servicenow

チューリッヒ戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

自動翻訳

最終更新日: **2025**年**12**月**17**日

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらの資料は、翻訳ソフトウェアを使用してお客様の便宜のために翻訳されています。正確な翻訳をご提供できるよう相当な努力を払っておりますが、いかなる自動翻訳も人間の翻訳者に代わることはなく、そのようなことは意図されておりません。翻訳は「現状のまま」提供されています。他言語への翻訳の的確性、信頼性または正確性については、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行われません。翻訳ソフトには限界があるため、一部のコンテンツが正確に翻訳されていない場合があります。これらの資料の公用言語は英語です。翻訳の際に生じる相違または不一致は、コンプライアンスまたは履行の目的に関しては拘束力を有さず、法的効力はないものとします。

ここで示したいくつかの例と図は、説明の目的でのみ提供されています。ServiceNow 製品またはサービスへの実際の関連付けやつながりは意図されておらず、推測されるものではありません。

ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の商標または登録商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標です。

下記の ServiceNow ウェブサイト利用規約をお読みください。 www.servicenow.com/terms-of-use.html

自動翻訳

本社
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
United States
(408) 501-8550

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

servicenow

目次

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 7
ポートフォリオ計画 9
探索 11
構成 34
ポートフォリオ計画の管理 65
ポートフォリオ計画作業の優先順位付け 74
ロードマップを計画する 85
クイックフィルターを適用 110
シナリオ計画による計画の最適化 111
キャパシティ計画立案を使用 120
計画立案アイテムの財務管理 126
ポートフォリオ財務管理 138
計画立案アイテムのドキュメント 141
ポートフォリオ計画ビューの管理 145
ダッシュボードの使用 149
ポートフォリオ計画のステータスまたはロードマップをエクスポート 162
PPM での作業の実行 164
参照 165
戦略的計画 196
フィードバック 197
ポートフォリオ計画 226
エンタープライズアジャイル計画 501
ダッシュボード 591
用語集 613
[store-future: BEGIN review]
[End]
戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist 616
探索 618
構成 622
監視タスク 631
使用方法 634
参照 647
コラボレーションワーク管理 649
探索 651
構成 655
使用方法 662
参照 723
CWM 向け Now Assist 729
探索 731
構成 733

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用方法 ... 736
参照 ... 741
ゴールフレームワーク および SPM のゴールフレームワーク ... 742
探索 ... 744
構成 ... 749
目標を管理 ... 760
参照 ... 769
データ分離 ... 789
探索 ... 791
構成 ... 793
参照 ... 798
プロジェクトポートフォリオ管理 ... 801
探索 ... 803
アクティブ化 ... 817
イノベーション管理 ... 818
デマンド管理 ... 850
プロジェクト管理 (PM) ... 945
プロジェクトワークスペース ... 1163
プロジェクトワークスペースクラシック版 - レガシー ... 1259
投資ポータル ... 1281
リソース管理ワークスペース ... 1284
リソース管理クラシック版 ... 1314
ポートフォリオ管理 ... 1402
プログラム管理 ... 1456
レートモデル ... 1472
タイムカード管理 ... 1480
ファイナンシャルマネジメント - 従来 ... 1526
金銭的利益計画と金銭以外の利益計画 ... 1710
戦略的支出トラッキング ... 1711
アナリティクスとレポート ... 1721
参照 ... 1740
SPM ベンチマーク ... 1763
SPM ベンチマーク の詳細 ... 1763
SPM ベンチマーク の構成 ... 1765
SPM ベンチマーク KPI をカスタマイズ ... 1767
SPM ベンチマーク の参照 ... 1768
投資枠管理 ... 1771
投資枠管理 のインストール ... 1772
従来の 投資枠管理 をストアアプリケーションにアップグレード ... 1774
投資枠管理 管理 ... 1775
トップレベルの投資の作成 ... 1779
投資の作成 ... 1781

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

投資の共同オーナー....1783
投資のための資金を要求....1784
投資のための資金配分を計画する....1785
投資への資金の割り当て....1786
投資の実際の支出の入力....1787
資金要求を却下....1788
資金の使用状況の確認....1789
過去の資金調達の詳細の表示....1790
ドメインセパレーションと 投資枠管理....1790
戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート....1791
探索....1792
構成....1793
使用方法....1797
参照....1803
アジャイル開発 2.0....1806
探索....1808
構成....1823
使用方法....1851
スクラムプログラム....1892
作業進捗ステータス....1904
ダッシュボード....1906
統合....1939
参照....1996
モバイル体験....2012
スケール アジャイル フレームワーク (SAFe)....2024
ドメインセパレーションと 大規模アジャイルフレームワーク (SAFe)....2025
Essential SAFe および Portfolio SAFe のビジネスステークホルダーロール....2026
Essential SAFe....2029
ポートフォリオ SAFe....2080
SAFe — 統一されたバックログ....2087
Essential SAFe 用 パフォーマンスアナリティクス コンテンツパック....2089
Work Progress Status for SAFe....2132
テスト管理アプリケーション....2134
ドメインセパレーションと テスト管理....2135
テスト管理 1.0....2136
テスト管理 2.0....2162
テスト管理 1.0 からテスト管理 2.0 への移行....2179
事業計画立案ポータル....2188
事業部門....2189
企業戦略を作成する....2190
事業部門戦略を作成する....2191
コスト管理....2192

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コスト管理を有効化.....2193
コスト管理のデモデータ.....2199
コスト概要モジュール..... 2201
CI レートカード.....2202
タスクレードカードと賃金レードカード.....2208
予算とコストセンター..... 2211
配布コストとルールの使用.....2214
経費でビジネスサービスを使用する..... 2216
コストのソース..... 2219
CI 関係.....2223
経費の割り当て..... 2224
予算関連レコード.....2226
ドメインセパレーションとコスト管理..... 2226
[ワークフローベースのドラフト]戦略的ポートフォリオ管理 (SPM):test-default..... 2227
[ドラフト]フィードバックを収集し、アイデアを出し、革新する..... 2228
[ドラフト]ビジネス目標の設定と管理.....2229
[ドラフト]作業の計画と調整..... 2230
[ドラフト]計画された作業を実行..... 2231
[ドラフト]ダッシュボードの表示、レポートの生成とエクスポート..... 2233
[ドラフト]SPM の Now Assist で生産性を向上.....2234
[ワークスペースベースのドラフト]戦略的ポートフォリオ管理 (SPM).....2238

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

作業をビジネスゴールに戦略的に合わせ、製品とサービスを提供します。 ServiceNow® 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) は、さまざまな方法論で価値を計画、提供、追跡し、顧客価値をより迅速に推進できるように支援することで、デジタルトランスフォーメーションを可能にします。


https://player.vimeo.com/video/1011388119?h=22a1bc163b&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

SPM の Now Assist で生産性を向上




SPM アプリ内で利用できるさまざまな生成 AI スキルについて説明します。

戦略的計画ワークスペース



製品フィードバックからイノベーションを起こし、作業を戦略に合わせて調整し、柔軟な構成で実行します。

プロジェクトワークスペース



インタラクティブな中央ワークスペースからプロジェクトを計画および管理します。

リソース管理ワークスペース



一元化されたワークスペースから、リソースにアサインされた作業の割り当てとブレークダウンを表示します。

Portfolio Planning Workspace (ポートフォリオ計画ワークスペース)



従来の製品およびポートフォリオ管理を強化します。

コラボレーションワーク管理




中央のワークスペースからチームと共同作業し、複数のツールを切り替えて作業を管理する手間を省きます。

プロジェクトポートフォリオ管理クラシック



簡素化されたチーム指向のアプローチに従って、デマンド、プロジェクト、プログラム、およびポートフォリオを管理します。

Agile Development 2.0



純粋なアジャイルアプローチを実装するか、従来のプロジェクト構造内でアジャイル手法を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

組織拡張 (com.snc.organization_extension) プラグイン

Organization Extension (com.snc.organization_extension) プラグインは、目標、事業部門、企業戦略、および事業部門戦略エンティティを有効化します。デモデータを使用して、すべてのお客様が zBoot で利用できます。

事業部門、目標、企業戦略、および事業部門戦略モジュールは、[組織 (Organization)] アプリケーションメニューで使用できます。

ビジネスアプリケーションおよびビジネス機能モジュールも [組織 (Organization)] アプリケーションメニュー内で使用できますが、それらの関連テーブルは構成管理 (CMDB) (com.snc.cmdb) プラグインに移動されます。これは zBoot で利用できますが、デモデータはありません。

学習する

- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) とは
- デジタル変革とは
- ガントチャートとは
- アジャイルとは
- アジャイルとウォーターフォールの違いとは
- アジャイルプロジェクト管理とは [リスト] タブ
- 重要業績評価指標 (KPI) とは
- プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) とは
- 作業ブレークダウン構成 (WBS) とは
- バリューストリームマッピング (VSM) とは
- リソース管理とは

開始

- ServiceNow SPM を使用して、スピードとアジリティでビジネス成果を実現する方法を理解します。詳細については、「Customer Success Center」を参照してください。
- 実行をビジネスゴールや優先順位に合わせる方法を学びます。詳細については、「戦略的計画」を参照してください。
- 目標を作成し、そのためのターゲットを設定し、目標とターゲットの進捗状況を評価して、組織計画を達成してビジネスの成果を推進します。詳細については、「ゴールフレームワークと SPM のゴールフレームワーク」を参照してください。
- さまざまなモジュールの読み取り専用ロールを提供する専用のプラグインを使用して SPM 機能を強化し、ダッシュボードとレポートへの安全なアクセスを確保します。

アプリケーションと機能

- Now Assist for SPM
- コラボレーションワーク管理
- CWM 向け Now Assist
- 製品フィードバック
- SPW でのポートフォリオ計画
- Enterprise Agile Planning

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- SPW ダッシュボード
- プロジェクトワークスペース
- リソース管理ワークスペース
- ゴールフレームワーク および SPM のゴールフレームワーク
- Project Portfolio Management (プロジェクトポートフォリオ管理)
- 戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート
- タイムカード管理
- アジャイル開発 2.0
- Microsoft Azure DevOps Integration for アジャイル開発
- Atlassian Jira Integration for アジャイル開発
- テスト管理アプリケーション
- コスト管理
- データ分離
- [qa: BEGIN review][ワークフローベースのドラフト]戦略的ポートフォリオ管理 (SPM):test-default[End]
- [qa: BEGIN review][ワークスペースベースのドラフト]戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)[End]

ポートフォリオ計画




ServiceNow® ポートフォリオ計画 (旧 アラインメントプランナーワークスペース) を使用して作業を優先順位付けし、計画を可視化することで、従来の製品およびポートフォリオの管理を強化します。一元化されたワークスペースを使用して、プロジェクトとデマンドの作業を効果的に計画、追跡、管理します。


ポートフォリオ計画 は 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) Standard ライセンスを持つユーザーが利用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



開始

探索	構成	使用方法
		
ポートフォリオ計画がビジネスに提供する主な機能と価値について説明します	コア構成の設定	ポートフォリオ全体の作業を計画および調整する方法を学ぶ

優先順位付け	ロードマップ	レポート
		
ポートフォリオ計画の作業のランク付けと優先順位付け	ポートフォリオ計画の作業のロードマップを作成	ポートフォリオ計画とロードマップステータスレポートを PPT としてエクスポート

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

統合	比較	参照
		
ポートフォリオ計画とプロジェクトポートフォリオ管理の統合	ポートフォリオ計画と戦略的計画の機能の比較	コンポーネントとドメインセパレーションの詳細を取得します

トラブルシューティングとサポート

- で質問や回答をする 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) フォーラム ServiceNow コミュニティ
- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

ポートフォリオ計画 の探索

ポートフォリオ計画 を使用して、製品とポートフォリオに対して計画されている作業の優先順位付け、ロードマップ、および追跡を行います。従来のプロジェクトおよび製品配送アプローチの管理を強化します。

ポートフォリオ計画の概要

ポートフォリオ計画 は、希望する配送の観点から製品とポートフォリオの作業を計画するのに役立ちます。ポートフォリオや製品を通じてエンタープライズレベルから計画をカスケードするか、作業が事業達成目標に沿うように計画します。

ポートフォリオ計画 のレンズを使用すると、計画立案の視点を柔軟に切り替え、カスタマイズされた計画を作成して、製品とポートフォリオに対する焦点を絞った計画を実現できます。これらのポートフォリオ計画に関連する作業から、関連する作業の優先順位付けとロードマップを行うことで、適切な実行チームを適切な戦略に配置します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。











ポートフォリオ計画ワークスペース と 戦略的計画ワークスペース の比較

- ポートフォリオ計画ワークスペース：ウォーターフォール手法を使用する場合に、作業を優先順位付け、ロードマップ、および追跡します。デマンドおよびプロジェクト管理 (PM) のための従来のポートフォリオ計画立案を強化します。
- 戦略的計画ワークスペース：従来の手法、アジャイル手法、またはハイブリッド手法を使用する場合に、作業を優先順位付け、ロードマップ、および追跡します。組織全体で目標を定義して追跡することで、戦略を実行に合わせます。Strategic Planning の詳細については、「戦略的計画」を参照してください。

機能	ポートフォリオ計画ワークスペース	戦略的計画ワークスペース
事前定義されたレンズ:プロジェクトポートフォリオ	✓	✓
事前定義されたレンズ:組織	✓	✓









自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	ポートフォリオ計画ワークスペース	戦略的計画ワークスペース
事前定義されたレンズ:プロジェクトプログラム		
事前定義されたレンズ:製品		
事前定義されたレンズ:戦略的投資		
事前定義されたレンズ:目標		








自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	ポートフォリオ計画ワークスペース	戦略的計画ワークスペース
事前定義されたレンズ:バリューストリーム		
事前定義されたレンズ:ビジネスケイパビリティ		
レンズ構成:既存のレンズを変更する		
レンズ構成:新しいレンズを作成		









自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	ポートフォリオ計画ワークスペース	戦略的計画ワークスペース
ポートフォリオ計画:作成と共有		
計画立案アイテム:サポートされている計画立案アイテム	プロジェクト、デマンド	プロジェクト、デマンド、エピック、カスタム
計画立案アイテム:上位レベルの計画立案でサポートされている計画立案アイテム	プログラム (pm_program)	戦略的プログラム、イニシアチブ、カスタム
計画立案アイテム:カスタム計画立案アイテムテーブル		5 つの事前定義されたテーブル
優先順位付け:リスト		
優先順位付け:階層		









自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	ポートフォリオ計画ワークスペース	戦略的計画ワークスペース
優先順位付け:カンバン		
ロードマップ:タイムライン		
ロードマップ:カンバン		
シナリオ計画		









自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	ポートフォリオ計画ワークスペース	戦略的計画ワークスペース
採点		
目標		
製品フィードバック		
キャパシティ計画立案		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	ポートフォリオ計画ワークスペース	戦略的計画ワークスペース
財務管理		
フリーフォームロードマップの作成と共有	プロジェクト、デマンド、プログラムテーブル	任意の ServiceNow® プラットフォームエンティティ
Enterprise Agile Planning		
ダッシュボード		
での目標と戦略の監視 ServiceNow AI コントロールタワー		

以下のセクションの情報を活用して、ポートフォリオ計画 のさまざまな機能について詳細に学ぶことができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ポートフォリオ計画のレンズ

計画の視点を柔軟に切り替えて、カスタマイズされたポートフォリオ計画を使用して、作業の配置を優先順位付け、ロードマップし、表示します。結果の共有を促進する計画に関するインサイトを検出することで、エンタープライズ計画を改善します。

レンズ


ポートフォリオ計画 内のレンズは、作業の優先順位付けと計画を行うための視点を示します。レンズとその構造は、さまざまな計画マネージャーが作業の優先順位付け、資金調達、および計画を行う方法を表します。たとえば、ロールに応じて、配送組織、戦略的投資、製品などの観点から作業を計画できます。

事前定義されたレンズとその構造

ポートフォリオ計画 には、ポートフォリオ計画のビルドを開始するための事前定義された 2 つのレンズ (組織と Portfolio Planning) が用意されています。

計画マネージャーは、会社でのロールに基づいてこれらのレンズを使用できます。各レンズには複数のレベルが含まれており、そこでペルソナが計画を立て、これらのレベルが合わさってそのレンズの構造を形成します。

事前定義されたレンズの構造

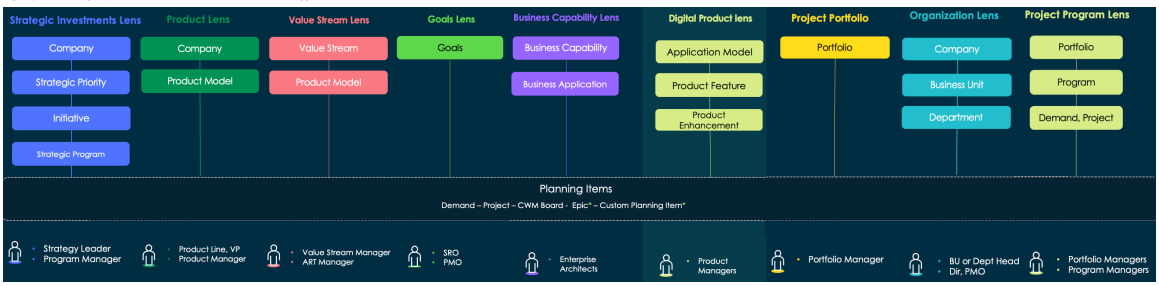

レンズ	計画レベル	計画マネージャー	説明
組織	• 会社 • 事業部門 • 部門	• 部門長 • 事業部門長	作業が会社の目標にどのように沿っているかをビジュアル化する
プロジェクトポートフォリオ	ポートフォリオ	• プロダクトマネージャー • ポートフォリオマネージャー	作業が会社全体のポートフォリオにどのように沿っているかをビジュアル化する
プロジェクトプログラム	• ポートフォリオ • Program (プログラム)	• ポートフォリオマネージャー • プログラムマネージャー	プログラムの作業を計画して優先順位付けし、ロードマップを作成します。

アドミニストレーターと協力して、これらの事前定義されたレンズの構造を変更することができます。詳細については、「ポートフォリオ計画 でのレンズの設定」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ポートフォリオ計画の作成を開始して、作業とビジネス戦略の整合性を向上させます。「ポートフォリオ計画の作成」を参照してください。

ポートフォリオ計画 でのポートフォリオ計画

カスタマイズされたポートフォリオ計画は、適切な時期に会社の目標に沿って適切な作業のロードマップを作成するのに役立ちます。

ポートフォリオ計画の概要

ポートフォリオ計画は、計画マネージャーごとのカスタム計画であり、レンズを使用してビルドされます。ポートフォリオマネージャーは、プロジェクトポートフォリオレンズを使用してポートフォリオの視点で計画し、部門長は組織レンズを使用して部門の視点で計画することができます。

計画マネージャーは、さまざまなレンズを使用して複数のポートフォリオ計画を作成できます。さまざまな視点から作業の計画と進捗状況をビジュアル化し、ステークホルダーと共有します。

ポートフォリオ計画を使用すると、次のことができます。

- 目的の視点 (レンズ) で集中的に作業を計画できるようにします。
- 適切な作業に優先順位を付けてロードマップを作成し、会社の目標との整合性を確保します。
- 実行チームを適切な作業に配置するために費やす時間を短縮します。

ポートフォリオ計画を使用した上位レベルの計画


ポートフォリオ計画では、上位レベルのポートフォリオ計画を構築することで、組織のプログラム (pm_program) に優先順位を付けてロードマップを作成できます。上位レベルの計画立案アイテムは、通常、会社の複数の事業部門、部門、またはポートフォリオにまたがります。これらの上位レベルの計画立案アイテムは、会社の優先事項をさらにブレークダウンし、特定のマイルストーンと結果を達成するのに役立ちます。

階層ビューを使用して、作業パイプラインをレビューし、プログラムに関連付けられた下位レベルの計画立案アイテムにドリルダウンできます。

たとえば、 EPMOとして、各プログラムに関連付けられたエピックを表示できます。

プロジェクトプログラムレンズのプログラム (pm_program) を使用して、上位レベルのポートフォリオ計画を作成できます。「上位レベルのポートフォリオ計画の作成」を参照してください。

以下は、会社のいくつかのプログラムと、それらに沿った下位レベルの作業 (プロジェクトとデマンド) を示すサンプルポートフォリオ計画です。

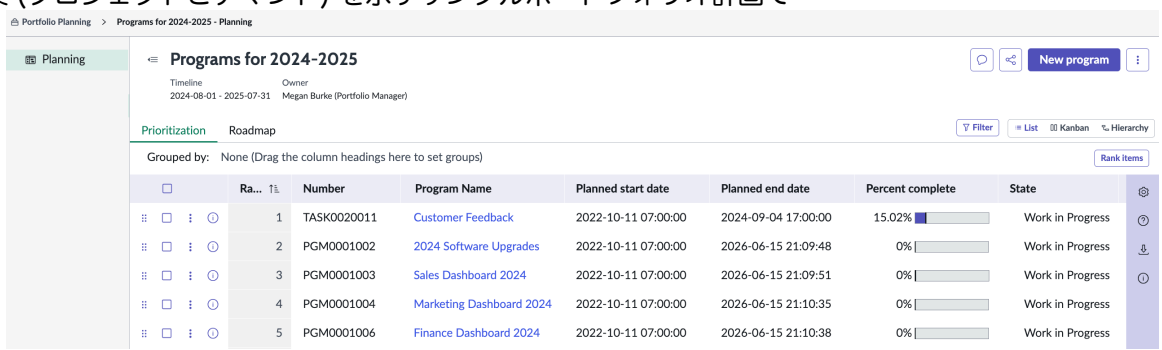

ポートフォリオ計画の作成を開始して、作業を会社の目標に合わせて調整します。「ポートフォリオ計画でのポートフォリオ計画の管理」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポートフォリオ計画 での作業の優先順位付け


ポートフォリオ計画 の一元化されたワークスペースを使用して、ポートフォリオに関連する作業に優先順位を付けます。レビューして投資する適切な作業を決定します。

ポートフォリオ計画のロードマップをスケジュール設定する前に、既存の作業負荷と今後の作業負荷をあらかじめ把握しておくとよいでしょう。すべての作業アイテムを 1 か所にリストアップしておくと、作業パイプライン全体を把握しやすくなります。統合ビュー により、バックログの調整をスムーズに行えるため、優先順位付けが必要なアイテムを簡単に確認して決定できます。

ワークスペースの [優先順位付け] タブを使用して、ポートフォリオ計画のすべての新規および既存の作業をレビューし、そのバックログを表すことができます。優先順位付けでは、作業負荷を効率的に確認できるように、関連目標、計画コスト、計画利益などの各作業アイテムに関する情報が提供されています。これらのデータポイントを使用すると、アイテムを優先順に並べて、どのアイテムを他のアイテムよりも優先するかを決定できるようになります。[優先順位付け] タブには、バックログを確認および管理するための次のビューがあります。

リストビュー


計画立案アイテムはグリッド形式でリストされます。ドラッグ機能を使用して、アイテムをスタックランクし、目的の属性でグループ化して、優先度に基づいてソートすることができます。

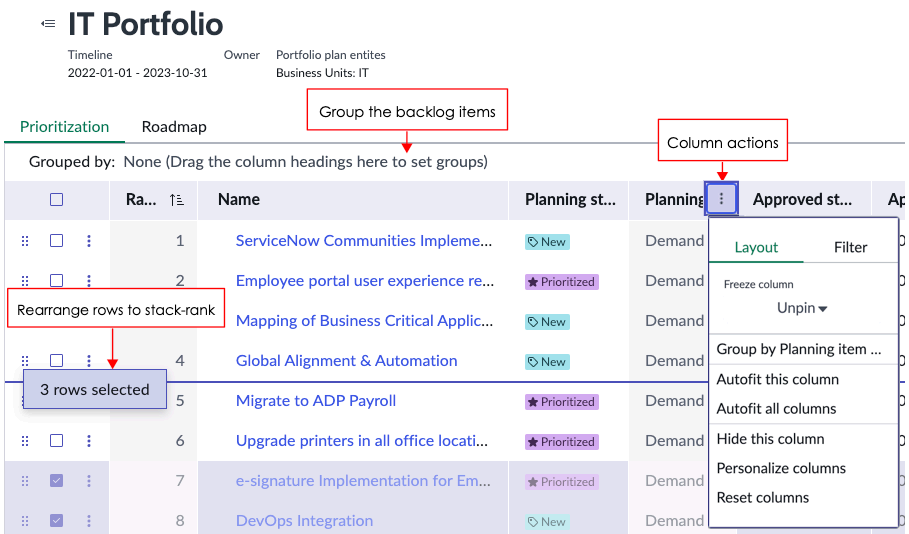

階層ビュー

このビューには、現在のポートフォリオ計画の作業と他のレンズのエンティティとの調整がどのように行われるかが表示されます。レンズスイッチャーを使用すると、作業の調整を表示する視点を変更できます。ビューのタイムラインセクションを使用して、計画立案アイテム間のスケジュールと依存関係を可視化して、効果的に作業の優先順位を付けます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

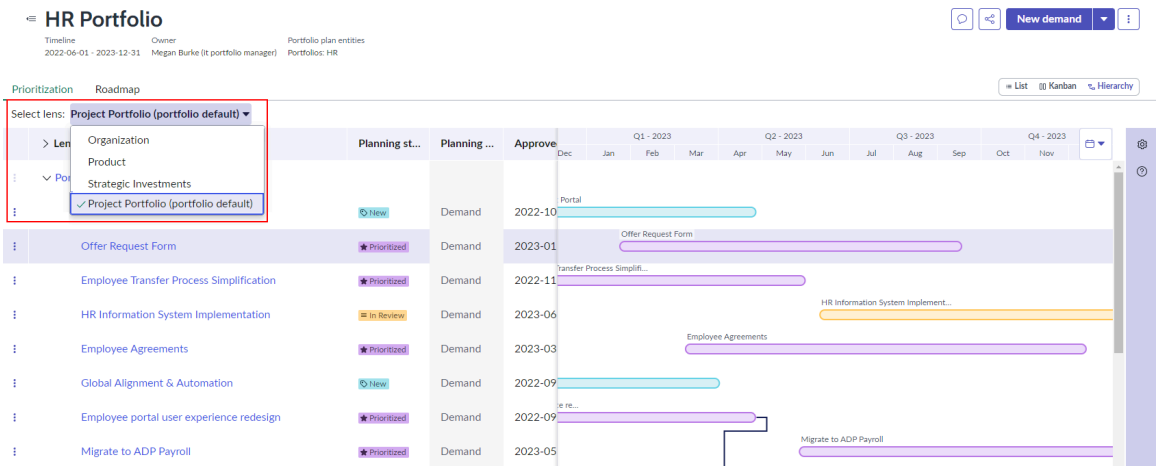

たとえば、ポートフォリオマネージャーは、ポートフォリオ向けに作成されたプロジェクトやデマンドをすべて 1 か所で、ポートフォリオのバックログとして確認することができるようになります。ポートフォリオで新しいプロジェクトを始める必要がある場合は、このバックログに直接追加することができます。こうしたアイテムは、簡単に識別できるように [新規] とマークされます。特定のアイテムについてステークホルダーと協議中の場合は、優先順位が確定するまで [確認中] とマークします。作業可能なアイテムが決まった後は、[優先順位付け] とマークすると、ポートフォリオロードマップに追加されるようになっています。プロジェクトやデマンドを続行しない場合は、[キャンセル] とマークします。

ポートフォリオ計画 で作業パイプラインの管理を開始するには、「ポートフォリオ計画でのポートフォリオ計画作業の優先順位付け 」を参照してください。

ポートフォリオ計画 のロードマップ

ポートフォリオ計画 ワークスペースのビジュアルロードマップを使用して、会社の作業を効果的に計画します。

組織が成長し、優先順位が変化していくにつれ、既存の計画を変更したり、新たな計画を簡単に作成したりできる柔軟性が重要になります。ロードマップを使用して、現在と今後の計画のレイアウトを作成しながら、それらを事業達成目標に合わせることができます。これらの視覚的な計画を組織全体の他のステークホルダーと共有し、有意義な会話を促進し、共通の理解を検証します。

各ロードマップは上位レベルの作業ブロックであり、エンタープライズプロジェクトマネージャー、ポートフォリオマネージャー、プロジェクトマネージャーなどのさまざまな計画立案ペルソナによって優先順位が付けられます。また、ロードマップは、開発中にデリバリーチームをガイドしながら、ステークホルダーにインサイトを提供します。

操作できるロードマップのタイプは次のとおりです。

- ポートフォリオ計画ロードマップ
- フリーフォームロードマップ

これらのロードマップで使用可能な機能は次のとおりです。

- ハイブリッドロードマップ
- ロードマップレベルのマイルストーン
- 計画立案アイテムレベルのマイルストーン
- 計画立案アイテムの依存関係
- トラッキングモード

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ロードマップは ポートフォリオ計画 でデフォルトで利用可能です 。Roadmap Planning (sn_roadmap_plng) は、独立したアプリケーションとしてインストールできなくなりました。

ポートフォリオ計画ロードマップ

レンズを使用して柔軟なポートフォリオ計画を作成することで、ポートフォリオの作業の優先順位付けとロードマップを行うことができます。これらのポートフォリオロードマップを使用して、組織のさまざまな視点の作業を個別に計画および追跡し、それらを会社の計画の概要に接続します。

ポートフォリオ計画の作成 で開始します。

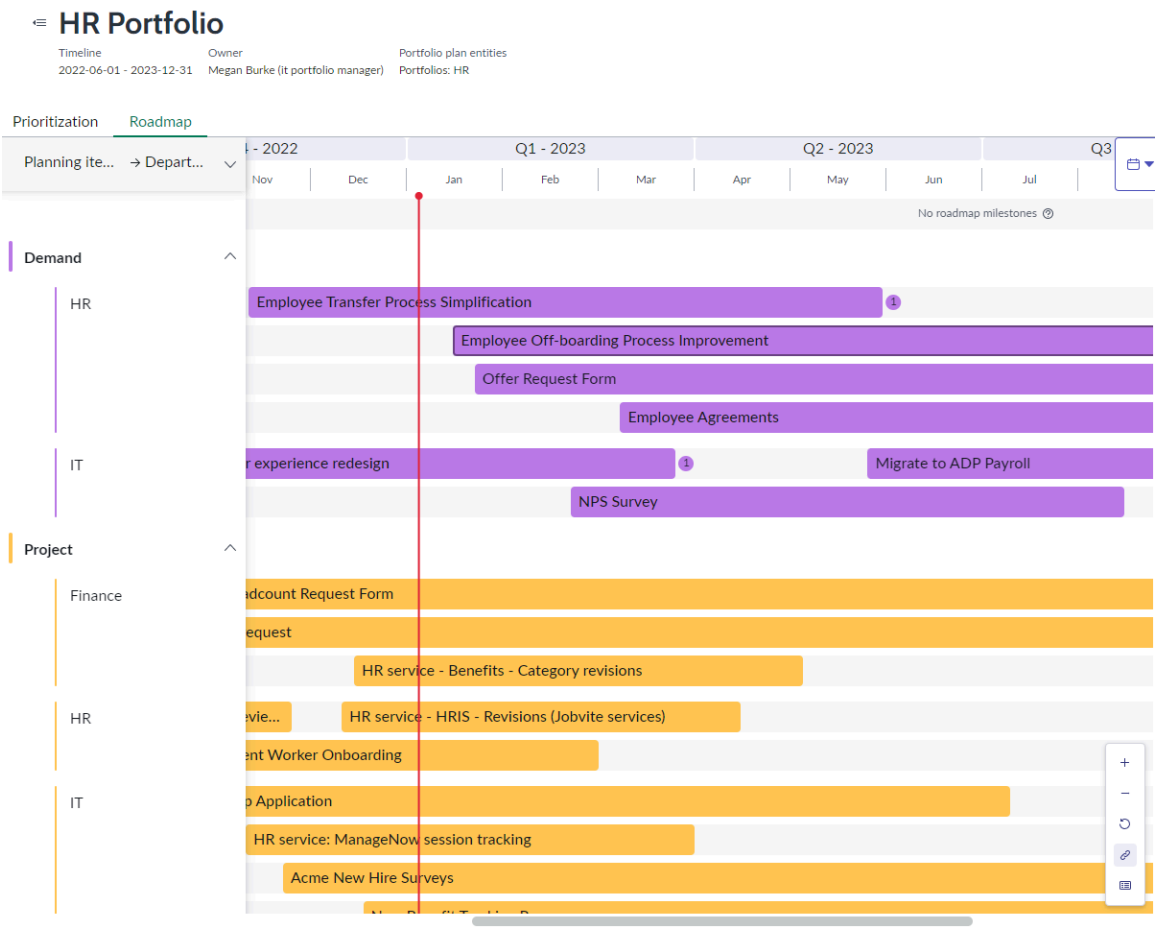

フリーフォームロードマップ

自由形式のロードマップを使用すると、複数のポートフォリオにわたる作業など、会社のさまざまな部門からの作業を柔軟に計画および追跡できます。

フィルター条件を使用して、ロードマップに必要な作業アイテムの種類を定義できます。部門のプロジェクト専用のロードマップが必要な場合は、プロジェクトのロードマップを定義して現在のプロジェクトの進捗状況の追跡を開始し、新しいプロジェクトの計画を作成します。「フリーフォームロードマップを作成」を参照してください。


自由形式のロードマップを使用すると、複数のポートフォリオにわたる作業など、会社のさまざまな部門からの作業を柔軟に計画および追跡できます。

フィルター条件を使用して、ロードマップに必要な作業アイテムの種類を定義できます。部門のプロジェクト専用のロードマップが必要な場合は、プロジェクトのロードマップを定義して現在のプロジェクトの進捗状況の追跡を開始し、新しいプロジェクトの計画を作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

「フリーフォームロードマップを作成」を参照してください。

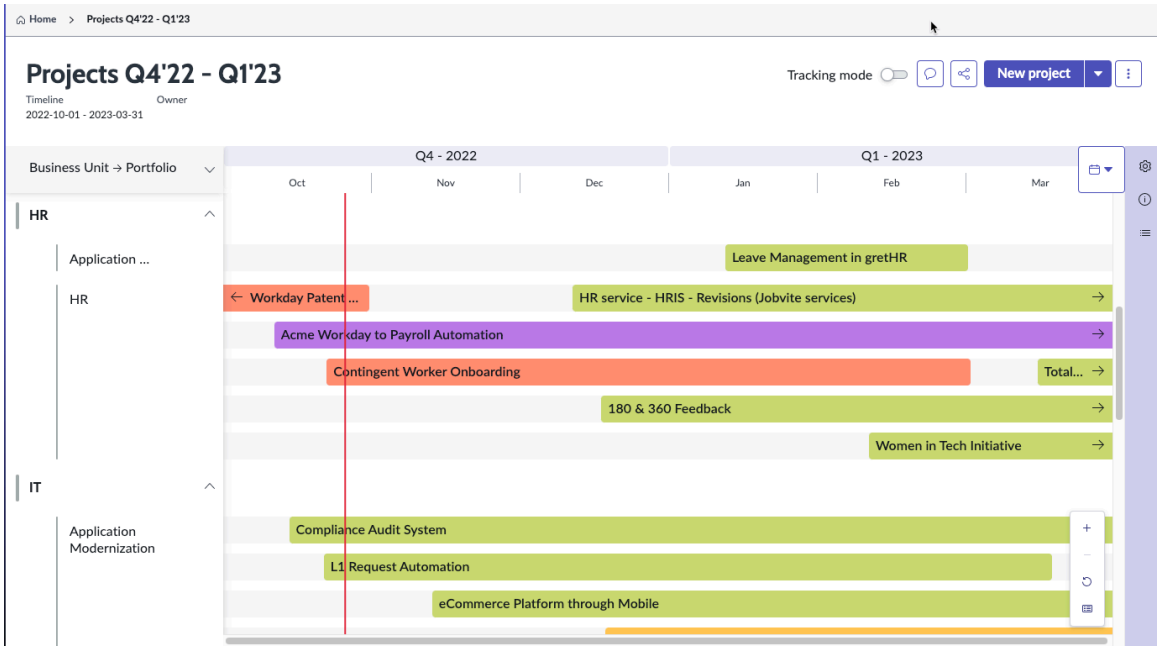

ハイブリッドロードマップ


ポートフォリオ計画 では、ポートフォリオロードマップとフリーフォームのロードマップの両方を使用して、ハイブリッドロードマップをビルドできます。たとえば、プロジェクトとデマンドを組み合わせたものを単一のビューに含めることができます。

ロードマップのマイルストーン

ロードマップまたはロードマップ上の各計画立案アイテムのマイルストーンを作成できます。

ロードマップレベルまたはポートフォリオレベルのマイルストーン

ロードマップレベルで作成されたマイルストーンは、そのロードマップのタイムライン中に開始日または主要なイベントを追跡するのに役立ちます。ロードマップマイルストーンの作成方法については、「ロードマップのマイルストーンを追加」を参照してください。

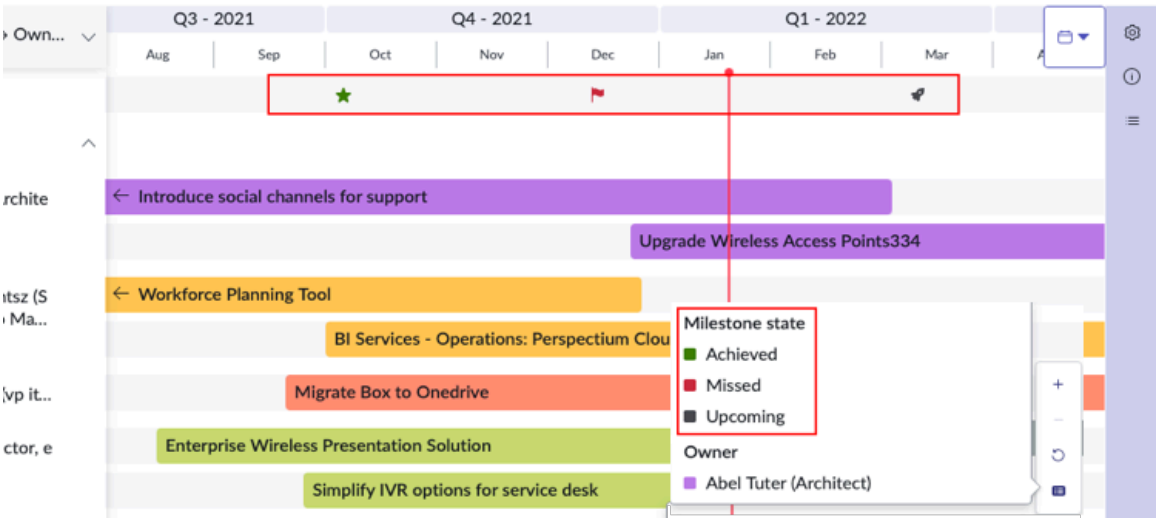


計画立案アイテムのマイルストーン

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイテムレベルで作成されたマイルストーンを使用すると、戦略的な成果にさらに重点を置くことができます。こうしたマイルストーンは、期限や他の重要な日付を追跡するのに役立ちます。プロジェクトとデマンドのマイルストーンにアクセスできます。

ロードマップからすべてのタイプの計画立案アイテムのマイルストーンを作成および更新できますが、プロジェクトのマイルストーンは読み取り専用です。プロジェクトマイルストーンへの変更は関連するプロジェクト計画に影響を与える可能性があるため、プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) のプロジェクトワークスペースを使用してプロジェクトマイルストーンを作成または更新することをお勧めします。

ロードマップでアイテムレベルマイルストーンを作成する方法については、「ロードマップアイテムのマイルストーンを追加」を参照してください。

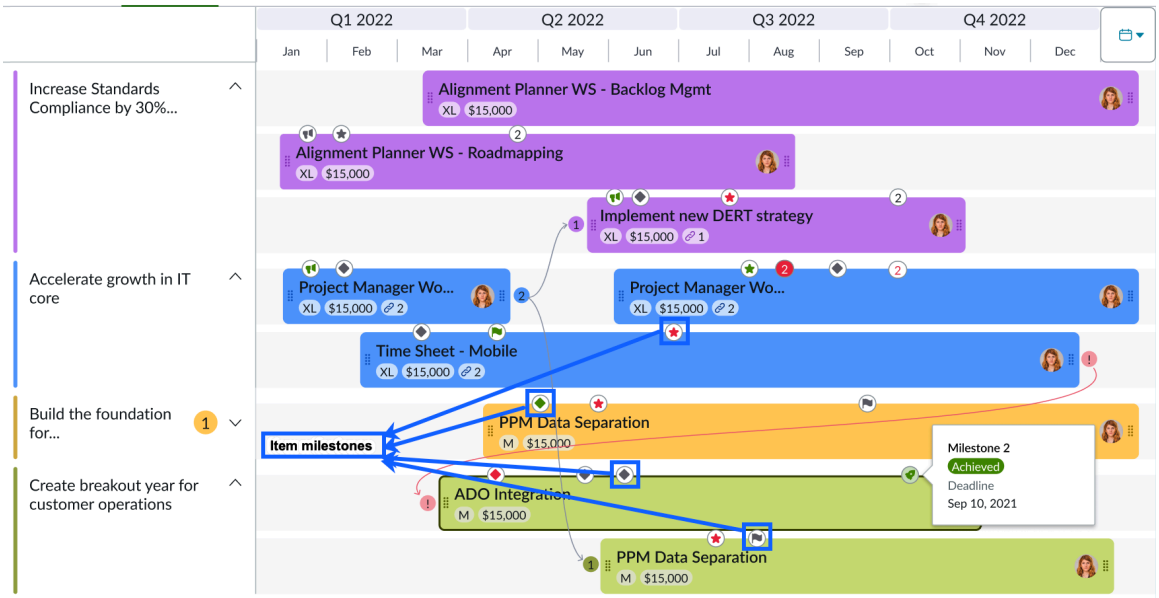

計画立案アイテムの依存関係

計画立案の際は、計画立案アイテムがそれぞれどのように関係しているのかを把握することが重要です。これが把握できていないと、タイムクリティカルなプロジェクトやデマンドの優先順位付けを誤ってしまう恐れがあります。また、情報が不足すると、適切な作業を適切な期間にスケジュール設定できなくなる可能性もあります。


ロードマップにおける依存関係を把握することで、こうした計画立案アイテム間の関係を視覚化することができ、それに応じてスケジュールを調整することができるようになります。

ポートフォリオ計画 では、依存関係をシンプル化したりハイブリッド化したりすることができます。たとえば、2 つのプロジェクト間、またはプロジェクトとエピック間の依存関係を確立することができます。また、計画立案アイテムは、同じポートフォリオ計画内のアイテムまたはまだ計画されていないアイテムに依存する可能性があります。

依存関係の行は、まとめて優先順位付けする必要があるアイテムを簡単に識別するのに役立ちます。このように計画立案アイテム間の関係性を簡単に識別できるようになることで、計画立案プロセスにおけるコラボレーションが向上し、意思決定が強化されます。

依存関係の作成や管理については、「ロードマップアイテムの依存関係を追加」を参照してください。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

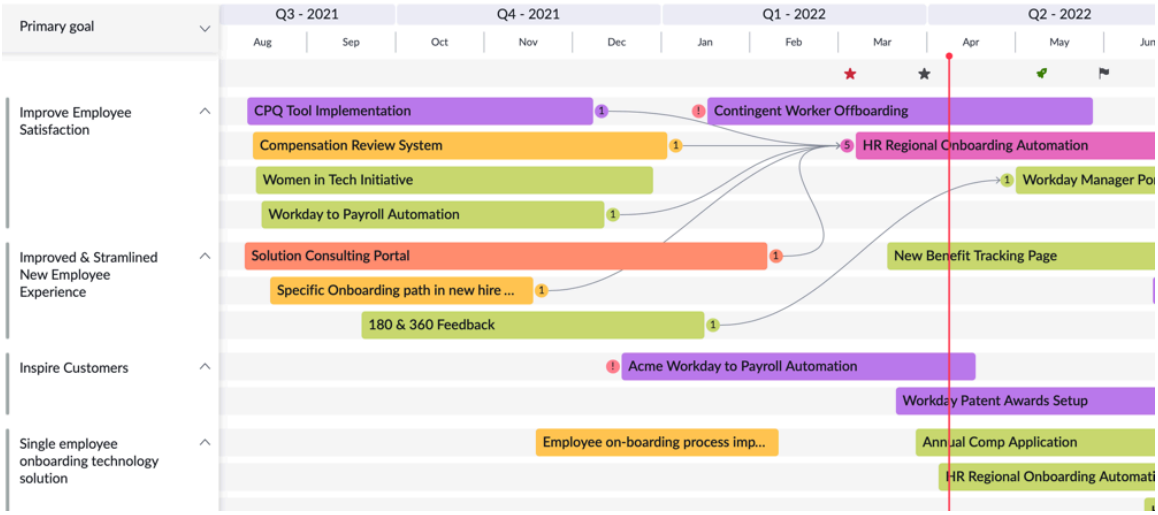

ロードマップの追跡モード

ロードマップ上の各アイテムのステータス、進捗状況、およびメトリクスを追跡します。計画立案アイテムバーのステータスインジケーターや完了率スコアを使用すると、情報に基づいた意思決定を事前に行い、作業の進捗状況をステークホルダーに簡単に伝えることができるようになります。

「ロードマップアイテムの進捗状況を追跡する」を参照してください。

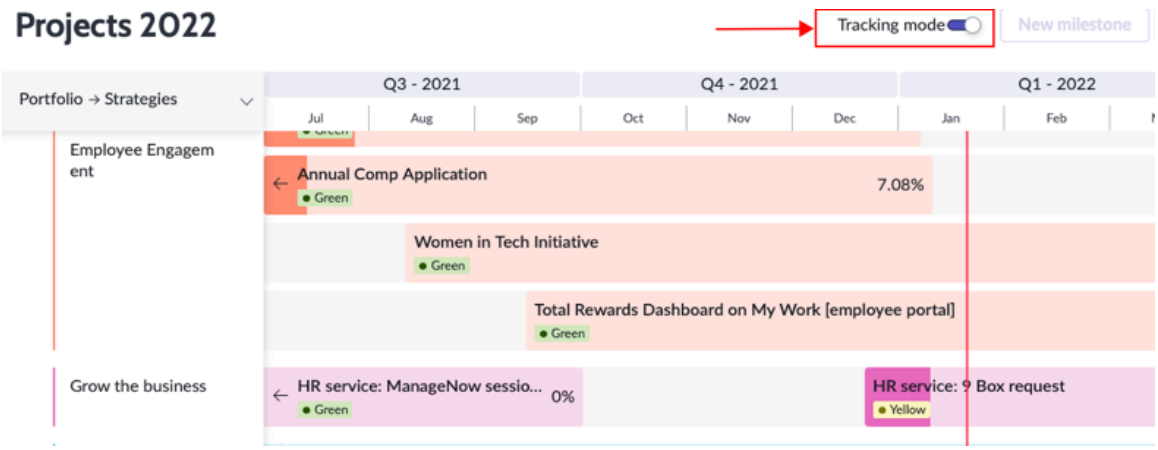

ポートフォリオ計画 のシナリオ計画

戦略的シナリオを作成して評価し、さまざまな計画立案アプローチを検討します。組織の目標と戦略的優先事項に沿った最適なシナリオを承認します。

シナリオ計画の概要

ポートフォリオ計画 のシナリオ計画を使用すると、組織は、戦略的目標および意図するビジネス成果に沿った最適な戦略的シナリオを作成、評価、および承認できます。このプロセスは、さまざまなアプローチを可視化し、その影響を評価し、本稼働計画を実装する前に情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。シナリオ計画を活用することで、組織は潜在的な課題を予測できます。 シナリオ計画の概要


シナリオとは

ポートフォリオ計画 のシナリオは、本稼働計画に影響を与えることなく戦略的アプローチを探索できる計画のシミュレーションバージョンです。アイテムに優先順位を付け、タイムラインを調整し、各アプローチの潜在的な影響を評価するための安全な環境を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

計画と比較すると、シナリオにはさらに次のものがあります。

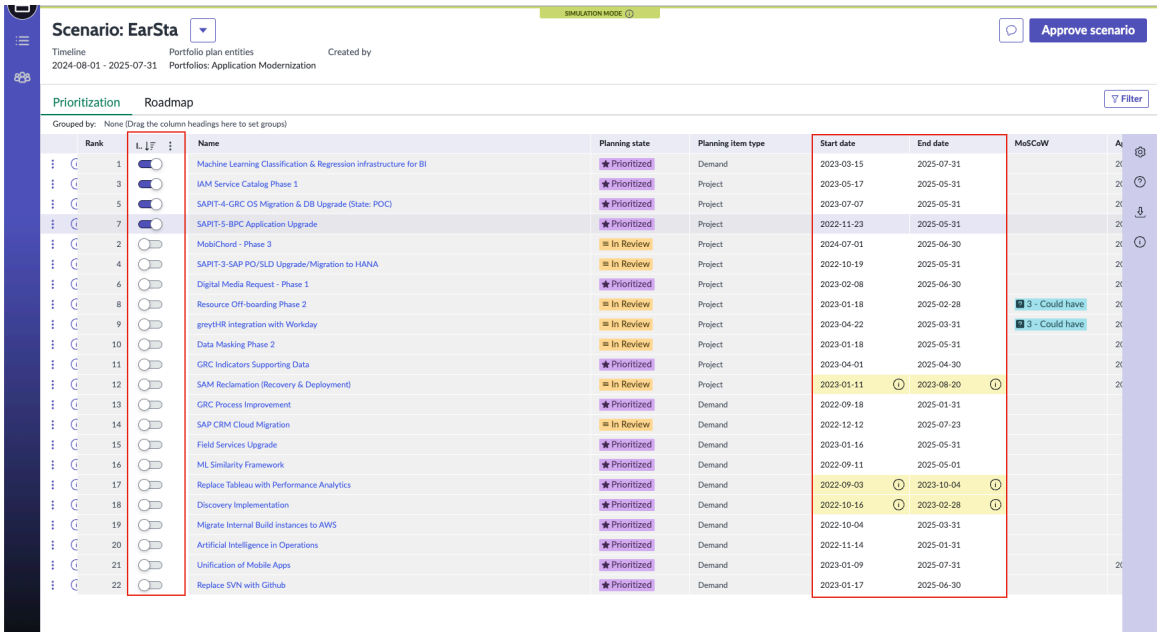

- [計画中 **(In Plan)**] トグル：[計画中 **(In Plan)**] トグルを使用すると、作成しているシナリオの計画立案アイテムに優先順位を付けたり、優先順位を下げたりすることができます。デフォルトでは、シナリオを作成すると、次のすべてのフィールド値を持つ計画立案アイテムに対して [計画中 **(In Plan)**] トグルがオンになります。
  - [計画] ステータスが [優先順位付け] または [完了]
  - 開始日と終了日がポートフォリオ計画日の範囲。
- 日付フィールド：シナリオの [開始日] フィールドと [終了日] フィールドは、計画立案アイテムの計画または実績の開始日と終了日に基づいて自動的に入力されます。これらの日付は、シナリオ計画プロセス中に更新できます。シナリオが承認されると、更新日が計画立案アイテムの承認日として記録されます。更新日が許容範囲から外れている場合は、黄色でハイライト表示されます。

ポートフォリオ計画の詳細については、「ポートフォリオ計画 でのポートフォリオ計画」を参照してください。

シナリオを並べて比較することで、各シナリオ間の目標の整合性とトレードオフの違いを評価できます。この比較分析は、戦略的目標に最適なシナリオを特定するのに役立ちます。シナリオの比較の詳細については、「シナリオを比較」を参照してください。


ポートフォリオ計画 のシナリオ計画ワークフロー


ポートフォリオ計画 のシナリオ計画機能を使用すると、次のアクティビティを実行できます。


- シナリオを作成して、さまざまな戦略的アプローチとビジネス成果を調査します。詳細については、「シナリオの作成」を参照してください。
- 複数のシナリオを並べて調整して比較し、目標の整合性とトレードオフの違いを評価します。詳細については、「シナリオを比較」を参照してください。
- 組織の目標に沿った最適なシナリオを承認します。詳細については、「シナリオの承認」を参照してください。
- 計画サイクルごとにターゲットポートフォリオ予算を設定します。計画サイクルは、会計期間、四半期、年次、またはポートフォリオタイムラインに使用できます。
- 計画内アイテムのターゲット予算と予算案を評価し、優先順位付けされたアイテムによる金銭的利益を確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

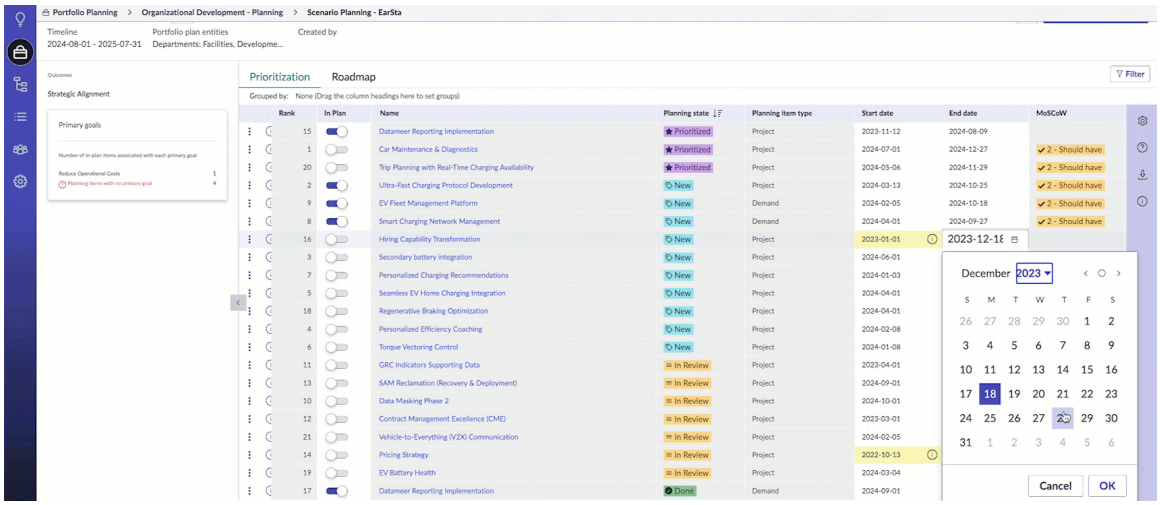

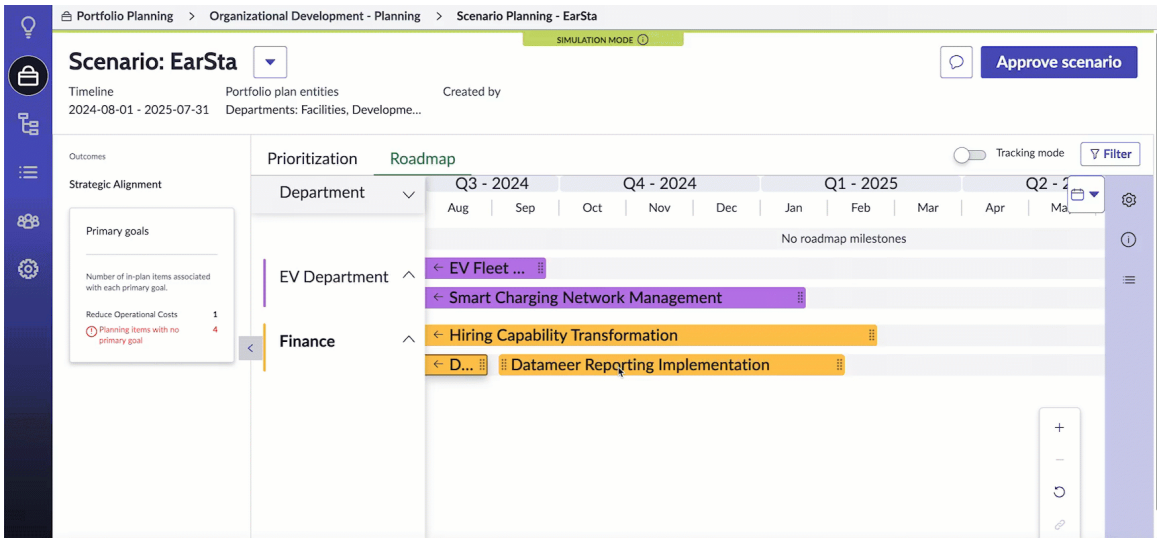

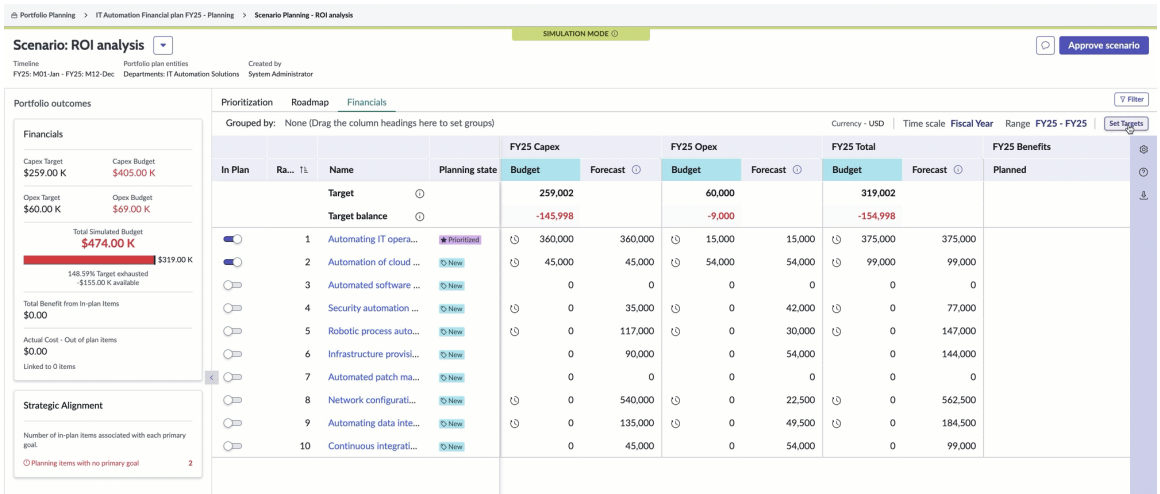


シナリオ計画ワークフローの概要

シナリオ計画ワークフローには、実行オーナーとポートフォリオオーナーが関与します。次の図は、計画立案アイテムの予定日または実際の日付に基づいてシナリオ計画を作成する方法と、これらの計画立案アイテムの状況に基づいて [計画内] トグルを調整する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

シナリオ計画におけるユーザージャーニー

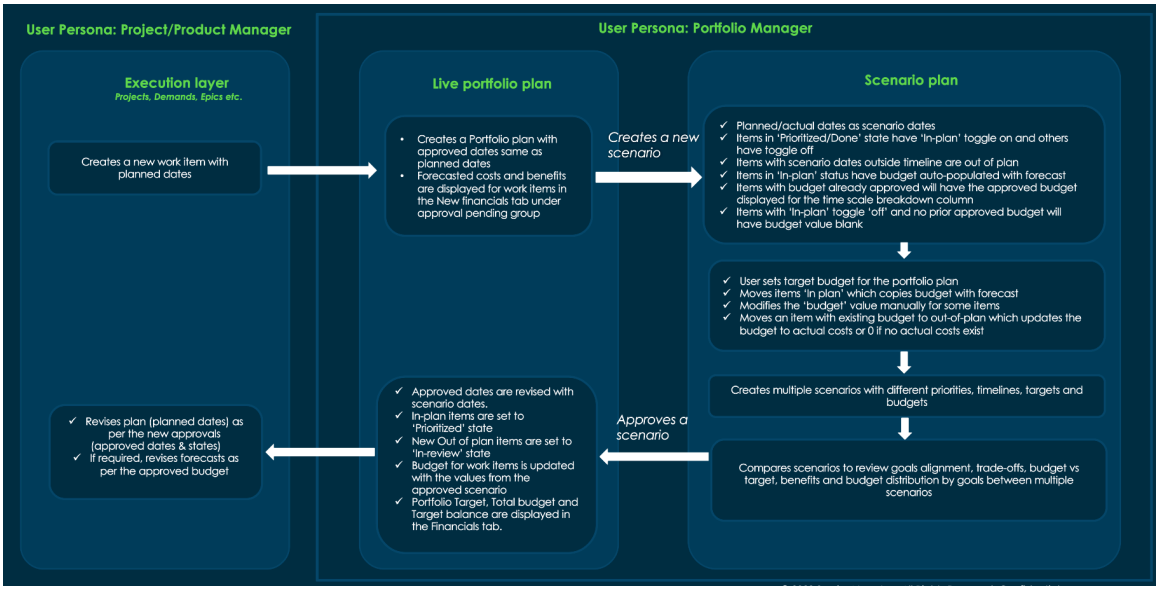


シナリオ計画を使用してポートフォリオ計画プロセスを強化するための詳細なガイダンスについては、「でのシナリオ計画による計画の最適化 ポートフォリオ計画」を参照してください。

プロジェクトポートフォリオ管理 による ポートフォリオ計画

ServiceNow プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) アプリケーションの ポートフォリオ計画 で計画された作業がスムーズに実行できるようになります。

ポートフォリオマネージャーやプロダクトオーナーなどの計画立案ペルソナは、ポートフォリオ計画を使用することで、計画を事業達成目標に合わせ、実行チームは PPM を使用して計画されたプロジェクトとデマンドで作業を配送できます。

ポートフォリオ計画 と **ServiceNow®** プロジェクトポートフォリオ管理 との統合

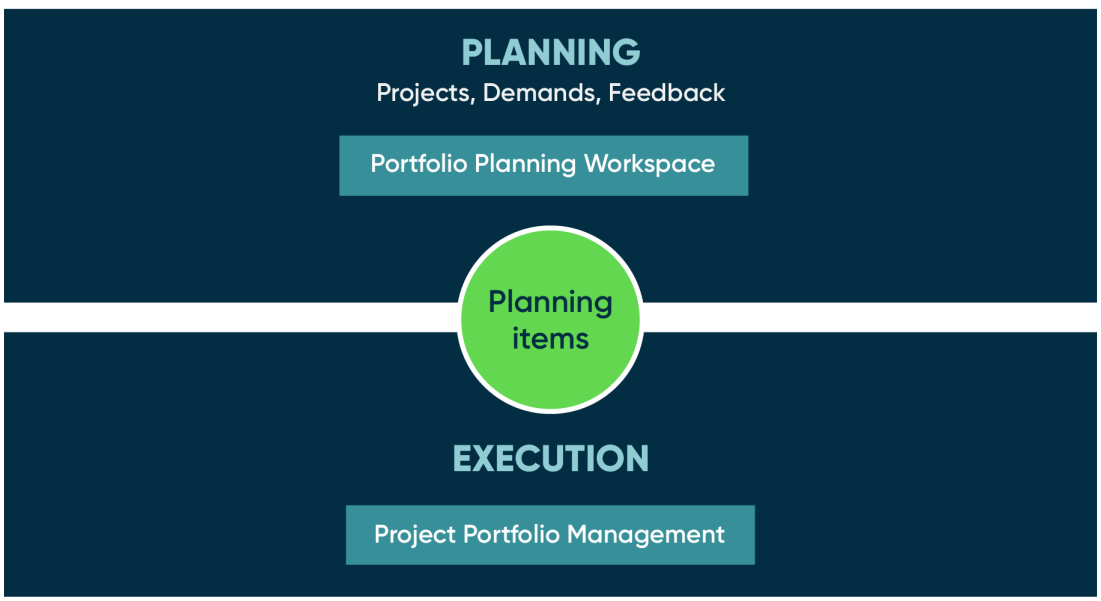

ポートフォリオ計画 **with PPM** の主なメリット

- 利用可能な PPM 計画立案アイテムを ポートフォリオ計画で表示します。
- PPM から ポートフォリオ計画 への計画立案アイテムのインポート

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- ポートフォリオ計画 から PPM への計画立案アイテムのエクスポート
- ポートフォリオ計画 with PPM のリンクされた計画立案アイテムの更新を同期します。
- リンクされた計画立案アイテムの進捗状況を ポートフォリオ計画 で追跡します。

ポートフォリオ計画 with PPM の統合を開始するには、「ポートフォリオ計画 と PPM の統合」を参照してください。


ポートフォリオ計画 でのキャパシティ計画立案

[キャパシティ計画立案] 画面では、リソースのキャパシティ、割り当て、および使用率をリソースマネージャーが包括的に把握できます。

[キャパシティ計画立案] 画面を分析すると、次のことが簡単にできます。

- 優先順位付けされたポートフォリオアイテムのリソースキャパシティを表示します。
- グループ、ロール、スキルなどの主要な属性を使用して、組織全体のリソースキャパシティのニーズと見積りを把握します。
- ポートフォリオにおけるリソースの供給と作業のデマンドを効果的に予測します。
- 色インジケーターを使用して、リソースキャパシティ割り当てを理解し、その概要を把握します。
- 今後のアサインに備えて特定のスキルまたはロールを持つリソースを計画します。
- 直感的な新しいユーザーインターフェイスを使用して、リソース割り当ての健全性をすぐに表示すると、過剰な割り当てがある月別にポートフォリオ期間の詳細なブレークダウンが得られます。

[キャパシティ計画立案] 画面

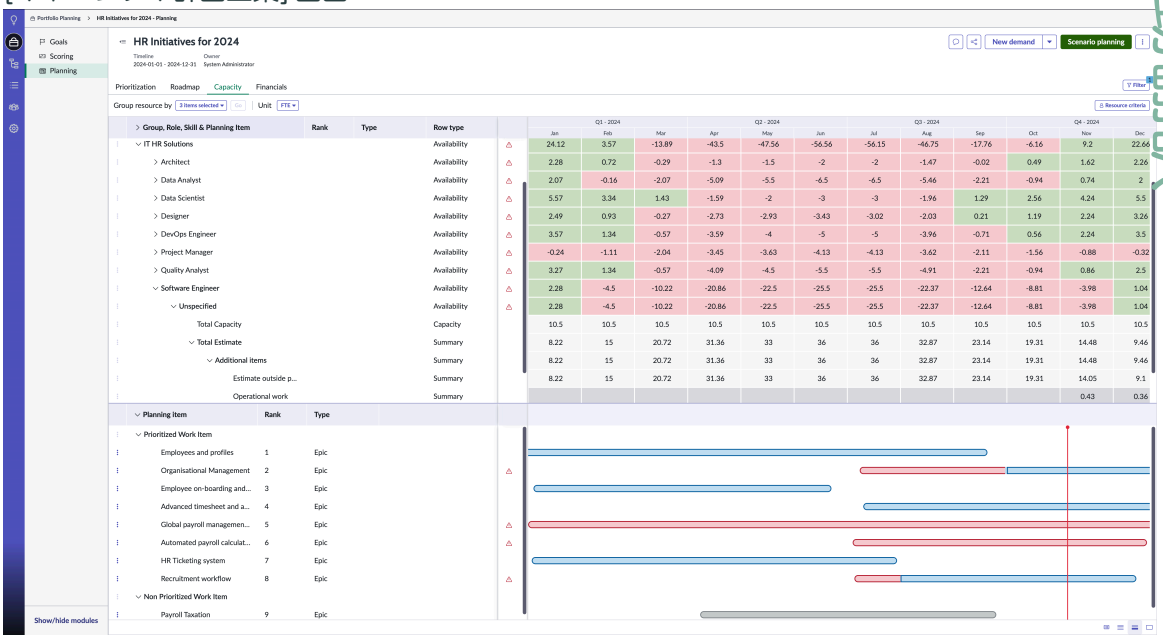

- 画面の上部トレイには、以下が表示されます。
  - 定義されたリソース基準に応じたリソースキャパシティの詳細
  - 期間の割り当ての詳細
  - プライマリ属性でグループ化されたリソース
- 画面の下部トレイには、以下が表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 優先順位付けされた計画立案アイテム
- 計画立案アイテムの期間でのインタラクティブなガントチャート

  ガントチャートバーをクリックすると、その特定の計画立案アイテムのキャパシティのみを表示できます。

  ガントチャートを移動して、リソースキャパシティの詳細を適宜調整できます。
- [キャパシティ計画立案] 画面のビューを調整するための切り替えオプション ()

プロジェクトとデマンドの財務計画立案

財務を計画、再予測、追跡し、プロジェクトとデマンドのベースラインを作成します。


財務ビューでは、会計期間全体の実際の経費と予定経費が簡素化されて表示されます。過去の会計期間の実績コスト、現在および将来の会計期間の計画コスト、四半期や年の合計、および総作業期間の合計を表示することで、最新のコスト概算を把握できます。

インターフェイスでは、コスト計画、経費ライン、ベースラインを作成できます。プロジェクトマネージャーまたは財務ユーザーは、次のことができます。

- [詳細] タブのシンプルな財務セクションを使用して、計画立案アイテムの大まかな財務予測を入力する。
- 計画経費および計画投資の大まかな見積もりを作成する。
- [財務] タブを使用して、計画コストの詳細なブレークダウンを作成する。
- 優先順位付けグリッド内のすべての計画立案アイテムについて、計画コスト、実績コスト、および予定利益のロールアップを表示します。
- [コスト] 画面から簡単にコスト計画の追加、編集、または削除。
- インライン編集機能を使用して、予定経費を再予測する。
- 計画立案アイテムの時間スコープ全体について、過去の実績コストと将来の計画経費を示す簡素化されたビューを表示する。
- 合計時間スコープと年次ブレークダウンについて、予測 (以前の EAC - 完了時の推定)、残りの見積もり (以前の ETC - 完了までの推定)、および各コスト計画の実績を表示することで、より優れた包括的なソリューションを取得します。
- グリッドのインライン編集機能を使用して四半期および年次の合計を直接更新することで、将来の会計期間の計画コストを再予測する。
- 組織用に構成された財務属性で分類された、計画立案アイテムのスコープ全体のリソースのアサインに応じて人件費の生成。属性ベースのマッピングの計画立案属性の詳細については、「Planning 属性の使用」を参照してください。
- 関連するコスト計画の詳細が事前入力されたサイドパネルから、コスト計画について簡単に経費ラインの追加または編集。
- [新しい経費ライン (New expense line)] サイドパネルを使用して予定外の経費を記録する。
- 財務ベースラインを作成して比較し、計画立案アイテムの財務を追跡する。
- 財務ベースラインを作成し、ベースラインの比較機能を使用して、最新のコスト (過去の会計期間の実際の経費と、現在および将来の会計期間の計画コスト) を当初の予測計画コストと比較する。
- 財務ベースラインを手動または自動でキャプチャして、コストの差異の原因と、いつ発生したかを経時的に分析する。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

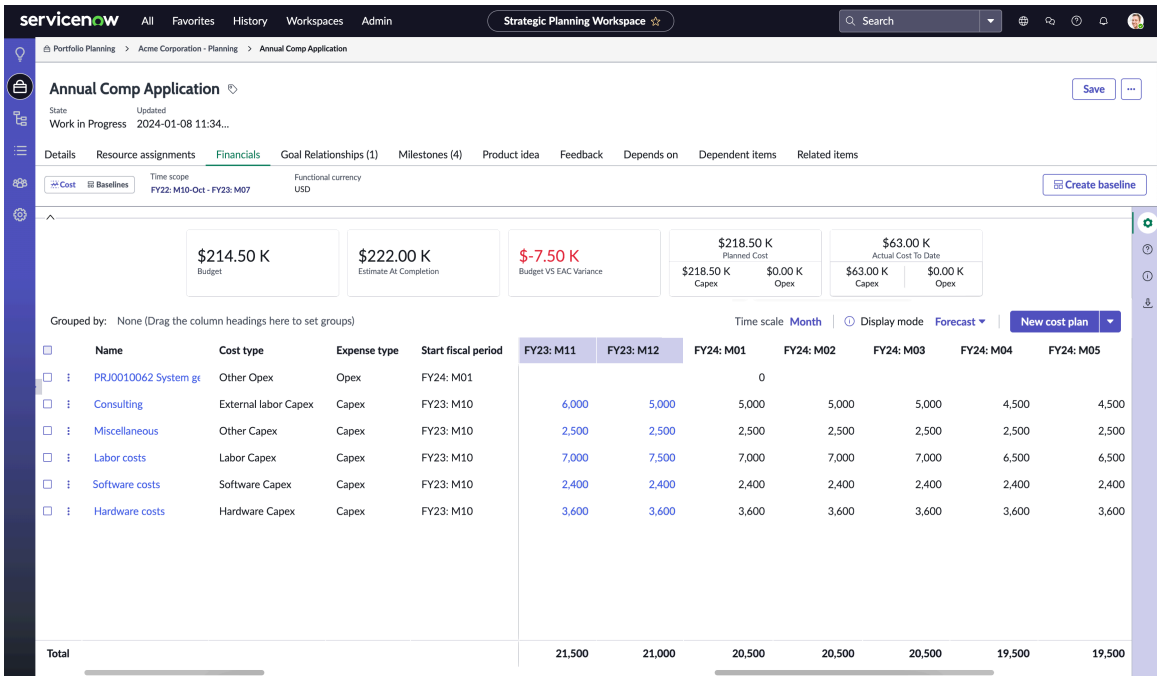

[財務] 画面では、以下の情報を表示できます。

- 時間スコープ:計画立案アイテムまたはコスト計画の期間のうち、会計期間の範囲が大きい方。
- 機能通貨:財務の計算に定義および使用される通貨。
- 割り当てられた予算、予測 (以前の EAC - EAC - EAC)、差異 (予算と予測の差)、計画コストのブレークダウン、原価費目別の実績など、さまざまな財務情報を表示するカスタマイズ可能なウィジェット。

  注:
  「予算」および「予算と EAC の差異」ウィジェットは、デマンドとプロジェクトでのみ使用できます。

- タイムスケール:財務を表示するための期間ブレークダウン。デフォルト値は、会計カレンダータイプに応じて [月]/[期間] に設定されます。
- 表示モード:さまざまなモードを切り替えるオプションを一覧表示して、財務の焦点を絞ったビューを取得します。
- 人件費の生成:リソースのアサインに応じて計画立案アイテムの計画人件費を生成または更新するためのワンクリックソリューション。

  注:
  このオプションは、リソースがアサインされているプロジェクトでのみ有効になります。

- このペインには、名前、原価費目、経費タイプ、統計会計期間、会計期間の終了、合計計画コスト、従業員タイプ、およびロールが表示されるコスト計画属性が表形式で表示されます。これらのフィールドはカスタマイズできます。詳細については、「財務の左ペインビューのカスタマイズ」を参照してください。
- 右側のペインでは、選択した時間スコープ期間の実績、予測、および残りの推定の合計を表示できます。過去の会計期間のコスト計画に対する実際の経費、現在の会計年度の実績、予測、および残りの見積もり、および現在および将来の会計期間の計画コスト。

  注:
  経費タイプを簡単に識別して区別できるように、実績と計画のヘッダー行が異なる色分けされています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 新しいコスト計画:エンティティの新しいコスト計画を作成するための簡素化されたサイドパネルが開きます。
- テーブルの左ペインの列をカスタマイズするためのカスタマイズオプション。
- コストまたはベースライン比較を Microsoft Excel または CSV ファイルとしてダウンロードするためのエクスポートオプション。

のダッシュボード ポートフォリオ計画ワークスペース

製品およびポートフォリオマネージャーは、 ポートフォリオ計画ワークスペース ダッシュボードを使用して、パフォーマンスを監視し、進捗状況を追跡し、計画と実行に関連する情報に基づいた意思決定を行います。これらのダッシュボードでは、 プラットフォームアナリティクス を活用して履歴データの傾向と定期的なレポートを提供します。

実行ダッシュボードは、次の ポートフォリオ計画ワークスペースで利用できます。

デフォルトのダッシュボードを使用するか、独自のダッシュボードを作成して、パフォーマンスを監視し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

ダッシュボードのメリット

- データの可視化を作成し、 プラットフォームアナリティクス エクスペリエンスを使用してダッシュボードに追加します。
- パフォーマンスを監視し、進捗状況を追跡し、計画と実行に関連する情報に基づいた意思決定を行います。
- 既存のダッシュボードを複製し、すぐに利用可能なダッシュボードを変更することなく、必要に応じてカスタマイズします。
- すぐに利用可能なダッシュボードを使用するか、必要に応じて独自のダッシュボードを構成します。
- ステークホルダーとダッシュボードを共有してコラボレーションを可能にします。
- ダッシュボード内で直接フィルターを適用して、関連データを表示します。
- 適用されたフィルターは、ユーザーのカスタマイズの一部として保存され、次回ログインするときに使用できます。

ポートフォリオ計画ワークスペースダッシュボードの使用と管理に関するガイダンスについては、「でのダッシュボードの使用 ポートフォリオ計画」を参照してください。

他の **ServiceNow®** アプリケーションとうまく併用する

ポートフォリオ計画を他のServiceNow® アプリケーションと統合することで、ポートフォリオマネージャーとプロダクトマネージャーは製品の計画、コラボレーション、およびリリース管理を最適化できます。

コラボレーションワーク管理 による ポートフォリオ計画

ServiceNow® コラボレーションワーク管理 (CWM) とポートフォリオ計画の統合により、ポートフォリオ計画でボードを使用して計画とロードマップを作成できます。CWMボードをレンズ構成に追加することで、ポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページと [ロードマップ] ページで計画立案アイテムとしてアクセスできます。

CMW ボードを計画立案アイテムとして構成するためにサポートされているレンズは、組織とプロジェクトポートフォリオです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CWM と ポートフォリオ計画 の統合の詳細については、「戦略的計画または CWMの接続ポートフォリオ計画」を参照してください。

ポートフォリオ計画の構成

ポートフォリオ計画 を設定して製品マネージャーやポートフォリオマネージャーが作業事業達成目標を調整するのに必要なプロセスについて説明します。

構成ワークフロー

ポートフォリオ計画 をセットアップするプロセスの指針として、次のステップを使用してください。これらのステップの中には、admin ロールが必要なものと、sn_line_core.apw_admin ロールが必要なものがあります。

1. ポートフォリオ計画 のインストール。
2. ユーザーロールをアサインします。

   「ポートフォリオ計画 とともにインストールされるコンポーネント」にある「インストールされるロール」テーブルを参照してください。

   > **注:**
   > 古いバージョンからポートフォリオ計画 v6.1.1 以降にアップグレードする場合は、roadmap_editor ロールが使用されなくなるため、milestone_editor ロールを roadmap_editor ロールから削除するための修正スクリプトが実行されます。この場合、ServiceNow インスタンスに roadmap_editor ロールを持つ多数のユーザーがいると、アップグレードが完了するまでに時間がかかることがあります。詳細については、「KB1443618」を参照してください。

3. ポートフォリオ計画を有効にするには、レンズを設定します。

   「ポートフォリオ計画 でのレンズの設定」を参照してください。

4. ServiceNow® ポートフォリオ計画 を プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) と統合します。

   「プロジェクトポートフォリオ管理 による ポートフォリオ計画」を参照してください。

5. キャパシティ計画立案を構成し、リソースキャパシティを生成します。

   「のキャパシティ構成 ポートフォリオ計画」を参照してください。

6. エピックの財務計画立案を有効にし、[財務] 画面ビューをカスタマイズします。

   「ポートフォリオ計画 の財務の構成」を参照してください。

ポートフォリオ計画 を構成するためのガイド付きセットアップ

ガイド付きセットアップには一連のタスクがあり、ServiceNow のインスタンスで必要な設定を行うのに役立ちます。ポートフォリオ計画をインストールした後、次の場所に移動します: すべて > > ポートフォリオ計画 > ガイド付きセットアップ.

ガイド付きセットアップからタスクを設定する場合は、[ヘルプを表示] アイコン ( ) をクリックすると、追加のガイダンスのアプリ内ヘルプを起動できます。

ポートフォリオ計画 のインストール

アドミンロールを持っている場合は、ポートフォリオ計画 アプリケーション (sn_align_ws) をインストールできます。このアプリケーションには、デモデータが含まれています。まだインストールさ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

れていない場合は、関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインをインストールします。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション.
- 依存関係、ライセンスやサブスクリプションの要件、およびリリースの互換性については、ServiceNow Store の ポートフォリオ計画 アプリケーションリストを確認してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

ポートフォリオ計画 とともに次のアイテムがインストールされます。

- ロール
- テーブル

詳細については、「ポートフォリオ計画 とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して、ポートフォリオ計画 アプリケーション (sn_align_ws) を検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることがあります。

   [インストール] ボタンの横のリストに、使用可能なバージョンが表示されます。
3. リストからバージョンを選択し、[インストール] を選択します。

   表示される [インストールの詳細を確認] ダイアログボックスに、アプリケーションとともにインストールされている依存関係が一覧表示されます。
4. プロンプトが表示された場合は、ServiceNow Store へのリンクに従って、依存関係のエンタイトルメントを取得します。
5. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。
   デモデータには、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードが含まれています。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。
6. **[Install** (インストール)] を選択します。

タスクの結果

以下のコンポーネントは、ポートフォリオ計画 アプリケーションのインストール時にインストールされます。

- ロール
- テーブル

詳細については、「ポートフォリオ計画 とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


ポートフォリオ計画 でのレンズの設定

会社の計画プロセスを表すレンズを設定できるように、ポートフォリオ計画 での レンズの構造と事前定義されたレンズについて説明します。

レンズ構造

ポートフォリオ計画 内の各レンズは、 レンズエンティティで構成される構造で構成されます。これらのエンティティは、さまざまなレベルの計画を表します。計画マネージャーは、これらのレベルのいずれかでポートフォリオ計画をビルドし、このレンズに関連付けられている作業アイテムのタイプの計画を作成できます。

レンズ構造の例

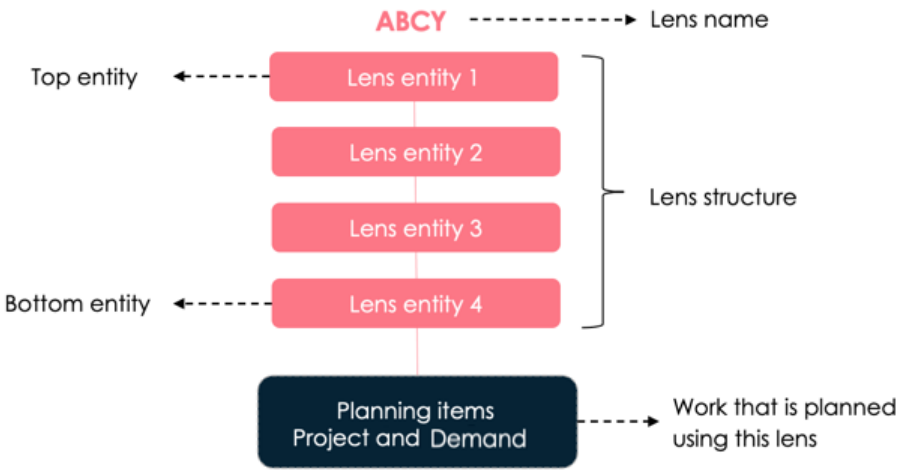

ポートフォリオ計画 の事前定義されたレンズ


組織とプロジェクトポートフォリオの 2 つの事前定義されたレンズを使用できます。

たとえば、組織レンズには、エンティティとして [会社]、[事業部門]、および [部門] があります。部門長は部門レベルでポートフォリオ計画を作成し、部門の作業の優先順位付けとロードマップを開始できます。この作業は、プロジェクト、デマンド、または構成されたその他のカスタムタイプの形式にすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

事前定義されたレンズのレンズ構造

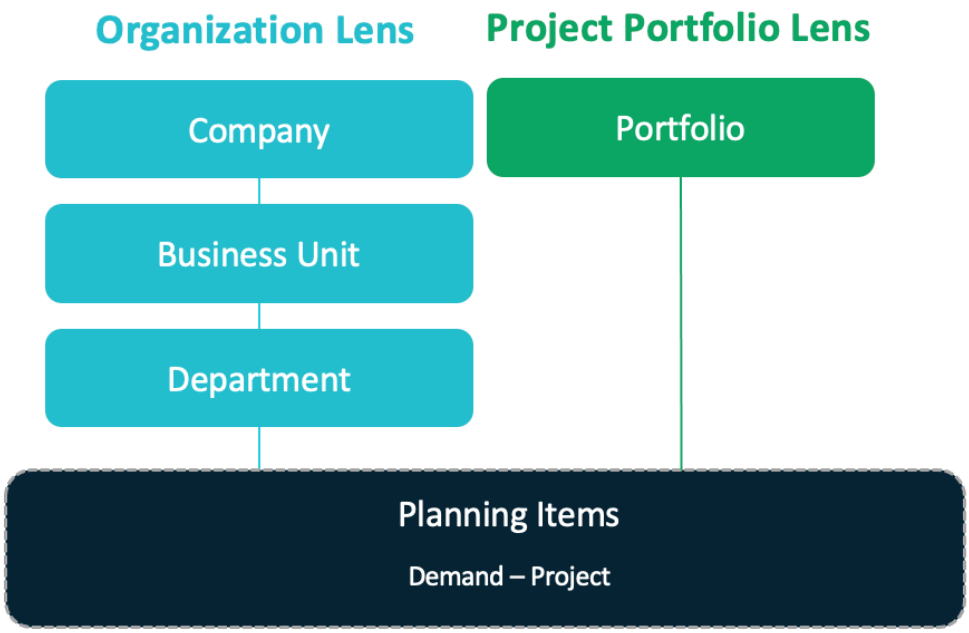

ポートフォリオ計画 ワークスペースで、計画立案マネージャーは、事前定義されたいずれかのレンズを使用してポートフォリオ計画の作成を開始できます。

レンズの計画立案アイテム

レンズを使用してビルドするすべてのポートフォリオ計画について、そのレンズに含まれるアイテムタイプのみが計画に使用できます。たとえば、レンズ XYZ にデマンドのみが追加されているとします。この場合、XYZ レンズを使用してビルドされる任意のポートフォリオ計画では、デマンドの形式のみで作業を計画できます。

レンズとレンズ構造の構成

事前定義されたレンズをそのまま使用することも、既存の構成を更新することもできます。

- レンズをそのまま使用するには、ServiceNow プロジェクトポートフォリオ管理 との統合を設定して、レンズのセットアップを完了します。

  「ポートフォリオ計画 と PPM の統合」を参照してください。

- レンズ構成を更新するには、以下を実行します。
  - レンズ内に含まれる計画立案アイテムを変更します。「レンズフォーム」を参照してください。
  - さらにエンティティをレンズ構造に追加します。「ポートフォリオ計画 のレンズ構造の変更」を参照してください。

ポートフォリオ計画 のレンズ構造の変更

計画マネージャーが ポートフォリオ計画 でポートフォリオ計画の作成を開始できるように、レンズ構造のエンティティを追加または変更します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


始める前に
アプリケーションスコープが [ポートフォリオ計画コア **(Portfolio Planning Core)**] に設定されていることを確認します。

必要なロール：admin

このタスクについて
レンズの場合は、エンティティを追加して既存の構造を変更します。最大 6 つのエンティティをレンズ構造に追加できます。レンズとその構造の詳細については、「ポートフォリオ計画 でのレンズの設定」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > ポートフォリオ計画 > レンズ.
2. [レンズ] リストから、レンズ構造を更新するレンズを選択します。
3. エンティティをレンズ構造に追加します。
   a. [レンズ構造] 関連リストから、[新規] を選択します。
   b. フォームのフィールドに入力します。
      フィールドの詳細については、「レンズ構造フォーム」を参照してください。
   c. [送信] を選択します。
4. ステップ 3 を繰り返して、すべてのレンスエンティティの追加を完了します。
   - トップダウン方式でエンティティを追加します。
     最初にトップレベルのエンティティを追加し、次に第 2 レベルのエンティティを追加し、その後に 3 番目のエンティティを追加します。
   - トップレベルを除くすべてのエンティティに親エンティティ参照があることを確認します。
     たとえば、第 2 レベルのエンティティは、トップレベルのエンティティを親として参照する必要があります。

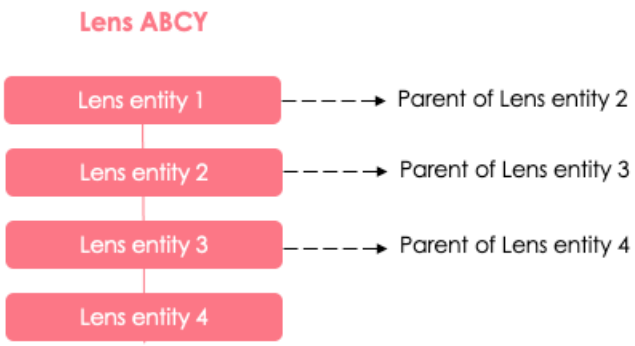

次のタスク

1. 計画立案アイテムテーブル [sn_align_core_planning_item] にこのレンズの下部エンティティを参照するフィールドがあることを確認します。
2. レンズに関連付けられているすべての計画立案アイテムタイプの次のフォームビューに、レンズ構造の下部エンティティのフィールドが含まれていることを確認します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- APW プレビュー
- APW 新規
- APW デフォルト

3. このレンズに関連付けるすべての計画立案アイテムタイプのテーブルのロードマップ構成を更新します。

   このレンズ構造の下部エンティティとその親を [フィールド別にグループ化]と [フィールド別の色] に追加します。これらのフィールドは、ポートフォリオロードマップのデフォルトのグループ化基準および色分け基準設定として使用されます。「ポートフォリオ計画ワークスペースでの優先順位付けとロードマップの計画立案アイテムの表示設定のカスタマイズ」を参照してください。

4. レンズ構成を検証してアクティブ化します。「ポートフォリオ計画 でレンズをアクティブ化」を参照してください。

ポートフォリオ計画 でレンズをアクティブ化

計画マネージャーがこのレンズを使用してポートフォリオ計画の作成を開始できるように、レンズ構成を検証して有効にします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
既存のレンズの構造を変更した場合、その構成を検証し、そのステータスを [アクティブ] に設定します。

計画マネージャーは、アクティブなレンズのみを使用してポートフォリオ計画を作成できます。計画マネージャーのワークスペースでレンズを使用できるようにするには、その構成が有効であり、[アクティブ] ステータスである必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > ポートフォリオ計画 > レンズ.
2. [レンズ] リストから、レンズを選択します。
3. [レンズ] フォームで、[レンズの検証] 関連リンクをクリックします。

   - 構成が有効な場合は、有効化できることを示す成功メッセージが表示されます。
   - レンズ構成が有効でない場合は、エラーメッセージを使用して問題を理解し、構成を修正します。

     関連リンクを使用して、再度レンズを検証してください。

4. [アクティブ] フィールドを選択し、フォームを保存します。

関連情報

ポートフォリオ計画 のレンズ構造の変更

ポートフォリオ計画 の [優先順位付け] ページの追加列の設定



ポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページにどの列を表示する必要があるかを構成して、計画マネージャーが、適切なデータポイントを選択できるようにします。

ポートフォリオマネージャーまたはプロダクトオーナーは、ワークスペースの [優先順位付け] ページにある [カスタマイズ] サイドパネルを使用して、計画立案アイテムのデータを表示したり非表示

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

にしたりすることができます。デフォルトでは、リストビューおよび階層ビューのこのサイドパネルには、その計画立案アイテムで利用可能なすべてのデフォルトフィールドが表示されます。たとえば、計画マネージャーが追加の列を表示する場合は、ドット連結フィールドからの情報が必要になる可能性があります。このような場合、または既存の選択肢を削除するには、アドミンロールを使用して設定できます。

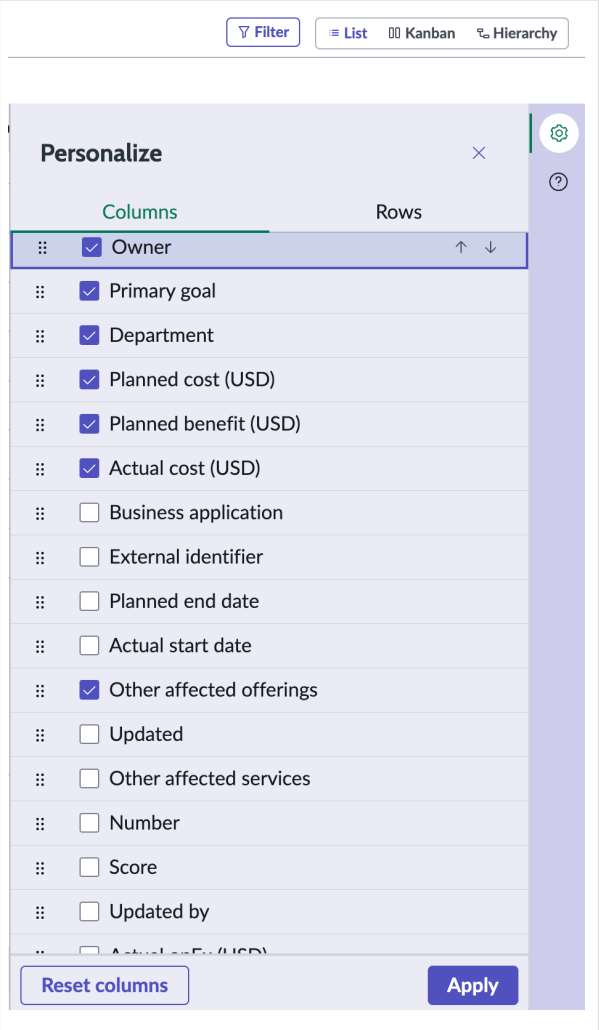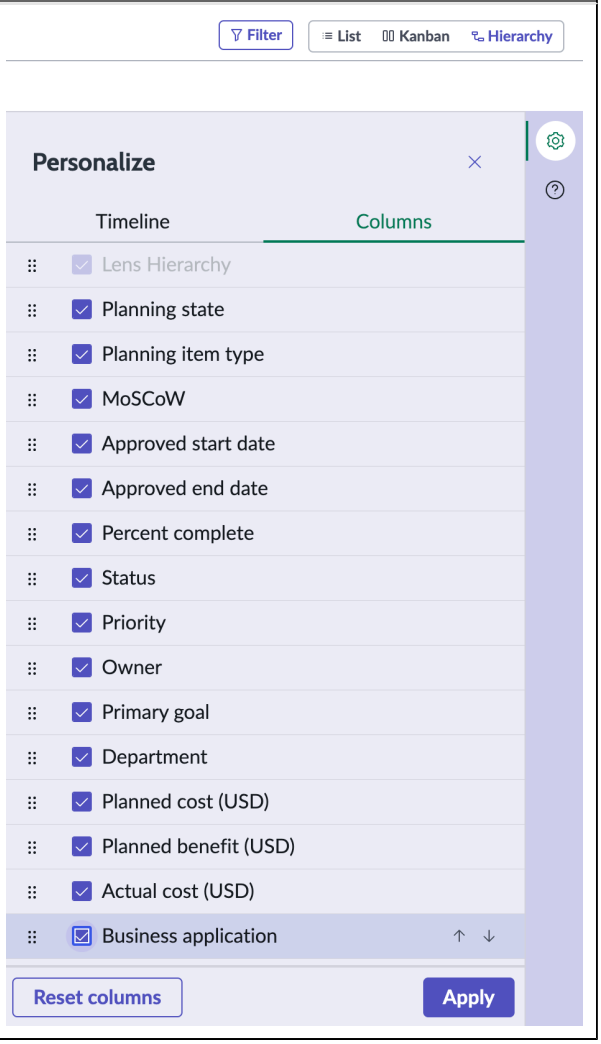リストビューの設定をカスタマイズする	階層ビューの設定をカスタマイズする
	

このサイドパネルに追加の列を選択肢として追加するか、ポートフォリオ計画に関連付けられた計画立案アイテムタイプのリストレイアウト構成を更新して、デフォルトの列の選択肢を削除します。

- ポートフォリオ計画に複数のアイテムタイプが関連付けられている場合は、計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] テーブルのビュー構成を更新します。
- ポートフォリオ計画に単一のアイテムタイプが関連付けられている場合、関連するテーブルのビュー構成を更新します。

識別されたテーブルのフォームビューから、ビューを **[APW の優先順位付け]** に変更し、リストレイアウトを更新します。リストレイアウト構成を更新する詳細な手順については、「リストのレイアウトの構成」を参照してください。

注:
リスト v3 は、新しい展開では使用できなくなりました。既にリスト v3 を使用している場合は引き続き使用できますが、この場合、一部の機能が利用できない可能性があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポートフォリオ計画 での優先順位およびロードマップ設定の構成

関連する情報を計画立案マネージャーが表示できるように、ワークスペースの [優先順位付け] ページと [ロードマップ] ページでのデータの表示方法を構成します。

ポートフォリオ計画 ワークスペースの優先順位付けページのハイライト表示されたフィールドのカスタマイズ

計画マネージャーのニーズに応じて、ポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページで強調表示されるフィールドをカスタマイズします。

デフォルトでは、ポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページのリストビューおよび階層ビューで、計画立案アイテムの [計画ステータス] および [ステータス]フィールドが色付きでハイライト表示されます。計画立案マネージャーの要件に基づいて、 [所有者] または [優先度] などの選択肢タイプのフィールドを、ページ上でのハイライト表示される列になるように構成できます。このカスタマイズでは次を行う必要があります。

- 優先順位付けビュー [スクリプトインクルード] (リストビューの場合は APWBacklogConfigImpl、階層ビューの場合は APWGanttConfigImpl) の変更
- sys_highlighted_value テーブルの必須フィールドに対する新しいレコードの設定

ポートフォリオ計画 で [優先順位付け] ページのスクリプトインクルードを変更

[優先順位付け] ページのリストビューと階層ビューのスクリプトインクルードを変更して、ワークスペースのこれらのビューでハイライト表示される列を変更します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード.
2. リストから、次のいずれかを選択します。
   - リストビューの場合は、[APWBacklogConfigImpl] を選択します。
   - 階層ビューの場合は、[APWGanttConfigImpl] を選択します。
3. スクリプトインクルードの [スクリプト] フィールドの列名を更新します。

   `getColumnsForHighlightedValues` 関数で、戻り値を目的の列に更新します。

   たとえば、[優先度] 列を強調表示する場合は、戻り値を `("planning_state", "state", "priority")` に更新します。
4. **[Update** (更新)] を選択します。

次のタスク

ポートフォリオ計画 の [優先順位付け] 列でハイライト表示される新しい値の作成

ポートフォリオ計画 の [優先順位付け] 列でハイライト表示される新しい値の作成

計画マネージャーのニーズに応じて、ポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページで強調表示されるフィールドをカスタマイズします。

始める前に

ポートフォリオ計画 で [優先順位付け] ページのスクリプトインクルードを変更。

必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペースエクスペリエンス > アドミニストレーション > ハイライト表示される値.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「ハイライト表示される値フォーム」を参照してください。
4. フォームを保存します。
5. [ハイライト表示される値の条件] 関連リストで、ワークスペースでハイライト表示する各フィールド値の色、順序、およびアイコンを構成するレコードを作成します。

   a. [新規] を選択します。

   b. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「ハイライト表示される値の条件フォーム」を参照してください。

   c. [送信] を選択します。

6. ステップ 5 を繰り返して、すべてのフィールド値に対してこの構成を完了します。
   たとえば、[ステータス] 列を設定している場合、 [ハイライト表示される値の条件] 関連リストで、選択肢の [赤]、 [緑]、[黄] のそれぞれに対して 3 つのレコードを作成する必要があります。
7. **[Update** (更新)] を選択します。

でのマイルストーンアイコンのスクリプトインクルードの変更 ポートフォリオ計画ワークスペース

ロードマップおよびポートフォリオ計画のマイルストーンアイコンのスクリプトインクルードを変更して、ワークスペースの [ロードマップ] タブに表示されるアイコンをカスタマイズします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード.
2. リストから [RoadmapMilestoneAPIImpl] を選択します。
3. スクリプトインクルードの スクリプト フィールドでマイルストーンアイコンタイプを更新します。
   `getMilestoneMetadata` メソッドで、戻り値を必要なアイコンに更新します。


   たとえば、主要なイベントマイルストーンに円の感嘆符アイコン (ⓘ を表示する場合は、key_eventマイルストーンの戻り値を 「circle-exclamation-outline」 に更新します。

   デフォルトのアイコンは次のとおりです。

   - key_event: 'flag-fill'
   - launch_date: 「ロケットシップ・フィル」
   - important_date: 'calendar-clock-fill'
   - key_milestone: 「ダイヤモンドフィル」
   - 締め切り: 「スターフィル」

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

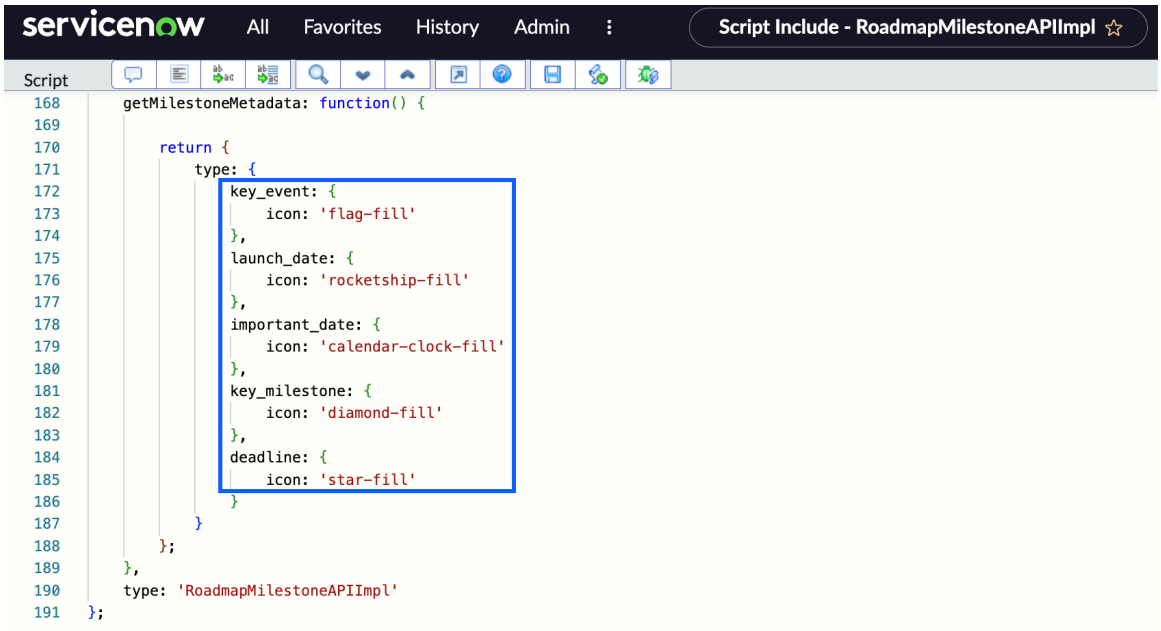

4. **[Update** (更新)] を選択します。

ポートフォリオ計画 でのフリーフォームロードマップに対する追加のソーステーブルの構成

ロードマップ設定に新しいテーブルを追加して詳細を設定し、ポートフォリオ計画 でのフリーフォームロードマップの作成時にこれらのテーブルをソーステーブルとして使用できるようにします。

始める前に

ポートフォリオ計画 のインストール。

必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

手順

1. 移動先 すべて > ポートフォリオ計画 > ポートフォリオ計画の構成.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「[ポートフォリオ計画の構成] フォーム」を参照してください。
4. [送信] を選択します。

ポートフォリオ計画ワークスペースでの優先順位付けとロードマップの計画立案アイテムの表示設定のカスタマイズ

ソーステーブル構成を更新して、ビジネスの優先度に従って ポートフォリオ計画 でロードマップビューをカスタマイズできるようにします。

始める前に

ポートフォリオ計画 のインストール。

必要なロール：sn_roadmap_plng.roadmap_admin or sn_align_core.apw_admin

このタスクについて

ポートフォリオ計画またはフリーフォームロードマップの作成に使用するソーステーブルについて、構成を変更します。フィールドを更新して、ロードマップ上のアイテム、またはアイテムごとに表示されるメトリクスなどをグループ化して色分けすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ポートフォリオ計画 > ポートフォリオ計画の構成.
2. 構成を編集するテーブルを開きます。
3. 必須フィールドを編集します。
   フィールドの詳細については、「[ポートフォリオ計画の構成] フォーム」を参照してください。
4. [更新] を選択します。

ポートフォリオ計画 での優先順位付けおよびロードマップに対するアイテムの表示制限の更新

[優先順位付け] ページ、[ロードマップ] ページ、および ポートフォリオ計画 の ロードマップビュー のアイテムマイルストーンに表示されるアイテムの表示制限を更新するシステムプロパティを作成します。

始める前に
インスタンスのアプリケーションスコープが [グローバル] に設定されていることを確認します。

必要なロール：admin

このタスクについて
[優先順位付け] ページと [ロードマップ] ページのデフォルトの表示制限は、次のとおりです。

- 優先順位付けビューに表示される計画立案アイテム = 250
- ロードマップビューに表示されるロードマップアイテム = 250
- ロードマップビューのアイテムレベルのマイルストーン = 100
- すべてのカンバンビューに表示されるアイテム = 250

合計数がこれらのデフォルト制限を超えた場合、追加の数の計画立案アイテムとマイルストーンインジケーター、および垂直レーンは、ワークスペースに表示されません。このデフォルト設定を上書きするには、システムプロパティを作成し、その値を目的の表示制限値に設定します。

重要:
システムプロパティの値がデフォルト値を超えると、UI のパフォーマンスが低下する可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > すべてのプロパティ.
   システムプロパティ [sys_properties] テーブル内の全プロパティのリストが表示されます。
2. [新規] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。
   その他のフォームフィールドの詳細については、「システムプロパティの追加」のフィールド説明テーブルを参照してください。
4. [送信] を選択します。

ポートフォリオ計画 の階層ビュー構成

システムプロパティを構成することで、上位レベルおよび通常のポートフォリオ計画の階層ビューに表示される計画立案アイテムの親レコードを表示または非表示にします。

階層ビューに空の親エンティティを表示する


[優先順位付け] タブの階層ビューでは、関連付けられた計画立案アイテムがある場合にのみ、親レコードが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

たとえば、組織レンズ ([会社] > [事業部門] > [部門]) から作成されたポートフォリオ計画は、デマンドとプロジェクトの計画を管理および追跡するために使用されます。そのため、優先順位付け階層ビューに切り替えると、少なくとも 1 つのデマンドまたはプロジェクトが関連付けられている部門のみがビューに表示されます。

このポートフォリオ計画に含まれていても、計画立案アイテムが関連付けられていない他の部門を表示する場合は、アドミニストレーターと協力してシステムプロパティ *sn_align_ws.gantt_hide_empty_entities* を作成し、それを **false** に設定します。

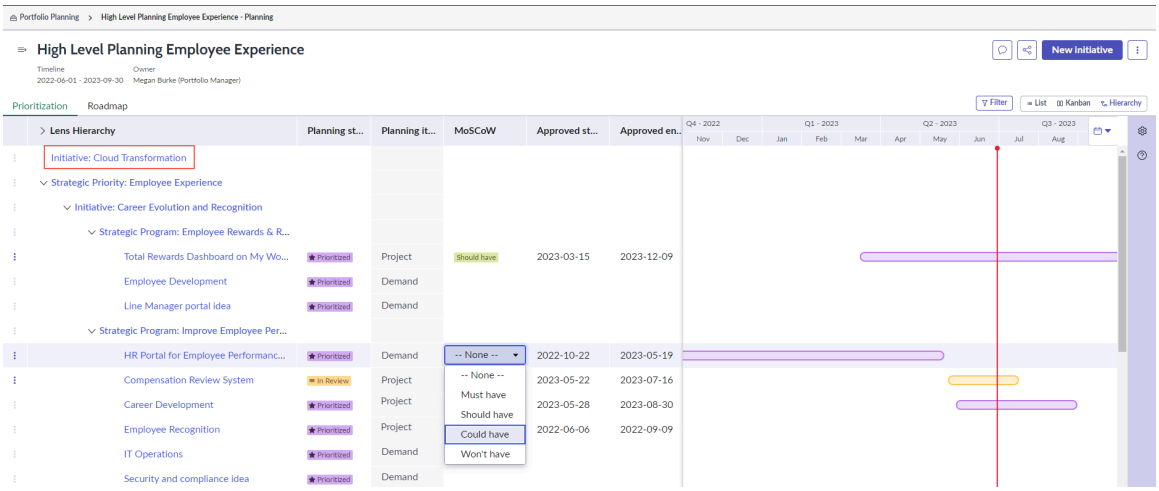


上位レベルのポートフォリオ計画の完全な階層を表示する

上位レベルのポートフォリオ計画の場合、階層ビューにはデフォルトで親レベルまでの階層のみが表示されます。

たとえば、戦略的投資レンズ ([会社] > [戦略的優先事項] > [イニシアチブ] > [戦略的プログラム]) から作成されたポートフォリオ計画は、戦略的プログラムの計画を管理および追跡するために使用されます。そのため、優先順位付け階層ビューに切り替えると、デフォルトでは [戦略的優先事項] > [イニシアチブ] レベルのみが表示されます。

戦略的優先事項>イニシアチブ>戦略的プログラム>計画立案アイテムの階層全体を表示する場合は、アドミニストレーターと協力してシステムプロパティを作成します **true**.

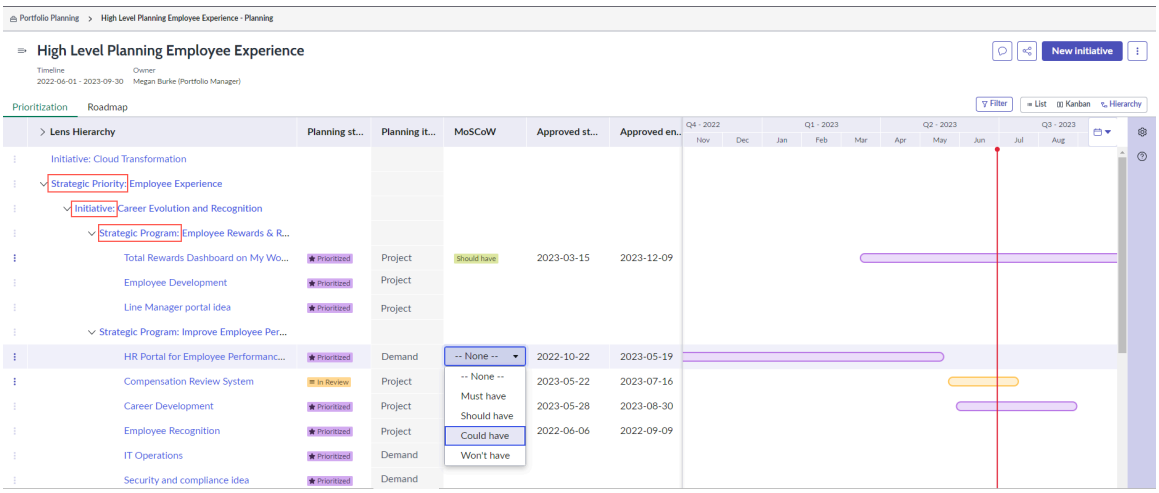

ポートフォリオ計画 ワークスペースでのリストのカスタマイズ

ポートフォリオ計画ワークスペースの [リスト] メニューにカスタムテーブルを追加し、新しく作成されたカテゴリとリストへのアクセスを管理できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リストをカスタマイズし、ポートフォリオ計画ワークスペースの [リスト] ページで新しく作成されたカテゴリとリストへのアクセスを管理するには、次のタスクを実行します。

- [新規] ボタンを [APW リストメニュー構成 (APW List Menu Configuration)] ページに追加します。詳細については、「リストメニューへのカスタムテーブル追加の有効化」を参照してください。
- [リスト] メニューにカスタムテーブルを追加します。詳細については、「ポートフォリオ計画 ワークスペースでのリストのカスタマイズ」を参照してください。
- [リスト] ページで新しく作成されたカテゴリとリストを表示できるユーザーを管理します。詳細については、「ポートフォリオ計画 での新しいリストの対象者を定義」を参照してください。

リストメニューへのカスタムテーブル追加の有効化

[APW リストメニュー構成 (APW List Menu Configuration)] ページに [新規] アクションボタンを追加して、ポートフォリオ計画ワークスペースのリストメニューにカスタムテーブルを追加できるようにします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ワークスペースエクスペリエンス > アクション **&** コンポーネント > リストアクション.
2. [アクションのアサイン] ページで、[新規] を選択してアクションボタンを作成します。
3. フォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「アクションのアサインフォーム」を参照してください。
4. [送信] を選択します。

タスクの結果
[新規] アクションボタンを [APW リストメニュー構成 (APW List Menu Configuration)] ページに追加します。

次のタスク
ポートフォリオ計画 ワークスペースでのリストのカスタマイズ。

ポートフォリオ計画 ワークスペースでのリストのカスタマイズ

ポートフォリオ計画 ワークスペースの [リスト] メニューにカスタムテーブルを追加します。

始める前に
必要なロール：admin

- アプリケーションスコープが **[Portfolio Planning]** に設定されていることを確認します。
- リストメニューへのカスタムテーブル追加の有効化。

このタスクについて
ワークスペースホームページの [リスト] メニューは、計画マネージャーが必要なレコードをすばやく見つけるのに役立ちます。デフォルトでは、このビューには、この ServiceNow インスタンスで利用可能なすべての計画立案アイテムとレンズのエンティティのリストが表示されます。計画マネージャーがさらにカテゴリまたはリストを必要とする場合は、追加できます。

ワークスペースでのリストの構成の詳細については、「リスト」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. **sys_ux_list_menu_config.list** に移動します。
2. [UX リストメニュー構成] リストから、**[APW** リストメニュー構成] を選択します。
3. 新しいカテゴリまたは新しいリストを選択します。

   ヒント:
   最初にカテゴリを作成してから、リストを作成します。

4. フォームのフィールドに入力します。
   - UX リストカテゴリフォーム。
   - UX リストフォーム。
5. [送信] を選択します。
   すべてのカスタムカテゴリとリストを作成するまで、この手順を繰り返します。

ポートフォリオ計画 での新しいリストの対象者を定義

ポートフォリオ計画 ワークスペースの [リスト] ページで新しく作成されたカテゴリとリストを表示できるユーザーを管理します。

始める前に
ポートフォリオ計画 ワークスペースでのリストのカスタマイズ。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 **sys_ux_applicability_m2m_list.list**.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「リスト適用性フォーム」を参照してください。
4. [送信] を選択します。

でのシナリオ計画の構成 ポートフォリオ計画

戦略的計画でシナリオ計画を構成して、複数のシナリオを作成および比較します。

1. シナリオ計画を有効または無効にします。

   詳細については、「ポートフォリオ計画でのシナリオ計画の有効化または無効化」を参照してください。

2. シナリオの比較ページで財務ウィジェットを管理します。

   比較ビューにウィジェットを追加および管理する方法の詳細については、「 比較シナリオでの財務ウィジェットの構成」を参照してください。

ポートフォリオ計画でのシナリオ計画の有効化または無効化

ポートフォリオ計画でシナリオ計画を有効化または無効化します。

始める前に
必要なロール：admin


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
シナリオ計画はデフォルトで有効です。次の手順を使用して、必要に応じてシナリオ計画を無効または有効にします。

手順

1. [すべて] > [システムプロパティ] に移動します。
2. *sn_align_ws.is_scenario_planning_disabled* プロパティを検索します。



3. プロパティの値を確認します。
   - シナリオ計画を有効にするには、プロパティが **[False]** に設定されていることを確認します。
   - シナリオ計画を無効にするには、プロパティが **[True]** に設定されていることを確認します。

次のタスク
シナリオの作成

比較シナリオでの財務ウィジェットの構成


既存のウィジェットを追加または管理して、シナリオを比較しながら財務インサイトを表示します。コストタイプから独自の属性を定義して、[シナリオを比較] ページで詳細を表示します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > ウィジェット.
2. [ウィジェット] リストで、[シナリオを比較] で [簡単な説明] をフィルタリングして既存のリストを表示します。

   デフォルトでは、シナリオの財務実績を比較するために 5 つの財務ウィジェットが有効になっています。



3. 既存のウィジェットを編集するか、シナリオ計画で使用するウィジェットを作成します。
4. **[Submit** (送信)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポートフォリオ計画 診断

計画立案マネージャーがプロジェクトとデマンドに優先順位を付け、ロードマップを作成する前に、診断スキャンを実行して、 ポートフォリオ計画 の構成およびその他の一般的な設定のエラーを識別して修正します。

ポートフォリオ計画 診断スキャンは、以下に対する構成を検証することで、不一致を見つけるのに役立ちます。

- レンズとレンズ構造
- 計画立案アイテムのフォームビュー、リストビュー、関連リストビュー、およびワークスペースビューのルール
- 計画立案アイテムのグローバルランク
- ポートフォリオ計画

ポートフォリオ計画で使用可能なデフォルトの診断スキャンは次のとおりです。

ポートフォリオ計画 診断

スキャンの名前	説明
グローバルランクのない計画立案アイテムを識別する	グローバルランクが設定されていない、[優先順位付けリスト] ページの計画アイテムの数を識別します。 このスキャンが失敗した場合、結果にはグローバルランクのない計画立案アイテムが表示されます。[修復スクリプトを実行] をクリックして、このフィールドが空のアイテムにグローバルランクを入力します。
計画立案アイテムのリストビューを検証	ポートフォリオ計画に追加できるすべての計画立案アイテムに、[APW の優先順位付け] および [APW のデフォルト] のリストビューがあることを検証します。 このスキャンが失敗した場合、結果には、特定の計画立案アイテムテーブルに欠落しているリストビューが表示されます。 これらの修正方法については、「Strategic Planning での新しい計画立案アイテムテーブルのリストビューの作成」を参照してください。
計画立案アイテムのフォームセクションビューを検証	ポートフォリオ計画に追加できるすべての計画立案アイテムに、[APW の優先順位付け]、[APW のデフォルト]、および [APW 新規] のフォームビューがあることを検証します。 このスキャンが失敗した場合、結果には、特定の計画立案アイテムテーブルに欠落しているフォームセクションビューが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スキャンの名前	説明
	これらの修正方法については、「戦略的計画 での新しい計画立案アイテムテーブルのフォームビューの作成」を参照してください。
計画立案アイテムの関連リストビューを検証	ポートフォリオ計画で許可されたすべての計画立案アイテムに、[APW のデフォルト] 関連リストビューがあることを検証します。 このスキャンが失敗した場合、結果には、特定の計画立案アイテムテーブルに欠落している関連リストビューが表示されます。 これらの修正方法については、「Strategic Planning での新しい計画立案アイテムタイプの関連リストビューの作成」を参照してください。
計画立案アイテムのデフォルトビューのワークスペースビュールールを検証	ポートフォリオ計画で許可されたすべての計画立案アイテムにデフォルトのビューのワークスペースビュールールがあることを検証します。 このスキャンが失敗した場合、結果には、特定の計画立案アイテムテーブルに欠落しているデフォルトの表示ルールが表示されます。 これらの修正方法については、「戦略的計画 の新規計画立案アイテムフォームに対するワークスペースビュールールの作成」を参照してください。
計画立案アイテムの APW デフォルトビューのワークスペースビュールールを検証	ポートフォリオ計画で許可されたすべての計画立案アイテムに APW デフォルトのビューのワークスペースビュールールがあることを検証します。 このスキャンが失敗した場合、結果には、特定の計画立案アイテムテーブルに欠落している APW デフォルトの表示ルールが表示されます。 これらの修正方法については、「戦略的計画 の新規計画立案アイテムフォームに対するワークスペースビュールールの作成」を参照してください。
ポートフォリオ計画構成の無効なフィールドの検証	既存のすべてのポートフォリオ計画のポートフォリオ計画構成レコード内の無効なフィールドを検索します。 このスキャンが失敗した場合は、[修復スクリプトの実行] をクリックして、特定された無効なフィールドを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スキャンの名前	説明
すべてのポートフォリオ計画のポートフォリオ計画構成の検証	インスタンスで作成された既存の各ポートフォリオ計画に有効なポートフォリオ計画構成があるかどうかを確認します。

のキャパシティ構成 ポートフォリオ計画

リソースの従業員プロファイルを生成し、それをプライマリ属性にマッピングして、キャパシティ計画立案を開始します。

- キャパシティの計画立案属性を有効にして、リソースを一意の属性にマッピングします。詳細については、「ポートフォリオ計画 でのキャパシティ計画立案の計画属性の有効化」を参照してください。
- リソースのアサインを作成し、従業員プロファイルを生成します。詳細については、「キャパシティ計画立案で作業するリソースの従業員プロファイルの生成」を参照してください。
- リソースを一意のグループ、ロール、およびスキルにマッピングして、従業員プロファイルを生成します。詳細については、「プライマリ属性をリソースにマッピング」を参照してください。

ポートフォリオ計画 でのキャパシティ計画立案の計画属性の有効化

リソースのキャパシティの詳細をフィルタリングして表示するには、計画属性の [グループ]、[スキル]、および [ロール] を有効にします。

始める前に
必要なロール：admin

注:
この有効化は、キャパシティ計画立案の計画属性を有効にするための 1 回限りのタスクです。


手順

1. 移動先 すべて > ポートフォリオ計画 > 計画立案属性.
2. [属性名] をフィルタリングして、[グループ] 属性を見つけて開きます。
3. [キャパシティ計画立案を有効にします] オプションを選択します。
4. [更新] を選択します。


注:
キャパシティ計画立案で属性が有効になっている場合、リソース管理ではその属性がデフォルトで有効になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

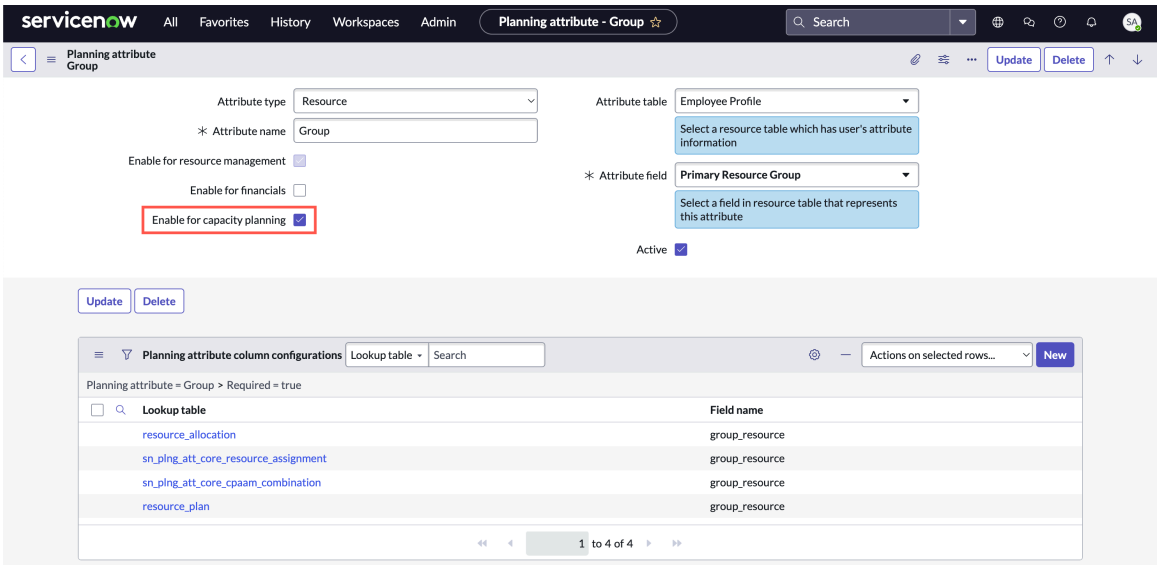

5. [スキル] 属性と [ロール] 属性について、ステップ 2 ~ 4 を繰り返します。

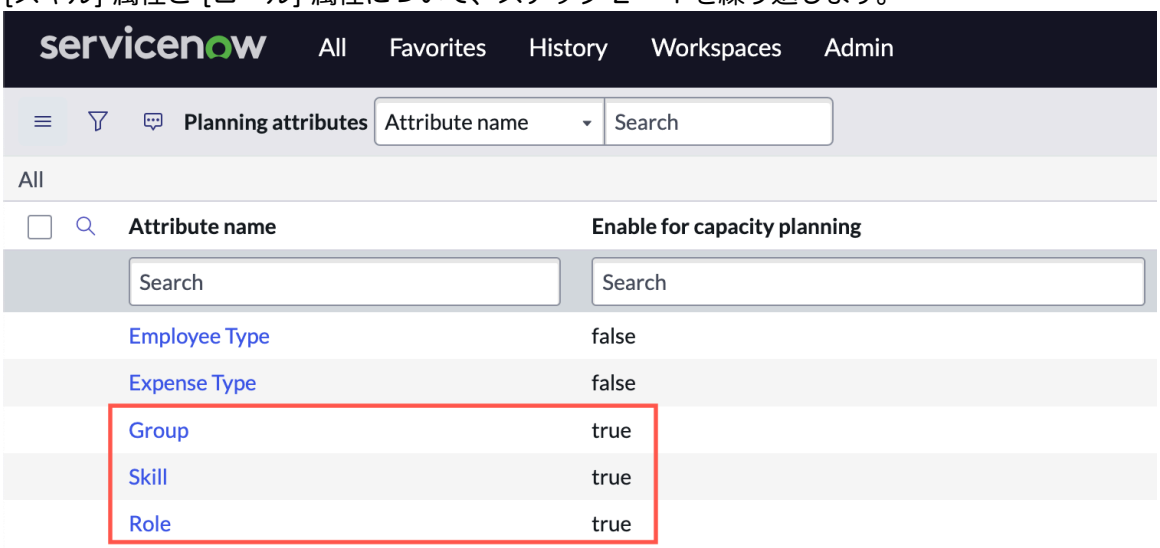

カスタム属性を作成してリソースにマップできます。詳細については、「計画立案属性の作成または編集」を参照してください。

6. [グループ]、[ロール]、および [スキル] フィールドの [キャパシティ計画立案を有効にします] 列の値を **true** に設定します。

キャパシティ計画立案で作業するリソースの従業員プロファイルの生成

プライマリ属性に対してマッピングするリソースの従業員プロファイルを生成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 従業員プロファイル > 従業員の定義.
2. 名前をフィルタリングして sys_user テーブルを見つけて開きます。
3. [従業員の定義] ページで、テーブルリストから [ユーザー] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 条件ビルダーを使用して必要なリソースをフィルタリングし、更新数アイコン ( ) を選択します。
5. [従業員プロファイルを生成] ( ) を選択します。
6. [従業員プロファイルを生成] ウィンドウで、[続行] を選択します。

タスクの結果
選択したリソースの従業員プロファイルが生成されます。

次のタスク
リソースのプライマリグループ、プライマリロール、およびプライマリスキルに従業員プロファイルを入力します。詳細については、「プライマリ属性をリソースにマッピング」を参照してください。

プライマリ属性をリソースにマッピング

既存の従業員プロファイルテーブルに関連付けられているリソースのプライマリグループ、プライマリロール、およびプライマリスキルを探してマッピングします。

始める前に
作業するリソースの従業員プロファイルの生成 キャパシティ。

必要なロール：admin

手順
1. 移動先 すべて > 従業員プロファイル > 従業員プロファイル.
2. [ユーザー] 列をフィルタリングして、従業員プロファイルを含むリソースを見つけて開きます。
3. [プライマリリソース属性を入力します] 関連リンクを選択すると、属性が自動入力されます。
   - 従業員が単一のグループ、ロール、およびスキルにアサインされている場合は、プライマリ属性が入力されます。
   - 従業員が複数のグループ、スキル、またはロールにアサインされている場合は、ルックアップアイコンを使用して、[プライマリリソースグループ]、[プライマリリソースロール]、および [プライマリリソーススキル] を選択します。
4. [更新] を選択します。

リソースキャパシティを自動的に生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化

スケジュール済みジョブをアクティブ化して、必要な頻度でリソースキャパシティを自動生成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順
1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [名前] フィールドをフィルタリングし、[リソースキャパシティの生成] を見つけて開きます。
3. [アクティブ] オプションを選択して、スケジュールジョブをアクティブにします。
4. [スケジュール済みスクリプト実行] フォームのフィールドを編集してジョブをカスタマイズし、要件を満たします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールドの説明とスクリプトの詳細については、「Automatically run a script of your choosing」を参照してください。

5. [今すぐ実行] を選択してスケジュール済みジョブを実行するか、[更新] を選択して変更を保存します。

ポートフォリオ計画 の財務の構成

ポートフォリオ計画 の計画立案アイテムの財務情報が表示されるように ServiceNow 内部統合を構成します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 作業アイテムへのリソースのアサインに基づいて財務で人件費を生成するように属性を構成します。
   詳細については、「Planning 属性の使用」と「計画立案属性の作成または編集」を参照。
2. デフォルトのマッピング構成を生成してテーブルマップを作成します。
   詳細については、「デフォルトのマッピング構成を生成」を参照してください。
3. ロールアップされた財務データを計画立案アイテムレベルで表示するための新しいウィジェットを作成します。
   詳細については、「ウィジェットの構成とプロジェクトへの関連付け」を参照してください。
4. オプション: 組織の要件に合わせて、[財務] 画面の左ペインをカスタマイズします。
   詳細については、「財務の左ペインビューのカスタマイズ」を参照してください。
5. 予算業務オプションを有効にして、計画立案アイテムの予算を割り当ておよび管理します。
   詳細については、「ポートフォリオ計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化」を参照してください。
6. 予算属性を経費タイプまたは原価費目に設定して、計画立案アイテムの予算を管理します。
   詳細については、「予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する」を参照してください。
7. オプション: 組織の要件に合わせて [コスト計画を作成] フォームのフィールドをカスタマイズします。
   詳細については、「[コスト計画] フォームのカスタマイズ」を参照してください。
8. デフォルトの経費タイプをカスタマイズして、計画立案アイテムのコスト計画を管理します。
   詳細については、「ポートフォリオ計画 のデフォルトの経費タイプの変更」を参照してください。
9. ベースライン名のカスタムプリフィックスを定義します。
   詳細については、「ベースラインのカスタムプリフィックスの作成」を参照してください。
10. 計画立案アイテムの予算を移行するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
    詳細については、「計画立案アイテムの予算を移行するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。
11. 計画立案アイテムの財務ベースラインを定義した周期で自動的に作成するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
    詳細については、「プロジェクトおよびデマンドの財務ベースラインを作成するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。
12. 属性ベースのリソースのアサインに基づいてプロジェクトとデマンドの人件費を生成するスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
    詳細については、「プロジェクトおよびデマンドの人件費を生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

財務の左ペインビューのカスタマイズ


財務の左ペインをカスタマイズして、カスタムフィールド情報を表示します。

始める前に

必要なロール：admin


手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [Label (ラベル)] フィールドをフィルターして、**[Cost Plan** (コスト計画)] テーブルを開きます。
3. **[Show List** (リストを表示)] 関連リンクを選択します。
4. に移動し、財務ビューを選択します リストコントロール > 表示 > 財務ビュー.

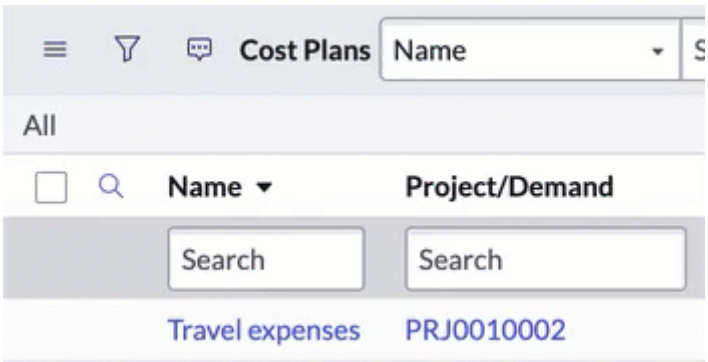

選択したビュー ( ) がヘッダーに表示されます。

5. ヘッダーオプションを選択して、リストのレイアウトを構成します。

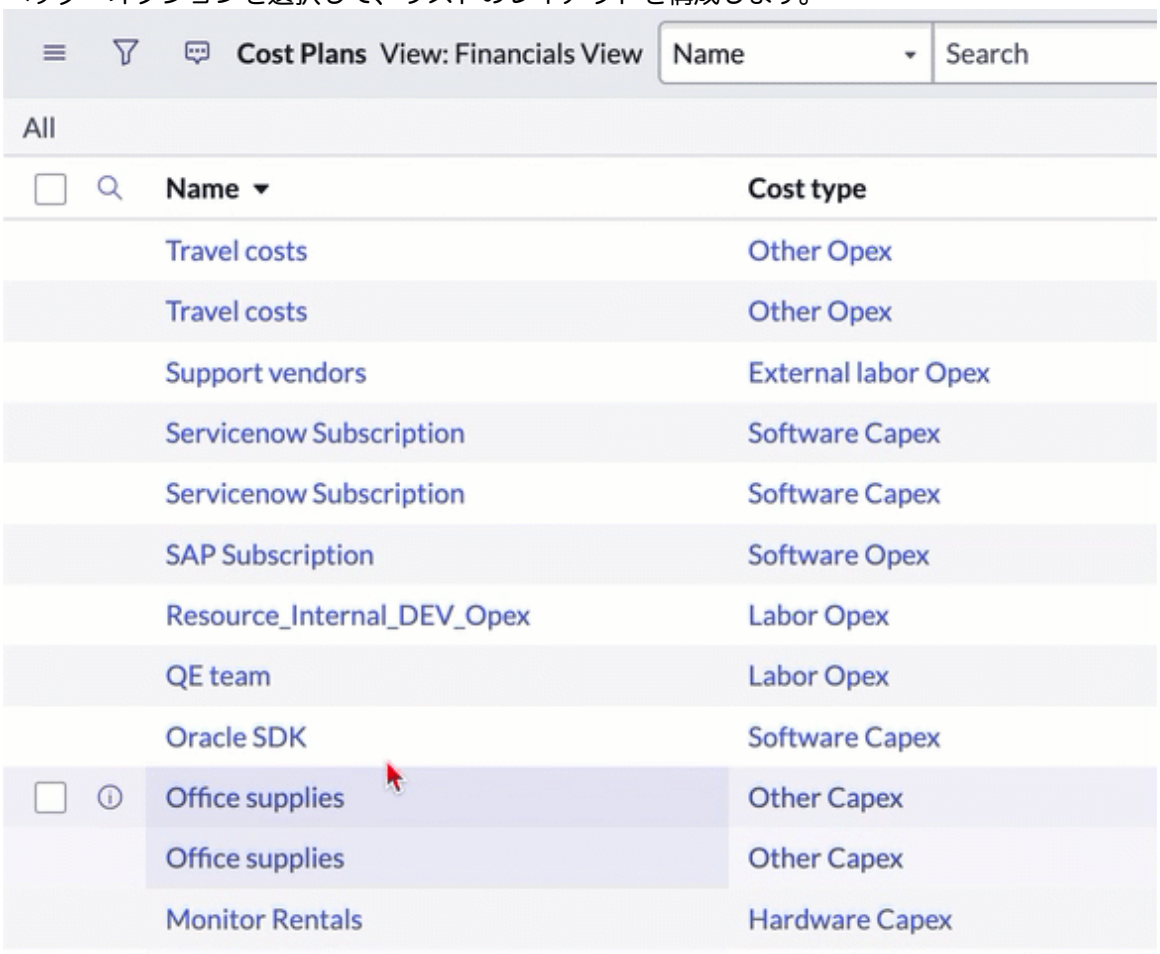

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. [選択済み] 列のフィールドを追加または削除して、財務ビューの左ペインビューをカスタマイズします。
7. [保存] を選択します。

タスクの結果
財務ビューのカスタマイズされたフィールドが含まれるコスト計画テーブルが表示されます。

ポートフォリオ計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化

ポートフォリオ計画を使用して計画立案アイテムの予算割り当てを処理するには、ネクストエクスペリエンスに移行した後に割り当てプロパティを有効にします。

始める前に

- ネクストエクスペリエンスで財務にアクセスする新規顧客の場合、このプロパティはデフォルトで有効になっています。
- 必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > プロパティ.
2. [名前] 列をフィルタリングして、**sn_invst_pln.enable_budget_allocation_v2** プロパティを見つけて開きます。
3. [値] フィールドを **[True]** に更新し、[更新] を選択します。

次のタスク
計画立案アイテムの予算管理に役立つ予算属性を設定します。詳細については、「予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する」を参照してください。

予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する

ポートフォリオ計画を使用して計画立案アイテムの予算割り当てを処理するには、経費タイプまたは原価費目で予算属性をインスタンスレベルとして構成します。

始める前に

- 計画立案アイテムの予算業務で機能するように予算割り当てプロパティを有効にします。詳細については、「ポートフォリオ計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化」を参照してください。
- 必要なロール：admin

> **注:**
> 既存のお客様は、予算属性を cost_type に変更することはできません。

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > プロパティ.
2. [名前] 列をフィルタリングして、**budget_allocation_attribute** プロパティを見つけて開きます。
3. [値] フィールドを次のいずれかに更新します。
   - **cost_type** - ハードウェア経費、外部労働投資、ソフトウェア投資、ソフトウェア経費などの原価費目別に財務ビューをネストします。
   - **expense_type** - 投資や経費などの経費タイプ別に財務ビューをネストします。
4. [更新] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[コスト計画] フォームのカスタマイズ

組織のニーズに応じて、新しいコスト計画フォームで必要なフィールドを管理します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [Label (ラベル)] フィールドをフィルターして、**[Cost Plan** (コスト計画)] テーブルを開きます。
3. [フォームをデザイン] 関連リンクを選択します。
4. ヘッダー行で、テーブルリストから [コスト計画 **[cost_plan]]** を選択し、ビューリストから [財務ビュー] を選択します。
5. このフォームでは次のことができます。
   - [フィールド] 列から必要なフィールドをドラッグアンドドロップする。
   - [フィールドを削除] アイコンを使用して、既存のフィールドを削除する。
6. [保存] を選択します。

ポートフォリオ計画 のデフォルトの経費タイプの変更

デフォルトの経費タイプを設定して、計画立案アイテムのコスト計画を作成または編集します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > すべてのプロパティ.
2. 名前をフィルタリングし、**sn_plng_att_core.default.expense_type** テーブルを見つけて開きます。
3. 値フィールドを必要な経費タイプに変更し、 [保存] を選択します。
   デフォルト値は [Opex] です。

カスタム人件費を作成して**sys_id**にマッピングする

カスタム人件費を作成してsys_idにマッピングし、関連する経費に基づいて人件費を生成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. カスタム人件費を作成します。
   a. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
   b. [Label] フィールドをフィルタリングして、開いている **[Cost Type Definition**] を見つけます。
   c. [関連リンク] から [リストを表示] を選択します。

      OOB 人件費のリストが表示されます。

   d. **[New** (新規)] を選択します。
   e. [コストタイプ定義] フォームで、フィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 名前 :人件費計画の名前を入力します。

  ヒント:
  コストタイプ (投資または経費) を名前のサフィックスとして追加すると、コスト計画の作成時に簡単に識別できます。

- 経費タイプ - リストから [投資] または [経費] を選択して経費を定義します。

  たとえば、ソフトウェア投資の人件費を作成して、ソフトウェアの購入経費をキャプチャすることができます。ハードウェアの購入費用を計上するためのハードウェア経費の人件費。

f. [**Submit** (送信)] を選択します。

新しいコスト計画がリストに表示されます。

g. コスト計画の行を右クリックし、[**sys_id**のコピー] を選択します。

2. カスタム人件費をsys_idにマッピングします。

a. 移動先 すべて > システムプロパティ > すべてのプロパティ.

b. [Name (名前)] フィールドをフィルタリングして、**sn_plng_att_core.labor_costtype_sysid_mapping** プロパティを見つけて開きます。

c. 値 フィールドに人件費タイプ名を入力すると、OOB 人件費マッピング形式と同じ形式でsys_idされます。

d. [Update (更新)] を選択します。

計画立案アイテムの予算を移行するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化

[アクティブなデマンドとプロジェクトの予算の移行 **(Migrate budget for active demands and projects)]** スケジュール済みジョブをアクティブ化して、アクティブな計画立案アイテムの予算をクラシック UI からネクストエクスペリエンスに移行します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.

2. 名前フィールドをフィルタリングし、[アクティブなデマンドとプロジェクトの予算の移行 **(Migrate budget for active demands and projects)]** を見つけて開きます。

3. [スケジュール済みスクリプト実行] フォームのフィールドを編集してジョブをカスタマイズし、要件を満たします。
フィールドの説明とスクリプトの詳細については、「Automatically run a script of your choosing」を参照してください。

4. [今すぐ実行] を選択してスケジュール済みジョブを実行するか、[更新] を選択して変更を保存します。

プロジェクトおよびデマンドの財務ベースラインを作成するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化

スケジュール済みジョブを定義して、計画立案アイテムの財務ベースラインを必要な頻度で自動的に作成します。

始める前に
必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. 特定する名前フィールドをフィルタリングし、[デマンドおよびプロジェクトの財務ベースラインを作成 **(Create Financial Baseline For active Demands and Projects)]** を開きます。
3. [アクティブ] オプションを選択してジョブをアクティブ化してスケジュールします。
4. [スケジュール済みスクリプト実行] フォームのフィールドを編集してジョブをカスタマイズし、要件を満たします。
   フィールドの説明とスクリプトの詳細については、「Automatically run a script of your choosing」を参照してください。
5. [今すぐ実行] を選択してスケジュール済みジョブを実行するか、[更新] を選択して変更を保存します。

プロジェクトおよびデマンドの人件費を生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化

スケジューラージョブをアクティブ化して、属性ベースのリソースのアサインに対する人件費を自動的に作成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [名前] フィールドをフィルターし、*Generate Labor Costs* スケジュール済みジョブを見つけて開きます。
3. [アクティブ] を選択し、[スケジュール済みスクリプト実行] フォームでフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「プロジェクトおよびデマンドの人件費を生成するための [スケジュール済みスクリプト実行] フォーム」を参照してください。
4. [更新] を選択して変更を保存するか、[今すぐ実行] を選択してスケジュール済みジョブを実行します。

でのポートフォリオ財務の構成 ポートフォリオ計画

でポートフォリオ財務を表示および管理するためのプロパティとスケジュール済みジョブの構成の詳細 ポートフォリオ計画

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 内部計画立案アイテムタイプの統合を有効にします。
   詳細については、「内部計画立案アイテムの統合を有効にする」を参照してください。
2. デマンドおよびプロジェクトの投資エンティティを有効化します。
   詳細については、「計画立案アイテムの投資エンティティのアクティブ化」を参照してください。
3. 財務を表示するには、ロールアップシステムプロパティを true に設定します。
   詳細については、「プロジェクトのロールアッププロパティをアクティブ化してポートフォリオファイナンシャルを表示します」を参照してください。
4. データ生成スケジュール済みジョブをアクティブ化して、ポートフォリオ財務を表示します。
   詳細については、「ポートフォリオ財務を表示するためのデータを生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳


内部計画立案アイテムの統合を有効にする

内部計画立案アイテムタイプの統合を有効にして、ポートフォリオ財務を表示します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. 名前フィールドをフィルタリングし、 テーブルマップ [sn_align_cmn_int_table_map] テーブルを見つけて開きます。
3. [リストを表示] 関連リンクを選択します。
4. dmn_demand および pm_project の [アクティブ] フィールドを **true** に設定します。

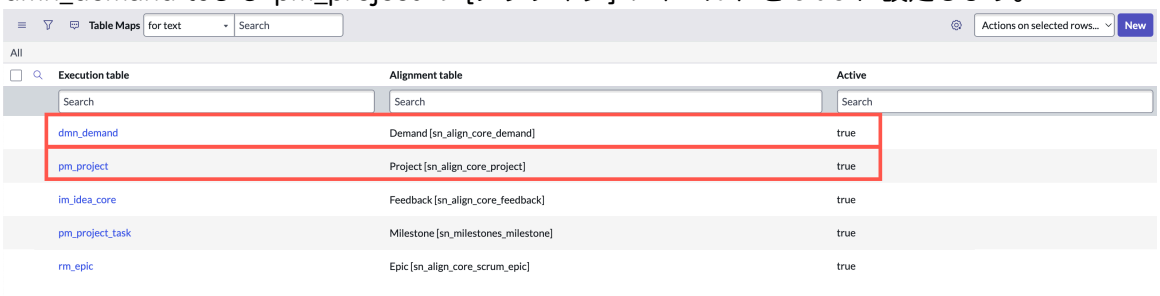


計画立案アイテムの投資エンティティのアクティブ化

デマンド、プロジェクト、およびエピックに設定された投資をアクティブ化して、ポートフォリオ財務を表示します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. 名前フィールドをフィルタリングし、 投資エンティティ [sn_invst_pln_invst_funding_entity] テーブルを見つけて開きます。
3. [リストを表示] 関連リンクを選択します。
4. [デマンド] フィールドと [プロジェクト] フィールドの [アクティブ] フィールドを **true** に設定します。

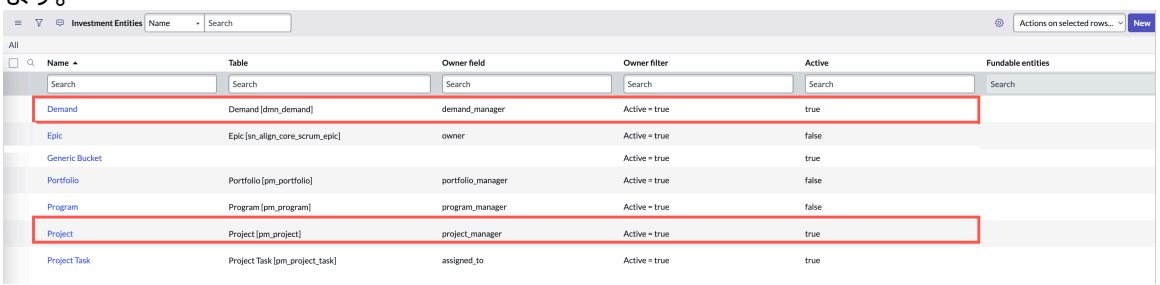

プロジェクトのロールアッププロパティをアクティブ化してポートフォリオファイナンシャルを表示します

プロジェクトコストロールアッププロパティをアクティブ化して、ポートフォリオファイナンシャルの上位プロジェクトのロールアップコストを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
このプロパティを true に設定すると、計画コスト、予測、実績コストなどの財務フィールドがサブプロジェクトからトッププロジェクトにロールアップされます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > すべてのプロパティ.
2. 名前フィールドをフィルタリングし、 **com.snc.project.rollup.cost** プロパティを選択します。
3. [値] フィールドに 「true 」と入力し、[更新] を選択します。

ポートフォリオ財務を表示するためのデータを生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化

古いデータモデルから新しいデータモデルに予算を移行し、ポートフォリオ財務を表示するための **SPW/PPW** スケジュール済みジョブで、財務データのデータ生成をアクティブ化および定義します。

このタスクについて
このスケジュール済みジョブを定義して実行し、ポートフォリオ財務を表示するのは 1 回限りのアクティビティです。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. 名前フィールドをフィルタリングして、 **SPW/PPW** で財務のデータ生成を見つけて開きます。
3. [アクティブ] オプションを選択してジョブをアクティブ化してスケジュールします。
4. [スケジュール済みスクリプト実行] フォームのフィールドを編集してジョブをカスタマイズし、要件を満たします。

   フィールドの説明とスクリプトの詳細については、「Automatically run a script of your choosing」を参照してください。

5. [今すぐ実行] を選択して、スケジュール済みジョブを実行します。

タスクの結果
エピック、デマンド、およびプロジェクトのポートフォリオ財務を表示するために必要なすべてのマッピングがマッピングされます。

データ生成ジョブが成功したかどうかを検証するには、次の場所に移動します すべて > システム定義 > テーブル をクリックし、プロジェクト [sn_align_core_project] テーブルの投資レコードのマッピングを確認します。

ポートフォリオ計画 と **PPM** の統合

ポートフォリオ計画 が ServiceNow® プロジェクトポートフォリオ管理 と連携するようにセットアップするために必要なプロセスについて説明します。

構成ワークフロー

ポートフォリオ計画 と プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) の統合セットアッププロセスの指針として、次のステップを使用してください。これらのステップの中には、アドミンロール

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

(sn_align_core.apw_admin) が必要なものと、ユーザーロール (sn_align_core.apw_user) が必要なものがあります。

1. 配置統合を作成。
2. デフォルトのマッピング構成を生成。
3. カスタムマッピング構成の作成。

ガイド付きセットアップ

ポートフォリオ計画 をインストールした後、ガイド付きセットアップを使用して必要な構成を行うことができます。ガイド付きセットアップを開くには、次に移動します: ポートフォリオ計画 > ガイド付きセットアップ.

配置統合を作成

内部配置統合は、内部プロセスとデータを同期して戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) をサポートし、プロジェクトポートフォリオ管理、アジャイル開発 2.0、大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) などのアプリケーションとのリアルタイムの双方向同期を通じて、計画と実行がビジネス目標と一致していることを確認します。

このタスクについて
ポートフォリオ計画 をインストールすると、**[ServiceNow** 内部] 配置統合がデフォルトで作成されます。配置統合が利用できない場合は、配置統合タイプを作成できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > ポートフォリオ計画 > 統合.
2. **[ServiceNow** 内部] 配置統合が存在するかどうかを検証します。
3. 存在しない場合は、[新規] をクリックして、配置統合を作成します。
4. [名前] フィールドに、配置統合の名前 (例：ServiceNow Internal) を入力します。
   または、関連リンクから **[ServiceNow** 内部統合を作成] をクリックして、内部配置統合を作成することもできます。
5. [送信] をクリックします。

デフォルトのマッピング構成を生成

デフォルトのマッピング構成を生成して、プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) のテーブルマップを作成します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core_apw.admin

手順

1. 移動先 すべて > ポートフォリオ計画 > 統合.
2. **[ServiceNow** 内部] をクリックして、内部アプリケーションの配置統合を表示します。
3. [デフォルトのマッピング構成を生成] をクリックして、プロジェクトとデマンドのテーブルマップを作成します。

   注:
   マッピング構成は、テーブル、フィールド、および選択マップで構成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カスタムマッピング構成の作成

機能、ストーリーなど、デフォルトで作成されない計画立案アイテムのマッピング構成を作成します。

アドミニストレーターは、デフォルトで作成されない計画立案アイテムのテーブルマップ、フィールドマップ、および選択マップを作成できます。詳細については、以下を参照してください。

1. テーブルマップの作成。
2. フィールドマップの作成。
3. 選択マップの作成。

テーブルマップの作成

テーブルマップを作成して、ポートフォリオ計画のテーブルと プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) のテーブル間のマッピングを定義します。

始める前に
必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

手順

1. 移動先 すべて > ポートフォリオ計画 > 統合.
2. **[ServiceNow** 内部] を選択します。
3. [テーブルマップ] タブで [新規] を選択して、新しいテーブルマップを作成します。
4. テーブルマップフォーム で、フィールドに入力します。
5. [送信] を選択します。

タスクの結果
配置テーブルと実行テーブルの構成を使用して、新しいテーブルマップが作成されます。

注:
デマンドまたはプロジェクト以外のタイプの計画立案アイテムに関するテーブルマップを作成または更新するには、SPM Pro ライセンスが必要です。詳細については、アドミニストレーターにお問い合わせください。

次のタスク
この新しいテーブルマップ構成を PPM にエクスポートするビジネスルールを作成します。詳細については、「カスタムテーブルマップ構成を適用するビジネスルールの作成」を参照してください。

カスタムテーブルマップ構成を適用するビジネスルールの作成

プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) アプリケーションから新しいカスタムテーブルマップ構成へのエクスポートを有効にするビジネスルールを作成します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core_apw.admin

このタスクについて
ポートフォリオ計画 統合でカスタムテーブルマップを作成した後、 rm_epic または dmn_demand テーブルで「実行から調整までのデータを同期」ビジネスルールに類似したビジネスルールを作成します。

注:
ビジネスルールが PPM の実行アプリケーションで作成されていることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > ビジネスルール.
2. 使用可能なビジネスルールのリストから、[実行から調整までのデータを同期] ルールを見つけて開きます。
3. コンテキストメニュー (☰) から、このビジネスルールに対して [挿入と維持] 操作を実行します。
   ServiceNow インスタンスで [挿入と維持] アクションを有効にしていない場合は、「レコードの挿入オプションの許可」を参照してください。
4. [ビジネスルール] フォームで、次のフィールドを編集します。

[ビジネスルール] フォーム

フィールド	説明
名前	ビジネスルールの一意の名前。 たとえば、新しいテーブルマップがデマンドをマップする場合は、このルールに「ポートフォリオ計画 とのデマンドの同期」と名前を付けます。
テーブル	カスタムマップを作成したテーブルを選択します。 たとえば、機能 [sn_safe_feature] です。

5. [更新] をクリックします。

フィールドマップの作成

各テーブルマップのフィールドをポートフォリオ計画からプロジェクトポートフォリオ管理に、またはその逆にマッピングします。

始める前に

配置統合レコードのテーブルマップが作成されていることを確認してください。詳細については、「テーブルマップの作成」を参照してください。

注:
実行フィールドタイプが [参照] で配置フィールドタイプが [文字列] である場合、同期は機能しません。

必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

手順

1. 移動先 すべて > ポートフォリオ計画 > 統合.
2. **[ServiceNow** 内部] を選択します。
3. [テーブルマップ] 関連リストで、フィールドマップを作成するテーブルマップを選択します。
4. [フィールドマップ] タブで [新規] を選択して、新しいフィールドマップを作成します。
5. フィールドマップフォーム で、フィールドに入力します。
6. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

選択マップの作成

ポートフォリオ計画からプロジェクトポートフォリオ管理、またはその逆の値のリストを使用して、フィールドの各フィールドマップの選択リストをマッピングします。

始める前に

フィールドマップを作成し、値のリストを含む選択フィールドが含まれていることを確認してください。詳細については、「フィールドマップの作成」を参照してください。

必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

手順

1. 移動先 すべて > ポートフォリオ計画 > 統合.
2. **[ServiceNow** 内部] を選択します。
3. [テーブルマップ] 関連リストで、選択マップを作成するフィールドがあるテーブルマップを選択します。
4. [フィールドマップ] 関連リストで、選択マップを作成する関連フィールドマップを選択します。
5. [選択マップ] タブで [新規] を選択して、新しい選択マップを作成します。
6. 選択マップフォーム で、フィールドに入力します。
7. [送信] をクリックします。

一括インポートの設定

このシステムプロパティを使用すると、ポートフォリオ計画 with PPM の一括インポート機能を更新できます。

始める前に

必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

手順

1. ナビゲーションフィルターに、「sys_properties.list」と入力します。
2. *com.sn_align_cmn_int.bulk_import* を検索します。
3. プロパティ値を次のいずれかのオプションに設定します。
   PPM から ポートフォリオ計画 にレコードがインポートされると、最後のコメントのみがインポートされます。

ポートフォリオ計画でのポートフォリオ計画の管理

ポートフォリオ計画ワークスペース でパーソナライズされたポートフォリオ計画を作成し、事業達成目標に合わせて目的の視点 (レンズ) で集中的に作業を計画できるようにします。

次のセクションでは、ポートフォリオ計画 ワークスペースでのポートフォリオ計画の作成、更新、共有、および共同作業について説明します。

ポートフォリオ計画のロードマップの使用方法の詳細については、「ポートフォリオ計画 の計画ロードマップ」を参照してください。

上位レベルのポートフォリオ計画の作成

ポートフォリオ計画ワークスペースで上位レベルのアイテム (プログラム) のポートフォリオ計画をビルドし、こうしたプログラムに沿った作業の優先順位付け、ロードマップ作成、および管理を行えるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

このタスクについて
上位レベルの計画立案は、プログラム (pm_program) 計画立案アイテムに対してのみ作成でき、[プロジェクトプログラム] レンズでサポートされています。


このタスクでは、[プロジェクトプログラム] レンズを選択し、条件を追加して、必要な計画立案アイテムデータをフィルタリングし、追加の詳細を追加してポートフォリオ計画をビルドします。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. [ポートフォリオ計画] ページで、[新規] を選択します。
   ポートフォリオ計画が存在しない場合は、[最初のポートフォリオ計画を作成] を選択します。
3. 上位レベルの計画立案の [プロジェクトプログラム] レンズを選択します。
   [ポートフォリオ計画を作成] ウィザードが表示されます。
4. レンズに、計画立案の作業アイテムとして [プログラム] を選択します。

   a. そのレンズについて、計画する作業を選択します。

      たとえば、会社のプログラムの作業を管理するとします。上位レベルの計画立案アイテムとして [プログラム] を選択します。これにより、プログラムを計画し、こうしたプログラムに沿った作業をレビューできます。

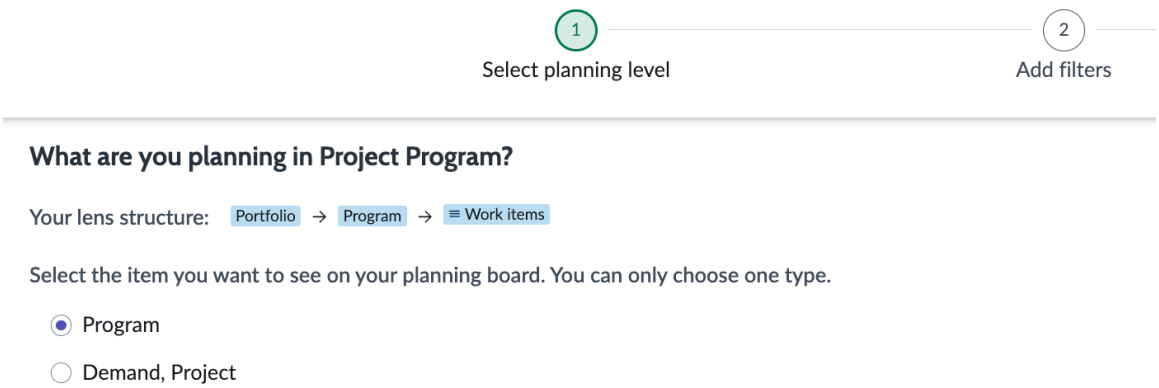

   b. 条件を追加して、計画立案アイテムのデータをさらにフィルタリングします。

      たとえば、カスタマーサポート部門のプログラムを担当しているとします。プログラムテーブルからカスタマーサポート部門のみのプログラムをフィルタリングする条件を設定できます。

      複数の条件を追加して、複雑なフィルターを設定し、適切な種類のデータをポートフォリオ計画に追加することもできます。

   c. ポートフォリオ計画の詳細を入力します。

      ポートフォリオ計画の名前、所有者、開始日と終了日、および説明の情報を入力します。

   [前へ] および [次へ] ボタンを使用して、ステップ間を移動します。
5. [作成] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
ポートフォリオ計画が作成され、ページが更新されて、[計画] ページが表示されます。ホームページから、所有または共有しているすべてのポートフォリオ計画のリストを表示できます。

次のタスク
バックログを分析し、ポートフォリオ計画の作業に優先順位を付けます。「ポートフォリオ計画でのポートフォリオ計画作業の優先順位付け」を参照してください。

ポートフォリオ計画の作成

選択した計画の視点で作業の優先順位付けと調整を開始できるように、ポートフォリオ計画 ワークスペースでレンズを使用してカスタマイズされたポートフォリオ計画をビルドします。

始める前に
必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. **[New** (新規)] を選択します。
   ポートフォリオ計画が存在しない場合は、[最初のポートフォリオ計画を作成] を選択します。
   ポートフォリオ計画を作成ウィザードが表示されます。
3. ポートフォリオ計画を作成ウィザードを使用して選択します。


   a. レンズを選択します。

   b. 選択したレンズについて、エンティティタイプとそのタイプの目的のエンティティを選択します。

      エンティティタイプは、作業を計画する視点を表します。たとえば、[組織] レンズを選択した場合は、エンティティタイプとして [事業部門] を選択し、必要な事業部門を選択して、その視点から作業を計画できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

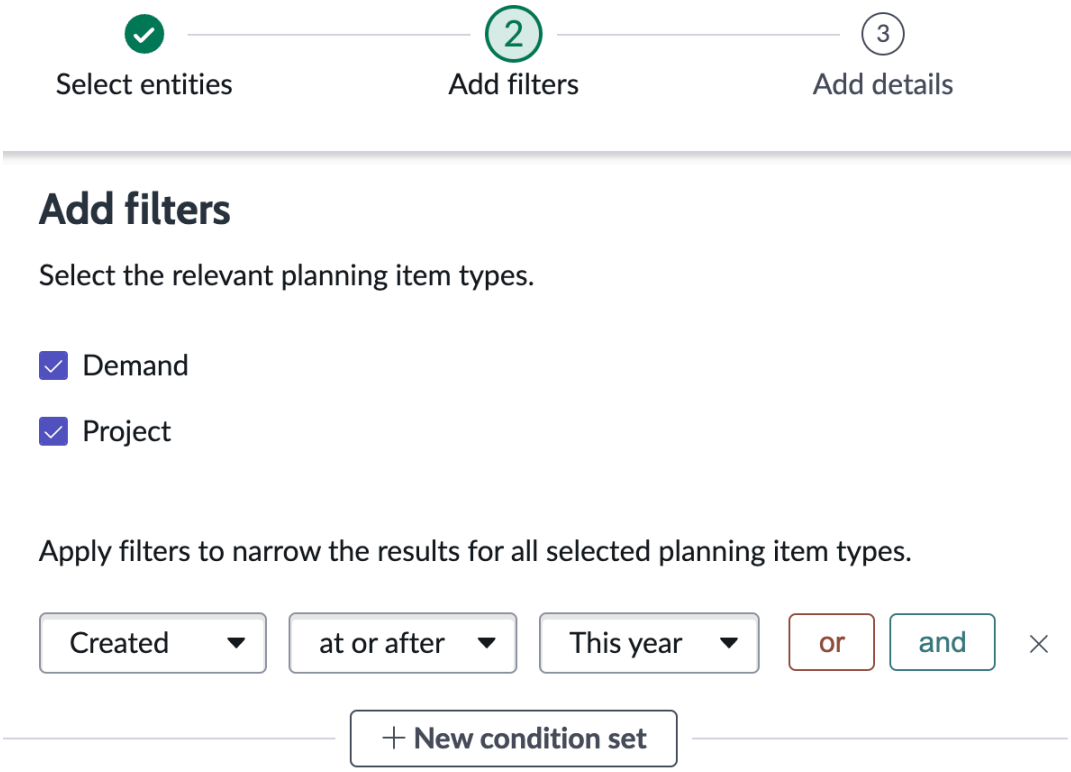

複数の条件を追加して、複雑なフィルターを設定し、適切な種類のデータをポートフォリオ計画に追加することもできます。

c. ポートフォリオ計画に含める計画立案アイテムのタイプを選択します。

追加の条件を使用して、計画立案アイテムデータをさらにフィルターできます。

d. ポートフォリオ計画の詳細を入力します。

ポートフォリオ計画の名前、開始日と終了日、および説明の情報を入力します。

[前へ] および [次へ] ボタンを使用して、ステップ間を移動できます。

4. [作成] を選択します。

タスクの結果

ポートフォリオ計画が作成され、ページが更新されて、この新しいポートフォリオ計画の [計画] ページが表示されます。ホームページから、所有または共有しているすべてのポートフォリオ計画のリストを表示できます。

次の基準を満たす計画立案アイテムがポートフォリオ計画に表示されます。

- ステップ 3(b) で選択したエンティティタイプの 1 つに属する計画立案アイテム
- ステップ 3(c) で選択した計画立案アイテムタイプと一致する計画立案アイテム
- 承認された開始日または終了日がポートフォリオ計画タイムライン内にある計画立案アイテム
- 承認された開始日と承認された終了日の両方がない計画立案アイテム

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
プロジェクトポートフォリオ管理 年にプロジェクトに変換されたデマンドがある場合、結果の (デマンドから変換された) プロジェクト計画立案アイテムのみがポートフォリオ計画に表示されます。

次のタスク

- バックログを分析し、ポートフォリオ計画の作業に優先順位を付けます。「ポートフォリオ計画でのポートフォリオ計画作業の優先順位付け」を参照してください。
- 優先順位付けされた作業をロードマップして、計画の進捗状況をビジュアル化します。「ポートフォリオ計画 の計画ロードマップ」を参照してください。
- ポートフォリオ計画の変更。
- ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する際に、要件に応じてポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にします。「ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする」を参照してください。
- ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する。

ポートフォリオ計画の複製

既存のポートフォリオ計画のデータを使用してポートフォリオ計画を作成します。作成するポートフォリオ計画が既存のポートフォリオ計画と類似している場合は、既存のポートフォリオ計画を複製することで時間を節約できます。表示アクセス権または編集アクセス権で共有されたポートフォリオ計画をコピーすることもできます。

始める前に
必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

このタスクについて
[ポートフォリオ計画を複製] オプションを選択すると、選択したポートフォリオ計画とそのすべてのデータ (優先順位付けおよびロードマップ) がポートフォリオ計画にコピーされます。また、コピーされたアイテムとその子アイテムの間のすべての依存関係と関係も保持されます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. ポートフォリオ計画ヘッダーから、[その他のアクション] アイコン (⋮ を選択し、[ポートフォリオ計画の複製] を選択します。
4. [ポートフォリオ計画を複製] ウィンドウで、詳細を入力します。

   a. [ポートフォリオ計画名 **(Portfolio plan name)]** フィールドにポートフォリオ計画の名前を入力します。
   デフォルトでは、名前は *ABC (Copy)* です。ここで、ABC はコピー元のポートフォリオ計画の名前です。

   b. オプション: コピー元のポートフォリオ計画のユーザーにアクセス権を付与するには、[同じユーザーおよびグループと共有 **(Share with same users and groups)]** オプションを選択します。
   このアクションでは、コピー元のポートフォリオ計画に対してユーザーが持っていたのと同じ読み取りアクセス権と編集アクセス権が付与されます。

   c. [**Confirm** (確認)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
新しいポートフォリオ計画が作成され、新しいポートフォリオ計画にアクセスするためのリンクが画面に生成されます。

次のタスク

- バックログを分析し、ポートフォリオ計画の作業に優先順位を付けます。「ポートフォリオ計画でのポートフォリオ計画作業の優先順位付け」を参照してください。
- 優先順位付けされた作業をロードマップして、計画の進捗状況をビジュアル化します。「ポートフォリオ計画 の計画ロードマップ」を参照してください。
- ポートフォリオ計画の変更。
- ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する際に、要件に応じてポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にします。「ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする」を参照してください。
- ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する。

ポートフォリオ計画の変更

ポートフォリオ計画 ワークスペースでポートフォリオ計画の詳細を更新するか、削除して、計画の優先度の変更を反映します。

始める前に
ポートフォリオ計画の作成。

必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder


このタスクについて
注:
ポートフォリオ計画の所有者または編集者のみが編集できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. ポートフォリオ計画ヘッダーから、その他のアクションアイコン (⋮) を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

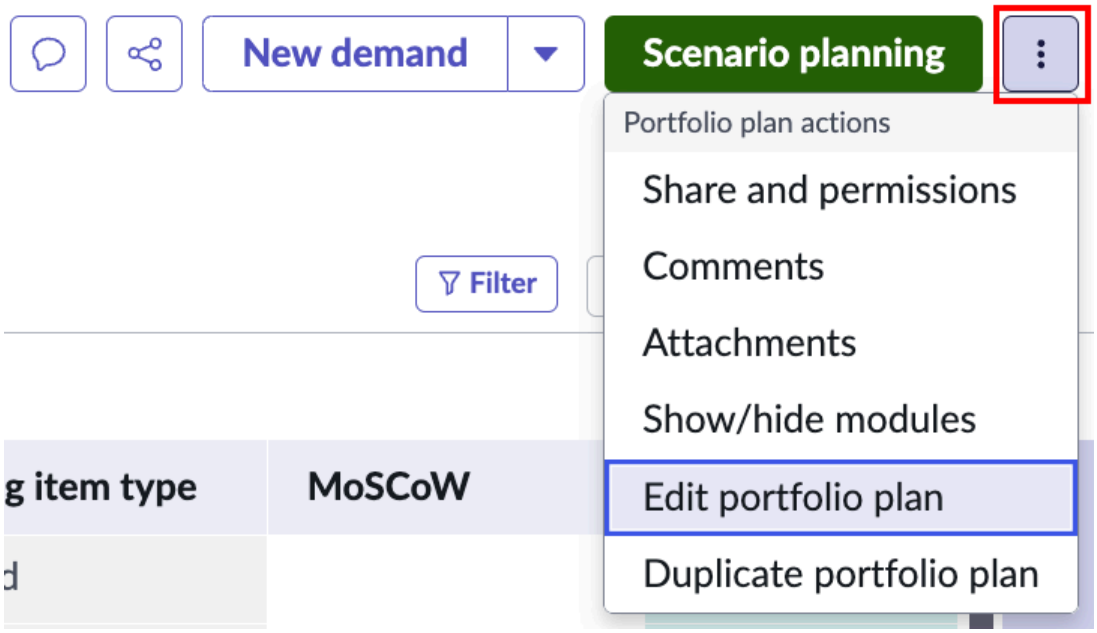

4. ポートフォリオ計画の詳細を更新するか、[ポートフォリオ計画アクション] メニューを使用して削除します。

次のタスク
更新されたポートフォリオ計画を共有するか、他のステークホルダーと共同作業を行います。

- ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する際に、要件に応じてポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にします。「ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする」を参照してください。
- ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する。
- ポートフォリオ計画でのコラボレーション。

ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする

ポートフォリオマネージャーは、必要に応じてポートフォリオ計画の機能 (優先順位付け、ロードマップなど) を表示または非表示にして、必要なデータのみをステークホルダーと共有できるようにします。

このタスクについて
ポートフォリオ計画の機能を非表示にすると、ステークホルダーにとって重要なデータのみを共有し、ポートフォリオ計画内の他のデータへのアクセスを制限することができます。

> **注:**
> 表示アクセス権を提供し、機能 (キャパシティ計画立案など) を 非表示にして、ポートフォリオ計画をステークホルダーと共有 する場合、ビューアーは有効な機能のみを表示でき、共有ポートフォリオ計画の非表示の機能 (キャパシティ計画立案) は表示されません。ただし、編集アクセス権を提供するポートフォリオ計画を共有すると、エディターは必要に応じて機能を有効または無効にしたり、共有ポートフォリオ計画内のデータを表示および編集したりできます。

始める前に
ポートフォリオ計画の作成。


必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、機能を表示または非表示にするポートフォリオ計画を選択します。
3. ポートフォリオ計画の左ペインで、[モジュールを表示/非表示] を選択します。
4. [モジュールの表示/非表示] ウィンドウで、表示する機能を選択し、非表示にする機能の選択を解除します。

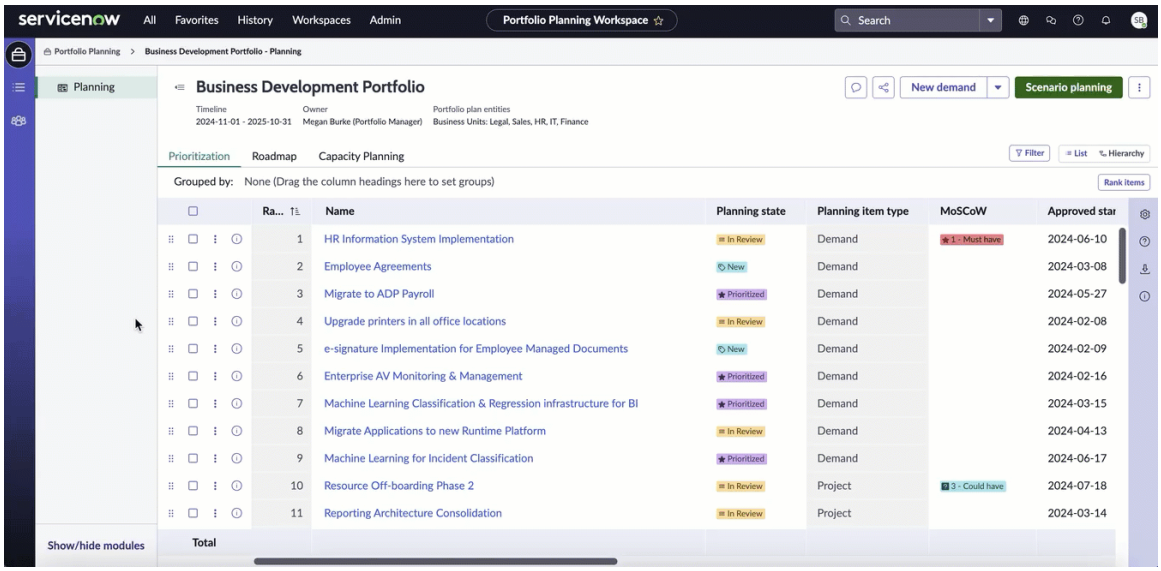

5. [変更を適用] を選択します。

関連情報

ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する

ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する

ポートフォリオ計画をステークホルダーや他の計画マネージャーと共有して、計画の進捗状況に対する可視化を得て、共同作業を開始できるようにします。

始める前に

- ポートフォリオ計画の作成。
- ポートフォリオ計画を共有するユーザーまたはグループがポートフォリオ計画への読み取りまたは編集アクセス権を取得するには、sn_align_core.ap_read_only または sn_align_core.apw_user ロールが必要です。

必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

このタスクについて

ポートフォリオを共有する個々のユーザーまたはグループを選択します。

ポートフォリオ計画を個々のユーザーまたはグループと共有すると、優先順位付けやロードマップを含む、ポートフォリオ計画全体にアクセスできます。また、ユーザーが sn_align_ws.spw_capacity_user または sn_align_ws.spw_capacity_read ロールを持っている場合は、[計画] ページの [キャパシティ] タブにアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. [計画] ページのポートフォリオ計画ヘッダーから、[ポートフォリオ計画を共有] アイコン ( ) を選択します。
4. [ポートフォリオ計画を共有] フォームで、ポートフォリオ計画を共有するユーザーを選択し、そのアクセス権を適切に設定します。
   a. [メンバーまたはグループ] フィールドに、個々のユーザーまたはグループの名前を入力します。
   b. [アクセス] フィールドで、選択した名前のアクセスレベルとして [ビューアー] または [エディター] を選択します。
      - エディターは、ポートフォリオ計画の設定とデータを表示および変更できます。
      - ビューアーは、コメントまたは添付ファイルの追加のみを行うことができます。設定やデータを変更することはできません。

      注:
      ユーザーにポートフォリオ計画への表示専用アクセス権が付与されている場合でも、sn_align_core.apw_user ロールが割り当てられていれば、ポートフォリオ計画で使用される計画立案アイテムテーブルまたは関連テーブルを編集できます。
5. [招待を送信] を選択します。

タスクの結果
選択した個人およびグループユーザーに、ポートフォリオ計画の共有がメールで通知されます。

次のタスク
ポートフォリオ計画でのコラボレーション。

ユーザーまたはグループのアクセスレベルを変更するか、アクセス権を削除できます。

1. [ポートフォリオ計画を共有] フォームで、[アクセスを管理] を選択します。
2. ユーザーまたはグループカードから、[アクションメニュー] アイコン ( ) を選択します。
3. 適切なアクセスレベルを選択するか、[削除]を選択します。

関連情報

ポートフォリオ計画の変更

ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする

ポートフォリオ計画でのコラボレーション

ユーザーがフィードバックを確認して共有できるように、ポートフォリオ計画にコメントと添付ファイルを追加します。ステークホルダーと共同作業し、結果の共有を推進します。

始める前に
ポートフォリオ計画の作成。

必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
計画やデータポイントについてコメントし、添付ファイルを共有し、ワークスペース内の 1 つの場所からフィードバックを提供することで、すべてのステークホルダーがビジネスの優先順位と連携していることを確認します。

ポートフォリオ計画のヘッダーから追加する添付ファイルとコメントは、優先順位付けおよびロードマップを含む、ポートフォリオ計画全体に適用されます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [計画] ページのポートフォリオ計画ヘッダーから、[コメント] アイコン ( ) を選択します。
4. ポートフォリオ計画にコメントまたは添付ファイルを追加します。

関連情報

ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする

ポートフォリオ計画でのポートフォリオ計画作業の優先順位付け

ポートフォリオ計画 ワークスペースの優先順位付け機能を使用して、適切な時間に適切な作業を優先順位付けできるように、計画立案アイテムを追加、更新、およびランク付けします。

優先順位付けビュー

ポートフォリオ計画 の優先順位付けページはバックログを表し、作業パイプラインのアイテムをリストおよび階層ビューで表示します。これらのビューの概要については、「ポートフォリオ計画 での作業の優先順位付け」を参照してください。

注:
優先順位付け機能は、ポートフォリオ計画でのみ使用できます。

優先順位付け機能

[優先順位付け] ページのこれらの各ビューでは、次のアクションを実行できます。

新しい計画立案アイテムの追加

[優先順位付け] ページからバックログに新しいアイテムを直接追加します。ここで作成できる計画立案アイテムのタイプは、ポートフォリオ計画の構成によって異なります。「優先順位付けへの計画立案アイテムの追加」を参照してください。

計画立案アイテムの詳細の更新

優先順位付けページビューから、計画立案アイテムの詳細を編集し、添付ファイルを追加し、それらをステークホルダーと直接共同作業することで、リアルタイムのバックログ調整をスムーズに行うことができます。

「優先順位付けビューからの計画立案アイテム詳細の更新」を参照してください。


実行アプリで計画立案アイテムを開く

ServiceNow PPM、アジャイル開発 2.0、または SAFe アプリケーションを使用して計画された作業を実行している場合は、それらのアプリケーションで計画立案アイテムを開くことができます。たとえば、計画立案アイテムがプロジェクトの場合、プロジェ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クトフォーム、プロジェクト計画コンソール、またはプロジェクトステータスレポートに、[優先順位付け] ページから直接移動できます。



[優先順位付け] ページビューをカスタマイズ

優先順位付けページの表示方法を変更して、必要な形式で情報を表示できるようにします。「[優先順位付け] ページビューのカスタマイズ」を参照してください。

行と列のカスタマイズ、グループ化、ソートなどの設定はすべて、ポートフォリオ計画初期設定として保存することができます。したがって、これらの設定は、ポートフォリオ計画が共有されるすべてのユーザーまたはユーザーグループに適用されます。

優先順位付けへの計画立案アイテムの追加

ポートフォリオ計画 ワークスペースのポートフォリオ計画の作業バックログに新しい計画立案アイテムを追加し、作業パイプラインが最新であることを確認します。

始める前に

ポートフォリオ計画の作成。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

ポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページを使用して、新しい計画立案アイテムを追加するか、プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) などの他の ServiceNow 実行システムからそれらをインポートします。

このタスクを実行するときは、リストビューまたは階層ビューを使用できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け] ページから、ポートフォリオ 計画の新しい計画立案アイテムを追加します。

   [その他のオプション] ドロップダウンを使用して、作成する計画立案アイテムを選択します。

4. フォームにて、簡単な説明や承認日を入力します。
   完全なフィールドの詳細については、「デマンド計画立案アイテムフォーム」または「プロジェクト計画立案アイテムフォーム」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

5. [送信] を選択します。
6. オプション: PPM を使用して計画された作業を実行する場合は、アプリケーションから作業アイテムをインポートすることもできます。
   詳細については、「PPM での ポートフォリオ計画 作業の実行」を参照してください。

タスクの結果

[計画ステータス] フィールドが [新規] に設定された状態で新しいアイテムが作成され、アイテムの位置は現在のビューに基づいています。

- リストビュー：リストの下部に追加されます。
- 階層ビュー：適切なグループに追加されます。たとえば、選択したレンズが [組織] であるとします。次に、新しいアイテムがその部門のグループ化に追加されます。

次のタスク

- 計画立案アイテムのランク付け。
- 優先順位付けビューからの計画立案アイテム詳細の更新。

計画立案アイテムの複製

既存の計画立案アイテムのコピーを作成して、ポートフォリオ計画ワークスペースでポートフォリオ計画の作業バックログに追加し、作業パイプラインが最新であることを確認します。作成する計画立案アイテムが既存の計画立案アイテムと類似している場合は、既存の計画立案アイテムを複製することで時間を節約できます。

始める前に

ポートフォリオ計画の作成。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

ポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページを使用して、新しい計画立案アイテムを追加するか、プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) などの他の ServiceNow 実行システムからそれらをインポートします。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け] ページで、[リスト] ビューを選択します。
4. コピーする計画立案アイテムの [その他のアクション] アイコン (を選択し、[複製] を選択します。
   新しい計画立案アイテムが作成され、コピー元の計画立案アイテムのすぐ下にアイテムが表示されます。また、新しい計画立案アイテムのランクは、コピー元の計画立案アイテムのランクに基づいて自動的に更新されます。

   デフォルトでは、名前は *Copy of ABC* です。ここで、ABC はコピー元の計画立案アイテムの名前です。
5. オプション: PPM を使用して計画された作業を実行する場合は、アプリケーションから作業アイテムをインポートすることもできます。
   詳細については、「PPM での ポートフォリオ計画 作業の実行」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- 計画立案アイテムのランク付け。
- 優先順位付けビューからの計画立案アイテム詳細の更新。
- [優先順位付け] ページビューのカスタマイズ。

優先順位付けビューからの計画立案アイテム詳細の更新

計画立案アイテムの詳細情報を更新または削除して、ポートフォリオ計画 ワークスペースで優先順位付けページに最新の作業パイプラインが反映されるようにします。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
ポートフォリオの [優先順位付け] ページのリストビューおよび階層ビューを使用して、計画立案アイテムの詳細を更新します。グリッドビューからインラインで詳細を編集して、リアルタイムのバックログ調整をスムーズにします。計画立案アイテムの [完全な詳細] ページを使用して添付ファイルを追加し、ステークホルダーとコラボレーションします。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け] ページで、[リスト] または [階層] ビューを選択します。
4. アイテムの詳細を更新したり、アイテムにファイルを添付したり、アイテムを削除したりします。

   [完全な詳細] ページで編集できない特定の列の情報は、インラインでも編集できません。たとえば、計画コストや計画利益などです。これらのセルは、背景がグレー色になり視覚的に区別できるようになっています。

   属性別に優先順位付けアイテムリストをグループ化する場合、アイテムの簡単な説明をグリッドビューから直接編集することはできません。

計画立案アイテムのランク付け

ポートフォリオ計画のパイプラインに追加された計画立案アイテムをランク付けし、その優先度を決定して、ポートフォリオロードマップの計画を開始できるようにします。

始める前に

- ポートフォリオ計画の作成。
- 優先順位付けページの計画立案アイテムが、[ランク] 列で昇順でソートされていることを確認します。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
リストビューを使用して、ポートフォリオ計画の計画立案アイテムをスタックランクします。

ServiceNow システム内で、すべての計画立案アイテムにグローバルランクが割り当てられます。[優先順位付け] ページでアイテムを並べ替えてランクを変更し、計画ステータスを更新します。計画立案アイテムをロードマップスケジュールに含めることを決定した場合は、アイテムの [計画ステータス] を [優先] としてマークし、優先順位付けページから直接ロードマップに追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

バックログ内の他のアイテムと関連性があるアイテムにおいては、[ランク] 列により、ランクをすばやく特定することができるようになります。計画立案アイテムのリストが長い場合、上位のアイテムを判断する上でこうした情報が役立ちます。カスタムのグループ化やソートがない場合、計画立案アイテムはランクでソートされ、行を並べ替えることができます。

注:
計画立案アイテムが既に他の属性でグループ化またはソートされている場合、行を並べ替えることはできません。グループ化またはソートを解除してから、行を並べ替えます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け **]** のリスト ビューから、順序を並べ替えて、優先度に従って計画立案アイテムをランク付けします。

   計画立案アイテムのランキングがビジネスの優先度と一致するまで、このステップを繰り返します。必要なデータの可視化を高めるには：

   - 必要な列でリストをソートまたはグループ化します。「[優先順位付け] ページのリストビューをカスタマイズする」を参照してください。
   - 計画立案アイテムをフィルタリングします。「ポートフォリオ計画 での優先順位付けとロードマップデータへのクイックフィルターの適用」を参照してください。

   ヒント:

   行コンテキストメニューアイコン (⋮) の [一番上に移動] および [一番下に移動] オプションをそれぞれ使用して、計画立案アイテムに最高ランクと最低ランクをアサインすることもできます。

タスクの結果
アイテムのランクは自動的に更新され、[ランク] 列で確認することができます。[ランク] 列は読み取り専用です。

作業の優先順位付け

チームが作業を開始できるように、ポートフォリオ計画パイプラインのアイテムを確認して優先順位を付けて計画のロードマップに追加します。

始める前に

- ポートフォリオ計画の作成。
- 優先順位付けページの計画立案アイテムが、[ランク] 列で昇順でソートされていることを確認します。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
調整セッション中に、[優先順位付け] タブのリストビューまたは階層ビューでアイテムを確認し、優先順位付けします。アイテムに割り当てられた MoSCoW 値を使用して、作業の優先度を判断できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け] ページで、計画立案アイテムを [レビュー中] または [優先順位付け] としてマークします。


   計画立案アイテムが [優先順位付け] とマークされると、[承認された開始日] フィールドと [承認された終了日] フィールドの値に基づいてポートフォリオロードマップに自動的に追加されます。

   - 日付がポートフォリオ計画期間内にある場合、アイテムがロードマップに表示されます。
   - いずれかの日付フィールドが空白の場合、アイテムはロードマップの [予定外のアイテム] リストに追加されます。

   注:
   ロードマップには、[計画ステータス (Planning state)] が [優先順位付け] に設定されているアイテムのみが表示されます。

   アイテムが [完了] または [キャンセル]とマークされている場合、デフォルトでそのアイテムは優先順位付けページに表示されません。[計画ステータス] 列のフィルターを更新して、完了またはキャンセルされたアイテムを表示できます。

4. オプション: リストビューから、一度に複数のアイテムの計画ステータスを更新できます。
   a. 更新する行から [計画ステータス **(Planning state)]** セルを 1 つ選択します。
   b. **Ctrl** キー (Windows OS の場合) または **command** キー (Mac OS の場合) を押したまま、更新する他の行の [計画ステータス **(Planning state)]** セルを選択します。
   c. 選択したセルの 1 つをダブルクリックし、ステータスを選択します。

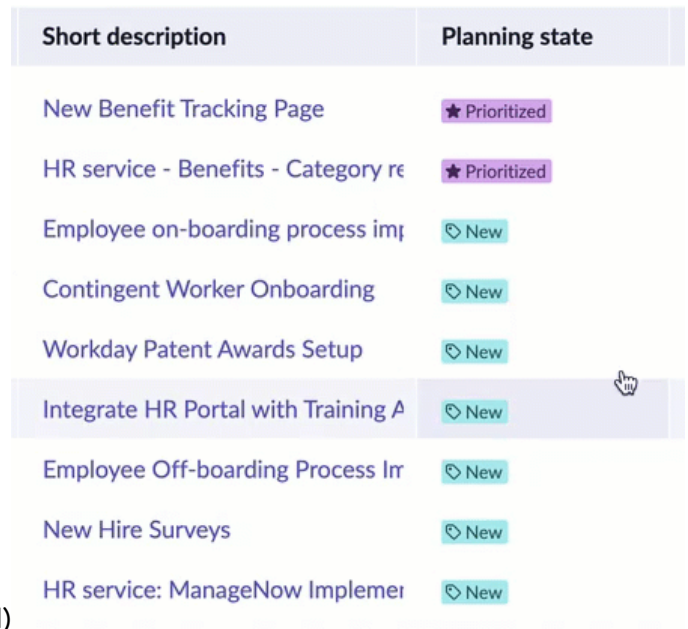

(Optional)

タグを使用した計画立案アイテムの分類

タグを追加し、要件に基づいて計画立案アイテムを分類します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
ポートフォリオ計画の作成。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
タグを使用すると、計画立案アイテムを分類できます。タグ名を作成します。これにより、タグの理由に名前が付けられます。タグは、全員、一部の人、または自分だけに表示されるようにすることができます。可視化設定では、タグを使用して計画立案アイテムを検索できるユーザーを指定します。


計画立案アイテムに加えられたタグ付けの追加または削除は、[計画] ページと [採点] ページのすべてのビュー間で自動的に同期されます。計画立案アイテムにタグを付けた後、[優先順位付け] のリストビューおよび [採点] ページで、[フィルター] オプション (Filter) を使用して、計画立案アイテムの検索にタグを使用できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け] のリストビューから、次のいずれかのオプションを使用して計画立案アイテムのタグを追加します。

   注:
   タグの可視化設定のデフォルトはプライベートであり、タグはそのタグを作成したユーザーにのみ表示されます。したがって、タグを作成したユーザーのみが、そのタグを使用して、そのタグでラベル付けされた計画立案アイテムを検索できます。

4. タグの可視化設定を変更するには、計画立案アイテムの [詳細] ページでタグを選択し、[表示可能] 設定を変更します。

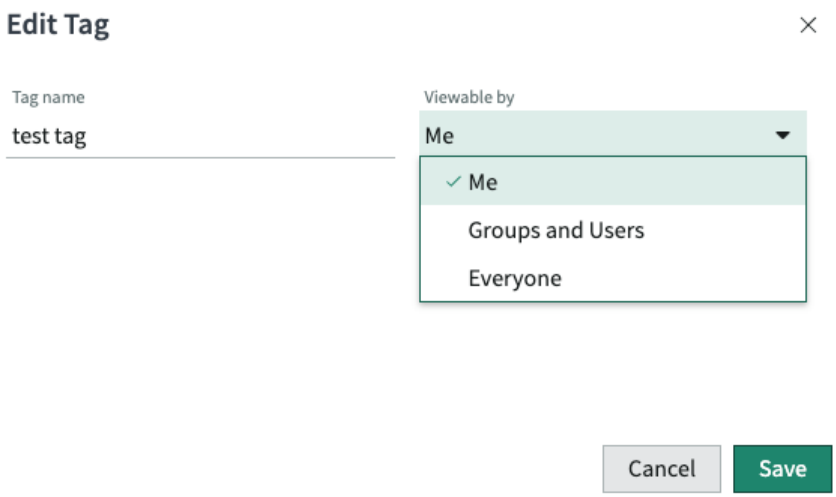


オプション	説明
自分	タグは、そのタグを作成したユーザーにのみ表示されます。タグを作成したユーザーのみが、そのタグを使用して、そのタグでラベル付けされた計画立案アイテムを検索できます。この設定がデフォルトです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
グループとユーザー	タグは特定のグループまたはユーザーに表示されます。このタグを表示できるグループとユーザーを指定できます。
全員	タグは全員に表示されます。 **注:** この可視化設定は、admin または tags_admin ロールのみが使用できます。

計画立案アイテムには複数のタグを付けることができ、それぞれに異なる可視化設定を設定できます。

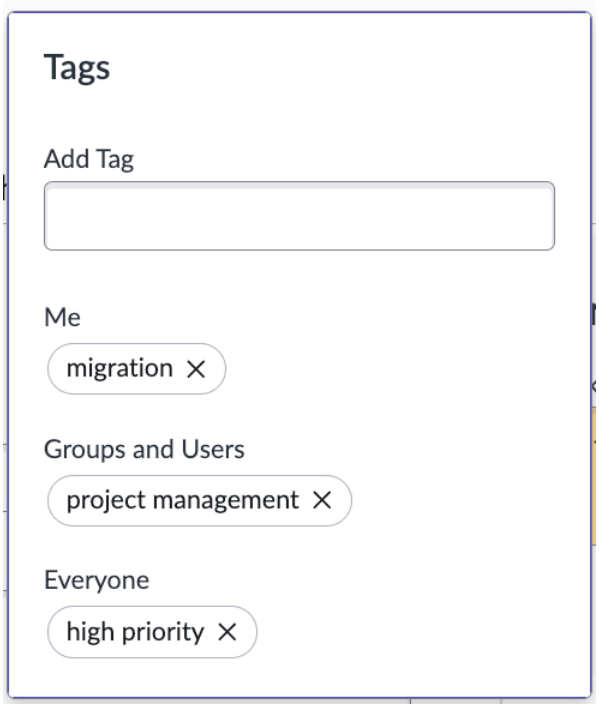

5. 計画立案アイテムからタグを削除するには、リストビューの [タグ] 列のセルをダブルクリックするか、計画立案アイテムの [詳細] ページで塗りつぶされたタグのアイコン ( ) を選択してタグのリストを開き、削除するタグの横にある **[X]** を選択します。

[優先順位付け] ページビューのカスタマイズ

ポートフォリオ計画 ワークスペースの [優先順位付け] ページのリストおよび階層ビューをカスタマイズして、自分とステークホルダーにとって最も関連性の高い情報を表示できるようにします。

[優先順位付け] ページのリストビューをカスタマイズする

選択した属性で計画立案アイテムをグループ化してソートし、表示される列をカスタマイズして効果的な調整を容易にします。

[優先順位付け] ページの階層ビューをカスタマイズする

レンズに基づいてビューを変更し、現在のポートフォリオ計画の作業が他のレンズにどのように関連しているかを学習し、財務とスケジュールのロールアップをよりよく把握できるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[優先順位付け] ページのリストビューをカスタマイズする

ワークスペースの [優先順位付け] ページのリストビューをカスタマイズして、自分とステークホルダーにとって最も関連性の高い情報を表示できるようにします。

始める前に

ポートフォリオ計画の作成

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

このタスクでは、[優先順位付け] ページのリストビューをカスタマイズするためのさまざまなオプションについて説明します。

カスタマイズ初期設定は、ポートフォリオ計画 にポートフォリオ計画の設定として保存されます。したがって、これらの設定は、ポートフォリオ計画が共有されるすべてのユーザーまたはユーザーグループに適用されます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [カスタマイズ] サイドパネルを使用して、ページの行と列の表示を更新します。

   a. [カスタマイズ] アイコン ( ) を選択します。

   b. [列] セクションから、データを表示または非表示にする列を選択します。

      ここで列を並べ替えて、バックログの表示順序を変更することができます。

      このページで列を追加して使用する場合、アドミニストレーターが追加の列を構成することができます。「ポートフォリオ計画 の [優先順位付け] ページの追加列の設定」を参照してください。

   c. [行] セクションで、**[1**行おきに網掛け] トグルを使用して、行を表示する方法を選択します。

4. [優先順位付け] ページに表示されている 1 つまたは複数の列ごとにアイテムをグループ化します。

   タイプ選択や参照の属性ごとに計画立案アイテムをグループ化することもできます。グループ化の例としては、計画ステータス、計画立案アイテムタイプ、所有者、主要目標などが挙げられます。

   次のいずれかの方法で、計画立案アイテムをグループ化します。アクションを繰り返して、複数の属性でリストをグループ化します。

5. 列名をクリックして、計画立案アイテムを列でソートします。
   たとえば、[承認された開始日] でアイテムをソートすることができます。
6. 属性で計画立案アイテムをフィルタリングします。

   a. フィルタリングする列で、[列アクション] アイコン ( ) を選択します。

   b. [フィルター] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. 適用するフィルターを選択または入力します。

たとえば、[計画ステータス **(Planning state)**] 列をフィルタリングして [新規] アイテムのみを表示するようにリストを設定することができます。その他、フィルタリングの例としては、アイテムの計画ステータス、主要目標、優先順位が挙げられます。

注:

さらに、タイプ選択、文字列、参照の属性のみでフィルタリングすることもできます。

7. 列をリストの左または右に固定します。

a. 固定する列において、[列アクション] アイコン ( ) を選択します。

b. [列の固定] セクションで、[左に固定 **(Pin to left)**] または [右に固定 **(Pin to right)**] を選択します。
デフォルトの選択は [固定を解除] です。

8. 選択に従って幅を調整するか、自動調整で幅を設定します。
列の境界線でマウスを長押ししたままドラッグして、幅を調整します。[列アクション] ( ) の [この列を自動調整] または [すべての列を自動調整] オプションを使用して、列幅を自動調整することができます。

9. [カスタマイズ] メニュー ( ) から [列をリセット] を選択して、列をデフォルト設定にリセットします。

このオプションを選択すると、列のカスタマイズ、グループ化、ソートがデフォルト設定に戻ります。

これまでに優先順位付けページで行ったカスタマイズ設定は消去されます。この後に行われるあらゆるカスタマイズは、ポートフォリオの新しい初期設定として設定されます。

10. ポートフォリオ計画 での優先順位付けとロードマップデータへのクイックフィルターの適用

[優先順位付け] ページの階層ビューをカスタマイズする

ポートフォリオ計画 ワークスペースの [優先順位付け] ページの階層ビューをカスタマイズして、自分とステークホルダーにとって最も関連性の高い情報を表示できるようにします。

始める前に

ポートフォリオ計画の作成。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

選択した属性で計画立案アイテムをソートし、[カスタマイズ] サイドパネルを使用して列の表示をカスタマイズします。

カスタマイズ初期設定は、ポートフォリオ計画 にポートフォリオ計画の設定として保存されます。したがって、これらの設定は、ポートフォリオ計画が共有されるすべてのユーザーまたはユーザーグループに適用されます。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [カスタマイズ] サイドパネルを使用して、タイムラインビューとグリッドビューの列をカスタマイズします。

   a. [カスタマイズ] アイコン ( ) を選択します。

      [カスタマイズ] サイドパネルが開きます。

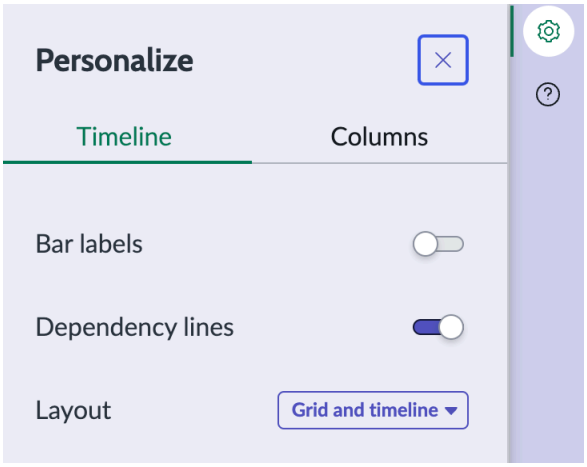

   b. [タイムライン] セクションで、アイテム名と依存関係線の表示を切り替えます。
      レイアウトを更新することもできます。グリッドとタイムラインビュー、グリッドビュー、またはタイムラインビューのみを選択します。

   c. [列] セクションから、グリッドビューに表示される計画立案アイテムフィールドを更新します。
      必要な列を選択し、[適用] をクリックします。

4. 列名をクリックして、計画立案アイテムを列でソートします。
   たとえば、[承認された開始日] でアイテムをソートすることができます。
5. ポートフォリオ計画 での優先順位付けとロードマップデータへのクイックフィルターの適用

ポートフォリオ計画のアイテムのデータを **[Prioritization** (優先順位付け)] から **Excel** または **CSV** にエクスポートする

ポートフォリオ計画アイテムのデータをポートフォリオ計画から Microsoft Excel または CSV ファイルにエクスポートします。このデータを共有し、ビジネスステークホルダーと共同作業を行うことができます。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け] タブで、[リスト] ビューを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. エクスポートする列がカスタマイズされていることを確認します。

   注:
   フィルターがビューに適用されると、フィルターされたデータがエクスポートされます。

5. カスタマイズされたサイドパネルを使用して、ポートフォリオ計画アイテムをエクスポートします。

   a. エクスポートアイコン ( ) を選択します。

   b. [エクスポート] ウィンドウの [ファイルタイプ] ドロップダウンから **[Excel]** または **[CSV]** を選択して、データをそれぞれ Microsoft Excel ファイルまたは CSV ファイルにエクスポートします。
   選択した形式のファイルがエクスポートされます。デフォルトでは、ファイルの名前は *ABC_Prioritization_List* です。ここで、ABC はデータをエクスポートするポートフォリオ計画の名前です。

ポートフォリオ計画 の計画ロードマップ

一元化されたワークスペースでロードマップを使用して、今後のプロジェクトまたはイニシアチブの計画のレイアウトを作成しながら、それらを事業達成目標に合わせて調整します。ステークホルダー間のコラボレーションを促進し、外出先で計画を調整します。

ポートフォリオ計画 ワークスペースのロードマップには、ポートフォリオ計画ロードマップとフリーフォームロードマップの 2 つのタイプがあります。

ポートフォリオ計画の場合、[優先順位付け] ページから優先順位付けされた計画立案アイテムのみがロードマップに表示されます。「作業の優先順位付け」を参照してください。

ビジネス計画でロードマップ機能を使用する場合は、以下のセクションの情報を活用してください。

関連情報

ポートフォリオ計画 のロードマップ

フリーフォームロードマップを作成

スタンドアロンのビジュアルロードマップを作成して、会社のさまざまな部門から作業の概要計画を開始します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
すべての部門のプロジェクトなど、組織の複数のユニットにわたる作業を計画するためのスタンドアロンロードマップを作成します。フリーフォームロードマップの詳細については、「ポートフォリオ計画 のロードマップ」を参照してください。

ロードマップの基礎となる開始点としてソーステーブルを選択します。簡易ロードマップのプロジェクトまたはデマンドのいずれかまたはハイブリッドロードマップの計画立案アイテムテーブルを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. [新規] を選択します。
   これが ServiceNow インスタンス内の最初のフリーフォームロードマップである場合は、[最初のフリーフォームロードマップを作成] を選択します。
3. フリーフォームロードマップを作成ウィザードを使用して、ロードマップの詳細を入力します。
   a. ロードマップの基礎となるソーステーブルを選択します。
   b. ソーステーブルからデータをフィルターする条件を追加します。
      たとえば、ソーステーブルが [プロジェクト] の場合、関連するフィルター条件は、[事業部門] が [ファイナンス] かつ [アクティブ] が **[true]** になります。
   c. ロードマップの名前と予定日の詳細を入力します。
4. [作成] を選択します。

タスクの結果

- 新しいロードマップが作成され、表示されます。
- このロードマップは、ポートフォリオ計画ワークスペースのホームページの [フリーフォームロードマップ] タブに一覧表示されます。

次のタスク

- ロードマップを使用して更新、カスタマイズ、および共同作業を行います。
- マイルストーンを追加するか、ロードマップで計画されているアイテムの依存関係を作成します。

フリーフォームロードマップの詳細を更新

フリーフォームロードマップの詳細を更新して、ロードマップの優先度またはタイムラインの変更を反映します。

始める前に
フリーフォームロードマップを作成。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. ロードマップを選択して開きます。
3. ロードマップヘッダーから、[その他のアクション] アイコン (⋮) を選択します。
4. フリーフォームロードマップを更新ウィザードを使用して、ロードマップの詳細を編集します。
5. [更新] を選択します。

タスクの結果
ロードマップが更新され、ロードマップアイテムが最新の変更に従って表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フリーフォームロードマップをステークホルダーと共有する

ロードマップ計画に関係する作業のステークホルダーである組織のメンバーを追加して、ロードマップの進捗状況を可視化できるようにします。

始める前に

- フリーフォームロードマップを作成。

- ステークホルダーとして追加するユーザーに、ロードマップにアクセスするための適切なロールがあることを確認します。ユーザーロールの詳細については、「ポートフォリオ計画 とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
組織内の他のユーザーとステークホルダーにフリーフォームロードマップへのアクセス権を付与します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. ロードマップを選択して開きます。
3. ロードマップヘッダーで、[ロードマップを共有] アイコン ( ) を選択します。
4. [ロードマップを共有] フォームで、ロードマップを共有するユーザーを選択し、そのアクセス権を適切に設定します。

   a. [メンバーまたはグループ] フィールドに、個々のユーザーまたはグループの名前を入力します。

   b. [アクセス] フィールドで、選択したユーザーのアクセスレベルとして [ビューアー] または [エディター] を選択します。

   - エディターは、ロードマップの設定とデータを表示および変更できます。
   - ビューアーは、コメントまたは添付ファイルの追加のみを行うことができます。設定やデータを変更することはできません。

5. [招待を送信] を選択します。

次のタスク
ユーザーまたはグループのアクセスレベルを変更するか、アクセス権を削除します。

1. [ロードマップを共有] フォームで、[アクセスを管理] を選択します。
2. ユーザーまたはグループカードから、[アクションメニュー] アイコン ( ) を選択します。
3. 適切なアクセスレベルを選択するか、[削除]を選択します。

フリーフォームロードマップでステークホルダーとコラボレーションする

組織の他のユーザーがフィードバックを確認して共有できるように、フリーフォームロードマップにコメントと添付ファイルを追加します。ロードマップが会社の優先順位と一致していることを、協力して確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user または sn_roadmap_plng.roadmap_editor

このタスクについて
[コメント] サイドパネルを使用して、ロードマップレベルまたは計画立案アイテムレベルで添付ファイルまたはメモを追加します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. 共同作業するロードマップを選択します。
3. ロードマップレベルまたは計画立案アイテムレベルで適切なタブを選択します。
4. 添付ファイルまたは作業メモを追加します。

フリーフォームロードマップビューの管理

ポートフォリオマネージャーは、グループ化、マイルストーンの選択、依存関係の選択、追跡モードなどのパーソナライズ設定を適用して、フリーフォームロードマップのカスタマイズされたビューを作成できます。ポートフォリオオーナーまたはエディターは、これらのカスタマイズされたビューをステークホルダーと共有して、フリーフォームロードマップでのコラボレーションを容易にすることができます。

フリーフォームロードマップビューのメリット

ポートフォリオマネージャーは、グループ化、マイルストーンの選択、依存関係の選択、追跡モードなどの設定を適用して、必要に応じてカスタマイズされたビューを作成できます。

- ビューは、プライベートまたはパブリックとして作成できます。
- 最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを作成できます。
- フリーフォームロードマップビューをステークホルダーと共有して、フリーフォームロードマップでのコラボレーションを有効にすることができます。
- 必要に応じて、共有ビューとプライベートビューを切り替えます。

フリーフォームロードマップビューの作成

要件に基づいてカスタマイズされたフリーフォームロードマップビューを作成し、再度ログインしたときにアクセスしてステークホルダーと共有してコラボレーションできるようにします。

始める前に
必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて
フリーフォームロードマップごとに、最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを作成できます。

手順


1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. フリーフォームロードマップを選択して開きます。
3. 必要に応じてビューを変更します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

たとえば、 トラッキングモード の切り替えを有効にすることができます。

[新規ビューとして保存] オプションがフリーフォームロードマップヘッダーに表示されます。

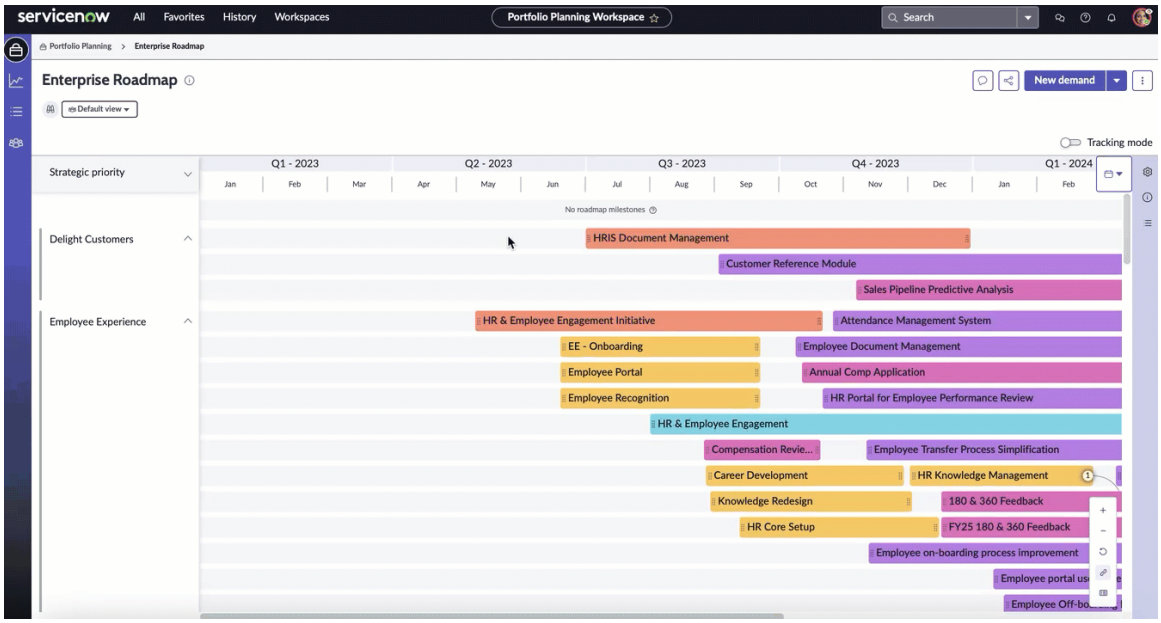

4. フリーフォームロードマップヘッダーから、[新規ビューとして保存] を選択します。
5. [新規ビューとして保存] ウィンドウで、詳細を入力します。

   a. [ビュー名] フィールドにビューの名前を入力します。

   b. オプション: [共有ビュー] トグルを選択して、このビューを公開します。
   [共有ビュー] トグルを選択すると、このフリーフォームロードマップを共有しているすべてのステークホルダーにビューが表示されます。

   c. **[Save** (保存)] を選択します。

タスクの結果
フリーフォームロードマップの共有ビューが作成され、このフリーフォームロードマップを共有しているすべてのステークホルダーに表示されます。

次のタスク

- フリーフォームロードマップをステークホルダーと共有して、フリーフォームロードマップでのコラボレーションを開始します。「フリーフォームロードマップをステークホルダーと共有する」を参照してください。
- フリーフォームロードマップビューを編集して、既存のビューを変更します。「フリーフォームロードマップビューの編集」を参照してください。

フリーフォームロードマップビューの編集

要件に基づいてカスタマイズされたフリーフォームロードマップビューを編集して、再度ログインしたときにアクセスして、コラボレーションのためにステークホルダーと共有できるようにします。

始める前に
必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

- フリーフォームロードマップビューの所有者のみが、共有 (公開) ビューを編集できます。
- フリーフォームロードマップごとに、最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを使用できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. フリーフォームロードマップを選択して開きます。
3. フリーフォームロードマップヘッダーから、編集するか、カスタマイズ設定で上書きするビューを利用可能なフリーフォームロードマップビューのリストから選択します。
   選択したビューが表示されます。
4. 必要に応じてビューを変更 。
   たとえば、 トラッキングモード の切り替えを有効にします。

   ビューに変更を加えると、フリーフォームロードマップヘッダーに ビューを保存 オプションが表示されます。

5. [ビューの保存] を選択します。
   ビューが更新され、加えられた変更が反映されます。
6. オプション: ビューの名前を編集するには、フリーフォームロードマップヘッダーから [フリーフォームロードマップ] ドロップダウンを選択し、名前を編集するビューの横にあるビューの編集アイコン (
   [ビューの編集] ウィンドウで、詳細を入力します。

   a. 必要に応じて、[ビュー名] フィールドでビューの名前を更新します。

      注:
      フリーフォームロードマップビューの所有者のみがビューの名前を変更できます。


   b. オプション: [共有ビュー] トグルを選択してこのビューを公開するか、[共有ビュー] トグルを無効にしてビューをプライベートにします。

      重要:
      共有ビューをプライベートビューに変更すると、既存のステークホルダーのアクセス権が削除されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. **[Save** (保存)] を選択します。

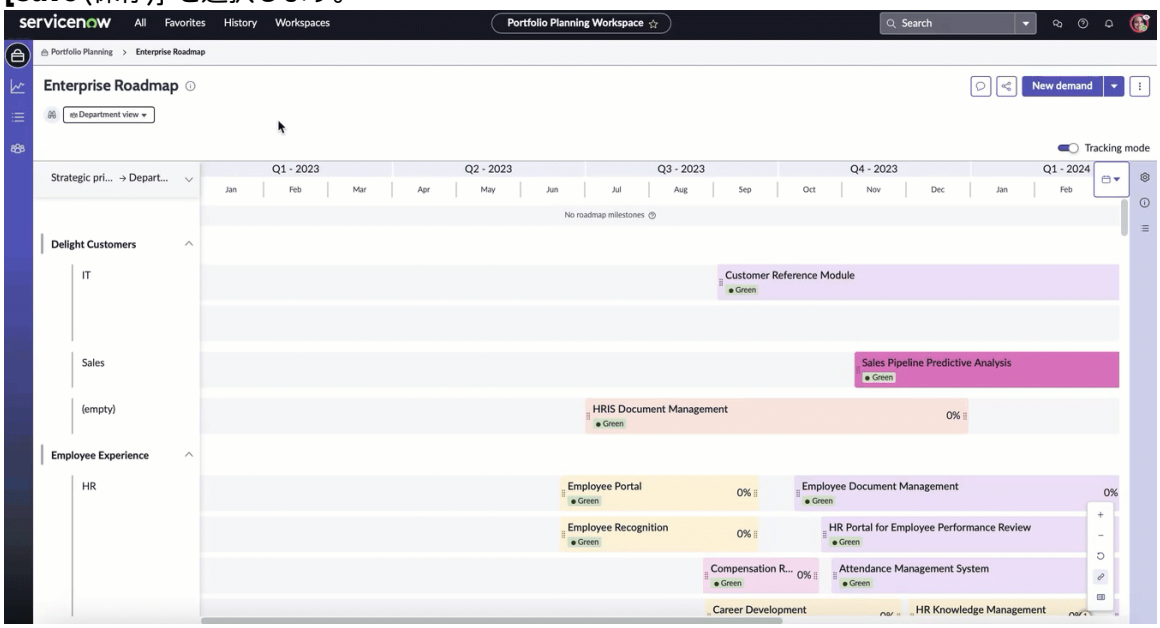

次のタスク

フリーフォームロードマップをステークホルダーと共有して、フリーフォームロードマップでのコラボレーションを開始します。詳細については、「フリーフォームロードマップをステークホルダーと共有する」を参照してください。

関連情報

- フリーフォームロードマップビューの作成
- フリーフォームロードマップビューの削除

フリーフォームロードマップビューの削除

カスタマイズされたフリーフォームロードマップビューが不要になった場合、または共有ビューが上限の 10 件または 3 件のプライベートビューに達した場合は、削除します。

始める前に

必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて

- フリーフォームロードマップビューの所有者またはフリーフォームロードマップの編集者のみがビューを削除できます。
- フリーフォームロードマップを削除すると、ビューに加えられた変更を含め、ビューが削除されます。ただし、このアクションにより、アイテム (プロジェクト、デマンド、エピック) はフリーフォームロードマップにそのまま保持されます。
- フリーフォームロードマップごとに、最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを使用できます。


手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. フリーフォームロードマップを選択して開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. フリーフォームロードマップヘッダーから [フリーフォームロードマップビュー] ドロップダウンを選択し、削除するビューの横にあるビューの削除アイコン ( ) を選択します。
[このビューを削除] ウィンドウが表示されます。
4. [このビューを削除] ウィンドウで、[削除] を選択します。

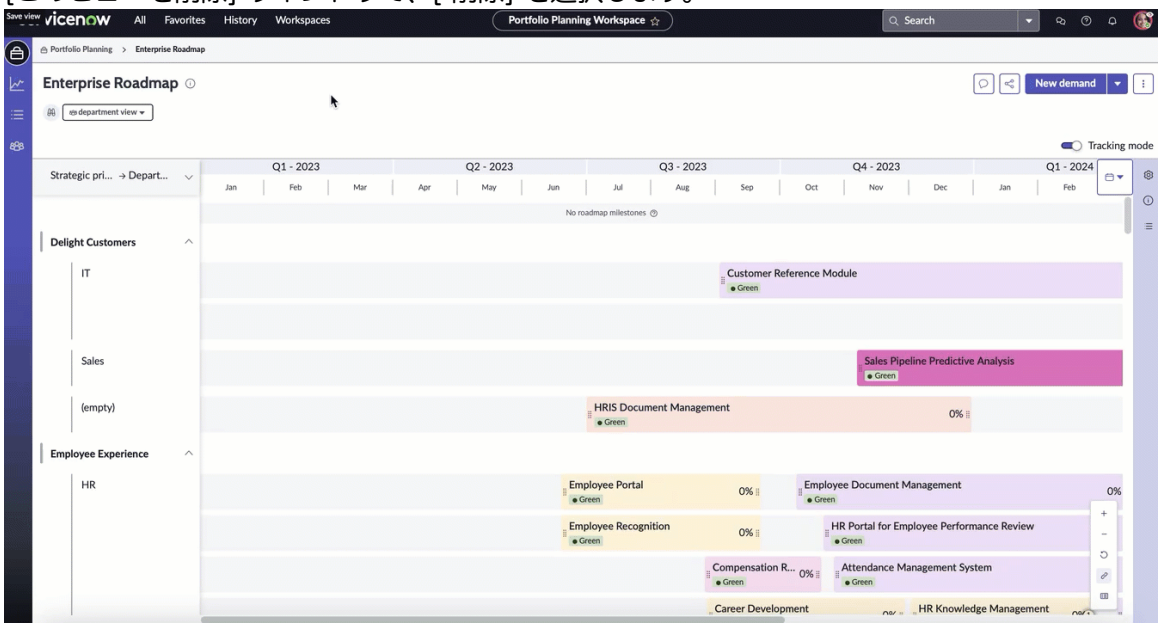

関連情報

フリーフォームロードマップビューの作成

フリーフォームロードマップビューの編集

フリーフォームロードマップの複製

既存のロードマップのデータを使用してロードマップを作成します。作成するロードマップが既存のロードマップと類似している場合は、既存のロードマップを複製することで時間を節約できます。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

すべての部門のプロジェクトなど、組織の複数のユニットにわたる作業を計画するためのスタンドアロンロードマップを作成します。フリーフォームロードマップの詳細については、「ポートフォリオ計画 のロードマップ」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. コピーを作成するロードマップを選択します。
3. ロードマップヘッダーから、[その他のアクション] アイコン ( ) を選択し、[ロードマップの複製] を選択します。
4. [ロードマップを複製] ウィンドウで、詳細を入力します。

   a. [ロードマップ名 **(Roadmap name)**] フィールドにロードマップの名前を入力します。
   デフォルトでは、名前は *ABC (Copy)* です。ここで、ABC はコピー元のロードマップの名前です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

b. オプション: コピー元のロードマップのユーザーにアクセス権を付与するには、[同じユーザーおよびグループと共有 **(Share with same users and groups)]** オプションを選択します。
このアクションでは、コピー元のロードマップに対してユーザーが持っていたのと同じ読み取りアクセス権と編集アクセス権が付与されます。

c. [確認] を選択します。

タスクの結果

- 新しいロードマップが作成され、新しいロードマップにアクセスするためのリンクが画面に生成されます。
- このロードマップは、ポートフォリオ計画 ワークスペースの ホームページの [フリーフォームロードマップ] タブにリストされます。

次のタスク

- ロードマップを使用して更新、カスタマイズ、および共同作業を行います。
- マイルストーンを追加するか、ロードマップで計画されているアイテムの依存関係を作成します。

ロードマップビューから計画立案アイテムを作成する

ロードマップビューから直接、新しい計画立案アイテムを作成してポートフォリオロードマップまたはフリーフォームロードマップに追加します。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. ロードマップビューから、[新規 **<**アイテムタイプ**>]** オプションを選択します。

- フリーフォームロードマップの場合、オプションはロードマップのソーステーブルによって異なります。
- ポートフォリオ計画ロードマップの場合、オプションはポートフォリオ計画の設定によって異なります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1 つの計画立案アイテムタイプ	複数の計画立案アイテムタイプ
	

3. フォームの必須フィールド情報を入力します。
   完全なフィールドの詳細については、「デマンド計画立案アイテムフォーム」または「プロジェクト計画立案アイテムフォーム」を参照してください。
4. [送信] を選択します。

タスクの結果
新しいアイテムは、その承認済みの開始日と終了日に基づいて、ロードマップ上の場所に表示されます。

承認された開始日と終了日の両方のフィールドに入力しないと、作成したアイテムは未スケジュールアイテムのリストに移動されます。それらのアイテムを後でロードマップ計画に追加することができます。詳細については、「予定外のアイテムをロードマップに計画する」を参照してください。

ロードマップからの計画立案アイテムの変更

ロードマップに最新の計画が反映されるように、ポートフォリオ計画またはフリーフォームロードマップから計画立案アイテムの詳細を更新または削除します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
サイドパネルビュー、またはロードマップの完全な詳細ビューから、計画立案アイテムの詳細を編集します。

手順
1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. ロードマップビューで、更新または削除する計画立案アイテムをクリックします。

   サイドパネルが開き、[詳細] タブが表示されます。

   さらに、[完全な詳細] をクリックしてアイテムのレコードページを開くこともできます。[完全な詳細] ページでは、マイルストーンや依存関係など、関連リストを表示することもできます。フィールドの詳細については、「デマンド計画立案アイテムフォーム」または「プロジェクト計画立案アイテムフォーム」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> フリーフォームロードマップが、プロジェクト [pm_project] やデマンド [dmn_demand] など、PPM テーブルのいずれかでビルドされている場合、完全な詳細ページからのみ更新が可能です。

3. 詳細を更新するか、アイテムを削除します。
   - 更新するには、フィールドの詳細を編集して [更新] をクリックします。

     完全な詳細ページが表示されている場合は、[保存] をクリックします。
   - 削除するには、次の手順を実行します。
     a. [完全な詳細] ページで、[その他のアクション] アイコン ( ) をクリックして、[削除] を選択します。
     b. **[OK]**をクリックして確認する。

予定外のアイテムをロードマップに計画する

まだ開始日または終了日のないアイテムをポートフォリオ計画またはフリーフォームロードマップに追加します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
ポートフォリオ計画またはフリーフォームロードマップの基準に一致しているが、開始日も終了日も設定されていない計画立案アイテムは、未スケジュールアイテムとして分類されます。計画を進めながら、未スケジュールアイテムリストを使用して、これらのアイテムをロードマップタイムラインにスケジュール設定します。


手順
1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. サイドバーから、[未スケジュールアイテム] ( ) を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. サイドパネルの予定外のアイテムのリストから、計画立案アイテムをドラッグし、ロードマップ上の任意の場所にドロップします。

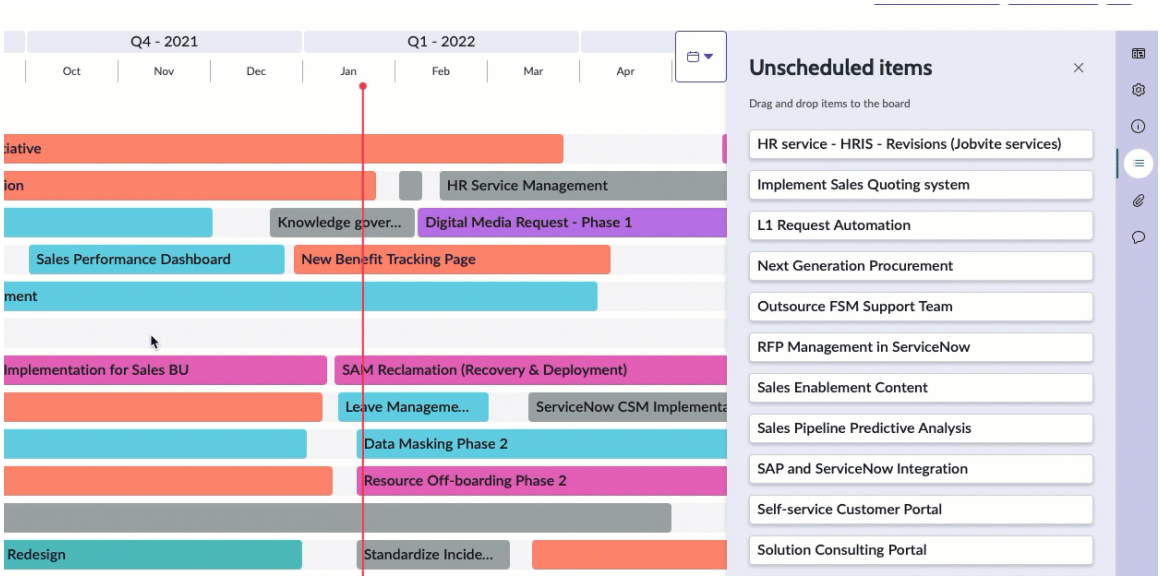

ロードマップアイテムの再スケジュール

ロードマップアイテムの予定日を更新して、スケジュールの優先度の変更を説明します。


始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. ロードマップアイテムに予定されている日付を変更するには、ロードマップアイテムバーのサイズを変更します。
3. ロードマップアイテムを再スケジュールするには、選択したタイムライン領域にアイテムをドラッグアンドドロップします。

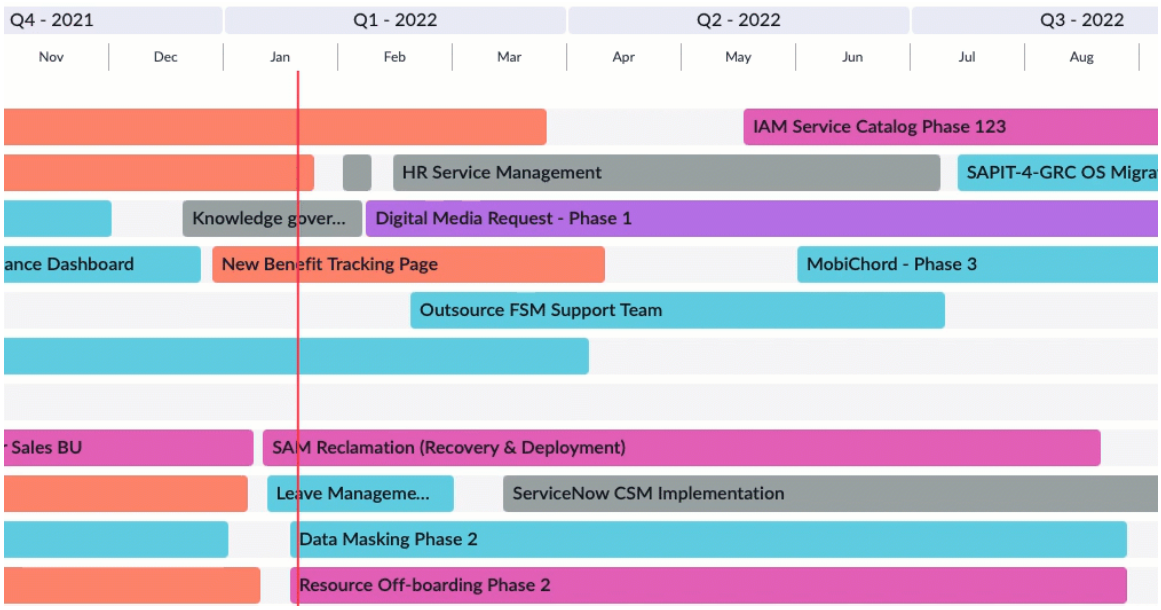

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロードマップのマイルストーンを追加

マイルストーンを作成してロードマップに表示することにより、計画のタイムラインの重要な日付を追跡します。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

ポートフォリオ計画またはフリーフォームロードマップのタイムラインに、ロードマップビューから、開始日、期限、その他の重要なイベントなどのマイルストーンを直接作成します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. [その他のアクション] ドロップダウンから、[新しいマイルストーン] を選択します。



3. フォームのフィールドに入力します。

   フィールドの詳細については、「ロードマップのマイルストーンフォーム」を参照してください。


4. [送信] を選択します。

5. オプション: ロードマップにマイルストーンを追加するには、ステップ 2 ～ 4 を繰り返します。

タスクの結果

作成したマイルストーンはロードマップに表示されます。

以下は、計画期間のさまざまなマイルストーンを示すマイルストーンバーを含むサンプルロードマップの画像です。

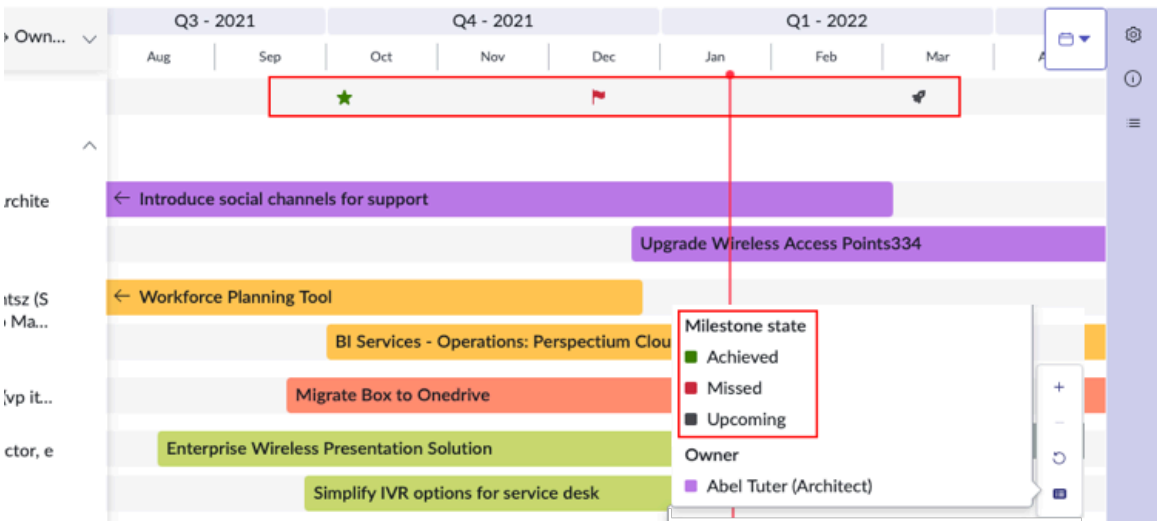


凡例に表示されるマイルストーンの色は、マイルストーンのステータスを示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 赤：達成できなかったマイルストーン。
- 緑：達成されたマイルストーン。
- グレー：今後のマイルストーン。

複数のマイルストーンが互いに近くにスケジュールされている場合、マイルストーンバーにグループ化されて表示されることがあります。この場合、マイルストーンバーを展開したり折りたたんだりして、その期間のすべてのマイルストーンを表示できます。

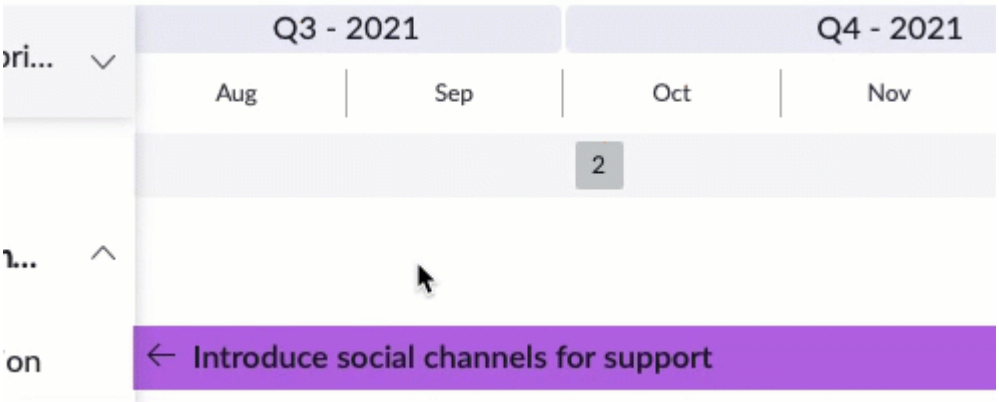

ロードマップマイルストーンを更新

ポートフォリオ計画またはフリーフォームロードマップに追加したマイルストーンを更新または削除して、計画の変更が反映されるようにします。


始める前に
ロードマップのマイルストーンを追加。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. マイルストーンを再スケジュールするには、マイルストーンを選択したタイムライン領域にドラッグアンドドロップします。

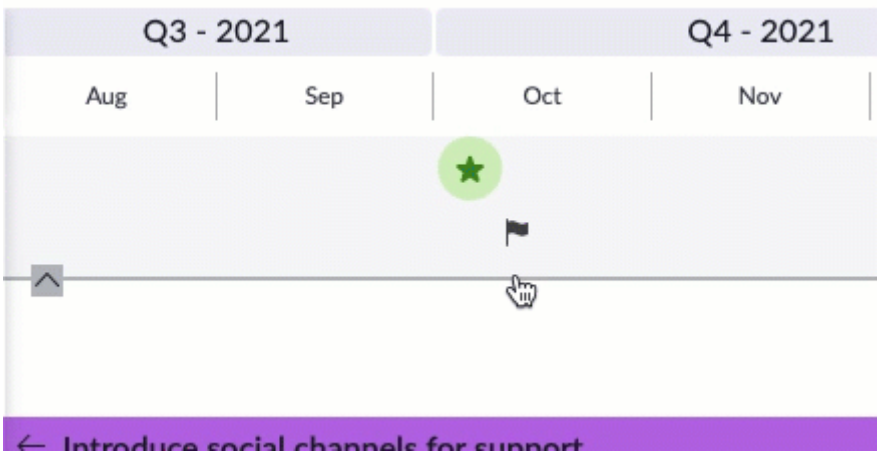

他の詳細を更新したり、マイルストーンを削除したりする場合は、次の手順に進みます。

3. ロードマップビューで、更新するマイルストーンをクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サイドパネルが開き、マイルストーンの詳細が表示されます。

4. マイルストーンを更新または削除します。
   - 更新するには、フィールドの詳細を編集して [保存] をクリックします。

     フォームフィールドの詳細については、「ロードマップ構成フォーム」を参照してください。
   - マイルストーンを削除するには、[削除] をクリックします。

     [OK] を選択して確定します。

ロードマップアイテムのマイルストーンを追加

ロードマップビューから直接マイルストーンを作成して、計画立案アイテム (デマンドやプロジェクトなど) の主要な結果を追跡します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
ロードマップアイテムを選択して、そのマイルストーンを作成します。ロードマップサイドパネルを使用して詳細を入力し、送信します。

フリーフォームロードマップの場合、ソーステーブルが計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] またはその拡張のいずれかの場合のみマイルストーンはサポートされます。

重要:

ロードマップビューからプロジェクトマイルストーンを追加することはできません。プロジェクトマイルストーンを作成または更新すると、関連するプロジェクト計画に影響を与える可能性があります。そのため、プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) のプロジェクトワークスペースを使用してプロジェクトマイルストーンを作成または更新することをお勧めします。

ただし、すでに プロジェクトポートフォリオ管理 による ポートフォリオ計画 と統合している場合、プロジェクトの既存のマイルストーンはすべてロードマップに表示されます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。
2. ロードマップビューから、マイルストーンを追加する計画立案アイテムをクリックします。
   サイドパネルが開き、アイテムの詳細が表示されます。
3. [マイルストーン] タブを選択します。
   または、[完全な詳細] をクリックして、完全な詳細ページから [マイルストーン] タブを選択することもできます。
4. [マイルストーンを追加] アイコン (アイコン) を選択します。
   アイテムにマイルストーンがない場合は、[新しいマイルストーン] を選択します。
5. フォームのフィールドに入力します。

   フィールドの詳細については、「計画立案アイテムのマイルストーンフォーム」を参照してください。
6. [保存] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


[マイルストーン] タブに戻ると、マイルストーンが一覧表示されます。

7. オプション: アイテムにマイルストーンを追加するには、ステップ 2 ～ 6 を繰り返します。

タスクの結果

- 作成したマイルストーンは、ロードマップアイテムバーに示されます。

  以下は、マイルストーンがあることを示すロードマップアイテムを含むサンプルロードマップの画像で

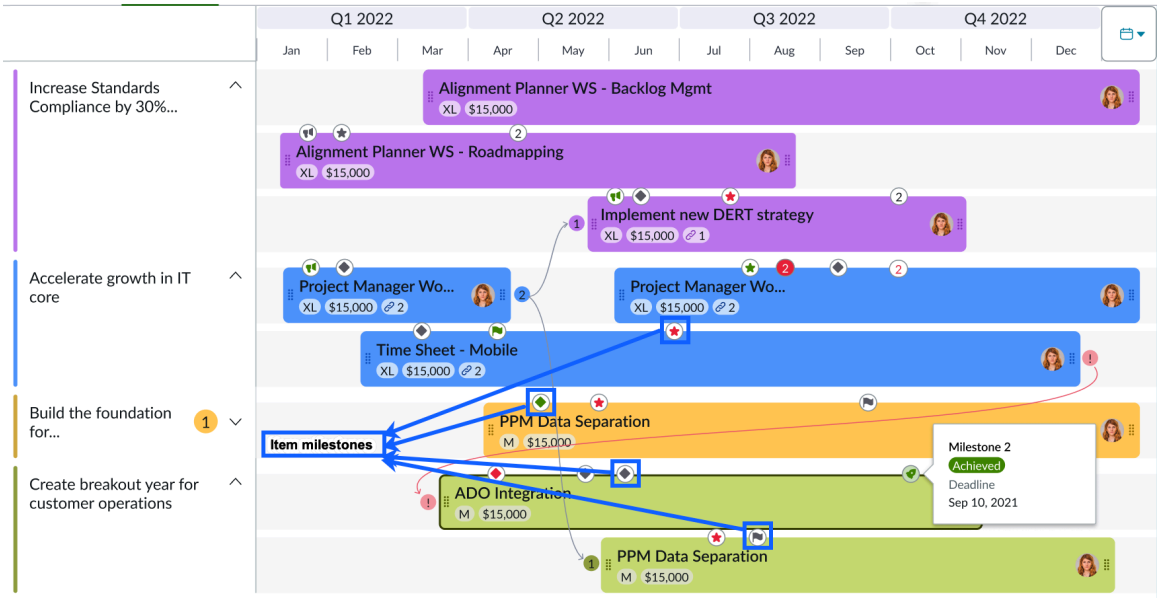

  す。

- これらのマイルストーンインジケーターの上にカーソルを合わせると、マイルストーン名、タイプ、期日などの詳細が表示されます。
- これらのインジケーターのいずれかをクリックすると、[アイテムの詳細] サイドパネルの [マイルストーン] タブが開きます。ここでは、この計画立案アイテムのすべてのマイルストーンのリストを確認できます。

次のタスク

マイルストーンの管理の詳細を表示：

- ロードマップでのマイルストーン表示のカスタマイズ
- ポートフォリオ計画 Workspace のアイテムマイルストーンエラー
- ロードマップアイテムのマイルストーンを更新

ロードマップアイテムのマイルストーンを更新

計画立案アイテム (デマンド、スクラムエピック、プログラムなど) に追加したマイルストーンを更新または削除して、計画の変更が反映されるようにします。

始める前に

ロードマップアイテムのマイルストーンを追加。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

ポートフォリオロードマップまたはフリーフォームロードマップから、計画マイルストーンを選択して詳細を更新します。ロードマップサイドパネルを使用して、詳細を編集して送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フリーフォームロードマップの場合、ソーステーブルが計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] またはその拡張のいずれかの場合のみマイルストーンはサポートされます。

重要:

ロードマップビューからプロジェクトマイルストーンを追加することはできません。プロジェクトマイルストーンを作成または更新すると、関連するプロジェクト計画に影響を与える可能性があります。そのため、プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) のプロジェクトワークスペースを使用してプロジェクトマイルストーンを作成または更新することをお勧めします。

ただし、すでに プロジェクトポートフォリオ管理 による ポートフォリオ計画 と統合している場合、プロジェクトの既存のマイルストーンはすべてロードマップに表示されます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. ロードマップビューから、計画立案アイテムをクリックして、[マイルストーン] タブを選択します。

   サイドパネルに、この計画立案アイテムに関連付けられているすべてのマイルストーンのリストが表示されます。

   または、[完全な詳細] をクリックしてアイテムのレコードページを開き、[マイルストーン] タブを選択できます。

3. 更新するマイルストーンをクリックします。
4. マイルストーンフォームから、詳細を更新するか、マイルストーンを削除します。
   - 更新するには、フィールドの詳細を編集して [保存] をクリックします。

     フォームフィールドの詳細については、「計画立案アイテムのマイルストーンフォーム」を参照してください。

   - マイルストーンを削除するには、[削除] をクリックします。

     [OK] を選択して確定します。

ロードマップアイテムの依存関係を追加

ポートフォリオまたはフリーフォームロードマップの計画立案アイテム間で、依存関係を作成して関係性を可視化して、スケジュールを調整できます。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
ポートフォリオロードマップまたはフリーフォームロードマップから、アイテム詳細のサイドパネルを使用して、2 つの計画立案アイテム間の依存関係を作成します。依存関係は、プロジェクト、エピック、デマンド、イニシアチブ、プログラム、作成したカスタム計画立案アイテムタイプに対応しています。

ロードマップ上の計画立案アイテムの依存関係は、同じロードマップまたは別のロードマップのアイテムにあるか、またはアイテムがまだ計画されていない可能性があります。ロードマップの依存関係について、詳しく説明します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳


注:
フリーフォームロードマップの場合、依存関係は、ロードマップのソーステーブルが計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] またはその拡張の 1 つである場合のみ利用できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。
2. ロードマップビューから、依存関係を追加する計画立案アイテムをクリックします。
   サイドパネルが開き、アイテムの詳細が表示されます。
3. 選択 その他 > 依存関係.
4. [依存関係] タブで、[依存関係を追加] アイコン (アイコン) を選択します。
5. フォームのフィールドに入力します。

   フォームフィールドについては、「依存関係フォーム」を参照してください。
6. [保存] を選択します。

タスクの結果
選択した計画立案アイテム間で依存関係が作成され、アイテム詳細のサイドパネルにある [依存関係] タブに一覧表示されます。

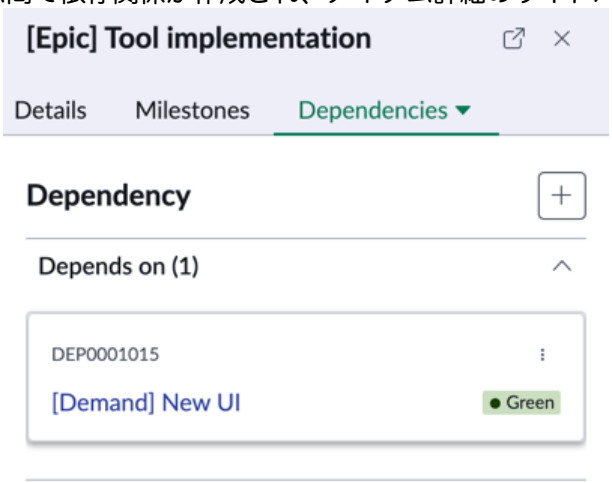


ロードマップで、ロードマップアイテムカードまたは依存関係線から依存関係の詳細を確認することができます。ロードマップにおける依存関係に対して利用可能な表示設定について説明します。

依存関係アイテムのいずれかがロードマップにない場合、依存関係の詳細情報が、外部計画立案アイテムへのリダイレクトリンクと併せて、ロードマップのアイテムカードに表示されます。この場合、アイテムは同じロードマップに属している場合も属していない場合もあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

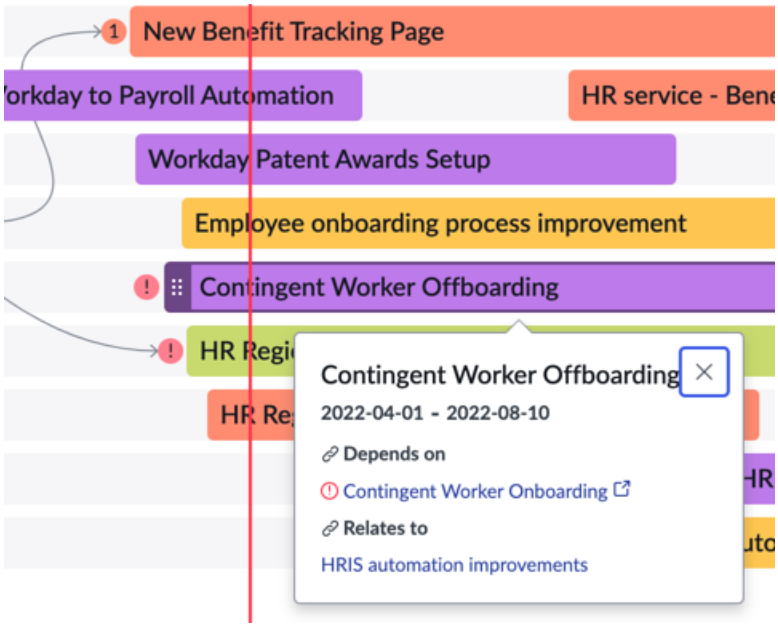

次のタスク

- ロードマップアイテムの依存関係エラーを解決する方法について説明します。
- 依存関係の詳細を更新するか、依存関係を削除します。「ロードマップアイテムの依存関係を更新」を参照してください。

ロードマップアイテムの依存関係を更新

ロードマップ上の計画立案アイテムの依存関係を更新または削除して、計画の変更が反映されるようにします。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
ロードマップサイドパネルを使用して、依存関係の詳細を変更するか依存関係を削除します。

フリーフォームロードマップの場合、依存関係は、ロードマップのソーステーブルが計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] またはその拡張の 1 つである場合のみ利用できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. ロードマップビューで、依存関係を更新または削除する計画立案アイテムをクリックします。

   サイドパネルが開き、アイテムの詳細が表示されます。

3. 選択 その他 > 依存関係.
   この計画立案アイテムの依存関係は、カードの形式でリストされます。

4. サイドパネルから、[その他のアクション] アイコン (⋮) を使用して編集または削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロードマップビューのカスタマイズ

ロードマップの表示方法をカスタマイズします。ロードマップアイテムをグループ化し、カテゴリ別に色分けし、数値データポイントを追加してマイルストーンや依存関係を表示することで、ロードマップを効率的に分析し、情報に基づいた意思決定を行うことができるようになります。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

このタスクでは、ロードマップビューをカスタマイズするためのさまざまなオプションについて説明します。適用するオプションを選択します。

ここで適用される設定は、ロードマップに従う初期設定として保存されます。ロードマップにアクセスできるすべてのユーザーに同じ設定が表示されます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. ロードマップのタイムラインのスケールを変更します。
   タイムスケールアイコン ( ) を選択し、[月]、[四半期]、または [年] を選択します。

   注:
   選択したタイムスケールビューは、ロードマップ設定に保存されます。

3. サイドパネルを使用して、ロードマップの外観をカスタマイズします。

   a. サイドバーから、[カスタマイズ] アイコン ( ) を選択します。

   b. 使用可能な属性でロードマップアイテムをグループ化し、色分けします。

   ロードマップアイテムを最大 2 つの属性でグループ化し、1 つの属性で色分けすることができます。

   アドミンと協力して、[グループごと]、[色別]、および [メトリクス] フィールドの他の属性を追加できます。「ポートフォリオ計画ワークスペースでの優先順位付けとロードマップの計画立案アイテムの表示設定のカスタマイズ」を参照してください。

   c. [所有者] トグルを使用すると、ロードマップアイテムの所有者を表示できるようになります。

   d. [メトリクス] セクションにフィールドを追加して、ロードマップアイテムバーに予定コストなどのデータポイントを表示します。

   最大 3 つのメトリクスを追加できます。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

e. ロードマップアイテム (プロジェクト、エピック、デマンドなど) にマイルストーンがある場合は、[マイルストーン] セクションの切り替えを使用して、それらの表示方法を調整します。
詳細については、「ロードマップでのマイルストーン表示のカスタマイズ」を参照してください。

f. ロードマップアイテムに依存関係がある場合、[依存関係] セクションのトグルで表示方法を調整します。
詳細については、「ロードマップアイテムの依存関係表示のカスタマイズ」を参照してください。

g. 現在の日付のインジケーターを使用して、タイムライン上の現在の日付を特定します。
[その他の設定] セクションで、[現在の日付行] のトグルを有効化します。

4. 計画立案アイテムに条件を適用して、ロードマップに表示されるデータをフィルターします。

a. サイドバーから、[ロードマップアイテムをフィルタリング] アイコン ( ) を選択します。
サイドパネルが開き、現在適用されているフィルターが [フィルターの概要] に表示されます。

b. [フィルターを更新] を選択して、条件を追加したり更新したりします。
AND や **OR** の演算子を使用して条件をビルドします。

c. [適用] を選択します。

5. [依存関係線を表示] アイコン ( ) を使用して、ロードマップアイテム間での依存関係の線表示をすばやく有効化または無効化します。
6. ズームオプションを使用して、ロードマップビューのズームイン、ズームアウト、およびズームのリセットを行います。



注:
選択したズームレベルは、ロードマップ設定として保存されません。

7. ポートフォリオ計画 での優先順位付けとロードマップデータへのクイックフィルターの適用

ロードマップでのマイルストーン表示のカスタマイズ

ロードマップビューでのマイルストーンの表示方法を選択することで、ロードマップタイムラインや計画立案アイテムのマイルストーンを簡単に追跡できます。



ロードマップの [カスタマイズ] ( ) サイドパネルには、ロードマップのマイルストーン表示をカスタマイズするためのさまざまな切り替え機能があります。

- ポートフォリオ計画ロードマップでは、これらの切り替えを常に使用できます。
- フリーフォームロードマップの場合、これらの切り替えは、ロードマップのソーステーブルが計画立案アイテムテーブル [sn_align_core_planning_item] またはその拡張のいずれかである場合のみ使用できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



自動翻訳

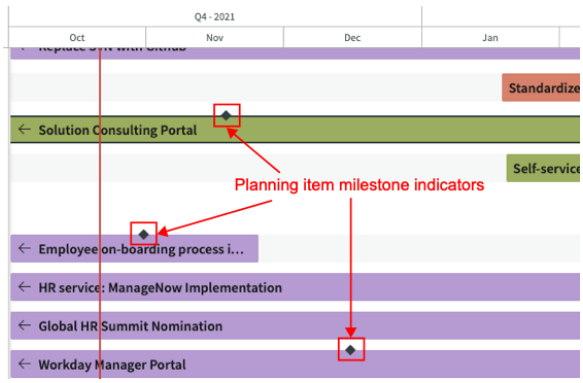

マイルストーンの切り替え	ロードマップビュー
ロードマップのマイルストーン ロードマップタイムラインのマイルストーンを表示します。	
アイテムマイルストーン 計画立案アイテムのマイルストーンを表示します。	
マイルストーンのみ すべての計画立案アイテムバーを非表示にして、ロードマップ上のマイルストーンのみを表示します。 この切り替えを選択すると、[グループごと] フィールドと [色別] フィールドが変更され、無効になります。この切り替えをオフにすると、以前のカスタマイズ設定が使用可能になります。 このビューでは、マイルストーンインジケーターが色分けされていることも確認できます。 • 赤：欠落 • 緑：達成 • 黒/ダークグレー：予定	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マイルストーンの切り替え	ロードマップビュー
注: アイテムレベルのマイルストーンの合計数 (未スケジュールアイテムのマイルストーンを含む) が 100 を超える場合、そのアイテムのマイルストーンインジケーターはロードマップに表示されません。アドミンと協力して、この数を希望の値に変更することができます。詳細については、「ポートフォリオ計画 での優先順位付けおよびロードマップに対するアイテムの表示制限の更新」を参照してください。	
マイルストーンラベル マイルストーンラベルを表示します。	ラベル付きのマイルストーンインジケーター  ラベルなしのマイルストーンインジケーター 

ロードマップアイテムの依存関係表示のカスタマイズ

ロードマップビューでの依存関係の表示方法を選択することで、計画立案アイテム間の関係性の識別の効率を向上します。




ロードマップの [カスタマイズ] ( ) サイドパネルには、ロードマップにおける依存関係表示をカスタマイズするためのさまざまな切り替え機能があります。

- ポートフォリオ計画ロードマップでは、これらの切り替えを常に使用できます。
- フリーフォームロードマップの場合、これらの切り替えは、ロードマップのソーステーブルが計画立案アイテムテーブル [sn_align_core_planning_item] またはその拡張のいずれかである場合のみ使用できます。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

依存関係トグル	ロードマップビュー
依存関係を表示 計画立案アイテムバーの左右にある円の形態で依存関係を示します。 これらの円 (1) の中に数字が示されています。これは、アイテムが共有する依存関係の番号を表します。また、赤色で表示 (!) されている場合は、依存関係が競合していることを表します。 **注:** [依存関係] セクションで他の 2 つのトグルを使用するには、このトグルを有効にする必要があります。	ロードマップにおける依存関係の円 
依存関係行 依存関係を計画立案アイテム間の線で示します。 これらの線は、次の場合にのみ表示されます。 • 依存関係にある両方の計画立案アイテムが同じロードマップ内にある • 依存関係のタイプが [依存] である	計画立案アイテム間の依存関係の線 
依存関係のあるアイテムのみ ロードマップをフィルタリングして、少なくとも 1 つの [依存] タイプを持つ計画立案アイテムのみを表示します。 ここで表示されるアイテムは、現行のロードマップ内外のアイテムに依存している可能性があります。	依存関係のあるアイテムのみを表示するロードマップ 

ロードマップアイテムの進捗状況を追跡する

追跡モードを使用して、ポートフォリオ計画ロードマップまたはフリーフォームロードマップ上の作業アイテムの完了を視覚的に追跡します。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

トグルを使用して、ロードマップビューを計画モードから追跡モードに切り替えます。ロードマップアイテムカードは、ステータスと進捗状況を示す進捗状況バーに変わります。

注:
追跡モードでは、ロードマップアイテムとマイルストーンを作成、更新、または再スケジュールすることはできません。このビューは読み取り専用モードです。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. ロードマップの追跡ビューをオンにするには、追跡モードの切り替えを使用します。




3. オプション: 追跡モードでロードマップビューをカスタマイズします。

> **注:**
> ロードマップの計画立案モードで行ったグループ化とパーソナライズによる色分けは追跡モードに引き継がれますが、メトリクスは引き継がれません。


   a. [ステータス] と [完了率] をそれぞれ切り替えて、ロードマップアイテムの [ステータス] と [完了率] のヴィジビリティを有効または無効にします。

   b. [メトリクス] セクションにフィールドを追加して、ロードマップアイテムバーに予定コストなどのデータポイントを表示します。
   追跡モードでは、最大 2 つのメトリクスを追加できます。

   c. マイルストーンの表示をカスタマイズします。
   マイルストーンをアイコンだけで表示するか、ラベルと一緒に表示するかを選択できます。

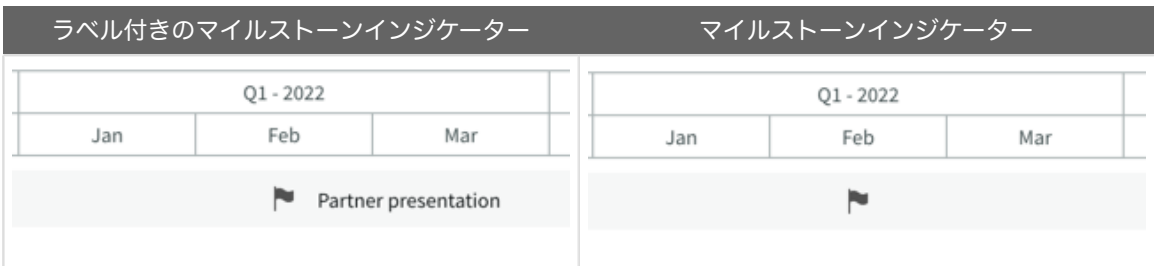

タスクの結果
ロードマップの追跡ビューは、カスタマイズ設定に従って表示されます。ロードマップ追跡のサンプルビューを次の画像に示します。

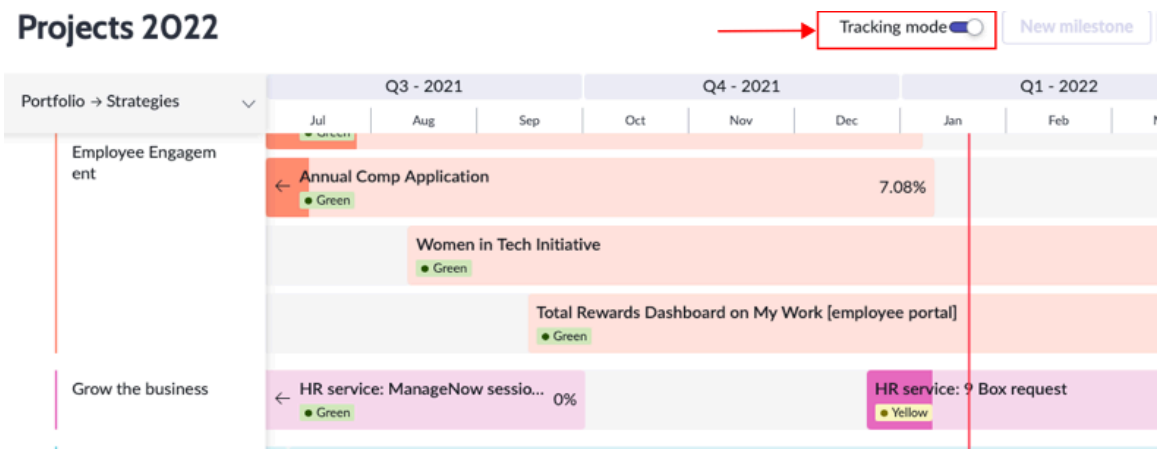

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ポートフォリオ計画 での優先順位付けとロードマップデータへのクイックフィルターの適用

[優先順位付け] および [ロードマップ] タブのデータにフィルターをすばやく適用し、タブのすべてのビューで一貫したデータを使用してシームレスに計画できるようにします。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

クイックフィルターは、優先順位付けとロードマップのリストビューと階層ビューに表示されるデータをフィルタリングするのに役立ちます。これらのフィルターはユーザー設定として保存されます。これにより、後で再度ログインした場合でも、タブのすべてのビューで同じデータを表示できるため、作業をシームレスに計画、優先順位付け、ロードマップすることができます。


手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. 作業するタブに基づいて、[優先順位付け]、[ロードマップ]、または [キャパシティ計画立案] を選択します。

   デフォルトでは、[ロードマップ] タブのデータは [優先順位付け] の [計画] ステータスでフィルタリングされ、 優先順位付けされたアイテムのみが表示されます。
4. ポートフォリオ計画ヘッダーから、[フィルター] を選択して、条件を追加します。

   タブ内で、選択または参照タイプのフィールドのみにフィルターを追加できます。

   - それぞれのビューで利用可能なフィールドのみにフィルターを適用できます。
   - フィルターが自動的に適用され、タブに表示されるデータが自動的に更新されます。
   - [優先順位付け] タブで設定されたフィルターは [ロードマップ] タブに適用されず、その逆も同様です。
   - 1 つのビューに設定されたフィルターは、同じタブ内の他のビューにも適用されます。

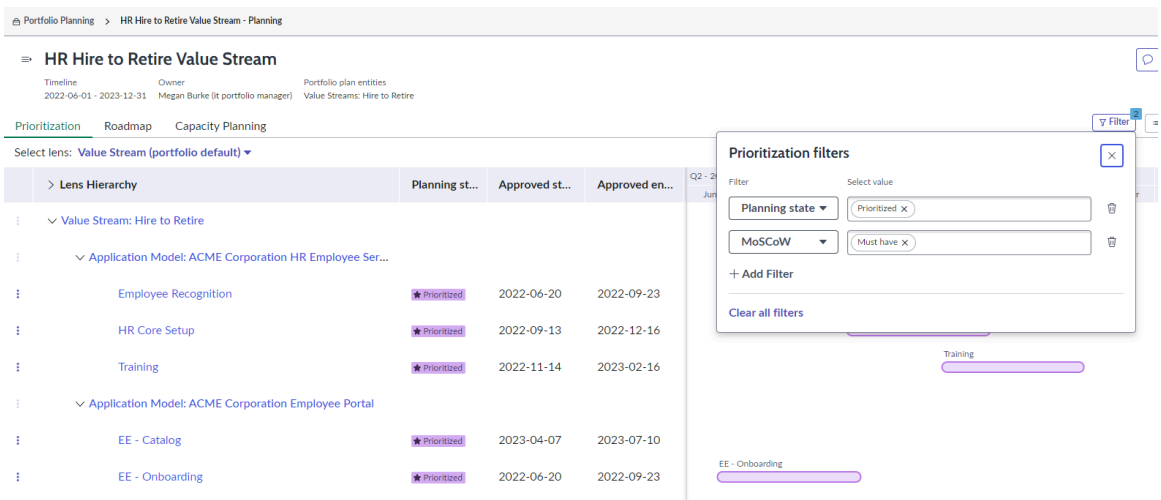


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

でのシナリオ計画による計画の最適化 ポートフォリオ計画

ポートフォリオマネージャーは、潜在的な結果を比較し、戦略的目標との整合性を評価し、最適なシナリオを本稼働計画として承認することで、ポートフォリオ計画を最適化します。


[優先順位付け] タブのシナリオ計画アイテム

[シナリオ] ページの [優先順位付け] タブでは、シナリオに対して計画立案アイテムを追加または削除したり、日付を調整したりできます。

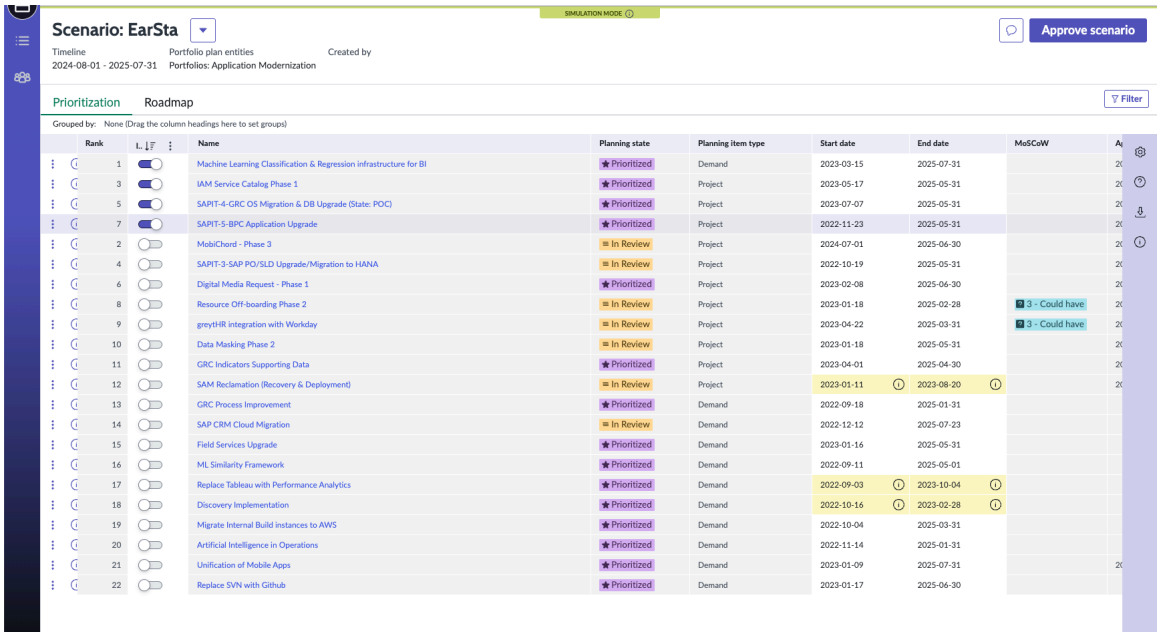

[ロードマップ] タブのシナリオ計画アイテム

[ロードマップ] タブには、シナリオ内の計画立案アイテムのガントチャートのようなビューが表示され、ポートフォリオ計画タイムライン全体での開始予定日と終了予定日が示されます。[ロードマップ] タブを使用すると、タイムライン全体で計画立案アイテムを表すバーをドラッグして日付を調整できます。

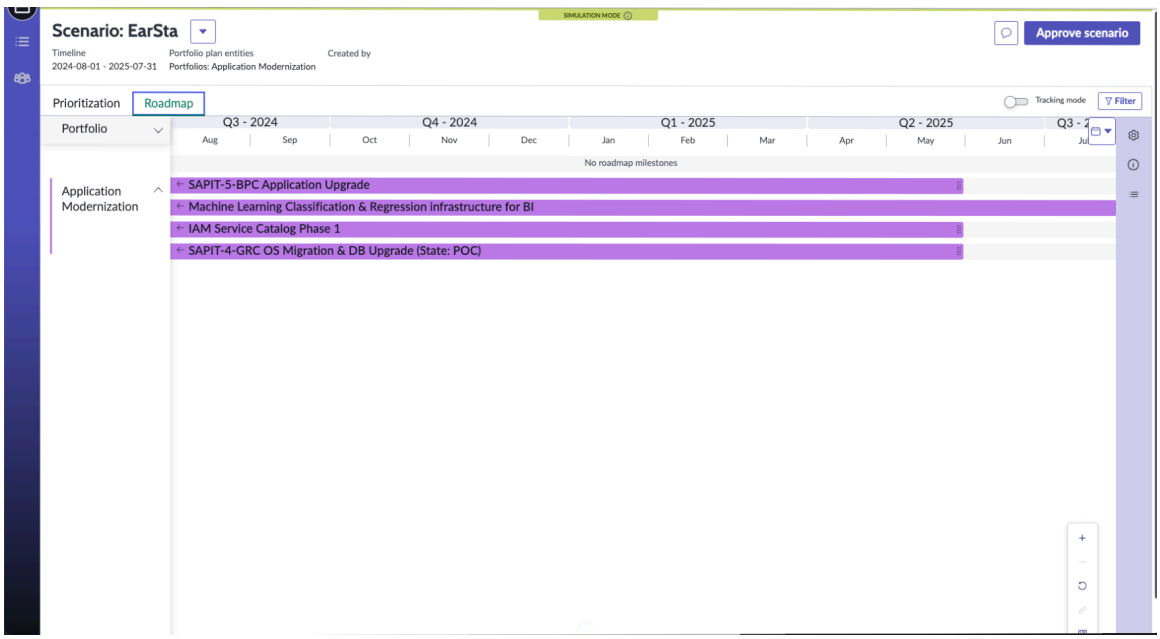


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[財務] タブのシナリオ計画アイテム

[シナリオ] ページの [財務] タブでは、結果パネルを使用してカスタムターゲットと予算を設定し、割り当てられた予算をターゲットと比較できます。

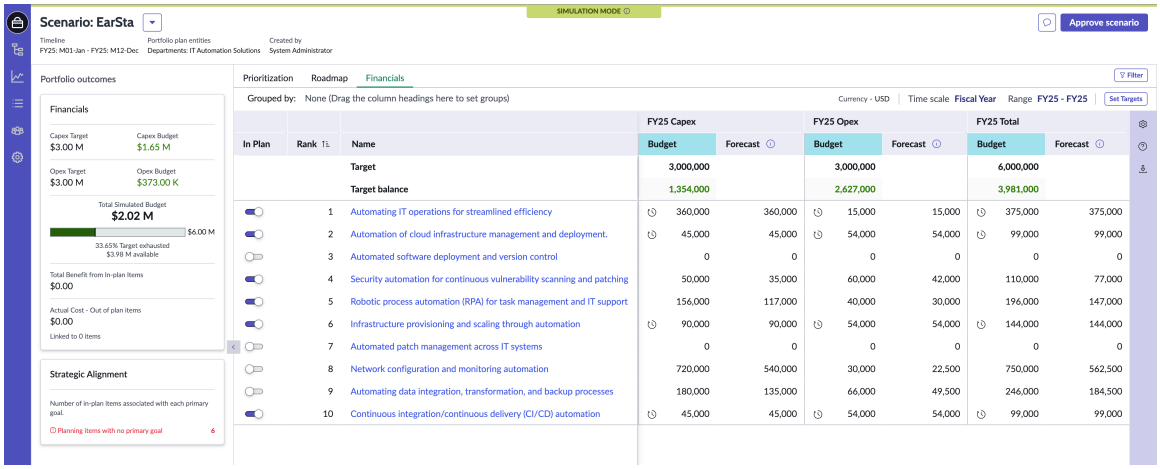

ポートフォリオマネージャーは、さまざまな予算の組み合わせを持つ複数のシナリオをシミュレートし、その結果を比較して、情報に基づいた意思決定を行い、リソースと戦略的目標のバランスを取ることができます。シナリオ計画の財務ビューを使用して、財務情報のシミュレーションモードを取得できます。ポートフォリオマネージャー、プログラムマネージャー、ポートフォリオを担当するポートフォリオユーザーなどの戦略的計画立案ユーザーは、このビューを使用して、特定の計画サイクル (月次、四半期、年次、または 1 年以上最大 5 年) のポートフォリオ予算ターゲットを設定できます。この定義された予算を使用して、ポートフォリオユーザーは、ポートフォリオ内の計画立案アイテムに優先順位を付けて、優先順位付けされたアイテムがポートフォリオ予算内で実行できるかどうかを分析すると同時に、優先順位付けされたアイテムによる金銭的利益を確認できます。

重要:
予算割り当てプロパティを有効にして 、ポートフォリオレベルで計画立案アイテムに予算を割り当て、経費タイプまたは原価費目別に予算を割り当てる予算 属性を設定します 。

複数のシナリオを作成して比較し、ステークホルダーと協力して、金銭的利益リターンが改善された理想的な計画を承認します。承認されると、承認されたシナリオが定義された計画サイクルの新しいポートフォリオ計画になります。シナリオ承認後にポートフォリオで発生する変更の詳細については、「 シナリオの承認」を参照してください。

財務シナリオ計画は、定期的な計画サイクル、四半期レビュー、財務レビューサイクルなど、組織のニーズに応じて計画サイクルまたは実行サイクル全体を通じて実行できます。シナリオ計画の財務は、情報に基づいた意思決定に到達し、組織のニーズに合わせてポートフォリオ計画をカスタマイズするのに役立ちます。

注:

- シナリオ計画の財務は、エピック、プロジェクト、およびデマンドタイプの計画立案アイテムでのみサポートされています。
- 従来の投資枠管理を使用している顧客は、新しいエクスペリエンスに移行して財務シナリオ計画に取り組む必要があります。

タイムスケールと範囲フィルターを使用して、シナリオ計画の財務ビューをカスタマイズします。組織の計画サイクルに応じて、月次、四半期ごと、または年次の頻度で計画立案アイテムの予算を管理します。

シナリオ計画の [成果] パネル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

シミュレーションの [結果] パネルには、投資および経費のターゲット金額と予算金額、このシミュレーションの予算ターゲットの設定、ターゲットからの使用済み予算と残りの予算、計画内項目からの利益、および計画外項目からの実績コスト会計など、ポートフォリオの財務情報が表示されます。集計データは、ターゲットデータと予算データを含むポートフォリオタイムライン範囲に基づいてフェッチされます。

識別のための結果パネルの表現。

[結果] パネルの表現

表示	定義
シミュレートされた予算合計の進捗状況バー表示のない金額の赤色のテキスト	このシナリオのターゲット金額の定義または設定はありません。
金額の赤いテキストとシミュレートされた合計予算の赤い進捗状況バー	計画立案アイテムに割り当てられた予算の合計が、シナリオの設定済みターゲット金額を超えています。
投資予算の金額 (赤)	投資予算の割り当てがシナリオの投資ターゲットを超えています。
経費予算の赤色テキストの金額	経費予算の割り当てがシナリオの経費ターゲットを超えています。
予算金額の緑色のテキストと緑色の進捗状況バー	各経費タイプと合計予算の予算割り当てが、シナリオに設定されたターゲット内である。

シナリオ計画の機能

シナリオ計画では、次のアクションを実行できます。

機能	説明
シナリオの作成	シミュレートされた環境で現在の計画または別のシナリオからシナリオを作成し、そのシナリオを実際の計画や他のシナリオと比較します。
シナリオを比較	シナリオと実稼働計画を並べて比較し、トレードオフと計画に追加または削除されたアイテムを確認します。
シナリオの承認	最適なシナリオを承認します。
シナリオの管理	シナリオのリストを表示したり、シナリオの名前を変更したり、シナリオを削除したりします。

シナリオ計画のユースケース

シナリオ計画のユースケースの概要を次に示します。

- 会計年度の計画 - ACME Inc のポートフォリオマネージャーである Megan Burke は、翌会計年度の計画を立てており、計画立案アイテムに優先順位を付け、組織の戦略的目標に合わせる必要があります。Megan はポートフォリオ計画のシナリオを作成し、[優先順位付け] タブを使用してアイテムを目標に合わせます。Megan は、プログラムマネージャーや財務チームと話し合い、複数のシナリオを作成して比較します。Megan は、翌会計年度の適切に調整された戦略的ポートフォリオ計画として最適なシナリオを承認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- サイクル半ばの優先順位付け直し - 年度半ばに予定されている優先順位の変更により、現在のポートフォリオ計画の調整が必要になります。ACME Inc. のプロダクトマネージャーである John Doe は、シナリオを作成し、変更した優先順位を組み込みます。John は、プログラムマネージャーと財務チームのフィードバックに基づいて計画を調整し、計画を確定します。

シナリオの作成

シミュレートされた環境で実際の計画または別のシナリオからシナリオを作成し、そのシナリオを実際の計画や他のシナリオと比較します。

始める前に

必要なロール：

- sn_align_core.apw_user
- sn_align_ws.spw_financial_user - 財務の詳細を表示および編集します。

このタスクについて

シナリオを作成すると、潜在的な結果を可視化して予測できます。シナリオは、本稼働計画または別の既存のシナリオに基づいて作成できます。1 つ以上のシナリオを作成したら、それらを本稼働計画と並べて比較し、最も望ましいシナリオを承認できます。承認したシナリオが本稼働計画になります。

手順


1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [シナリオを作成] を選択します。

   注:
   最初のシナリオを作成する前に、[シナリオ] ページに [シナリオ計画] ボタンが表示されます。このような場合は、[シナリオ計画] を選択すると、[シナリオを作成] ボタンが表示されます。

   a. [シナリオ名] フィールドにシナリオの名前を入力します。
   b. オプション: [説明] フィールドにシナリオの詳細を入力します。
   c. [コピー元] フィールドで、[現在の計画 *(Current Plan)]* またはシナリオの作成ベースにする既存シナリオの名前を選択します。
   d. [作成] を選択します。
   [シナリオ計画] - [シナリオ名] ページが表示され、[優先順位付け] タブが開きます。[優先順位付け] タブには、本稼働計画またはシナリオのコピー元の既存のシナリオにあるすべての計画立案アイテムが一覧表示されます。計画立案アイテムの開始日と終了日は、本稼働計画で指定された日付または実際の実行日に基づいて決定されます。
   - [計画中 **(In Plan)]** トグル：デフォルトでは、計画ステータスが [優先順位付け] または [完了] であり、開始日がポートフォリオ計画タイムライン内にある計画立案アイテムに対して、[計画中 **(In Plan)]** トグルがオンになります。[計画中 **(In Plan)]** トグルは、ステータスが [新規]、[レビュー中]、または [キャンセル済み] のアイテムに対してオフになります。
   - 範囲外の日付を黄色でハイライト表示：ポートフォリオ計画タイムラインの範囲外である計画立案アイテムの日付は、黄色の背景でハイライト表示されます。このようなアイテムの場合、[計画中 **(In Plan)]** トグルはオフになります。
4. [優先順位付け] タブを使用して、追加の計画立案アイテムをシナリオに含めるか除外します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

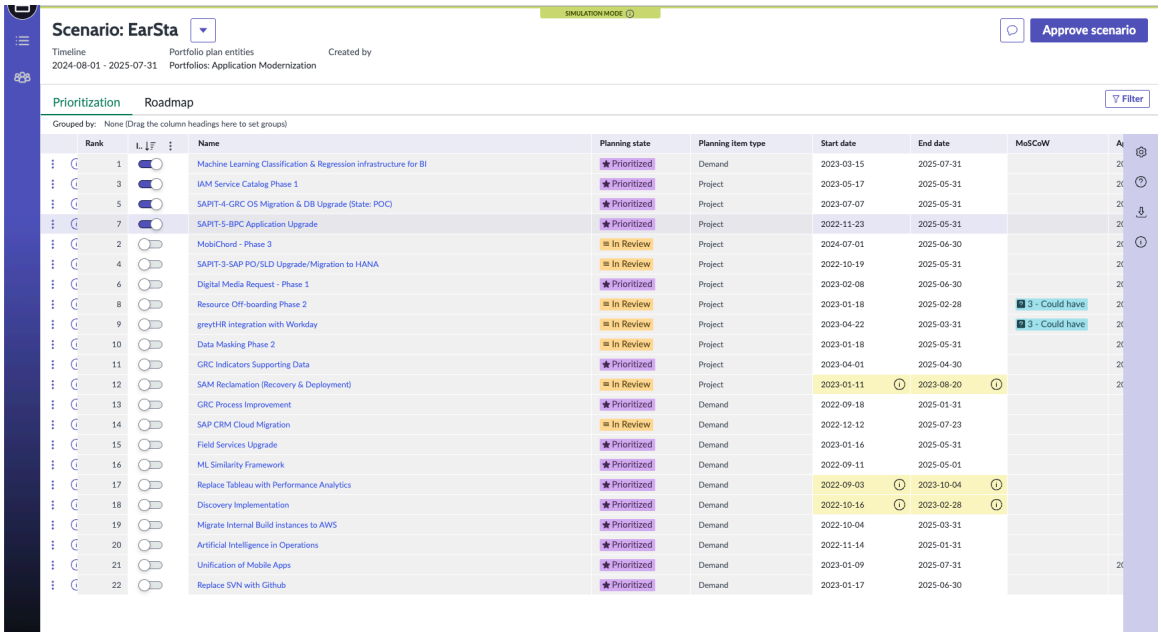


a. オプション: シナリオから計画立案アイテムを除外するには、[計画中 **(In Plan)]** トグルをオフにします。

b. オプション: シナリオに計画立案アイテムを含めるには、ポートフォリオ計画タイムライン内に収まるようにアイテムの開始日と終了日を編集し、[計画中 **(In Plan)]** トグルをオンにします。

タイムライン範囲外のアイテムをシナリオに含めると、これらのアイテムは計画立案および優先順位付けのプロセスの間はシナリオに残ります。シナリオが承認されると、これらのアイテムの日付はシナリオの日付に合わせて更新されます。ただし、これらの更新日は元のポートフォリオ計画タイムラインから外れているため、アイテムは本稼働ポートフォリオ計画から移動されます。

5. [ロードマップ] タブを使用して、計画立案アイテムの依存関係を表示し、計画立案アイテムの日付を調整します。

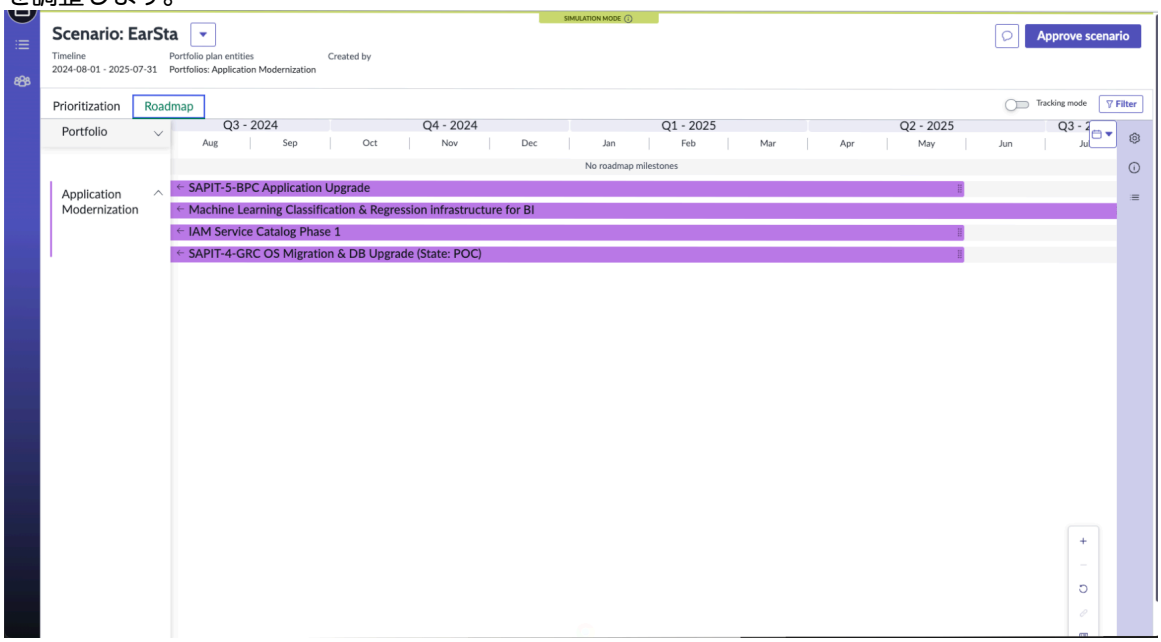

a. 計画立案アイテムのバーの開始または終了をドラッグして、開始日または終了日を変更します。


b. 計画立案アイテムのバーをドラッグして、計画タイムライン内で移動します。

c. さまざまな計画立案アイテムの依存関係とマイルストーンを表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

6. [財務] タブを使用して、適切なアイテムの優先順位付け、投資、実行を表示し、組織に最高の投資収益率をもたらします。

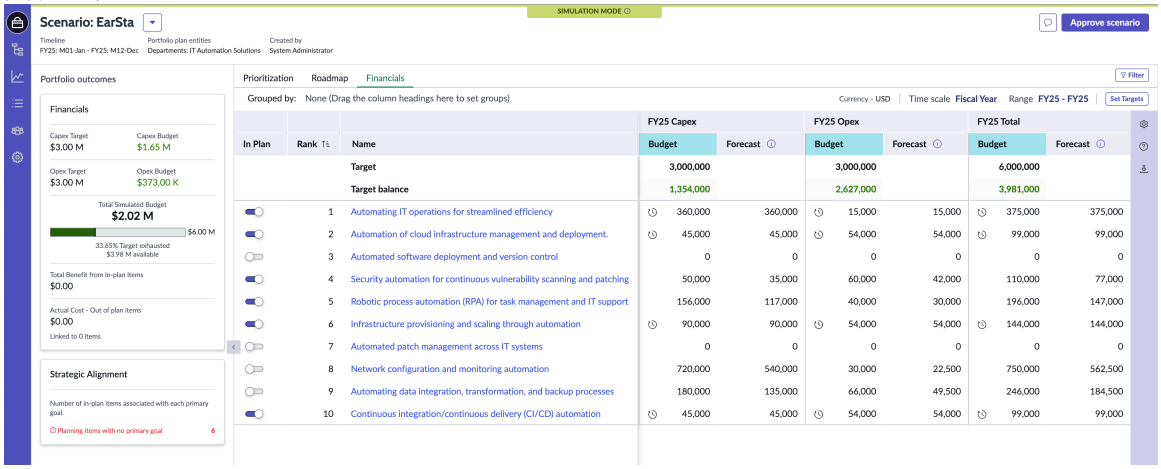

a. ポートフォリオ予算のターゲットを設定します。

i. [ターゲットの設定] ボタン ([Set Targets]を選択します。

ii. [ターゲットを設定] ウィンドウで、インライン編集機能を使用して経費タイプまたは原価費目の予算を設定します。

> **ヒント:**
> [タイムスケール] と [範囲] を変更して、組織の計画サイクルに合わせて、月次、四半期ごと、または年次の頻度で各会計期間のターゲットを設定できます。ターゲットはより高いタイムスケールに設定され、会計期間間で均等に分割されます。

シナリオにターゲットが設定されると、[ターゲット] 行に、会計期間および予算割り当ての選択肢別に定義されたターゲット金額が表示されます。

b. [計画内] トグルを使用して、シナリオに計画立案アイテムを含めたり除外したりします。

c. インライン編集機能を使用して、個々の計画立案アイテムの予算を追加または予算を削減します。

シナリオの作成中に予算に加えられた変更は、 を示すアイコンになります。

次のタスク

- 必要に応じて、さらにシナリオを作成します。
- シナリオを比較。シナリオアクションリストから [シナリオを比較] を選択すると、シミュレーションモードからシナリオを直接比較できます。
- シナリオの承認。

シナリオを比較

シナリオを並べて比較して、包括的な計画を評価し、リソース使用率を最適化し、実現可能性と財務情報を確認します。

始める前に

1 つ以上の計画立案シナリオを作成し、実行する計画立案アイテムを選択していることを確認します。詳細については、「シナリオの作成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：


- sn_align_core.apw_user
- sn_align_ws.spw_financial_user:財務ウィジェットを表示します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [シナリオを作成] メニューから、[シナリオを比較] を選択します。
   [シナリオを比較] ページが表示されます。
4. [比較するシナリオを追加] を選択し、比較に含めるシナリオを選択または選択解除します。
   最大 5 つのシナリオを比較に追加できます。
5. [比較] を選択します。
   [シナリオ] ページの [シナリオアクション] メニューから [シナリオを比較] を選択して、[シナリオを比較] ページを表示することもできます。[シナリオを比較] ページが表示され、[シナリオ] ページで現在の計画との比較に含まれるシナリオが開きます。
   選択したシナリオが [シナリオを比較] ページに並べて表示されます。
6. 予算とターゲット、利益、予算配分、トレードオフなど、シナリオのさまざまな側面を比較します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

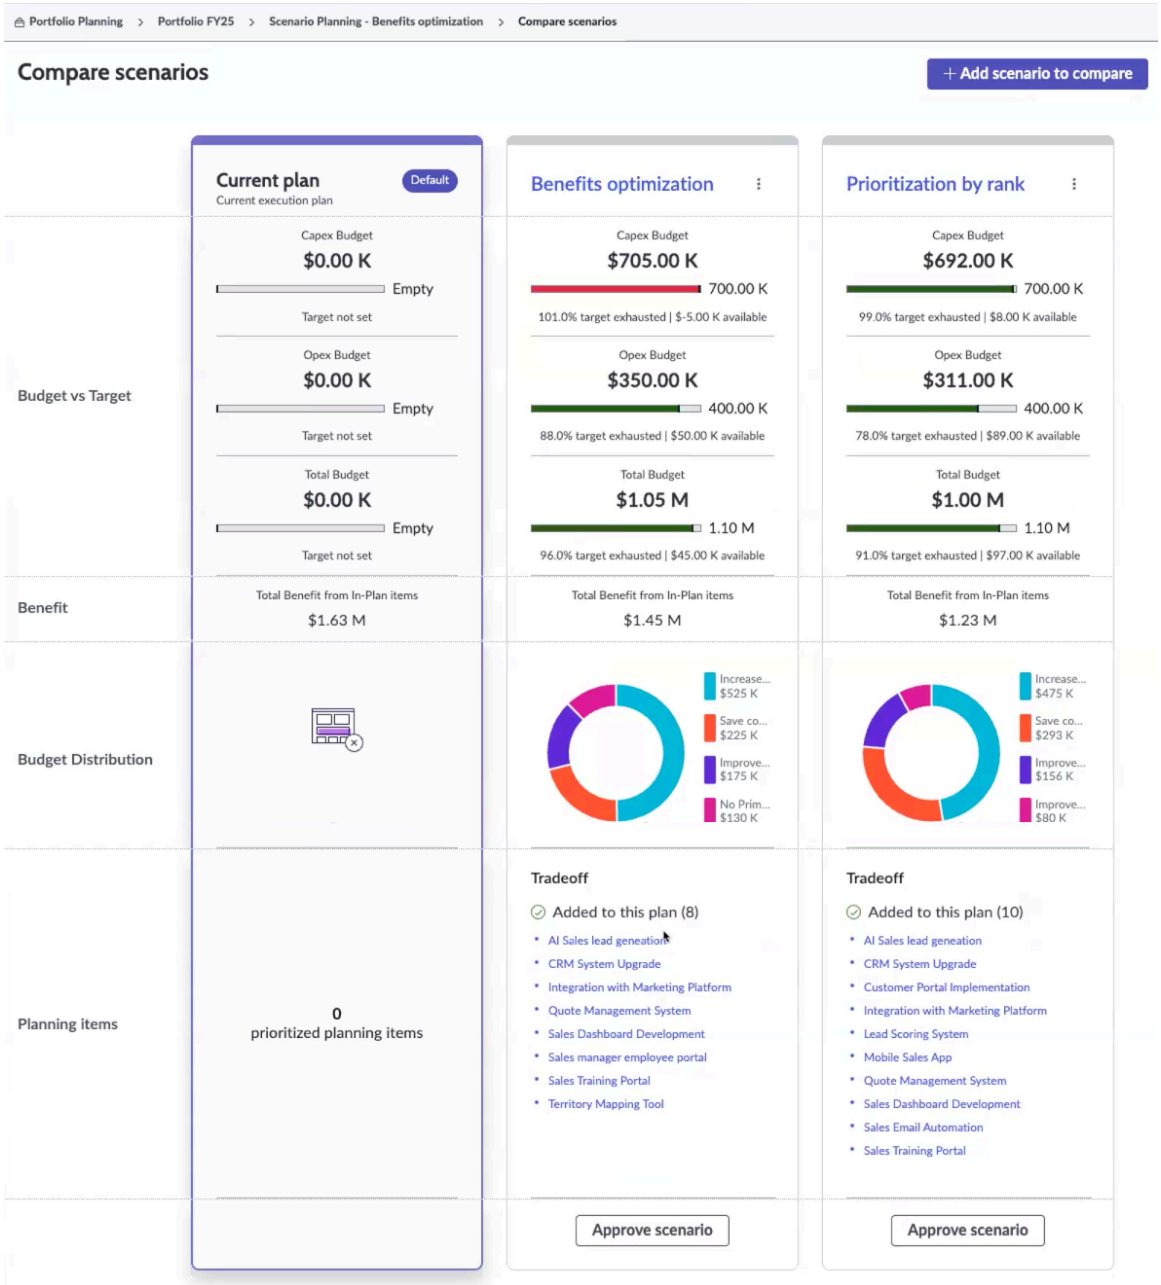

注:
[シナリオを比較] ページのコストと利益のウィジェットは、シナリオ計画中に予算が手動で変更されていない 計画 内アイテムのライブデータを読み取ります。

シナリオ比較の視覚的な手がかり

クライテリア	説明
この計画から削除されました	シナリオが承認されたときに計画から削除されたアイテムには、赤色の X が付きます。
この計画に追加されました	シナリオが承認されたときに計画に追加されたアイテムには、緑色のチェックマークが付きます。

次に、承認のシナリオの適合性を示すいくつかの指標を示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- すべての計画立案アイテムは、組織の目標を効果的にサポートする重点的な戦略を提供します。
- トレードオフのセクションには、関連アイテムが含まれており、プロジェクトまたはイニシアチブのさまざまな側面に対処する包括的で包含的な計画を示しています。
- シナリオは現実的で達成可能であり、現在の制約と機能を考慮し、計画されたアクションを与えられた時間枠と予算内で実行できることを確認しています。
- ウィジェットを使用したファイナンシャルプランによるメリットの向上、設定されたターゲットに対して割り当てられた予算を検証するための [予算とターゲット]、より良い金銭的利益のあるシナリオを特定するための [メリット]、および [予算配分]。

7. オプション: シナリオに関連する [シナリオの承認] ボタンを選択して承認します。
ポートフォリオ計画ワークスペースでの既存のシナリオの承認の詳細については、「 シナリオの承認」を参照してください。

次のタスク
シナリオの承認

シナリオの承認

組織の目標に沿っており、現在の計画にするための最良のビジネス成果が得られるシナリオを承認します。

始める前に
シナリオを比較済みで、承認するシナリオを選択していることを確認します。詳細については、「シナリオを比較」を参照してください。

必要なロール：

- sn_align_ws.scenario_approver
- sn_align_ws.spw_funding_user - 財務上の変更を表示して承認します。

このタスクについて
シナリオを承認するときに：

- [計画中 (In Plan)] ステータスの計画立案アイテムは、[優先順位付け] ステータスに更新されます。
- 計画から移動した計画立案アイテムは、[レビュー中] ステータスに変更されます。
- それに応じて承認日が修正されます。
- 計画立案アイテムの予算に加えられた変更は、予算として承認されます。

手順


1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [シナリオを作成] メニューから、[シナリオを比較] を選択します。

   [シナリオの承認] ボタンは、[シナリオ] ページでも使用できます。シナリオを作成すると、他のシナリオと比較せずにシナリオを直接承認できます。

4. 承認するシナリオに関連する [シナリオの承認] ボタンを選択して承認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

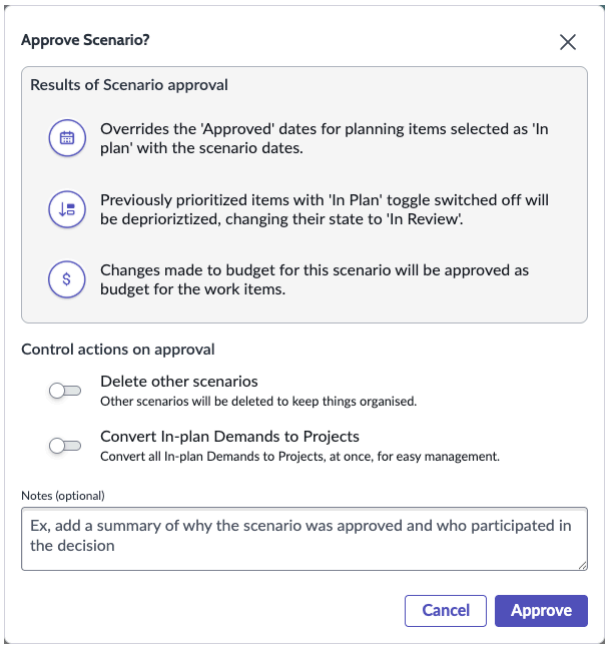

シナリオの承認中に、次のことができます。

- [計画内のデマンドをプロジェクトに変換] トグルを選択して、ポートフォリオ計画を自動的にビルドするために、優先化されたデマンドをプロジェクトに変換します。
- [他のシナリオを削除] トグルを選択して、残りのシナリオを削除します。
- [メモ] フィールドにシナリオを承認する理由を入力します。

5. [承認] を選択します。

シナリオの管理

[シナリオの管理] オプションを使用して、すべてのシナリオのリストの表示、シナリオの名前変更、またはシナリオの削除を行います。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. 移動先 シナリオを作成 > シナリオを管理します。.
   [シナリオ] ページの [最近のシナリオ] メニューで [シナリオの管理] を選択することもできます。
   [シナリオの管理] ダイアログに、現在の計画に関連するシナリオのリストが表示されます。
4. 次のいずれかのアクションを実行します。

ポートフォリオ計画 でのキャパシティ計画立案の使用

リソースキャパシティを評価し、既存の割り当てを確認します。これは、リソースのアサイン作業中に情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

[リソースキャパシティを管理] 画面を使用して、リソースキャパシティの詳細を生成します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[キャパシティ計画立案] 画面を使用して、ポートフォリオへのリソースキャパシティマッピングに関する詳細情報を表示します。

リソースキャパシティを管理

[リソースキャパシティを管理] 画面

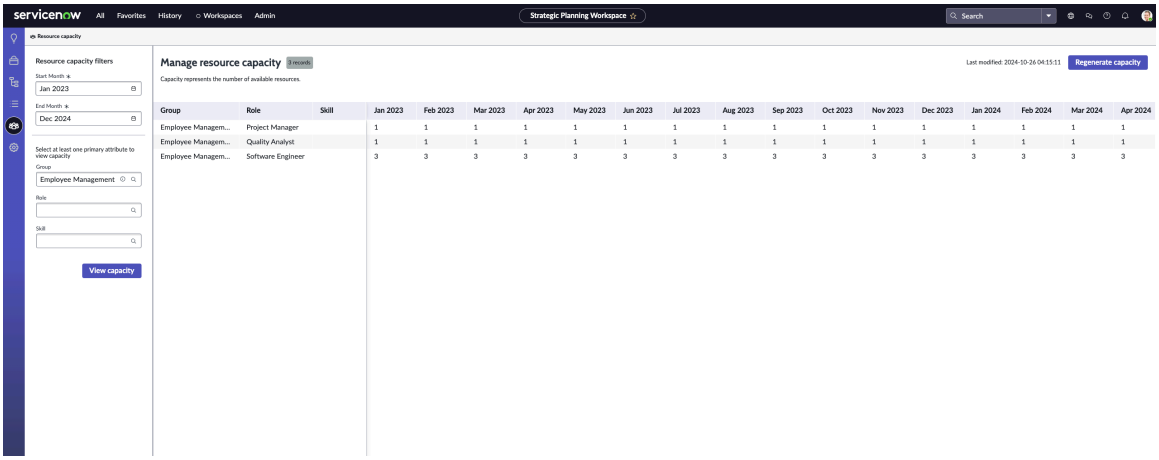

[リソースキャパシティを管理] を使用して、期間とプライマリ属性を選択して、利用可能なリソースの数を表示します。生成されたリソースキャパシティの詳細が保存されます。キャパシティを再生成して、リソース可用性の最新の変更を表示できます。

[リソースキャパシティ] 画面では、次のデータを表示できます。

- 生成されたキャパシティのリソース可用性。
- 月次ブレークダウンビューで利用可能なリソースの合計数。
- キャパシティの詳細を生成する最新の日付。
- 従業員プロファイルマッピングから最新のキャパシティの詳細を再生成してフェッチするオプション

[リソースキャパシティを管理] 画面では、次のことができます。


- 必要な日付範囲で特定のキャパシティ属性を持つリソースをフィルタリングして、利用可能なリソースの数を表示します。
- キャパシティの詳細を再生成し、リソース従業員プロファイルマッピングから最新の詳細を表示します。

リソース基準を選択

- プライマリ属性を選択すると、優先順位付けされた計画立案アイテムのリソースのアサインから利用可能なグループ、ロール、またはスキルが自動的に表示されます。
- 自動選択と手動選択オプションを切り替えて、すべての計画立案アイテムに割り当てられたリソース工数を表示するか、カスタムデータを表示します。
- リソース基準を定義して、優先順位付けされた計画立案アイテムのリソースのアサインから利用可能なグループ、ロール、またはスキルを表示します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

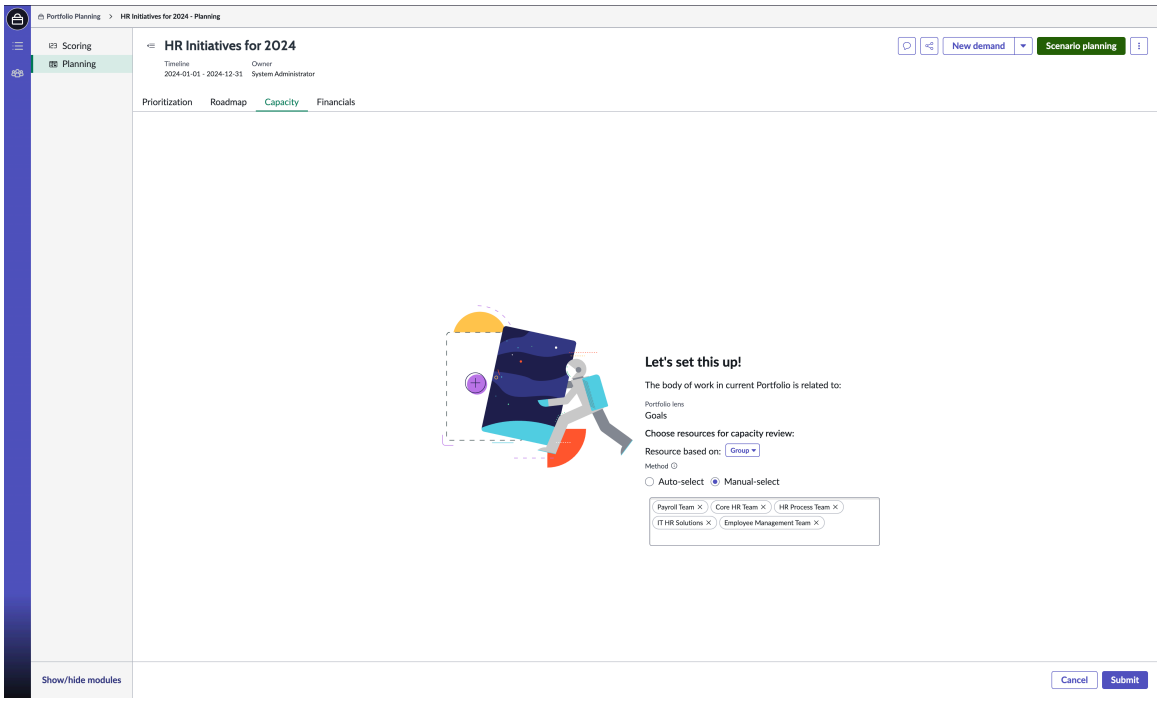

キャパシティ計画立案

[キャパシティ計画立案] 画面には、優先順位付けされた計画立案アイテムのリソース工数が表示されます。

- リソースキャパシティと割り当ての包括的な概要
- 現在のリソースキャパシティ割り当て
- インタラクティブなガントチャットにより、優先順位付けされた計画立案アイテムが下部トレイに表示され、作業を分析および計画できます。

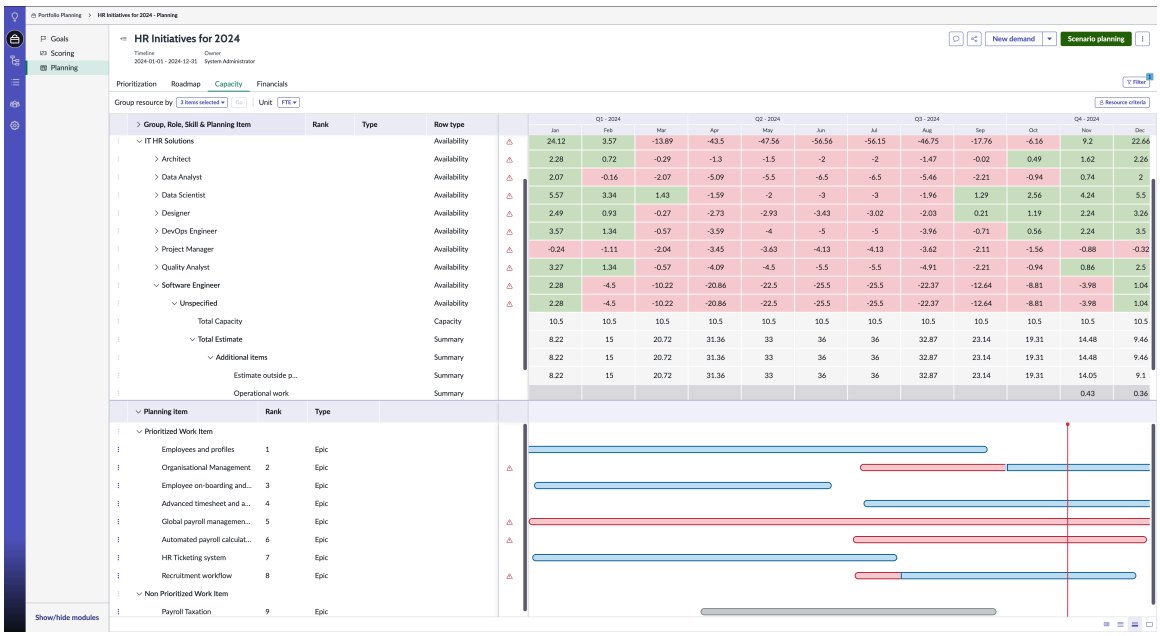

[キャパシティ計画立案] 画面について。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

キャパシティ計画立案の凡例


色	説明
黄 (ガントバー)	リソースがアサインされていない計画立案アイテム。
青 (ガントバー)	計画立案アイテムのリソース推定がリソースキャパシティ内である。
赤 (セルとガントバー)	リソース推定の過剰割り当て。
緑 (セル)	リソースキャパシティ内のリソース推定。

キャパシティ計画立案を使用すると、以下の操作ができます。

- 現在のポートフォリオの優先順位付けされた計画立案アイテムのキャパシティ割り当てを表示し、将来のリソース要件をより適切に予測します。
- フィルターオプション (Filter) を使用して、タイプ、ステータス、優先度、またはその他の必要な属性別に計画立案アイテムを表示し、キャパシティ計画を作成します。

  注:
  デフォルトのフィルターは、優先順位付けされた計画立案アイテムのみを表示するように設定されています。

- 割り当てられた運用リソースのアサインに基づいて更新されたリソースキャパシティを表示します。
- ヒートマップビューで合計リソースキャパシティを表示します。

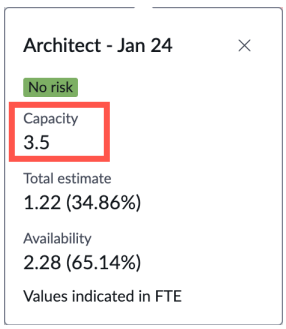

- 合計リソースキャパシティと推定合計を表示します。
- [追加アイテム] リストに、運用作業の工数とポートフォリオ外の推定の工数を表示します。
- [リソース基準] (Resource efficiency) を選択して、人員の基準を再定義します。

Example: キャパシティ計画立案における運用リソースアサインの計算

リソースマネージャーは、運用リソースの割り当てを作成したり、従業員の既存の運用リソース計画を移行したりして、作業要件を満たすために必要な会議、トレーニング、休暇などを処理できます。

キャパシティが 2 FTE のグループで、リソースマネージャーがトレーニング用キャパシティの 10% でグループタイプの運用リソースのアサインを作成するとします。この運用アサインは、[キャパシティ計画立案] 画面の上部トレイにある [運用作業] 品目で確認できます。[運用作業] 品目の値は 0.2 で、これはグループの合計キャパシティの 10% です。

リソースマネージャーが休暇用にグループタイプの運用リソースのアサインを作成すると、[運用作業] 品目は更新されませんが、使用可能な合計キャパシティが減少します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースマネージャーが、4 月から 6 月までの四半期の休暇用にキャパシティの 25% で運用リソースのアサインを作成する同じグループを考えてみましょう。4 月から 6 月までの四半期のグループの使用可能な合計キャパシティは 1.5 FTE で、これは 25% の休暇を削減した後の合計キャパシティの 75% に相当します。

これはグループの合計キャパシティの 25% にあたる 0.5 FTE が削減されます。

注:
[運用作業] 品目は灰色でハイライト表示されます。

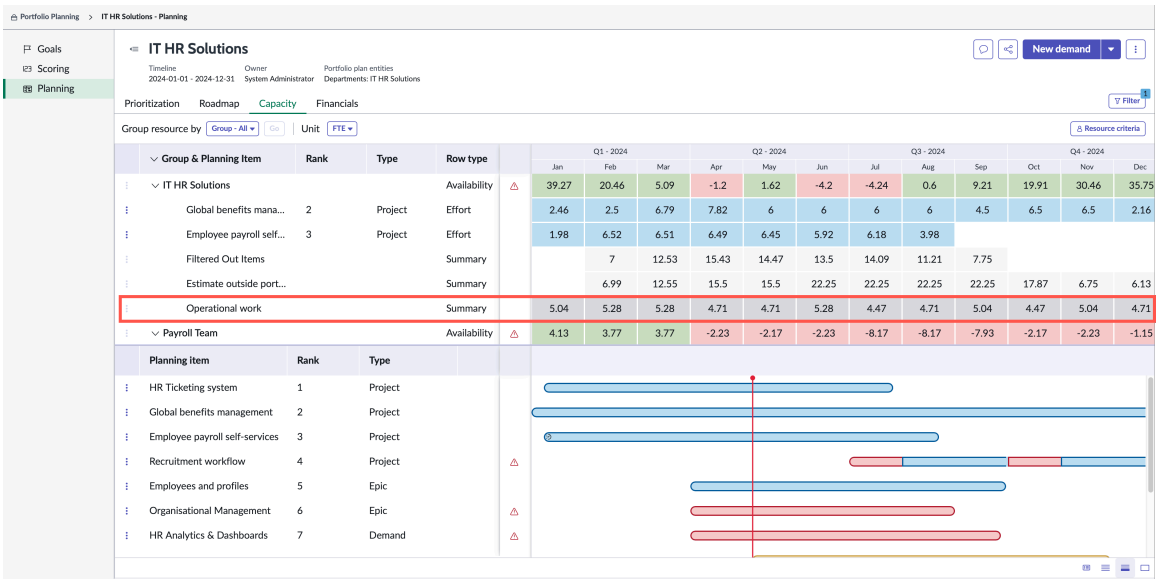

リソースキャパシティを生成

プライマリ属性を持つリソースの総キャパシティを生成して表示します。[キャパシティの詳細] は、ポートフォリオマネージャーがリソースの可用性に応じて計画立案アイテムを計画および管理するのに役立ちます。

始める前に

1. キャパシティ計画立案の計画属性を有効にする詳細については、「ポートフォリオ計画 でのキャパシティ計画立案の計画属性の有効化」を参照してください。
2. リソースの従業員プロファイルを生成する詳細については、「キャパシティ計画立案で作業するリソースの従業員プロファイルの生成」を参照してください。

必要なロール：sn_align_ws.spw_capacity_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画ワークスペース.
2. [リソースキャパシティを管理] オプション ( ) を選択します。

   注:
   キャパシティ計画立案で計画属性が有効になっていない場合は、空のステータス画面と構成オプションが表示されます。アドミニストレーターに連絡し、キャパシティ計画立案の計画属性を有効にしてもらいます。詳細については、「キャパシティ計画立案の計画属性を有効にする」を参照してください。

3. キャパシティの詳細を表示して再生成するには、次のいずれかのオプションを使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次のタスク
キャパシティ計画立案を使用して 、リソースキャパシティ、リソースから作業へのマッピングを表示し、リソース割り当ての優先順位を再設定して、優先順位付けされた計画立案アイテムを効果的に実行します。

ポートフォリオ計画 でのキャパシティ計画立案の使用

ポートフォリオのリソースキャパシティを表示および分析して、リソースの割り当てを計画および再予測します。


始める前に
リソースキャパシティを生成を使用してリソースキャパシティを生成します。

必要なロール：sn_align_ws.spw_capacity_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画ワークスペース.
2. ポートフォリオ計画から計画を選択します。
3. 選択 計画 > キャパシティ計画立案.
4. リストからプライマリ属性を選択して、リソース基準を定義します。
   [グループ] を選択すると、優先順位付けされた計画立案アイテムのリソースのアサインから利用可能なすべてのグループが [自動選択] オプションに自動的に表示されます。手動選択オプションを使用して、リソースキャパシティを表示する提案を追加または削除できます。


   ヒント:
   リソース 基準 (ボタンを使用して、いつでもリソース基準を再定義および変更して、カスタム結果を表示できます。

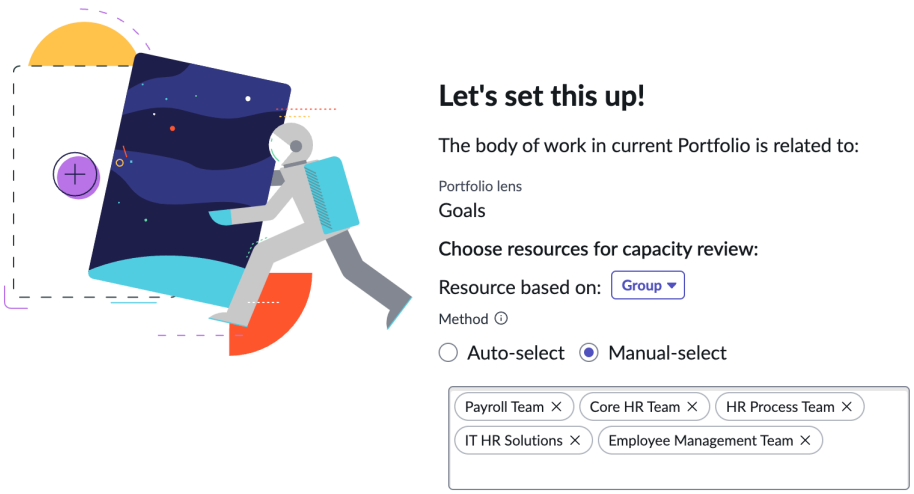

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. **[Submit** (送信)] を選択します。

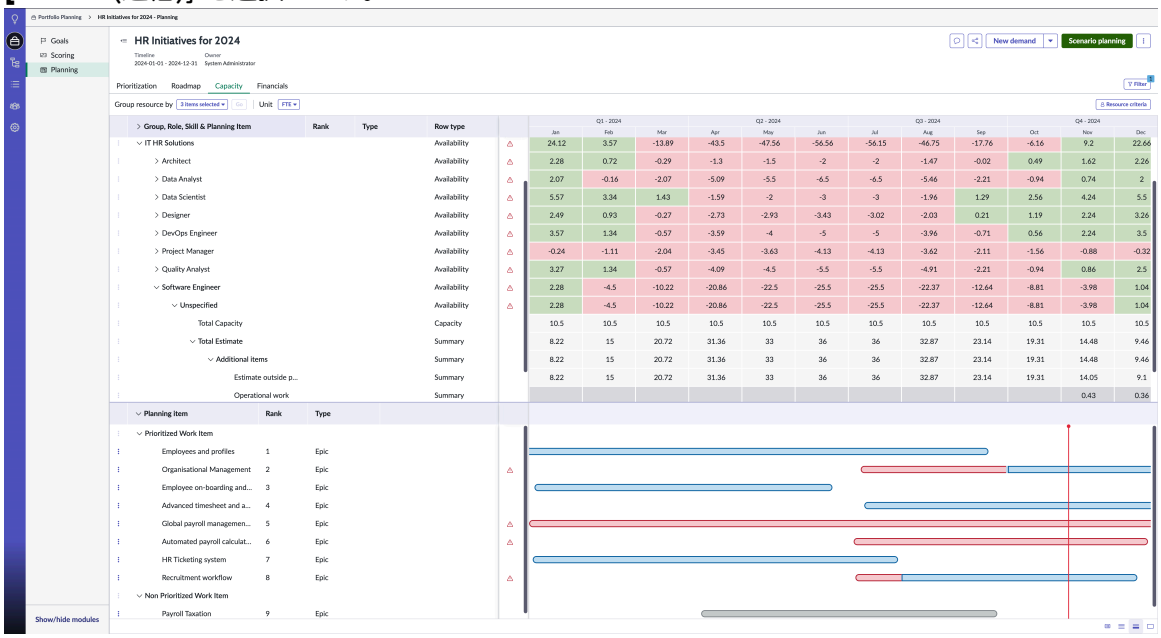

タスクの結果
選択した人員の基準のリソースキャパシティ割り当ての [キャパシティ計画立案] 画面が表示されます。人員の基準の選択に基づいて、リソースキャパシティはグループ、スキル、およびロールでネストされます。

での計画立案アイテムの財務管理 ポートフォリオ計画

予算、予測としてのコスト計画、経費ラインとしての実際の経費を管理し、人件費を算出し、財務ベースラインを作成し、ポートフォリオ計画ワークスペースで必要な頻度で計画立案アイテムの財務パフォーマンスを表示、分析、および比較します。

包括的な財務ビューは、選択したアイテムの計画コストと実績コスト、予測 (以前の EAC - EAC - 完了時の推定)、残りの見積もり (以前の ETC - 完了までの推定)、実績 (以前の現在までの実績) などを把握するのに役立ちます。コスト計画を管理し、経費ラインを関連付けて、計画立案アイテムの実績を反映するように処理することができます。


コスト比較ビューまたはベースライン比較ビューから財務データを Microsoft Excel または CSV ファイルとしてエクスポートし、ステークホルダーと共有して計画立案アイテムとポートフォリオの財務実績を確認します。

コストビュー

計画コストを予測し、コスト計画と経費ラインを作成および管理して、計画立案アイテムの財務パフォーマンスを追跡し、最新のコストと実績を確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

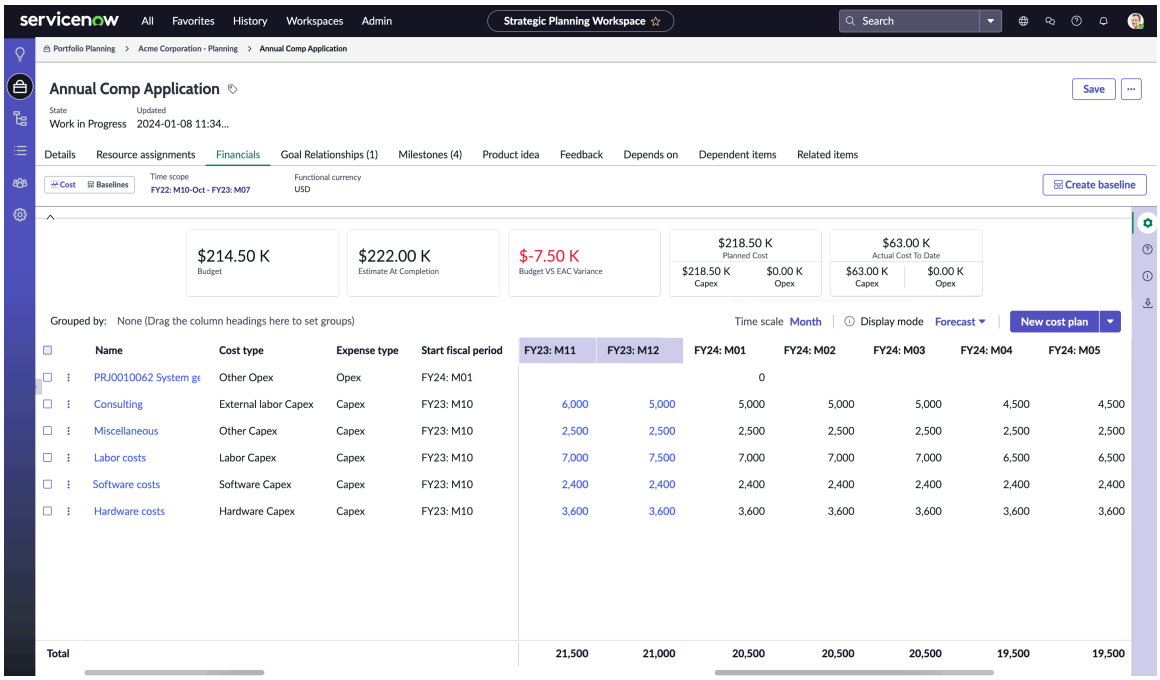

コスト画面では、次のことができます。

- プロジェクトマネージャーは、複数のプロジェクトレベルにわたって財務データの可視性と管理を強化することができます。財務のコストビューには、サブプロジェクトのコスト計画と経費ラインが表示され、財務を追跡できます。
- 親プロジェクトウィジェットには、予測コストと経費の連結値が表示されます。
- 親計画立案アイテムのコストビューから直接、任意のサブプロジェクトまたはデマンドの [プロジェクト/デマンド] 列を使用して、コストを特定して管理します。
- 将来の会計期間のすべてのコスト計画値を再予測するには、ダブルクリックして、最小タイムスケールビューで月別または期間別に値を編集します。
- 計画立案アイテムのコスト計画を管理します。詳細については、「コスト計画の追加、編集、または削除」を参照してください。
- 計画立案アイテムの経費ラインを追加または編集して、予定経費または予定外の経費を記録します。詳細については、「経費ラインの追加または編集」を参照してください。
- 会計期間の人件費を生成する。詳細については、「人件費の生成」を参照してください。
- ベースラインを作成して比較し、計画立案アイテムの財務スナップショットをキャプチャします。詳細については、「デマンドとプロジェクトの財務ベースラインの作成と比較」を参照してください。
- ウィジェットを構成し て、計画立案アイテムの財務データの概要を取得します。
- サブプロジェクトのすべての財務詳細は集計され、親プロジェクトのコスト計画とウィジェットに表示されます。

ヒント:

コストビューでは、カスタマイズアイコン ( ) を使用して左ペインの列をカスタマイズしたり、ユーザー設定を保存して、列の非表示、表示、または調整、時間スコープの表示などに行ったカスタマイズを保持することで、ユーザーエクスペリエンスが強化されます。

表示モード

ポートフォリオ計画ワークスペース の計画立案アイテムの財務ページには、さまざまなモード間の表示モードドロップダウンがあり、計画立案アイテムのさまざまな形式の財務情報を表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらのビューは、プロジェクトマネージャーと資金調達ユーザーがファイナンシャルプランで作業する際に役立つ、焦点を絞った関連情報を提供します。

- 予測
- 予算と予測
- 計画と実績
- 計画済み

Financial Funding ロール [sn_align_ws.spw.funding_user] を持つユーザーには、[予算と予測] の代わりに [予算割り当て] オプションが表示されます。

表示モード値

モード	値
予測	計画立案アイテムの全スコープの実績、残りの推定、および予測を表示します。 タイムスケールを使用して、過去の会計期間の実績と、現在および将来の会計期間の計画コストを表示します。
予算と予測	会計期間の予算、実績、差異、および計画立案アイテムの全スコープの予測値を表示します。 このモードを使用すると、次のことができます。 • 最新の予測をさまざまなタイムスケールで承認された予算と比較します。 • 過去の会計期間の予算と実績、および現在および将来の会計期間の予算と計画を会計期間レベルで表示します。
予算の割り当て (資金調達ロール)	会計期間の予算、実績、差異、および計画立案アイテムの全スコープの予測値を表示します。 このモードを使用すると、資金調達ユーザーは次のことができます。 • 最新の予測を表示し、作業アイテムに承認できる予算を入力します。 • 過去の会計期間の差異を分析し、将来の会計期間の予算割り当てを処理します。 • 最新の予測を承認された予算と比較し、必要に応じて予算を修正します。
計画と実績	過去および現在の会計期間の計画コストを実際の経費と比較し、将来の会計期間の計画コストを表示します。
計画済み	インライン編集機能を使用して、全範囲の計画コストのみを表示し、計画コストを管理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- [予算割り当て] または [予算と予測の比較] 表示オプションが表示されない場合は、 予算割り当てプロパティを有効にし 、インスタンスレベルで 予算属性を設定します 。
- ネクストエクスペリエンスを使用して予算割り当てを処理するには、計画立案アイテムの予算を移行するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化。

最後に選択したビューは、ユーザー設定として保存されます。

財務ユーザーのデフォルトの表示モードとアクセスレベル

ユーザーロール	デフォルトモード	ロールレベルのアクセス
sn_align_ws.spw_funding_user	予算の割り当て	予算を割り当てて承認し、コスト計画と経費ラインを管理します。
sn_align_ws.spw_financial_user	予測	コスト計画と経費ラインを管理します。
business_stakeholder	予測	財務データを表示します。

ベースラインビュー

ベースラインを作成して、計画立案アイテムの財務上の変更のスナップショットをキャプチャします。オンデマンドのベースラインを作成することも、スケジューラージョブを使用して周期的に作成することもできます。

注:
親プロジェクトで作成されたベースラインには、すべての子プロジェクトのコスト計画と経費ラインが含まれ、プロジェクトとサブプロジェクトの財務実績のブレークダウンを計算してより正確に把握できます。

親プロジェクトの財務ベースラインを作成すると、子プロジェクトの財務レコードも計算されるため、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの財務健全性を 1 か所で追跡できます。


ベースラインを比較して、最新ステータスとベースライン間、または任意の 2 つのベースライン間のコストの差を比較します。

注:
各ベースラインには作成された順序に基づいて番号のタグが付けられます。現在の財務ベースラインは財務の詳細をリアルタイムでキャプチャし、常にフラグアイコン ( ) で表されます。

ベースライン比較ビューは、2 つのベースライン間の差異を理解するのに役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

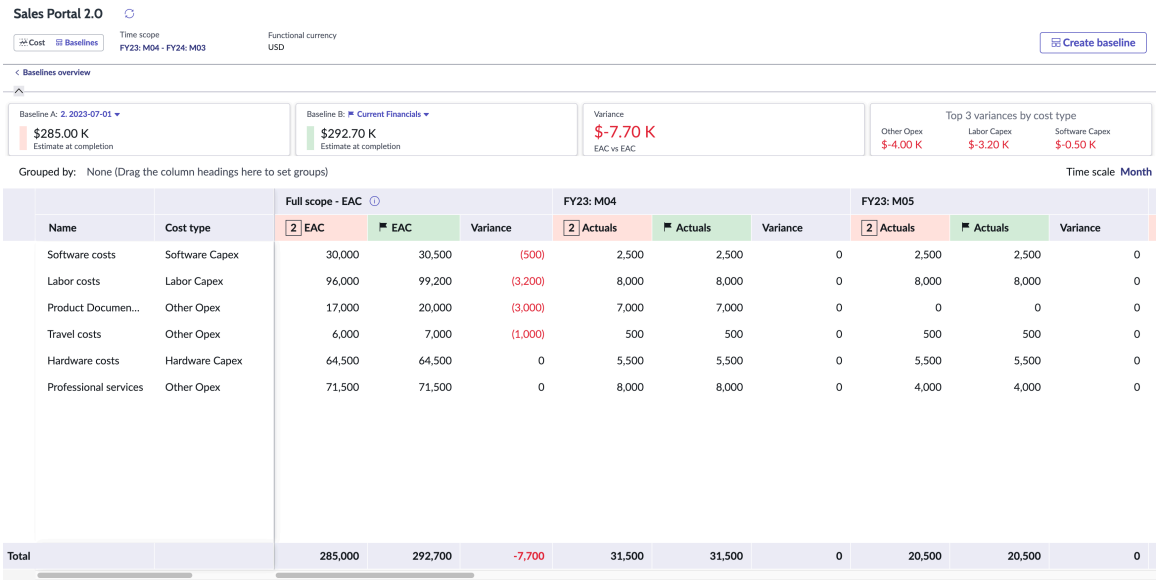

ベースラインを比較する場合は、ウィジェットを使用して以下を表示します。

- 各ベースラインには EAC を表示する 2 つの専用ウィジェットがあります。
- 3 番目のウィジェットには選択したベースラインの EAC 値の間の合計差異が表示されます。
- 4 番目のウィジェットには全体的な差異に寄与する上位 3 つの差異が原価費目別に表示されます。

ウィジェットとヘッダー行は色分けされ、選択したベースラインを識別するのに役立ちます。

ヒント:
いずれかのウィジェットからベースラインの名前を選択して、比較ビューから異なるベースラインを切り替えます。

ベースラインを比較すると、コスト計画とそれに関連する原価費目、フルスコープの EAC、実際の経費と計画コストのブレークダウンビューのリストが表示されます。

デフォルトでは、ブレークダウンビューのタイムスケールは [月] に設定されています。

- [タイムスケール] オプションを使用して、月次、四半期、および年次レベルで比較ブレークダウンビューを表示します。
- 会計期間、ウィジェットのデータ、および比較テーブルをフィルタリングするには、[時間スコープ] を選択します。

ウィジェットとヘッダー行は色分けされ、選択したベースラインを識別するのに役立ちます。

ヒント:
1 番目または 2 番目のウィジェットからベースラインの名前を選択して、さまざまなベースラインを比較します。

2 つのベースライン (ベースライン A：2023-10-01 とベースライン B：現在の財務) の比較ビューの例を見てみましょう。

Example: 異なるタイムスタンプでキャプチャされた **2** つのベースライン間で実績、計画、EAC を比較する方法

作成日に基づいて選択したベースラインについて、テーブルには作成日からの過去の会計期間の実績値と、現在および将来の会計期間の計画値が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2023 年 7 月から 2024 年 6 月までの計画立案アイテムを考えてみましょう。ベースライン A は 2023-10-01 に作成されました。2023 年 12 月の現在の財務ベースラインと 2023 年 10 月に取得したベースラインを比較すると、次のようになります。

1. ベースライン比較ビューには、2023 年 7 月から 2023 年 9 月までの [実績] 対 [実績] の列が表示されます。

		FY23: M07			FY23: M08			FY23: M09		
Name	Cost type	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance
Professional services	External labor Capex	3,500	3,500	0	3,500	3,500	0	4,700	4,700	0
Travel costs	Other Opex	800	800	0	450	450	0	0	6,000	(6,000)
Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
Software costs	Software Capex	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
other costs	Other Capex									
Server costs	Hardware Capex									
Total		18,100	18,100	0	20,750	20,750	0	21,500	27,500	-6,000

2. 2023 年 10 月および 2023 年 11 月の [計画] 対 [実績]。

		FY23: M10			FY23: M11		
Name	Cost type	2 Planned	Actuals	Variance	2 Planned	Actuals	Variance
Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)
Travel costs	Other Opex	450	500	(50)	450	600	(150)
Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
Software costs	Software Capex	3,000	3,500	(500)	3,000	3,000	0
Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
other costs	Other Capex		0	0		0	0
Server costs	Hardware Capex					1,200	(1,200)
Total		20,250	20,800	-550	20,250	22,600	-2,350

3. 2023 年 12 月から 2024 年 6 月までの [計画] 対 [計画]。

		FY23: M12			FY24: M01			FY24: M02			FY24: M03		
Name	Cost type	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance
Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
Travel costs	Other Opex	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0
Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
Software costs	Software Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)
Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)
other costs	Other Capex		1,000	(1,000)									
Server costs	Hardware Capex		1,000	(1,000)									
Total		20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000

注:
列は、前回の会計期間までの実績コストと現在から将来の会計期間の計画コストの合計である EAC を計算するように定義されます。

予算の割り当て

ポートフォリオマネージャーは、計画立案アイテムの予算を管理および承認できます。承認された予算は、プロジェクトマネージャーが作業を実行するための経費を計画して充足するのに役立ちます。

無駄のない予算業務と資金調達の実現可能性を利用して、月次、四半期ごと、または年次のレベルで、より短い計画サイクルの予算を計画および承認します。無駄のない予算業務は、ポートフォリオマネージャーが承認された予算のリターン価値を追跡し、将来の会計期間の予算をより適切に計画するのに役立ちます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
予算が毎月割り当てられる場合、予算合計は四半期および年次レベルにロールアップされます。同様に、予算が四半期または年次レベルで割り当てられる場合は、月次レベルまで均等にブレークダウンされます。

計画立案アイテムの予算を割り当て、承認、および処理する方法の詳細については、「戦略的計画での計画立案アイテムの予算管理」を参照してください。

ヒント:
予算割り当てビューでは、ポートフォリオマネージャーは EAC を確認して、プロジェクトマネージャーが行った財務予測を理解し、[コストを予算としてコピー] オプションを使用して、計画コスト全体を予算として割り当てます。

原価費目を属性として選択し、人件費、非労務などの個々の原価費目の予算を割り当てて承認します。

プロジェクトマネージャーは、表示モードの [予算と予測] オプションを使用して、承認された予算を必要なタイムスケールで表示できます。作業が進行し、実績がキャプチャされると、予算と予測のモードを使用して予算と実績コストを比較し、必要なタイムスケールでインライン編集機能を使用して実績が予算を超えている計画コストを再予測できます。

プロダクトマネージャーは、投資または経費別、原価費目別、および月次、四半期、または年次レベルの必要なタイムスケールで、最新のコストを承認された予算と比較できます。比較ビューは、経費タイプまたは原価費目におけるあらゆる差異を特定し、どの会計期間で発生したものであるかを把握できるよう、プロダクトマネージャーにインサイトを提供します。プロダクトマネージャーは、この情報を活用して、ポートフォリオマネージャーに追加の予算を要求できます。

既存のアクティブなプロジェクトとデマンドの予算を、クラシック UI から ネクストエクスペリエンス に移行できます。ネクストエクスペリエンス の財務には、月次ブレークダウンと原価費目別に詳細なレベルで予算を保存するための新しい予算データモデルがあります。アクティブなプロジェクトとデマンドの予算は、個別に移行することも、スケジュール済みジョブを使用して一括で移行することもできます。

- アクティブなプロジェクトの予算をクラシック UI から ネクストエクスペリエンス に移行します。詳細については、「ネクストエクスペリエンスへのアクティブなプロジェクトの予算の移行」を参照してください。
- アクティブなデマンドの予算をクラシック UI から ネクストエクスペリエンス に移行します。詳細については、「ネクストエクスペリエンスへのアクティブなデマンドの予算の移行」を参照してください。

注:
移行された予算は sn_invst_pln_invst_budget テーブルにキャプチャされ、必要な時間スコープに対して無駄のない予算業務を有効にします。

利益計画


金銭的利益計画は、計画立案アイテムの実行中に発生する潜在的な利益をキャプチャします。金銭以外の利益計画は、計画立案アイテムの実行中に発生した潜在的な非財務的利益をキャプチャします。金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの潜在的な利益をキャプチャできます。

簡単な財務

簡単な財務では、コストビューからコスト計画をキャプチャしなくても、詳細ページから概要レベルの投資、経費、利益などの計画を入力できます。簡単な財務の値は、計画コストと実績コストがキャプチャされるまで必要に応じて更新できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

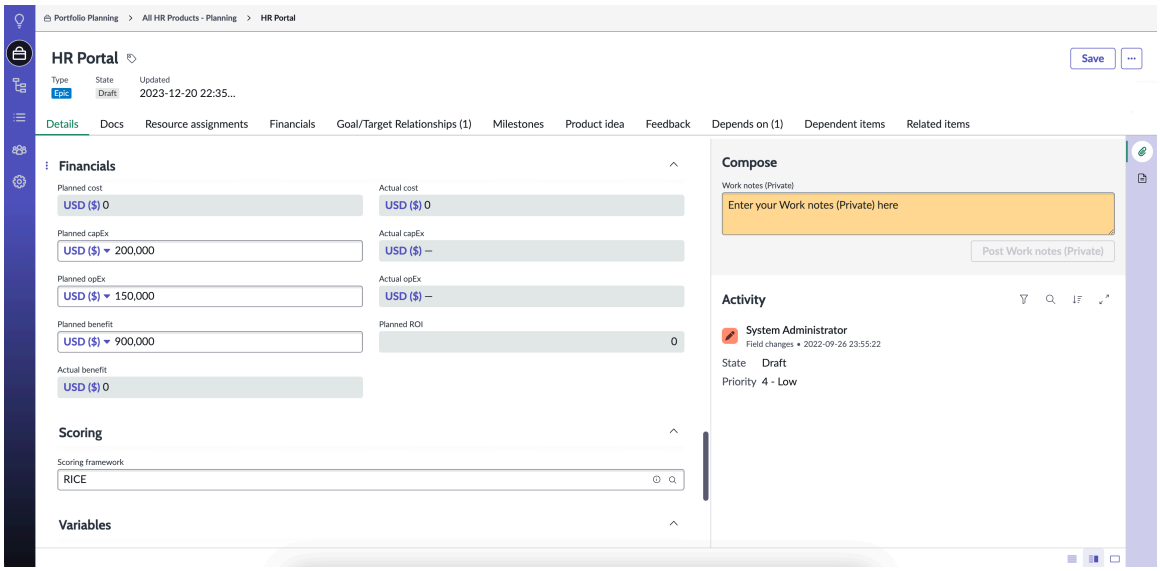

ベースライン機能を使用すると、ここにあるような簡単な財務の値をベースラインでキャプチャし、既存のベースラインと比較できます。以下のことを行うことができます。

- 簡単な財務を再予測し、ベースラインのリストから現在の財務を選択して比較します。
- プロジェクトの進行に合わせて計画経費と実際の経費をキャプチャし、財務ベースラインを簡単な財務ベースラインと比較して、計画立案アイテムの財務実績を追跡します。

コスト計画の追加、編集、または削除

必要な期間のコスト計画を作成して、予定経費と実際の経費を追跡します。コスト計画を編集して予定経費を調整し、スコープ対象外の予測を削除します。

始める前に

必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画ワークスペース をクリックし、計画立案アイテムを開きます。
2. **[Financials** (財務)] タブをクリックします。

> **ヒント:**
> 初期計画コストをキャプチャした直後に財務ベースラインを作成して、計画コストのスナップショットを作成します。このベースラインを使用して、作業の進捗に応じて、後でベースラインと比較し、初期計画コストと実際の経費の差異を特定します。

これは、将来の経費を計画し、計画コストを再予測するのに役立ちます。

ポートフォリオ計画での計画立案アイテムの予算管理

計画立案アイテムの予算を割り当て、管理、および承認します。無駄のない予算業務により、計画立案アイテムの全期間に予算を割り当てるのではなく、月次、四半期、年次のブレークダウンレベルなど、さまざまな会計期間の短い計画サイクルに予算を割り当てることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- 管理者は、予算業務で機能するようにプロパティを有効にします。詳細については、「ポートフォリオ計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化」を参照してください。
- 管理者は、原価費目別または経費タイプ別に予算を割り当てて承認する属性を設定します。詳細については、「予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する」を参照してください。
- 必要なロール：it_portfolio_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画ワークスペース をクリックし、計画立案アイテムを開きます。
2. **[Financials** (財務)] タブをクリックします。
3. [予算の割り当て] トグルを有効にします (Budget allocation)。
4. 月次、四半期、または年次レベルで選択したタイムスケールに対して、次のいずれかの方法で予算を管理できます。
   - [予算] 列の各セルをダブルクリックして、値を手動で入力します。
   - [予算] 列のオプションから [コストを予算としてコピー] を選択して、EAC を予算としてコピーします。

   EAC が予算としてコピーされた場合でも、グリッド内編集機能を使用して、各原価費目の予算をいつでも再予測できます。

   注:
   未承認の予算値は、 アイコンで示されます。
5. [予算の承認 **]** (Approve budget) を選択します。
   予算の承認の確認ウィンドウが表示されます。[この予算承認の財務ベースラインを作成します **(Create a financial baseline for this budget approval)]** オプションはデフォルトで有効になっており、最新の予算と財務見積もりがキャプチャされます。

   ヒント:
   予算の承認中に作成された財務ベースラインは、実際の経費がキャプチャされた後に将来のベースラインと比較して、財務パフォーマンスを追跡できます。
6. 確認ウィンドウで、[承認] (Approve) を選択します。

タスクの結果
予算ウィジェットが更新され、最新の承認済み予算が反映されます。プロジェクトマネージャーは、原価費目別の [予算とコスト **(Budget vs cost)]** ビューを使用して、承認済み予算を表示し、それを計画コストと比較できます。

経費ラインの追加または編集

実績コストをキャプチャする経費ラインを作成または編集します。経費ラインをコスト計画に関連付けるか、スタンドアロンの経費ラインを作成して予定外の経費を記録できます。

始める前に
必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
経費ラインは、特定のソースに関連付けることができるプロジェクトコスト計画の一部です。コスト計画に対して複数の経費ラインを作成できます。処理済みステータスの経費ラインのみが作業アイテムのロールアップに含まれます。
どのコスト計画にも関連付けられていない予定外の経費ラインについては、自動的にコスト計画が作成されるか、同じ経費タイプの既存のシステム生成コスト計画に関連付けられます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画ワークスペース をクリックし、計画立案アイテムを開きます。
2. **[Financials** (財務)] タブをクリックします。
3. 次のいずれかのオプションを使用して、経費ラインを追加します。

4. [経費ラインを作成 (Create expense line)] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[経費ラインを作成] フォーム」を参照してください。
5. [保存] を選択します。

人件費の生成

[計画立案属性] ページで構成された財務属性に基づいて、属性ベースのリソースのアサインに対する [財務] ビューに人件費を生成します。

始める前に
必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画ワークスペース をクリックし、計画立案アイテムを選択します。
2. **[Financials** (財務)] タブをクリックします。
3. [人件費の生成] (Generate labor cost) を選択します。
4. [人件費を生成] 確認ウィンドウで [生成] を選択します。

> **注:**
> または、スケジュール済みジョブをアクティブ化して、必要な頻度でベースラインを自動的に作成することもできます。

デマンドとプロジェクトの財務ベースラインの作成と比較

財務ベースラインを作成して比較し、プロジェクト経費のスナップショットを取得して、計画コストを実際の経費と比較します。

始める前に
必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画ワークスペース をクリックし、計画立案アイテムを選択します。
2. 左側のメニューから [財務] を選択します。
3. ベースラインを作成または比較します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

での計画立案アイテムの金銭的利益計画の管理 ポートフォリオ計画


金銭的利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの実行中に潜在的な利益をキャプチャします。

始める前に

必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[ポートフォリオ計画] を選択します。
2. 計画立案モジュールから計画立案アイテムを選択します。
3. [金銭的な利益計画] 関連リストを選択します。

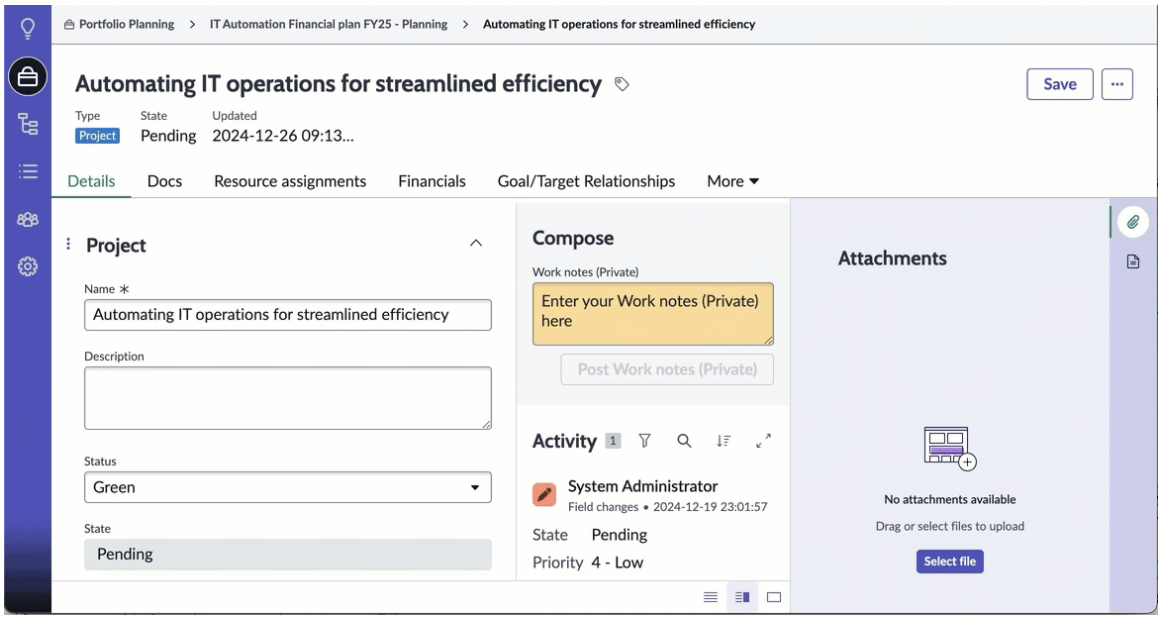

4. 利益計画フォームの各フィールドに入力します。
5. **[Save** (保存)] を選択します。

での計画立案アイテムの金銭以外の利益計画の管理 ポートフォリオ計画

金銭的利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの実行中に潜在的な利益をキャプチャします。

始める前に


必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[ポートフォリオ計画] を選択します。
2. 計画立案モジュールから計画立案アイテムを選択します。
3. [金銭以外の利益計画] 関連リストを選択します。

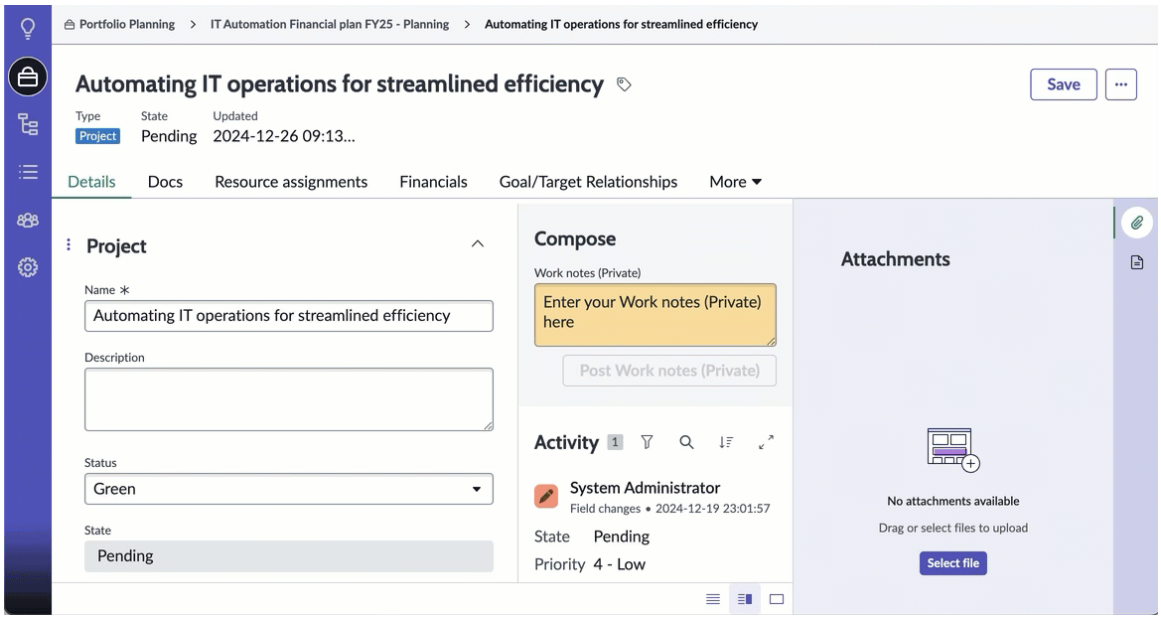

4. 利益計画フォームの各フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「金銭以外の利益計画フォーム」を参照してください。
5. [保存] を選択します。

財務を **Excel** または **CSV** ファイルとしてエクスポート

計画立案アイテムのコストまたはベースライン比較データをエクスポートして、ステークホルダーと簡単に共有できます。

始める前に
必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > ポートフォリオ計画ワークスペース をクリックし、計画立案アイテムを選択します。
2. **[Financials** (財務)] タブをクリックします。
3. [エクスポート] オプション ( ) を選択します。
4. [エクスポート] サイドパネルで、[ファイルタイプ] リストから **[Excel]** または **[CSV]** を選択し、[エクスポート] ボタン () を選択します。

財務データは、name_fin_mmddyy の命名規則に従って Excel ファイルまたは CSV ファイルとしてダウンロードされます。命名規則の詳細は次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. name：計画立案アイテムの名前から最初の 10 文字を取得します。

b. fin：ファイルに財務データがあることを示します。

c. mmddyy：このデータをエクスポートするときのシステムの日付形式です。
たとえば、2024 年 1 月 26 日に「Documentation」という名前の計画立案アイテムの財務データをダウンロードする場合、ファイル名は documentat_fin_012624 になります。

注:
財務データは、コストビューとベースライン比較ビューからエクスポートできます。

でのポートフォリオ財務の管理 ポートフォリオ計画

ポートフォリオ財務の推定、承認済みコスト、利益、実績などの財務ブレークダウンを表示します。

ポートフォリオユーザーは、トップレベルのデマンドとプロジェクトのロールアップされた財務値を表示できます。

コストは、経費タイプ別または原価費目別に表示できます。ポートフォリオレベルの財務ビューを使用すると、予算 (計画立案アイテムの承認済み予算)、予測、差異 (承認済み予算と最新の予測の差)、実績、および各計画立案アイテムの投資、経費、合計、および利益の残りの推定など、さまざまな財務フィールドを表示できます。この情報を使用して、計画立案アイテムの財務ステータスを追跡し、次の計画サイクルで作業する際に考慮すべき計画立案アイテムについて十分な情報に基づいた意思決定を行い、支出超過を回避するために追跡することができます。

ポートフォリオ財務を使用すると、ポートフォリオマネージャーは次のことができます。

- 計画立案アイテムの財務実績とステータスを追跡します。
- 次のポートフォリオサイクルの計画と優先順位付けを行いながら、計画立案アイテムのコストと利益の概算を分析することで、情報に基づいた意思決定に到達します。
- 予算属性構成に応じて、経費タイプまたは原価費目に基づいて財務を表示します。
- 承認された予算を最新の予測および実績と比較することで、計画立案アイテムへの過剰な支出を回避します。


重要:
新規および既存の顧客は、ポートフォリオレベルで計画立案アイテムの財務を表示するようにポートフォリオ財務を構成する必要があります。詳細については、「でのポートフォリオ財務の構成 ポートフォリオ計画」を参照してください。

ポートフォリオ財務ビューは、会計カレンダータイプが構成されたデマンドとプロジェクトのみをサポートします。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

予算属性として経費タイプを含む予算ステータス別にグループ化されたポートフォリオ財務

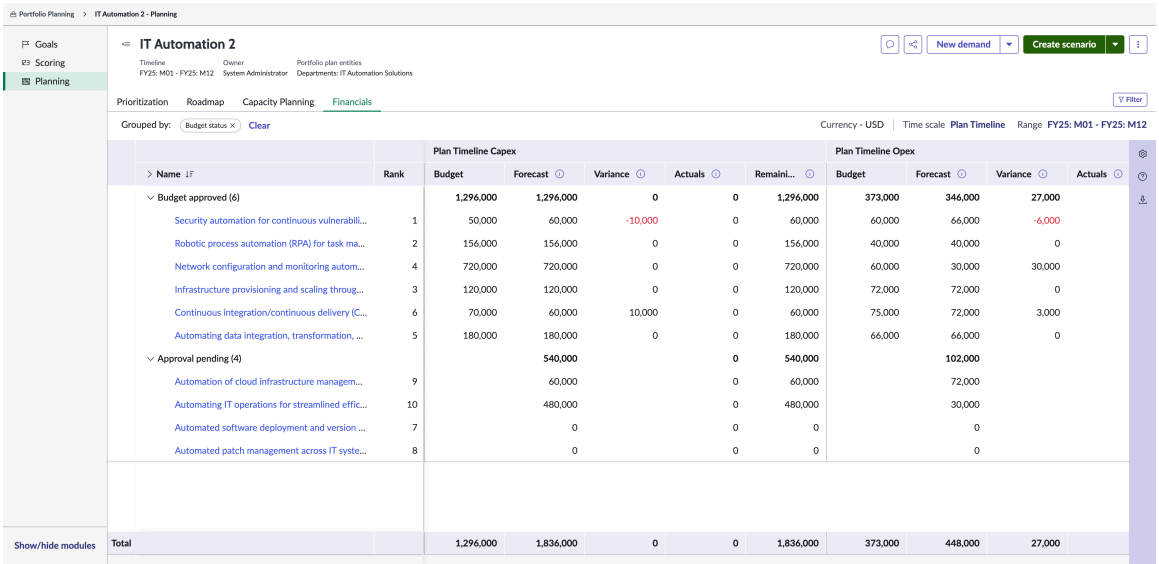

予算属性として原価費目のタイプを持つ計画ステータス別にグループ化されたポートフォリオ財務

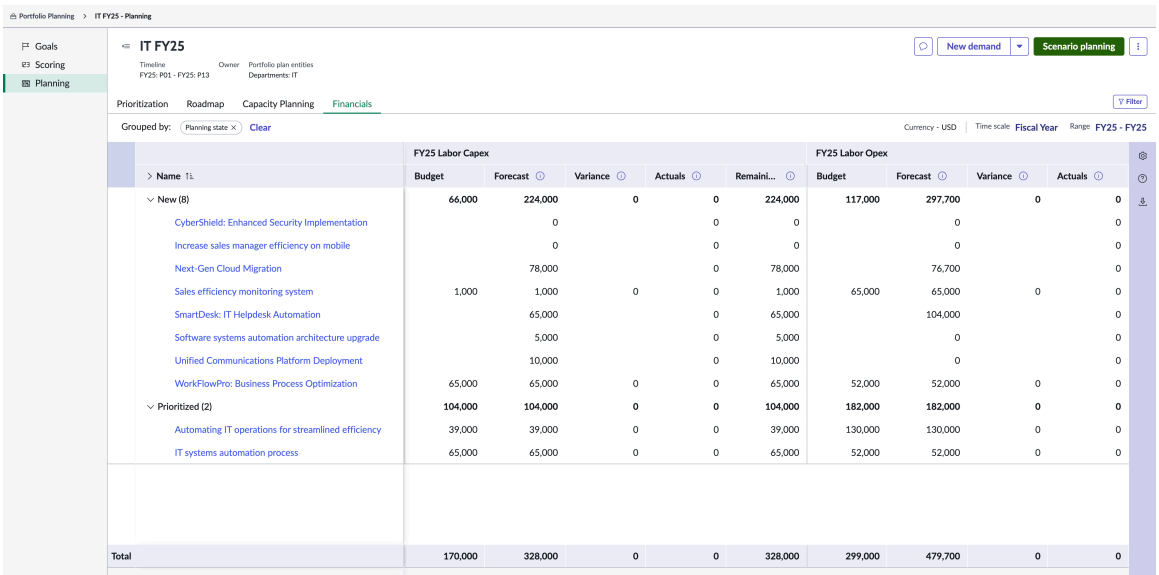

注:
グループヘッダー行には、グループ内のすべての計画立案アイテムの予算、予測、差異、実績、および推定残額のロールアップ値が表示されます。

ポートフォリオ財務のデフォルトビューは、予算承認ステータス別にグループ化された計画立案アイテムを表示するように設定されています。[予算承認済み] グループ化では、予算が割り当てられ承認済みの計画立案アイテムが一覧表示されます。承認待ちグループ化では、予算がない計画立案アイテム、または要求された予算が承認されない場合に、計画立案アイテムが一覧表示されます。

注:
ポートフォリオ財務ビューは、まだ 投資枠管理と互換性がありません。このビューには、アプリケーションから計画立案アイテムに割り当てられた適切な予算値が 投資枠管理 表示されない場合があります。これは将来の機能拡張として追加される予定です。

左側のグリッドには、計画立案アイテムの全期間における名前、ランク、計画立案ステータス、計画立案アイテムタイプ、承認された開始日、計画コストの合計、合計実績コスト、計画利益の合計、ROI などの計画立案アイテムの詳細。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

右側のグリッドで、ポートフォリオタイムラインの投資、経費、合計、および利益ポートフォリオの予算、予測、差異、実績、および残りの推定などの計画立案アイテムの財務属性、または年、四半期、月、または期間別のブレークダウン。


ヒント:
左側のグリッドから計画立案アイテムの名前を選択して、その計画立案アイテムの財務レコードページに直接アクセスできます。

[エクスポート] オプション (を使用して、ポートフォリオ財務の詳細を Excel または CSV にエクスポートできます。

財務ビューのカスタマイズ

ポートフォリオ財務をカスタマイズして、必須パラメーターを表示およびアクセスすると、ポートフォリオと計画立案アイテムをより適切に計画できるようになります。

- タイムスケールと範囲を定義すると、月次、四半期、および年次ビューで財務をより詳細に把握できます。タイムスケールを使用して会計期間を選択し、タイムスケール内の範囲をフィルタリングして、特定の月、四半期、または年の財務を表示します。

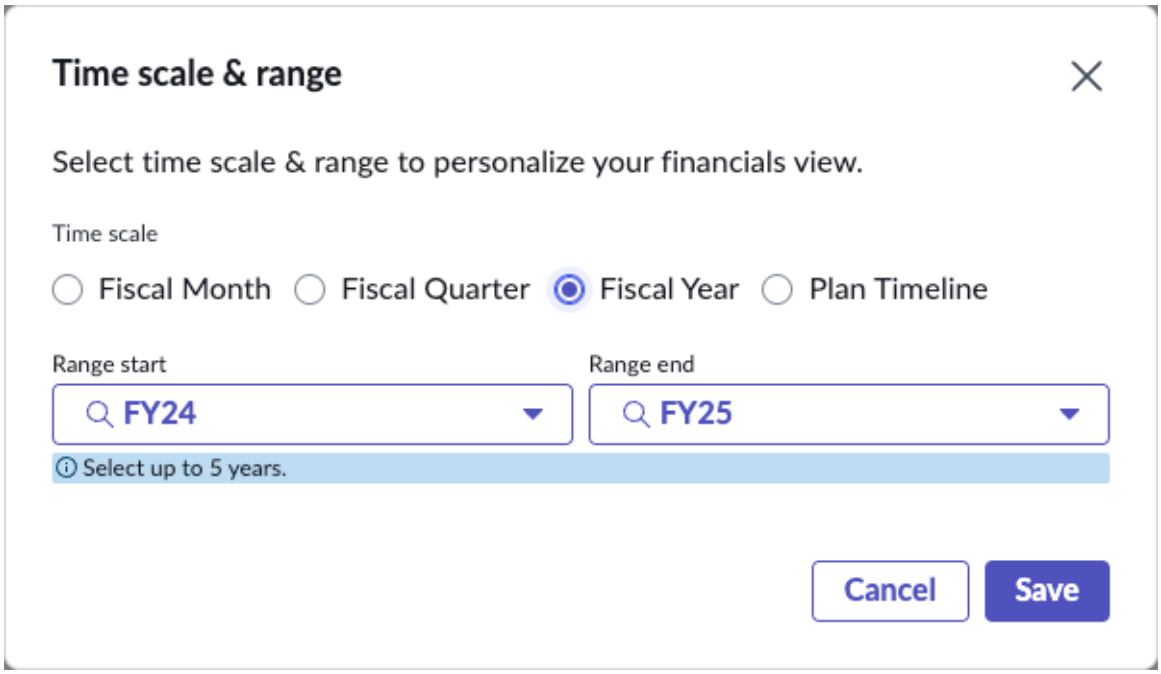

タイムスケールと範囲のパラメーター

タイムスケール	説明と範囲
会計月	月次ブレークダウン別のポートフォリオ財務ビュー。 最大 12 か月を選択できます。
会計四半期	四半期ごとのブレークダウン別のポートフォリオ財務ビュー。 最大 4 つの四半期を選択できます。
会計年度	ポートフォリオ財務ビューの年次ブレークダウン別。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムスケール	説明と範囲
	最大 5 年の期間を選択できます。
タイムラインを計画	ポートフォリオタイムライン全体のポートフォリオ財務ブレークダウン。

- グリッドのグループ化と列をカスタマイズします。

  [カスタマイズ] オプション (を使用して右側のグリッドの列とグループを構成し、カスタムビューを構築します。



  たとえば、予算と実績のブレークダウンを比較する場合は、これら 2 つのオプションのみを選択して、設定を適用します。カスタマイズ設定の 左グリッド リストから必要な列を選択して、左グリッドをカスタマイズすることもできます。

- 計画立案アイテムをグループ化します。

  デフォルトでは、財務ビューは 予算ステータス 列でグループ化されます。[グループ化] 行から予算ステータスのグループ化を削除し、必要なヘッダーをドラッグアンドドロップしてこのビューを変更できます。

での計画立案アイテムのドキュメント ポートフォリオ計画

ポートフォリオ計画ワークスペースの一元的な場所から、計画立案アイテムに関するあらゆる種類のドキュメントを保存および管理します。

ドキュメントの概要

製品マネージャーとポートフォリオマネージャーは、ドキュメント機能を使用して計画立案アイテムの情報を保存できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 各計画立案アイテムには、関連する情報をキャプチャするための個別のドキュメントページを含めることができます。

  たとえば、エピック計画立案アイテムの場合、高レベルの事業達成目標や技術的な製品要件のドキュメントページを作成します。

- 各計画立案アイテムには複数のドキュメントページを関連付けることができ、重要なアーティファクトを効果的に整理できます。
- プロジェクト概要、製品要件、ブレーンストーミングのアイデア、会議メモなどの事前定義されたテンプレートが利用可能です。これらのテンプレートのいずれかを使用して計画立案アイテムのドキュメントページを作成するか、空白のページから開始します。

ドキュメントの機能

ドキュメントの主な機能は次のとおりです。

- コンテンツを自動保存します。
- ライブユーザープレゼンスの機能を使用して、ドキュメントページを閲覧または作業しているユーザーを確認します。
- 事前定義されたテンプレートを使用してドキュメントを作成します。
- 見出し、リスト、配置などを含むリッチテキスト段落の書式設定を使用します。
- ブロックレベルの編集を使用して、テキストブロックを移動して配置を変更します。
- **/** コマンドを使用して、チームメンバーをインラインでタグ付けしたりテーブルを挿入したりします。
- 他の ServiceNow AI Platform テーブルへの参照を追加して、チーム間で作業を接続します。
- ファイルをアップロードするか Web URL を使用して、画像を挿入します。


> **注:**
> Google イメージリンクを挿入するエクスペリエンスが機能しない場合があります。

計画立案アイテムドキュメント内でのリアルタイムコラボレーション

リアルタイムコラボレーションの機能を使用して、ドキュメントページを他の複数のエディターと同時に編集します。色付きのカーソルは、ページ上の各エディターの現在の位置を示します。ページのコンテンツを作業中または確認中の好みに基づいて、これらのライブプレゼンスインジケーターを表示するか非表示にするかを選択できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

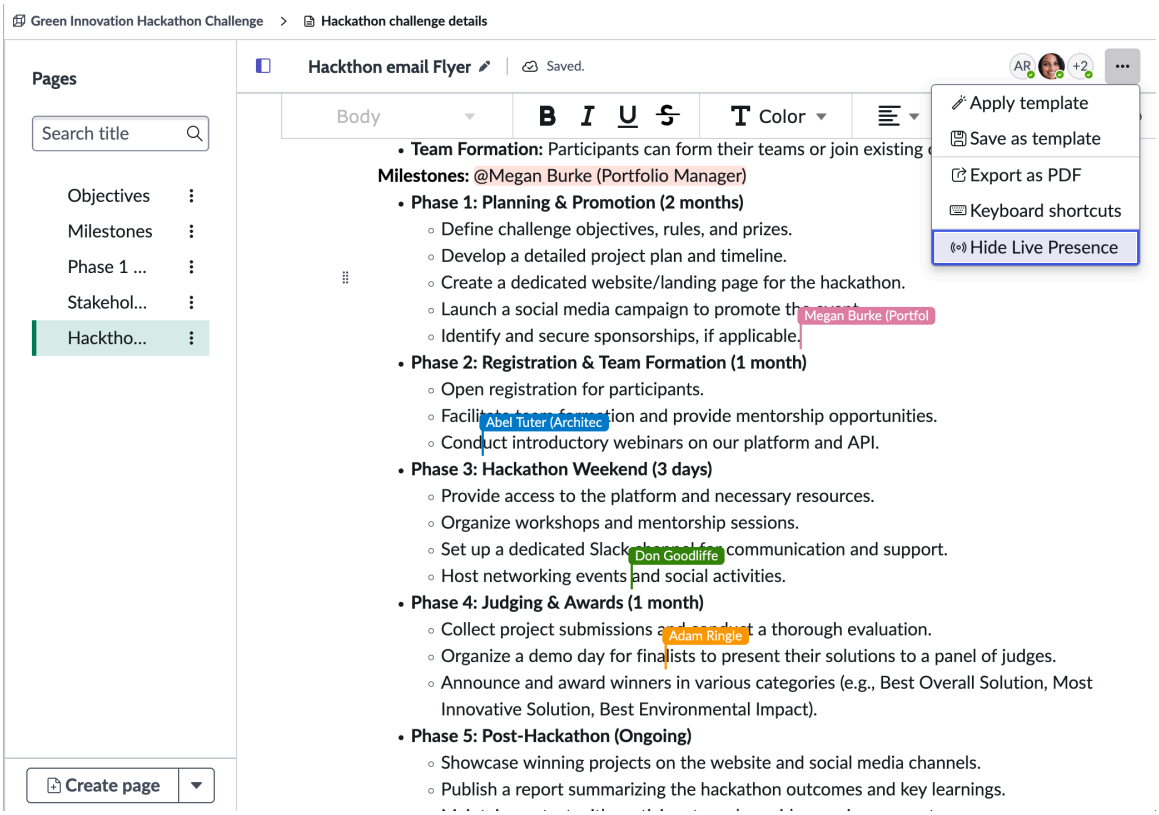

注:
膨大な数のユーザーが同じコンテンツブロックを同時に編集すると、アプリケーションのパフォーマンスに問題が発生する可能性があります。

計画立案アイテムのページとサブページの作成と管理

戦略的計画でページとサブページを作成、複製、削除することで、計画立案アイテムの情報を柔軟に整理します。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user


手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、ポートフォリオ計画を選択します。
3. [優先順位付け] または [ロードマップ] ページから、ドキュメントページを作成する計画立案アイテムを選択します。
   [ロードマップ] ページから計画立案アイテムを選択した場合は、アイテムのサイドパネルの [詳細] タブから [完全な詳細] を選択します。
4. 計画立案アイテムのレコードページから、[ドキュメント] を選択します。
5. ページを作成するには、空白のページを作成するか、事前定義されたテンプレートから開始します。
   - 空白のページの場合は、[ページの作成] を選択します。
   - テンプレートから作成するには：


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [テンプレートからページを作成] を選択します。




b. テンプレートセンターからテンプレートを選択し、[ページの作成] を選択します。

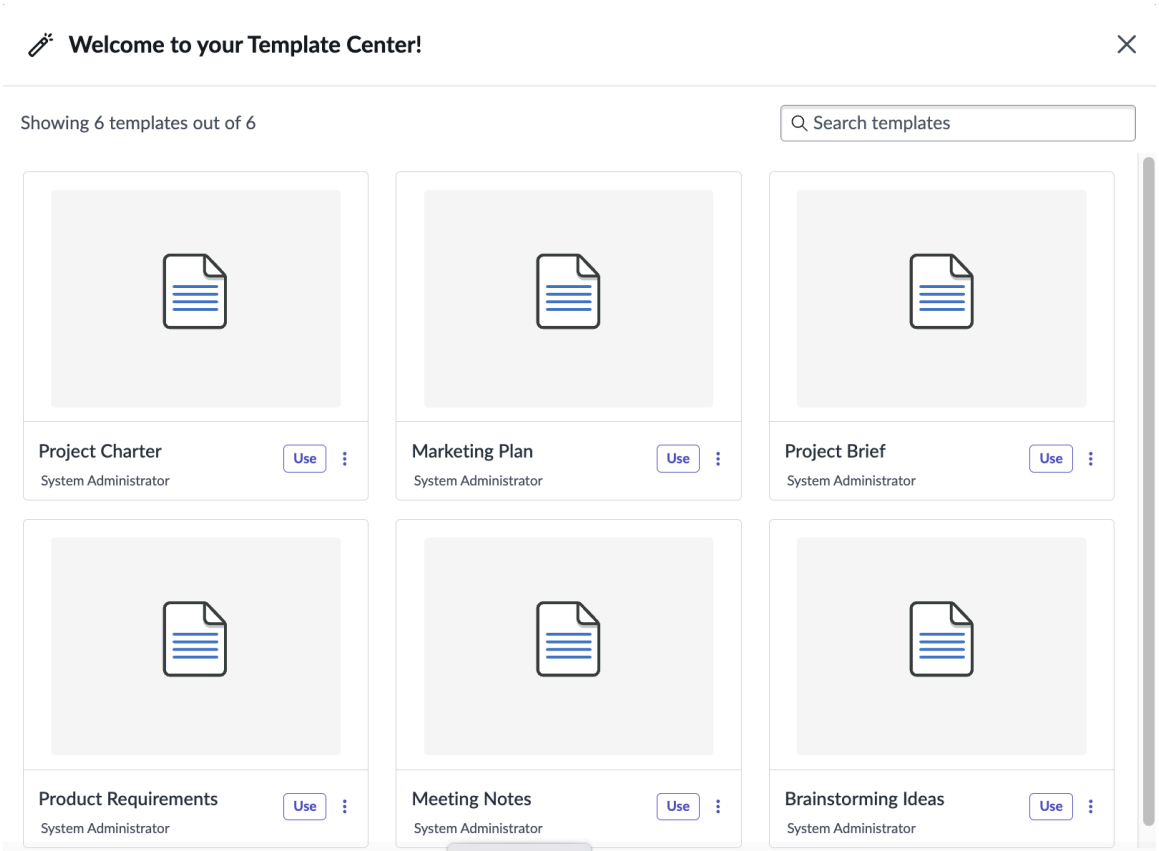

新しいページが作成され、「無題」という名前でドキュメントに追加されますが、名前は変更できます。

6. サブページを作成するには、「 ページ・アクション 」メニュー(⋮ を選択し、「 サブページの作成」を選択します。



7. ページまたはサブページを削除するには、[ページアクション] メニュー (⋮) を選択し、[削除] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

でのポートフォリオ計画ビューの管理 ポートフォリオ計画

ポートフォリオマネージャーは、列の選択、グループ化、フィルタリングなどのパーソナライズ設定を適用して、ポートフォリオ計画のカスタマイズされたビューを作成できます。ポートフォリオオーナーまたはエディターは、これらのパーソナライズされたビューをステークホルダーと共有して、ポートフォリオ計画でのコラボレーションを容易にすることができます。

ポートフォリオ計画ビューのメリット

ポートフォリオマネージャーは、列の選択、グループ化、フィルタリングなどの設定を適用して、必要に応じてカスタマイズされたビューを作成できます。

- ビューは、プライベートまたはパブリックとして作成できます。
- 最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを作成できます。
- ポートフォリオ計画ビューをステークホルダーと共有して、ポートフォリオ計画でのコラボレーションを有効にすることができます。
- 必要に応じて、共有ビューとプライベートビューを切り替えます。
- 各ビューでは、[優先順位付け]、[ロードマップ]、[キャパシティ]、および [財務] タブの表示設定が保存されます。

ポートフォリオ計画ビューの作成

要件に基づいてカスタマイズされたポートフォリオ計画ビューを作成し、再度ログインしたときにアクセスしてステークホルダーと共有してコラボレーションできるようにします。

始める前に

必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて

ポートフォリオ計画ごとに、最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを作成できます。


手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. 必要に応じてビューに変更を加えます。
   たとえば、 **Department** 属性と値を **Finance** としてフィルターを適用します。

   [新規ビューとして保存] オプションがポートフォリオ計画ヘッダーに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

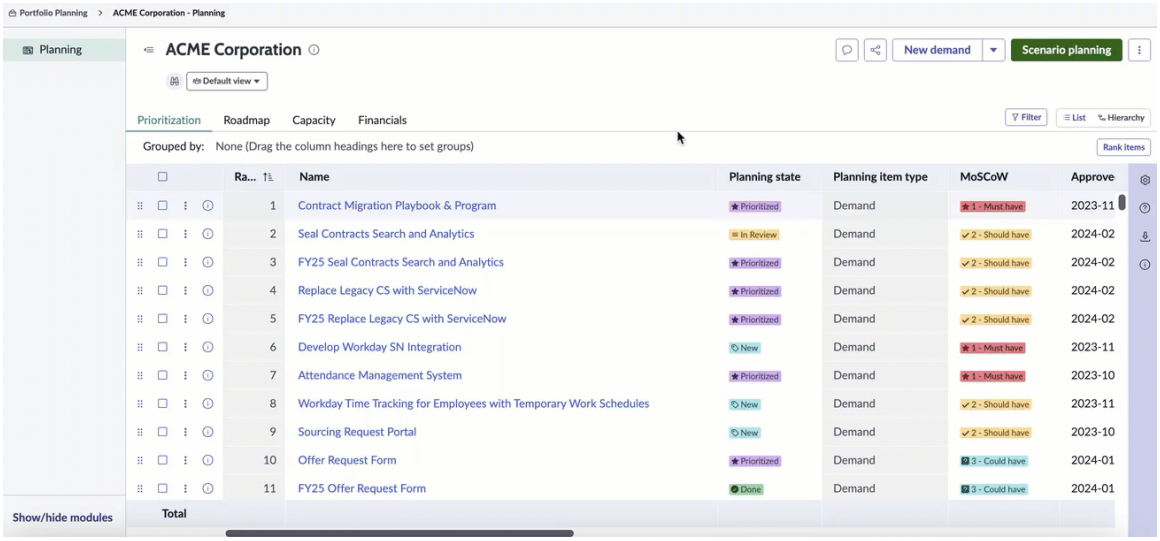

4. ポートフォリオ計画ヘッダーから、[新規ビューとして保存] を選択します。
5. [新規ビューとして保存] ウィンドウで、詳細を入力します。

   a. [ビュー名] フィールドにビューの名前を入力します。

   b. オプション: [共有ビュー] トグルを選択して、このビューを公開します。
   [共有ビュー] トグルを選択すると、このポートフォリオ計画を共有しているすべてのステークホルダーにビューが表示されます。

   c. **[Save** (保存)] を選択します。

タスクの結果
ポートフォリオ計画の共有ビューが作成され、このポートフォリオ計画を共有しているすべてのステークホルダーに表示されます。

次のタスク

- ポートフォリオ計画をステークホルダーと共有して、ポートフォリオ計画でのコラボレーションを開始します。「ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する」を参照してください。
- ポートフォリオ計画ビューを編集して、既存のビューに変更を加えます。「ポートフォリオ計画ビューの編集」を参照してください。

ポートフォリオ計画ビューの編集

要件に基づいてカスタマイズされたポートフォリオ計画ビューを編集して、再度ログインしたときにアクセスして、コラボレーションのためにステークホルダーと共有できるようにします。

始める前に
必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて

- 共有 (公開) ビューを編集できるのは、ポートフォリオ計画ビューの所有者のみです。
- ポートフォリオ計画ごとに、最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを設定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. ポートフォリオ計画ヘッダーから、編集するか、使用可能なポートフォリオ計画ビューのリストからカスタマイズ設定で上書きするビューを選択します。
   選択したビューが表示されます。
4. 必要に応じてビューを変更します。
   たとえば、 **Department** 属性と値を **Finance** としてフィルターを適用します。

   ビューに変更を加えると、[ビューを保存] オプションがポートフォリオ計画ヘッダーに表示されます。
5. [ビューの保存] を選択します。
   ビューが更新され、加えられた変更が反映されます。
6. オプション: ビューの名前を編集するには、ポートフォリオ計画ヘッダーから [ポートフォリオ計画ビュー] ドロップダウンを選択し、名前を編集するビューの横にあるビューの編集アイコン ( ) を選択します。
   [ビューの編集] ウィンドウで、詳細を入力します。

   a. 必要に応じて、[ビュー名] フィールドでビューの名前を更新します。


      注:
      ポートフォリオ計画ビューの所有者のみがビューの名前を変更できます。

   b. オプション: [共有ビュー] トグルを選択してこのビューを公開するか、[共有ビュー] トグルを無効にしてビューをプライベートにします。

      重要:
      共有ビューをプライベートビューに変更すると、既存のステークホルダーのアクセス権が削除されます。

   c. **[Save** (保存)] を選択します。

   (Optional) ビューの名前が更新されます。

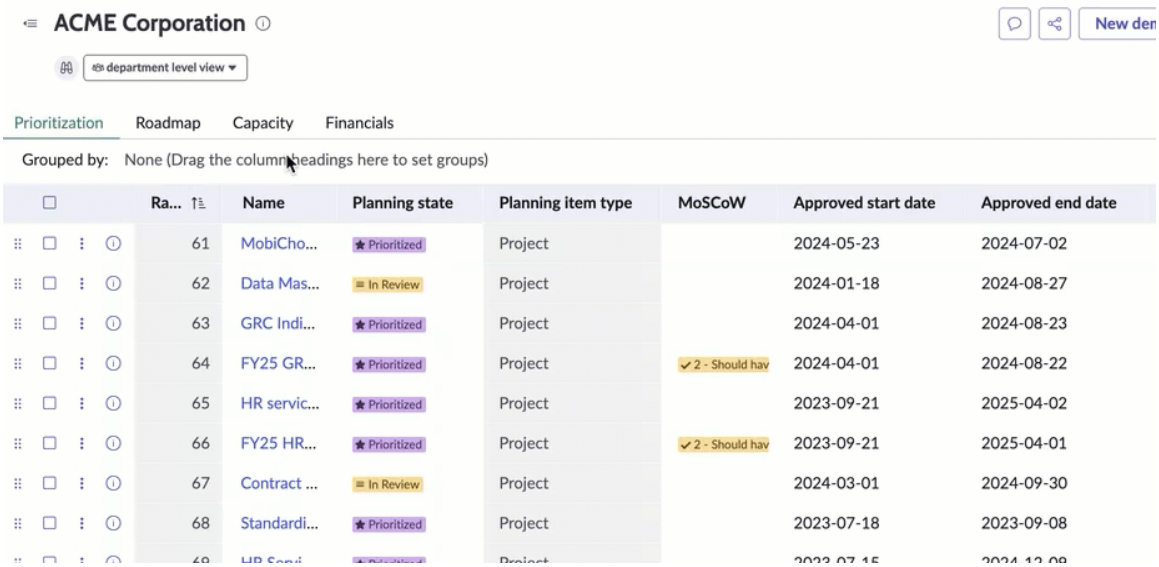

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
ポートフォリオ計画をステークホルダーと共有して、ポートフォリオ計画でのコラボレーションを開始します。「ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する」を参照してください。

関連情報

ポートフォリオ計画ビューの作成

ポートフォリオ計画ビューの削除

ポートフォリオ計画ビューの削除

不要になった場合、または共有ビューが最大 10 回、プライベートビューが 3 回という上限に達した場合は、カスタマイズされたポートフォリオ計画ビューを削除します。


始める前に
必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて

- ポートフォリオ計画ビューの所有者またはポートフォリオ計画の編集者のみがビューを削除できます。
- ポートフォリオ計画を削除すると、ビューに加えられた変更を含め、ビューが削除されます。ただし、このアクションにより、アイテム (プロジェクト、デマンド、エピック) はポートフォリオ計画にそのまま残ります。
- ポートフォリオ計画ごとに、最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを設定できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. ポートフォリオ計画ヘッダーから [ポートフォリオ計画ビュー] ドロップダウンを選択し、削除するビューの横にあるビューの削除アイコン ( ) を選択します。
   [このビューを削除] ウィンドウが表示されます。
4. [このビューを削除] ウィンドウで、[削除] を選択します。

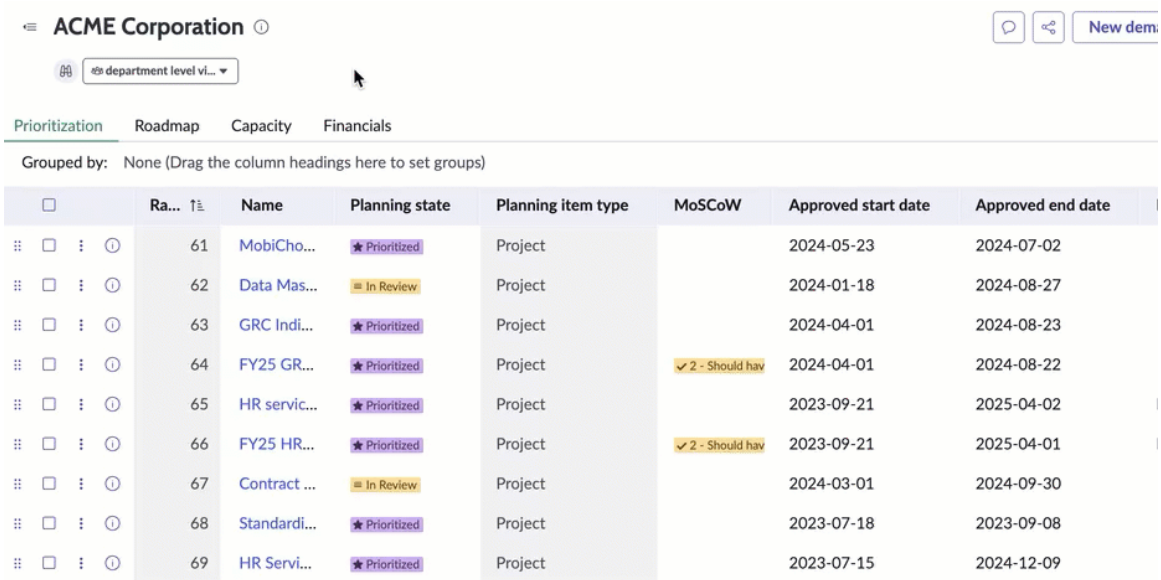

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

ポートフォリオ計画ビューの作成

ポートフォリオ計画ビューの編集

でのダッシュボードの使用 ポートフォリオ計画

ポートフォリオ計画ワークスペース のプラットフォームアナリティクスダッシュボードを使用すると、パフォーマンスを監視し、進捗状況を追跡し、計画と実行に関連する情報に基づいた意思決定を行うことができます。

ダッシュボードの管理に必要なロール

すぐに利用可能なダッシュボードにアクセスするために必要なロール

アクセスレベル	必要なロール
実行ダッシュボードの読み取り、複製、共有	sn_align_core.ap_read_only **注:** 財務関連ウィジェットおよびキャパシティ計画立案ウィジェットでデータを表示するには、ユーザーに適切なロールが必要です。
実行ダッシュボードの編集	アドミン

ダッシュボードの作成または編集に必要なロール (すぐに利用可能なダッシュボードを除く)

アクセスレベル	必要なロール
ダッシュボードを作成	sn_align_core.apw_user
ダッシュボードを編集	sn_align_core.apw_user **注:** 自分が所有するダッシュボードまたは編集権限を付与されたダッシュボードを編集できます。

注:
ダッシュボードでウィジェットを作成するには、 ServiceNow AI Platformで使用可能なデータソーステーブルを構成します。ただし、主要なデータ、メトリクス、または可視化を表示するには、ソーステーブルへの読み取りアクセス権が必要です。

たとえば、予算データを表示するようにコスト計画ブレークダウンテーブルを設定するダッシュボードでウィジェットを作成する場合、コスト計画ブレークダウンテーブルへの読み取りアクセス権がある場合にのみ、予算サマリーがダッシュボードに表示されます。同様に、このダッシュボードをステークホルダーと共有する場合、予算サマリーを表示するには、ステークホルダーがコスト計画ブレークダウンテーブルへの読み取りアクセス権も持っている必要があります。

プラットフォームアナリティクスダッシュボードを管理するために必要なロールの詳細については、「Platform Analytics dashboard roles」を参照してください。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

の実行ダッシュボード ポートフォリオ計画ワークスペース

実行ダッシュボードは、ポートフォリオマネージャーとプロダクトマネージャーが作業アイテム全体の配送の進捗状況をリアルタイムで可視化するのに役立ち、ポートフォリオリードが遅延を検出し、コースを早期に修正し、戦略を順調に進めることを可能にします。

実行ダッシュボードは、[概要]、[財務]、[金銭と依存関係]、[キャパシティ]、[RIDAC]、[データ品質]、[地理] などのさまざまなタブでさまざまなアナリティクスを提供します。

実行ダッシュボードの [概要] タブ

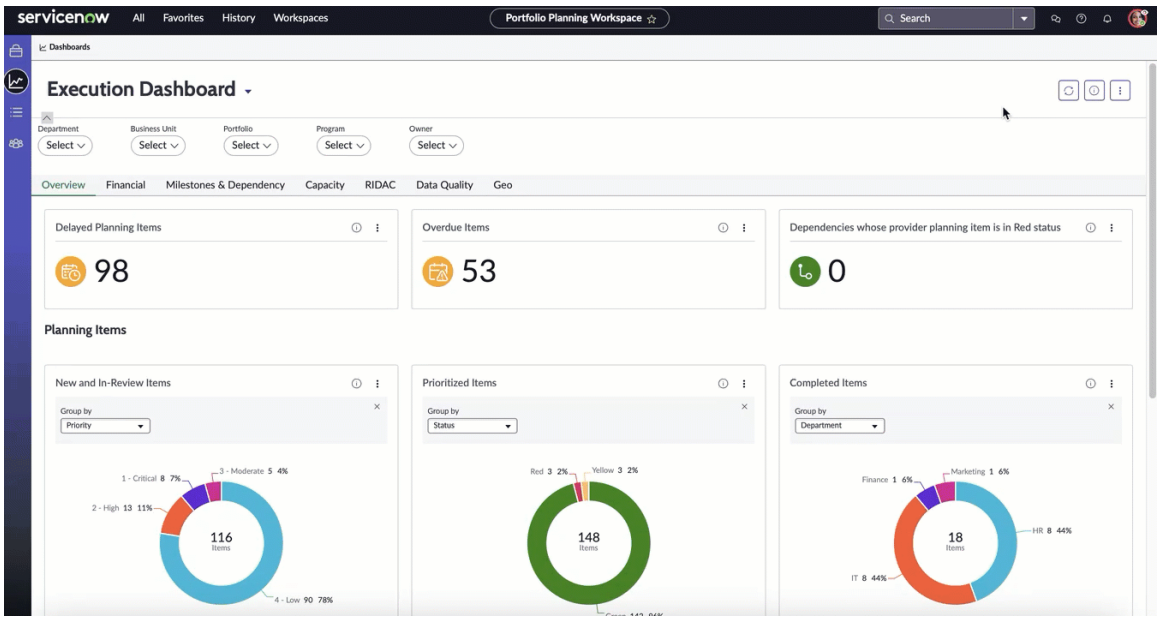


ウィジェット/可視化	説明
遅延計画立案アイテム	承認された開始日が過去の日付であるにもかかわらず、優先順位が付けられているがまだ開始されていない (実際の開始日が記録されていない) 計画立案アイテム。
期限切れのアイテム	承認された終了日が過去の日付であるにもかかわらず、未完了のままである (実際の終了日が記録されていない) 優先順位付けされた計画立案アイテム。
プロバイダー計画立案アイテムが赤のステータスである依存関係	すべての依存計画立案アイテムに影響を与える、プロバイダー計画立案アイテムのステータスが赤の依存関係。
プランニングアイテム	
新規およびレビュー中のアイテム	優先度別にグループ化された新規およびレビュー中の計画立案アイテムの可視化。他の利用可能なオプションを使用してアイテムをグループ化することもできます。
優先順位付けされたアイテム	ステータス別にグループ化された優先順位付けされた計画立案アイテムの可視化。他の利用可能なオプションを使用してアイテムをグループ化することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウィジェット/可視化	説明
完了済みアイテム	ステータスが [完了] である計画立案アイテムの可視化。他の利用可能なオプションを使用してアイテムをグループ化することもできます。
実行アイテム	
プロジェクト	ステータス別にグループ化されたプロジェクト数の可視化。他の利用可能なオプションを使用してアイテムをグループ化することもできます。
デマンド	ステータス別にグループ化されたデマンド数の可視化。他の利用可能なオプションを使用してアイテムをグループ化することもできます。

実行ダッシュボードの [財務] タブ

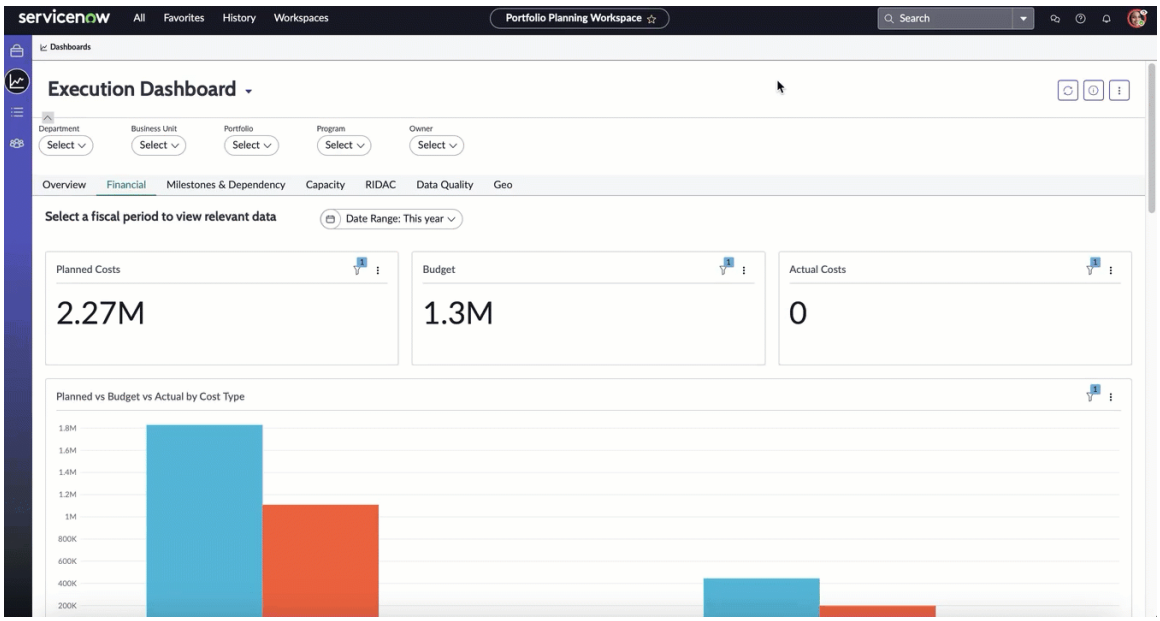


ウィジェット/可視化	説明
関連データを表示する会計期間を選択	日付範囲を 今年 または 昨年 として選択し、それに応じてデータをフィルタリングして表示するオプション。日付範囲をクリアすると、ポートフォリオ計画の開始日から考慮したデータが表示されます。
計画コスト	計画を実行するためのコスト概算。
予算	計画を実行するための推定予算。
実績コスト	計画の実行中に発生した実績コスト。
コストタイプ別の計画と予算と実績	原価費目別の計画、予算、実績の可視化。
計画、予算、実績	計画、予算、実績別のコストの可視化。
投資タイプ別の予算	投資タイプ別の予算の可視化。
福利厚生	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウィジェット/可視化	説明
計画利益	計画された金銭的利益。
実績金銭的利益。	達成された金銭的利益。
保留中の金銭的利益。	処理待ちステータスの金銭的利益。
カテゴリ別の福利厚生	収益、コスト削減、顧客満足度スコアなどのカテゴリ別の利益。
金銭的利益	計画利益と実績利益に関する金銭的利益の可視化。

実行ダッシュボードの [マイルストーンと依存関係] タブ

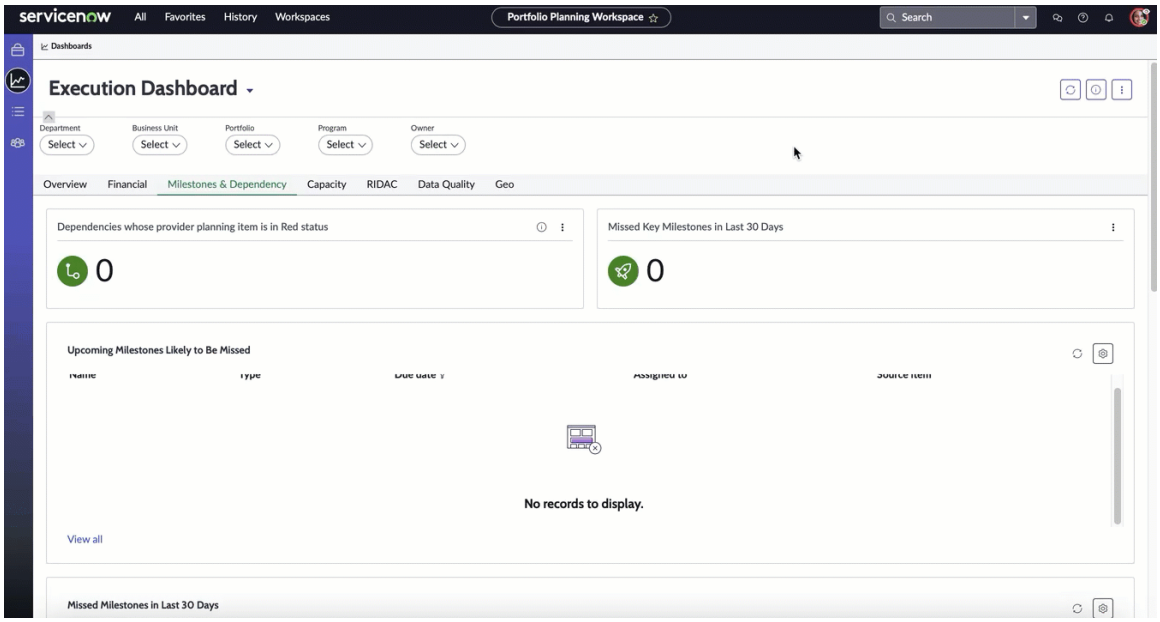


ウィジェット/可視化	説明
プロバイダー計画立案アイテムが赤のステータスである依存関係	すべての依存計画立案アイテムに影響を与える、プロバイダー計画立案アイテムが赤のステータスになっている依存関係の数。
過去 30 日間に実行されなかった主要マイルストーン	過去 30 日以内に主要マイルストーンを達成できなかった計画立案アイテムの数。
達成されない可能性が高い今後のマイルストーン	重要なマイルストーンが間もなく達成されない計画立案アイテムのリスト。名前、タイプ、期日、アサイン先、ソースアイテムなどの詳細が含まれます。
過去 30 日間に実行されなかったマイルストーン	過去 30 日以内に主要マイルストーンを達成できなかった計画立案アイテムのリスト。詳細、名前、タイプ、期日、アサイン先、ソースアイテムなどの詳細が含まれます。
過去 30 日間に達成したマイルストーン	過去 30 日以内に主要マイルストーンが達成された計画立案アイテムのリスト。詳細、名前、タイプ、期日、アサイン先、ソースアイテムなどの詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウィジェット/可視化	説明
マイルストーンアナライザー	ステータス別にグループ化され、タイプ別に積み重ねられた主要なマイルストーンの可視化。他の利用可能なオプションを使用して、アイテムをグループ化して積み重ねることもできます。

実行ダッシュボードの [キャパシティ] タブ

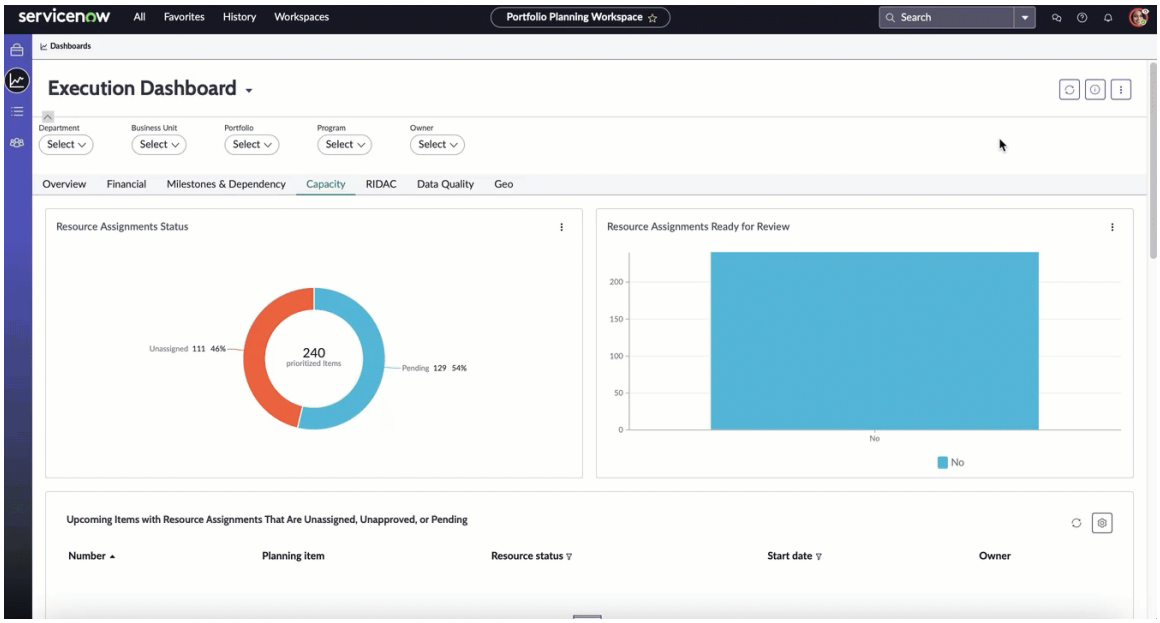


ウィジェット/可視化	説明
リソースのアサインステータス	リソースのアサインステータスの可視化。
リソースのアサインのレビュー準備完了	レビュー準備完了のリソースのアサイン数の可視化。
未アサイン、未承認、または処理待ちのリソースのアサインがある予定のアイテム	リソースのアサインステータスが [未アサイン]、[未承認]、または [処理待ち] である今後の計画立案アイテムのリスト。
グループ、ロール、スキル別のリソースのアサイン	グループ、ロール、およびスキル別のリソースのアサイン数の可視化。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

実行ダッシュボードの **[RIDAC]** タブ

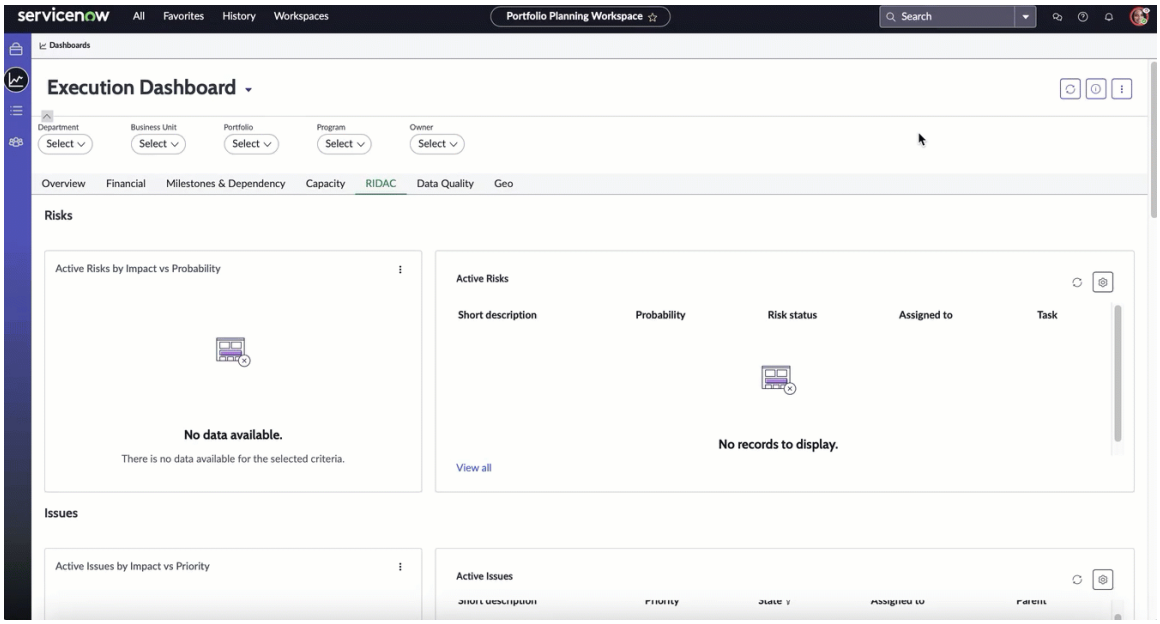

実行ダッシュボードの [データ品質] タブ

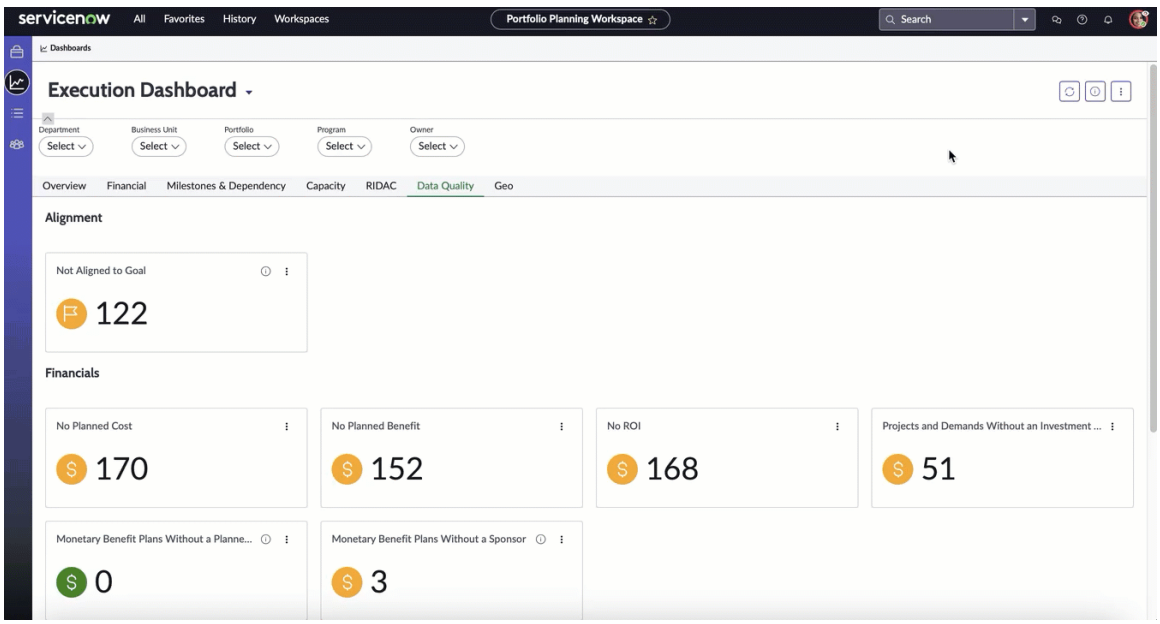

ウィジェット/可視化	説明
位置調整	
目標に対して未調整	目標に関連付けられていない作業アイテムの数。
財務	
計画コストなし	コストの見積もりがまだ実行のために行われていない作業アイテムの数。
計画利益なし	利益の推定がまだ完了していない作業アイテムの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウィジェット/可視化	説明
ROI なし	ROI がまだ推定されていない作業アイテムの数。
投資タイプのないプロジェクトとデマンド	投資タイプがまだ定義されていないプロジェクトとデマンドの数。
予定利益のない金銭的利益計画	利益がまだ定義されていない金銭的利益計画の数。
スポンサーなしの利益計画	スポンサーがまだアサインされていない金銭的利益計画の数。
他の属性を持つ計画立案アイテム	
リソースのアサインがありません	リソースがアサインされていない計画立案アイテムの数。
予定外のアイテム	まだスケジュールされていない計画立案アイテムの数。
ポートフォリオなし	ポートフォリオが定義されていない計画立案アイテムの数。
プログラムなし	プログラムが定義されていない計画立案アイテムの数。
部門がありません	部門が設定されていない計画立案アイテムの数。
事業部門なし	事業部門が設定されていない計画立案アイテムの数。
オーナーなし	所有者がアサインされていない計画立案アイテムの数。

実行ダッシュボードの [地理] タブ

ウィジェット/可視化	説明
場所別の計画コスト	計画を実行するための場所別のコスト概算。

でのダッシュボードの表示 ポートフォリオ計画ワークスペース

ダッシュボードに主要なデータとメトリクスを表示して、パフォーマンスを監視し、進捗状況を追跡し、計画と実行に関連する情報に基づいた意思決定を行います。

始める前に

必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて

ダッシュボードは、複数のソースからのデータを 1 つのわかりやすい形式に統合します。 ダッシュボード内の各ウィジェットには、主要なデータと測定基準が表示され、可視化が含まれる場合があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ダッシュボード.
   デフォルトでは、実行ダッシュボードは [ダッシュボード] ページに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. オプション: [ダッシュボードの変更] ドロップダウンから、表示するダッシュボードを選択します。
   選択したダッシュボードが ダッシュボードページに表示されます。
3. オプション: 主要なデータとメトリクスを表示する必要なタブを選択します。
   ダッシュボード内の各ウィジェットには、主要なデータと測定基準が表示され、可視化が含まれる場合があります。
4. オプション: ウィジェットを選択すると、リストビューでデータの詳細が表示されます。
   編集アクセス権がある場合は、必要に応じてリストビューから個々のレコードの詳細を直接更新できます。

関連情報

ダッシュボードを作成

ダッシュボードの複製

ダッシュボードを共有

プラットフォームアナリティクスダッシュボードの追加

ダッシュボードを作成

プラットフォームアナリティクスエクスペリエンスでは、データの可視化、フィルター、その他の要素を含む共有可能なダッシュボードを作成できます。インラインエディターで利用可能な要素を使用して、必要に応じてさまざまなタイプのウィジェットを作成できます。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

ダッシュボードは、複数のソースからのデータを 1 つのわかりやすい形式に統合します。ダッシュボード内の各ウィジェットには、主要なデータと測定基準が表示され、可視化が含まれる場合があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ダッシュボード.
   デフォルトでは、実行ダッシュボードは [ダッシュボード] ページに表示されます。
2. ダッシュボードヘッダーから、[その他のアクション] アイコン (⋮ を選択し、[新規作成] を選択します。
3. [新規ダッシュボード] ウィンドウで、詳細を入力します。
   a. [名前] フィールドにダッシュボードの名前を入力します。
   b. オプション: [説明] フィールドにダッシュボードの簡単な説明を入力します。
   c. **[Create new dashboard** (新規ダッシュボードを作成)] を選択します。

次のタスク

セクション、フィルター、画像、リスト、プロセスマイニングマップ、リッチテキストを追加して、必要に応じてダッシュボードを編集します。詳細については、「ダッシュボードを編集」を参照してください。

関連情報

でのダッシュボードの表示 ポートフォリオ計画ワークスペース

ダッシュボードの複製

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ダッシュボードを共有

プラットフォームアナリティクスダッシュボードの追加

ダッシュボードを編集

セクション、フィルター、画像、リスト、プロセスマイニングマップ、およびリッチテキストを追加して、必要に応じてダッシュボードをカスタマイズまたは編集します。ダッシュボードが共有されている場合、行った変更はすべてグローバルに適用されます。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

注:

- 自分が所有するダッシュボードまたは編集権限を付与されたダッシュボードを編集できます。
- アドミンのみが、すぐに利用可能なダッシュボードである実行ダッシュボードを編集できる。ただし、 すぐに利用可能なダッシュボードを複製 し、必要に応じてカスタマイズすることができます。

次の要素を使用して、ダッシュボードを作成または編集できます。

Strategic Planning のダッシュボード 要素


要素	説明
データの可視化	現在のインスタンスデータまたはインポートした一時データを視覚的に表現できます。データの可視化には、ダッシュボードデザイナーで作成した可視化と、ライブラリからのデータの可視化が含まれます。
フィルター	指定した基準に基づいて、ダッシュボード上の可視化をフィルタリングできます。個々のタブまたはタブの上にフィルターを配置して、すべてのタブの要素にフィルターを適用することができます。フィルターには、データフィルターとドメインフィルターの両方が含まれます。ダッシュボードデザイナーでフィルターを作成することも、ライブラリからフィルターを選択することもできます。
見出し	ダッシュボードの上部またはダッシュボードのセクションにテキストを配置する場所を提供します。見出しの書式設定は 6 つの見出しレベルに制限されています。
イメージ	ダッシュボードに静止画像またはアニメーション画像を保持します。
リスト：簡易	ダッシュボードの対象者向けにカスタマイズできるテーブルデータを表示します。
プロセスマイニング：マップ	プロセスの一部であるさまざまな状況とそれらの状況間の移行をマッピングします。プロセスのオブジェクトがどのステータスにあるか、およびそれらがステータスを変更する速度を確認

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Strategic Planning のダッシュボード 要素 (続く)

要素	説明
	します。既存のプロセスマイニングプロジェクトが必要です。
リッチテキスト	フォント選択、テキストサイズ、ハイライト表示、ハイパーリンクなど、テキストまたは HTML として書式設定できるテキストを保持します。HTML マークアップを編集するには、[構成] パネルから HTML エディターを開き、[コードタグ] < >アイコンを選択します。

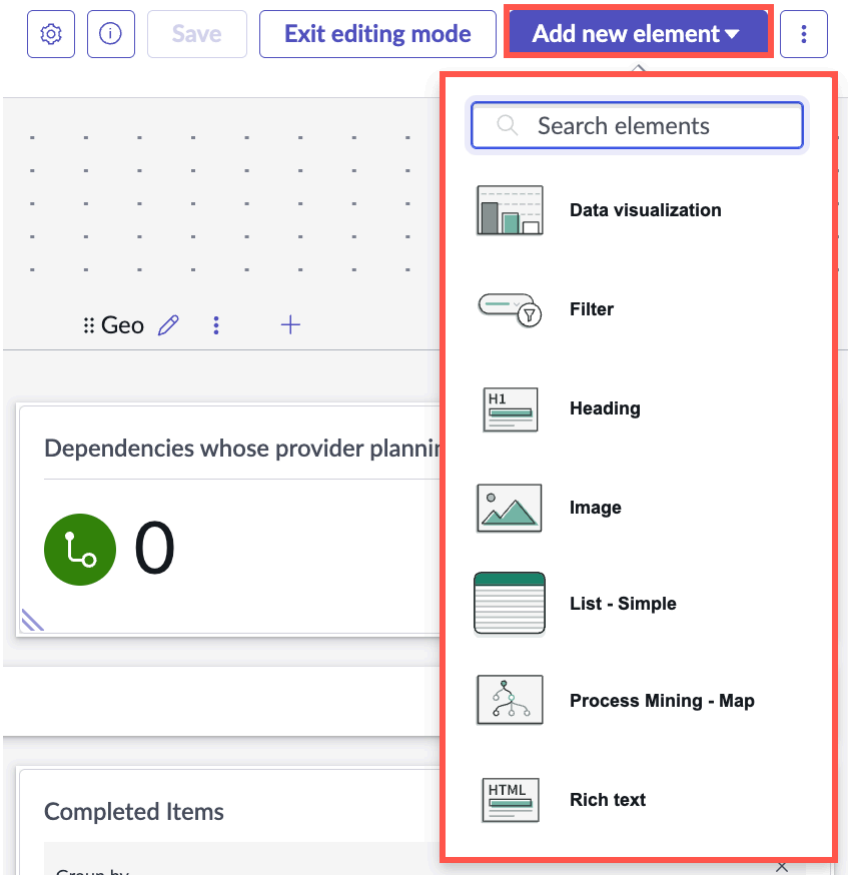

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ダッシュボード.
   デフォルトでは、実行ダッシュボードは [ダッシュボード] ページに表示されます。
2. [ダッシュボードの変更] ドロップダウンから、編集するダッシュボードを選択します。
   選択したダッシュボードが表示されます。
3. ダッシュボードヘッダーから [編集] を選択します。
4. 必要に応じて、ウィジェットをドラッグして移動またはサイズ変更します。
5. ダッシュボードヘッダーから [保存] を選択します。
6. ダッシュボードヘッダーから、[編集モードを終了] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
ダッシュボードが最新の変更で更新されます。

次のタスク
- 必要に応じて要素を追加し、ダッシュボードをカスタマイズします。
- ポートフォリオ計画 でプラットフォームアナリティクスエクスペリエンスを使用してダッシュボードを編集する詳細な手順については、「Edit Platform Analytics dashboards」を参照してください。

関連情報
- でのダッシュボードの表示 ポートフォリオ計画ワークスペース
- ダッシュボードを作成
- ダッシュボードの複製
- ダッシュボードを共有
- プラットフォームアナリティクスダッシュボードの追加

ダッシュボードの複製

作成するダッシュボードが既存のダッシュボードと類似している場合は、既存のダッシュボードを複製することで時間を節約できます。ダッシュボードを複製した後、必要に応じてタブとウィジェットをカスタマイズできます。

始める前に
- ダッシュボードを共有するユーザーまたはグループがポートフォリオ計画への読み取りまたは編集アクセス権を取得するには、それぞれ sn_align_core.ap_read_only または sn_align_core.apw_user ロールが必要です。
- ダッシュボードを複製すると、元のダッシュボードのすべての設定と詳細がコピーされます。元のダッシュボードにローカルに存在するコンテンツは、新しいダッシュボードに複製されます。元のダッシュボードに、共有のビジュアル化など、ライブラリ内のコンテンツへの参照が含まれている場合、それらの参照は複製されます。ライブラリ内の要素を編集するためのロール要件は、後者に適用されます。

必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

手順
1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ダッシュボード.
   デフォルトでは、実行ダッシュボードは [ダッシュボード] ページに表示されます。
2. [ダッシュボードの変更] ドロップダウンから、複製するダッシュボードを選択します。
3. ダッシュボードヘッダーから、[その他のアクション] アイコン ( ) を選択し、[複製] を選択します。
4. [ダッシュボードを複製中 (Duplicating dashboard)] ウィンドウで、詳細を入力します。
   a. [新しい名前] フィールドにポートフォリオ計画の名前を入力します。
      デフォルトでは、名前は *ABC (Copy)* です。ここで、ABC は複製元のダッシュボードの名前です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

b. オプション: [説明] フィールドにゴールの簡単な説明を入力します。

c. [複製] を選択します。

ダッシュボードの複製は 時間がかかる場合があります[バックグラウンドで続行] を選択して、その間もアプリケーションを使用し続けます。

タスクの結果
ダッシュボードが新しい名前でコピーされます。ダッシュボードの外観は元のダッシュボードと同じです。

次のタスク
セクション、フィルター、画像、リスト、プロセスマイニングマップ、リッチテキストを追加して、必要に応じてダッシュボードを編集します。詳細については、「ダッシュボードを編集」を参照してください。

関連情報
- でのダッシュボードの表示 ポートフォリオ計画ワークスペース
- ダッシュボードを作成
- ダッシュボードを共有
- プラットフォームアナリティクスダッシュボードの追加

ダッシュボードを共有

ステークホルダー、計画マネージャー、ポートフォリオマネージャー、または製品マネージャーとダッシュボードを共有して、作業の進捗状況を可視化し、コラボレーションを促進します。共有ダッシュボードの表示専用権限、または表示権限と編集権限の両方を付与できます。

始める前に
必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて
共有ダッシュボードにアクセスするには、ダッシュボードを共有するユーザーまたはグループに適切なロールが割り当てられている必要があります。

手順
1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ダッシュボード.
   デフォルトでは、実行ダッシュボードは [ダッシュボード] ページに表示されます。
2. [ダッシュボードの変更] ドロップダウンから、共有するダッシュボードを選択します。
   選択したダッシュボードが表示されます。
3. ダッシュボードヘッダーから、[その他のアクション] アイコン (⋮ を選択し、[共有] を選択します。
4. [共有ダッシュボード] ウィンドウで、詳細を入力します。

   a. 個々のユーザーまたはユーザーグループにそれぞれアクセスを提供する には、[アクセス権を付与する] フィールドにユーザー名またはグループ名を入力します。
   ロールを選択して、そのロールに割り当てられたすべてのユーザーにダッシュボードアクセス権を付与することもできます そのロール 。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

b. オプション: [受信者がこのダッシュボードに関連付けられた共有権限を追加、編集、または削除できるようにする] を選択して、ユーザーが新しいユーザーにアクセス権を付与したり、既存の権限を変更または削除したりできるようにします。


c. 必要に応じて、[閲覧者として追加] または [編集者として追加] を選択します。

> **注:**
> [エディターとして追加] を選択できるのは、sn_align_core.apw_user ロールが割り当てられている場合のみです。

選択したユーザー、グループ、ロールが [アクセスを管理] に表示されます。

ユーザー、グループ、またはロールを選択し、[共有可能] オプションを有効にすることで、権限を共有の管理することもできます。

d. [**Confirm** (確認)] を選択します。

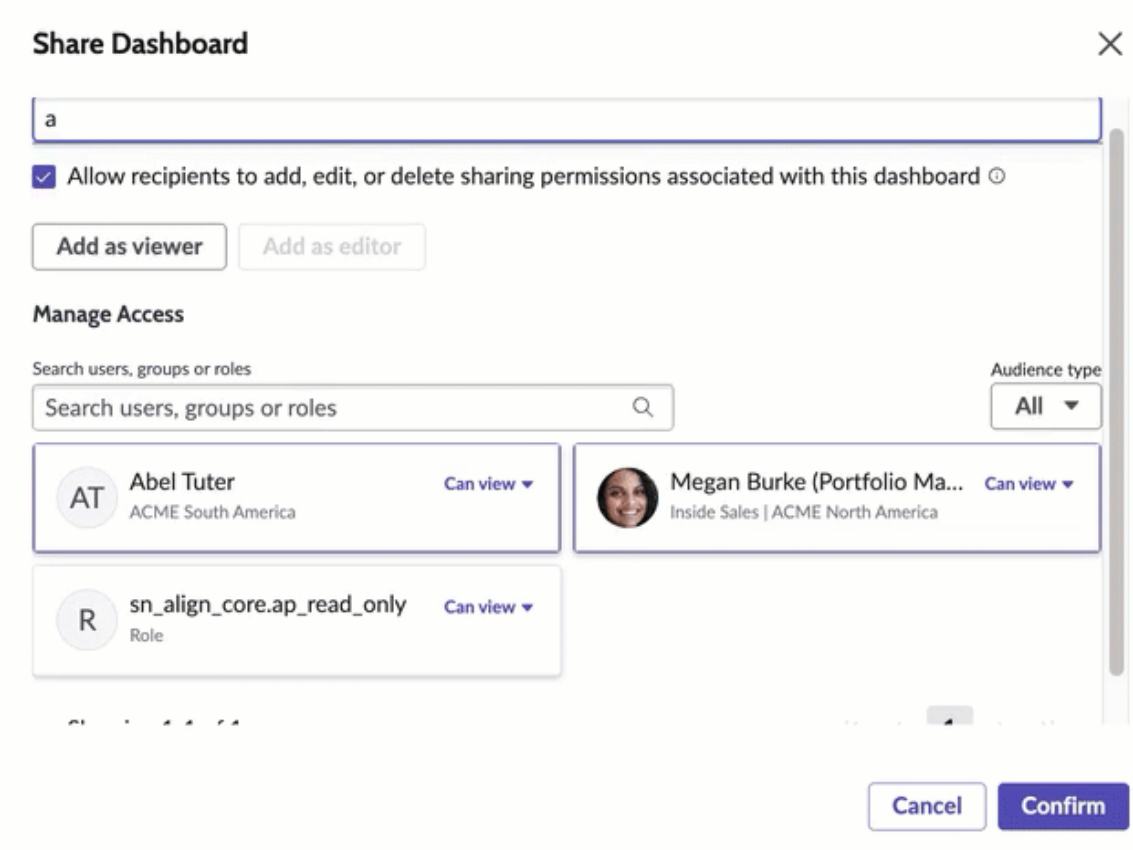

タスクの結果

ダイアログを再度開くと、ダッシュボードを共有したロール、グループ、およびユーザーが付与した権限とともに 再び表示されます。

次のタスク

ダッシュボードを共有したユーザーの権限は、各ユーザー、グループ、またはロールの [表示可能]/[共有可能] リストの下にある [ダッシュボードの共有] ダイアログで変更できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

- でのダッシュボードの表示 ポートフォリオ計画ワークスペース
- ダッシュボードを作成
- ダッシュボードの複製
- プラットフォームアナリティクスダッシュボードの追加

プラットフォームアナリティクスダッシュボードの追加

プラットフォームアナリティクスを使用して作成された既存のダッシュボードがある場合は、それらをポートフォリオ計画ワークスペースに追加して、1 つの場所から直接アクセスできます。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
任意のプラットフォームアナリティクスダッシュボードをポートフォリオ計画ワークスペースに追加できます。

手順

1. 移動先 すべて > プラットフォームアナリティクス > アナリティクスセンター.
   [ダッシュボード] セクションがページに表示されます。
2. [ブックマーク済み] タブまたは [認定済み] タブから、ブックマーク済みまたは認定済みのダッシュボードを選択します。
   追加するダッシュボードブックマークまたは認定されていない場合は、[ダッシュボード] セクションから [すべて表示] を選択し、[ダッシュボード] ページからダッシュボードを選択します。
3. ダッシュボードヘッダーから [編集] を選択します。
4. ダッシュボードヘッダーから、[ダッシュボードの詳細を表示] アイコン (
   a. [詳細] サイドパネルで、[ポートフォリオ計画ワークスペース] の [ダッシュボードの可視化] フィールドに入力します。
5. ダッシュボードヘッダーから [保存] を選択します。
6. ダッシュボードヘッダーから、[編集モードを終了] を選択します。

タスクの結果
ダッシュボードがポートフォリオ計画ワークスペース上に表示されます。

関連情報

- でのダッシュボードの表示 ポートフォリオ計画ワークスペース
- ダッシュボードを作成
- ダッシュボードの複製
- ダッシュボードを共有

ポートフォリオ計画ステータスまたはロードマップのエクスポート先 **Microsoft PowerPoint**

ポートフォリオ計画とフリーフォームロードマップの作業アイテム、ロードマップ、および主要メトリクスのステータスを Microsoft PowerPoint ファイルにエクスポートして、ビジネスステークホルダーが最新の進捗状況を常に把握できるようにします。レポートへのデータのコピーを回避することで時間を節約し、ServiceNow インスタンスにアクセスできないステークホルダーとも連携できるようにすることで、成果の共有を促進します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート のインストール。

> **重要:**
> PowerPoint へのエクスポートは現在、FedRAMP、NSC DOD IL5、オーストラリアの IRAP で保護されたデータセンターのお客様、セルフホスト型のお客様、またはその他の制限された環境のお客様は利用できません。将来のリリースで可用性の更新を確認してください。

必要なロール：admin

このタスクについて
ポートフォリオ計画の状況レポートを生成するために、次の 2 つの PowerPoint テンプレートがデフォルトで提供されています。

- [ポートフォリオ計画のステータス (Portfolio plan status)]：ランク別に優先順位付けされた上位 5 つのアイテムの個々の詳細スライドが含まれています。
- [ロードマップテンプレート - デフォルト (Roadmap Template - default)]：このポートフォリオのロードマップのスライドが含まれます。一度に最大 1 年間のロードマップデータをエクスポートできます。


事前定義されたテンプレートを更新するか、独自のブランド化されたテンプレートを作成することで、生成されたレポートに表示されるデータのタイプをカスタマイズできます。「Microsoft PowerPoint テンプレートの作成」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > **Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画およびフリーフォームロードマップの目標、作業アイテム、ロードマップ、および主要メトリクスのステータスを Microsoft PowerPoint ファイルにエクスポートします。

タスクの結果
関連するデータが含まれる PowerPoint ファイルが生成されます。

この画像はエクスポートされたロードマップの例で

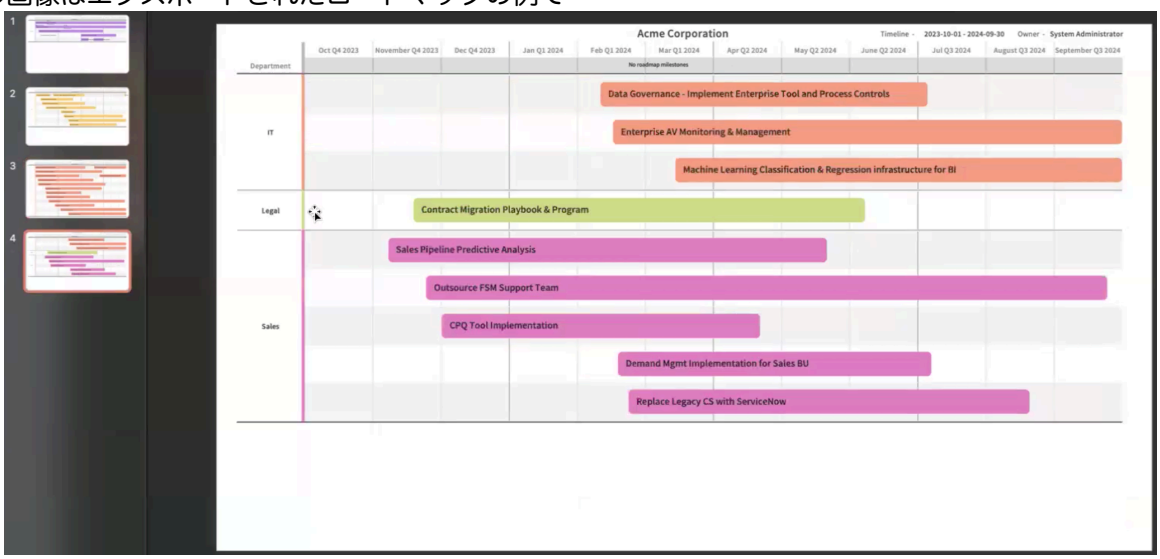

す。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PPM での ポートフォリオ計画 作業の実行

ServiceNow プロジェクトポートフォリオ管理 アプリケーションの ポートフォリオ計画 で計画された作業がスムーズに実行できるようになります。

ポートフォリオ計画 と PPM の間で計画立案アイテムをインポート、エクスポート、および管理します。

ポートフォリオ計画 と **PPM** の統合

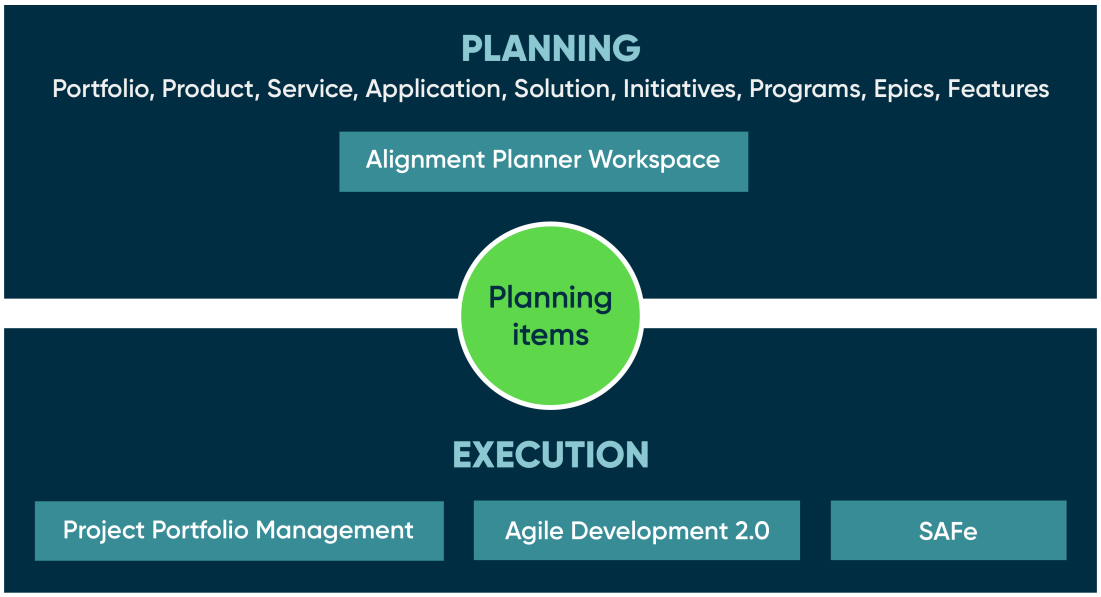

ポートフォリオ計画ワークスペース へのレコードのインポート

関連するテーブルマップ、フィールドマップ、および選択マップが構成された後に、プロジェクトポートフォリオ管理 からレコードをインポートします。

始める前に
必要なロール：sn_ament_core.apw_admin


手順

1. 移動先 すべて > ポートフォリオ計画 > 統合.
2. **[ServiceNow** 内部] 配置統合レコードを選択します。
3. [インポート] をクリックします。
4. [インポート要求を作成] フォームで、レコードをインポートする日付範囲を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インポート要求を作成

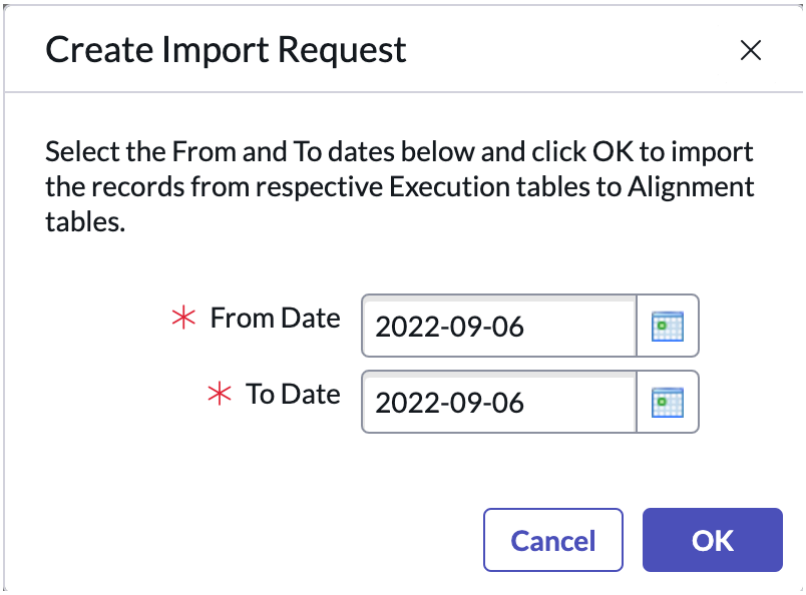

5. [OK] を選択します。

注:
指定された日付内に作成されたレコードがインポートされます。

エラーログの表示

エラーログを表示して、統合プロセス中に発生した可能性のある問題の原因を理解します。

始める前に
必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

手順

1. 移動先 すべて > ポートフォリオ計画 > 統合.

2. エラーログを表示するには、[統合エラー] タブを選択します。

ポートフォリオ計画の参照

ユーザーロール、テーブル、ドメインセパレーション情報など、ポートフォリオ計画 に関する追加の詳細を提供するための参照情報。

ポートフォリオ計画 とともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、ポートフォリオ計画 アプリケーションのアクティブ化とともにインストールされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
ポートフォリオ計画 admin [sn_align_core.apw_admin]	ポートフォリオ計画 アプリケーションのすべてのモジュールにアクセスできます。	• it_portfolio_manager • sn_align_core.apw_user • view_changer
ポートフォリオ計画 ユーザー [sn_align_core.apw_user]	ポートフォリオ計画、フリーフォームロードマップ、計画立案アイテムを作成、更新、および削除できます。 このロールは、ポートフォリオマネージャーや製品マネージャー、事業部門リーダー、その他の計画立案ペルソナなどのユーザーに付与できます。	• sn_align_cmn_int.user • sn_milestones.milestone_editor
sn_align_core.ap_read_only	• 共有されているポートフォリオ計画と自由形式のロードマップを表示できます。 • 共有されているポートフォリオ計画とロードマップにメモ、コメントまたは添付ファイルを追加できます。 • ポートフォリオ計画ビューとフリーフォームロードマップビューを作成、編集、削除できます。 **注:** オーナーのみが、ポートフォリオ計画ビューまたはフリーフォームロードマップビューを編集または削除できます。	sn_milestones.milestone_viewer
マイルストーンエディター	ロードマップ上のマイルストーンを作成、更	sn_milestones.milestone_viewer

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
[sn_milestones.milestone_editor]	新、および削除できます。	
マイルストーンビューア [sn_milestones.milestone_viewer]	ロードマップにマイルストーンを表示できます。	なし
ビジネスステークホルダー [business_stakeholder]	• ポートフォリオ計画とフリーフォームロードマップを作成および更新できます。 • 共有されているポートフォリオ計画とロードマップにメモ、コメントまたは添付ファイルを追加できます。 • ロードマップをカスタマイズできます。 • [キャパシティ計画立案] 画面で、計画立案アイテムに対して生成されたリソースキャパシティを表示できます。 • プラットフォームビューを使用して目標と関連レコードを表示できます。 **注:** このロールを持つユーザーには、ロードマップアイテムを作成または編集するためのアクセス権がありません。	• sn_align_core.ap_read_only • sn_align_ws.spw_capacity_read • sn_gf.goal_user_read

シナリオ計画のロール

ロールタイトル [名前]	説明	含まれるロール
sn_align_ws.scenario_approver	ポートフォリオのシナリオを承認できます。	sn_align_core.apw_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポートフォリオ計画と **PPM** ロール

ロールタイトル [名前]	説明	含まれるロール
ポートフォリオ計画 統合ユーザー [sn_align_cmn_int.user]	ポートフォリオ計画 と PPM の間で計画立案アイテムをインポート、エクスポート、および管理します。	connection_admin

キャパシティロール

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
sn_align_ws.spw_capacity_user	リソースキャパシティの詳細を生成できます。	sn_align_ws.spw_capacity_read
sn_align_ws.spw_capacity_read	リソースキャパシティの詳細を表示できます。	なし

財務計画立案ロール

ロールタイトル [名前]	説明	含まれるロール
sn_align_ws.spw_financial_user	計画立案アイテムのコスト計画と経費ラインを作成します。	なし

インストールされるテーブル

テーブル	説明
配置統合 [sn_align_cmn_int_integrations_setup]	ServiceNow インスタンスの統合情報のデータを保存します。
選択マップ sn_align_cmn_int_choice_map	ポートフォリオ計画 の計画立案アイテムのフィールドと PPM 間の選択マップ関係を保存します。
デマンド [sn_align_core_demand]	デマンド計画立案アイテムタイプで作成されたレコードを保存します。
依存関係 [sn_align_core_dependency]	ロードマップアイテム間の依存関係に関するデータを格納します。
フィールドマップ [sn_align_cmn_int_field_map]	ポートフォリオ計画 の計画立案アイテムと PPM 間のフィールドマップ関係を保存します。
インポート要求	ポートフォリオ計画 から PPM へのインポート要求を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
[sn_align_cmn_int_import_request]	
インスタンスマッピング [sn_align_cmn_int_instance_mapping]	インスタンス間のマッピング情報を保存します。
統合エラー [sn_align_cmn_int_integration_error]	ポートフォリオ計画 と PPM 間の統合のエラーを保存します、
統合マッピング [sn_align_cmn_int_integration_mapping]	ポートフォリオ計画 と PPM 間の統合マッピングを保存します。
レンズ [sn_align_core_lens]	レンズ構成のデータを保存します。
レンズ構造 [sn_align_core_lens_structure]	レンズエンティティのデータとさまざまなレンズ間でのそれらの関係を保存します。
計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item]	すべての計画立案アイテムタイプのデータを保存します。
ポートフォリオ計画 [sn_align_ws_portfolio_plan]	ポートフォリオ計画のデータを保存します。
プロジェクト [sn_align_core_project]	プロジェクト計画立案アイテムタイプで作成されたレコードを保存します。
ロードマップ構成 [sn_align_ws_roadmap_configuration]	ポートフォリオロードマップとフリーフォームロードマップの作成に使用されるテーブルの構成データを格納します。
テーブルマップ sn_align_cmn_int_table_map	ポートフォリオ計画 の計画立案アイテムと PPM 間のテーブルマッピング関係を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールされているシステムプロパティ

Portfolio Planning with PPM システムプロパティ

名前	説明
com.sn_align_cmn_int.bulk_import	• タイプ：選択リスト • デフォルト値：INSERT • 他の可能な値： ○ 挿入 ○ <値 2 名>： • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル • 詳細を見る： 一括インポートの設定

ドメインセパレーションと ポートフォリオ計画

ポートフォリオ計画 ではドメインセパレーションがサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート) 」を参照してください。

ポートフォリオ計画でのドメインセパレーションの概要

さまざまなドメインで、レンズ、ポートフォリオ計画、計画立案アイテム、およびロードマップを作成できます。

ポートフォリオ計画におけるドメインセパレーションの仕組み

ServiceNow インスタンスでドメインセパレーションを有効にした後、ポートフォリオ計画 のデータは自動的にドメインセパレーションされます。つまり、さまざまなドメインの計画階層、計画立案アイテム、および計画組織のデータは、これらのドメインにアクセスできるユーザーにのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポートフォリオ計画 のドメインセパレーションテーブル

ポートフォリオ計画 でインストールされるすべてのテーブルは、ドメインセパレーションをサポートしています。テーブルの完全なリストについては、「ポートフォリオ計画 とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

ポートフォリオ計画 での計画立案アイテムの並べ替えエラー

ポートフォリオ計画 ワークスペースの優先順位付けのリストビューでアイテムの並べ替えに失敗するシナリオを確認してください。

ポートフォリオ計画の作業パイプライン内の計画立案アイテムのランクを更新するために、[優先順位付け] ページのリストビューからアイテムを並べ替えることができます。その際、ランキング構成のエラーが原因で並べ替えが失敗する可能性があります。計画立案アイテムの並べ替えが失敗する可能性があるシナリオは次のとおりです。

シナリオ 1：Global ranking プラグインがアクティブでない

ServiceNow インスタンスで Global Ranking Application プラグイン (com.snc.sdlc.ranking) がアクティブかどうかを確認します。アクティブでない場合は、アドミニストレーターに連絡してアクティブにしてください。

シナリオ 2：計画立案アイテムにランク構成がない

並べ替えしているすべての計画立案アイテムにランク構成があるかどうかを確認します。ない場合は、アドミニストレーターに連絡して、これらの計画立案アイテムタイプのランク構成を更新してください。

シナリオ 3：ターゲット行にグローバルランクがない

並べ替えるターゲット位置の前または後の計画立案アイテムにグローバルランクがあるかどうかを確認します。ない場合は、システムアドミニストレーターに連絡してグローバルランクを生成してください。

関連情報

計画立案アイテムのランク付け

ポートフォリオ計画 **Workspace** のアイテムマイルストーンエラー

ポートフォリオ計画ロードマップまたはフリーフォームロードマップにおける計画立案アイテムのマイルストーンが ポートフォリオ計画 Workspace でエラーステータスになることがある場合のシナリオを説明します。


既存の計画立案アイテムを再スケジュールすると、アイテムのマイルストーンがアイテムの承認された開始日または終了日から外れる場合があります。

ロードマップで計画立案アイテムを再スケジュールしても、マイルストーンの期日は変更されません。そのため、マイルストーンの期日がアイテムの日付範囲外である場合、その範囲外のマイルストーンのインジーターは非表示になり、エラーステータスに移行

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

します。まだアイテムの日付範囲内にあるマイルストーンのインジケーターが表示されま

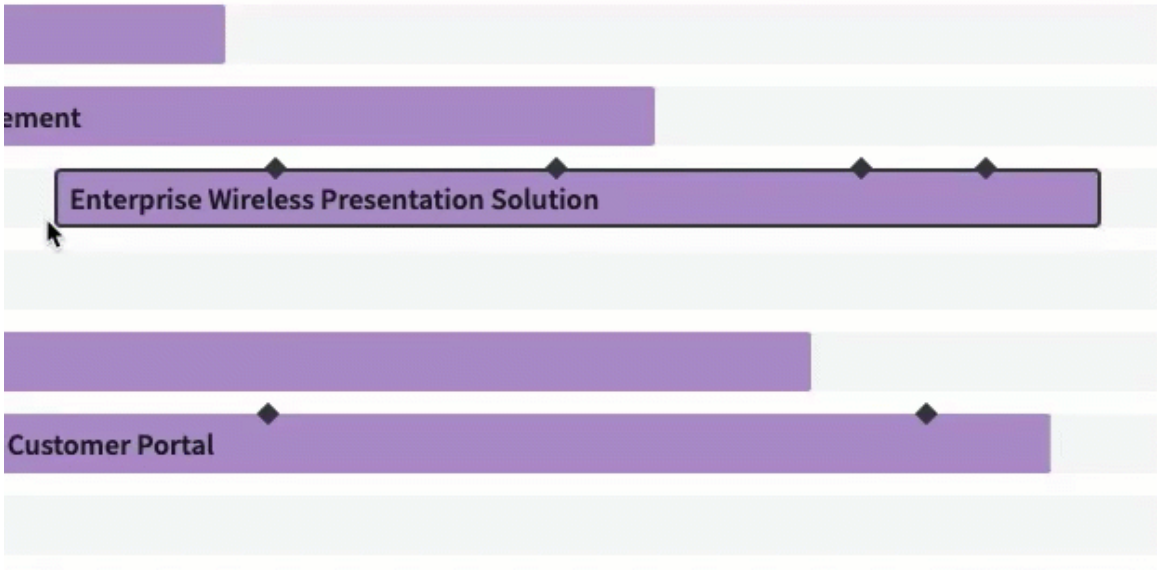

す。

アイテムのスケジュールと同期していないマイルストーンは、サイドパネルの [マイルストーン] タブから表示できます。サイドパネルから、計画の変更を反映するようにマイルストーンの期日を編集および調整できます。「ロードマップアイテムのマイルストーンを更新」を参照してくださ

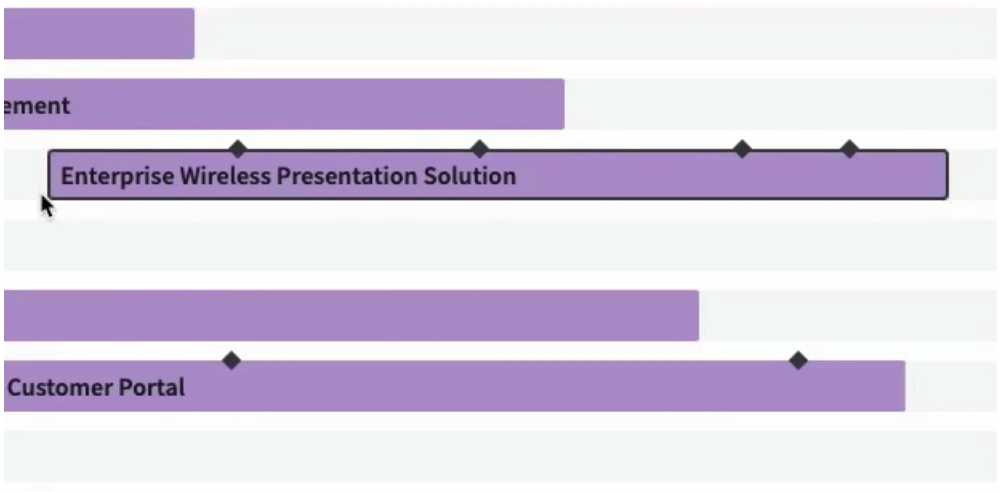

い。

注:
ロードマップビューからプロジェクトマイルストーンを更新することはできません。プロジェクトマイルストーンを更新すると、関連付けられているプロジェクトのコストとリソース計画に影響を与える可能性があります。そのため、プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) のプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトマイルストーンを更新することをお勧めします。

ポートフォリオ計画 **Workspace** のアイテム依存関係エラー

ポートフォリオ計画 Workspace のポートフォリオ計画ロードマップまたはフリーフォームロードマップにおける計画立案アイテムの依存関係がエラーステータスになることがある場合のシナリオを説明します。


アイテム間のスケジュールが競合している場合は、2 つの計画立案アイテム間の依存関係がエラーになることがあります。線形の依存関係 (線形依存性) では、一方のアイテムの作業を開始するにはもう一方のアイテムの作業を完了する必要があるというように、アイテムがスケジュールされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
エラー状況は、計画立案アイテムの関係タイプが [依存] になっている場合にのみ表示されます。

ここで示されているサンプルロードマップの場合、従業員のオンボーディングプロセスの改善での作業の開始は、新規雇用に関する特定のオンボーディングパスの完了に依存しています。こうした関係が、線形の依存関係と見なされます。この場合、従業員のオンボーディングプロセスの改善は、新規雇用に関する特定のオンボーディングパスの終了日より前に開始するようにスケジュール設定されています。このような競合がある場合、ロードマップではエラーアイコン ( ) とともに表示され、[アイテムの詳細] サイドパネルの [依存関係] タブにも表示されるようになっています。

このようなエラーを解消するには、計画立案アイテムのスコープを確認し、開始日や終了日を更新してスケジュールを適宜調整する必要があります。

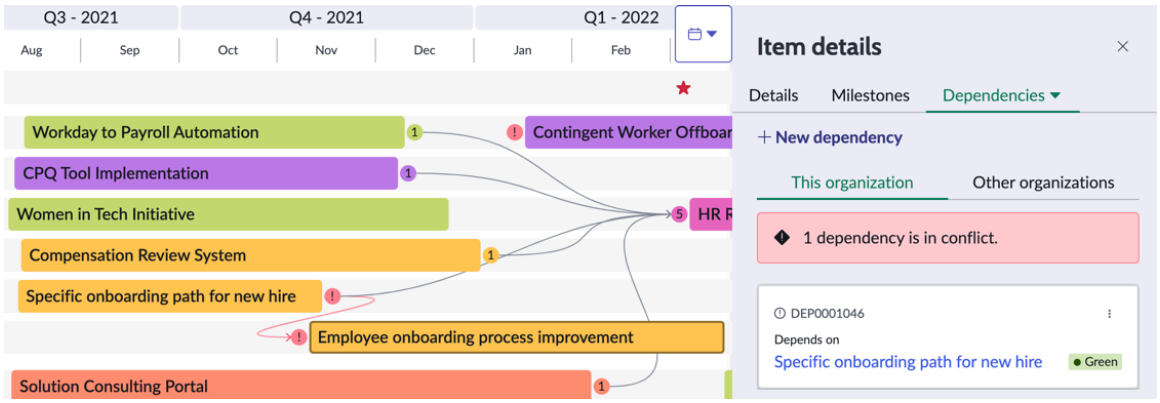

関連情報

- ロードマップアイテムの依存関係を追加
- ロードマップアイテムの依存関係を更新

ポートフォリオ計画 **with PPM** の管理

ポートフォリオ計画 が、これらのガイドラインに従って、プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) と適切に統合されていることを確認します。

- レコードが連動された後は、テーブルマップのフィルター条件を変更しないでください。既に連動されたレコードは新しいフィルター条件と一致しない可能性があり、フィルター条件を変更するとデータ不整合が発生する可能性があります。フィルター条件を変更する必要がある場合は、データの不整合の問題を回避するために、連動されたレコードの関連属性を必ず手動で更新してください。
- テーブルマップを作成するときは常に、関連するフィールドマップと選択マップも設定されていることを確認してください。
- テーブルマップのインポートジョブが実行中 (処理中) のときは、テーブルマップまたはそのフィールドマップを変更しないでください。
- 計画立案アイテムフォームの [変換先] フィールドを使用して、変換元の元のレコードを特定できます。
- 参照または Glide リストのフィールドタイプのフィールドマップを作成する間、実行テーブルと配置テーブルが 2 つの異なるテーブルを参照しているときは常に [ルックアップ] フィールドと [ルックアップ] 列の値が追加されていることを確認してください。
- データ同期に失敗した場合は、次のことを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- その配置統合レコード内の [統合エラーログ] 関連リスト。
- [配置テーブルフィルター] (インポート用) および [実行テーブルフィルター] (エクスポート用) の条件が満たされていること。
- 配置統合とテーブルマップの両方で [アクティブ] フラグがチェックされていること。
- 各テーブルマップに適切なフィールドと選択肢が設定されていること。

- [実行 **URL]** フィールドを表示する場合は、計画立案アイテムレコードを構成して表示します。
- 同期された計画立案アイテムの [実行 URL] フィールドが空白の場合は、次の場所に移動します: ポートフォリオ計画 > 統合 をクリックし、[計画立案アイテムの実行 **URL** を修正] をクリックします。このアクションでは、実行 URL フィールドを作成して更新します。
- プロジェクト、デマンド、およびエピックテーブルマップに [主要目標] フィールドが導入され、配置テーブルと実行テーブルの間の [目標] フィールドの統合がサポートされています。
- プロジェクトをインポートまたはエクスポートしようとしている場合は、(そのプロジェクトの一部である) デマンドが同期されていることを確認してください。
- 任意の実行テーブルのテーブルマップを作成できます。展開されたテーブル (rm_epic、dmn_demand、pm_project) のいずれかからテーブルマップが作成されていない場合、またはテーブルマップから拡張されていない場合は、テーブルマップレコードのインターフェイスをサポートするビジネスルールを作成する必要があります。ビジネスルールの作成に関する詳細については、「カスタムテーブルマップ構成を適用するビジネスルールの作成」を参照してください。

ポートフォリオ計画 のフォームフィールドの情報

ポートフォリオ計画 アプリケーションで使用されるフォームのフィールド情報。

アクションのアサインフォーム

[アクションのアサイン] フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して **[New]** アクションボタンを [APW リストメニュー構成 (APW List Menu Configuration)] ページに追加します。

[目標] フォーム

フィールド	説明
アクションラベル	アクションラベルの名前。「New」と入力します。
アクション名	アクションの名前。「create-new-uxf」と入力します。
実装方法	アクションの実装。**[UXF** クライアントアクション] を選択します。
テーブル	アクションが作成されるテーブルの名前。**[sys_ux_list_menu_config]** を選択します。
クライアントアクションを指定	クライアントアクション。[新しいレコードを作成] を検索して選択します。
ビュー	アクションボタンが表示されるフォームのビュー。

選択マップフォーム

選択マップフォームのフィールドについて理解します。このフォームを使用して、選択マップを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

選択マップフォーム

フィールド	説明
実行テーブル列	マッピングする必要がある、選択した実行テーブルのフィールド列。このフィールドの値は、フィールドマップ構成での選択に基づいて自動的に追加されます。
実行の選択	選択した実行テーブルコラムフィールドの選択フィールド値を選択します。
配置テーブル列	マッピングする必要がある、選択した配置テーブルのフィールド列。このフィールドの値は、フィールドマップ構成での選択に基づいて自動的に追加されます。
配置の選択	選択した配置テーブルコラムフィールドの選択フィールド値を選択します。

[コスト計画を作成] フォーム

このフォームを使用して、計画立案アイテムのコスト計画を作成します。

[コスト計画を作成] フォーム

フィールド	説明
名前	コスト計画の名前。
入力通貨 (Entered currency)	単位コスト値をキャプチャする通貨。
単価	コスト計画の計画コスト。
数量	コスト計画の数量。
合計計画コスト	コスト計画の合計計画コスト値。
会計期間の開始	コスト計画の会計期間の開始月。
会計期間の終了	コスト計画の会計期間の終了月。
コスト配分	会計期間または期間ごとに計画コストを割り当てます。 このリストから値を選択します。 • [会計期間全体で均等に分割 **(Split equally across fiscal periods)]** - 期間全体にわたるすべての会計期間にコストを均等に分配します。 • [会計期間ごとに繰り返し **(Recurring per fiscal period)]** - 期間全体にわたって各会計期間のコストが繰り返し発生します。
原価費目	コスト計画の原価費目。 リストから原価費目のフォームを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[コスト計画を作成] フォーム (続く)

フィールド	説明
	注: 選択した原価費目に基づいて、[ロール] フィールドと [製品モデル] フィールドが表示されます。
従業員タイプ	Read-onlyフィールド。 • 外部：コストタイプが外部労働設備投資または外部労働運用費用の場合。 • 内部：コストタイプが労働設備投資または労働運用費用の場合。
ロール	コスト計画を経費計上するロールの名前。
製品モデル	コストタイプがソフトウェア、ハードウェア、またはその他の設備投資または運用コストの場合に使用できます。 コスト計画を経費計上するモデルをリストから選択します。 コスト計画を経費計上するハードウェア支出のモデル名。

[経費ラインを作成] フォーム

このフォームを使用して、実際の経費の経費ラインを作成します。

[Expense Line を作成] フォーム

フィールド	説明
番号	経費ラインの自動生成番号。
総計	発生した経費。
簡単な説明	経費の簡単な説明を入力します。 経費ラインを識別するための一意で具体的な詳細を記載します。
日付	経費が発生した日付。
処理日	経費の処理日。
コスト計画	経費ラインを記録するための関連コスト計画名。
原価費目	経費の原価費目。 デフォルトでは、コスト計画の原価費目が選択されています。
状況	経費ラインのステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[Expense Line を作成] フォーム (続く)

フィールド	説明
	処理済みの経費ラインのみが投資エンティティに考慮されます。
経費タイプ	経費タイプ (内部または外部) を定義します。 デフォルトでは、経費タイプは [原価費目] フィールドエントリから考慮されます。
レートカード	レートカードの名前。
サマリータイプ	経費ラインのビジネス目的。

依存関係フォーム

依存関係フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、ポートフォリオ計画のロードマップにおける計画立案アイテム間の依存関係を追加したり確立したりします。

依存関係フォーム

フィールド	説明
計画立案アイテム	依存関係を作成するためにロードマップから選択した計画立案アイテム。これを後続のアイテムと見なします。 このフィールドは、選択内容に基づいて自動的に入力されます。
関係性タイプ	次のいずれかを選択します。 • 依存：一方のアイテムの作業開始が、もう一方のアイテムの作業終了に依存しています。この依存関係は、線形関係と見なされます。 • 関連：2 つのアイテムの作業は互いに関連していますが、互いの作業完了においては、厳密な依存関係がありません。この依存関係は、非線形関係と見なされます。
計画立案アイテム	必要な計画立案アイテム。これを先行アイテムと見なします。
番号	システムで生成された依存関係の一意の識別番号。

フィールドマップフォーム

フィールドマップフォームのフィールドについて理解します。このフォームは、対応するテーブルマップのマッピングを作成するために使用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールドマップフォーム

フィールド	説明
実行テーブル	戦略的計画 のテーブルとマッピングする必要がある アジャイル開発 2.0、SAFe、または PPM のテーブル。このフィールドの値は、テーブルマップ構成での選択に基づいて自動的に追加されます。
実行テーブル列	マッピングする必要がある、選択した実行テーブルのフィールド列。
配置テーブル	アジャイル開発 2.0、SAFe、または PPM のテーブルとマッピングする必要がある 戦略的計画 のテーブル。このフィールドの値は、テーブルマップ構成での選択に基づいて自動的に追加されます。
配置テーブル列	マッピングする必要がある、選択した配置テーブルのフィールド列。
フロータイプ	マッピングを配置から実行、実行から配置、またはその両方で行うかどうかを指定します。 ここで、配置は 戦略的計画 を意味し、実行は PPM、アジャイル開発 2.0、および SAFe アプリケーションを意味します。

デマンド計画立案アイテムフォーム

デマンドフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、ポートフォリオ計画でデマンドタイプの計画立案アイテムの詳細を作成または編集します。

これらのフィールドは、計画立案アイテムの [完全な詳細] ページに表示されます。

デマンド計画立案アイテムフォーム

フィールド	説明
名前	計画立案アイテムの簡単な説明
説明	計画立案アイテムの詳細情報 SPM の Now Assistアプリケーションがインストールされている場合は、[計画立案アイテムの作成] スキルを使用して、デマンドの説明を絞り込むことができます。
状況	計画立案アイテムに関する現在の進捗状況
所有者	この計画立案アイテムにアサインされたユーザー
[計画] ステータス	戦略的計画 バックログの計画立案アイテムに関する進捗状況。
カテゴリ	この計画立案アイテムのカテゴリ。[戦略的] または [稼働] から選択

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド計画立案アイテムフォーム (続く)

フィールド	説明
MoSCoW	重要度に基づくこの計画立案アイテムの優先度。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 1：必要 • 2：あるとよい • 3：あってもよい • 4：なし
ポートフォリオ	この計画立案アイテムが関連付けられているポートフォリオ。
Program (プログラム)	この計画立案アイテムが関連付けられているプログラム。
製品	この計画立案アイテムが関連付けられている製品。
戦略的プログラム	この計画立案アイテムが関連付けられている戦略的プログラム。
プライマリゴール	主要目標としてこの計画立案アイテムに関連付けられている目標
製品の機能拡張	この計画立案アイテムが関連付けられている製品拡張。
プライマリターゲット	プライマリターゲットとしてこの計画立案アイテムに関連付けられているターゲット。
作業メモ	作業の進行に伴う計画立案アイテムの更新や検討を記録するためのメモ
戦略的優先事項	この計画立案アイテムが関連付けられている戦略的優先度

デマンド計画立案アイテムフォームの [日付] セクション

フィールド	説明
承認された開始日	この計画立案アイテムにおいて承認された開始日
承認された終了日	この計画立案アイテムにおいて承認された終了日
開始予定日	この計画立案アイテムの作業開始予定日。この値は、[承認された開始日] フィールドからコピーされます。
終了予定日	この計画立案アイテムの作業完了予定日。この値は、[承認された終了日] フィールドからコピーされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド計画立案アイテムフォームの [詳細] セクション

このセクションでは、投資タイプ、実行タイプ、影響を受けるビジネスアプリケーションなど、この計画立案アイテムに関する付加的な詳細情報を取得します。

フィールド	説明
投資クラス	[実行] と [変更]から選択
投資タイプ	この計画立案アイテムの投資タイプ。たとえば、このアイテムの作業完了により製品のユーザーエクスペリエンスが向上する場合、[エンドユーザーエクスペリエンス] を選択します。
優先度	この計画立案アイテムの優先度
ビジネスアプリケーション	この計画立案アイテムが関連するビジネスアプリケーション
影響を受けるその他のビジネスアプリケーション	この計画立案アイテムにより影響を受けるビジネスアプリケーション
ビジネスケイパビリティ	この計画立案アイテムのビジネス機能

デマンド計画立案アイテムフォームの [ビジネスケース] セクション

このセクションでは、計画立案アイテムのリスク、スコープ、ブロッカーなど、この計画立案アイテムにおけるビジネスの詳細情報を取得します。

フィールド	説明
ビジネスケース	この計画立案アイテムに投資するビジネスケース
実行リスク	この計画立案アイテムの作業が完了した場合のビジネス上のリスク
不実行リスク	この計画立案アイテムの作業が未完了の場合のビジネス上のリスク
イネーブラー	このデマンドの実現要因。
バリア	この計画立案アイテムに対するブロッカー (もしある場合)
スコープの範囲内	この計画立案アイテムの定義された基準
スコープの範囲外	この計画立案アイテムでは不要な、明確に定義された基準
仮定	この計画立案アイテムで作業するための前提 (もしある場合)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド計画立案アイテムフォームの [財務] セクション

このセクションでは、コスト、投資、経費、利益、ROI、その他の推定など、この計画立案アイテムに関する財務的な詳細情報を取得します。

フィールド	説明
計画コスト	この計画立案アイテムにかかる計画コスト
計画投資	この計画立案アイテムに対する計画資本的支出
計画経費	この計画立案アイテムに対する計画運用支出
計画 ROI	この計画立案アイテムの計画投資利益率
収支	この計画立案アイテムの収支
計画利益	この計画立案アイテムによる計画利益

デマンド計画立案アイテムフォームの [アセスメントデータ] セクション

フィールド	説明
影響	この計画立案アイテムがビジネスに与える影響
リスク	この計画立案アイテムに関連するリスクに関する数値
値	この計画立案アイテムにより得られる値に関する数値
スコア	計画立案アイテムのスコア。


ハイライト表示される値の条件フォーム

ハイライト表示される値の条件フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、ポートフォリオ計画 ワークスペースでハイライト表示されたフィールドの表示を設定します。

フィールド	説明
条件	フィールド値の条件。 たとえば、ステータスが緑だとします。
色	指定された条件を満たすフィールド値の色。
アプリケーション	ServiceNow インスタンスのスコープ。デフォルトでは、このフィールドは [ポートフォリオ計画] に設定されています。
順番	[優先順位付け] ページの階層ビューにある凡例でこの色が表示される順番。 たとえば、[計画ステータス] 列の場合、値 [新規] には順序 1 が指定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

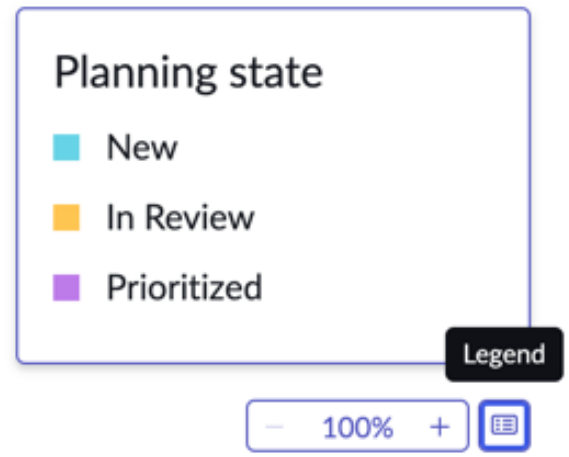フィールド	説明
	
アイコンを表示	フィールド値の横にアイコンを表示するオプション。
アイコン	フィールド値の横に表示されるアイコン。このフィールドは、[アイコンを表示] フィールドが選択されている場合にのみ表示されます。

ハイライト表示される値フォーム

ハイライト表示される値フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、ポートフォリオ計画 ワークスペースのポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページでハイライト表示されるフィールドをカスタマイズします。

フィールド	説明
テーブル	ハイライト表示された列を含むテーブル。「**sn_align_core_planning_item**」と入力します。
アプリケーション	ServiceNow インスタンスのスコープ。デフォルトでは、このフィールドは [ポートフォリオ計画] に設定されています。
フィールド	ワークスペースでハイライト表示されているテーブルの列。

レンズフォーム

レンズフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、ポートフォリオ計画 にレンズを作成します。

レンズフォーム

フィールド	説明
名前	レンズの名前
有効	レンズがアクティブかどうかを示します。
説明	レンズの簡潔な説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レンズフォーム (続く)

フィールド	説明
	このレンズのビジネス目的と、このレンズを使用する計画マネージャーを指定できます。
計画立案アイテム	このレンズを使用して計画できる作業のタイプ。 目的の計画立案アイテムを [利用可能] リストから [選択済み] リストに移動します。

レンズ構造フォーム

レンズ構造フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、ポートフォリオ計画 アプリケーションのレンズの構造を定義します。

レンズ構造フォーム

フィールド	説明
エンティティ	レンズエンティティのソーステーブル。 エンティティは、レンズの視点での計画レベルを表します。 このレンズの視点から計画ペルソナに関連するエンティティを選択します。たとえば、部門、製品モデル、ビジネスゴールです。
エンティティフィルター	エンティティソースからデータをフィルターするための条件。 フィルターされたデータは、選択および計画する計画ペルソナのワークスペースに表示されます。
最上位エンティティ	このエンティティがレンズ構造のトップレベルエンティティであるかどうかを示します。
親エンティティ	現在のレンズ構造でこのエンティティの 1 レベル上にあるエンティティ。 このフィールドは、[最上位エンティティ] フィールドが選択されていない場合にのみ使用できます。
親エンティティへの参照	親エンティティテーブルを参照する現在のエンティティテーブルの列。 例： • エンティティ：戦略的プログラム **[sn_align_core_program]** • 親エンティティ：部門 **[cmn_department]**

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レンズ構造フォーム (続く)

フィールド	説明
	この場合、部門 [cmn_Department] テーブルを参照する戦略的プログラム [sn_align_core_program] テーブルのフィールドは [部門] になります。 このフィールドは、[最上位エンティティ] フィールドが選択されていない場合にのみ使用できます。

関連情報

ポートフォリオ計画 のレンズ構造の変更

リスト適用性フォーム

リスト適用性フォームのフィールド情報について説明します。この情報を使用して、ポートフォリオ計画 ワークスペースの新しく作成されたリストの対象者を定義します。

フィールド	説明
リスト	対象者を定義するリストの名前。
アプリケーション	デフォルトでは、このフィールドは [ポートフォリオ計画] に設定されています。
適用	このリストの対象者。 このフィールドを **[Alignment Workspace ホーム対象者 (Alignment Workspace Home Audience)]**に設定します。
有効	この適用性をリストに有効にするオプション。

計画立案アイテムのマイルストーンフォーム

計画立案アイテムのマイルストーンフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、ポートフォリオ計画 のロードマップに計画立案アイテムのマイルストーンを作成します。

フィールド	説明
名前	マイルストーンに使用したい名前。
タイプ	マイルストーンタイプ。次のいずれかを選択します。 • 期限 • 主要マイルストーン • 重要なイベント • 開始の日付 • 重要な日付
期日	マイルストーンの日付。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ステータス	マイルストーンのステータス。次のいずれかを選択します。 • 予定 • 欠落 • 達成
担当者	マイルストーンにアサインされているユーザー。
説明	マイルストーンに関する簡単な説明。

プロジェクト計画立案アイテムフォーム

プロジェクトフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、ポートフォリオ計画 でプロジェクトタイプの計画立案アイテムの詳細を作成または編集します。

これらのフィールドは、計画立案アイテムの [完全な詳細] ページに表示されます。

プロジェクト計画立案アイテムフォーム

フィールド	説明
名前	計画立案アイテムの簡単な説明
説明	計画立案アイテムの詳細情報 SPM の Now Assistアプリケーションがインストールされている場合は、[計画立案アイテムを書く (Write planning item)] スキルを使用して、プロジェクトの説明を絞り込むことができます。
ステータス	計画立案アイテムのステータス
所有者	この計画立案アイテムにアサインされたユーザー
ステータス	計画立案アイテムに関する現在の進捗状況
完了率 (%)	この計画立案アイテムにおける作業完了率
[計画] ステータス	戦略的計画 または ポートフォリオ計画 バックログの計画立案アイテムに関する進捗状況
MoSCoW	重要度に基づくこの計画立案アイテムの優先度。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 1：必要 • 2：あるとよい • 3：あってもよい • 4：なし
ポートフォリオ	この計画立案アイテムが関連付けられているポートフォリオ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト計画立案アイテムフォーム (続く)

フィールド	説明
Program (プログラム)	この計画立案アイテムが関連付けられているプログラム。
製品	この計画立案アイテムが関連付けられている製品。
戦略的プログラム	この計画立案アイテムが関連付けられている戦略的プログラム。
製品の機能拡張	この計画立案アイテムが関連付けられている製品拡張。
主要目標	主要目標としてこの計画立案アイテムに関連付けられている目標
プライマリターゲット	プライマリターゲットとしてこの計画立案アイテムに関連付けられているターゲット。
作業メモ	作業の進行に伴う計画立案アイテムの更新や検討を記録するためのメモ
戦略的優先事項	この計画立案アイテムが関連している戦略的優先度。

プロジェクト計画立案アイテムフォームの [日付] セクション

フィールド	説明
開始予定日	この計画立案アイテムの作業開始予定日。この値は、[承認された開始日] フィールドからコピーされます。
終了予定日	この計画立案アイテムの作業完了予定日。この値は、[承認された終了日] フィールドからコピーされます。
承認された開始日	この計画立案アイテムにおいて承認された開始日
承認された終了日	この計画立案アイテムにおいて承認された終了日
実開始日	この計画立案アイテムの作業が開始された実際の日付
終了実績日時	この計画立案アイテムの作業が完了した実際の日付

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト計画立案アイテムフォームの [詳細] セクション

このセクションでは、投資タイプ、計画立案アイテムのフェーズ、実行タイプ、影響を受けるビジネスアプリケーションなど、この計画立案アイテムに関する付加的な詳細情報を取得します。

フィールド	説明
投資クラス	この計画立案アイテムの投資クラス。[実行] と [変更]から選択
投資タイプ	この計画立案アイテムの投資タイプ。たとえば、このアイテムの作業完了により製品のユーザーエクスペリエンスが向上する場合、[エンドユーザーエクスペリエンス] を選択します。
デマンド	この計画立案アイテムが関連付けられているデマンド
実行タイプ	この計画立案アイテムの実行方法論[ウォーターフォール]、[アジャイル]、[ハイブリッド] から選択します。 このフィールドは、計画立案アイテムタイプがプロジェクトである場合にのみ使用できます。
優先度	この計画立案アイテムの優先度
フェーズ	この計画立案アイテムのフェーズ。 このフィールドは、計画立案アイテムタイプがプロジェクトである場合にのみ使用できます。
ビジネスアプリケーション	この計画立案アイテムが関連するビジネスアプリケーション
影響を受けるその他のビジネスアプリケーション	この計画立案アイテムにより影響を受けるビジネスアプリケーション
ビジネスケイパビリティ	この計画立案アイテムのビジネス機能

[プロジェクト計画立案アイテム] フォームの [ビジネスケース] セクション

このセクションでは、計画立案アイテムのリスク、スコープ、ブロッカーなど、この計画立案アイテムにおけるビジネスの詳細情報を取得します。

フィールド	説明
ビジネスケース	この計画立案アイテムに投資するビジネスケース
実行リスク	この計画立案アイテムの作業が完了した場合のビジネス上のリスク
不実行リスク	この計画立案アイテムの作業が未完了の場合のビジネス上のリスク
実現要因	このプロジェクトの実現要因

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[プロジェクト計画立案アイテム] フォームの [ビジネスケース] セクション
このセクションでは、計画立案アイテムのリスク、スコープ、ブロッカーなど、この計画立案アイテムにおけるビジネスの詳細情報を取得します。

(続く)

フィールド	説明
障害	この計画立案アイテムに対するブロッカー (もしある場合)
スコープの範囲内	この計画立案アイテムの定義された基準
スコープの範囲外	この計画立案アイテムでは不要な、明確に定義された基準
仮定	この計画立案アイテムで作業するための前提 (もしある場合)

[プロジェクト計画立案アイテム] フォームの [財務] セクション
このセクションでは、コスト、投資、経費、利益、ROI、その他の推定など、この計画立案アイテムに関する財務的な詳細情報を取得します。

フィールド	説明
計画コスト	この計画立案アイテムにかかる計画コスト
計画投資	この計画立案アイテムに対する計画資本的支出
計画経費	この計画立案アイテムに対する計画運用支出
計画利益	この計画立案アイテムによる計画利益
実績利益	この計画立案アイテムにより達成された実績利益
ETC	この計画立案アイテムの作業を完了するためにかかる推定コスト
実績コスト	この計画立案アイテムの実績コスト
実績投資	この計画立案アイテムに対する実際の資本的支出額
実績経費	この計画立案アイテムに対する実際の運用経費
計画 ROI	この計画立案アイテムの計画投資利益率
予定リターン	この計画立案アイテムの収支
完了時の推定 (EAC)	この計画立案アイテムの作業完了時点での推定コスト。

プロジェクト計画立案アイテムフォームの [スコア] セクション
このセクションでは、スコア、ビジネス価値スコア、リスクスコア、サイズスコアなど、この計画立案アイテムのスコアリングの詳細をキャプチャします。

フィールド	説明
スコア	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト計画立案アイテムフォームの [スコア] セクション
このセクションでは、スコア、ビジネス価値スコア、リスクスコア、サイズスコアなど、この計画立案アイテムのスコアリングの詳細をキャプチャします。

(続く)

フィールド	説明
価値スコア	この計画立案アイテムにより得られるビジネス価値のスコア。
リスクスコア	この計画立案アイテムに関連するリスクのスコア。
サイズスコア	タスクの完了に必要なジョブのスコア。

ロードマップ構成フォーム

ロードマップ構成フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、ロードマップ設定に新しいテーブルを追加し、ポートフォリオ計画 にてその詳細を構成します。

ロードマップ構成フォーム

フィールド	説明
ソーステーブル	ロードマップをビルドするために使用するテーブル。
開始日フィールド	ロードマップアイテムの開始日に使用されるフィールド。 例：[開始予定日]。
終了日フィールド	ロードマップアイテムの終了日に使用されるフィールド。 例：[終了予定日]。
アイテム名フィールド	ロードマップアイテムの名前に使用されるフィールド。 例：[簡単な説明]。
アイテムオーナーフィールド	ロードマップアイテムのオーナーに使用されるフィールド。 例：[担当者]。
ステータス	ロードマップアイテムの名前に使用されるフィールド。
完了率 (%)	ロードマップアイテムの完了を追跡するために使用されるフィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロードマップ構成フォーム (続く)

フィールド	説明
	このフィールド値は、追跡モードでロードマップアイテムの進捗状況を視覚化するために使用されます。
フィールド別のグループ	ロードマップアイテムをグループに分類できるフィールドのリスト。 たとえば、[ステータス] 属性を使用して、アイテムを [ドラフト]、[準備完了]、[対応中] などの状況グループに分類できます。
フィールド別の色	ロードマップアイテムを色で分類できるフィールドのリスト。 たとえば、[計画立案アイテムタイプ] 属性を使用して、特定のタイプに属するアイテムの各グループに一意の色を割り当てることができます。
メトリクスフィールド	ロードマップアイテムのメトリクスとして使用されるフィールドのリスト。 たとえば、[計画利益] や [実績コスト] などです。 これらの値は、ロードマップアイテムにマウスカーソルを合わせると表示されます。

自動翻訳

テーブルマップフォーム

テーブルマップフォームのフィールドについて理解します。このフォームを使用して、アジャイル開発 2.0、SAFe、PPM と統合するレコードに新しいカスタムテーブルマップを作成します。

テーブルマップフォーム

フィールド	説明
配置統合	配置統合タイプを指定します。デフォルトでは、値は **[ServiceNow** 内部] です。
実行テーブル	戦略的計画 のテーブルとマッピングする必要がある アジャイル開発 2.0、SAFe、または PPM のテーブル。例：欠陥 [rm_defect]。
配置テーブル	アジャイル開発 2.0、SAFe、または PPM のテーブルとマッピングする必要がある 戦略的計画 のテーブル。例：マイルストーン [sn_milestones_milestone]。
マイルストーンテーブルマップ	このフィールドは、プロジェクト [pm_project] テーブルマップにのみ関連します。これは、プロジェクトポートフォリオ管理ワークスペースから 戦略的計画 にプロジェクトのマイルストーンを統合するための新しいマイルストーンテー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブルマップフォーム (続く)

フィールド	説明
	ブルマップ (sn_milestones_milestone) への参照です。他のすべてのテーブルマップでは、[マイルストーンテーブルマップ] フィールドは使用できません。
実行テーブルフィルター	PPM、アジャイル開発 2.0、または SAFe から関連レコードを取得するためのフィルター条件。たとえば、[ポートフォリオ] が [HR] である、[アクティブ] が [True] である、などです。
配置テーブルフィルター	戦略的計画 から関連レコードを取得するためのフィルター条件。
アクティブフラグ	テーブルマップ同期がアクティブであることを確認します。このフィールドはデフォルトでオンになっています。
添付ファイルを同期する	添付ファイルがアプリケーション間で同期されていることを確認します。このフィールドはデフォルトでオンになっています。

ロードマップのマイルストーンフォーム

ロードマップのマイルストーンフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、ポートフォリオ計画 にロードマップのタイムラインに関するマイルストーンを作成します。

フィールド	説明
名前	マイルストーンに使用したい名前。
タイプ	マイルストーンタイプ。次のいずれかから選択します。 • 重要なイベント • 開始の日付 • 重要な日付 • 期限 • 主要マイルストーン
期日	マイルストーンの日付。
担当者	マイルストーンにアサインされているユーザー。

プロジェクトおよびデマンドの人件費を生成するための [スケジュール済みスクリプト実行] フォーム

[スケジュール済みスクリプト実行] フォームを使用して、プロジェクトおよびデマンドに対して「人件費を生成」スケジュール済みジョブを有効にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アイテムのスケジュール] フォーム

フィールド	説明
名前	このスケジュール済みジョブを識別する名前
アクティブ	スケジュール済みジョブがアクティブであり、指定された日時に実行する必要があることを示すオプション
実行	スケジュール済みジョブの実行に使用する時間間隔： • 日次：指定された時刻に毎日実行されます。 • 週次：指定された時刻と曜日に、毎週実行されます。 • 月次：指定された日の時刻に、毎月実行されます。 • 定期的：指定した繰り返し間隔で実行されます。 • **1**回：1 回のみ実行されます。 • オンデマンド：オンデマンドですぐに実行されます。 • ビジネスカレンダー：エントリ開始：[ビジネスカレンダー] フィールドで選択したビジネスカレンダーのエントリ開始日に実行されます。ビジネスカレンダーに定義した各ビジネスエントリの開始日にスケジュール済みジョブが実行されます。 たとえば、ビジネスカレンダーが会計年度を表し、各エントリの開始日が会計月である場合、スケジュール済みジョブは毎月最初の日に実行されます。 • ビジネスカレンダー：エントリ終了：[ビジネスカレンダー] フィールドで選択したビジネスカレンダーの終了日に対して実行されます。この選択は、[ビジネスカレンダー：エントリ開始] と同じ方法で実行されますが、関連するビジネスカレンダーエントリの終了日に対して実行されます。 **注:** [ビジネスカレンダー：エントリ開始 **(Business Calendar: Entry Start)]** または [ビジネスカレンダー：エントリ終了 **(Business Calendar: Entry End)]** を選択すると、オフセット係数を適用して、選択したビジネスカレンダーの時間スパンの前または後にジョブを実行するようにスケジュールを設定できます。詳細については、[オフセットタイプ **(Offset Type)]** フィールドと [オフセット **(Offset)]** フィールドを参照してください。 ビジネスカレンダーの作成と使用、およびビジネスカレンダーエントリの定義の詳細については、「Creating business calendars」および「Define business calendar entries」を参照してください。
タイムゾーン	スケジュール済みジョブの実行時間を指定するときに [時間] フィールドエントリで使用するタイムゾーン。タイムゾーンエントリを次のように選択します。 • なし：スケジュール済みジョブを作成しているログインユーザーのデフォルトのタイムゾーンを使用します。 たとえば、ユーザーのアサインされたタイムゾーンが米国太平洋標準時であり、[時間] フィールドに 16:45 と入力した場合、スケジュール済みジョブは米国太平洋標準時の午後 4 時 45 分に実行されます。 • システムのタイムゾーンを使用：実行するインスタンスに指定されたデフォルトのシステムタイムゾーンを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アイテムのスケジュール] フォーム (続く)

フィールド	説明
	たとえば、インスタンスのデフォルトのシステムタイムゾーンがヨーロッパ/ロンドンであり、[時間] フィールドに 22:15 と入力した場合、スケジュール済みジョブはロンドン時間の午後 10 時 15 分に実行されます。 • 実際のタイムゾーン。 たとえば、[米国/東部] を選択し、[時間] フィールドに 13:30 と入力した場合、スケジュール済みジョブは米国東部標準時の午後 1 時 30 分に実行されます。
日	スケジュール済みジョブを実行する日。 • [実行] が [週次] の場合は、曜日を選択します。たとえば、水曜日を選択します。 • [実行] が [月次] に設定されている場合は、月の日を選択します。たとえば、毎月 25 日の場合、25 を選択します。 このフィールドは、[実行] フィールドで [月次] または [週次] を選択した場合にのみ表示されます。
繰り返し間隔	スケジュール設定された各ジョブ実行の繰り返し間隔の期間。期間を日数、時間数、または分数で入力します。例： • 4 日ごとにスケジュール済みジョブを実行するには、[日数] フィールドに「04」と入力します。 • 26 時間ごとに実行するには、[時間] フィールドに「26」と入力します。 • 13:30:25 の間隔で繰り返す必要がある場合は、[時間] フィールドに「13」と入力し、その後のラベルのない 2 つのフィールドに「30」と「25」を入力します。 これらのフィールドは、[実行] フィールドで [定期的] を選択した場合にのみ表示されます。 **注:** この設定では、夏時間の変更は考慮されません。たとえば、期間に 1 日を選択した場合、計算によりジョブの開始時間が 24 時間追加されます。開始時間が夏時間 (DST) の期間であり、そのタイムゾーンが DST でない場合、ジョブは 1 時間オフセットされて実行されます。
ビジネスカレンダー	スケジュール済みジョブに対するビジネスカレンダーの開始日または終了日を決定するために使用しているビジネスカレンダーエントリ。このフィールドは、[時間] フィールドで [ビジネスエントリ：開始日 **(Business Entry: Start Date)]** または [ビジネスエントリ：終了日 **(Business Entry: End Date)]** を選択した場合にのみ表示されます。
オフセットタイプ (Offset Type)	このジョブをスケジュール設定するために選択したビジネスカレンダーに適用する時間オフセットのタイプ (存在する場合)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アイテムのスケジュール] フォーム (続く)

フィールド	説明
	• 過去 **(Past)**：オフセット係数を適用して、選択したビジネスカレンダーの時間スパンの開始前に実行するジョブをスケジュール設定します。 • 将来 **(Future)**：オフセット係数を適用して、選択したビジネスカレンダーの時間スパンの終了後に実行するジョブをスケジュール設定します。 • なし：このジョブのスケジュール設定に時間オフセットを適用しません。 オフセット係数を追加すると、次のユースケースに対するビジネスカレンダーで定義された正式な時間スパンの前または後にジョブの実行をスケジュール設定できます。 • 選択したビジネスカレンダーの時間スパン外である特定の時間にジョブをスケジュール設定します。 • 選択したビジネスカレンダーの時間スパンに沿って複数のジョブを順番に実行するように調整します。 [オフセットタイプ] フィールドと [オフセット] フィールドは、[実行] フィールドで [ビジネスカレンダー：エントリ開始] または [ビジネスカレンダー：エントリ終了] を選択した場合にのみ表示されます。
オフセット (OffSet)	このジョブをスケジュール設定するために選択したビジネスカレンダーに適用する時間オフセットの量 (日、時間、分、秒)。たとえば、ビジネスカレンダーの開始日よりも 3 日、14 時間、10 分、45 秒前にジョブを開始するようにスケジュール設定する場合は、次のようにします。 • [オフセットタイプ **(Offset type)**] フィールドで [過去 **(Past)**] を選択します。 • [日数] フィールドに「**3**」と入力します。 • [時間] フィールドに「**14**」、「**10**」、「**45**」と入力します。 [オフセット日数 **(Offset days)**] フィールドと [時間] フィールドは、[実行] フィールドで [ビジネスカレンダー：エントリ開始] または [ビジネスカレンダー：エントリ終了] を選択し、[オフセットタイプ] フィールドで [過去] または [予定] を選択した場合にのみ表示されます。
時刻	スケジュール済みジョブを実行する時刻。時間、分、秒を 24 時間形式で表します。[タイムゾーン] フィールドで選択した内容によって、このエントリのタイムゾーンが決まります。 **注:** 時間値は常に、ServiceNow AI Platform® に UTC 時間で保存されてから、適切な時間に変換されます。この変換は、選択した [タイムゾーン] と [時間] フィールドのエントリによって異なります。 このフィールドは、[実行] フィールドで [日次]、[週次]、または [月次] を選択した場合にのみ表示されます。
開始中	最初にスケジュール設定されたジョブ生成の日時。カレンダー日時を選択します。このフィールドは、[実行] フィールドで [定期的] を選択した場合にのみ表示されます。
優先度	スケジュール済みジョブの数値の優先度：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アイテムのスケジュール] フォーム (続く)

フィールド	説明
	• 必須ジョブの優先度値を 100 未満に設定します。 • 必須でないジョブの優先度値を 100 より高く設定します。 • すべてのスケジュール済みジョブの 70 パーセント以上が [期限切れ] の場合、100 を超える値でマークされたジョブは実行されません。
実行方法	スケジュール済みジョブを作成して実行するユーザーの名前。スケジュール済みジョブを作成するユーザーの代わりにスケジュール済みジョブをシステムにアサインするには、システムまたはダミーユーザーを作成し、このフィールドに追加します。
条件付き	関連するスクリプトで特定の条件が満たされた場合にスケジュール済みジョブの実行を有効にするオプション。
条件	スケジュール済みジョブを実行するかどうかを決定する条件付きスクリプト。スクリプトの最後の式はブール値 (true/false) で評価されます。このテキストボックスは、[条件を使用 **(Use conditions)]** を選択した場合にのみ表示されます。
開始中	最初にスケジュール設定されたジョブ生成の日時。カレンダー日時を選択します。このフィールドは、[実行] フィールドで [定期的] を選択した場合にのみ表示されます。

UX リストカテゴリフォーム

UX リストカテゴリフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、ポートフォリオ計画 ワークスペースの [リスト] メニューのリストに追加のカテゴリを作成します。

フィールド	説明
タイトル	ワークスペースでのカテゴリの表示名。
アプリケーション	アプリケーションスコープ。アプリケーションスコープが [ポートフォリオ計画]に設定されていることを確認します。
順番	このカテゴリがワークスペースに表示される順番。
有効	ワークスペースでのこのカテゴリの表示を有効にするオプション。
説明	カテゴリの簡単な説明。
設定	リストカテゴリが参照している構成。 デフォルトでは、このフィールドは **[APW リストメニュー構成 (APW List Menu Configuration)]** に設定されています。

関連情報

ポートフォリオ計画 ワークスペースでのリストのカスタマイズ

UX リストフォーム

UX リストフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、ポートフォリオ計画 ワークスペースの [リスト] メニューの追加のリストを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
タイトル	ワークスペースでのカテゴリの表示名。
アプリケーション	アプリケーションスコープ。アプリケーションスコープが [ポートフォリオ計画]に設定されていることを確認します。
順番	このカテゴリがワークスペースに表示される順番。
カテゴリ	ワークスペースでこのリストが表示されるカテゴリ。
有効	ワークスペースでのこのカテゴリの表示を有効にするオプション。
テーブル	リストのソーステーブル。
設定	リストカテゴリが参照している構成。 デフォルトでは、このフィールドは **[APW リストメニュー構成 (APW List Menu Configuration)]** に設定されています。
条件	ソーステーブルのデータをフィルターする条件。
列	ワークスペースのリストに表示する必要があるテーブルの列。
列でグループ化	レコードのリストをグループ化するために使用される属性。
表示	ワークスペースのリストに表示する列を決定するビュー。ビューを選択すると、[列] フィールドが無効になります。

関連情報

ポートフォリオ計画 ワークスペースでのリストのカスタマイズ

戦略的計画

戦略的計画 ワークスペース (SPW) を使用すると、組織の製品フィードバック、ポートフォリオ計画立案、および Enterprise Agile Planning を管理できます。製品パフォーマンスを評価し、作業を戦略に合わせて調整し、単一のワークスペースからアジャイルフレームワークを拡張します。

戦略的計画 は 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) Pro ライセンスを持つユーザーが利用できます。


戦略的計画アプリケーションの生成 AI 機能を確認します。マルチフィードバック要約スキルを使用して 1 つまたは複数のフィードバックの要約を生成し、手動フィードバック分析の時間を短縮します。計画立案アイテム生成 AI Docs スキルを使用して、ドキュメントで選択したテキストのサマリーを生成し、詳細をすばやく把握します。

戦略的計画 をインストールすると、製品フィードバック、ポートフォリオ計画、および Enterprise Agile Planning 機能もインストールされます。これらの機能へのアクセスは、アサインされたユーザーロールに基づいています。以下のセクションでさまざまな機能について詳しく説明します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

開始



フィードバック | ポートフォリオ計画 | エンタープライズアジャイル計画 | ダッシュボード

トラブルシューティングとサポート

- で質問や回答をする 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) フォーラム ServiceNow コミュニティ
- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

フィードバック

顧客中心のフィードバック管理システムを構築し、フィードバックと製品アイデアを作成して フィードバック アプリケーションに関連付けるプロセスを最適化します。

https://player.vimeo.com/video/1015698735?h=308bd4151e&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

フィードバックの概要

フィードバック アプリケーションは、戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) Pro ライセンスを持つユーザーが利用できます。

フィードバックアプリケーションを使用すると、ユーザーフィードバックを収集および分析して、製品に関する情報に基づいた意思決定を行うプロセスが簡素化されます。直感的なインターフェイスは、製品の機能、ユーザビリティ、パフォーマンスに関するリアルタイムのフィードバックを提供し、ユーザーが自分の意見を共有するのに役立ちます。フィードバックアプリケーションを使用して、フィードバックまたは製品アイデアを作成し、フィードバック、製品アイデア、計画立案アイテム、または計画立案以外のアイテムにリンクします。


マルチフィードバック要約スキルを活用して、1 つまたは複数のフィードバックを迅速に要約し、フィードバック分析を簡素化します。生成されたサマリーをコピーして計画立案アイテムまたは計画立案以外のアイテムを作成し、手動でアイテムを作成する時間を節約します。計画立案アイテム生成 AI Docs スキルを使用して、ドキュメントで選択したコンテンツからサマリーを生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


開始

探索

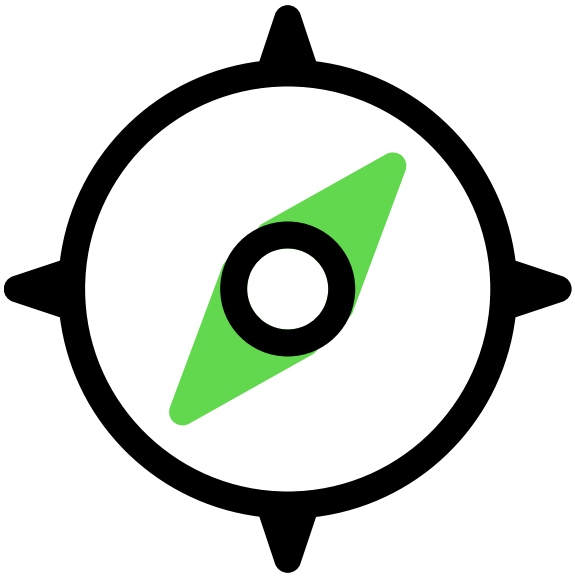


フィードバックの主な機能とビジネス価値を学ぶ戦略的計画

構成

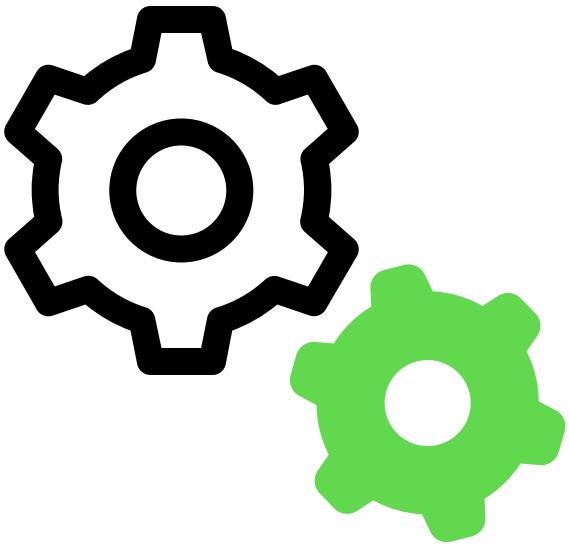


のコア構成の設定 フィードバック

使用方法



フィードバックまたは製品アイデアを管理し、フィードバック主導の意思決定を行います

参照

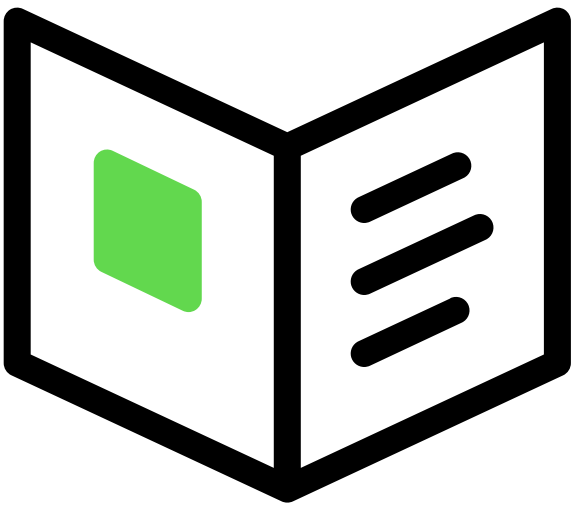

コンポーネント、フォーム、テーブル、システムプロパティに関する情報を取得します

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トラブルシューティングとサポート

- で質問や回答をする 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) フォーラム ServiceNow コミュニティ
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

での フィードバック アプリケーションの探索 戦略的計画

フィードバックアプリケーションでフィードバックと製品アイデアを管理し、情報に基づいた意思決定を行う方法について説明します。

フィードバックの概要

このフィードバックアプリケーションは、フィードバックと製品アイデアを収集、管理、評価するように設計されています。フィードバックは、メール、ソーシャルメディア、チャット、会議、およびアイデアポータルなどのさまざまなソースから受け取ります。フィードバックを使用すると、製品に関するフィードバックを分析したり、フィードバックを製品アイデアにリンクしたりできます。フィードバックまたは製品アイデアを計画立案アイテムまたは計画立案以外のアイテムに直接関連付けることができます。このアプリケーションは、顧客フィードバックを製品ロードマップに合わせて調整し、傾向と統計情報を特定し、フィードバック実装の進捗状況を追跡します。

フィードバックのメリット

フィードバックでは、次のことができます。

- ユーザーからのフィードバックを収集し、製品の開発、改善、および将来の戦略についてデータに基づいた意思決定を行います。
- フィードバックまたは製品アイデアを作成し、フィードバック、製品アイデア、計画立案アイテム、または計画立案以外のアイテムにリンクします。
- アイデアポータルから フィードバック アプリケーションにアイデアをインポートします。
- Outlook アカウントから直接フィードバックを送信するには、Microsoft Outlook アドインを構成します。
- インスタンスでメールアカウントを構成し、この構成されたメールアドレスにメールを送信すると、フィードバックレコードが作成されるようにします。

メリット	機能	ロール
複数のソースからのフィードバックを取得して評価し、製品について情報に基づいた意思決定を行います。	戦略的計画でフィードバックを作成する	pf_user
実装可能な製品アイデアを作成し、優先順位を付けます。	戦略的計画で製品アイデアを作成する	pf_user
評価、優先順位付け、および作業が可能な 1 つ以上の製品アイデアに関連付けることにより、フィードバックを管理します。	フィードバックと製品アイデアとの関連付け	pf_user
フィードバックまたは製品アイデアを計画立案アイテムまたは計画立案以外のアイテムにリンクして、懸念事項に対処します。	フィードバックまたは製品アイデアと計画立案アイテムとの関連付けおよびフィードバックまたは製品アイデアレコードと計画立案以	pf_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メリット	機能	ロール
	外のアイテムとの関連付け	
製品アイデアに関連付けられた目標を関連付けて管理します。	製品アイデアと目標との関連付け	pf_user と goal_user
製品アイデアに関連付けられたドキュメント、ファイル、またはリソースを収集および管理します。	フィードバックのドキュメント	pf_user
アイデアポータルからフィードバックにアイデアをインポートします。	アイデアポータルとフィードバック アプリケーションとの統合	sn_align_core.apw_admin
ワークフローを妨げることなく、Microsoft Outlook から直接フィードバックを作成または送信します。	Microsoft Outlook からフィードバックを送信する	pf_user
関連アイテムを切り替えることなく、フィードバックまたは製品アイデアにリンクする計画立案以外のアイテムを構成します。	フィードバックまたは製品アイデアレコードに対する計画立案以外のアイテムの構成	アドミン
フィードバックまたは製品アイデアの概要ページに対するフィルターを構成して、ユーザーの設定に基づいて情報を取得します。	フィルターを構成する	admin
Now Assist for SPM を使用して、顧客フィードバックの簡潔で有益なサマリーを生成します。	戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist を使用したフィードバックの要約	pf_user
計画立案アイテム生成 AI Docs スキルを使用して、選択したテキストのサマリーを生成します。	計画立案アイテムのドキュメント要約スキルを使用して、選択したコンテンツまたは完了したコンテンツのサマリーを生成します	pf_user
計画立案アイテムの記述スキルを使用して計画立案アイテムの説明を絞り込みます。	計画立案アイテムの書き込みスキルを使用して計画立案アイテムのコンテンツを絞り込む	sn_align_core.apw_user

自動翻訳

関連情報

- での フィードバック アプリケーションの構成 戦略的計画
- での フィードバック アプリケーションの管理 戦略的計画
- フィードバックの参照

での フィードバック アプリケーションの構成 戦略的計画

フィードバックを送信するには フィードバック アプリケーションを他のアプリケーションに設定します。

ServiceNow Store から 戦略的計画 アプリケーションをインストールしフィードバックアプリケーションの構成を開始します。戦略的計画をインストールする方法の詳細については、「戦略的計画のインストール」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

戦略的計画ワークスペースの構成

Microsoft Outlook 向け ServiceNow® アドインのインストール

ユーザーロールを構成し、Microsoft Outlook 向け ServiceNow® アドインを使用するためのアドインマニフェストファイルをダウンロードします。

始める前に
必要なロール：admin

注:

Microsoft Outlook 向け ServiceNow® アドイン (com.sn_outlook_addin) があることを確認します。

手順

1. 移動先 すべて > **Office** 用 **ServiceNow** アドイン > **Office** アドインマニフェスト ServiceNowインスタンスから。
2. [フィードバックを得るための **ServiceNow (ServiceNow for feedback)]** を選択します。
3. [マニフェストをダウンロード] を選択します。
4. Microsoft Outlook でメールアカウントを開きます。
5. [その他のアイテム] メニューから、 アドインを取得 > 自分のアドイン > カスタムアドインを追加する > ファイルから追加.
6. ServiceNow® インスタンスからダウンロードした `manifest.xml` ファイルを選択し、[開く] を選択します。
7. **[Install** (インストール)] を選択します。
   [ServiceNow for フィードバック] タイルが [カスタムアドイン] セクションに追加されます。
8. [その他のアイテム] メニューから [フィードバック向け **ServiceNow (ServiceNow for Feedback)**] を選択し、認証情報を使用してログインします。
   ServiceNow® インスタンスで Microsoft Outlook アカウントに接続できます。

関連情報

Microsoft Outlook からのフィードバックの作成

フィードバック送信用メールの構成

Microsoft Outlook からのフィードバックの作成

Microsoft Outlook から直接フィードバックを作成または送信します。Microsoft Outlook 内でフィードバックの作成と送信を構成することで、プロジェクトマネージャーは、さまざまなアプリケーションを切り替えることなく、簡単にフィードバックを提供できます。

始める前に
必要なロール：pf_user

このタスクについて
プロジェクトマネージャーは、Microsoft Outlook で日常のタスクを実行しながらフィードバックを提供できます。たとえば、プロダクトマネージャーがメールでフィードバックを受け取った場合、ワークフローを中断することなく、 Microsoft Outlook アドインを使用してメールをフィードバックとして直接送信できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. Microsoft Outlook アカウントから、フィードバックとして使用するメールを選択します。
2. **ServiceNow for Feedback** アドインを選択します。

   メールの件名がフィードバックの名前としてコピーされ、メールの本文が説明として追加されます。ソースはメールとして自動入力されます。
3. [タイプ] リストから、フィードバックのタイプを選択します。
4. [アサイン先] リストから、ユーザーを選択します。
5. フィードバックにタグを追加し、[保存] を選択します。

フィードバック送信用メールの構成

インスタンスでメール設定を構成し、この ID にメールを送信してフィードバックを作成します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
インスタンスでメール設定を構成し、それを使用してメールを直接送信します。*sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address* システムプロパティを使用すると、インスタンス内でメール設定を構成し、メールアカウントからフィードバックを直接送信できます。

手順

1. インスタンスに移動します。
2. 移動先 すべて > システムプロパティ > メールプロパティ.
3. オプション: メールのプロパティを更新します。

   a. [メール送信の有効化] および [メール受信の有効化] を [はい] に設定します。

   b. [信頼するドメインからのメール受信に対してユーザーを自動的に作成する] を [はい] に設定します。

      (Optional) このフィールドのデフォルト値は [いいえ] です。[はい] を選択して、ユーザーテーブルにユーザーを自動的に作成できます。

   c. [保存] を選択します。
4. [システムプロパティ] リストを更新します。

   a. 移動先 すべて > システムプロパティ > すべてのプロパティ
   *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address*プロパティを検索します。

   b. *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address* プロパティを開き、[値] フィールドにインスタンスのメール ID を入力します。
   構成済みの任意のメールアカウントを使用できます。
5. フィードバックとして転送する既存のメールを選択するか、フィードバックを作成します。
6. [送信] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アイデアポータルと フィードバック アプリケーションとの統合

アイデアポータルを フィードバック アプリケーションと統合して、製品アイデアとフィードバックのコラボレーションを可能にします。

始める前に
必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

このタスクについて
一方向の同期がサポートされており、アイデアポータルからフィードバックへのマッピングが実行されます。すべてのアイデアがフィードバックにインポートされます。これらのアイデアはフィードバックでフィードバックレコードとして作成され、各アイデアに対して受け取った投票数もインポートされます。受け取った投票数でフィードバックの人気を評価し、それらに優先順位を付けて情報に基づいた意思決定を行うことができます。

手順

1. ServiceNow インスタンスに移動します。
2. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 統合.
3. **[ServiceNow** 内部] を選択して、内部アプリケーションの配置統合を表示します。
4. [デフォルトのマッピング構成を生成] を選択して、フィードバックとアイデアテーブル間のテーブルマップを作成します。
   マッピング構成は、各レコードのテーブル、フィールド、および選択マップで構成されます。
   フィードバックと他のテーブル間のカスタムマッピング構成の作成の詳細については、「カスタムマッピング構成の作成」を参照してください。

フィードバックまたは製品アイデアレコードに対する計画立案以外のアイテムの構成

フィードバックまたは製品アイデアレコードをリンクして関連アイテム間をすばやく移動できるように、計画立案以外のアイテムを構成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > すべてのプロパティ.
2. *sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_planning_items_for_link_item* プロパティを開きます。
3. こちらを選択してプロパティを編集します。
4. 値フィールドに計画立案以外のアイテムテーブル名を入力し、[更新] を選択します。
   任意のグローバルアプリケーションまたはスコープ対象のアプリケーションから、インシデント、ケース、スクラムタスク、アジャイルストーリー、またはテーブルのテーブル名を追加できます。
   値フィールドには、1 つまたは複数のテーブル名をカンマで区切って入力できます。
5. リンクする計画立案以外のアイテムを構成します。
   a. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
   b. [ラベル] リストからフィードバックを検索します。
   c. *sn_align_core_feedback* テーブル名を含むフィードバックレコードを開き、[リストを表示] 関連リンクを選択します。
   d. 任意のフィードバックレコードを開き、追加のアクションを選択します 構成 > 関連リスト.
   e. [このビューを編集 **(Edit this view)]** リンクを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

f. 関連アイテムを [利用可能] パネルから [選択済み] パネルに移動します。

g. [保存] を選択します。

6. ステップ 4 で追加したすべての計画立案以外のアイテムテーブルのビュー名 `workspace_apw_new` を使用して、フォームビューを構成します。

次のタスク

フィードバックまたは製品アイデアレコードと計画立案以外のアイテムとの関連付け

フィードバックまたは製品アイデアの概要ページに対するフィルターの構成

フィードバックまたは製品アイデアの概要ページにフィルターを構成して、ユーザーの設定に基づいて情報を表示します。フィルターを使用してユーザーの関心に最も関連性の高いフィードバックや製品アイデアを見つけて活用します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > すべてのプロパティ.
2. *`sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_filters`* プロパティを開きます。
3. こちらを選択してプロパティを編集します。
4. 値フィールドに、クエリのフィールド名を入力します。
   JSON クエリにフィールド名を追加できます。JSON には、各フィルターの列オブジェクトがあります。各列オブジェクトには、次の 2 つのプロパティがあります。
   - fieldname：フィードバックまたは製品アイデアテーブルのフィールド名
   - encodedQuery：参照テーブルのフィルター

   フィードバックテーブルまたは製品アイデアテーブルの参照タイプフィールドまたは選択肢タイプフィールドのみをフィルターとして追加できます。新しいフィルターを追加することも、既存のフィルターに条件を追加することもできます。
5. [更新] を選択します。

での フィードバック アプリケーションの管理 戦略的計画

戦略的計画 でフィードバックアプリケーションを使用してフィードバックや製品のアイデアを作成し、製品開発中にデータに基づく意思決定を行います。追跡、優先順位付け、実装が可能な製品アイデアまたは計画立案アイテムまたは計画立案以外のアイテムにフィードバックを関連付けます。

以下のコンポーネントを使用して、戦略的計画内でフィードバックを管理します。


- フィードバック
- 製品アイデア

フィードバック

フィードバック とは、製品についてユーザーまたは顧客から提供された提案、問題、提案されたソリューション、または問題の説明を指します。 戦略的計画 を使用すると、複数のソースからフィードバックを収集し、受信したフィードバックを確認して、重大な問題や機能要求を把握できます。フィードバックホームページからフィードバックフィルターを作成できます。フィードバックフィルターの詳細については、「戦略的計画でのフィードバックフィルターの作成」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

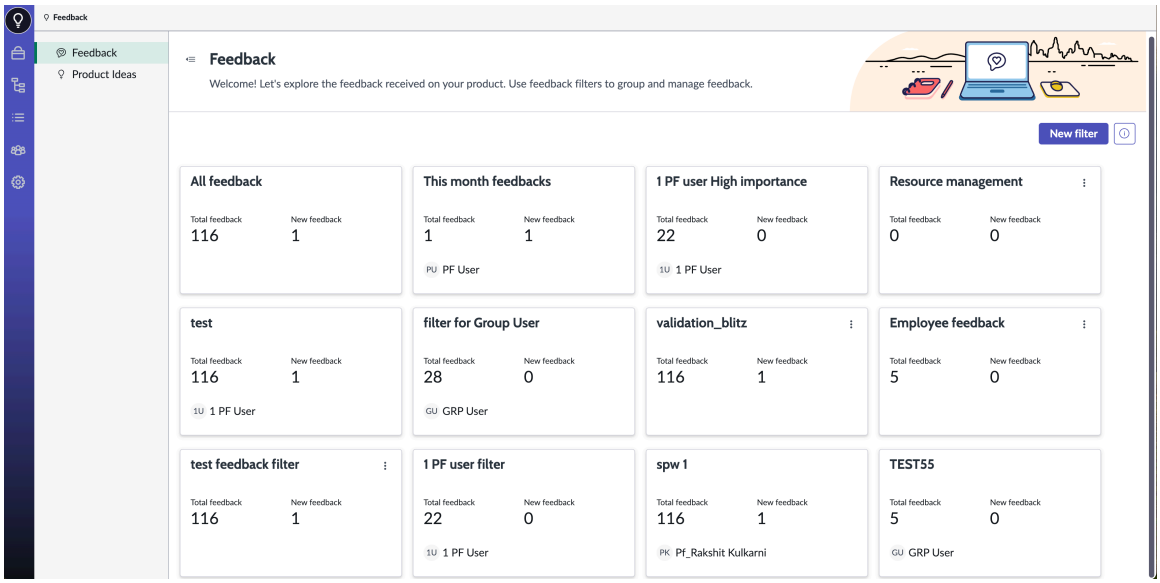

フィードバックの概要


概要ページのフィードバック数に基づいて、フィードバック、フィードバックにリンクされた製品アイデアの数、上位のタグ、および顧客に関するインサイトを取得します。以下のフィルターに基づいて傾向と統計情報を表示します。

- フォーカスエリアを決定するために主に使用される上位のタグ
- フィードバックを最も積極的に送信している上位の顧客
- 過去 7 日間に受信したフィードバック
- 製品アイデアにリンクされていないフィードバック
- 全体的なステータスに基づくフィードバック
- ユーザーにアサインされているフィードバックとアサインされていないフィードバック
- フィードバックデータ全体の全体的な感情の分布を特定します。
- 過去 9 か月間に受け取ったフィードバックの感情を分析します。

次の図では、顧客フィードバックの概要のサンプルと、 [概要] タブのさまざまな機能を示しています。たとえば、上位の顧客に基づくフィードバック数の表示によって、どの顧客が最も多くフィードバックを提供したかがわかります。ページの上部にあるフィルターを使用して、 フィードバック アプリケーションのフィードバック情報を表示します。フィルターの詳細については「フィードバックまたは製品アイデアの概要ページに対するフィルターの構成」を参照してください。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

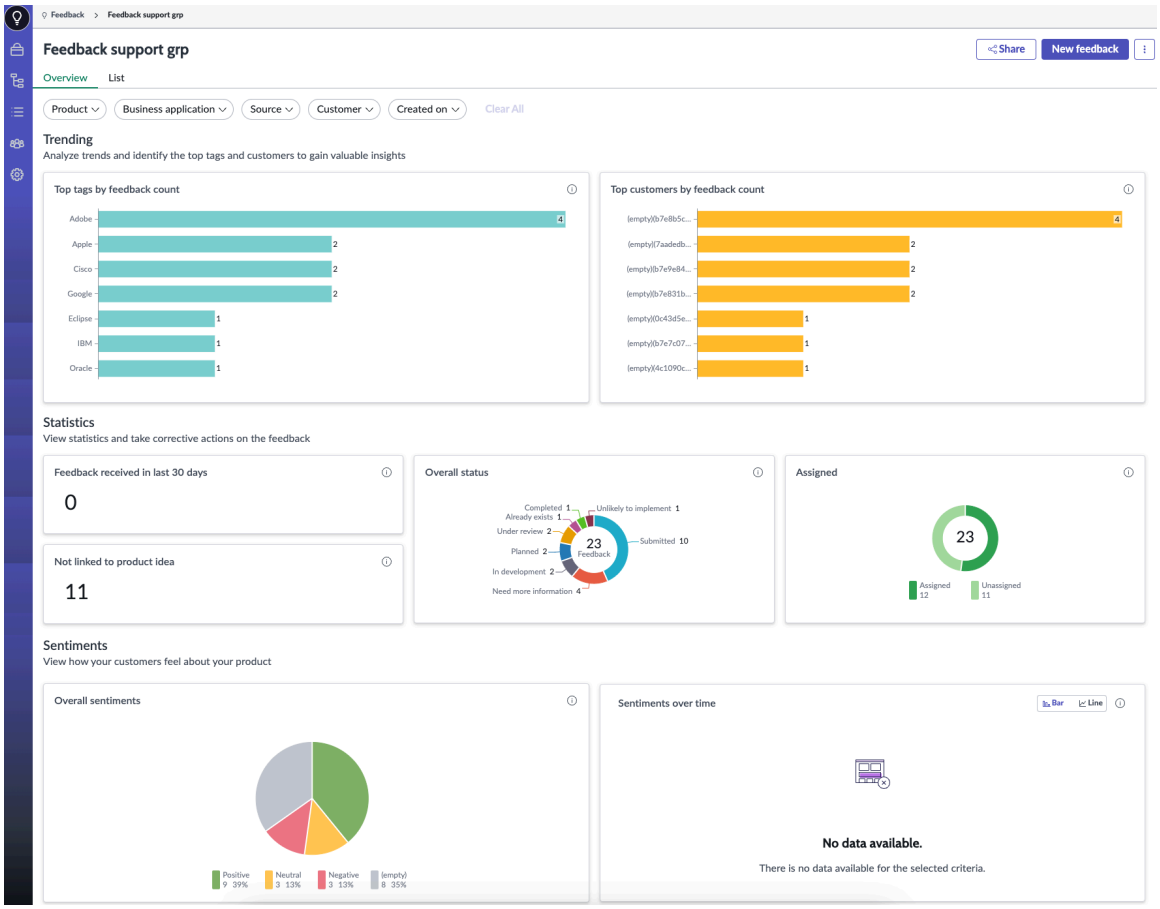

フィードバック リストビュー

製品マネージャーは、ユーザーまたは顧客から受信したフィードバック送信のリストを表示できます。フィードバックを移動、ソート、フィルタリング、グループ化、またはリンクし、要件に基づいてアクションに優先順位を付けることができます。

フィードバックレコードを作成し、このページのアイデアまたは計画立案アイテムにリンクすることもできます。たとえば、複数のフィードバックレコードを選択して、アイデア、エピック、デマンド、またはプロジェクトに関連付けることができます。

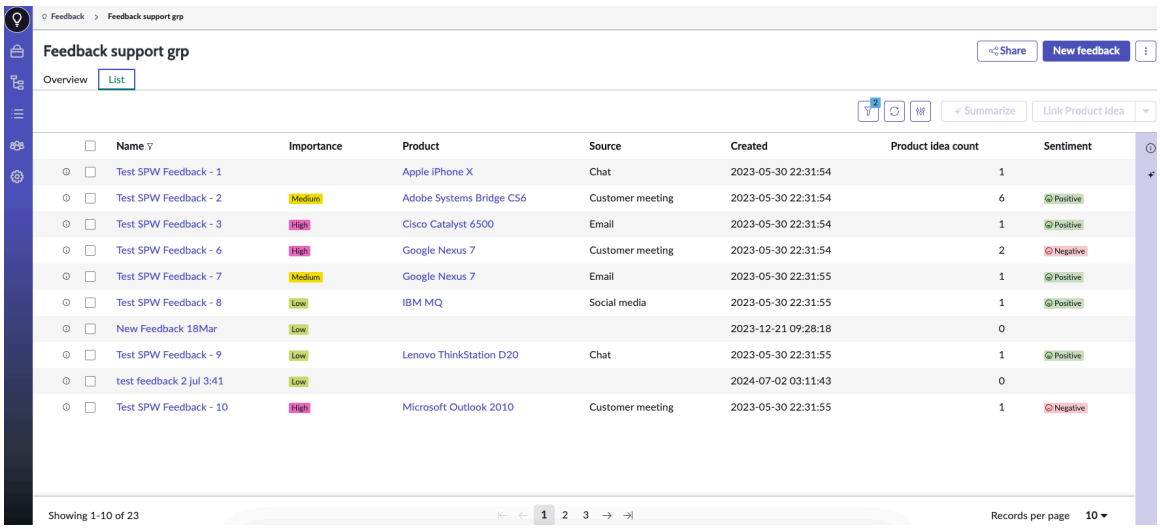

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


製品アイデア

製品アイデアは、1 つまたは複数のフィードバックレコードに基づいて開発されたソリューションまたは改善であり、すべての顧客にメリットをもたらします。製品アイデアを評価して優先順位を付けるか、別の計画立案アイテム (エピック、デマンド、またはプロジェクト) にリンクします。戦略的計画で製品アイデアを使用して、製品アイデアを管理し、カスタムレンズを作成します。製品アイデアの概要、フィードバックにリンクされた製品アイデアの数、最新のアイデア、およびアイデアの計画立案ステータスを取得します。ページの上部にあるフィルターを使用して、製品アイデアを表示します。

製品アイデアのリストビュー

製品マネージャーは、製品アイデア送信のリストを表示できます。計画立案ステータス、MoSCoW、優先度、影響などのさまざまな属性に基づいてアイデアをソートできます。リストビューの MoSCoW の値を使用して、製品アイデアに優先順位を付けます。リストビューには、リンクされたフィードバック数と製品アイデアに関心のある顧客の数が表示されます。顧客の数は、リンクされたフィードバックに基づいて計算またはロールアップされます。

製品アイデアのリスト

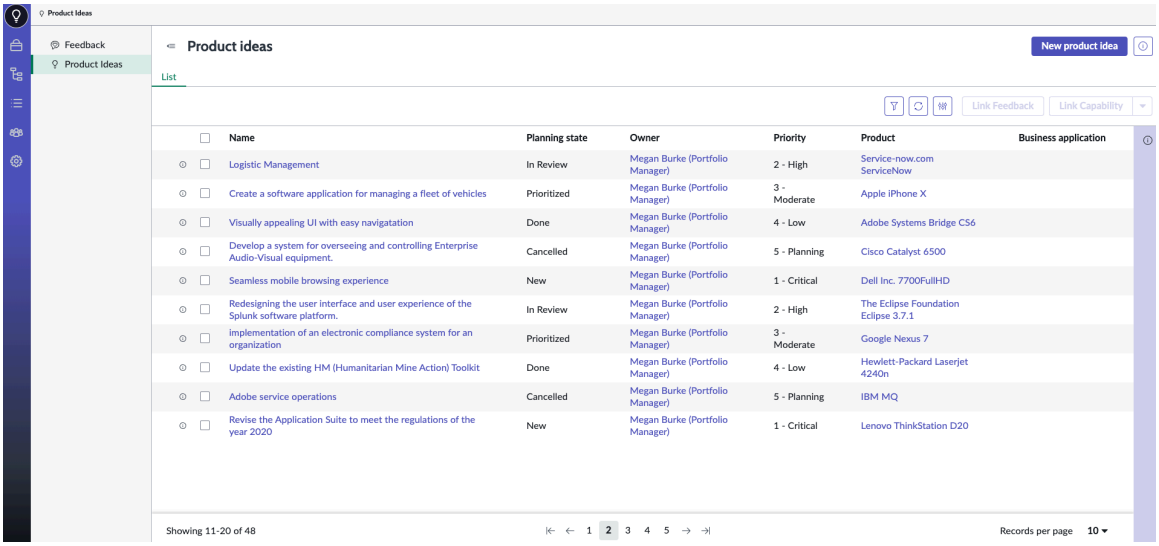

これらのタブを使用して、フィードバックまたは製品アイデアを管理します。

のタブ フィードバック

タブ	説明	アクション
詳細	送信されたフィードバックに関する追加情報を提供します。	• フィードバック情報を表示および追跡します。 • フィードバックに基づいて作業メモを作成します。 • フィードバックレコードに添付ファイルまたはファイルを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

のタブ フィードバック (続く)

タブ	説明	アクション
製品アイデア	フィードバックレコードにリンクされているアイデアを管理できます。こうしたアイデアは評価され、優先順位が付けられ、処理されます。	• フィードバックレコードにリンクされている製品アイデアを表示および追跡します。 • 製品アイデアを作成し、フィードバックレコードにリンクします。 • フィードバックレコードからアイデアのリンクを解除します。
計画立案アイテム	作業アイテムを追跡し、フィードバックをアクション可能なアイテムに変換します。	• フィードバックレコードにリンクされている計画立案アイテムの数を表示します。 • 計画立案アイテムを作成し、フィードバックレコードにリンクします。計画立案アイテムのステータスを監視し、計画立案アイテムの全体的な進捗状況を追跡します。 • フィードバックレコードからアイデアのリンクを解除します。

製品アイデアのタブ

タブ	説明	アクション
詳細	製品アイデアレコードの詳細ビュー。説明、添付ファイル、およびアクティビティを表示します。	• 説明、添付ファイル、アクティビティを表示し、製品アイデアに関連するその他の関連情報にアクセスします。 • 製品のアイデアに関する作業メモを作成します。 • 製品アイデアレコードに添付ファイルまたはファイルを追加します。
計画立案アイテム	製品アイデアレコードにリンクされている計画立案アイテムの数を表示できます。	• 製品アイデアレコードにリンクされている計画立案アイテムの数を表示します。 • 計画立案アイテムを作成し、製品アイデアレコードにリンクします。 • 製品アイデアレコードから計画立案アイテムのリンクを解除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品アイデアのタブ (続く)

タブ	説明	アクション
目標/ターゲットの関係	製品アイデアを、そのアイデアが貢献しようとしている特定の目標に関連付けることができます。	• 目標を作成し、製品アイデアレコードに追加します。 • 製品アイデアレコードから目標を削除します。
フィードバック	製品アイデアにリンクされているフィードバックレコードを表示および管理できます。このタブには、フィードバックがカードとして表示されます。カードを選択するとフィードバックレコードが開き、フィードバックに関する詳細情報が表示されます。	• 製品アイデアレコードにリンクされている関連するフィードバックを表示および追跡します。 • フィードバックカードを選択すると、フィードバックに関する詳細情報が開きます。 • ステータス、優先度、またはその他の属性別にフィードバックを並べ替えます。 • タイトル、キーワード、またはコンテンツでフィードバックを検索します。
ドキュメント	プロダクトマネージャーが、製品アイデア、フィードバック、または計画立案アイテムに関連するドキュメントを整理、保存、および共同作業するための一元化された場所を提供します。これには、詳細な要件、設計ドキュメント、技術仕様、またはその他のファイルを含めることができます。	• テンプレートを使用して複数のページを作成します。 • ドキュメントコンポーネント内で特定のユーザーをタグ付けまたはメンションします。 • レコードをメンションして、ドキュメントコンポーネント内にレコードの直接リンクを作成します。 • テーブル、画像、リンクなどを挿入します。 • 計画立案アイテム生成 AI Docs スキルを使用して、ドキュメントで選択したテキストのサマリーを生成します。詳細については、「計画立案アイテムのドキュメント要約スキルを使用して、選択したコンテンツまたは完了したコンテンツのサマリーを生成します」を参照してください。

関連情報

フィードバックの参照

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的計画でのフィードバックフィルターの作成


フィードバックフィルターを使用してフィードバックを作成および整理し、特定のフィードバックを見つけるために毎回手動でフィルターを適用する必要性を減らします。

始める前に
必要なロール：pf_user

このタスクについて
プロジェクトマネージャーは、フィードバックフィルターを保持してチームメンバーまたはグループと共有し、特定のフィードバックフィルターで共同作業を行うことができます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. [フィードバック] を選択し、[新しいフィルター] を選択して新しいフィルターを作成します。

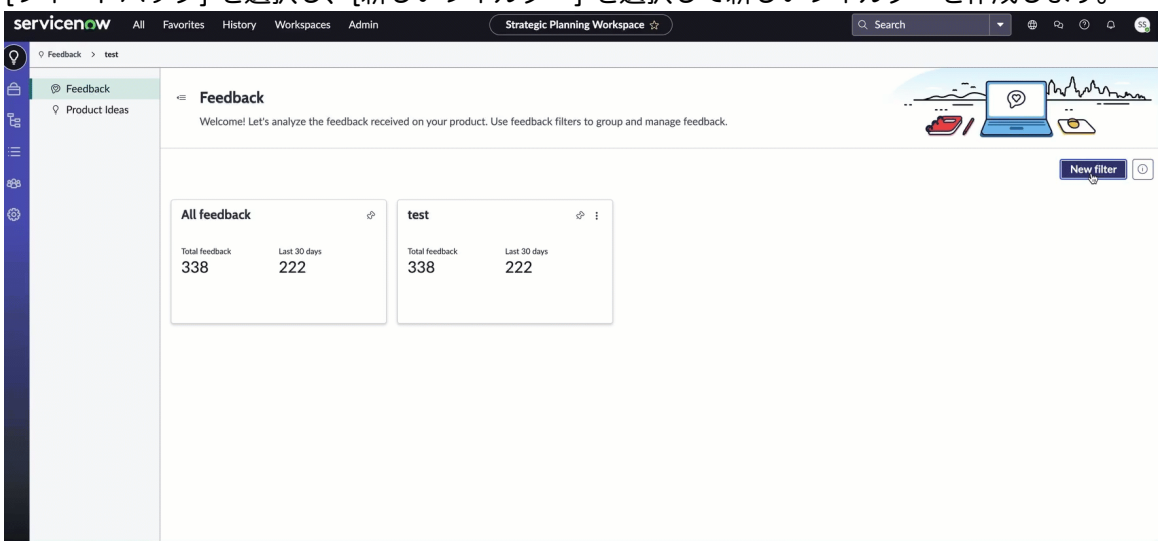

3. フォームで、[フィードバックフィルター名] に記入します。
   必要に応じて、フィルターを選択するか、新しいフィルター条件を設定できます。
4. [確認] を選択します。

   フィードバックフィルター、レビュー統計情報、および感情を追跡できます。このフィードバックフィルターに固有のフィルターページから、新しいフィードバックを直接作成することもできます。

   フィードバックホームページから直接、フィードバックフィルターカードをソート、固定、共有、更新、または削除します。フィードバックフィルターカードを共有するときに、特定のユーザーまたはグループにアクセス権を付与できます。フィードバックフィルターカードにアクセスできるユーザーを確認することもできます。

次のタスク

- 戦略的計画でのフィードバックフィルターの更新
- での フィードバック の作成 戦略的計画
- フィードバックと製品アイデアとの関連付け
- フィードバックまたは製品アイデアと計画立案アイテムとの関連付け

戦略的計画でのフィードバックフィルターの更新

フィードバックフィルターの詳細を編集し、フィードバックフィルターをリアルタイムで更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：pf_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[フィードバック] を選択します。
2. フィードバックフィルターを作成します。
   詳細については、「戦略的計画でのフィードバックフィルターの作成」を参照してください。
3. フィードバックページから、編集するフィードバックフィルターカードを選択します。
4. レコードの詳細を更新するか、フィードバックフィルターカードを削除します。

での フィードバック の作成 戦略的計画

フィードバック アプリケーションを使用してフィードバックを作成し、製品について情報に基づいた意思決定を行います。

始める前に
必要なロール：pf_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. [フィードバック] を選択します。
3. [フィードバック] を選択し、これらのオプションのいずれかを選択してフィードバックを作成します。

4. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドと説明の詳細については、「[フィードバック] フォーム」を参照してください。
5. [送信] を選択します。
   これでフィードバックを追跡できるようになります。インスタンスに移動し、フィードバック番号で検索して、フィードバックを開きます。

次のタスク

- リストページからのフィードバックまたは製品アイデアレコードの更新
- フィードバックと製品アイデアとの関連付け
- フィードバックまたは製品アイデアと計画立案アイテムとの関連付け

リストページからのフィードバックまたは製品アイデアレコードの更新

フィードバックまたは製品アイデアのリストページを使用して、フィードバックまたは製品アイデアレコードの詳細を編集し、リアルタイムで更新します。

始める前に
必要なロール：pf_user

このタスクについて
インライン編集を使用して、リストビューまたはサイドパネル内でフィードバックまたは製品アイデアレコードを変更します。リストビューからインラインで詳細を編集するか、サイドパネルを使用します。リストページの簡単な説明やステータスなどのフィールドのクイック更新を有効にします。[完全な詳細] ページを使用して、作業メモや添付ファイルを追加したり、フィードバックまたは製品アイデアレコードの関連リストを表示したりできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. フィードバックまたは製品アイデアリストから、編集するフィードバックまたは製品アイデアレコードを選択します。
   [完全な詳細] ページを使用して、フィードバックまたは製品アイデアレコードを編集できます。 を選択して、リストビューからフィードバックまたは製品アイデアレコードのプレビューを開きます。
3. レコードの詳細を更新したり、ファイルを添付したり、フィードバックや製品アイデアレコードを削除したりします。
   [完全な詳細] ページで編集できない特定の列の情報は、インラインでも編集できません。たとえば、製品アイデア数や投票数などです。属性別にフィードバックまたは製品アイデアレコードをグループ化する場合、アイテムの簡単な説明をリストビューから直接編集することはできません。

フィードバックと製品アイデアとの関連付け

フィードバックレコードを、計画して優先順位付けし、実行できる 1 つ以上の製品アイデアにリンクします。

始める前に
必要なロール：pf_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. [フィードバック] を選択します。
3. [フィードバック] を選択し、[フィードバックの作成 (Create feedback)] を選択します。
4. フィードバックが作成されたら、[製品アイデアをリンク] を選択して製品アイデアをリンクします。
5. オプション: 製品アイデアのリストページから、計画立案アイテムに関連付ける製品アイデアレコードを 1 つ以上選択し、[確認] を選択します。
   [製品アイデア] タブから関連する製品アイデアを表示できます。

関連情報

フィードバックまたは製品アイデアと計画立案アイテムとの関連付け

フィードバックまたは製品アイデアレコードと計画立案以外のアイテムとの関連付け

フィードバックまたは製品アイデアと計画立案アイテムとの関連付け

フィードバックレコードまたは製品アイデアレコードを計画立案アイテムにリンクします。この関連付けを行うことで、顧客の懸念に一元的な場所で迅速に対処し、意思決定の際にすべての情報が考慮されるようにします。

始める前に
必要なロール：pf_user または apw_user

このタスクについて
一度にフィードバックまたは製品アイデアレコードと関連付けられる計画立案アイテムは 1 つだけです。フィードバックまたは製品アイデアレコードをデマンド、エピック、またはプロジェクトのいずれかにリンクできます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
フィードバックまたは製品アイデアレコードが計画立案アイテム (プロジェクト、デマンド、またはエピック) に関連付けられると、フィードバックまたは製品アイデアレコードの [計画立案アイテム] タブにレコードが表示されます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. [フィードバック] を選択します。
3. [フィードバック] を選択し、[フィードバックの作成 (Create feedback)] を選択します。
4. フィードバックが作成されたら、製品アイデアへのリンクリストからフィードバックに関連付ける計画立案アイテムを選択します。



計画立案アイテムのリストから、関連付けるレコードを 1 つ以上選択します。製品アイデアに対して同様の手順を実行できます。

5. [確認] を選択します。
[プランニングアイテム] タブから、関連する計画立案アイテムを表示できます。完了ステータスのデマンドを製品アイデアまたはフィードバックに関連付けることはできません。

戦略的計画での製品アイデアの作成

フィードバック アプリケーションを使用して製品アイデアを作成し、ユーザーにとって重要なアイデアに優先順位を付けます。製品アイデアをフィードバックに組み込んで、製品を強化します。

始める前に
必要なロール：pf_user

このタスクについて
ユーザーが作成した製品アイデアは、製品のフォーカスエリアを特定するのに役立ちます。こうした製品アイデアは、製品開発ライフサイクルでの継続的な改善を促進します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. [フィードバック] を選択します。
3. [製品アイデア] を選択し、次に [新しい製品アイデア] を選択します。
4. フォームのフィールドに入力します。

フィールドと説明の詳細については、「[製品アイデア] フォーム」を参照してください。

5. [送信] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- リストページからのフィードバックまたは製品アイデアレコードの更新
- 製品アイデアとフィードバックとの関連付け
- フィードバックまたは製品アイデアレコードと計画立案以外のアイテムとの関連付け
- 製品アイデアと目標との関連付け

製品アイデアとフィードバックとの関連付け

分析して優先順位付けし、実現できる製品アイデアを 1 つ以上のフィードバックレコードに関連付けます。

始める前に

必要なロール：pf_user

手順

1. 移動先 すべて > ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. [フィードバック] を選択します。
3. [製品アイデア] を選択し、次に [製品アイデアの作成 (Create product idea)] を選択します。
4. [製品アイデアのリスト] ページから、関連付けるアイデアを 1 つ以上選択します。
5. [フィードバックをリンク] を選択します。
6. [フィードバックをリンク] リストから、1 つまたは複数のフィードバックレコードを選択し、[確認] を選択します。
   これで、製品アイデアを追跡できます。インスタンスに移動し、製品アイデア番号で検索して製品アイデアを開きます。新しいフィードバックレコードを作成し、[新しいフィードバックを作成] リンクを使用して製品アイデアに関連付けることもできます。

関連情報

フィードバックまたは製品アイデアレコードと計画立案以外のアイテムとの関連付け

製品アイデアと目標との関連付け

フィードバックアプリケーションでドキュメントを管理する

フィードバックまたは製品アイデアレコードと計画立案以外のアイテムとの関連付け

フィードバックレコードまたは製品アイデアレコードを計画立案以外のアイテムにリンクします。この関連付けを行うことで、顧客の懸念に一元的な場所で迅速に対処し、意思決定の際にすべての情報が考慮されるようにします。

始める前に

「フィードバックまたは製品アイデアレコードに対する計画立案以外のアイテムの構成」を行ったことを確認します。

必要なロール：pf_user

このタスクについて


単一または複数のフィードバックレコードまたは製品アイデアレコードを一度に 1 つ以上の計画立案以外のアイテムに関連付けることができます。計画立案以外のアイテムには、インシデント、スクラムタスク、アジャイルストーリー、または Agile Development、PPM 標準、SAFe アプリケーションなどグローバルまたはスコープ対象のアプリケーションからのアイテムがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. [フィードバック] を選択します。
3. フィードバックのリストから、計画立案以外のアイテムに関連付けるフィードバックレコードを 1 つ以上選択します。
   製品アイデアに対して同様の手順を実行できます。製品アイデアのリストから、計画立案以外のアイテムに関連付けるアイデアを 1 つ以上選択し、2 ～ 4 の手順に従います。
4. [製品アイデアをリンク (Link Product idea)] リストから、計画立案以外のアイテムを選択します。



   計画立案以外のアイテムは、そのアイテムが構成されている場合にのみ [製品アイデアをリンク (Link Product idea)] リストに表示されます。たとえば、インシデントを設定した場合は、リストに [インシデントをリンク] オプションが表示されます。

5. 計画立案以外のアイテムのリストから、1 つ以上のレコードを選択し、[確認] を選択します。
   [関連アイテム] タブでフィードバックや製品アイデアを追跡できるようになりました。

製品アイデアと目標との関連付け

1 つ以上の製品アイデアを目標に関連付けることで、目標関係を作成します。特定の目標を定義することで、製品のアイデアに焦点を当ててターゲットを絞ります。

始める前に
必要なロール：pf_user、apw_user、または goal_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. [フィードバック] を選択します。
3. [製品アイデア] を選択し、次に [製品アイデアの作成 (Create product idea)] を選択します。
4. [製品アイデアのリスト] から、関連付けるアイデアを 1 つ以上選択します。
5. [追加] を選択します。
6. [目標] リストから目標を選択します。
   目標の詳細については、「計画立案アイテムの目標またはターゲットへの関連付け」を参照してください。
7. 目標を主要目標として設定する場合は、[主要目標] チェックボックスをオンにします。
   残りのフィールドは、目標レコードから自動入力されます。
8. [保存] を選択します。
   これで、[目標関係] リストから目標を追跡できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィードバックアプリケーションでドキュメントを管理する

[ドキュメント] タブで、製品アイデアに関連付けられたドキュメント、ファイル、またはリソースをキャプチャします。

始める前に


必要なロール：pf_user

ドキュメントコンポーネントプラグイン (com.sn_docs) がインストールされていることを確認します。

このタスクについて

手順

1. フィードバック アプリケーションで製品アイデアを作成します。
2. 製品アイデアリストのタブで、開くレコードを選択します。
3. サイドパネルで、[完全な詳細] ボタンを選択してレコードの詳細を開きます。
4. [ドキュメント] タブに移動します。
5. [ページ] セクションで、[ページを作成] を選択します。

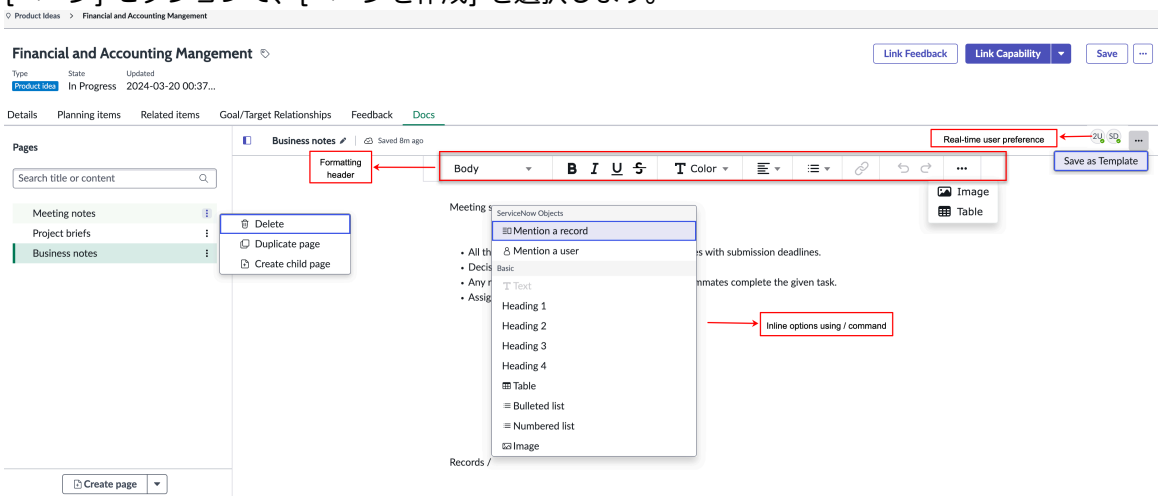

[ドキュメント] タブで、以下のタスクを実行できます。

- [その他のアクション] メニューを選択して、[ページ] セクションで子ページを削除、複製、または作成する。
- キーボードでスラッシュを使用して、必要に応じて [ユーザーをメンション]、または [レコードをメンション] などのアクションのリストを開く。
- 書式設定セクションを使用してテキストの外観をカスタマイズする。

6. [テンプレートとして保存] を選択して、作業メモを保存します。

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist を使用したフィードバックの要約

フィードバックレコードの名前と説明からサマリーを生成すると、各フィードバックレコードを手動で読み取らずに大量のフィードバックを迅速に分析できます。このタスクは、戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist アプリケーションのマルチフィードバック要約スキルを使用して実行できます。

https://player.vimeo.com/video/1016235687?h=c41764ac08&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
このスキルへのアクセスを必要とするカスタムロールを持つユーザーがいる場合は、それらのロールの ACL を更新し、それらのカスタムロールを製品内ロールに追加する必要があります。

必要なロール：pf_user

このタスクについて
フィードバックまたはマルチフィードバック要約スキルを使用すると、製品について受け取ったフィードバックに関する十分な詳細を取得できるため、製品の機能、使いやすさ、およびパフォーマンスを改善できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[フィードバック] を選択します。
2. [フィードバック] ページから、任意のフィードバックフィルターカードを選択します。
3. フィードバックのリストから、1 つ以上のフィードバックレコードを選択します。


   サマリーコンテンツがロードされている間にサイドパネルのローダーを表示して、より魅力的なロードエクスペリエンスを実現します。

   1 つのフィードバックレコードのサマリーを生成する場合は、リストレベルまたはレコードレベルで生成できます。レコードレベルでは、フィードバックサマリーが Now Assist コンポーネントに表示されます。コンポーネントはデフォルトでは折りたたまれており、展開するとサマリーが表示されます。

4. [要約を作成] を選択します。

   Now Assist アイコンにカーソルを合わせると、そのアニメーションが表示されます。


   フィードバック要約スキルを使用して、単一のフィードバックレコードのサマリーを生成できます。この画像は、単一のフィードバックレコードに対して AI で生成されたサマリーを示しています。

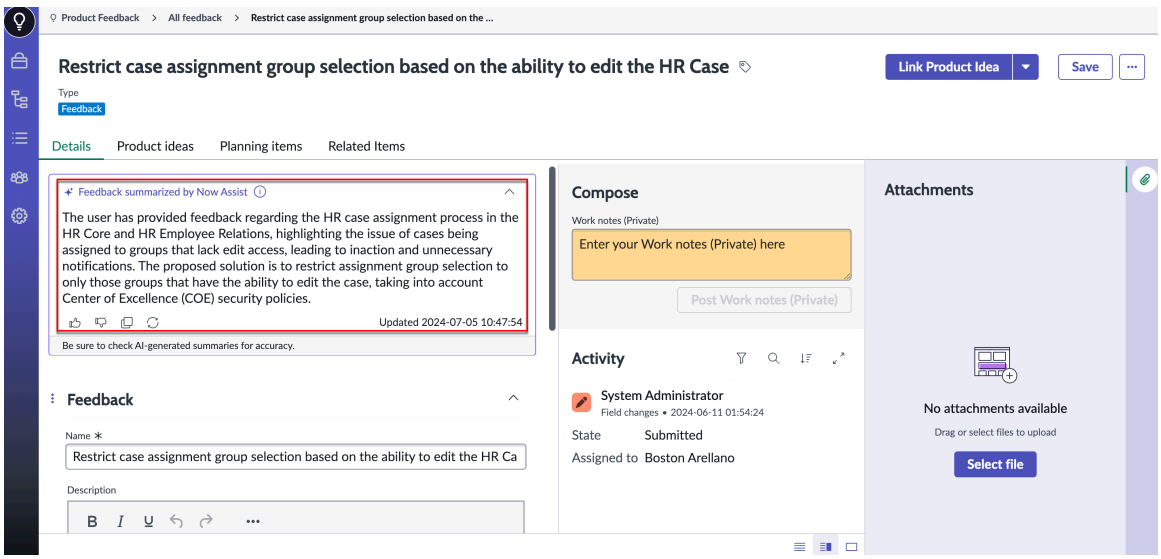

マルチフィードバック要約スキルを使用して 1 つまたは複数のフィードバックの要約を生成できます。たとえば、優先度の高いフィードバックを分析してフィルター処理し、レコードを要約して、要件に関するインサイトを得ることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

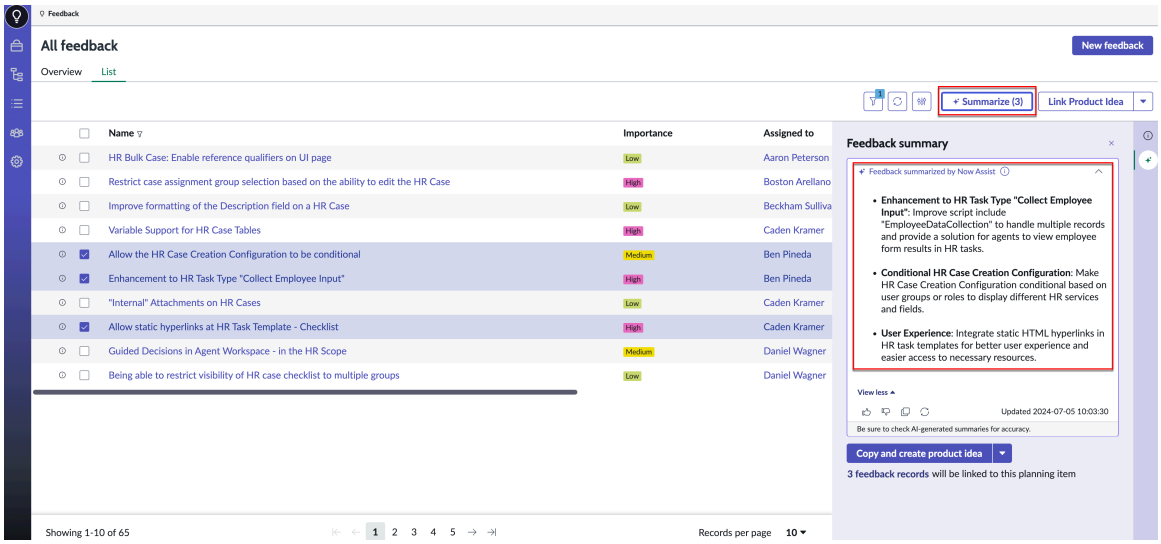

注:
これらのフィールドの情報は自動的に生成されるため、テキストを確認して正確であることを確認することをお勧めします。

フィードバックまたはマルチフィードバック要約スキルは、フィードバックレコードの名前と説明の情報を使用して、フィードバックからパラグラフまたは箇条書きのサマリーを生成します。

フィードバックリストとドキュメントの [要約を作成] ボタンに Now Assist アイコンのホバーアニメーションを表示します。

5. オプション: フィードバックの要約が完了したら、サマリーの展開または折りたたみ、フィードバックの提供、コピー、またはケースに関する情報の表示を行うことができます。

   注:
   フィードバック要約またはマルチ要約スキルは、フィードバックレコードをチェックして、サマリーを生成するのに十分な情報が利用可能かどうかを判断します。要約するのに十分なフィードバックコンテンツがない場合は、コンテンツを追加して再試行できます。

   サイドパネルで、レコードのプレビューアイコン ( ) を選択して追加の詳細を表示するか、生成されたサマリーのプレビューアイコン ( ) を選択してサマリー出力を表示できます。

6. オプション: [エピックのコピーと作成 **(Copy and create epic)**] を選択して、生成されたサマリーをコピーし、計画立案アイテムを作成します。

   (Optional) フィードバックを計画立案アイテムにリンクすることで、時間を節約し、ワークフローを簡素化します。これにより、サマリーをコピーする必要がなくなります。フィードバック で作業アイテムをすばやく作成し、ロードマップに表示できます。

計画立案アイテムのドキュメント要約スキルを使用して、選択したコンテンツまたは完了したコンテンツのサマリーを生成します

戦略的計画 でNow Assistによって生成されたサマリーから、ドキュメントの詳細をすばやく把握できます。

始める前に
計画立案アイテムのドキュメント要約スキルがアクティブ化されていることを確認します。

このスキルへのアクセスを必要とするカスタムロールを持つユーザーがいる場合は、それらのロールの ACL を更新し、それらのカスタムロールを製品内ロールに追加する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール:sn_align_core.ap_read_only、sn_align_core.pf_read、sn_apw_advanced.eap_read_only、sn_apw_advance または sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて

Now Assist によって生成されたサマリーを使用して、ドキュメント、会議メモ、プロジェクトレポートなどを読む時間を最小限に抑えます。また、学習ニーズに合ったソース資料をドキュメントにコピーアンドペーストして、簡単なサマリーを生成することもできます。


手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、フィードバックから製品アイデアなどの計画立案アイテムレコードを開きます。
2. [ドキュメント] タブから、要件に応じて次のいずれかのアクションを実行します。

   注:
   読み取りロールを持つユーザーは、コンテンツ全体の要約も可能です。

3. オプション: ドキュメントでコンテンツの要約が完了したら、フィードバックを提供したり、コンテンツに関する情報をコピーしたり、表示したりできます。

(Optional)

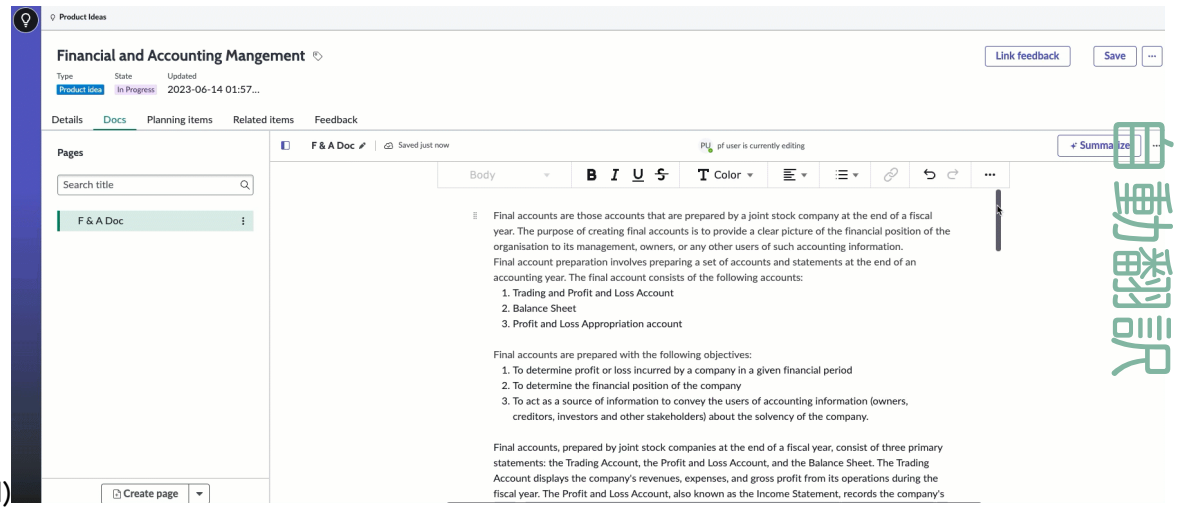

注:
これらのフィールドの情報は AI によって生成されるため、テキストを確認して正確であることを確認することをお勧めします。

Now Assist スキルをアクティブ化できるのはアドミニストレーターのみです。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。

計画立案アイテムのドキュメント要約スキルは、ドキュメントコンテンツをチェックして、要約を生成するのに十分な情報が利用可能かどうかを判断します。要約するのに十分なコンテンツがない場合は、コンテンツを追加して再試行できます。

注:
[要約 を作成 (Summarize)] ボタンは、計画立案アイテムのドキュメント要約スキルがアクティブな場合にのみ表示されます。選択したテキストが Now Assistのトークン制限を超えた場合、計画立案アイテムのドキュメント要約スキルを実行できません。要約するコンテンツが他にもある場合は、一部のコンテンツを削除して再試行できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィードバックの参照

フィールド、ユーザーロール、テーブル、システムプロパティ情報など、フィードバックに関する追加の詳細を提供する参照情報です。

フィードバックアプリケーションとともにインストールされるコンポーネント

ユーザーロール、テーブル、システムプロパティなど フィードバック アプリケーションとともに 戦略的計画 にインストールされるいくつかのタイプのコンポーネントについて説明します。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
[sn_align_core.pf_read]	フィードバックを表示できます。	なし
[sn_apw_advanced.pf_user]	フィードバックエンティティを作成、表示、更新、および削除します。	• pf_read • pf_basic
[sn_align_core.pf_basic]	フィードバックを作成、表示、更新、および削除しますが、戦略的計画ワークスペースからフィードバックにアクセスすることはできません。	なし

インストールされるテーブル

テーブル	説明
フィードバック [sn_align_core_feedback]	さまざまなソースから受信した フィードバック に関するすべての情報を保存します。
製品アイデア [sn_align_core_product_idea]	製品アイデアに関するすべての情報を保存します。
フィードバック関係 [sn_align_core_m2m_feedback_rel]	エンティティ (計画立案アイテムまたは計画立案以外のアイテム) に関連付けられたフィードバックに関する情報を格納します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールされているシステムプロパティ

名前	説明
sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address	フィードバックを作成または送信するためのアドレスを指定します。*sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_a* システムプロパティを使用すると、インスタンス内でメール設定を構成し、メールアカウントから直接フィードバックを送信できます。
sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_planning_items_link_item	フィードバックまたは製品アイデアにリンクできる計画立案以外のアイテムを指定します。*sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_p* システムプロパティを使用して、インシデント、スクラムタスク、アジャイルストーリーなどの計画立案以外のアイテム、または SAFe アプリケーションテーブル、Agile Development テーブル、PPM 標準テーブル、グローバルアプリケーションテーブル、またはスコープ対象のアプリケーションテーブルからのアイテムを、フィードバックまたは製品アイデアにリンクすることができます。
sn_apw_advanced.product_feedback_feedback_filters	フィードバック情報を並べ替えるフィルターを指定します。*sn_apw_advanced.product_feedback_feedback_filt* システムプロパティを使用すると、フィードバックの概要ページで追加および削除するフィルターを設定できます。
sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_filters	製品アイデア情報を並べ替えるフィルターを指定します。*sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_* システムプロパティを使用すると、製品アイデアの概要ページで追加または削除するフィルターを設定できます。
sn_apw_advanced.pf_docs_config	*sn_apw_advanced.pf_docs_config* を使用すると、さまざまな属性を使用してドキュメントコンポーネントをカスタマイズできます。 • タイプ：文字列 • 可能な値：次の属性を含むキーと値のペアを持つ JSON { "hideLeftPanel": true/false, "hideDocTitle": false, "hideFavorites": false, "collapseLeftPanel": false, "collapseRigthPanel": false, "allowExternalLink": false, "implicitSave": true, "recordMentionEnabled": true, "userMentionEnabled": true, "recordMentionConfig": [{ (Record mention configuration)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"sourceTable": TABLE_NAME,
	"filterCondition": "",
	"label": TABLE_LABEL,
	"fields": [
	FIELD1_NAME,
	FIELD2_NAME
	]
	}],
	}</pre>
	• 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル

sn_align_ws.pf_max_list_items	フィードバックまたは製品アイデアのリストビューに表示されるレコードの最大数を指定します。*sn_align_ws.pf_max_list_items* を使用すると、表示されるレコード数に制限を設定することで、フィードバックまたは製品アイデアのリストビューをカスタマイズできます。 • タイプ：整数 • 可能な値：0 より大きい任意の整数 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル

戦略的計画とともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「戦略的計画ワークスペースとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

フィードバックアプリケーションのフォームフィールド情報

フィードバック アプリケーションで使用されるフォームのフィールド情報。

[製品アイデア] フォーム

[製品アイデア] フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画で製品アイデアの詳細を作成または編集します。

[製品アイデア] フォームの [詳細] タブ

フィールド	説明
名前	製品アイデアの簡単な説明。
説明	製品アイデアの詳細な説明。
[計画] ステータス	製品アイデアのステータス。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 新規 • レビュー中 • 優先順位付け

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[製品アイデア] フォームの [詳細] タブ (続く)

フィールド	説明
	• 完了 • キャンセル
オーナー	この製品アイデアにアサインされたユーザー。
MoSCoW	製品アイデアの優先度は、その重要性に基づいています。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 必須 • 必要 • 可能性 • なし
作成者	この製品アイデアを作成したユーザー。
製品	製品アイデアに関連付けられた製品。
顧客	製品アイデアに関心を示した顧客。このフィールドはリンクされたフィードバックに基づいて自動的に設定されます。
ロケーション	製品アイデアの影響を受ける場所。
部門	製品アイデアに関連付けられた部門。
戦略的プログラム	製品アイデアに関連付けられた戦略的プログラム。
作業メモ	製品アイデアのアクティビティを追加および追跡するためのメモ。

[製品アイデア] フォームの [日付] セクション

フィールド	説明
承認された開始日	この製品アイデアの承認された開始日。
承認された終了日	この製品アイデアの承認された終了日。

[製品アイデア] フォームの [詳細] セクション

フィールド	説明
優先度	この製品アイデアの優先度。

関連するタブのリストは次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [計画立案アイテム] タブ：製品アイデアレコードにリンクされているすべての計画立案アイテムを表示します。詳細については、「フィードバックまたは製品アイデアと計画立案アイテムとの関連付け」を参照してください。
- [目標関係] タブ：製品アイデアレコードにリンクされているすべての目標を表示します。詳細については、「製品アイデアと目標との関連付け」を参照してください。
- [フィードバック] タブ：製品アイデアレコードにリンクされているすべてのフィードバックレコードを表示します。詳細については、「製品アイデアとフィードバックとの関連付け」を参照してください。
- [ドキュメント] タブ：製品アイデアレコードに関連するドキュメントまたは情報を表示します。詳細については、「フィードバックアプリケーションでドキュメントを管理する」を参照してください。
- [関連アイテム] タブ：製品アイデアレコードにリンクされているすべての計画立案以外のアイテムを表示します。このタブは、計画立案以外のアイテムがリンクされている場合にのみ使用できます。詳細については、「フィードバックまたは製品アイデアレコードと計画立案以外のアイテムとの関連付け」を参照してください。

関連情報

戦略的計画での製品アイデアの作成

[フィードバック] フォーム

[フィードバック] フォーム

[フィードバック] フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、 フィードバックのフィードバックレコードの詳細を作成または編集します。

注:
ESG ワークスペースと戦略的計画のユーザーは、ワークスペースのデフォルト/カスタム フォームレイアウトに追加されていないフィールドを表示できません。これらのフィールドを表示するデフォルト/カスタムフォームレイアウトを設定します。フォームレイアウトの構成方法については、「フォームレイアウトの構成」を参照してください。

フィードバックフォームの [詳細] タブ

フィールド	説明
名前	フィードバックの簡単な説明。
説明	フィードバックの詳細な説明。
製品アイデア数	フィードバックに関連付けられた製品アイデアの数。
状況	フィードバックの現在のステータス。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 送信済み • 詳細情報が必要 • レビュー中 • バックログ • 計画 • 開発中 • 完了

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィードバックフォームの [詳細] タブ (続く)

フィールド	説明
	• 実装する可能性は低い (Unlikely to Implement) • 重複 • 既に存在 (Already Exists)
アサイン先	フィードバックにアサインされたユーザー。
ソース	フィードバックのソース。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • チャット • 顧客会議 • メール • ソーシャルメディア • アイデアポータル
タイプ	フィードバックのタイプ。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 問題 • 拡張要求 • インサイト
製品	フィードバックに関連付けられた製品。
顧客	フィードバックを送信した顧客。
感情	フィードバックレコードの感情。使用可能なオプションは、[肯定的 (Positive)]、[否定的]、[中立] です。
作成者	フィードバックレコードを作成したユーザー。
ビジネスアプリケーション	このフィードバックが関連するビジネスアプリケーション。

関連するタブのリストは次のとおりです。

- [製品アイデア] タブ：フィードバックレコードにリンクされているすべてのアイデアを表示します。詳細については、「フィードバックと製品アイデアとの関連付け」を参照してください。
- [計画立案アイテム] タブ：フィードバックレコードにリンクされているすべての計画立案アイテムを表示します。詳細については、「フィードバックまたは製品アイデアと計画立案アイテムとの関連付け」を参照してください。
- [関連アイテム] タブ：フィードバックレコードにリンクされているすべての計画立案以外のアイテムを表示します。このタブは、計画立案以外のアイテムがリンクされている場合にのみ使用できます。詳細については、「フィードバックまたは製品アイデアレコードと計画立案以外のアイテムとの関連付け」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。






関連情報

での フィードバック の作成 戦略的計画

ポートフォリオ計画



戦略的計画ワークスペースのポートフォリオ計画により、従来のワークストリームとアジャイルのワークストリームを組み合わせることで、製品およびポートフォリオマネージャーは組織の戦略と連携して、アジャイルな変革を促進できるようになります。

開始するには

探索	構成	使用方法
		
のポートフォリオ計画の主な機能とビジネス価値を学ぶ 戦略的計画	コア構成の設定	会社全体の作業の計画、資金調達、調整
目標	**優先順位付け**	**ロードマップ**
		
目標を作成し、ターゲットを設定し、進捗状況を評価します	ポートフォリオ計画の作業のランク付けと優先順位付け	ポートフォリオ計画の作業のロードマップを作成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レポート	統合	参照
		
ポートフォリオ計画ステータスレポートを PPT としてエクスポート	戦略的計画と実行システムの統合	コンポーネント、フォームフィールド、一般的なガイドラインに関する詳細を取得します

トラブルシューティングとサポート

- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

戦略的計画ワークスペース でのポートフォリオ計画の詳細

戦略的計画 が提供する特性、機能、ビジネス価値について説明します。

戦略的計画の概要

戦略的計画 でレンズを使用すると、自分で選択した配送の観点で会社の作業を計画することができます。レンズを使用して作成されたカスタマイズしたポートフォリオ計画を使用すれば、 エンタープライズレベルからポートフォリオや製品まで計画をカスケードしたり、組織の目標や価値ストリームに沿って作業を調整できます。関連する作業の優先順位を付けてロードマップを作成することで、適切な実行チームを適切な戦略に配置します。

戦略的計画がプロジェクトやエピックなどの計画立案アイテムに分解された後、これらのアイテムを製品またはポートフォリオのロードマップにスケジュールすることができます。ハイブリッドロードマップを使用すると、ウォーターフォールとアジャイルの両方の作業アイテムを共有イニシアチブにロールアップできます。これらの計画立案アイテムごとにキャパシティと財務をすべて単一のワークスペースから計画することもできます。

次の表では、戦略的計画の機能の詳細と、それらを利用してマネージャーが効果的な計画を立案して会社全体でアジャイルな変革を推進する方法について説明します。

機能と利点

機能	メリット
レンズ	計画立案の視点を選択して、作業の優先順位付け、資金調達、調整を行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。







機能	メリット
レンズ構成	事前定義された 6 つのレンズを使用するか、カスタムレンズを作成します。
ポートフォリオ計画	戦略に沿って目的の視点 (レンズ) で集中的に作業を計画でき、成果の共有を促進します。
上位レベルのポートフォリオ計画	イニシアチブなどの戦略的アイテムのポートフォリオ計画をビルドすることで、より上位レベルで作業の優先順位を付けてロードマップを作成します。
計画立案アイテム	従来のアプローチ、アジャイルアプローチ、またはハイブリッドアプローチに合わせて、プロジェクト、エピック、デマンド、またはカスタムタイプの形式で作業を計画します。
優先順位付け	リストビュー、カンバンビュー、および階層ビューを使用して、バックログの調整をスムーズにし、適切な作業に優先順位を付けます。
ポートフォリオロードマップ	ロードマップを作成して優先順位付けされた作業を可視化し、マイルストーンを設定して重要な成果を追跡できるようにします。
フリーフォームロードマップ	計画立案組織やポートフォリオに制限されることなく、会社全体の作業を柔軟に計画および追跡します。
シナリオ計画	潜在的な結果を比較し、戦略的目標との整合性を評価し、最適なシナリオを本稼働計画として承認することで、ポートフォリオ計画を最適化します。
採点	ポートフォリオ計画でアイテムの採点を開始し、事前定義されたスコアまたはカスタムスコアに基づいて作業に優先順位を付けます。
ゴール管理	ポートフォリオ計画の目標を作成し、そのためのターゲットを設定し、目標とターゲットの進捗状況を評価して、組織計画を達成してビジネスの成果を推進します。
診断	構成およびその他の一般的な設定のエラーを特定して修正します。
キャパシティ計画立案	優先順位付けされた計画立案アイテムのリソースキャパシティを生成、表示し、適切に計画します。
財務計画	新しい [財務] 画面の包括的なビューを使用して、計画立案アイテムの財務計画を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。









ポートフォリオ計画ワークスペース と 戦略的計画ワークスペース の比較

- ポートフォリオ計画ワークスペース：ウォーターフォール手法を使用する場合に、作業を優先順位付け、ロードマップ、および追跡します。デマンドおよびプロジェクト管理 (PM) のための従来のポートフォリオ計画立案を強化します。ポートフォリオ計画立案の詳細については、「ポートフォリオ計画」を参照してください。
- 戦略的計画ワークスペース：従来の手法、アジャイル手法、またはハイブリッド手法を使用する場合に、作業を優先順位付け、ロードマップ、および追跡します。組織全体で目標を定義して追跡することで、戦略を実行に合わせます。

機能	ポートフォリオ計画ワークスペース	戦略的計画ワークスペース
事前定義されたレンズ:プロジェクトポートフォリオ		
事前定義されたレンズ:組織		
事前定義されたレンズ:プロジェクトプログラム		









自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	ポートフォリオ計画ワークスペース	戦略的計画ワークスペース
事前定義されたレンズ:製品		
事前定義されたレンズ:戦略的投資		
事前定義されたレンズ:目標		
事前定義されたレンズ:バリューストリーム		








自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	ポートフォリオ計画ワークスペース	戦略的計画ワークスペース
事前定義されたレンズ:ビジネスケイパビリティ		
レンズ構成:既存のレンズを変更する		
レンズ構成:新しいレンズを作成		
ポートフォリオ計画:作成と共有		
計画立案アイテム:サポートされている計画立案アイテム	プロジェクト、デマンド	プロジェクト、デマンド、エピック、カスタム
計画立案アイテム:上位レベルの計画立案でサポートされている計画立案アイテム	プログラム (pm_program)	戦略的プログラム、イニシアチブ、カスタム









自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	ポートフォリオ計画ワークスペース	戦略的計画ワークスペース
計画立案アイテム:カスタム計画立案アイテムテーブル		5 つの事前定義されたテーブル
優先順位付け:リスト		
優先順位付け:階層		
優先順位付け:カンバン		









自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	ポートフォリオ計画ワークスペース	戦略的計画ワークスペース
ロードマップ:タイムライン		
ロードマップ:カンバン		
シナリオ計画		
採点		







自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	ポートフォリオ計画ワークスペース	戦略的計画ワークスペース
目標		
製品フィードバック		
キャパシティ計画立案		
財務管理		
フリーフォームロードマップの作成と共有	プロジェクト、デマンド、プログラムテーブル	任意の ServiceNow® プラットフォームエンティティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	ポートフォリオ計画ワークスペース	戦略的計画ワークスペース
Enterprise Agile Planning		
ダッシュボード		
での目標と戦略の監視 ServiceNow AI コントロールタワー		

自動翻訳

戦略的計画のレンズ

レンズは計画立案の視点を表します。視点は、組織内のさまざまなレベルの計画立案マネージャーによって異なります。レンズを使用すると、カスタマイズされたポートフォリオ計画を作成し、高レベルのイニシアチブと目標で作業の優先順位付けと調整を行うことができます。

レンズ概要

戦略的計画 のレンズは、作業の計画と資金調達を行うための視点を示します。レンズを選択して、計画立案の視点を選択し、作業の優先順位付けと調整を行います。たとえば、部門リーダーであれば、 組織レンズを選択できます。製品マネージャーは、製品レンズを選択できます。


レンズ構造

戦略的計画 内の各レンズは、エンティティで構成される構造で構成されます。レンズのエンティティは、会社のさまざまなレベルの計画立案を表します。こうしたいずれかのレベルでポートフォリオ計画をビルドできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レンズの下部エンティティに関連付けられた計画立案アイテムタイプは、このようなポートフォリオ計画を使用して計画できる作業タイプを表します。

レンズ構造の例

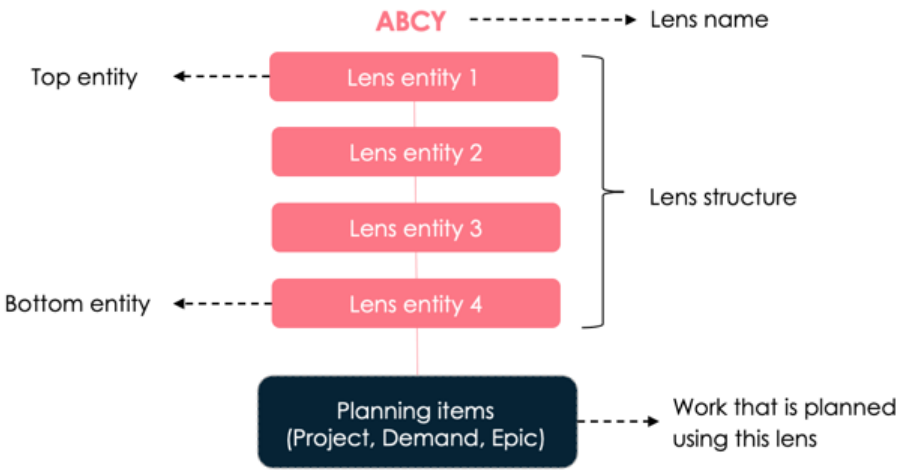


たとえば、組織レンズには、エンティティとして [会社]、[事業部門]、および [部門] があります。サポート部門の部門長は、部門レベルでポートフォリオ計画を作成できます。次に、部門にアサインされた作業に優先順位を付け、優先順位付けされた作業のロードマップを計画できます。この作業は、エピック、プロジェクト、デマンド、またはその他のカスタムタイプの形式にすることができます。

事前定義されたいずれかのレンズを使用して開始するか、計画のニーズに合わせて、最大 6 つのレベルでカスタムレンズ構造をビルドします。

事前定義されたレンズとその構造

戦略的計画 には、ポートフォリオ計画のビルドを開始するための 9 つの定義済みのレンズ (プロジェクトポートフォリオ、プロジェクトプログラム、組織、戦略的投資、製品、デジタル製品、バリューストリーム、目標、ビジネスケイパビリティ) が用意されています。計画マネージャーは、会社でのロールに基づいてこれらのレンズを使用できます。

事前定義されたレンズの構造

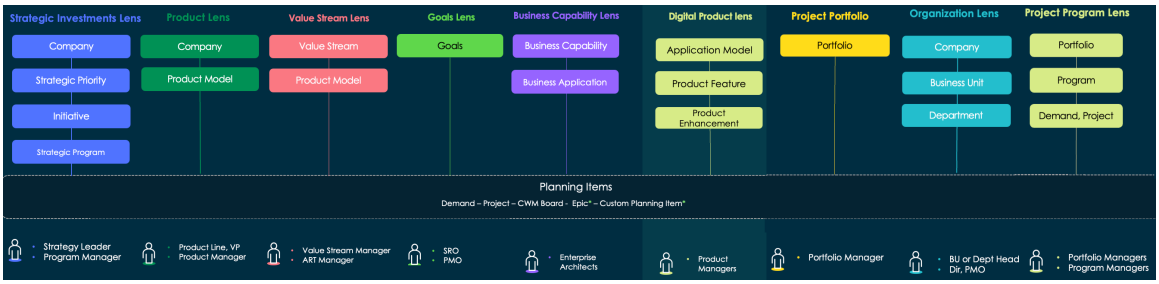

レンズ	計画立案レベル (レンズのエンティティ)	計画マネージャー	説明
組織	• 会社 • 事業部門 • 部門	• 部門長 • 事業部門長	組織内の作業の移動を計画および追跡し、作業がさまざまなレベルに合わせてどのように調整されるかをビジュアル化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レンズ	計画立案レベル (レンズのエンティティ)	計画マネージャー	説明
Product	• 会社 • 製品モデル	• プロダクトリーダー • プロダクトマネージャー	製品レンズから作業を計画、資金調達、および優先順位付けします。
デジタル製品	• アプリケーションモデル • 製品の特徴 • 製品の機能拡張	• プロダクトリーダー • プロダクトマネージャー	デジタル製品の作業を計画、優先順位付け、ロードマップを作成します。 ServiceNow® デジタルプロダクトリリースワークスペースがインストールされている場合、製品の機能拡張に関連付けられた計画立案アイテムが、デジタルプロダクトリリースワークスペースの [リリース適用範囲] ページの [計画立案アイテム] タブに表示されます。詳細については、「リリースのスコープ」を参照してください。
戦略的投資	• 会社 • 戦略的優先事項 • イニシアチブ • 戦略的プログラム	• 戦略リーダー • EPMO	作業者にかかわらず、戦略的イニシアチブまたは戦略的プログラムを計画、管理、および監督します。
目標	目標	• ポートフォリオマネージャー • 事業部門長	• 定義された目標のためのポートフォリオ計画を作成、共有、および共同作業します。 • 目標のターゲットを設定し、進捗状況を追跡します。 • 目標を達成するために必要な作業を調整し、優先順位を付け、ロードマップを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レンズ	計画立案レベル (レンズのエンティティ)	計画マネージャー	説明
バリューストリーム	• 製品モデル • バリューストリーム	• バリューストリームマネージャー • ART マネージャー	バリューストリームの作業を計画、資金調達、および優先順位付けします。
プロジェクトポートフォリオ	ポートフォリオ	• プロダクトマネージャー • ポートフォリオマネージャー	自社のプロジェクトポートフォリオの作業を計画、資金調達、および優先順位付けします。
ビジネスケイパビリティ	• ビジネスケイパビリティ • ビジネスアプリケーション	エンタープライズアーキテクト	ビジネスケイパビリティまたはビジネスアプリケーションに基づいて作業を計画、優先順位付け、およびロードマップを作成します。 このレンズは、次の場合にのみ使用できます。 ServiceNow® エンタープライズアーキテクチャワークスペース がインストール済みである。
プロジェクトプログラム	• ポートフォリオ • Program (プログラム)	• ポートフォリオマネージャー • プログラムマネージャー	プログラムの作業を計画して優先順位付けし、ロードマップを作成します。

- アドミンの場合は、計画立案マネージャーの要件に基づいて、このような事前定義されたレンズの構造を変更するか、まったく新しいレンズを構成することができます。詳細については、「戦略的計画 でのレンズの構成」を参照してください。
- 計画マネージャーの場合は、ポートフォリオ計画について確認し、ビジネス戦略に沿って作業の調整を開始します。「戦略的計画 でのポートフォリオ計画」を参照してください。

戦略的計画 でのポートフォリオ計画

カスタマイズされたポートフォリオ計画は、適切な時期に会社の目標に沿って適切な作業のロードマップを作成するのに役立ちます。ポートフォリオ計画の計画に関するインサイトを使用して、共有戦略を促進し、エンタープライズ計画を改善します。

ポートフォリオ計画の概要

ポートフォリオ計画は、計画マネージャーごとのカスタム計画であり、レンズを使用してビルドされます。これにより、計画立案マネージャーは目標を定義し、このような目標のターゲットを設定し、作業のロードマップの作成を行い、目標と計画された作業の整合性を確保できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略リーダーは、戦略的投資レンズを使用してイニシアチブの視点で計画し、部門長は、組織レンズを使用して部門の視点で計画します。

計画マネージャーは、さまざまなレンズを使用して複数のポートフォリオ計画を作成できます。さまざまな視点から作業の計画と進捗状況をビジュアル化し、ステークホルダーと共有します。

ポートフォリオ計画を使用すると、次のことができます。

- 目的の視点 (レンズ) で集中的に作業を計画できるようにします。
- 適切な作業に優先順位を付け、ビジネス戦略との整合性を向上させます。
- 実行チームを適切な作業に配置するために費やす時間を短縮します。

ポートフォリオ計画を使用した上位レベルの計画

戦略的計画 では、イニシアチブなどの戦略的アイテムのポートフォリオ計画をビルドすることで、組織の作業のロードマップを上位レベルで作成できます。上位レベルの計画立案アイテムは、通常、会社の複数の事業部門、部門、またはポートフォリオにまたがります。こうした戦略的作業アイテムは、会社の優先事項をさらに細分化するのに役立ちます。

- イニシアチブ：長期的な目標を達成するために使用されます。イニシアチブは、組織に持続可能な競争上の優位性をもたらすように設計されています。多くの場合、複数の部門間や事業部門間の調整とコラボレーションを必要とする大規模な作業が伴います。
- 戦略的プログラム：イニシアチブの特定のマイルストーンと成果を達成するために使用されます。
- プログラム (pm_program)：プログラムのマイルストーンと成果を達成するために使用されます。
- 製品の機能拡張:デジタル製品の機能拡張を計画して達成するために使用されます。

階層ビューを使用して、作業パイプラインをレビューし、 戦略的アイテムに関連付けられた下位レベルの計画立案アイテムにドリルダウンできます。

たとえば、EPMO として、各イニシアチブに関連付けられたエピックを表示できます 。また、これらのイニシアチブが整合している目標を表示および管理することもできます。


デフォルトでは、戦略的投資レンズからイニシアチブまたは戦略的プログラムを使用して、またはプロジェクトプログラムレンズからプログラム (pm_program) を使用して、上位レベルのポートフォリオ計画を作成できます。「上位レベルのポートフォリオ計画の作成」を参照してください。

イニシアチブ、戦略的プログラム、プログラム (pm_program) 以外の計画立案アイテムに対して上位レベルの計画立案を有効にする必要がある場合は、ServiceNow アドミンと協力して追加の構成を完了してください。「戦略的計画 での上位レベルの計画立案の構成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

以下は、会社のいくつかの戦略的プログラムと、それらに沿った下位レベルの作業 (プロジェクトとデマンド) を示すサンプルポートフォリオ計画です。

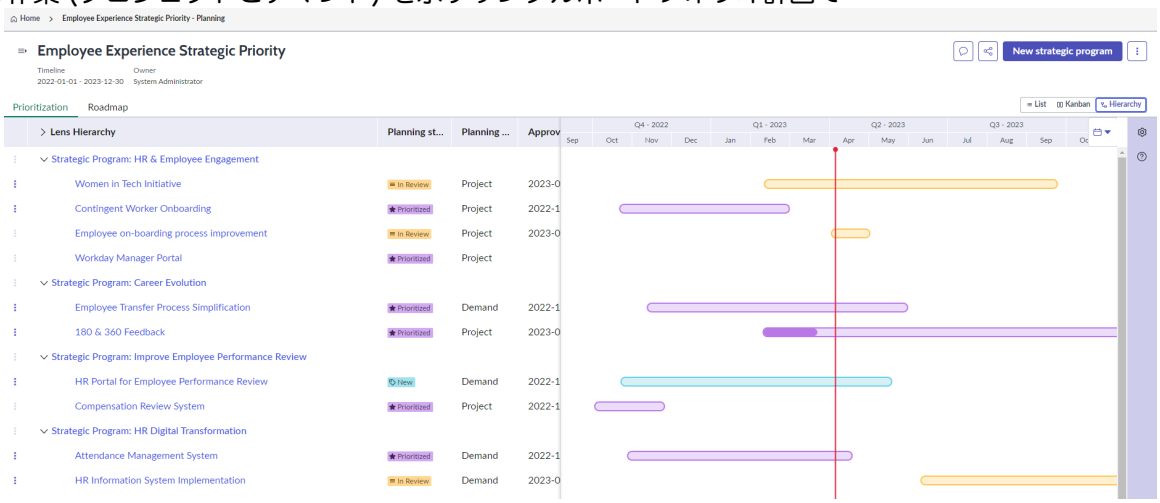

アドミニストレーターと協力して、必要なレンズのセットアップを確実に行ってください。「戦略的計画 でのレンズの構成」を参照してください。

ポートフォリオ計画の作成を開始して、作業をビジネス戦略に合わせて調整します。「戦略的計画 ワークスペースでのポートフォリオ計画の管理」を参照してください。

Strategic Planning での採点

採点により、定義された定量的メトリクスに基づいて、エピック、プロジェクト、デマンド、イニシアチブ、戦略的プログラム、その他の計画立案アイテムなどのアイテムに優先順位を付けることができます。

ポートフォリオ計画の採点フレームワークを選択する前に、使用できる事前定義されたフレームワークについてまず理解しておくと役立ちます。その後、希望する採点パラメーターに基づいて、事前定義された採点フレームワークのいずれかを使用するのか、カスタム採点フレームワークを作成するのかを選択できます。

以下は、ポートフォリオ計画に使用できる事前定義された 3 つの採点フレームワークです。

- RICE
- 価値と工数
- WSJF

RICE

各基準を採点することによりアイテムに優先順位付けして、評価するためのフレームワークです。これは、チームが 4 つの主要な基準 (リーチ、影響、信頼性、工数) に基づいてアイテムを評価および比較するのに役立ちます。

パラメーター：

- リーチ：プロジェクトまたは機能の影響を受けるユーザーまたはユーザーの数を示します。アイテムが到達できる潜在的な対象者を推定することは不可欠です。たとえば、新しい機能が少数のユーザーによって使用される可能性が高い場合、ユーザーベースの大部分によって使用される機能と比較して、リーチスコアが低くなる可能性が高くなります。

  この値を入力するには、「一定期間内の既存/ターゲットユーザーの数は？」という質問に回答します。

- 影響度：アイテムがユーザーまたは組織にもたらす潜在的な影響または利益を測定します。この基準は、プロジェクトが提供できる肯定的な結果と価値に焦点を当てています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この値を入力するには、「個々のユーザーにどの程度影響するか？」という質問に回答します。

- 信頼性：信頼性はプロジェクトが意図した結果を達成する確実性のレベルを測定します。この基準は、チームがリーチと影響度の推定値にどの程度自信を持っているかを評価するものです。信頼性の高いアイテムは通常、確実なデータ、ユーザーフィードバック、または以前の経験に基づいているため、期待される結果が得られる可能性が高くなります。

  この値を入力するには、「影響度とリーチスコアについてどの程度自信があるか？」という質問に回答します。

- 工数 - 製品、設計、開発の工数に基づく、人月の期間。この基準は、チームが実行について相対的な難易度を理解するのに役立ちます。工数スコアが高いアイテムには、より多くの開発時間、財務投資、または既存のシステムの大幅な変更が必要になる場合があります。

  この値を入力するには、「このアイテムに必要な時間は月にどれくらいか？」という質問に回答します。

RICE スコアは次の式で計算されます。

```
RICE Score = (Reach x Impact x Confidence)/Effort
```

価値と工数

予定作業量とユーザー/顧客にもたらす価値に基づいて、計画立案アイテムに優先順位を付けるフレームワーク。価値と工数メソッドは、バックログアイテムに優先順位を付ける最も簡単な方法です。

パラメーター：

- 価値 - 潜在的な収益、ユーザーのメリット、ビジネスインパクト、および戦略的目標に基づくアイテムの有意性。

  この値を入力するには、「これは目標にどのように貢献しますか？」という質問に回答します。

- 工数 - 製品、設計、開発の見積もりなど、製品をビルドするための期間。

  この値を入力するには、「タスクを提供する難易度はどれくらいか？」という質問に回答します。

価値と工数スコアは次の式で計算されます。

```
Value vs. Effort Score = Value/Effort
```

WSJF

最大のメリットを得るためにアイテムを順序付けするためのフレームワークです。特に、頻繁に優先順位を変更することにより経済的価値が向上する場合に役立ちます。このスコアは、相対的な遅延コストと相対的なジョブ期間、ビジネス価値、時間の重要度、リスク削減、およびジョブサイズに基づいています。

パラメーター：

- ユーザーのビジネス価値 - ユーザー/顧客にとっての相対的な重要性と、収益への潜在的な影響度。

  この値を入力するには、「このアイテムはビジネスにとってどの程度重要か？」という質問に回答します。

- 時間の重要度 - ユーザーのビジネス価値が時間の経過とともにどのように低下するかを特定し、アイテム/機能をリリースする緊急性を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この値を入力するには、「アイテムの価値は時間の経過とともにどのように低下するか？」という質問に回答します。

- リスク削減 - 技術的およびビジネス上のリスクを軽減し、新しい機会を可能にすることができるアイテムを特定します。

  この値を入力するには、「このアイテムはビジネスにとって他にどのような役割を果たすか？」という質問に回答します。

- ジョブのサイズ - タスクを完了するための相対期間。

  この値を入力するには、「タスクはいつ完了するか？」という質問に回答します。

WSJF スコアは次の式で計算されます。

```
WSJF Score = (User Business value + Time criticality + Risk reduction)/Job Size
```

Strategic Planning で計画立案アイテムの採点を開始する方法については、「戦略的計画ワークスペースでの計画立案アイテムの採点」を参照してください。

関連情報

Strategic Planning のカスタム採点フレームワーク

戦略的計画 でのゴール管理

組織計画を達成してビジネスの成果を促進するために、ポートフォリオ計画の目標を作成し、そのターゲットを設定して、それらの目標とターゲットの進捗状況を評価します。

目標管理の主要コンポーネント：

- 目標：戦略計画に基づいて達成したい目標。
- ターゲット：目標の進捗状況を追跡して測定するための目標のターゲット
- ターゲットソース：ターゲットの実績値を自動更新するためのターゲットの構成。

目標

目標とは、組織が組織計画を達成するために設定する目標を指します。目標は本来、定性的なものが一般的です。目標は意欲的なものでなければならず、チームの意欲をかきたて、やりがいを与えることが期待されます。目標の例を次に示します。

- 2022 年末までに再生可能エネルギーを使用。
- 職場の多様性を 50% 向上させる。

目標にサブ目標を設定することもできます。作業 (計画立案アイテム) と目標を結びつければ、目標達成の責任者を追跡することができます。

計画立案アイテム (デマンド、プロジェクト、およびエピック)、および戦略アイテム (プログラムとイニシアチブ) を目標と関連付けて、目標を達成するために行われている作業をキャプチャできます。

ターゲット

ターゲットは、目標を測定するのに役立ちます。たとえば、職場の多様性を 50 % 増やすという目標を達成するために、2022 年の第 1 四半期までに 30 % 多様な従業員を雇用することをターゲットにできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ターゲットの測定単位を定義することで、ターゲットを定量的または定性的に設定できます。定量的ターゲットは、数値ベース、カウント可能、測定可能です。定性的ターゲットは、解釈ベースで説明的であり、通常は [はい] または [いいえ] タイプです。

ターゲットは短い期間 (例：四半期) に細分化できるため、ターゲットを四半期ごとに設定したり、特定のブレークダウンターゲットを絞り込むことができます。ターゲットブレークダウンは、ターゲットに設定されたブレークダウン間隔に基づいて作成されます。ターゲットブレークダウン機能の仕組みついては、「戦略的計画 でのターゲットブレークダウン」を参照してください。

定性的ターゲット

定性的ターゲットは、通常は測定できませんが、ターゲットが達成されたかどうか追跡できます。定性的ターゲットに使用できる測定単位は「はい/いいえ」です。必要に応じて、定性的ターゲットの測定単位 (使用可能な選択セット) を定義したり、目標に合わせて定性的ターゲットを設定したりすることもできます。

たとえば、2023 年第 2 四半期のハッカソン実行のターゲットを達成するには、「はい/いいえ」の測定単位を使用して、2023 年第 2 四半期のハッカソン実行としてターゲットを設定できます。ターゲットのベースまたはターゲット値は、それぞれ「いいえ」と「はい」にすることができます。ハッカソンイベントでターゲットが成功した場合は、ターゲット値を「はい」に更新できます。

ターゲットソース

ターゲットソースは、ターゲットの実績値を自動更新するターゲットの構成であり、ターゲットとその目標の進捗状況が自動的に更新されます。ServiceNow AI Platform　に存在する任意のテーブルまたはテーブルの組み合わせ (利益計画、コスト計画、サーベイ、インシデント、PA インジケーターなど) をターゲットソースとして構成できます。

ターゲットの実績値を自動化するために、次のターゲットソースタイプがサポートされています。

- PA インジケーター:PA インジケーターから必要なデータを取得して、ターゲットフォームの [実績終了日] フィールドを更新します。
- アセスメント/サーベイ:アセスメントメトリクスタイプおよびアセスメントメトリクスカテゴリレコードから必要なデータを取得して、ターゲットフォーム の [実績終了日] フィールドを更新します。
- カスタムスクリプト：カスタムスクリプトは、設定されている任意の ServiceNow AI Platform テーブルから必要なデータをフェッチします。カスタムスクリプトオプションを使用すると、ServiceNow AI Platform に存在する任意のテーブルまたはテーブルの組み合わせをターゲットソースとして設定できます。

利益計画の事前定義されたターゲット自動化スクリプト:事前定義されたデフォルトスクリプトは、関連する作業アイテムの金銭的または金銭以外の利益計画の [実績利益] フィールドまたは [金銭以外の実績利益] フィールドから値を取得することによって、ターゲットフォームの [実績終了日] フィールドを更新するターゲットソースです。


コンテキスト変数

コンテキスト変数は、ターゲットソースの追加構成です。コンテキスト変数は、ターゲットフォームで必要なデータをフェッチし、ターゲットフォームの [実績終了日] フィールドを更新するために使用できる情報を提供します。コンテキスト変数は、ターゲットソースタイプ [アセスメント/サーベイ] および [PA インジケーター] に必要です。ターゲットソースの作成中に SPM のゴールフレームワーク スコープが選択されている場合、(アセスメント/サーベイおよび PA インジケータータイプの) ターゲットソースに対してコンテキスト変数が自動的に作成されます。コンテキスト変数の詳細については、「ターゲットソースのコンテキスト変数」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

目標ビューの例

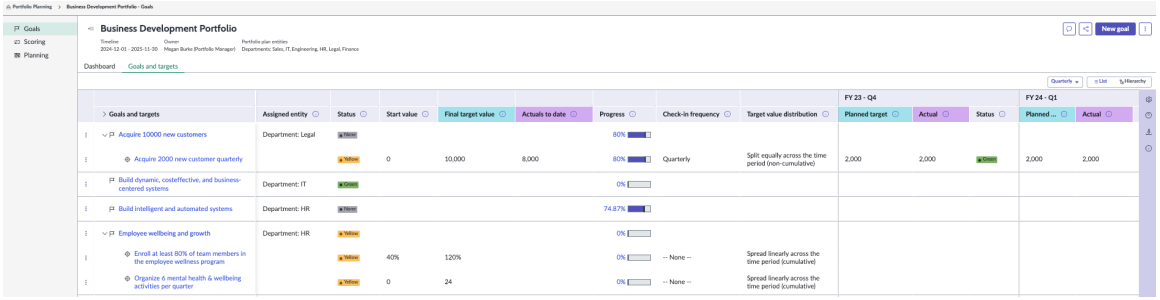

戦略的計画 でのゴール管理ワークフロー

戦略的計画 Workspace の目標ビューを使用すると、次のアクティビティを実行できます。

- 会社、事業部門、部門などのエンティティ の目標を作成します。詳細については、「戦略的計画での目標の作成」を参照してください。
- ターゲットを設定し、ターゲットの実績値を自動化します。詳細については、「戦略的計画 での目標のターゲットの作成」を参照してください。

  注:
  ターゲットの実績値の自動化はオプションです。ターゲットの実績値を自動化しない場合でも、ターゲットの実績値を手動で更新できます。

- 計画立案アイテムを目標に関連付けます。詳細については、「計画立案アイテムの目標またはターゲットへの関連付け」を参照してください。
- 計画立案アイテムの主要目標を関連付けまたは更新します。詳細については、「計画立案アイテムの主要目標またはターゲットの関連付けまたは更新」を参照してください。

戦略的計画 で目標を定義して管理する方法の詳細については、「戦略的計画ワークスペース での目標管理」を参照してください。

戦略的計画 での優先順位付け

戦略的計画 の一元化されたワークスペースを使用して、ポートフォリオに関連する作業に優先順位を付けます。レビューして投資する適切な作業を決定します。

ポートフォリオ計画のロードマップをスケジュール設定する前に、既存の作業負荷と今後の作業負荷をあらかじめ把握しておくとよいでしょう。すべての作業アイテムを 1 か所にリストアップしておくと、作業パイプライン全体を把握しやすくなります。統合ビュー により、バックログの調整をスムーズに行えるため、優先順位付けが必要なアイテムを簡単に確認して決定できます。


ワークスペースの [優先順位付け] タブを使用して、ポートフォリオ計画のすべての新規および既存の作業をレビューし、そのバックログを表すことができます。優先順位付けでは、作業負荷を効率的に確認できるように、関連目標、計画コスト、計画利益などの各作業アイテムに関する情報が提供されています。これらのデータポイントを使用すると、アイテムを優先順に並べて、どのアイテムを他のアイテムよりも優先するかを決定できるようになります。[優先順位付け] タブには、バックログを確認および管理するための次のビューがあります。

リストビュー

計画立案アイテムはグリッド形式でリストされます。ドラッグ機能を使用して、アイテムをスタックランクし、目的の属性でグループ化して、優先度に基づいてソートすることができます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

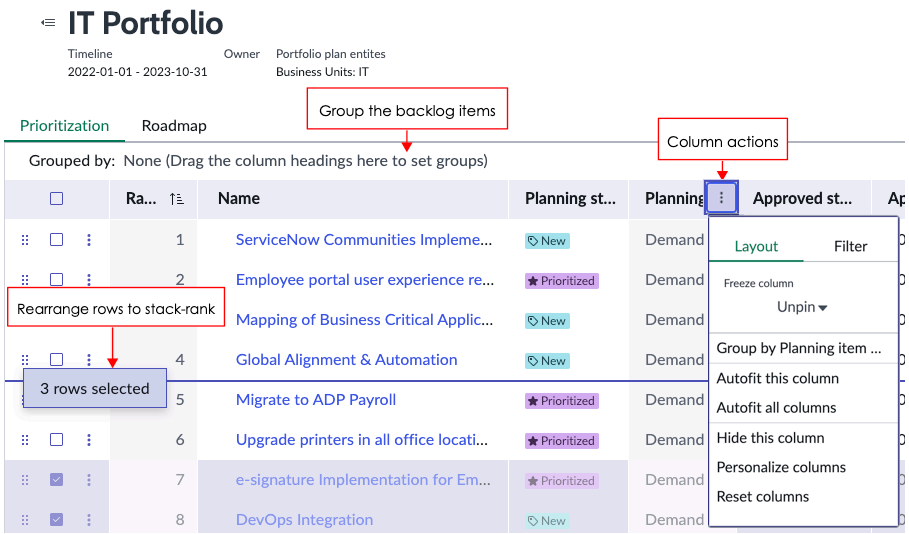

カンバンビュー

計画立案アイテムはカンバンボードに表示されます。ポートフォリオマネージャーは、垂直レーンと水平レーンのアイテムを可視化して調整できます。カスタマイズ設定を使用すると、垂直レーンと水平レーンを表示する属性を変更できます。 たとえば、垂直レーンと水平レーンの値を変更するだけで、計画ステータスと優先度別にグループ化したレコード表示できます。ドロップダウンリストから [なし] を選択して、水平レーンの値を持たないようにすることもできます。カードに表示されるデータは、サイドパネルを使用して変更できます。この機能を使用すると、より効果的に優先順位を付け、必要な詳細のみをカードに表示できます。また、カードをクリックして詳細が表示されたサイドパネルを開き、同じページで計画立案アイテムの詳細を編集します。

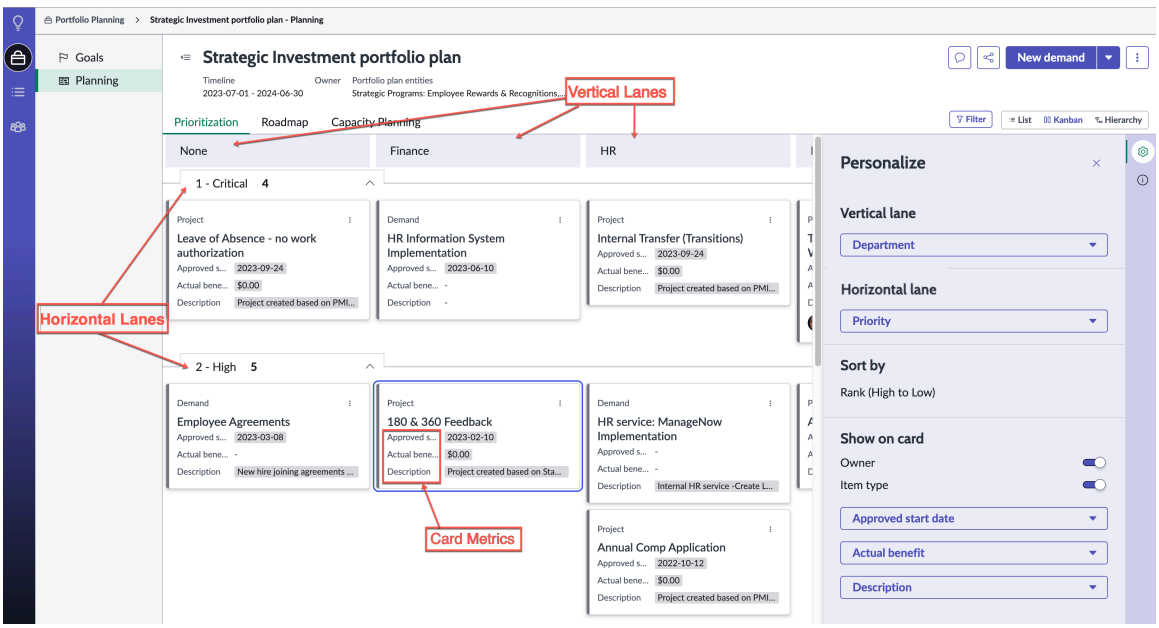


階層ビュー

このビューには、現在のポートフォリオ計画の作業と他のレンズのエンティティとの調整がどのように行われるかが表示されます。レンズスイッチャーを使用すると、作業の調整を表示する視点を変更できます。ビューのタイムラインセクションを使用して、計画立案アイテム間のスケジュールと依存関係を可視化して、効果的に作業の優先順位を付けます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

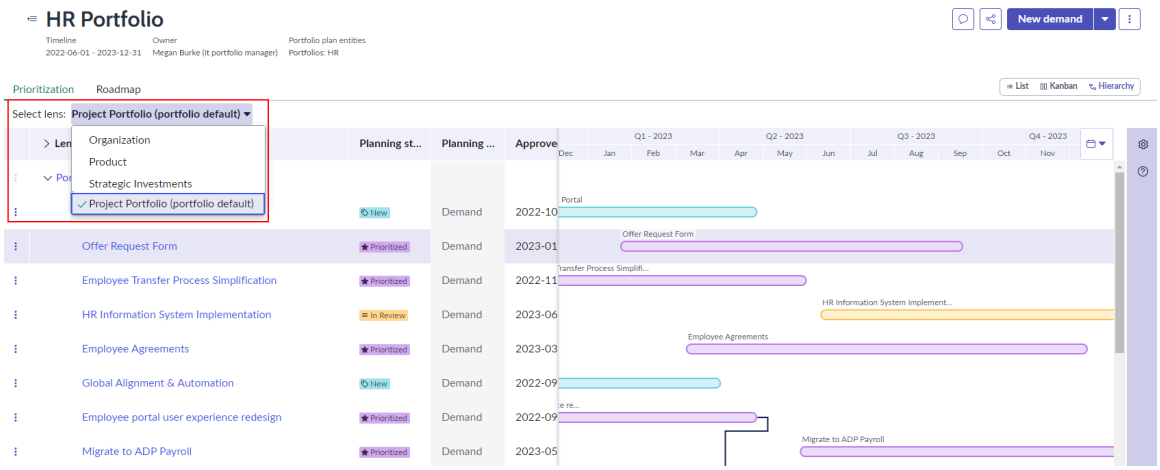

戦略的計画 で作業パイプラインの管理を開始するには、「戦略的計画ワークスペースでのポートフォリオ計画作業の優先順位付け」を参照してください。

戦略的計画 のロードマップ

戦略的計画 Workspace のビジュアルロードマップを使用して、会社の作業を戦略的に計画します。

組織が成長し、優先順位が変化していくにつれ、既存の計画を変更したり、新たな計画を簡単に作成したりできる柔軟性が重要になります。ロードマップを使用して、現在と今後の計画のレイアウトを作成しながら、それらを事業達成目標に合わせることができます。これらの視覚的な計画を組織全体の他のステークホルダーと共有し、有意義な会話を促進し、共通の理解を検証します。

各ロードマップは上位レベルの作業ブロックであり、エンタープライズプロジェクトマネージャー、ポートフォリオマネージャー、プロジェクトマネージャーなどのさまざまな計画立案ペルソナによって優先順位が付けられます。また、ロードマップは、開発中にデリバリーチームをガイドしながら、ステークホルダーにインサイトを提供します。

操作できるロードマップのタイプは次のとおりです。

- ポートフォリオ計画ロードマップ
- フリーフォームロードマップ

これらのロードマップで使用可能な機能は次のとおりです。

- ハイブリッドロードマップ
- ロードマップレベルのマイルストーン
- 計画立案アイテムレベルのマイルストーン
- 計画立案アイテムの依存関係
- トラッキングモード

> **注:**
> ロードマップは 戦略的計画 でデフォルトで利用可能です 。Roadmap Planning (sn_roadmap_plng) は、独立したアプリケーションとしてインストールできなくなりました。

ポートフォリオ計画ロードマップ


レンズを使用して柔軟なポートフォリオ計画を作成することで、ポートフォリオの作業の優先順位付けとロードマップを行うことができます。これらのポートフォリオロードマップを使用して、組織のさまざまな視点の作業を個別に計画および追跡し、それらを会社の計画の概要に接続します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポートフォリオ計画の作成 で開始します。ロードマップは、タイムラインビューとカンバンビューの両方で表示および編集できます。

ロードマップタイムラインビュー

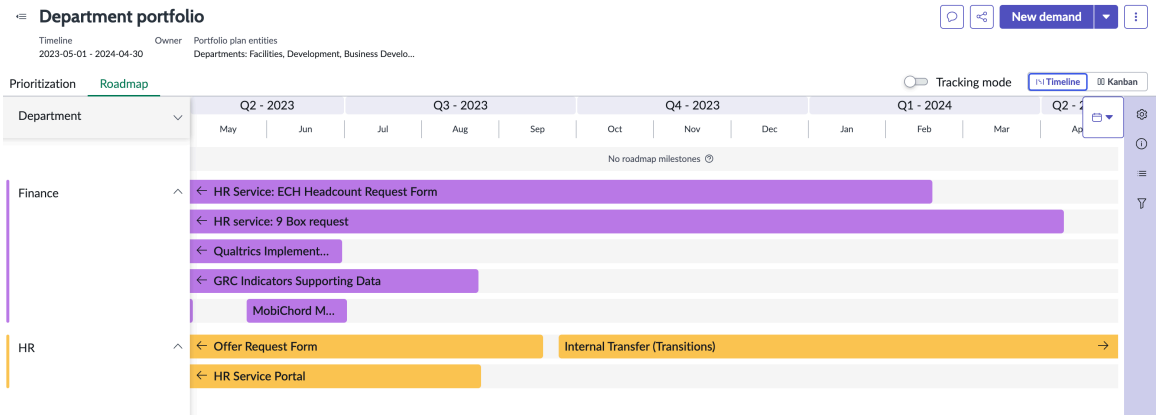

ロードマップカンバンビュー

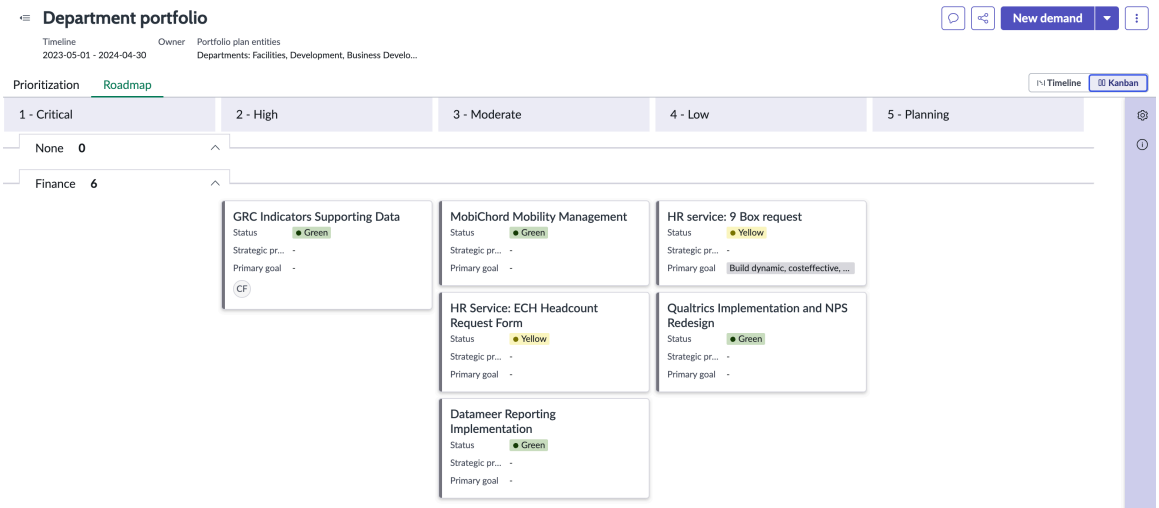

フリーフォームロードマップ

自由形式のロードマップを使用すると、複数のポートフォリオにわたる作業など、会社のさまざまな部門からの作業を柔軟に計画および追跡できます。

フィルター条件を使用して、ロードマップに必要な作業アイテムの種類を定義できます。部門のプロジェクト専用のロードマップが必要な場合は、プロジェクトのロードマップを定義して現在のプロジェクトの進捗状況の追跡を開始し、新しいプロジェクトの計画を作成します。

フリーフォームロードマップは、タイムラインビューとカンバンビューの両方で表示および編集できます。

「フリーフォームロードマップを作成」を参照してください。

ハイブリッドロードマップ

戦略的計画 では、ポートフォリオロードマップとフリーフォームロードマップの両方を使用して、ハイブリッドロードマップをビルドできます。たとえば、プロジェクト、デマンド、およびエピックを組み合わせたものを単一のビューに含めることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロードマップのマイルストーン

ロードマップまたはロードマップ上の各計画立案アイテムのマイルストーンを作成できます。

ロードマップレベルまたはポートフォリオレベルのマイルストーン

ロードマップレベルで作成されたマイルストーンは、そのロードマップのタイムライン中に開始日または主要なイベントを追跡するのに役立ちます。ロードマップマイルストーンの作成方法については、「ロードマップのマイルストーンの追加」を参照してください。

計画立案アイテムのマイルストーン

アイテムレベルで作成されたマイルストーンを使用すると、戦略的な成果にさらに重点を置くことができます。こうしたマイルストーンは、期限や他の重要な日付を追跡するのに役立ちます。プロジェクト、デマンド、エピックなどのすべての計画立案アイテムのマイルストーンにアクセスできます。

ロードマップから、プロジェクトを除くすべてのタイプの計画立案アイテムに対してマイルストーンを作成および更新できます。プロジェクトマイルストーンを変更すると、関連するプロジェクト計画に影響する恐れがあるため、プロジェクトマイルストーンはロードマップ上では読み取り専用になります。そのため、プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) でプロジェクトワークスペースを使用してプロジェクトマイルストーンを作成または更新することをお勧めします。

ロードマップでアイテムレベルマイルストーンを作成する方法については、「ロードマップアイテムのマイルストーンを追加」を参照してください。

計画立案アイテムの依存関係

計画立案の際は、計画立案アイテムがそれぞれどのように関係しているのかを把握することが重要です。これが把握できていないと、タイムクリティカルなプロジェクトやデマンドの優先順位付けを誤ってしまう恐れがあります。また、情報が不足すると、適切な作業を適切な期間にスケジュール設定できなくなる可能性もあります。

ロードマップにおける依存関係を把握することで、こうした計画立案アイテム間の関係を視覚化することができ、それに応じてスケジュールを調整することができるようになります。

戦略的計画 では、依存関係をシンプル化したりハイブリッド化したりすることができます。たとえば、2 つのプロジェクト間、またはプロジェクトとエピック間の依存関係を確立することができます。また、計画立案アイテムは、同じポートフォリオ計画内のアイテムまたはまだ計画されていないアイテムに依存する可能性があります。

依存関係の行は、まとめて優先順位付けする必要があるアイテムを簡単に識別するのに役立ちます。このように計画立案アイテム間の関係性を簡単に識別できるようになることで、計画立案プロセスにおけるコラボレーションが向上し、意思決定が強化されます。

依存関係の作成や管理については、「ロードマップアイテムの依存関係を追加」を参照してください。

ロードマップの追跡モード

ロードマップ上の各アイテムのステータス、進捗状況、およびメトリクスを追跡します。計画立案アイテムバーのステータスインジケーターや完了率スコアを使用すると、情報に基づいた意思決定を事前に行い、作業の進捗状況をステークホルダーに簡単に伝えることができるようになります。

「ロードマップアイテムの進捗状況を追跡する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

作業とビジネスゴールの整合性

作成してロードマップにスケジューリングする各計画立案アイテムは、高レベルのビジネスゴールに関連付けることができます。戦略的計画 を使用すると、作業がこれらのビジネスゴールにどのように沿っているかをロードマップビューから直接ビジュアル化できます。

ロードマップでは、計画立案アイテムを [戦略的優先事項] フィールドと [主要目標] フィールドでグループ化して、作業を目標にマッピングすることができます。

他の **ServiceNow®** アプリケーションとうまく併用する

ServiceNow® デジタルポートフォリオ管理 (DPM) を 戦略的計画 と統合することで、DPM マネージャーがロードマップ計画立案にアクセスできるようになります。この統合により、次のことが可能になります。

- 包括的なロードマップでサービスとパフォーマンスレベルを監視して、ポートフォリオのパフォーマンスを最適化する。
- 情報に基づいた予算決定を行い、バックログの優先順位付けとビジネスアプリケーションのロードマップの管理により、成果を共有する。

詳細については、「デジタルポートフォリオ計画の詳細」を参照してください。

関連情報

戦略的計画ワークスペース の計画ロードマップ

ゴールフレームワーク および SPM のゴールフレームワーク

戦略的計画 のシナリオ計画

戦略的シナリオを作成して評価し、さまざまな計画立案アプローチを検討します。組織の目標と戦略的優先事項に沿った最適なシナリオを承認します。

シナリオ計画の概要

戦略的計画 のシナリオ計画を使用すると、組織は、戦略的目標および意図するビジネス成果に沿った最適な戦略的シナリオを作成、評価、および承認できます。このプロセスは、さまざまなアプローチを可視化し、その影響を評価し、本稼働計画を実装する前に情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。シナリオ計画を使用することで、組織は潜在的な課題を予測できます。 シナリオ計画の概要


シナリオとは

戦略的計画 のシナリオは、本稼働計画に影響を与えることなく戦略的アプローチを探索できる計画のシミュレーションバージョンです。アイテムに優先順位を付け、タイムラインを調整し、各アプローチの潜在的な影響を評価するための安全な環境を提供します。

計画と比較すると、シナリオにはさらに次のものがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

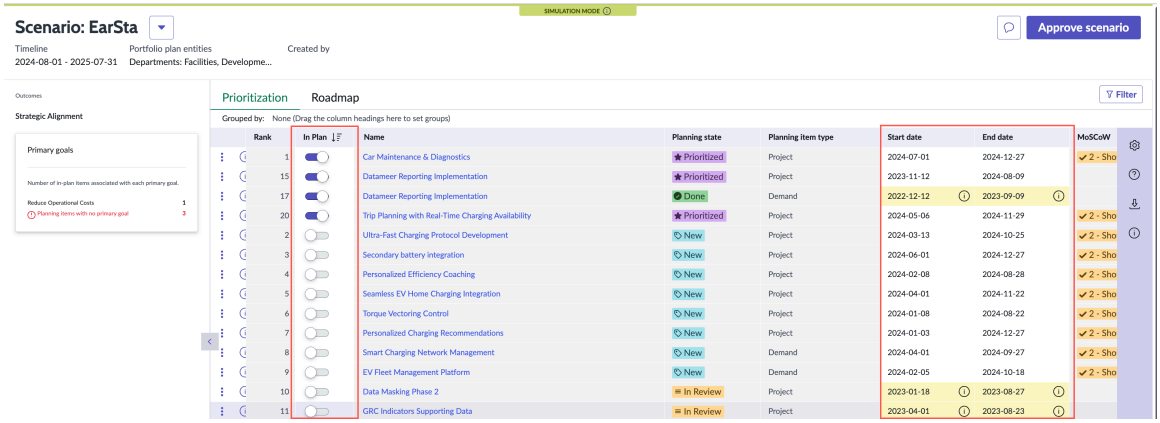

- [計画中 **(In Plan)**] トグル：[計画中 **(In Plan)**] トグルを使用すると、作成しているシナリオの計画立案アイテムに優先順位を付けたり、優先順位を下げたりすることができます。デフォルトでは、シナリオを作成すると、次のすべてのフィールド値を持つ計画立案アイテムに対して [計画中 **(In Plan)**] トグルがオンになります。
  - [計画] ステータスが [優先順位付け] または [完了]
  - 開始日と終了日がポートフォリオ計画日の範囲。
- 日付フィールド：シナリオの [開始日] フィールドと [終了日] フィールドは、計画立案アイテムの計画または実績の開始日と終了日に基づいて自動的に入力されます。これらの日付は、シナリオ計画プロセス中に更新できます。シナリオが承認されると、更新日が計画立案アイテムの承認日として記録されます。更新日が許容範囲から外れている場合は、黄色でハイライト表示されます。

ポートフォリオ計画の詳細については、「戦略的計画 でのポートフォリオ計画」を参照してください。

シナリオを並べて比較することで、各シナリオ間の目標の整合性とトレードオフの違いを評価できます。この比較分析は、戦略的目標に最適なシナリオを特定するのに役立ちます。シナリオの比較の詳細については、「シナリオを比較」を参照してください。


戦略的計画 のシナリオ計画ワークフロー


戦略的計画 のシナリオ計画機能を使用すると、次のアクティビティを実行できます。


- シナリオを作成して、さまざまな戦略的アプローチとビジネス成果を調査します。詳細については、「シナリオの作成」を参照してください。
- 複数のシナリオを並べて調整して比較し、目標の整合性、トレードオフ、および財務上のメリットの違いを評価します。詳細については、「シナリオを比較」を参照してください。
- 組織の目標に沿った最適なシナリオを承認します。詳細については、「シナリオの承認」を参照してください。
- 計画サイクルごとにターゲットポートフォリオ予算を設定します。計画サイクルは、会計期間、四半期、年次、またはポートフォリオタイムラインに使用できます。
- 計画内アイテムのターゲット予算と予算案を評価し、優先順位付けされたアイテムによる金銭的利益を確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

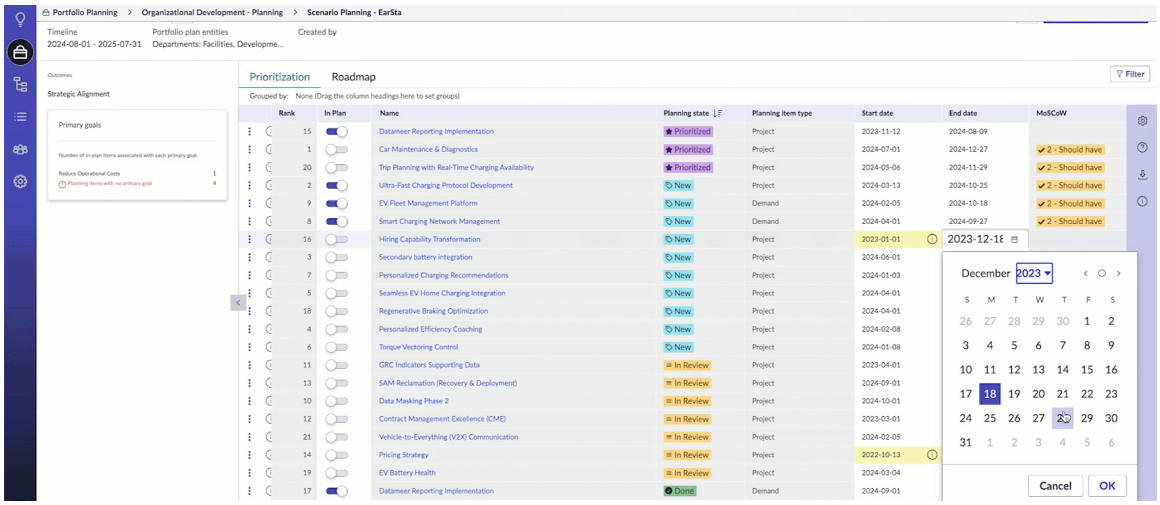

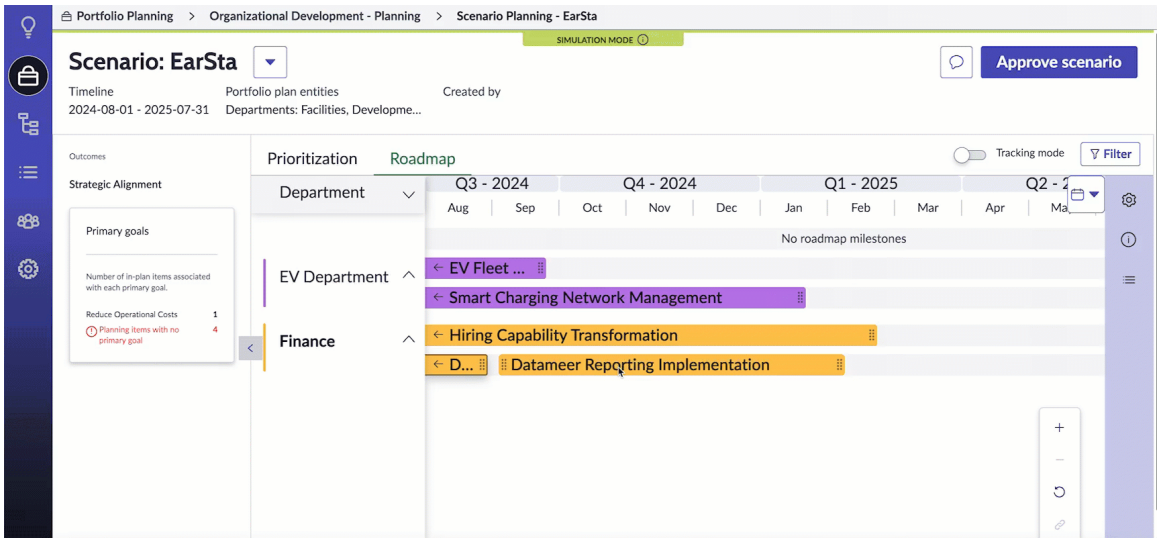

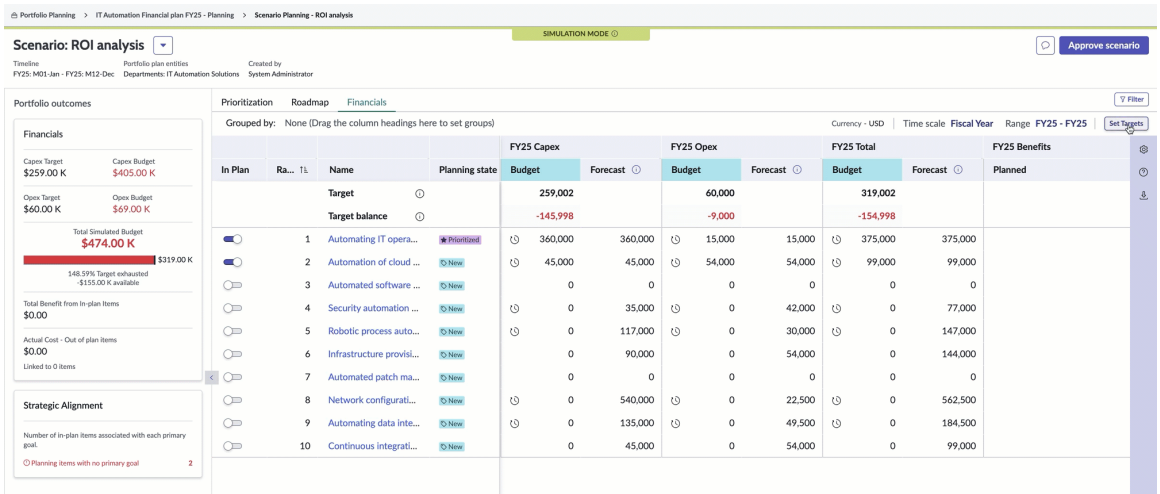


シナリオ計画ワークフローの概要

シナリオ計画ワークフローには、実行オーナーとポートフォリオオーナーが関与します。次の図は、計画立案アイテムの予定日または実際の日付に基づいてシナリオ計画を作成する方法と、これらの計画立案アイテムの状況に基づいて [計画内] トグルを調整する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

シナリオ計画におけるユーザージャーニー

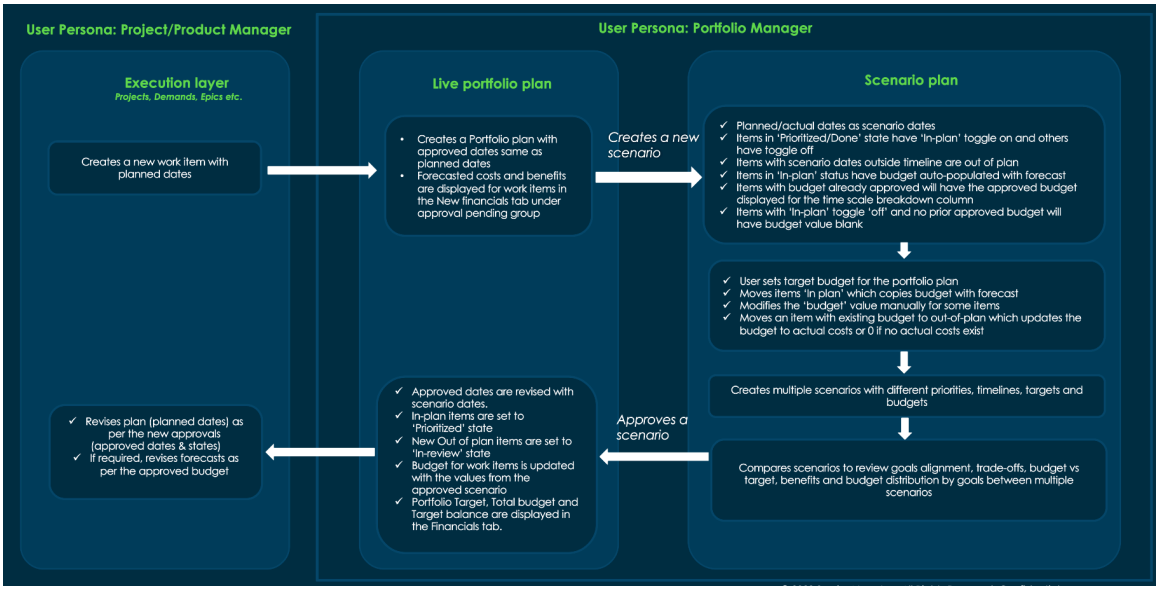

シナリオ計画を使用して戦略的計画プロセスを強化するための詳細なガイダンスについては、「でのシナリオ計画による計画の最適化 戦略的計画ワークスペース」を参照してください。

のキャパシティ 戦略的計画

[キャパシティ] タブでは、ポートフォリオマネージャーはリソースのキャパシティ、割り当て、および使用率を包括的に把握できます。


[キャパシティ] 画面を分析すると、次のことができます。

- 優先順位付けされたポートフォリオアイテムのリソースキャパシティを表示します。
- グループ、ロール、スキルなどの主要な属性を使用して、組織全体のリソースキャパシティのニーズと見積りを把握します。
- ポートフォリオにおけるリソースの供給と作業のデマンドを効果的に予測します。
- 色インジケーターを使用して、リソースキャパシティ割り当てを理解し、その概要を把握します。
- 今後のアサインに備えて特定のスキルまたはロールを持つリソースを計画します。
- 直感的な新しいユーザーインターフェイスを使用して、リソース割り当ての健全性をすぐに表示すると、過剰な割り当てがある月別にポートフォリオ期間の詳細なブレークダウンが得られます。
- [ランク] フィールドを使用して、優先順位付けされた計画立案アイテムのリソースキャパシティでリスクを特定します。
- 警告アイコンを使用すると、過剰利用されているリソース ( )、実際の日付を使用する計画立案アイテム ( )、およびリソースのアサインがない計画立案アイテムまたはリソースグループ ( ) を簡単に識別できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[キャパシティ] 画面

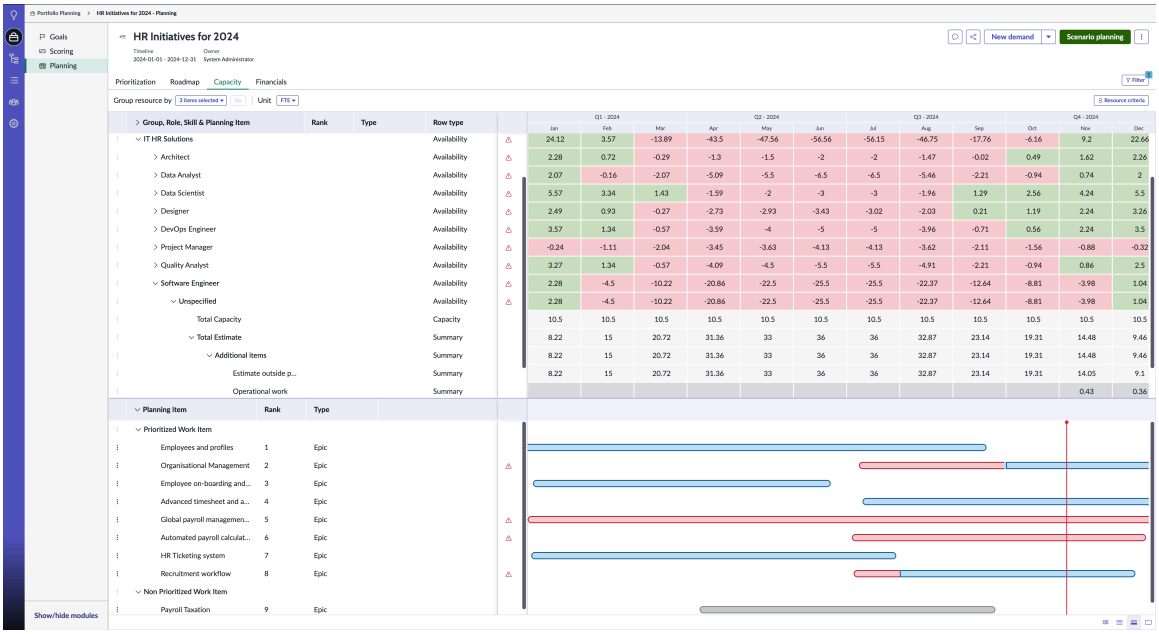

上部の画面領域には、以下が表示されます。


- 定義されたリソース基準に応じたリソースキャパシティの詳細
- 期間の割り当ての詳細
- プライマリ属性でグループ化されたリソース

下部の画面領域には、以下が表示されます。

- 優先順位付けされた計画立案アイテム
- 計画立案アイテムの期間でのインタラクティブなガントチャートガントバーを選択すると、その特定の計画立案アイテムのキャパシティのみを表示できます。

> **注:**
> 計画立案アイテムのガントバーを移動して、利用可能なリソースキャパシティに応じて予定日を調整します。実際の日付を使用する計画立案アイテムは [処理中] アイコン ( ) で示され、リソース可用性に合わせて調整することはできません。

- [リソースキャパシティ] ビューを調整するための切り替えオプション ( )。
- 計画立案アイテムのリソースキャパシティとガントバーの視覚的表現を説明する凡例。

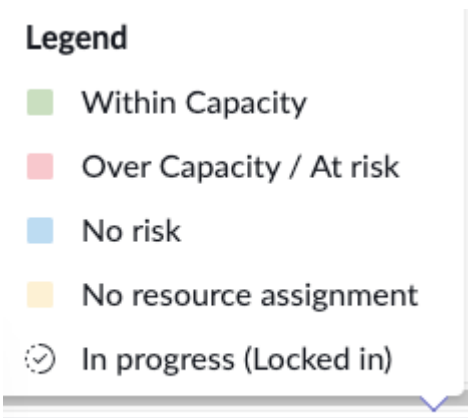

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

計画立案アイテムのファイナンシャルプラン

すべての計画立案アイテムについて、財務を計画、再予測、追跡し、ベースラインを作成します。

デマンド、プロジェクト、エピック、機能、機能などの低レベルの計画立案アイテムでサポートされているファイナンシャルプランで作業できます。

財務ビューでは、会計期間全体の実際の経費と予定経費が簡素化されて表示されます。過去の会計期間の実績コスト、現在および将来の会計期間の計画コスト、四半期別、年別、またはアイテムの全スコープに対する合計を表示することで、最新の推定完了コストを表示できます。


注:
ポートフォリオ財務は、イニシアチブ、製品アイデア、戦略的プログラムなどの高レベルのエンティティではまだサポートされていません。計画立案アイテムでまだサポートされていない人件費の生成。

財務レコードページのインターフェイスでは、コスト計画、経費ライン、ベースラインを作成できます。財務ユーザーは、次のことができます。

- [詳細] タブのシンプルな財務セクションを使用して、計画立案アイテムの大まかな財務予測を入力する。
- 計画経費および計画投資の大まかな見積もりを作成する。
- [財務] タブを使用して、計画コストの詳細なブレークダウンを作成する。
- 優先順位付けグリッド内のすべての計画立案アイテムについて、計画コスト、実績コスト、および予定利益のロールアップを表示します。
- [コスト] 画面から簡単にコスト計画の追加、編集、または削除。
- インライン編集機能を使用して、予定経費を再予測する。
- 計画立案アイテムの時間スコープ全体について、過去の実績コストと将来の計画経費を示す簡素化されたビューを表示する。
- 合計時間スコープと年次ブレークダウンについて、予測 (以前の EAC - 完了時の推定)、残りの見積もり (以前の ETC - 完了までの推定)、および各コスト計画の実績を表示することで、より優れた包括的なソリューションを取得します。
- グリッドのインライン編集機能を使用して四半期および年次の合計を直接更新することで、将来の会計期間の計画コストを再予測する。
- 組織用に構成された財務属性で分類された、計画立案アイテムのスコープ全体のリソースのアサインに応じて人件費の生成。属性ベースのマッピングの計画立案属性の詳細については、「Planning 属性の使用」を参照してください。
- 関連するコスト計画の詳細が事前入力されたサイドパネルから、コスト計画について簡単に経費ラインの追加または編集。
- [新しい経費ライン (New expense line)] サイドパネルを使用して予定外の経費を記録する。
- 財務ベースラインを作成して比較し、計画立案アイテムの財務を追跡する。
- 財務ベースラインを作成し、ベースラインの比較機能を使用して、最新のコスト (過去の会計期間の実際の経費と、現在および将来の会計期間の計画コスト) を当初の予測計画コストと比較する。
- 財務ベースラインを手動または自動でキャプチャして、コストの差異の原因と、いつ発生したかを経時的に分析する。
- さまざまな表示モードを切り替えて、財務レコードの焦点を絞ったビューを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

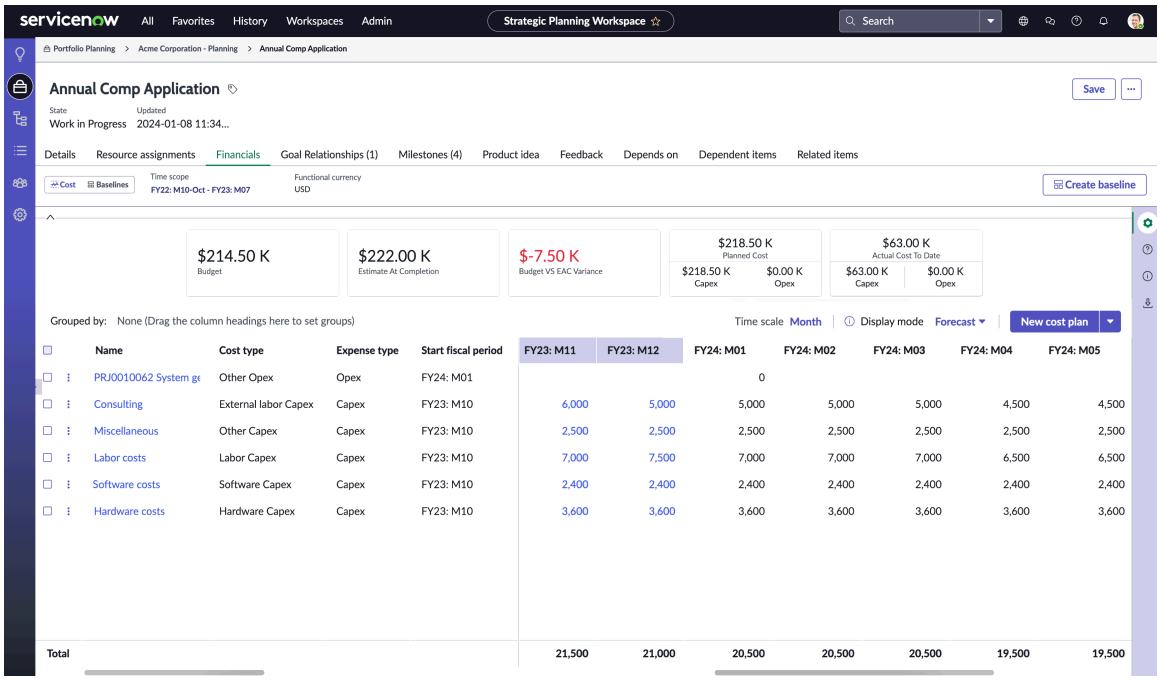

[財務] 画面では、以下の情報を表示できます。

- 時間スコープ:計画立案アイテムまたはコスト計画の期間のうち、会計期間の範囲が大きい方。
- 機能通貨:財務の計算に定義および使用される通貨。
- 割り当てられた予算、予測 (以前の EAC - EAC - EAC)、差異 (予算と予測の差)、計画コストのブレークダウン、原価費目別の実績など、さまざまな財務情報を表示するカスタマイズ可能なウィジェット。

  注:
  「予算」および「予算と EAC の差異」ウィジェットは、デマンドとプロジェクトでのみ使用できます。

- タイムスケール:財務を表示するための期間ブレークダウン。デフォルト値は、会計カレンダータイプに応じて [月]/[期間] に設定されます。
- 表示モード:さまざまなモードを切り替えるオプションを一覧表示して、財務の焦点を絞ったビューを取得します。
- 人件費の生成:リソースのアサインに応じて計画立案アイテムの計画人件費を生成または更新するためのワンクリックソリューション。

  注:
  このオプションは、リソースがアサインされているプロジェクトでのみ有効になります。

- 左側のペインには、名前、原価費目、経費タイプ、統計会計期間、会計期間の終了、計画コストの合計、従業員タイプ、およびロールが表示されるコスト計画属性の表形式ビューが表示されます。これらのフィールドはカスタマイズできます。詳細については、「財務の左ペインビューのカスタマイズ」を参照してください。
- 右側のペインでは、選択した時間スコープ期間の実績、予測、および残りの推定の合計を表示できます。過去の会計期間のコスト計画に対する実際の経費、現在の会計年度の実績、予測、および残りの見積もり、および現在および将来の会計期間の計画コスト。

  注:
  経費タイプを簡単に識別して区別できるように、実績と計画のヘッダー行が異なる色分けされています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 新しいコスト計画:エンティティの新しいコスト計画を作成するための簡素化されたサイドパネルが開きます。
- テーブルの左ペインの列をカスタマイズするためのカスタマイズオプション。
- コストまたはベースライン比較を Microsoft Excel または CSV ファイルとしてダウンロードするためのエクスポートオプション。

戦略的計画 **with** PPM、Agile 2.0、および **SAFe**


プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) や アジャイル開発 2.0 などの ServiceNow アプリケーションや、大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) などの 戦略的計画 で計画された作業がスムーズに実行できるようになります。

ポートフォリオマネージャーやプロダクトオーナーなどの計画立案ペルソナは、戦略的計画 を使用することで、計画を事業達成目標に合わせられるようになるだけでなく、作業の遂行方法を決定する実行チームに柔軟性を持たせることもできるようになります。

チームは、最も効果的な方法を選択して、ニーズに最適な実行システムを決定することができるようになります。さらに、ServiceNow プロジェクトポートフォリオ管理、アジャイル開発 2.0、大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) などのアプリケーションを使用して、マネージャーが計画した作業を実行できるようになります。

こうした柔軟性のあるアプローチで作業を遂行することにより、チームは活気づけられ、さらなる価値を生み出せるようになります。さらに、あらゆる作業における資金調達、管理、監視が 1 つのワークスペースで可能になります。

ServiceNow® アプリケーションとの 戦略的計画 統合

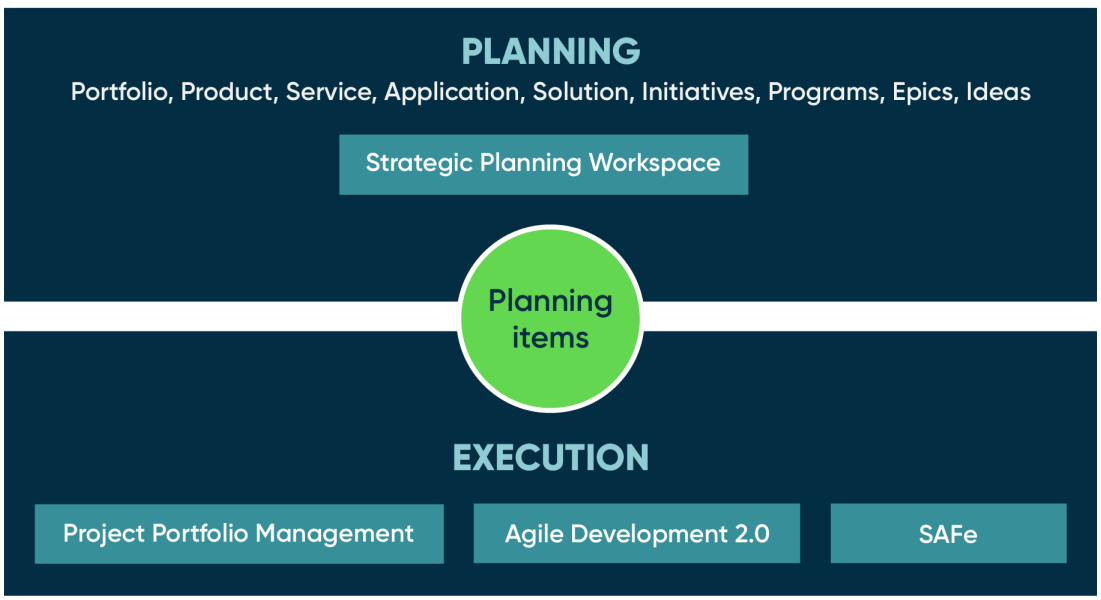

戦略的計画 **with** PPM、Agile 2.0、および **SAFe** の主なメリット

- 利用可能な PPM、Agile 2.0、および SAFe 計画立案アイテムを 戦略的計画で表示します。
- PPM、Agile 2.0、または SAFe から 戦略的計画に計画立案アイテムをインポートします。
- 戦略的計画 から PPM、Agile 2.0、または SAFe に計画立案アイテムをエクスポートします。
- 戦略的計画 with PPM、Agile 2.0、および SAFe のリンクされた計画立案アイテムの更新を同期します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- リンクされた計画立案アイテムの進捗状況を 戦略的計画 で追跡します。
- アイデアポータルをフィードバックと統合することで、アイデアポータルからフィードバックへのアイデアのフローを追跡します。

戦略的計画 with PPM、Agile 2.0、および SAFe の統合を開始するには、「戦略的計画 with PPM、Agile 2.0、および SAFe の構成」を参照してください。

他の **ServiceNow** アプリケーションとうまく併用する

戦略的計画を他のServiceNowアプリケーションと統合することで、ポートフォリオマネージャーとプロダクトマネージャーは製品の計画、コラボレーション、およびリリース管理を最適化できます。

戦略的計画**AI** コントロールタワーワークスペースあり

ServiceNow® AI コントロールタワーワークスペースを使用すると、すべての戦略的優先事項、目標、ターゲット、計画立案アイテム、実行アイテム (戦略的計画ワークスペースで人工知能として分類されたプロジェクトとデマンド) を追跡および監視できます。

戦略的優先事項の [タイプ] フィールド、目標の [カテゴリ] フィールド、計画立案アイテムの [投資タイプ] フィールドに [人工知能] オプションを入力すると、 AI コントロールタワー ワークスペースで進捗状況を監視できます。詳細については、「 戦略的優先事項の作成」、「 目標の作成」、および 「計画立案アイテムの追加」を参照してください。

AI コントロールタワー をインストールすると、AI コントロールタワーワークスペースに **[AI** 戦略] タブが表示され、AI 戦略、目標、ターゲット、計画立案アイテムのコスト、優先順位付けされた作業、および RIDAC の詳細に関するさまざまなウィジェットが表示されます。詳細については、「」を参照してください。

戦略的計画デジタルプロダクトリリースワークスペースあり

デジタル製品レンズを使用すると、プロダクトマネージャーは、ビジネス戦略に沿ってデジタル製品の作業を計画、優先順位付け、ロードマップを作成できます。

計画の一環として、計画立案アイテムを戦略的計画ワークスペースの製品拡張機能に関連付けると、関連付けられた計画立案アイテムがServiceNow デジタルプロダクトリリースワークスペースの [リリース適用範囲] ページの [計画アイテム] タブに表示されます。このタブは、製品マネージャーがデジタルプロダクトリリース ワークスペース自体で製品の拡張機能に関連付けられた計画立案アイテムのステータスを追跡し、製品のリリース管理を容易にするのに役立ちます。詳細については、「リリースのスコープ」を参照してください。

コラボレーションワーク管理 による 戦略的計画

ServiceNow コラボレーションワーク管理 (CWM) と戦略的計画の統合により、ポートフォリオ計画で目標を計画、ロードマップ、ボードに関連付けることができます。CWM ボードをレンズ構成に追加すると、ポートフォリオ計画の [優先順位付け]、[ロードマップ]、および [目標] ページで計画立案アイテムとしてボードにアクセスできます。

CWM ボードを計画立案アイテムとして構成するためにサポートされているレンズは、組織、プロジェクトポートフォリオ、および戦略的投資です。

CWM と 戦略的計画 の統合の詳細については、「戦略的計画または CWMの接続ポートフォリオ計画」を参照してください。レンズ構成を更新する方法の詳細については、「戦略的計画でのレンズの作成または変更」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エンタープライズアーキテクチャワークスペース による 戦略的計画

ビジネスケイパビリティレンズを使用すると、エンタープライズアーキテクトは、ビジネスケイパビリティまたはビジネスアプリケーションに基づいて作業を計画、優先順位付け、およびロードマップできます。ServiceNow エンタープライズアーキテクチャワークスペースの詳細については、次を参照してください。 エンタープライズアーキテクチャワークスペース.

デジタルポートフォリオ管理 による 戦略的計画

ServiceNow デジタルポートフォリオ管理 (DPM) を 戦略的計画 と統合することで、DPM マネージャーがロードマップ計画立案にアクセスできるようになります。この統合により、次のことが可能になります。

- 包括的なロードマップでサービスとパフォーマンスレベルを監視して、ポートフォリオのパフォーマンスを最適化する。
- 情報に基づいた予算決定を行い、バックログの優先順位付けとビジネスアプリケーションのロードマップの管理により、成果を共有する。

詳細については、「デジタルポートフォリオ計画の詳細」を参照してください。

戦略的計画ワークスペースの構成

戦略的計画 を設定して製品マネージャーやポートフォリオマネージャーがビジネスゴールと戦略に合わせて作業に取り組むために必要なプロセスについて説明します。

構成ワークフロー

戦略的計画 をセットアップするプロセスの指針として、次のステップを使用してください。これらのステップの中には、admin ロールが必要なものと、sn_line_core.apw_admin ロールが必要なものがあります。

1. 戦略的計画 のインストール。
2. ユーザーロールをアサインします。

   「戦略的計画ワークスペースとともにインストールされるコンポーネント」にある「インストールされるロール」テーブルを参照してください。

   注:
   古いバージョンから 戦略的計画 v2.1.0 以降にアップグレードする場合は、roadmap_editor ロールが使用されなくなるため、milestone_editor ロールを roadmap_editor ロールから削除するための修正スクリプトが実行されます。この場合、ServiceNow インスタンスに roadmap_editor ロールを持つ多数のユーザーがいると、アップグレードが完了するまでに時間がかかることがあります。詳細については、「KB1443618」を参照してください。

3. レンズを設定して、計画マネージャーがポートフォリオ計画を作成できるようにします。

   「戦略的計画 でのレンズの構成」を参照してください。

4. デフォルトで有効になっていないテーブルの上位レベルの計画立案を有効にします。

   (Optional) 「戦略的計画 での上位レベルの計画立案の構成」を参照してください。

5. レンズ、計画立案アイテム、ポートフォリオ計画、上位レベルの計画などの構成を検証します。

   「戦略的計画 診断」を参照してください。

6. 優先順位付けおよびロードマップ表示設定を構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

(Optional) 「戦略的計画での優先順位付けの表示設定」を参照してください。

7. フィードバック を構成し、フィードバックと製品アイデアを管理します。「での フィードバック アプリケーションの構成 戦略的計画」を参照してください。
8. 戦略的計画 を、選択した ServiceNow 実行システムと統合します。この統合により、戦略的計画 で計画し、選択した実行アプリで実行できるようになります。

   「戦略的計画 with PPM、Agile 2.0、および SAFe の構成」および「での フィードバック アプリケーションの構成 戦略的計画」を参照してください。

9. 既存の目標を 戦略的計画 に移行し、目標設定を構成します。

   「戦略的計画 での目標の設定」を参照してください。

10. キャパシティ計画立案を構成し、リソースキャパシティを生成します。

    「のキャパシティ構成 戦略的計画」を参照してください。

11. エピックのファイナンシャルプラン立案を有効にし、[財務] 画面ビューをカスタマイズします。

    「計画立案アイテムの財務の構成 戦略的計画」を参照してください。

戦略的計画 を構成するためのガイド付きセットアップ

ガイド付きセットアップには一連のタスクがあり、ServiceNow のインスタンスで必要な設定を行うのに役立ちます。後 装着 戦略的計画で、 すべて > 戦略的計画 > ガイド付きセットアップ.

ガイド付きセットアップからタスクを設定する場合は、[ヘルプを表示] アイコン ( ) をクリックすると、追加のガイダンスのアプリ内ヘルプを起動できます。

戦略的計画 のインストール

admin ロールを持っている場合は、ServiceNow Store から 戦略的計画 アプリケーションをインストールします。

始める前に

アプリケーションとその関連するすべてのストアアプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得 ServiceNow 製品またはアプリケーション.

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して 戦略的計画 アプリケーションを検索します。

   名前または ID (sn_apw_advanced) でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow へのリクエストが必要になることもあります。

3. [インストール] をクリックします。
4. アプリケーションのインストールダイアログボックスで、アプリケーションの依存関係を確認します。

   使用中のアプリケーションが他のアプリケーションを必要とし、それがまだインストールされていない場合は、先にインストールしておいてください。アプリケーションをインストールする時点

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

で、依存アプリケーションまたはプラグインがインストールされていない場合は、それらも自動的にインストールされます。

5. デモデータをインストールする場合は、[デモデータのロード] をクリックします。
   デモデータには、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードが含まれています。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。
6. **[Install** (インストール)] をクリックします。

タスクの結果

以下のコンポーネントは、戦略的計画 アプリケーションのインストール時にインストールされます 。

- ロール
- テーブル

詳細については、「戦略的計画ワークスペースとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

レンズおよびポートフォリオ計画の計画立案アイテム構成

戦略的計画 ワークスペースで計画立案マネージャーが作業できるデフォルトおよびカスタムの計画立案アイテムのタイプについて説明します。

レンズを使用してビルドするすべてのポートフォリオ計画について、そのレンズに追加されたアイテムタイプのみが計画に使用できます。たとえば、レンズ XYZ にエピックとプロジェクトが追加されているとします。この場合、XYZ レンズを使用してビルドする任意のポートフォリオ計画では、エピックおよびプロジェクトの形式の作業のみを計画できます。

デフォルトの計画立案アイテム

デフォルトでは、プロジェクト、デマンド、およびエピックをレンズの計画立案アイテムとして使用して、計画をビルドできます。

事前定義されたカスタム計画立案アイテム

別のアイテムタイプを使用する場合は、ServiceNow インスタンスで利用可能な最大 5 つの事前定義済みカスタム計画立案アイテムテーブルを使用できます。

1. 利用可能なカスタム計画立案アイテムタイプテーブルを 1 つ選択します。「戦略的計画ワークスペースとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
2. 使用するテーブルのラベルを変更します。

   たとえば、インシデントを計画する場合は、[カスタム計画立案アイテム 1] のラベルを [インシデント] に変更します。

3. このテーブルを *sn_align_core.planning_item_types_allow_list* プロパティに追加します。「戦略的計画 でのカスタムアイテムタイプの有効化」を参照してください。

新しいカスタム計画立案アイテム

これらの 5 つの事前定義済みカスタム計画立案アイテムテーブルをすべて使用し、 別のアイテムタイプをポートフォリオ計画に使用する場合は、新しいアイテムタイプを定義できます。「戦略的計画での新しい計画立案アイテムタイプの定義」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的計画 での既存の計画立案アイテムタイプの確認


レンズを使用してポートフォリオ計画を作成する場合は、戦略的計画 のデフォルトの計画立案アイテムタイプが会社の計画立案ニーズに合っていることの検証から開始します。

始める前に
会社の計画ニーズの詳細があることを確認します。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [名前] 列で **[sn_align_core]** を使用して、テーブルのリストをフィルタリングします。

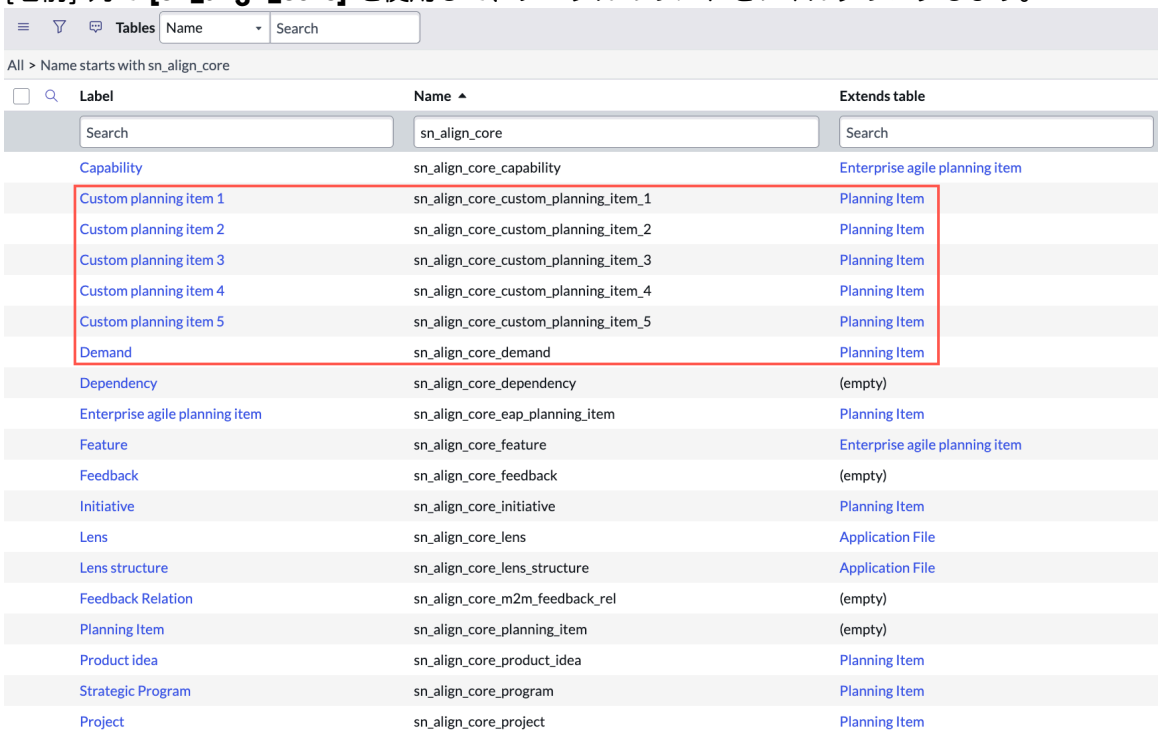

Tables | Name | Search

All > Name starts with sn_align_core

Label	Name	Extends table
Search	sn_align_core	Search
Capability	sn_align_core_capability	Enterprise agile planning item
Custom planning item 1	sn_align_core_custom_planning_item_1	Planning Item
Custom planning item 2	sn_align_core_custom_planning_item_2	Planning Item
Custom planning item 3	sn_align_core_custom_planning_item_3	Planning Item
Custom planning item 4	sn_align_core_custom_planning_item_4	Planning Item
Custom planning item 5	sn_align_core_custom_planning_item_5	Planning Item
Demand	sn_align_core_demand	Planning Item
Dependency	sn_align_core_dependency	(empty)
Enterprise agile planning item	sn_align_core_eap_planning_item	Planning Item
Feature	sn_align_core_feature	Enterprise agile planning item
Feedback	sn_align_core_feedback	(empty)
Initiative	sn_align_core_initiative	Planning Item
Lens	sn_align_core_lens	Application File
Lens structure	sn_align_core_lens_structure	Application File
Feedback Relation	sn_align_core_m2m_feedback_rel	(empty)
Planning Item	sn_align_core_planning_item	(empty)
Product idea	sn_align_core_product_idea	Planning Item
Strategic Program	sn_align_core_program	Planning Item
Project	sn_align_core_project	Planning Item

3. [拡張テーブル] 列に [計画立案アイテム] があるテーブルをレビューします。
   これらが、ポートフォリオ計画に必要なレンズの設定に必要なすべてのテーブルであるかどうかを確認します。

次のタスク
利用可能なもの以外の計画立案アイテムタイプが必要な場合は、5 つの事前定義済みのカスタム計画立案アイテムテーブルを使用するか、独自のものを作成できます。

- 事前定義されたカスタム計画立案アイテムテーブルを有効にします。
- 戦略的計画 での新しい計画立案アイテムタイプの定義

戦略的計画 での新しい計画立案アイテムタイプの定義

戦略的計画 にカスタム計画立案アイテムタイプを作成して、ポートフォリオ計画で計画できるようにします。

始める前に
インスタンスのアプリケーションスコープが ポートフォリオ計画 に設定されていることを確認します。

必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

   フィールドの詳細については、「計画立案アイテムタイプフォーム」を参照してください。
4. オプション: [モジュールの作成] チェックボックスの選択を解除します。
5. フォームを保存します。
   a. 追加アクションアイコン (☰) を選択します。
   b. [保存] を選択します。

次のタスク
計画立案アイテムタイプを作成した場合は、それに関連するフォームビューを作成します。詳細については、「戦略的計画 での新しい計画立案アイテムテーブルのフォームビューの作成」を参照してください。

戦略的計画 での新しい計画立案アイテムテーブルのフォームビューの作成

作成する新しい計画立案アイテムのテーブルごとに、それに必要なフォームビューを作成する必要があります。既存の計画立案アイテムのビューをカスタマイズすることもできます。

始める前に

- 戦略的計画 での新しい計画立案アイテムタイプの定義。
- インスタンスのアプリケーションスコープが ポートフォリオ計画 に設定されていることを確認します

必要なロール：admin

このタスクについて
必要なフォームビューは次のとおりです。

- APW プレビュー：ロードマップサイドパネルに計画立案アイテムの詳細を表示するために使用されるビューをサポートします。
- APW のデフォルト：戦略的計画 の計画立案アイテムフォームのデフォルトビューをサポートします。
- APW 新規：ロードマップからこのタイプの計画立案アイテムを作成する際に使用されるフォームビューをサポートします。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [拡張テーブル] 列の [計画立案アイテム] を使用して、テーブルのリストをフィルタリングします。
3. 作成した計画立案アイテムタイプを選択します。
4. [レイアウトフォーム] 関連リンクを選択します。
5. [ビュー名] フィールドから、[新規] を選択します。
6. [新規ビューを作成] ウィンドウで、[ビュー名] フィールドに次のいずれかの名前を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- APW プレビュービューを作成するには、「**Workspace APW Preview**」と入力します。
- APW デフォルトビューを作成するには、「**Workspace APW Default**」と入力します。
- APW 新規ビューを作成するには、 「**Workspace APW New**」と入力します。

これら以外のビューを作成する場合は、ビュー名に特殊文字が含まれていないことを確認してください。たとえば、「SAFe-Portfolio」という名前のビューを作成する場合は、ハイフン (-) をスペースに置き換え、「SAFe Portfolio」という名前を入力します。

7. **[OK]** を選択します。
8. フィールドの [利用可能] および [選択済み] リストを使用して、フォームに表示するフィールドを選択します。
   選択した順序で並べ替えることもできます。新しいテーブルのフォームビューをデフォルト設定のフォームビューと一致させるには、次の変更を行ってください。
   - [プレビュー] ビューと [APW デフォルト] ビューの場合、[戦略的優先事項] フィールドと [主要目標] フィールドを選択して、フォームに表示できるようにします。
   - 3 つのビューすべてで、フォームに表示されるように、レンズの下部のエンティティのフィールドを選択します。
   - 3 つのビューすべてに対して、[マイルストーン] 関連リストを追加します。「フォームに関連リストを追加する」を参照してください。
9. [保存] を選択します。
   この計画立案アイテムタイプに対して新しいフォームビューが作成されます。
10. ステップ 4 ～ 8 を繰り返して、他の 2 つのフォームビューの作成を完了します。

次のタスク
Strategic Planning での新しい計画立案アイテムテーブルのリストビューの作成。

Strategic Planning での新しい計画立案アイテムテーブルのリストビューの作成

作成する新しい計画立案アイテムのテーブルごとに、それに必要なリストビューを作成する必要があります。既存の計画立案アイテムのビューをカスタマイズすることもできます。

始める前に

- 戦略的計画 での新しい計画立案アイテムタイプの定義。
- インスタンスのアプリケーションスコープが ポートフォリオ計画 に設定されていることを確認します

必要なロール：admin

このタスクについて
作成した計画立案アイテムテーブルの [APW のデフォルト] および [APW の優先順位付け] リストビューを作成します。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [拡張テーブル] 列の [計画立案アイテム] を使用して、テーブルのリストをフィルタリングします。
3. 作成した計画立案アイテムタイプを選択します。
4. [リストレイアウト] 関連リンクを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

5. [リストビュー] セクションの [ビュー名] フィールドから、[新規] を選択します。
6. [ビュー名] フィールドに「**APW** のデフォルト」と入力します。
7. **[OK]** を選択します。
8. フィールドの [利用可能] および [選択済み] リストを使用して、この計画立案アイテムのリストビューに表示するフィールドを選択します。
   選択した順序で並べ替えることもできます。
9. [保存] を選択します。
   この計画立案アイテムタイプに新しいリストビューが作成されます。
10. 手順 4 ~ 9 を繰り返して、**[APW** の優先順位付け] のリストビューを作成します。

次のタスク
Strategic Planning での新しい計画立案アイテムタイプの関連リストビューの作成

Strategic Planning での新しい計画立案アイテムタイプの関連リストビューの作成

作成する新しい計画立案アイテムのテーブルごとに、それに必要な関連リストビューを作成する必要があります。既存の計画立案アイテムの関連リストビューをカスタマイズすることもできます。

始める前に

- 戦略的計画 での新しい計画立案アイテムタイプの定義。
- インスタンスのアプリケーションスコープが ポートフォリオ計画 に設定されていることを確認します

必要なロール：admin

このタスクについて
計画立案アイテムテーブルに追加するすべての関連リストは、[APW のデフォルト] ビューにある必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [拡張テーブル] 列の [計画立案アイテム] を使用して、テーブルのリストをフィルタリングします。
3. 作成した計画立案アイテムタイプを選択します。
4. **[Show Form** (フォームを表示)] 関連リンクを選択します。
5. フォームヘッダーから、[他のアクション] メニュー (☰ を選択し、 構成 > 関連リスト.
6. [リストビュー] セクションの [ビュー名] フィールドから、[新規] を選択します。
7. [ビュー名] フィールドに「**APW** のデフォルト」と入力します。
8. **[OK]** を選択します。
9. 関連リストの [利用可能] リストと [選択済み] リストを使用して、計画立案アイテムフォームに必要なものを選択します。
   選択した順序で並べ替えることもできます。
10. [保存] を選択します。

次のタスク
戦略的計画 の新規計画立案アイテムフォームに対するワークスペースビュールールの作成。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的計画 の新規計画立案アイテムフォームに対するワークスペースビュールールの作成

戦略的計画 で新規計画立案アイテムタイプのフォームビューのワークスペースビュールールを定義します。

始める前に

- 戦略的計画 での新しい計画立案アイテムテーブルのフォームビューの作成
- インスタンスのアプリケーションスコープが ポートフォリオ計画 に設定されていることを確認します

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > ワークスペースエクスペリエンス > フォーム > ワークスペースビュールール.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

   フィールドの詳細については、「ビュールールフォーム」を参照してください。
4. [条件] セクションで、[フィルター条件の追加] を選択し、次の条件を追加します。
   - APW デフォルトビューの場合：[作成済み] は [空ではない]
   - デフォルトビューの場合：[作成済み] は [空]
5. [送信] を選択します。
6. 両方のワークスペースビュールールの作成が完了するまで、このプロセスを繰り返します。

次のタスク

戦略的計画 でのカスタムアイテムタイプの有効化。

戦略的計画 でのカスタムアイテムタイプの有効化

戦略的計画 でカスタム計画立案アイテムタイプの使用を有効にして、計画立案マネージャーがフリーフォームロードマップまたはポートフォリオ計画への追加を開始できるようにします。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

ポートフォリオ計画とフリーフォームロードマップでの計画立案を許可するテーブルをシステムプロパティに追加します。


手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > すべてのプロパティ.
2. 次のいずれかのシステムプロパティを開きます。
   - ポートフォリオ計画の場合：*sn_align_core.planning_item_types_allow_list*
   - フリーフォームロードマップの場合：*sn_align_ws.freeform_planning_items_creation_list*
3. [値] フィールドに、カスタムテーブルを追加します。

   たとえば、**sn_align_core_custom_planning_item_1** を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

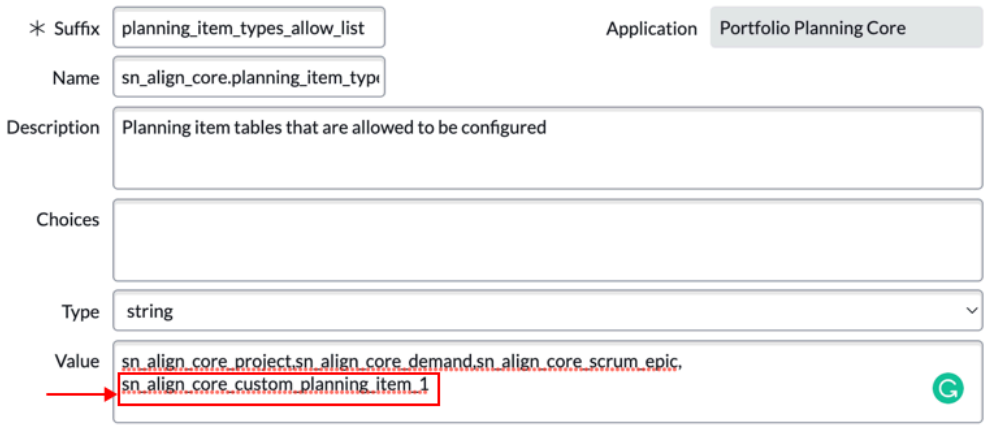

4. [更新] を選択します。

次のタスク

- ポートフォリオ計画の場合：カスタム計画立案アイテムタイプを、計画立案マネージャーが使用するレンズに追加します。「レンズフォーム」を参照してください。
- フリーフォームロードマップの場合：ロードマップビューからの計画立案アイテムの作成

戦略的計画 でのレンズの構成

計画立案マネージャーのレンズを設定できるように、戦略的計画 で計画立案アイテムの設定を構成し、レンズの構成を追加する方法について説明します。

計画立案マネージャーは、事前定義された 9 つのレンズ (プロジェクトポートフォリオ、プロジェクトプログラム、組織、戦略的投資、製品、デジタル製品、バリューストリーム、目標、およびビジネスケイパビリティ) のいずれかを使用して、ポートフォリオ計画を作成できます。また、それらのカスタムレンズ構造を設定することもできます。

事前定義済みレンズ	カスタムレンズ
1. [レンズ] リストに移動し、事前定義された各レンズの計画立案アイテムとして [エピック] を追加します。「レンズフォーム」を参照してください。 2. (オプション) 要件に従って、これらのレンズの構造を変更します。「戦略的計画 のレンズ構造の追加または変更」を参照してください。 3. 製品レンズまたは戦略的投資レンズに含まれている計画立案アイテムタイプについては、必要なすべてのフォームビューやリストビューにレンズの下部エンティティのフィールドが含まれていることを確認してください。 4. 製品または戦略的投資の場合は、[フィールド別にグループ化] および [フィールド別の色] に下位エンティティとその親エンティティを含めるようにロードマップ構成を更新します。「優先順位付けとロードマップのための計画立案アイテムの表示設定のカスタマイズ」を参照してください。	1. 戦略的計画でのレンズの作成または変更。 2. 戦略的計画 のレンズ構造の追加または変更。 3. 計画立案アイテムをレンズの下部エンティティに関連付けます。「レンズ構造フォーム」を参照してください。 4. すべての計画立案アイテムタイプのすべての APW フォームビューに、レンズの下部エンティティのフィールドが含まれていることを確認します。 5. [フィールド別にグループ化] および [フィールド別の色] に下位エンティティとその親エンティティを含めるようにロードマップ構成を更新します。「優先順位付けとロードマップのための計画立案アイテムの表示設定のカスタマイズ」を参照してください。 6. レンズを検証してアクティブ化します。「戦略的計画 でレンズをアクティブ化」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

事前定義済みレンズ	カスタムレンズ
5. 選択した ServiceNow 実行アプリケーションとの統合を設定します。「戦略的計画 with PPM、Agile 2.0、および SAFe の構成」を参照してください。	**7.** 選択した ServiceNow 実行アプリケーションとの統合を設定します。「戦略的計画 with PPM、Agile 2.0、および SAFe の構成」を参照してください。

戦略的計画でのレンズの作成または変更

レンズを作成して、戦略的計画 で会社の計画の視点の定義を開始します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
レンズレコードを作成し、このレンズを使用して計画できるアイテムのタイプ (プロジェクト、デマンドなど) を追加します。レンズに関連付ける計画立案アイテムのタイプは、ポートフォリオ計画で、計画マネージャーが使用できる唯一の作業のタイプです。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > レンズ.

2. **[New** (新規)] を選択します。

3. フォームのフィールドに入力します。
フィールドの詳細については、「レンズフォーム」を参照してください。

4. [送信] を選択します。

次のタスク
戦略的計画 のレンズ構造の追加または変更。

関連情報

戦略的計画のレンズ

戦略的計画 のレンズ構造の追加または変更

計画マネージャーが 戦略的計画 でポートフォリオ計画の作成を開始できるように、エンティティをレンズに追加し、その構造をビルドします。

始める前に
アプリケーションスコープが [ポートフォリオ計画コア **(Portfolio Planning Core)]** に設定されていることを確認します。

必要なロール：admin

このタスクについて
レンズの場合は、エンティティを追加して新しいレンズ構造をビルドするか、既存の構造を変更します。最大 6 つのエンティティをレンズ構造に追加できます。レンズとその構造の詳細については、「戦略的計画 でのレンズの構成」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > レンズ.

2. [レンズ] リストから、レンズ構造を追加または更新するレンズを選択します。

3. エンティティをレンズ構造に追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [レンズ構造] 関連リストから、[新規] を選択します。

b. フォームのフィールドに入力します。

フィールドの詳細については、「レンズ構造フォーム」を参照してください。

c. [送信] を選択します。


4. ステップ 3 を繰り返して、すべてのレンスエンティティの追加を完了します。

- トップダウン方式でエンティティを追加します。

  最初にトップレベルのエンティティを追加し、次に第 2 レベルのエンティティを追加し、その後に 3 番目のエンティティを追加します。

- トップレベルを除くすべてのエンティティに親エンティティ参照があることを確認します。

  たとえば、第 2 レベルのエンティティは、トップレベルのエンティティを親として参照する必要があります。

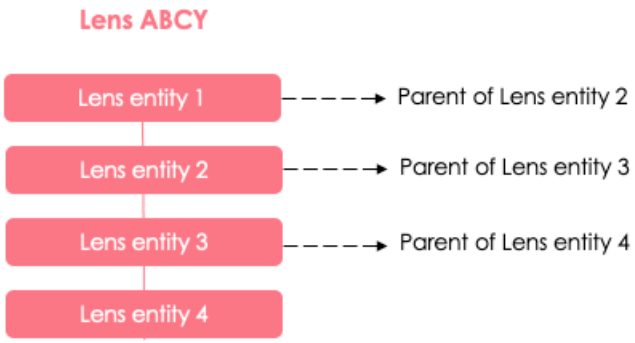

次のタスク

1. 計画立案アイテムテーブル [sn_align_core_planning_item] にこのレンズの下部エンティティを参照するフィールドがあることを確認します。

2. レンズに関連付けられているすべての計画立案アイテムタイプの次のフォームビューに、レンズ構造の下部エンティティのフィールドが含まれていることを確認します。

- APW プレビュー
- APW 新規
- APW デフォルト

3. このレンズに関連付けるすべての計画立案アイテムタイプのロードマップ構成を更新します。

このレンズ構造の下部エンティティとその親を [フィールド別にグループ化]と [フィールド別の色] に追加します。これらのフィールドは、ポートフォリオロードマップのデフォルトのグループ化基準および色分け基準設定として使用されます。「優先順位付けとロードマップのための計画立案アイテムの表示設定のカスタマイズ」を参照してください。

4. レンズ構成を検証してアクティブ化します。「戦略的計画 でレンズをアクティブ化」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的計画 でレンズをアクティブ化

計画マネージャーがこのレンズを使用してポートフォリオ計画の作成を開始できるように、レンズ構成を検証して有効にします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
既存のレンズの構造を変更した場合、またはカスタムレンズを作成した場合は、その構成を検証し、そのステータスを [アクティブ] に設定します。

計画マネージャーは、アクティブなレンズのみを使用してポートフォリオ計画を作成できます。計画マネージャーのワークスペースでレンズを使用できるようにするには、その構成が有効であり、[アクティブ] ステータスである必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > レンズ.
2. [レンズ] リストから、レンズを選択します。
3. [レンズ] フォームで、[レンズの検証] 関連リンクをクリックします。
   - 構成が有効な場合は、有効化できることを示す成功メッセージが表示されます。
   - レンズ構成が有効でない場合は、エラーメッセージを使用して問題を理解し、構成を修正します。

     関連リンクを使用して、再度レンズを検証してください。
4. [アクティブ] フィールドを選択し、フォームを保存します。

関連情報

戦略的計画 のレンズ構造の追加または変更

戦略的計画 での上位レベルの計画立案の構成

計画立案マネージャーが、デフォルト以外のアイテムに対して上位レベルの計画立案を有効にする必要がある場合は、レンズエンティティとポートフォリオ計画の構成を更新する必要があります。

デフォルトでは、戦略的プログラム、プログラム (pm_program)、およびイニシアチブが、上位レベルの計画立案で有効になっている計画立案アイテムタイプです。また、デフォルトでは、デジタル製品レンズを使用した製品拡張エンティティが上位レベルの計画立案に対して有効になっています。他の計画立案アイテムタイプを有効にするには、以下の構成タスクを完了します。

注:
上位レベルの計画立案は、戦略的計画 v2.1.0 以降で有効になっています。

計画立案アイテムテーブルを拡張するアイテムの場合

たとえば、カスタム計画立案アイテム 1 [sn_align_core_custom_planning_item_1] をレンズ構造に追加し、それを上位レベルのポートフォリオ計画に使用するとします。レンズの [レンズ構造] 関連リストで、[カスタム計画立案アイテム 1] エンティティの [計画が有効です] フィールドを **true** に設定します。詳細については、「レンズエンティティの上位レベルの計画立案の有効化」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

計画立案アイテムテーブルを拡張しないアイテムの場合

戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] 計画立案アイテムタイプに対して上位レベルの計画立案を有効にする例を考えてみましょう。

1. 戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルにグローバルランク列を作成します。「上位レベルの計画立案に備えたグローバルランク列の作成」を参照してください。
2. 新しいグローバルランク列のランク構成を作成します。「上位レベルの計画立案に備えたランク構成の作成」を参照してください。
3. 戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルのポートフォリオ計画構成を作成します。「上位レベルの計画立案に備えたポートフォリオ計画構成の作成」を参照してください。
4. レンズ構造レコードの戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] エンティティに対して上位レベルの計画立案を有効にします。「レンズエンティティの上位レベルの計画立案の有効化」を参照してください。
5. 診断と修正スクリプトを実行して、既存のすべての戦略的優先事項レコードのグローバルランクを入力します。「上位レベルの計画立案アイテムのグローバルランクの入力」を参照してください。
6. 戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルのビジネスルールを作成して、今後作成されるレコードのグローバルランクを設定できるようにします。「上位レベルの計画立案に備えたビジネスルールの作成」を参照してください。

ヒント:
上位レベルの計画立案エンティティとしてテーブルを選択するときは、これを計画立案アイテムとして使用できるように、開始日と終了日、所有者またはアサイン先、名前または簡単な説明などのフィールドがあることを確認してください。たとえば、組織テーブルまたは製品テーブルを上位レベルの計画立案エンティティとして使用することはできません。一方、戦略的優先事項テーブルは計画立案アイテムの要件を満たしているので、上位レベルの計画立案用に構成できます。

これらのタスクがすべて完了したら、計画立案マネージャーは目的のエンティティに対して上位レベルのポートフォリオ計画を作成できます。この例では、ポートフォリオ計画を作成して、会社の戦略的優先事項の優先順位付けとロードマップの作成を行い、会社全体の作業がどの程度こうした戦略的優先事項に沿っているかを表示できます。

上位レベルの計画立案に備えたグローバルランク列の作成

計画立案アイテム [sn_align_planning_item] テーブルを拡張しない計画立案アイテムタイプのグローバルランク列を作成して、戦略的計画 Workspace でこうしたアイテムの上位レベルの計画立案を有効にできるようにします。

始める前に
戦略的計画 v2.1.0 にアップグレードします。

必要なロール：admin

このタスクについて
上位レベルの計画立案を有効にする計画立案アイテムテーブルに [グローバルランク] 列を作成します。この列では、ServiceNow インスタンス内のこのテーブルのすべての既存および新規レコードのグローバルランクを入力できます。

手順
1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. 計画立案アイテムテーブルを検索して開きます。

   たとえば、戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルを検索して開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [列] 関連リストから [新規] を選択します。
4. フォームで次のフィールドに入力します。

[辞書エントリ] フォームのフィールド

フィールド	説明
テーブル	この列を作成するテーブル。 このフィールドは、ステップ 2 で選択したテーブルに自動的に設定されます。
タイプ	作成する列の値タイプ。 [長] を選択します。
列ラベル	ランク列のラベル。 「グローバルランク」と入力します。
列名	列の自動生成された一意の名前。
アプリケーション	テーブルのアプリケーションスコープ。 このフィールドには、選択したテーブルに基づいて自動入力されます。

[辞書エントリ] フォームのフィールドの詳細については、「Dictionary entry form」を参照してください。

5. フォームを保存します。

次のタスク
作成したグローバルランクフィールドのランク構成を作成します。「上位レベルの計画立案に備えたランク構成の作成」を参照してください。

上位レベルの計画立案に備えたランク構成の作成

戦略的計画 Workspace で計画立案アイテムではないテーブルでの上位レベルの計画立案を有効にするには、テーブルのグローバルランク列のランク構成を作成します。

始める前に
上位レベルの計画立案に備えたグローバルランク列の作成。

必要なロール：admin

このタスクについて
上位レベルの計画立案を有効にするテーブルの global_rank 列の構成を作成します。このタスクを完了すると、このテーブルのレコードにグローバルランク値をアサインできます。

このタスクでは、戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルのランク構成の作成例を検討します。

手順

1. 移動先 すべて > **rank_configuration.list**.
   [グローバルランク] フィールドが構成されているテーブルのリストが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

2. [新規] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

[ランクの構成] フォーム

フィールド	説明
テーブル	上位レベルの計画立案を有効にするテーブル。 例：戦略的優先事項 [sn_gf_strategy]
列	テーブルのグローバルランク列。

4. [送信] を選択します。

次のタスク
上位レベルの計画立案テーブルのポートフォリオ計画構成を作成します。「上位レベルの計画立案に備えたポートフォリオ計画構成の作成」を参照してください。

上位レベルの計画立案に備えたポートフォリオ計画構成の作成

戦略的計画 Workspace で計画立案アイテムではないテーブルでの上位レベルの計画立案を有効にするには、テーブルのポートフォリオ計画構成を作成します。

始める前に
上位レベルの計画立案に備えたランク構成の作成

必要なロール：admin

このタスクについて
グローバルランク列とその列のランク構成を作成したら、上位レベルの計画立案用に選択したテーブルのポートフォリオ計画構成を作成します。このタスクに続いて、計画立案マネージャーがこのテーブルに対して作成するポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページと [ロードマップ] ページの設定を構成します。

このタスクでは、戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルの例を検討します。

手順
1. 移動先 すべて > **sn_align_ws_roadmap_configuration.list**.
   戦略的計画 テーブルの既存のポートフォリオ計画構成レコードのリストが表示されます。
2. [新規] を選択して、テーブルにポートフォリオ計画構成を作成します。
3. フォームの各フィールドに入力します。

ポートフォリオ計画の構成

フィールド	説明
ソーステーブル	上位レベルの計画立案を有効にするテーブル。 例：戦略的優先事項 **[sn_gf_strategy]**。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ランクの構成

フィールド	説明
ランクの構成	ポートフォリオ計画の作成に使用されるテーブル。 このフィールドの値は、[ソーステーブル] フィールドで選択されたテーブルです。

このフォームのフィールドの詳細については、「[ポートフォリオ計画の構成] フォーム」を参照してください。

4. フォームを保存します。

次のタスク
上位レベルの計画立案テーブルの既存のすべてのレコードのグローバルランク値を入力します。

レンズエンティティの上位レベルの計画立案の有効化

戦略的計画 Workspace でエンティティの上位レベルの計画立案を有効にするには、レンズエンティティ構成を更新します。

始める前に
上位レベルの計画立案に備えたポートフォリオ計画構成の作成。

必要なロール：admin

このタスクについて
上位レベルの計画立案を有効にするテーブルについて、[レンズ] フォームの [計画が有効です] フィールドを [はい] に設定します。このタスクを完了すると、計画立案マネージャーは、戦略的計画 Workspace でこのテーブルを計画立案アイテムとして使用して、ポートフォリオ計画を作成できるようになります。

このタスクでは、レンズとしての戦略的投資の例と、上位レベルの計画立案エンティティとしての戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルを検討します。


手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > レンズ.
2. 上位レベルの計画立案に使用するレンズを選択して開きます。
   たとえば、[戦略的投資] を選択します。
3. [レンズ] フォームの [レンズ構造] 関連リストで、上位レベルのエンティティの [計画が有効です] フィールドを **true** に設定します。
   たとえば、戦略的優先事項エンティティの [計画が有効です] フィールドを **true** に設定します。

   上位レベルのエンティティがレンズ構造に含まれていない場合は、追加できます。「戦略的計画のレンズ構造の追加または変更」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

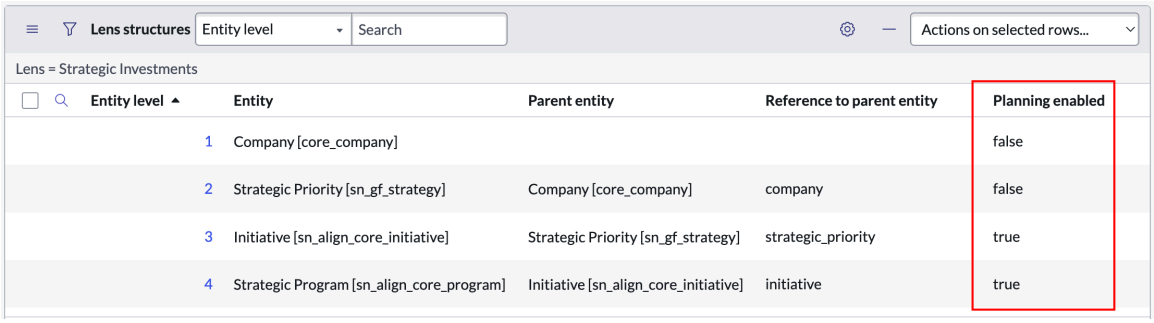

	Entity level	Entity	Parent entity	Reference to parent entity	Planning enabled
1		Company [core_company]			false
2		Strategic Priority [sn_gf_strategy]	Company [core_company]	company	false
3		Initiative [sn_align_core_initiative]	Strategic Priority [sn_gf_strategy]	strategic_priority	true
4		Strategic Program [sn_align_core_program]	Initiative [sn_align_core_initiative]	initiative	true

4. [レンズ] フォームを保存します。

タスクの結果
計画立案マネージャーは、戦略的投資レンズでポートフォリオ計画を作成し、戦略的優先事項を計画立案アイテムとして使用できるようになりました。

重要:
このエンティティに基づいてポートフォリオ計画が作成されると、その上位レベルの計画立案を無効にしたり、レンズ構造からエンティティレコードを削除したりすることはできません。

次のタスク
上位レベルの計画立案アイテムのグローバルランクの入力。

上位レベルの計画立案アイテムのグローバルランクの入力

戦略的計画 Workspace で計画立案アイテムではないテーブルでの上位レベルの計画立案を有効にするには、このテーブルの既存のレコードのグローバルランクを入力します。

始める前に
レンズエンティティの上位レベルの計画立案の有効化。

必要なロール：admin

このタスクについて
Strategic Planning 診断モジュールを使用して、計画立案マネージャーが上位レベルの計画立案用に選択したテーブルの既存のすべてのレコードのグローバルランクを入力します。このタスクを完了すると、テーブルの [グローバルランク] フィールドの値が生成されます。

このタスクでは、戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルの既存のすべてのレコードのランク値の生成例を検討します。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 診断.
2. [診断を実行] を選択して、[グローバルランクなしで、計画立案が有効になっている上位レベルの計画立案エンティティを識別する] 診断スクリプトを実行します。
   診断が失敗し、グローバルランクがないレコードのタイプと合計数が表示されます。
3. [スクリプト修復の実行] を選択して、フラグが付けられたすべてのレコードのグローバルランク値を入力します。
   診断スクリプトを再度実行することで、ランクが入力されていることを確認できます。診断が成功したことがわかります。

次のタスク
上位レベルの計画立案テーブルに今後作成されるレコードにグローバルランクを入力するビジネスルールを作成します。「上位レベルの計画立案に備えたビジネスルールの作成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

上位レベルの計画立案に備えたビジネスルールの作成

戦略的計画 Workspace で計画立案アイテムではないテーブルでの上位レベルの計画立案を有効にするには、このテーブルの今後のすべてのレコードにランク値をアサインできるようにするビジネスルールを作成します。

始める前に

上位レベルの計画立案アイテムのグローバルランクの入力。

必要なロール：admin

このタスクについて

計画立案マネージャーがポートフォリオ計画でこのタイプのアイテムを並べ替えて優先順位を付けるときに、ランクが自動的に更新されるように、上位レベルの計画立案エンティティの今後の全レコードにはグローバルランクが必要です。新しいレコードへのランク値の自動アサインを有効にするには、ビジネスルールを作成します。

このタスクでは、今後の全レコードのランク値の自動アサインを有効にするために、戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] でビジネスルールを作成する例を検討します。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. 計画立案アイテムテーブルを検索して開きます。

   たとえば、戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルを検索して開きます。
3. フォームヘッダーを右クリックし、 構成 > ビジネスルール.
4. **[New** (新規)] を選択します。
5. フォームのフィールドに入力します。

   [ビジネスルール] フォーム

フィールド	説明
名前	ルールを識別する名前。 例：戦略的優先度ランク挿入ルール。
テーブル	このビジネスルールが適用されるテーブル。 この例では、 戦略的優先事項 **[sn_gf_strategy]** を選択します。
詳細	このビジネスルールの詳細設定を有効にするオプション。

6. [詳細] 関連リストで、[スクリプト] フィールドに次のコードを入力します。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/)
{
    var spwRankingHelper = new sn_align_core.SPWRankingHelper();
    var rankConfig = spwRankingHelper.getRankConfiguration(current.getTableName());
    if (rankConfig.isValidRecord())
    {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    var sequencer = new
sn_align_core.AlignmentPlanningRankProcessor(rankConfig.getValue("table"),
rankConfig.getValue("column"));
    sequencer.generateNewIndex(current);
  }
})
(current, previous);
```

7. [実行タイミング] 関連リストで、[挿入] オプションを有効にします。

8. フォームを保存します。

タスクの結果

このタスクは、テーブルでの上位レベルの計画立案を有効にするための一連のタスクの最後であり、計画立案アイテム [sn_align_planning_item] テーブルを拡張するものではありません。このタスクが完了したら、構成されたエンティティタイプのポートフォリオ計画の作成を開始できることを計画立案マネージャーに通知できます。

「戦略的計画ワークスペースでのポートフォリオ計画の管理」を参照してください。

Strategic Planning のカスタム採点フレームワーク

定義されたスコアに基づいて計画立案アイテムに優先順位を付けることができるように、カスタム採点フレームワークを作成してポートフォリオ計画に関連付ける方法について説明します。

事前定義された 3 つの採点フレームワーク (RICE、価値と作業、または WSJF) のいずれかを使用するか、カスタム採点フレームワークを作成してポートフォリオ計画に関連付けることができます。

> **注:**
> 事前定義済みの採点フレームワークは編集できません。アドミニストレーターは、[採点フレームワーク] フォームの [アクティブ] フィールドを設定することで、ベースシステムの採点フレームワークを有効または無効にできます。

カスタム採点フレームワークの作成

カスタム採点フレームワークを作成して、設定に基づいて計画立案アイテムの採点を開始します。

始める前に

必要なロール：sn_align_core_apw_admin

このタスクについて

カスタム採点フレームワークの作成。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 採点フレームワーク.

2. **[New** (新規)] を選択します。

3. [名前] フィールドに採点フレームワークの名前を入力します。

4. [説明] フィールドに採点フレームワークの詳細を入力します。

5. [送信] を選択します。

次のタスク

採点フレームワークの属性の作成

採点フレームワークの属性の作成

採点フレームワーク内に属性を追加して、式をビルドし、ポートフォリオ計画内で計画立案アイテムの採点を開始できるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

このタスクについて
採点フレームワークの属性の作成。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 採点フレームワーク.
2. [採点フレームワーク] リストから、採点フレームワークの属性を追加するフレームワークを選択します。
3. [採点フレームワークの属性 (Scoring Framework Attributes)] 関連リストから [新規] を選択します。
4. フォームのフィールドに入力します。

採点フレームワークの属性フォーム

フィールド	説明
ラベル	採点フレームワークを定義する名前。
タイプ	ラベルのタイプ (整数、選択肢、星印など)。
説明	採点フレームワークの詳細。

ヒント:
選択肢タイプの採点属性を追加する場合は、[タイプ] フィールドに 10 進数または整数、また [表示タイプ] フィールドに選択肢があることを確認します。

5. [送信] を選択します。
6. ステップ 3 を繰り返して、すべての採点フレームワークの属性を追加します。

次のタスク
最終スコア属性の作成

最終スコア属性の作成

採点フレームワークの最終スコアを計算する属性を作成する方法について説明します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core_apw_admin

このタスクについて
採点フレームワークの最終スコアを計算する属性を作成します。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 採点フレームワーク.
2. [採点フレームワーク] リストから、最終スコア属性を追加するフレームワークを選択します。
3. [採点フレームワークの属性 (Scoring Framework Attributes)] 関連リストから [新規] を選択します。
4. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

採点フレームワークの属性フォーム

フィールド	説明
ラベル	採点フレームワークの最終スコアを定義する名前。
タイプ	ラベルのタイプ (選択肢、10 進数、整数、文字列など)。
説明	採点フレームワーク属性の詳細。

5. [最終スコア] オプションを選択して、この属性を採点フレームワークの最終スコア属性としてマークします。
6. [計算された値] タブを選択し、最終スコア属性の値を導く式を追加します。
この式は、採点フレームワークの採点属性にのみ基づいている必要があります。この例では、ICE カスタムフレームワークの式は次のとおりです。

```
ICE score = Impact * Confidence * Ease
```



7. [更新] を選択します。

戦略的計画 での目標の設定

戦略的計画 で目標を定義して管理するには、初期管理タスクをいくつか実行してワークスペースを完全に機能させる必要があります。戦略的計画 の目標ビューに表示されるデータは ゴールフレームワーク テーブルに格納されています。

- admin ロールで、既存の目標データを ゴールフレームワーク テーブルに移行できます。
- sn_gf.goal_admin ロールでは、目標設定を行うことができます。

既存の目標 (存在する場合) の移行後、および目標設定を行う場合は、戦略的計画 の目標ビューを使用して目標を定義します。詳細については、「戦略的計画ワークスペース での目標管理」を参照してください。

既存の目標データを ゴールフレームワーク テーブルに移行する

admin ロールを使用すると、スケジュール済みジョブを実行して、既存の目標データを ゴールフレームワーク テーブルに移行できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

注:
ゴールフレームワーク テーブルへのデータの移行は 1 回限りの作業であり、スケジュールどおりに行われることを意図したものではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [目標、戦略、および作業アイテムデータをゴールフレームワークと関連する計画アイテムテーブルに移行 **(Migrate Goal, Strategy, and Work item data to the Goal Framework and related Planning item tables)]** スケジュール済みジョブを検索してクリックします。
3. スケジュール済みスクリプト実行フォームで：
   a. [実行] フィールドで頻度が [オンデマンド] に選択されていることを確認します。
   b. [このスクリプトを実行] フィールドで、必須パラメーターの値を **[true]** に設定します。
   パラメーターの詳細については、「目標、戦略、および作業アイテムデータを Goal Framework と関連する計画立案アイテムテーブルに移行」を参照して ください。
4. [今すぐ実行する] をクリックします。

目標設定を構成する

目標設定に使用されるカレンダータイプ、目標進捗状況の加重平均計算、目標やターゲットの削除など、目標を管理するための目標設定を構成します。

始める前に
必要なロール：sn_gf.goal_admin

手順

1. 移動先 すべて > エンタープライズゴール管理 > 設定.
2. [目標設定] フォームで、プロパティを設定します。
   プロパティについては「目標設定フォーム」を参照してください。
3. [保存] をクリックします。

目標テーブルとターゲットテーブルのラベルのカスタマイズ

組織の要件に従って、目標 [sn_gf_goal] テーブルとターゲット [sn_gf_goal_target] テーブルのラベルをカスタマイズします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
目標 [sn_gf_goal] テーブルとターゲット [sn_gf_goal_target] テーブルのラベル名を変更すると、Heisenberg UI とワークスペース UI におけるこれらのラベルに変更が適用されます。また、ナビゲーションペインの [エンタープライズゴール管理] の下にある [目標] モジュールと [ターゲット] モジュールの名前も変更されます。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. 要件に応じてテーブルのラベル名をカスタマイズします。

アサインされたエンティティのテーブルの構成

アサインされたエンティティタイプのテーブルを構成して、目標ユーザーが目標を必須のアサインされたエンティティに関連付けることができるようにします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：sn_gf.goal_admin

このタスクについて

- デフォルトでは、戦略的計画 のインストールにより、事業部門 [business_unit]、部門 [cmn_department]、会社 [core_company]、製品モデル [cmdb_model]、バリューストリーム [cmn_value_stream]、イニシアチブ [sn_align_core_initiative]、および戦略的プログラム [sn_align_core_program] がインストールされます。
- PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理) を有効にすると、ポートフォリオ [pm_portfolio] アサイン済みエンティティがインストールされます。

手順

1. 移動先 すべて > エンタープライズゴール管理 > アサインされたエンティティ.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「目標がアサインされたエンティティ構成フォーム」を参照してください。
4. [送信] をクリックします。

ターゲットブレークダウンを使用して目標デモデータを作成する

[ターゲットブレークダウンを使用して目標デモデータを作成] スケジュールジョブを実行して、ターゲットブレークダウンを含む目標デモデータを作成し、[目標] ページにターゲットブレークダウンセクションを表示できるようにします。

このタスクについて
[目標] ページの [目標とターゲット] タブで [ターゲットブレークダウン] セクションを表示できるようにするには、ジョブを実行する必要があります。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [**Create Goals Demo Data with Target Breakdowns**] スケジュール済みジョブを検索して選択します。
3. スケジュール済みスクリプト実行フォームで、[実行] フィールドで頻度が [オンデマンド] に選択されていることを確認します。
4. **[Execute Now** (今すぐ実行)] を選択します。

タスクの結果
ターゲットブレークダウンを含む目標デモデータが作成されます。[目標] ページの [目標とターゲット] タブで、目標のターゲットブレークダウンを表示できるようになりました。

スプレッドシートから目標とターゲットのデータをインポート

アドミンロールを使用すると、既存の目標とターゲットのデータをスプレッドシートから ゴールフレームワーク テーブルにインポートできます。

始める前に
必要なロール：sn_gf.goal_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ジョブが正常に実行されると、スプレッドシートの目標データが目標 [sn_gf_goal] テーブルにインポートされます。
- ジョブが正常に実行されると、スプレッドシートのターゲットデータがターゲット [sn_gf_goal_target] テーブルにインポートされます。

注:
ターゲットは目標に関連付けられているため、最初に目標をインポートしてからターゲットをインポートする必要があります。

重要:
スプレッドシートの目標とターゲットのデータは、サポートされている形式である必要があります。スプレッドシートから目標とターゲットのデータをインポートするためにサポートされているデータ形式の詳細については、「Import goals and targets data (目標とターゲットのデータのインポート) [KB1191233]」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムインポートセット > データのロード.
2. [インポートセットテーブル] ドロップダウンリストから、 [目標インポートセット] **[imp_sn_gf_goal]** または [ターゲットインポートセット] **[imp_sn_gf_goal_target]** を選択します。
3. [インポート元] フィールドで、[ファイル] を選択します。
4. [ファイル] オプションで [選択] をクリックし、データをインポートするスプレッドシートを選択します。

   重要:
   - スプレッドシートの目標とターゲットのデータは、特定の形式である必要があります。サポートされているデータ形式の詳細については、「Import goals and targets data (目標とターゲットのデータのインポート) [KB1191233]」を参照してください。
   - データは各列のヘッダータイトルに基づいて目標テーブルとターゲットテーブルのそれぞれのフィールドにインポートされるため、スプレッドシートのヘッダー行の名前は変更しないでください。

5. [送信] をクリックします。
6. [進捗状況] ページで、[変換の実行] をクリックします。
7. [インポートセットと変換マップを指定] フォームで、[変換] をクリックします。
8. [変換履歴] をクリックし、[インポートセット実行] 関連リストの [ステータス] 列が [完了] に設定されていることを確認します。
   [インポートセットテーブル] ドロップダウンリストから選択したオプションに応じて、目標またはターゲットデータが目標 [sn_gf_goal] またはターゲット [sn_gf_goal_target] テーブルにインポートされます。

   ジョブが失敗した場合は、[変換履歴] をクリックして詳細を参照してください。

   注:
   [インポート] 操作を使用して、テーブルで新しいデータを挿入、または既存のデータを更新できます。デフォルトでは、 [名前] と [所有者] の値は、既存のレコードを更新するために使用されるプライマリキーです。新しいデータを挿入したり、既存のデータを更新したりするためのプライマリキーとしてさらにフィールドを追加することもできます。プライマリキーとしてフィールドを追加する方法の詳細については、「Import goals and targets data (目標とターゲットのデータのインポート) [KB1191233]」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

スケジュールジョブを更新してターゲットの実績値を自動化

SPM のゴールフレームワーク アプリケーションを使用して、初期設定に従ってスケジュール設定済みジョブの実行時間を変更し、ターゲットソースが構成されているターゲットの実績値を自動更新します。

始める前に
必要なロール：sn_gf.goal_admin

このタスクについて
デフォルトでは、スケジュール済みジョブは毎日午前 00:00:00 (システムタイムゾーン) に実行されます。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. **[SPM** のゴールフレームワークを使用してターゲットの実際の値を更新 **(Update Actual value of the targets using Goal Framework for SPM)]** スケジュール済みジョブを検索してクリックします。
3. スケジュールされた時刻にジョブを実行するには、[アクティブ] チェックボックスをオンになっていることを確認します。
4. 必要に応じて、[実行] フィールドと [時刻] フィールドの詳細を編集します。
5. [更新] をクリックします。
   スケジュール済みジョブの詳細については、「スケジュール済みジョブ」を参照してください。

ターゲットブレークダウンを移行

戦略的計画 v4.3.2 以降にアップグレードした後、**Migrate BreakdownInterval To Checkinfrequency** スケジュール済みジョブを実行して、既存の値を [レビュー頻度] フィールドからターゲットレコードの [チェックイン頻度] フィールドに移行します。

このタスクについて
ジョブの実行後、ターゲットの [チェックイン頻度] フィールドの値が、ターゲットの [レビュー頻度] フィールドの既存の値に基づいて入力されます。[レビュー頻度] フィールドの既存の値が [なし] 以外のオプションに設定されている場合、ターゲットの既存のチェックイン頻度の値に基づいて、そのようなターゲットのターゲットブレークダウンが作成されます。異なる値を持つターゲットに対してこれらの値を移行する方法の詳細については、「 ターゲットブレークダウンの移行」を参照してください。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. **[Migrate BreakdownInterval to Checkinfrequency**] スケジュール済みジョブを検索して選択します。
3. スケジュール済みスクリプト実行フォームで、[実行] フィールドで頻度が [オンデマンド] に選択されていることを確認します。
4. **[Execute Now** (今すぐ実行)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ターゲットブレークダウンの移行

アドミニストレーターが **[BreakdownInterval を Checkinfrequency** に移行] スケジュール済みジョブを実行すると、[レビュー頻度] フィールドと [ブレークダウン間隔] フィールドの既存の値がターゲットレコードの [チェックイン頻度] フィールドに移行されます。

ターゲット の [実績累計] フィールドの値と、ターゲットブレークダウンの [計画ターゲット値] フィールドと [実績] フィールドの値は、ターゲットの現在の実績値と既存のターゲットブレークダウンの値に基づいて設定されます。

ブレークダウン間隔が [なし] に設定されたターゲットのターゲットブレークダウン移行

ジョブの実行後、ターゲットの [チェックイン頻度] フィールドの値が、ターゲットの [レビュー頻度] フィールドの既存の値に基づいて入力されます。[レビュー頻度] フィールドの既存の値が [なし] 以外のオプションに設定されている場合、ターゲットの既存のレビュー頻度に基づいて、そのようなターゲットのターゲットブレークダウンが作成されます。ターゲットの [ブレークダウン間隔] が [なし] に設定されている場合でも、ターゲットの既存のレビュー頻度に基づいてターゲットのターゲットブレークダウンが作成されます。

次の表は、[レビュー頻度] フィールドと [ブレークダウン間隔] フィールドで異なる値を持つターゲットのチェックイン頻度の値を設定する方法を示しています。

ブレークダウン間隔が [なし] に設定されたターゲットブレークダウンの移行

レビュー頻度 (アップグレード前)	ブレークダウン間隔 (アップグレード前)	チェックイン頻度 (ジョブのアップグレードと実行後)
年次	なし	年次
四半期ごと	なし	四半期ごと
月次	なし	月次
隔週	なし	隔週 [隔週] オプションは保持され、[隔週] オプションはサポートされなくなったため、ターゲットブレークダウンは作成されません。 ターゲットの所有者または貢献者がターゲットのチェックイン頻度を更新すると、それに応じてターゲットブレークダウンが作成されます。
週次	なし	週次
日次	なし	日次
なし	なし	なし この場合、ターゲットブレークダウンは作成されません。

たとえば、アップグレード前のターゲットの詳細が次のようなシナリオを考えてみましょう。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- ターゲットの基準値とターゲット値は、それぞれ 0 と 100 です
- レビュー頻度は [月次] に設定され、ブレークダウン間隔は [なし] に設定されました
- ターゲットの開始日と終了日は、それぞれ 2024-01-01 と 2024-12-31 です
- ターゲットの現在の実績値は 60 で、現在の月は 8 月です

この場合、スケジュール済みジョブを実行した後、ターゲットに対して 12 個の月次ターゲットブレークダウンが作成され、8 月の月次ブレークダウンに 60 の現在の実際の値が入力されます。また、計画ターゲット値はブレークダウンごとに設定されます。

ブレークダウン間隔が [四半期ごと] または [年ごと] に設定されたターゲットのターゲットブレークダウン移行

ジョブの実行後、ターゲットの [チェックイン頻度] フィールドの値が、ターゲットの [レビュー頻度] フィールドの既存の値に基づいて入力されます。次に、ターゲットの既存のレビュー頻度に基づいて、ターゲットのターゲットブレークダウンが作成されます。

次の表は、[レビュー頻度] フィールドと [ブレークダウン間隔] フィールドで異なる値を持つターゲットのチェックイン頻度の値を設定する方法を示しています。

ブレークダウン間隔が [四半期ごと] または [年ごと] に設定されたターゲットブレークダウンの移行

レビュー頻度 (アップグレード前)	ブレークダウン間隔 (アップグレード前)	チェックイン頻度 (ジョブのアップグレードと実行後)
四半期ごと	四半期ごと	四半期ごと
四半期ごと	年次	四半期ごと

注:
ブレークダウン間隔が [年ごと] に設定されているターゲットの場合、ターゲットのタイプが累積か非累積かに関係なく、スケジュール済みジョブを四半期ごとに実行すると、ターゲットブレークダウンが作成され、[ターゲット値分布] が ターゲットの期間全体に直線的に (累積) 設定されます。

たとえば、アップグレード前のターゲットの詳細が次のようなシナリオを考えてみましょう。

- ターゲットの基準値とターゲット値は、それぞれ 0 と 80 です
- レビュー頻度は [四半期ごと] に設定され、ブレークダウン間隔は [年ごと] に設定されました
- ターゲットの開始日と終了日は、それぞれ 2023-01-01 と 2024-12-31 です
- ターゲットのタイプが非累積です
- 各四半期で達成された実績値は、2023 年第 1 四半期から 2024 年第 2 四半期までの 10 です
- ターゲットの現在の合計実績値は 60 で、現在の四半期は 2024 年第 2 四半期です

この場合、スケジュール済みジョブを実行すると、四半期ごとのブレークダウンが 8 つ作成され、ターゲット値の分布が ターゲットの期間全体に直線的に広がる (累積) に設定されます。2023 年第 1 四半期、2023 年第 2 四半期、2023 年第 3 四半期、2023 年第 4 四半期、2024 年第 1 四半期、および 2024 年第 2 四半期のターゲットブレークダウンの現在の実績値は、それぞれ 10、20、30、40、50、および 60 として入力されます。また、計画ターゲット値はブレークダウンごとに設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アサインされたエンティティの目標関係を移行する

スケジュール済みジョブを実行して、目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルから既存の目標関係データを移行します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

- アラインメントプランナーワークスペース v4.1.1 または v5.0.1 から 戦略的計画 v2.0.1 にアップグレードし、[会社]、[事業部門]、[部門]、および [ポートフォリオ] 以外のレンズエンティティとの m2m 関係を作成した場合は、それらのレンズエンティティを目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルから目標テーブルに移行して、それぞれのポートフォリオ計画内でこれらのレンズエンティティの目標にアクセスして管理します。
- アサインされたエンティティの目標関係データの移行は 1 回限りの作業であり、スケジュールして実行することを意図したものではありません。
- [会社]、[事業部門]、[部門]、[ポートフォリオ] レンズエンティティタイプ以外のカスタマイズされたレンズがある場合、ジョブを実行すると、目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルのデータに基づく [目標] フォーム にある [アサインされたエンティティタイプ] フィールドと [アサインされたエンティティ] フィールドに値が入力されます。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. *`Migrate goal relationships for assigned entities`* スケジュール済みジョブを検索してクリックします。
3. スケジュール済みスクリプト実行フォームで：
   a. [実行] フィールドで頻度が [オンデマンド] に選択されていることを確認します。
   b. [このスクリプトを実行] フィールドに、目標関係データを移行する、目標がアサインされたエンティティ構成 [sn_gf_assigned_entity_config] テーブルで構成されたエンティティをリストします。
   パラメーターの詳細については、「スケジュール済みスクリプト実行フォーム」を参照して ください。
4. [今すぐ実行する] をクリックします。

ターゲット自動化のためのターゲットソースの構成

目標のターゲットを設定するときに目標ユーザーがターゲットソースを定義できるように、ターゲット自動化のターゲットソースを構成します。ターゲットのターゲットソースを定義すると、ターゲットの実際の値が自動的に更新されます。

次の手順は、ターゲットソースを構成するガイドラインとして使用してください。

1. ターゲットのターゲットソースを作成して、ターゲットの実績値を更新するためのソースとして構成します。詳細については、「ターゲットソースの作成」を参照してください。

   コンテキスト変数は、ターゲットソースタイプ [アセスメント/サーベイ] および [PA インジケーター] に必要です。ターゲットソースの作成中にアセスメント/サーベイまたは PA インジケーターとしてタイプが選択されている場合、必須コンテキスト変数が自動的に作成されます。必須のコン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テキスト変数が作成されるタイミングの詳細については、「ターゲットソースのコンテキスト変数」を参照してください。

2. 必要な場合は、ターゲットソースのコンテキスト変数を作成して、コンテキスト変数から必要なデータをフェッチしてターゲットの実績値を更新します。詳細については、「ターゲットソースのコンテキスト変数を作成」を参照してください。


ターゲットソースのコンテキスト変数

コンテキスト変数は、ターゲットフォームで必要なデータをフェッチし、ターゲットフォームの [実績値] フィールドを自動更新するために使用できるターゲットソースの追加構成です。コンテキスト変数は、ターゲットソースタイプ [アセスメント/サーベイ] および [PA インジケーター] に必要です。

ターゲットソースを作成する前に SPM のゴールフレームワーク スコープが選択されている場合、(アセスメント/サーベイおよび PA インジケータータイプの) ターゲットソースに対して、コンテキスト変数が (コンテキスト変数フォームで [必須] フィールドが **true** に設定された状態で) 自動的に作成されます。自動的に作成されたコンテキスト変数は、必須コンテキスト変数とも呼ばれます。

必須のコンテキスト変数は、SPM のゴールフレームワーク スコープを選択し、次のいずれかの条件を満たしている場合に作成されます。

- (ターゲットソースタイプが [アセスメント/サーベイ] の場合) [ターゲットソース] フォームで、[タイプ] フィールドが [アセスメント/サーベイ] に設定され、**[**アセスメントメトリクスタイプ] フィールドに [評価方法 = アセスメント] のメトリクスタイプが入力されます。



- (ターゲットソースタイプが PA インジケーターの場合) [ターゲットソース] フォームで、[タイプ] フィールドが **[PA** インジケーター] に設定され、[ブレークダウン] フィールドに入力される値が選択肢リストタイプではありません。

  [ブレークダウン] フィールドが選択リストタイプであるターゲットソースタイプ、PA インジケーターのコンテキスト変数を作成するには、「ターゲットソースタイプ PA インジケーターのコンテキスト変数の作成」を参照してください。

注:
必須のコンテキスト変数は削除できません。

ターゲットソースのコンテキスト変数を手動で作成し、それらを使用して、ターゲットフォームで必要なデータをフェッチして [実績値] フィールドを自動更新するように設定することもできます。手動でコンテキスト変数を作成する方法の詳細については、「ターゲットソースのコンテキスト変数の作成」を参照してください。

ターゲットの実績値を自動化するためのターゲットソースの作成

ターゲットソースを作成して、目標ユーザーがターゲットの実績値を自動化するように構成できるようにします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
アプリケーションの SPM のゴールフレームワーク スコープを選択します。

必要なロール：sn_gf.goal_admin

このタスクについて
コンテキスト変数は、ターゲットソースタイプ [アセスメント/サーベイ] および [PA インジケーター] に必要です。ターゲットソースの作成中にアセスメント/サーベイまたは PA インジケーターとしてタイプが選択されている場合、必須コンテキスト変数が自動的に作成されます。必須のコンテキスト変数が作成されるタイミングの詳細については、「ターゲットソースのコンテキスト変数」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > エンタープライズゴール管理 > ターゲットソース.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「ターゲットソースフォーム」を参照して ください。
4. [送信] をクリックします。

ターゲットソースのコンテキスト変数の作成

ターゲットソースにさらにコンテキスト変数を設定する場合は、コンテキスト変数を手動で作成します。

始める前に
アプリケーションの SPM のゴールフレームワーク スコープを選択します。

必要なロール：sn_gf.goal_admin

このタスクについて
コンテキスト変数は、必要なデータをフェッチし、ターゲットフォームの [実績値] を自動更新するために使用できる情報を提供します。ターゲットソースのコンテキスト変数が作成された後、目標ユーザーは、実績値が自動的に更新されるように、ターゲットフォームの [実績値ソース構成] セクションを設定できます。

コンテキスト変数の作成は、テーブルでの列の作成に似ています。

ターゲットソースタイプが PA インジケーターで、ブレークダウンが選択リストタイプのコンテキスト変数を作成する方法については、「ターゲットソースタイプ PA インジケーターのコンテキスト変数の作成」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > エンタープライズゴール管理 > ターゲットソース.
2. コンテキスト変数を作成する必要なターゲットソースを開きます。
3. [コンテンツの変数] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「コンテキスト変数フォーム」を参照して ください。
5. [送信] をクリックします。

ターゲットソースタイプ **PA** インジケーターのコンテキスト変数の作成

[ブレークダウン] フィールドが選択リストタイプである場合、ターゲットソースタイプ PA インジケーターのコンテキスト変数を手動で作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
アプリケーションの SPM のゴールフレームワーク スコープを選択します。

必要なロール：sn_gf.goal_admin

このタスクについて
コンテキスト変数は、必要なデータをフェッチし、ターゲットフォームの [実績値] を自動更新するために使用できる情報を提供します。ターゲットソースのコンテキスト変数が作成された後、目標ユーザーは、実績値が自動的に更新されるように、ターゲットフォームの [実績値ソース構成] セクションを設定できます。

コンテキスト変数の作成は、テーブルでの列の作成に似ています。

手順

1. 移動先 すべて > エンタープライズゴール管理 > ターゲットソース.
2. コンテキスト変数を作成する必要なターゲットソースを開きます。
3. [コンテンツの変数] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. フォームで [タイプ] フィールドを選択肢として入力し、他のフィールドを必要に応じて入力します。
   フィールド値の説明については、「コンテキスト変数フォーム」を参照してください。
5. [送信] をクリックします。
   選択肢タイプのコンテキスト変数が作成されます。
6. 作成したコンテキスト変数の [選択肢] 関連リストで、[新規] をクリックします。

   注:
   [コンテキスト変数] フォームに [選択肢] 関連リストが表示されない場合は、 構成 > 関連リスト フィードバックを得ます

7. フォームで、フィールドに入力します。

   選択肢フォーム

フィールド	説明
テーブル	選択肢を作成するコンテキスト変数の名前。
要素	選択肢を作成するコンテキスト変数フォームの列名。
ラベル	選択肢の名前。
値	コンテキスト変数を作成する選択肢の値の Sys_id。 辞書エントリ [sys_dictionary] テーブルの [選択肢] 関連リストから sys_id をコピーできます。

8. [送信] をクリックします。
9. オプション: ステップ 6 ～ 8 を繰り返して、コンテキスト変数の選択肢をさらに作成します。

次のタスク
目標ユーザーは、ターゲットソースが構成されるターゲットフォームでこれらの選択肢をコンテキスト変数として構成できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カスタム測定単位の定義

カスタム測定単位を定義すると、目標ユーザーが選択に従ってターゲットの測定単位を設定できます。測定単位には、定量的および定性的の 2 種類があります。

デフォルトでは、定量的ターゲットに使用可能な単位は **[#]**、**[$]**、**[%]**、および [日] です。デフォルトでは、定性的ターゲットに使用可能な単位は [はい]/[いいえ] です。

アドミニストレーターはカスタム測定単位を作成し、目標ユーザーがそれを使用してターゲットの測定単位を設定できるようにする必要があります。

- 定量的ターゲットの場合は、単位 [sn_gf_unit] テーブルからカスタム測定単位を定義できます。
- 定性的ターゲットの場合は、最初に選択セットを作成してから、選択セットの選択リストを作成する必要があります。




戦略的計画での優先順位付けの表示設定

関連する情報を計画立案マネージャーが表示できるように、ワークスペースの [優先順位付け] タブでのデータの表示方法を構成します。

戦略的計画 での優先順位付けのために追加する列の構成

ポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページのデフォルトの列構成をカスタマイズして、計画マネージャーが、必要なデータポイントを適切に選択できるようにします。

ポートフォリオマネージャーまたはプロダクトオーナーは、ワークスペースの [優先順位付け] ページにある [カスタマイズ] サイドパネルを使用して、計画立案アイテムのデータを表示したり非表示にしたりすることができます。デフォルトでは、リストビューおよび階層ビューのこのサイドパネルには、その計画立案アイテムで利用可能なすべてのデフォルトフィールドが表示されます。たとえば、計画マネージャーが追加の列を表示する場合は、ドット連結フィールドからの情報が必要になる可能性があります。このような場合、または既存の選択肢を削除するには、アドミンロールを使用して設定できます。

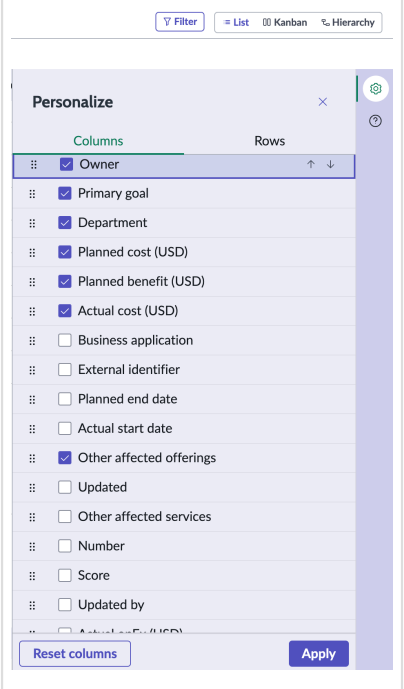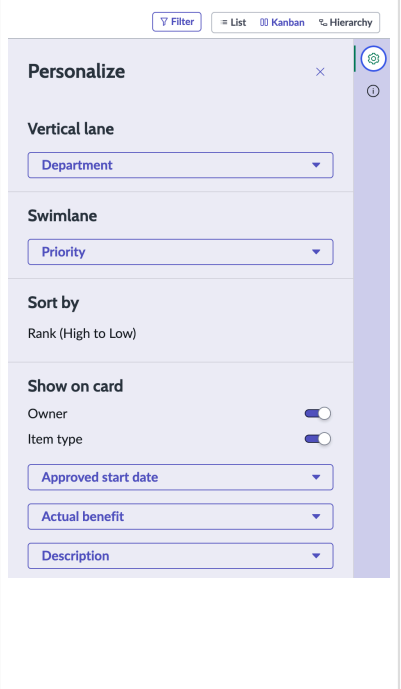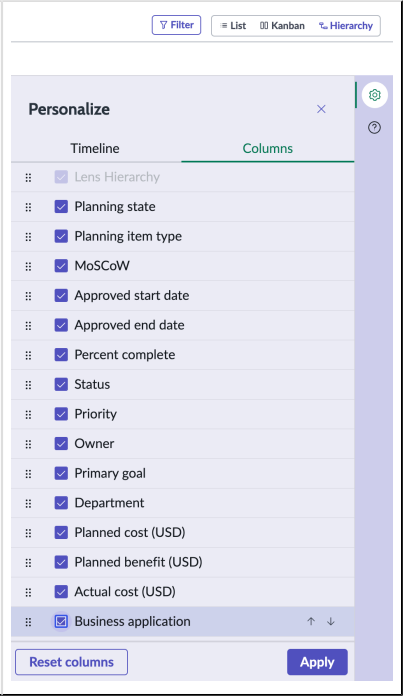リストビューの設定をカスタマイズする	カンバンビューの設定をカスタマイズする	階層ビューの設定をカスタマイズする
		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このサイドパネルに追加の列を選択肢として追加するか、ポートフォリオ計画に関連付けられた計画立案アイテムタイプのリストレイアウト構成を更新して、デフォルトの列の選択肢を削除します。

- ポートフォリオ計画に複数のアイテムタイプが関連付けられている場合は、計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] テーブルのビュー構成を更新します。
- ポートフォリオ計画に単一のアイテムタイプが関連付けられている場合、関連するテーブルのビュー構成を更新します。

識別されたテーブルのフォームビューから、ビューを **[APW** の優先順位付け] に変更し、リストレイアウトを更新します。リストレイアウト構成を更新する詳細な手順については、「リストのレイアウトの構成」を参照してください。

注:
リスト v3 は、新しい展開では使用できなくなりました。既にリスト v3 を使用している場合は引き続き使用できますが、この場合、一部の機能が利用できない可能性があります。

戦略的計画ワークスペースの [優先順位付け] ページでハイライト表示されたフィールドのカスタマイズ

計画マネージャーのニーズに応じて、ポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページで強調表示されるフィールドをカスタマイズします。

デフォルトでは、ポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページのリストビューおよび階層ビューで、計画立案アイテムの [計画ステータス] および [ステータス]フィールドが色付きでハイライト表示されます。計画立案マネージャーの要件に基づいて、 [所有者] または [優先度] などの選択肢タイプのフィールドを、ページ上でのハイライト表示される列になるように構成できます。このカスタマイズでは次を行う必要があります。

- 優先順位付けビュー [スクリプトインクルード] (リストビューの場合は APWBacklogConfigImpl、階層ビューの場合は APWGanttConfigImpl) の変更
- sys_highlighted_value テーブルの必須フィールドに対する新しいレコードの設定

戦略的計画 で [優先順位付け] ページのスクリプトインクルードを変更

[優先順位付け] ページのリストビューと階層ビューのスクリプトインクルードを変更して、ワークスペースのこれらのビューでハイライト表示される列を変更します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード.
2. リストから、次のいずれかを選択します。
   - リストビューの場合は、[APWBacklogConfigImpl] を選択します。
   - 階層ビューの場合は、[APWGanttConfigImpl] を選択します。
3. スクリプトインクルードの [スクリプト] フィールドの列名を更新します。

   `getColumnsForHighlightedValues` 関数で、戻り値を目的の列に更新します。

   たとえば、[優先度] 列を強調表示する場合は、戻り値を `("planning_state", "state", "priority")` に更新します。

4. **[Update** (更新)] を選択します。

次のタスク
戦略的計画 の [優先順位付け] 列でハイライト表示される新しい値の作成

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

戦略的計画 の [優先順位付け] 列でハイライト表示される新しい値の作成

計画マネージャーのニーズに応じて、ポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページで強調表示されるフィールドをカスタマイズします。

始める前に

戦略的計画 で [優先順位付け] ページのスクリプトインクルードを変更。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ワークスペースエクスペリエンス > アドミニストレーション > ハイライト表示される値.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「ハイライト表示される値フォーム」を参照してください。
4. フォームを保存します。
5. [ハイライト表示される値の条件] 関連リストで、ワークスペースでハイライト表示する各フィールド値の色、順序、およびアイコンを構成するレコードを作成します。

   a. [新規] を選択します。

   b. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「ハイライト表示される値の条件フォーム」を参照してください。

   c. [送信] を選択します。

6. ステップ 5 を繰り返して、すべてのフィールド値に対してこの構成を完了します。
   たとえば、[ステータス] 列を設定している場合、 [ハイライト表示される値の条件] 関連リストで、選択肢の [赤]、 [緑]、[黄] のそれぞれに対して 3 つのレコードを作成する必要があります。
7. **[Update** (更新)] を選択します。

でのマイルストーンアイコンのスクリプトインクルードの変更 戦略的計画

ロードマップおよびポートフォリオ計画のマイルストーンアイコンのスクリプトインクルードを変更して、ワークスペースの [ロードマップ] タブに表示されるアイコンをカスタマイズします。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード.
2. リストから [RoadmapMilestoneAPIImpl] を選択します。
3. スクリプトインクルードの スクリプト フィールドでマイルストーンアイコンタイプを更新します。
   `getMilestoneMetadata` メソッドで、戻り値を必要なアイコンに更新します。


   たとえば、主要なイベントマイルストーンに円の感嘆符アイコン ()を表示する場合は、key_eventマイルストーンの戻り値を 「circle-exclamation-outline」 に更新します。

   デフォルトのアイコンは次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- key_event: 'flag-fill'
- launch_date: 「ロケットシップ・フィル」
- important_date: 'calendar-clock-fill'
- key_milestone: 「ダイヤモンドフィル」
- 締め切り: 「スターフィル」

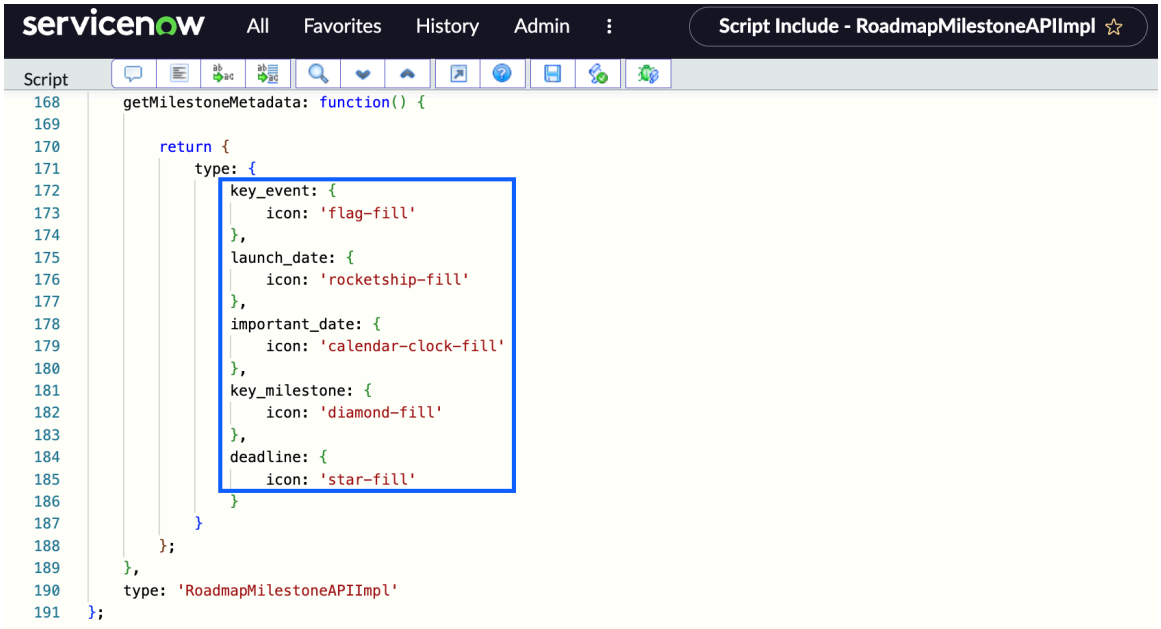

4. **[Update** (更新)] を選択します。

優先順位付けおよびロードマップのアイテムの表示制限の更新

戦略的計画 Workspace の優先順位付けビューおよびロードマップビューに表示されるアイテムの表示制限を更新するシステムプロパティを作成します。

始める前に

インスタンスのアプリケーションスコープが [グローバル] に設定されていることを確認します。

必要なロール：admin

このタスクについて

[優先順位付け] ページと [ロードマップ] ページのデフォルトの表示制限は、次のとおりです。

- 優先順位付けビューに表示される計画立案アイテム = 250
- ロードマップビューに表示されるロードマップアイテム = 250
- 階層ビューに表示される目標 = 250
- ロードマップビューのアイテムレベルのマイルストーン = 100
- すべてのカンバンビューに表示されるアイテム = 250
- すべてのカンバンビューに表示されるレーン = 30

合計数がこれらのデフォルト制限を超えた場合、追加の数の計画立案アイテムとマイルストーンインジケーター、および垂直レーンは、ワークスペースに表示されません。このデフォルト設定を上書きするには、システムプロパティを作成し、その値を目的の表示制限値に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:
システムプロパティの値がデフォルト値を超えると、UI のパフォーマンスが低下する可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > すべてのプロパティ.
   システムプロパティ [sys_properties] テーブル内の全プロパティのリストが表示されます。
2. [新規] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。
   その他のフォームフィールドの詳細については、「システムプロパティの追加」のフィールド説明テーブルを参照してください。
4. [送信] を選択します。

フリーフォームロードマップの追加のソーステーブルを構成

ロードマップ設定に新しいテーブルを追加して詳細を設定し、戦略的計画 でのフリーフォームロードマップの作成時にこれらのテーブルをソーステーブルとして使用できるようにします。

始める前に
戦略的計画 のインストール。

必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > ポートフォリオ計画の構成.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

   フィールドの詳細については、「[ポートフォリオ計画の構成] フォーム」を参照してください。
4. [送信] を選択します。

優先順位付けとロードマップのための計画立案アイテムの表示設定のカスタマイズ

優先順位付け、ポートフォリオ計画ロードマップ、およびフリーフォームロードマップページでの計画立案アイテム属性のデフォルトの表示構成を更新して、関連するデータが 戦略的計画 Workspace に表示されるようにします。

始める前に
戦略的計画 のインストール。

必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

このタスクについて
以下のページで、[グループ] フィールド、[色別] フィールド、[メトリクス] フィールドなどの計画立案アイテムの表示のデフォルト設定、およびカンバン設定 (デフォルトの垂直レーンや水平レーン、カンバンカードのメトリクスなど) を更新します。

- ポートフォリオ計画：
  - カンバンの優先順位付けビュー
  - ロードマップタイムラインビュー
  - ロードマップカンバンビュー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- フリーフォームロードマップ：
  - タイムラインビュー
  - カンバンビュー

これらの構成のオプションは、次のとおりです。

テーブル構成

設定テーブル	フィールド
ロードマップタイムラインの構成	• フィールド別のグループ • フィールド別の色 • メトリクスフィールド • ステータスフィールド • 完了率フィールド
カンバンの構成	優先順位付け、ロードマップ、およびフリーフォームロードマップのタブ： • 水平レーン • 垂直レーン • カンバンカードのメトリクス
ランクの構成	ランクの構成

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > ポートフォリオ計画の構成.
2. 構成を編集するテーブルを開きます。
3. 必須フィールドを編集します。
   フィールドの詳細については、「[ポートフォリオ計画の構成] フォーム」を参照してください。
4. [更新] を選択します。

戦略的計画 の階層ビューの表示構成

システムプロパティを構成することで、上位レベルおよび通常のポートフォリオ計画の階層ビューに表示される計画立案アイテムの親レコードを表示または非表示にします。

階層ビューに空の親エンティティを表示する

[優先順位付け] タブの階層ビューでは、関連付けられた計画立案アイテムがある場合にのみ、親レコードが表示されます。


たとえば、組織レンズ ([会社] > [事業部門] > [部門]) から作成されたポートフォリオ計画は、デマンドとプロジェクトの計画を管理および追跡するために使用されます。そのため、優先順位付け階層ビューに切り替えると、少なくとも 1 つのデマンドまたはプロジェクトが関連付けられている部門のみがビューに表示されます。

このポートフォリオ計画に含まれていても、計画立案アイテムが関連付けられていない他の部門を表示する場合は、アドミニストレーターと協力してシステムプロパティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

sn_align_ws.gantt_hide_empty_entities を作成し、それを **false** に設定します。

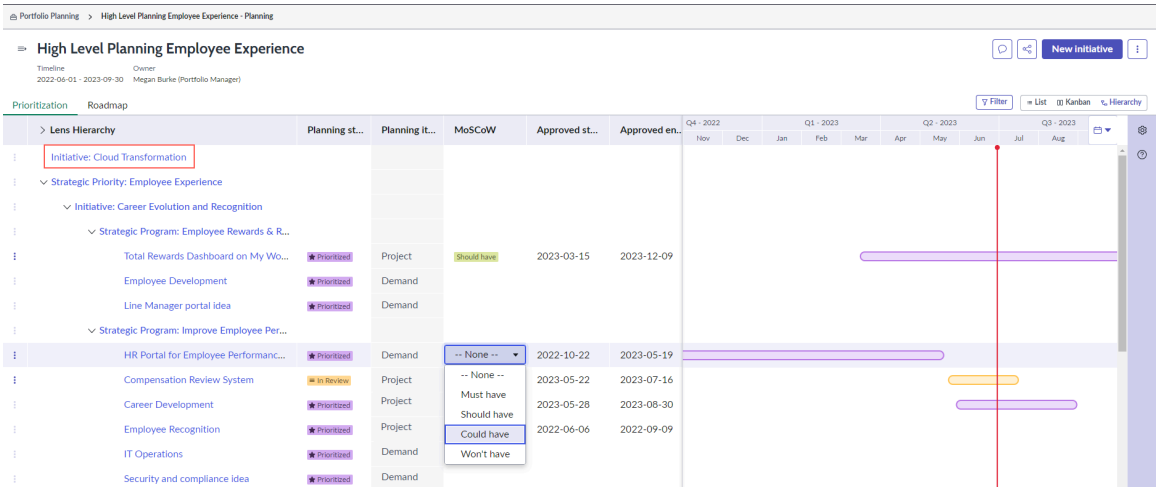


上位レベルのポートフォリオ計画の完全な階層を表示する

上位レベルのポートフォリオ計画の場合、階層ビューにはデフォルトで親レベルまでの階層のみが表示されます。

たとえば、戦略的投資レンズ ([会社] > [戦略的優先事項] > [イニシアチブ] > [戦略的プログラム]) から作成されたポートフォリオ計画は、戦略的プログラムの計画を管理および追跡するために使用されます。そのため、優先順位付け階層ビューに切り替えると、デフォルトでは [戦略的優先事項] > [イニシアチブ] レベルのみが表示されます。

戦略的優先事項>イニシアチブ>戦略的プログラム>計画立案アイテムの階層全体を表示する場合は、アドミニストレーターと協力してシステムプロパティを作成します **true**.

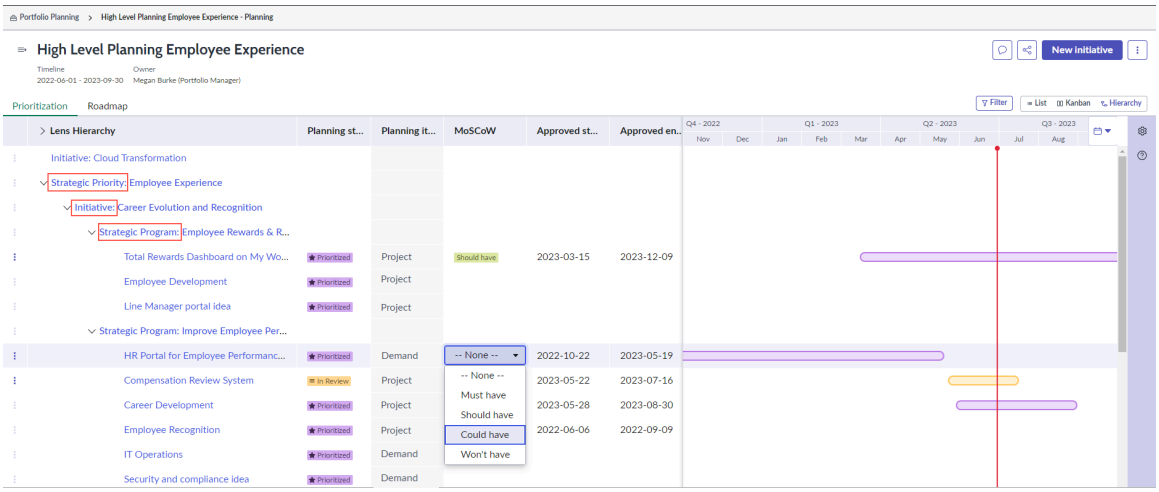

でのシナリオ計画の構成 戦略的計画

戦略的計画でシナリオ計画を構成して、複数のシナリオを作成および比較します。

1. シナリオ計画を有効または無効にします。

   詳細については、「戦略的計画でのシナリオ計画の有効化または無効化」を参照してください。

2. シナリオの比較ページで財務ウィジェットを管理します。

   比較ビューにウィジェットを追加および管理する方法の詳細については、「 比較シナリオでの財務ウィジェットの構成」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的計画でのシナリオ計画の有効化または無効化


戦略的計画でシナリオ計画を有効化または無効化します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
シナリオ計画はデフォルトで有効です。次の手順を使用して、必要に応じてシナリオ計画を無効または有効にします。

手順

1. [すべて] > [システムプロパティ] に移動します。
2. *sn_align_ws.is_scenario_planning_disabled* プロパティを検索します。



3. プロパティの値を確認します。
   - シナリオ計画を有効にするには、プロパティが **[False]** に設定されていることを確認します。
   - シナリオ計画を無効にするには、プロパティが **[True]** に設定されていることを確認します。

次のタスク
シナリオの作成

比較シナリオでの財務ウィジェットの構成


既存のウィジェットを追加または管理して、シナリオを比較しながら財務インサイトを表示します。コストタイプから独自の属性を定義して、[シナリオを比較] ページで詳細を表示します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > ウィジェット.
2. [ウィジェット] リストで、[シナリオを比較] で [簡単な説明] をフィルタリングして既存のリストを表示します。

   デフォルトでは、シナリオの財務実績を比較するために 5 つの財務ウィジェットが有効になっています。

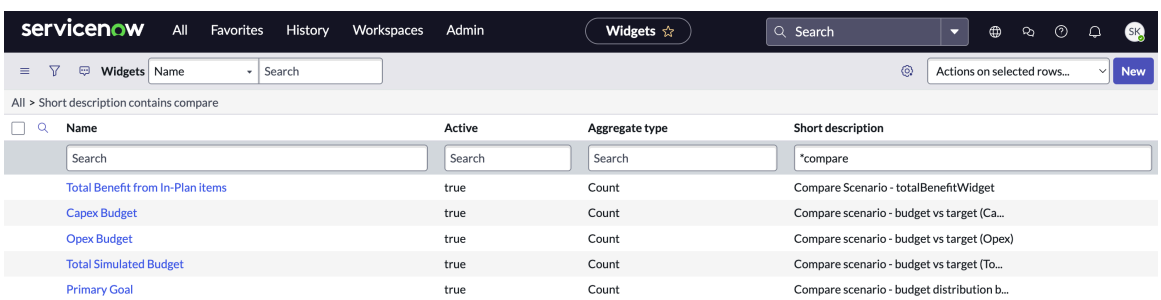

3. 既存のウィジェットを編集するか、シナリオ計画で使用するウィジェットを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. **[Submit** (送信)] を選択します。

のキャパシティ構成 戦略的計画

リソースの従業員プロファイルを生成し、それをプライマリ属性にマッピングして、キャパシティ計画立案を開始します。

- キャパシティの計画立案属性を有効にして、リソースを一意の属性にマッピングします。詳細については、「でのキャパシティの計画属性の有効化 戦略的計画」を参照してください。
- リソースのアサインを作成し、従業員プロファイルを生成します。詳細については、「作業するリソースの従業員プロファイルの生成 キャパシティ」を参照してください。
- リソースを一意のグループ、ロール、およびスキルにマッピングして、従業員プロファイルを生成します。詳細については、「プライマリ属性をリソースにマッピング」を参照してください。

でのキャパシティの計画属性の有効化 戦略的計画

計画立案マネージャーがリソースキャパシティの詳細を表示できるように、計画属性の [グループ]、[スキル]、および [ロール] を有効にします。

始める前に
必要なロール：admin

注:
このアクティブ化は、計画属性を有効にしてリソースキャパシティを計画および処理できるようにするための 1 回限りのタスクです。


手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 計画立案属性.
2. [属性名] をフィルタリングして、[グループ] 属性を見つけて開きます。
3. [キャパシティ計画立案を有効にします] オプションを選択します。
4. [更新] を選択します。


注:
キャパシティ計画立案で属性が有効になっている場合、リソース管理ではその属性がデフォルトで有効になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

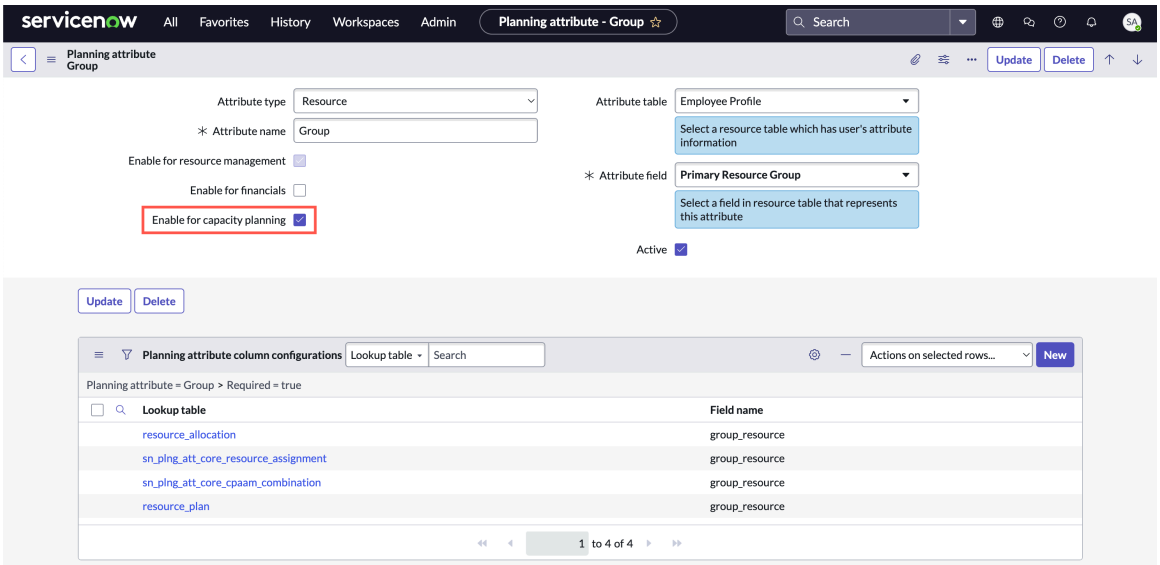

5. [スキル] 属性と [ロール] 属性について、ステップ 2 ~ 4 を繰り返します。

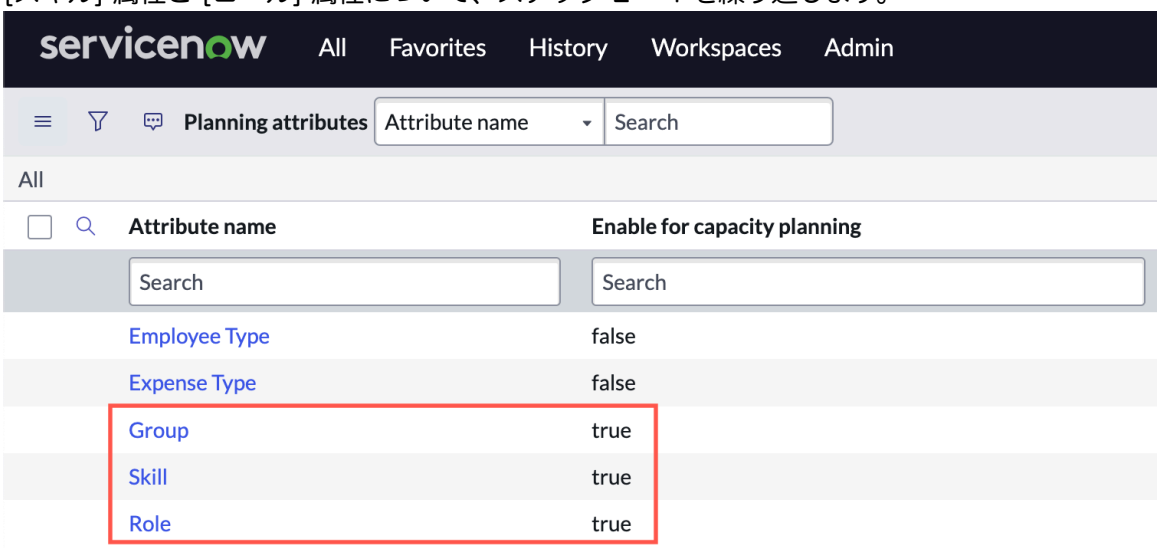

カスタム属性を作成してリソースにマップできます。詳細については、「計画立案属性の作成または編集」を参照してください。

6. [グループ]、[ロール]、および [スキル] フィールドの [キャパシティ計画立案を有効にします] 列の値を **true** に設定します。

作業するリソースの従業員プロファイルの生成 キャパシティ

プライマリ属性に対してマッピングするリソースの従業員プロファイルを生成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 従業員プロファイル > 従業員の定義.
2. 名前をフィルタリングして **sys_user** テーブルを見つけて開きます。
3. [従業員の定義] ページで、テーブルリストから [ユーザー] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 条件ビルダーを使用して必要なリソースをフィルタリングし、更新数アイコン ( ) を選択します。
5. [従業員プロファイルを生成] (Generate Employee Profiles) を選択します。
6. [従業員プロファイルを生成] ウィンドウで、[続行] を選択します。

タスクの結果
選択したリソースの従業員プロファイルが生成されます。

次のタスク
リソースのプライマリグループ、プライマリロール、およびプライマリスキルに従業員プロファイルを入力します。詳細については、「プライマリ属性をリソースにマッピング」を参照してください。

プライマリ属性をリソースにマッピング

既存の従業員プロファイルテーブルに関連付けられているリソースのプライマリグループ、プライマリロール、およびプライマリスキルを探してマッピングします。

始める前に
作業するリソースの従業員プロファイルの生成 キャパシティ。

必要なロール：admin

手順
1. 移動先 すべて > 従業員プロファイル > 従業員プロファイル.
2. [ユーザー] 列をフィルタリングして、従業員プロファイルを含むリソースを見つけて開きます。
3. [プライマリリソース属性を入力します] 関連リンクを選択すると、属性が自動入力されます。
   - 従業員が単一のグループ、ロール、およびスキルにアサインされている場合は、プライマリ属性が入力されます。
   - 従業員が複数のグループ、スキル、またはロールにアサインされている場合は、ルックアップアイコンを使用して、[プライマリリソースグループ]、[プライマリリソースロール]、および [プライマリリソーススキル] を選択します。
4. [更新] を選択します。

リソースキャパシティを自動的に生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化

スケジュール済みジョブをアクティブ化して、必要な頻度でリソースキャパシティを自動生成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順
1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [名前] フィールドをフィルタリングし、[リソースキャパシティの生成] を見つけて開きます。
3. [アクティブ] オプションを選択して、スケジュールジョブをアクティブにします。
4. [スケジュール済みスクリプト実行] フォームのフィールドを編集してジョブをカスタマイズし、要件を満たします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールドの説明とスクリプトの詳細については、「Automatically run a script of your choosing」を参照してください。

5. [今すぐ実行] を選択してスケジュール済みジョブを実行するか、[更新] を選択して変更を保存します。

計画立案アイテムの財務の構成 戦略的計画

戦略的計画 の計画立案アイテムの財務情報が表示されるように ServiceNow 内部統合を構成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 作業アイテムへのリソースのアサインに基づいて財務で人件費を生成するように属性を構成します。
詳細については、「Planning 属性の使用」と「計画立案属性の作成または編集」を参照。
2. デフォルトのマッピング構成を生成してテーブルマップを作成します。
詳細については、「デフォルトのマッピング構成を生成」を参照してください。
3. ファイナンシャルプランで作業するエピックの財務を有効にします。
詳細については、「での 計画立案アイテム の財務の有効化 戦略的計画」を参照してください。
4. 予算割り当てを有効にし、予算属性、原価費目、または経費タイプを定義して、計画立案アイテムに予算を割り当てます。
詳細については、「 戦略的計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化 」と「 予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する
5. ワークスペースビューで計画立案アイテムの金銭的および金銭以外の利益計画関連リストを有効にします。
詳細については、「計画立案アイテムの金銭的および金銭以外の利益計画の有効化」を参照してください。
6. ロールアップされた財務データを計画立案アイテムレベルで表示するための新しいウィジェットを作成します。
詳細については、「ウィジェットの構成とプロジェクトへの関連付け」を参照してください。
7. オプション: 組織の要件に合わせて、[財務] 画面の左ペインをカスタマイズします。
詳細については、「財務の左ペインビューのカスタマイズ」を参照してください。
8. オプション: 組織の要件に合わせて [コスト計画を作成] フォームのフィールドをカスタマイズします。
詳細については、「[コスト計画] フォームのカスタマイズ」を参照してください。
9. デフォルトの経費タイプをカスタマイズして、計画立案アイテムのコスト計画を管理します。
詳細については、「計画立案アイテムのデフォルトの経費タイプの変更」を参照してください。
10. ベースライン名のカスタムプリフィックスを定義します。
詳細については、「ベースラインのカスタムプリフィックスの作成」を参照してください。
11. 計画立案アイテムの予算を自動的に移行するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
詳細については、「計画立案アイテムの予算を移行するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。
12. 計画立案アイテムの財務ベースラインを移行するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
詳細については、次を参照してください。 財務ベースラインの移行先 ネクストエクスペリエンス.
13. 計画立案アイテムの財務ベースラインを定義した周期で自動的に作成するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細については、「計画立案アイテムの財務ベースラインを作成するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。

14. 属性ベースのリソースのアサインに基づいて、計画立案アイテムの人件費を定義した周期で自動的に生成するスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
詳細については、「計画立案アイテムの人件費を生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。

での 計画立案アイテム の財務の有効化 戦略的計画

E財務 すべての計画立案アイテム の財務をアクティブ化して、財務見積もりを処理します。

始める前に
必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_admin

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > セットアップ > 投資エンティティ.
2. Table フィールドをフィルタリングして、**sn_align_core_scrum_epic** table を見つけます。
3. [投資エンティティ] テーブルビューで、[アクティブ] 列をダブルクリックし、リストから **[true]** を選択します。

戦略的計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化

戦略的計画を使用して計画立案アイテムの予算割り当てを処理するには、ネクストエクスペリエンスに移行した後に割り当てプロパティを有効にします。

始める前に

- ネクストエクスペリエンスで財務にアクセスする新規顧客の場合、このプロパティはデフォルトで有効になっています。
- 必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > プロパティ.
2. [名前] 列をフィルタリングして、**sn_invst_pln.enable_budget_allocation_v2** プロパティを見つけて開きます。
3. [値] フィールドを **[True]** に更新し、[更新] を選択します。

次のタスク
計画立案アイテムの予算管理に役立つ予算属性を設定します。詳細については、「予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する」を参照してください。

予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する

戦略的計画を使用して計画立案アイテムの予算割り当てを処理するには、経費タイプまたは原価費目で予算属性をインスタンスレベルとして構成します。

始める前に

- 計画立案アイテムの予算業務で機能するように予算割り当てプロパティを有効にします。詳細については、「戦略的計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化」を参照してください。
- 必要なロール：admin

注:
既存のお客様は、予算属性を cost_type に変更することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > プロパティ.
2. [名前] 列をフィルタリングして、**sn_invst_pln.budget_allocation_attribute** プロパティを見つけて開きます。
3. [値] フィールドを次のいずれかに更新します。
   - **cost_type** - ハードウェア経費、外部労働投資、ソフトウェア投資、ソフトウェア経費などの原価費目別の財務情報を表示します。
   - **expense_type** - 投資や経費などの経費タイプ別の財務情報を表示します。
4. [更新] を選択します。

計画立案アイテムの金銭的および金銭以外の利益計画の有効化

エピック、機能、機能などの計画立案アイテムタイプの金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連リストを有効にします。

始める前に

- これは、すべての計画立案アイテムの金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連リストを有効にして表示するための 1 回限りのアクティビティです。
- 必要なロール：admin


手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [ラベル] フィールドをフィルタリングして、計画立案アイテムタイプを特定します。
   - 機能の利益計画を有効にする場合は、[ラベル] フィールドをフィルタリングして 機能 [sn_align_core_feature] テーブルを見つけて開きます。
   - ケイパビリティの利益計画を有効にする場合は、[ラベル] フィールドをフィルタリングし、 ケイパビリティ [sn_align_core_capability] テーブルを見つけて開きます。
3. **[Show List** (リストを表示)] 関連リンクを選択します。
4. 機能またはケイパビリティのリストからレコードを開きます。
5. レコードページの編集可能なフォームが表示されない場合は、アプリケーションのスコープを変更します。
6. レコードページビューを **EAP** デフォルトに変更します。


   ビューを変更するには、[他のアクション] メニュー ( を選択し、[表示] を選択して、[**EAP Default**] ビューを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

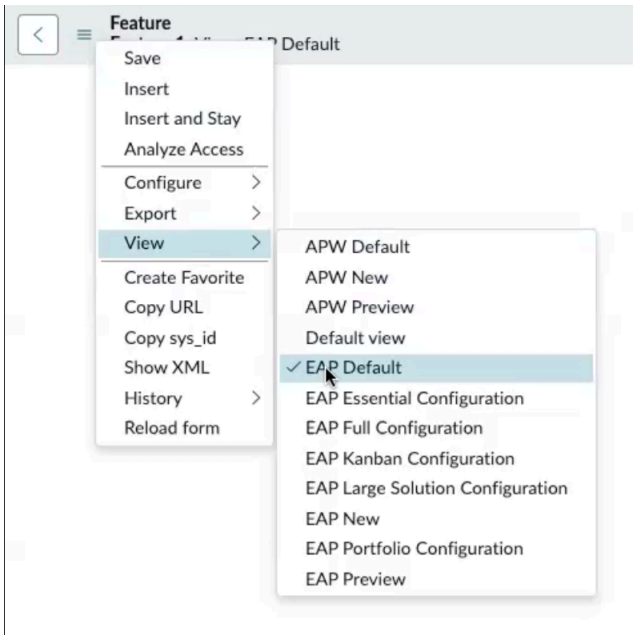

7. [他のアクション] メニュー ( ) を選択し、[構成] を選択して、[関連リスト] オプションを選択します。

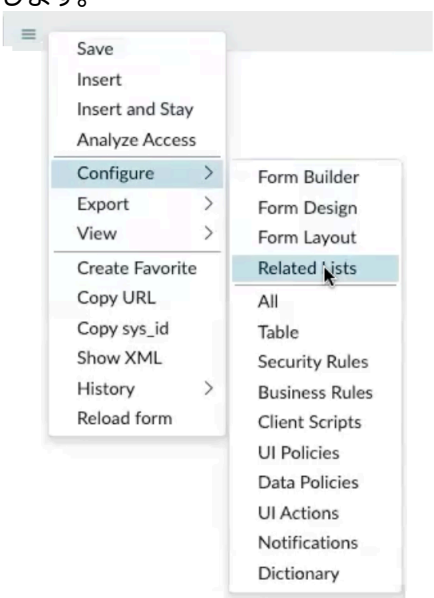

8. [利用可能] リストから [金銭的な利益計画] と [金 銭以外の利益計画] を選択し、[選択済み] リストに追加します。
9. **[Save** (保存)] を選択します。
10. 計画立案アイテムレコードページで [更新] を選択します。

次のタスク
計画立案アイテムの金銭的および金銭以外の利益計画を作成および管理します。

- での計画立案アイテムの金銭的利益計画の管理 戦略的計画
- での計画立案アイテムの金銭以外の利益計画の管理 戦略的計画

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウィジェットの構成とプロジェクトへの関連付け

ウィジェットを有効にして関連付け、大まかな作業アイテムの財務概要を表示します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > ウィジェット.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. ウィジェットの [新規レコード] フォームで、フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「ウィジェットの新規レコードフォーム」を参照してください。
4. [他のアクションメニュー] を選択し、[保存] を選択します。
5. [ウィジェットの関連性] 関連リストで、[新規] を選択します。
6. [ウィジェットの関連性] の [新規レコード] フォームで、フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「ウィジェットの関連性フォーム」を参照してください。
7. [送信] を選択します。


財務の左ペインビューのカスタマイズ

財務の左ペインをカスタマイズして、カスタムフィールド情報を表示します。

始める前に
必要なロール：admin

手順


1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [Label (ラベル)] フィールドをフィルターして、**[Cost Plan** (コスト計画)] テーブルを開きます。
3. **[Show List** (リストを表示)] 関連リンクを選択します。
4. に移動し、財務ビューを選択します リストコントロール > 表示 > 財務ビュー.



   選択したビュー ( ) がヘッダーに表示されます。
5. ヘッダーオプションを選択して、リストのレイアウトを構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

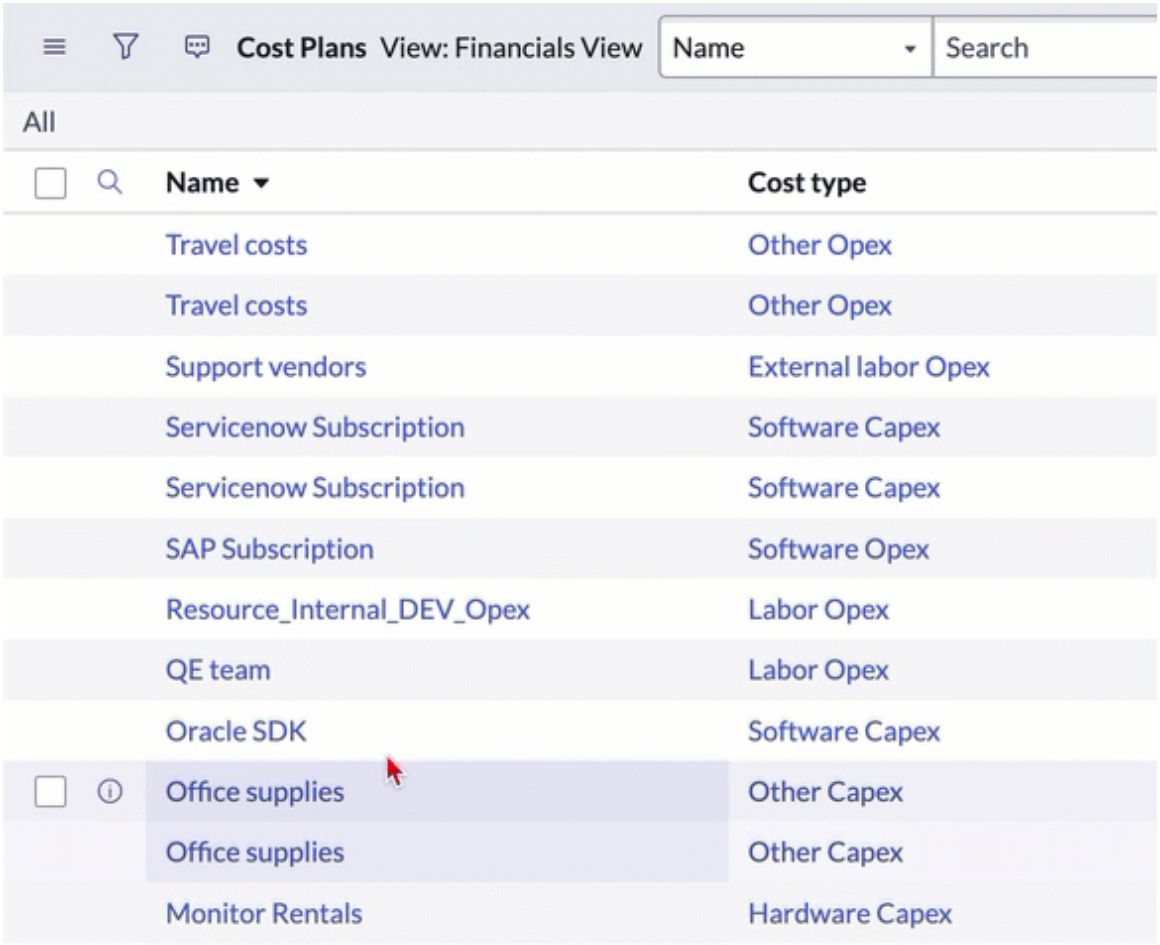

6. [選択済み] 列のフィールドを追加または削除して、財務ビューの左ペインビューをカスタマイズします。
7. [保存] を選択します。

タスクの結果
財務ビューのカスタマイズされたフィールドが含まれるコスト計画テーブルが表示されます。

[コスト計画] フォームのカスタマイズ

組織のニーズに応じて、新しいコスト計画フォームで必要なフィールドを管理します。

始める前に
必要なロール：admin

手順
1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [Label (ラベル)] フィールドをフィルターして、**[Cost Plan** (コスト計画)] テーブルを開きます。
3. [フォームをデザイン] 関連リンクを選択します。
4. ヘッダー行で、テーブルリストから [コスト計画 **[cost_plan]]** を選択し、ビューリストから [財務ビュー] を選択します。
5. このフォームでは次のことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [フィールド] 列から必要なフィールドをドラッグアンドドロップする。
- [フィールドを削除] アイコンを使用して、既存のフィールドを削除する。

6. [保存] を選択します。

計画立案アイテムのデフォルトの経費タイプの変更

デフォルトの経費タイプを設定して、計画立案アイテムのコスト計画を作成または編集します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > すべてのプロパティ.
2. 名前をフィルタリングし、**sn_plng_att_core.default.expense_type** テーブルを見つけて開きます。
3. 値フィールドを必要な経費タイプに変更し、 [保存] を選択します。
   デフォルト値は [Opex] です。

ベースラインのカスタムプリフィックスの作成

プリフィックスを変更して、計画立案アイテムのベースラインの名前をカスタマイズします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > すべてのプロパティ.
2. 入力した名前をフィルタリングして、**sn_invst_pln.baseline_prefix** を見つけて開きます。
3. [値] フィールドを変更して、ベースラインのカスタムプレフィックスを作成します。

   営業ポートフォリオを作成している場合は、[値] フィールドを「Sales baseline on」に変更できます。

4. [更新] を選択します。

Example:
2023 年 12 月 4 日に上記のプレフィックスを使用して営業プロジェクトのベースラインを作成しているとします。新しいベースラインの名前は「**Sales baseline on 2023-12-04**」になります。

カスタム人件費を作成して**sys_id**にマッピングする

カスタム人件費を作成してsys_idにマッピングし、関連する経費に基づいて人件費を生成します。

始める前に
必要なロール：admin

[store-future: BEGIN review]

このタスクについて
組織の要件に基づいて、カスタム労務費タイプを作成できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 組織で人件費のキャプチャに外部カテゴリまたは内部カテゴリを使用しない場合は、labor_capexやlabor_opexなどのカスタムコスト人件費タイプを作成して人件費をキャプチャし、一意のsys_idにマッピングします。
- 組織で人件費のキャプチャに投資または経費の分類を使用しない場合は、external_laborなどのカスタムコスト人件費タイプを作成して、それらを一意のsys_idにマッピングinternal_labor。

[End]

手順

1. カスタム人件費を作成します。
   a. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
   b. [Label] フィールドをフィルタリングして、開いている **[Cost Type Definition]** を見つけます。
   c. [関連リンク] から [リストを表示] を選択します。

      OOB 人件費のリストが表示されます。

   d. **[New** (新規)] を選択します。
   e. [コストタイプ定義] フォームで、フィールドに入力します。
      - 名前 :人件費計画の名前を入力します。

        ヒント:
        コストタイプ (投資または経費) を名前のサフィックスとして追加すると、コスト計画の作成時に簡単に識別できます。

      - 経費タイプ - リストから [投資] または [経費] を選択して経費を定義します。

      たとえば、ソフトウェア投資の人件費を作成して、ソフトウェアの購入経費をキャプチャすることができます。ハードウェアの購入費用を計上するためのハードウェア経費の人件費。

   f. [**Submit** (送信)] を選択します。

      新しいコスト計画がリストに表示されます。

   g. コスト計画の行を右クリックし、[**sys_id**のコピー] を選択します。
2. カスタム人件費をsys_idにマッピングします。
   a. 移動先 すべて > システムプロパティ > すべてのプロパティ.
   b. [Name (名前)] フィールドをフィルタリングして、**sn_plng_att_core.labor_costtype_sysid_mapping** プロパティを見つけて開きます。
   c. 値 フィールドに人件費タイプ名を入力すると、OOB 人件費マッピング形式と同じ形式でsys_idされます。
   d. **[Update** (更新)] を選択します。

[store-future: BEGIN review]

Example: デフォルトの初期設定の人件費とその**sys_id**のマッピング

```
{
 "labor_capex": "3d16eaf79330120064f572edb67ffb04",
 "labor_opex": "5b26eaf79330120064f572edb67ffb39",
 "external_labor_capex": "ed36eaf79330120064f572edb67ffb41",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "external_labor_opex": "7b36eaf79330120064f572edb67ffb58"
}
```

[End]

計画立案アイテムの予算を移行するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化

[アクティブなデマンドとプロジェクトの予算の移行 **(Migrate budget for active demands and projects)]** スケジュール済みジョブをアクティブ化して、アクティブな計画立案アイテムの予算をクラシック UI からネクストエクスペリエンスに移行します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. 名前フィールドをフィルタリングし、[アクティブなデマンドとプロジェクトの予算の移行 **(Migrate budget for active demands and projects)]** を見つけて開きます。
3. [アクティブ] オプションを選択して、スケジュールジョブをアクティブにします。
4. [スケジュール済みスクリプト実行] フォームのフィールドを編集してジョブをカスタマイズし、要件を満たします。
   フィールドの説明とスクリプトの詳細については、「Automatically run a script of your choosing」を参照してください。
5. [今すぐ実行] を選択してスケジュール済みジョブを実行するか、[更新] を選択して変更を保存します。

計画立案アイテムの財務ベースラインを作成するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化

計画立案アイテムの財務ベースラインを必要な周期で自動的に作成するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. 特定する名前フィールドをフィルタリングし、[計画立案アイテムの財務ベースラインを作成 **(Create Financial Baseline For Planning Items)]** を開きます。
3. [アクティブ] オプションを選択して、スケジュールジョブをアクティブにします。
4. [スケジュール済みスクリプト実行] フォームのフィールドを編集してジョブをカスタマイズし、要件を満たします。
   フィールドの説明とスクリプトの詳細については、「Automatically run a script of your choosing」を参照してください。
5. [今すぐ実行] を選択してスケジュール済みジョブを実行するか、[更新] を選択して変更を保存します。

計画立案アイテムの人件費を生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化

スケジュール済みジョブをアクティブ化して、属性ベースのリソースのアサインに対する人件費を自動的に生成します。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [名前] フィールドをフィルタリングして、[デマンドおよびプロジェクトの人件費を生成] と [エピックジョブの人件費を生成] を見つけて開きます。
3. [アクティブ] を選択し、[スケジュール済みスクリプト実行] フォームでフィールドに入力します。

   フィールド名の説明については、「計画立案アイテムの人件費を生成するための [スケジュール済みスクリプト実行] フォーム」を参照してください。

   注:
   非アクティブな計画立案アイテムの人件費を生成することができます。非アクティブな計画立案アイテムを含めるには、各計画立案アイテムの次のコード行から true を削除します。
   - エピック: `epicGr.addQuery("active", true);`
   - プロジェクト: `projectsGr.addQuery("active", true)`
   - デマンド: `demandGr.addQuery("active", true);`

4. [更新] を選択して変更を保存するか、[今すぐ実行] を選択してスケジュール済みジョブを実行します。

でのポートフォリオ財務の構成 戦略的計画

でポートフォリオ財務を表示および管理するためのプロパティとスケジュール済みジョブの構成の詳細 戦略的計画

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 内部計画立案アイテムタイプの統合を有効にします。
   詳細については、「デフォルトのマッピング構成を生成」を参照してください。
2. デマンド、プロジェクト、およびエピックの投資エンティティをアクティブ化します。
   詳細については、「計画立案アイテムの投資エンティティのアクティブ化」を参照してください。
3. 財務を表示するには、ロールアップシステムプロパティを true に設定します。
   詳細については、「プロジェクトのロールアッププロパティをアクティブ化してポートフォリオファイナンシャルを表示します」を参照してください。
4. データ生成スケジュール済みジョブをアクティブ化して、ポートフォリオ財務を表示します。
   詳細については、「ポートフォリオ財務を表示するためのデータを生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。

計画立案アイテムの投資エンティティのアクティブ化

デマンド、プロジェクト、およびエピックに設定された投資をアクティブ化して、ポートフォリオ財務を表示します。


始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. 名前フィールドをフィルタリングし、 投資エンティティ [sn_invst_pln_invst_funding_entity] テーブルを見つけて開きます。
3. [リストを表示] 関連リンクを選択します。
4. [デマンド]、[エピック]、および [プロジェクト] フィールドの [アクティブ] フィールドを **true** に設定します。

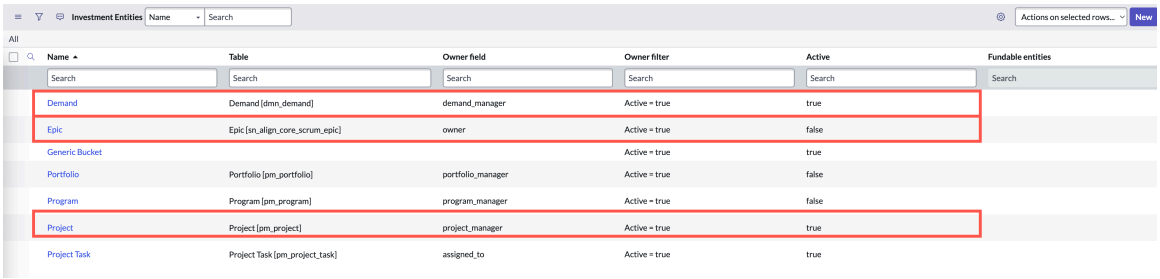

プロジェクトのロールアッププロパティをアクティブ化してポートフォリオファイナンシャルを表示します

プロジェクトコストロールアッププロパティをアクティブ化して、ポートフォリオファイナンシャルの上位プロジェクトのロールアップコストを表示します。

このタスクについて

このプロパティを true に設定すると、計画コスト、予測、実績コストなどの財務フィールドがサブプロジェクトからトッププロジェクトにロールアップされます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > すべてのプロパティ.
2. 名前フィールドをフィルタリングし、 **com.snc.project.rollup.cost** プロパティを選択します。
3. [値] フィールドに 「true 」と入力し、[更新] を選択します。

ポートフォリオ財務を表示するためのデータを生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化

古いデータモデルから新しいデータモデルに予算を移行し、ポートフォリオ財務を表示するための **SPW/PPW** スケジュール済みジョブで、財務データのデータ生成をアクティブ化および定義します。

このタスクについて

このスケジュール済みジョブを定義して実行し、ポートフォリオ財務を表示するのは 1 回限りのアクティビティです。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. 名前フィールドをフィルタリングして、 **SPW/PPW** で財務のデータ生成を見つけて開きます。
3. [アクティブ] オプションを選択してジョブをアクティブ化してスケジュールします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [スケジュール済みスクリプト実行] フォームのフィールドを編集してジョブをカスタマイズし、要件を満たします。

   フィールドの説明とスクリプトの詳細については、「Automatically run a script of your choosing」を参照してください。

5. [今すぐ実行] を選択して、スケジュール済みジョブを実行します。

タスクの結果

エピック、デマンド、およびプロジェクトのポートフォリオ財務を表示するために必要なすべてのマッピングがマッピングされます。

データ生成ジョブが成功したかどうかを検証するには、次の場所に移動します すべて > システム定義 > テーブル をクリックし、プロジェクト [sn_align_core_project] テーブルの投資レコードのマッピングを確認します。

戦略的計画でのリストのカスタマイズ

戦略的計画ワークスペースの [リスト] メニューにカスタムテーブルを追加し、新しく作成されたカテゴリとリストへのアクセスを管理できます。

リストをカスタマイズし、戦略的計画ワークスペースの [リスト] ページで新しく作成されたカテゴリとリストへのアクセスを管理するには、次のタスクを実行します。

- [新規] ボタンを [APW リストメニュー構成 (APW List Menu Configuration)] ページに追加します。詳細については、「リストメニューへのカスタムテーブル追加の有効化」を参照してください。
- [リスト] メニューにカスタムテーブルを追加します。詳細については、「戦略的計画 ワークスペースでのリストのカスタマイズ」を参照してください。
- [リスト] ページで新しく作成されたカテゴリとリストを表示できるユーザーを管理します。詳細については、「戦略的計画 での新しいリストの対象者を定義」を参照してください。

リストメニューへのカスタムテーブル追加の有効化

[APW リストメニュー構成 (APW List Menu Configuration)] ページに [新規] アクションボタンを追加して、戦略的計画ワークスペースのリストメニューにカスタムテーブルを追加できるようにします。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ワークスペースエクスペリエンス > アクション **&** コンポーネント > リストアクション.
2. [アクションのアサイン] ページで、[新規] を選択してアクションボタンを作成します。
3. フォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「アクションのアサインフォーム」を参照してください。
4. [送信] を選択します。

タスクの結果

[新規] アクションボタンを [APW リストメニュー構成 (APW List Menu Configuration)] ページに追加します。

次のタスク

戦略的計画 ワークスペースでのリストのカスタマイズ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

戦略的計画 ワークスペースでのリストのカスタマイズ

戦略的計画 ワークスペースの [リスト] メニューにカスタムテーブルを追加します。

始める前に

- アプリケーションスコープが [ポートフォリオ計画] に設定されていることを確認します。
- リストメニューへのカスタムテーブル追加の有効化。

必要なロール：admin

このタスクについて
ワークスペースホームページの [リスト] メニューは、計画マネージャーが必要なレコードをすばやく見つけるのに役立ちます。デフォルトでは、このビューには、この ServiceNow インスタンスで利用可能なすべての計画立案アイテムとレンズのエンティティのリストが表示されます。計画マネージャーがさらにカテゴリまたはリストを必要とする場合は、追加できます。

ワークスペースでのリストの構成の詳細については、「リスト」を参照してください。

手順

1. **[sys_ux_list_menu_config.list]** に移動します。
2. [UX リストメニュー構成] リストから、**[APW** リストメニュー構成] を選択します。
3. 新しいカテゴリまたは新しいリストを選択します。

   ヒント:
   最初にカテゴリを作成してから、リストを作成します。

4. フォームのフィールドに入力します。
   - UX リストカテゴリフォーム。
   - UX リストフォーム。
5. [送信] を選択します。
   すべてのカスタムカテゴリとリストを作成するまで、この手順を繰り返します。

次のタスク
戦略的計画 での新しいリストの対象者を定義。

戦略的計画 での新しいリストの対象者を定義

戦略的計画 ワークスペースの [リスト] ページで新しく作成されたカテゴリとリストを表示できるユーザーを管理します。

始める前に
戦略的計画 ワークスペースでのリストのカスタマイズ。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 **sys_ux_applicability_m2m_list.list**.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「リスト適用性フォーム」を参照してください。
4. [送信] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


戦略的計画 診断

計画立案マネージャーがポートフォリオ計画の作業に優先順位を付け、ロードマップを作成する前に、診断スキャンを実行して、 戦略的計画 の構成およびその他の一般的な設定のエラーを特定して修正します。

戦略的計画 診断スキャンは、以下に対する構成を検証することで、不一致を見つけるのに役立ちます。

- レンズとレンズ構造
- 計画立案アイテムのフォームビュー、リストビュー、関連リストビュー、およびワークスペースビューのルール
- 計画立案アイテムのグローバルランク
- ポートフォリオ計画
- 目標データ
- 上位レベルの計画立案エンティティ

戦略的計画で使用可能なデフォルトの診断スキャンは次のとおりです。

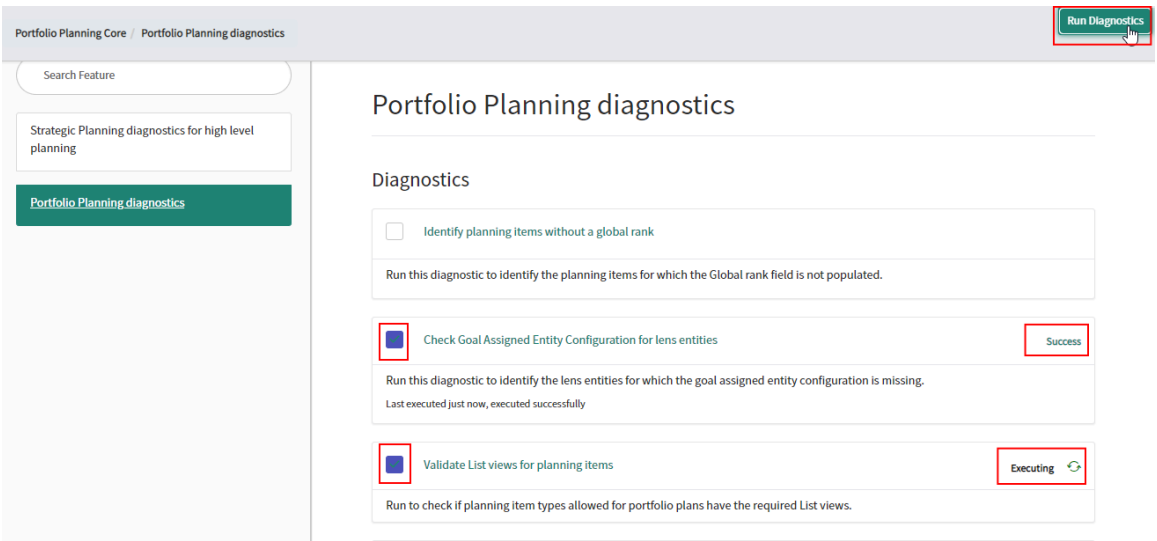

上位レベルの計画立案のための **Strategic Planning** 診断

フィールド	説明
上位レベルの計画立案エンティティのランク構成の検証 (Validate Rank configuration for the high-level planning entities)	上位レベルの計画立案が有効になっているエンティティにランク構成があることを確認します。 このテストが失敗した場合は、「上位レベルの計画立案に備えたランク構成の作成」を参照して失敗を修正してください。
上位レベルの計画立案エンティティのフォームセクションビューの検証 (Validate Form section views for high-level planning entities)	上位レベルの計画立案が有効になっているすべてのレンズエンティティに、必要なフォームセクションビューがあることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	このスキャンが失敗した場合、結果には、上位レベルの計画立案が有効になっている特定のエンティティに欠落しているフォームセクションビューが表示されます。 これらの修正方法については、「戦略的計画 での新しい計画立案アイテムテーブルのフォームビューの作成」を参照してください。
上位レベルの計画立案エンティティの関連リストビューの検証 (Validate Related list views for high-level planning entities)	上位レベルの計画立案が有効になっているすべてのレンズエンティティに、必要な関連リストビューがあることを確認します。 このスキャンが失敗した場合、結果には、上位レベルの計画立案が有効になっている特定のエンティティに欠落している関連リストビューが表示されます。 これらの修正方法については、「Strategic Planning での新しい計画立案アイテムタイプの関連リストビューの作成」を参照してください。
上位レベルの計画立案エンティティのリストビューの検証 (Validate List views for high-level planning entities)	上位レベルの計画立案が有効になっているすべてのレンズエンティティに、必要なリストビューがあることを確認します。 このスキャンが失敗した場合、結果には、特定の計画立案アイテムテーブルに欠落しているリストビューが表示されます。 これらの修正方法については、「Strategic Planning での新しい計画立案アイテムテーブルのリストビューの作成」を参照してください。
グローバルランクなしで、計画立案が有効になっている上位レベルの計画立案エンティティの特定 (Identify high-level planning entities enabled for planning, without a global rank)	グローバルランクがない上位レベルの計画立案エンティティの数を特定します。 このスキャンが失敗した場合、結果にはグローバルランクのない計画立案アイテムが表示されます。[修復スクリプトを実行] をクリックして、このフィールドが空のアイテムにグローバルランクを入力します。

ポートフォリオ計画 診断

計画立案アイテム、目標、およびポートフォリオ計画の一般的な構成エラーを検証するために使用できる診断スキャンは、次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スキャンの名前	説明
グローバルランクのない計画立案アイテムを識別する	グローバルランクが設定されていない、[優先順位付けリスト] ページの計画アイテムの数を識別します。 このスキャンが失敗した場合、結果にはグローバルランクのない計画立案アイテムが表示されます。[修復スクリプトを実行] をクリックして、このフィールドが空のアイテムにグローバルランクを入力します。
レンズエンティティの、目標がアサインされたエンティティ構成をチェック (Check Goal Assigned Entity Configuration for lens entities)	目標がアサインされたエンティティ構成が欠落しているレンズエンティティを識別します。 このスキャンが失敗した場合、結果には、アサインされたエンティティ構成がないレンズエンティティが表示されます。
計画立案アイテムのリストビューを検証	ポートフォリオ計画に追加できるすべての計画立案アイテムに、[APW の優先順位付け] および [APW のデフォルト] のリストビューがあることを検証します。 このスキャンが失敗した場合、結果には、特定の計画立案アイテムテーブルに欠落しているリストビューが表示されます。 これらの修正方法については、「Strategic Planning での新しい計画立案アイテムテーブルのリストビューの作成」を参照してください。
計画立案アイテムのフォームセクションビューを検証	ポートフォリオ計画に追加できるすべての計画立案アイテムに、[APW の優先順位付け]、[APW のデフォルト]、および [APW 新規] のフォームビューがあることを検証します。 このスキャンが失敗した場合、結果には、特定の計画立案アイテムテーブルに欠落しているフォームセクションビューが表示されます。 これらの修正方法については、「戦略的計画 での新しい計画立案アイテムテーブルのフォームビューの作成」を参照してください。
計画立案アイテムの関連リストビューを検証	ポートフォリオ計画で許可されたすべての計画立案アイテムに、[APW のデフォルト] 関連リストビューがあることを検証します。 このスキャンが失敗した場合、結果には、特定の計画立案アイテムテーブルに欠落している関連リストビューが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スキャンの名前	説明
	これらの修正方法については、「Strategic Planning での新しい計画立案アイテムタイプの関連リストビューの作成」を参照してください。
計画立案アイテムのデフォルトビューのワークスペースビュールールを検証	ポートフォリオ計画で許可されたすべての計画立案アイテムにデフォルトのビューのワークスペースビュールールがあることを検証します。 このスキャンが失敗した場合、結果には、特定の計画立案アイテムテーブルに欠落しているデフォルトの表示ルールが表示されます。 これらの修正方法については、「戦略的計画 の新規計画立案アイテムフォームに対するワークスペースビュールールの作成」を参照してください。
アサインされたエンティティの目標関係を検証 (Validate the goal relationships for assigned entities)	アサインされたエンティティに定義された m2m 目標関係があるかどうかを特定します。 このスキャンが失敗した場合、結果には、m2m 目標関係とアサインされたエンティティテーブルがある目標が表示されます。*`Migrate goal relationships for assigned entities`* スケジュール済みジョブを実行すると、目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルから目標テーブルに既存の目標関係データを移行できます。詳細については、「アサインされたエンティティの目標関係を移行する」を参照してください。
計画立案アイテムの APW デフォルトビューのワークスペースビュールールを検証	ポートフォリオ計画で許可されたすべての計画立案アイテムに APW デフォルトのビューのワークスペースビュールールがあることを検証します。 このスキャンが失敗した場合、結果には、特定の計画立案アイテムテーブルに欠落している APW デフォルトの表示ルールが表示されます。 これらの修正方法については、「戦略的計画 の新規計画立案アイテムフォームに対するワークスペースビュールールの作成」を参照してください。
ポートフォリオ計画構成の無効なフィールドの検証	既存のすべてのポートフォリオ計画のポートフォリオ計画構成レコード内の無効なフィールドを検索します。 このスキャンが失敗した場合は、[修復スクリプトの実行] をクリックして、特定された無効なフィールドを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スキャンの名前	説明
すべてのポートフォリオ計画のポートフォリオ計画構成の検証	インスタンスで作成された既存の各ポートフォリオ計画に有効なポートフォリオ計画構成があるかどうかを確認します。

戦略的計画 **with** PPM、Agile 2.0、および **SAFe** の構成

戦略的計画 が アジャイル開発 2.0、大規模アジャイルフレームワーク (SAFe)、プロジェクトポートフォリオ管理 と連携するようにセットアップするために必要なプロセスを理解します。

構成ワークフロー

戦略的計画 with PPM、Agile 2.0、および SAFe のセットアッププロセスの指針として、次のステップを使用してください。これらのステップの中には、アドミンロール (sn_align_core.apw_admin) が必要なものと、ユーザーロール (sn_align_core.apw_user) が必要なものがあります。

1. 配置統合を作成
2. デフォルトのマッピング構成を生成
3. カスタムマッピング構成の作成 (オプション)

ガイド付きセットアップ

戦略的計画 をインストールした後、ガイド付きセットアップを使用して必要な構成を行うことができます。ガイド付きセットアップを開くには、次に移動します: 戦略的計画 > ガイド付きセットアップ.

配置統合を作成

戦略的計画 をインストールすると、**[ServiceNow** 内部] 配置統合がデフォルトで作成されます。配置統合が利用できない場合は、配置統合タイプを作成できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 統合.
2. **[ServiceNow** 内部] 配置統合が存在するかどうかを検証します。
3. 存在しない場合は、[新規] をクリックして、配置統合を作成します。
4. [名前] フィールドに、配置統合の名前を入力します。
   または、関連リンクから **[ServiceNow** 内部統合を作成] をクリックして、内部配置統合を作成することもできます。
5. [送信] をクリックします。

デフォルトのマッピング構成を生成

デフォルトのマッピング構成を生成して、利用可能なアプリケーションのテーブルマップを作成します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core_apw.admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 統合.
2. **[ServiceNow** 内部] をクリックして、内部アプリケーションの配置統合を表示します。
3. [デフォルトのマッピング構成を生成] をクリックして、利用可能なアプリケーションのテーブルマップを作成します。
   エピック、デマンド、プロジェクト、プロジェクトタスクなどの計画立案アイテムタイプのテーブルマッピングが生成され、位置合わせマッピングが [テーブルマップ] 関連リストに表示されます。それぞれのアプリケーション用に作成されたテーブルマップのリストの詳細については、次の表を参照してください。

インストールされているアプリケーション	作成されたテーブルマップ
プロジェクトポートフォリオ管理	プロジェクト、プロジェクトタスク (マイルストーン用)、デマンド、およびアイデア
アジャイル開発 2.0	エピック
SAFe	SAFe エピック

注:
マッピング構成は、各レコードのテーブル、フィールド、および選択マップで構成されます。

デフォルトのマッピング構成

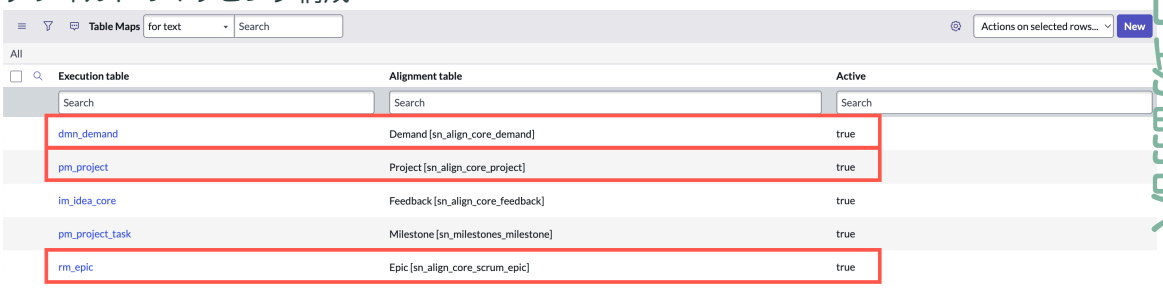

カスタムマッピング構成の作成

機能、ストーリーなど、デフォルトで作成されない計画立案アイテムのマッピング構成を作成します。

アドミニストレーターは、デフォルトで作成されない計画立案アイテムのテーブルマップ、フィールドマップ、および選択マップを作成できます。詳細については、以下を参照してください。

1. テーブルマップの作成
2. フィールドマップの作成
3. 選択マップの作成

テーブルマップの作成

テーブルマップを作成して、戦略的計画 のテーブルと アジャイル開発 2.0、SAFe、および PPM のテーブル間のマッピングを定義します。


始める前に
必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 統合.
2. **[ServiceNow** 内部] を選択します。
3. [テーブルマップ] タブで [新規] を選択して、新しいテーブルマップを作成します。
4. テーブルマップフォーム で、フィールドに入力します。
5. [送信] を選択します。

新しいテーブルマップの作成

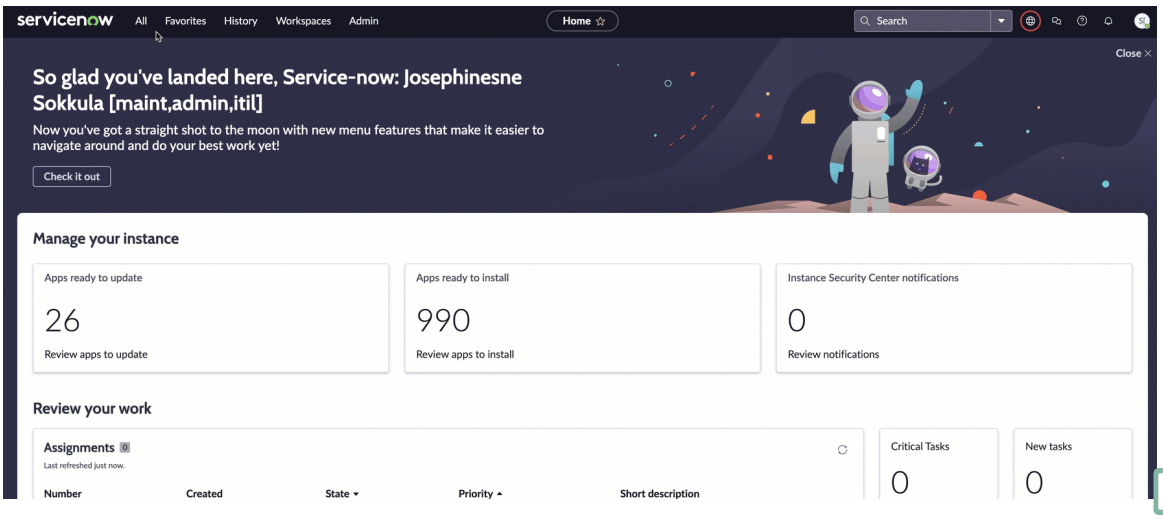

タスクの結果
配置テーブルと実行テーブルの構成を使用して、新しいテーブルマップが作成されます。

注:
デマンドまたはプロジェクト以外のタイプの計画立案アイテムに関するテーブルマップを作成または更新するには、SPM Pro ライセンスが必要です。詳細については、アドミニストレーターにお問い合わせください。

次のタスク
この新しいテーブルマップ構成を アジャイル開発 2.0、SAFe、または PPM にエクスポートするビジネスルールを作成します。詳細については、「カスタムテーブルマップ構成を適用するビジネスルールの作成」を参照してください。

カスタムテーブルマップ構成を適用するビジネスルールの作成

アジャイル開発 2.0、SAFe、および PPM アプリケーションから新しいカスタムテーブルマップ構成へのエクスポートを有効にするビジネスルールを作成します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core_apw.admin

このタスクについて
戦略的計画 統合でカスタムテーブルマップを作成した後、 rm_epic または dmn_demand テーブルで「実行から調整までのデータを同期」ビジネスルールに類似したビジネスルールを作成します。

注:
ビジネスルールが、アジャイル開発 2.0、SAFe、PPM などの実行アプリケーションで作成されていることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > ビジネスルール.
2. 使用可能なビジネスルールのリストから、[実行から調整までのデータを同期] ルールを見つけて開きます。
3. コンテキストメニュー (☰) から、このビジネスルールに対して [挿入と維持] 操作を実行します。
   ServiceNow インスタンスで [挿入と維持] アクションを有効にしていない場合は、「レコードの挿入オプションの許可」を参照してください。
4. [ビジネスルール] フォームで、次のフィールドを編集します。

[ビジネスルール] フォーム

フィールド	説明
名前	ビジネスルールの一意の名前。 たとえば、新しいテーブルマップがデマンドをマップする場合は、このルールに「戦略的計画とのデマンドの同期」と名前を付けます。
テーブル	カスタムマップを作成したテーブルを選択します。 たとえば、機能 [sn_safe_feature] です。

5. [更新] をクリックします。

フィールドマップの作成

各テーブルマップのフィールドを 戦略的計画 から アジャイル開発 2.0、SAFe、プロジェクトポートフォリオ管理へ、またその逆にマッピングします。

始める前に

配置統合レコードのテーブルマップが作成されていることを確認してください。詳細については、「テーブルマップの作成」を参照してください。

注:
実行フィールドタイプが [参照] で配置フィールドタイプが [文字列] である場合、同期は機能しません。

必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 統合.
2. **[ServiceNow** 内部] を選択します。
3. [テーブルマップ] 関連リストで、フィールドマップを作成するテーブルマップを選択します。
4. [フィールドマップ] タブで [新規] を選択して、新しいフィールドマップを作成します。
5. フィールドマップフォーム で、フィールドに入力します。
6. [送信] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

選択マップの作成

戦略的計画 から アジャイル開発 2.0、SAFe、プロジェクトポートフォリオ管理へ、またはその逆の値のリストを使用して、フィールドの各フィールドマップの選択リストをマッピングします。

始める前に

フィールドマップを作成し、値のリストを含む選択フィールドが含まれていることを確認してください。詳細については、「フィールドマップの作成」を参照してください。

必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 統合.
2. **[ServiceNow** 内部] を選択します。
3. [テーブルマップ] 関連リストで、選択マップを作成するフィールドがあるテーブルマップを選択します。
4. [フィールドマップ] 関連リストで、選択マップを作成する関連フィールドマップを選択します。
5. [選択マップ] タブで [新規] を選択して、新しい選択マップを作成します。
6. 選択マップフォーム で、フィールドに入力します。
7. [送信] をクリックします。

一括インポートの設定

このシステムプロパティを使用すると、戦略的計画 with PPM、Agile 2.0、および SAFe の一括インポート機能を更新できます。

始める前に

必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

手順

1. ナビゲーションフィルターに、「sys_properties.list」と入力します。
2. *com.sn_align_cmn_int.bulk_import* を検索します。
3. プロパティ値を次のいずれかのオプションに設定します。
   PPM、アジャイル開発 2.0、または SAFe から 戦略的計画 にレコードがインポートされると、最後のコメントのみがインポートされます。

チームスペースの操作

戦略的計画 をプロジェクトポートフォリオ管理のチームスペースと統合すると、関連するプロジェクトとデマンドにアクセスして、対応する計画立案アイテムレコードを使用して管理できます。

チームスペース機能を使用するには、チームスペースプラグインをアクティブ化する必要があります。次のチームスペースプラグインを使用できます。

- Project Management TeamSpace 1 (com.snc.ppm_teamspace_1)
- Project Management TeamSpace 2 (com.snc.ppm_teamspace_2)
- Project Management TeamSpace 3 (com.snc.ppm_teamspace_3)
- Project Management TeamSpace 4 (com.snc.ppm_teamspace_4)
- Project Management TeamSpace 5 (com.snc.ppm_teamspace_5)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


これらのプラグインとともにインストールされたチームスペースには同じコンポーネントが含まれていますが、コンポーネントのプリフィックスは異なります。たとえば、チームスペース 1 には **[Teamspace_1** プロジェクト **[tsp1_project]]** という名前のプロジェクトテーブルが含まれ、チームスペース 5 には **[Teamspace_5** プロジェクト **[tsp5_project]]** という名前のプロジェクトテーブルが含まれます。

また、対応するチームスペースロールを、戦略的計画 アドミン (sn_ament_core.apw_admin) ロールに追加する必要があります。たとえば、teamspace1 の場合は tsp1_portfolio_manager、teamspace2 の場合は tsp2_portfolio_manager のようになります。

チームスペースを 戦略的計画 レコードと統合するには：

1. すべてのチームスペースに対して 1 つの配置統合を作成します。配置側で、個々のチームスペーステーブルデータ (TSP1 ポートフォリオ [sn_align_core_tsp1_portfolio]、TSP1 デマンド [sn_align_core_tsp1_demand]、TSP2 プロジェクト [sn_align_core_tsp2_project] など) を保存するための拡張テーブルを作成します。
2. 配置統合で、ステップ 1 で作成した拡張テーブルをそれぞれのチームスペーステーブル (tsp1_portfolio、tsp1_demand、tsp2_project など) にマッピングします。

チームスペースとの統合

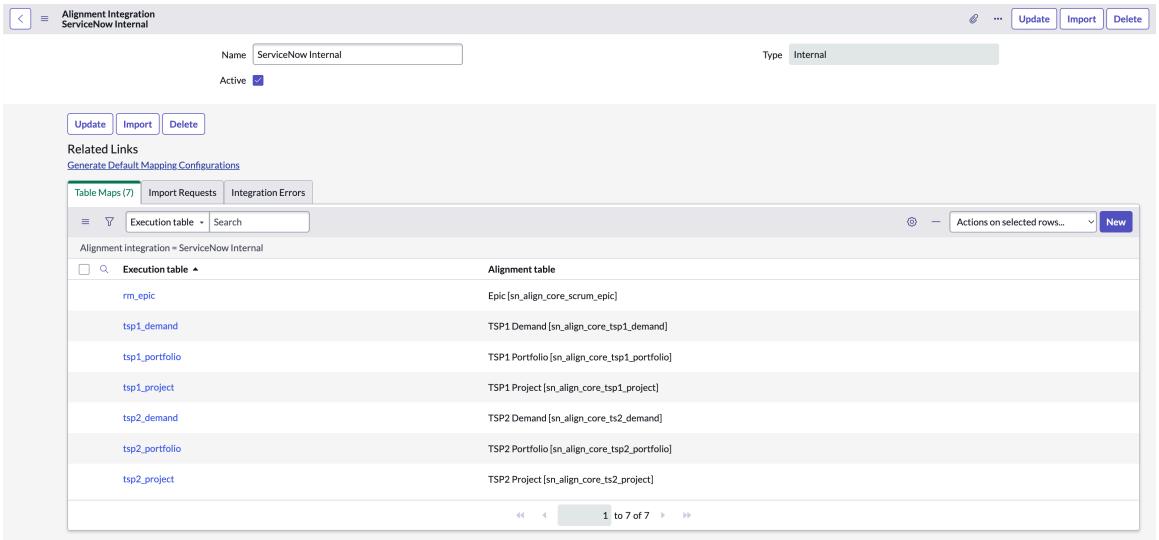

関連情報

テーブルマップの作成

戦略的計画ワークスペースでのポートフォリオ計画の管理

戦略的計画 Workspace でカスタマイズされたポートフォリオ計画を作成し、目的の視点 (レンズ) で集中的に作業を計画し、調整を促進できるようにします。

次のセクションでは、戦略的計画 ワークスペースでのポートフォリオ計画の作成、更新、共有、および共同作業について説明します。

上位レベルのポートフォリオ計画の作成

戦略的計画 Workspace で上位レベルの戦略的アイテムのポートフォリオ計画をビルドし、こうした戦略的アイテムに沿った作業の優先順位付け、ロードマップ作成、および管理を行えるようにします。

始める前に
必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
デフォルトでは、戦略的投資レンズを選択してイニシアチブまたは戦略的プログラムを使用することも、プロジェクトプログラムレンズを選択してプログラムを上位レベルの計画立案アイテムとして使用することもできます。デジタル製品レンズを選択し、製品機能拡張エンティティを上位レベルの計画に使用することもできます。別のアイテムを使用して計画する場合は、アドミンと協力して、ServiceNow インスタンスでそうしたアイテムを有効にしてください。構成の詳細については、「戦略的計画 での上位レベルの計画立案の構成」を参照してください。

このタスクでは、レンズを選択し、条件を追加して、必要な計画立案アイテムデータをフィルタリングし、追加の詳細を追加してポートフォリオ計画をビルドします。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. [ポートフォリオ計画] ページで、[新規] を選択します。
   ポートフォリオ計画が存在しない場合は、[最初のポートフォリオ計画を作成] を選択します。
3. 上位レベルの計画立案のレンズを選択します。


   デフォルトでは、戦略的投資レンズおよびプロジェクトプログラムレンズは上位レベルの計画立案に対して有効になっています。

   注:
   目標 [sn_gf_goal] テーブルは上位レベルの計画立案をサポートしていないため、目標レンズを選択しないでください。

   [ポートフォリオ計画を作成] ウィザードが表示されます。
4. [ポートフォリオ計画を作成] ウィザードを使用して選択します。

   a. 選択したレンズについて、計画する作業のタイプを選択します。

   たとえば、会社のイニシアチブの作業を管理するとします。上位レベルの計画立案アイテムとして [イニシアチブ] を選択します。これにより、イニシアチブを計画し、こうしたイニシアチブに沿った作業をレビューできます。

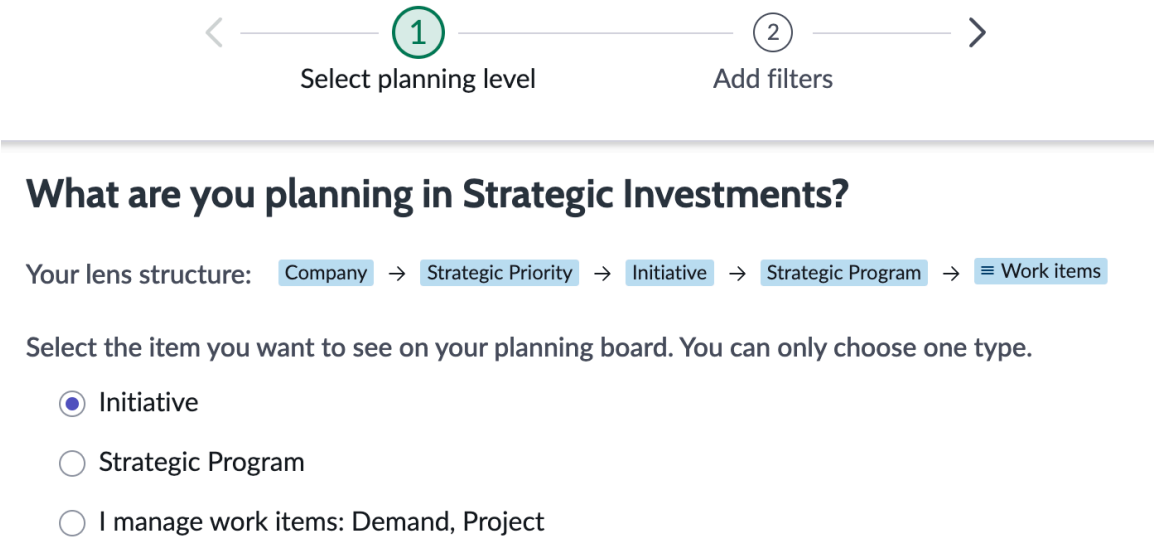

   b. 条件を追加して、計画立案アイテムのデータをさらにフィルタリングします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


たとえば、カスタマーサポート部門のイニシアチブを担当しているとします。イニシアチブテーブルからカスタマーサポート部門のみのイニシアチブをフィルタリングする条件を設定できます。

複数の条件を追加して、複雑なフィルターを設定し、適切な情報 ポートフォリオ計画に追加することもできます。

c. ポートフォリオ計画の詳細を入力します。

ポートフォリオ計画の名前、所有者、開始日と終了日、および説明の情報を入力します。

d. ドロップダウン値を使用するか、[採点フレームワーク] ウィンドウから採点フレームワークを選択します。
ポートフォリオ計画のカスタム採点フレームワークを作成するには、[採点フレームワークの詳細 **(Explore scoring frameworks)]** を選択します。

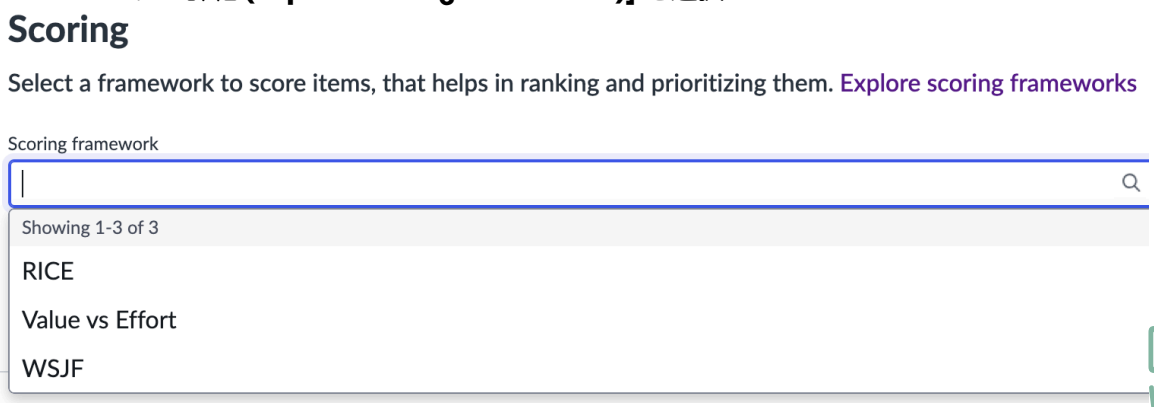

[前へ] および [次へ] ボタンを使用して、ステップ間を移動します。

5. [作成] を選択します。

タスクの結果

ポートフォリオ計画が作成され、ページが更新されて、[目標] ページ、[採点] ページ、および [計画] ページが表示されます。ホームページから、所有または共有しているすべてのポートフォリオ計画のリストを表示できます。

次のタスク

- ポートフォリオ計画の目標を定義し、それに合わせて作業を調整します。「戦略的計画ワークスペース での目標管理」を参照してください。
- バックログを分析し、ポートフォリオ計画の作業に優先順位を付けます。「戦略的計画ワークスペースでのポートフォリオ計画作業の優先順位付け」を参照してください。
- ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する際に、要件に応じてポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にします。「ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする」を参照してください。

ポートフォリオ計画の作成

作業の優先順位付けと調整を開始できるように、戦略的計画ワークスペースでレンズを使用してカスタマイズされたポートフォリオ計画をビルドします。

始める前に

必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
4 ステップのウィザードでレンズを選択し、条件を追加して、必要な計画立案アイテムをフィルタリングし、追加の詳細を入力して、ポートフォリオ計画を作成します。

(エンタープライズアーキテクチャワークスペース ユーザーのみ) ビジネスケイパビリティレンズを使用してポートフォリオ計画を作成するには、エンタープライズアーキテクチャワークスペース をインストールする必要があります。ビジネスケイパビリティレンズを使用してポートフォリオ計画を作成するには、sn_apm.apm_user ロールが必要です。

このタスクでは、通常の作業アイテムレベルのポートフォリオ計画の作成について説明します。上位レベルのポートフォリオ計画を作成する方法については、「上位レベルのポートフォリオ計画の作成」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. [ポートフォリオ計画] ページで、[新規] を選択します。
   既存の計画がない場合は、[最初のポートフォリオ計画を作成] を選択します。
3. ポートフォリオ計画を作成ウィザードを使用して選択します。

   a. レンズを選択します。

   b. 選択したレンズについて、エンティティタイプとそのタイプの目的のエンティティを選択します。

      エンティティタイプは、作業を計画するレベルを表します。

      たとえば、HR 部門の作業を計画するには、[組織] をレンズ、[部門] をエンティティタイプとして、**[HR]** を部門のリストから選択します。この選択により、HR 部門に関連付けられた作業のみがポートフォリオ計画に追加されます。

   c. ポートフォリオ計画に含める計画立案アイテムのタイプを選択します。


      追加の条件を使用して、計画立案アイテムデータをさらにフィルターできます。

      たとえば、今年作成されたすべての HR プロジェクトを計画して進捗状況を追跡するには、計画立案アイテムとして [プロジェクト] を選択し、今年作成されたすべての HR プロジェクトをフィルタリングする条件を追加します。

      複数の条件を追加して、複雑なフィルターを設定し、適切な計画立案アイテムをポートフォリオ計画に追加することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

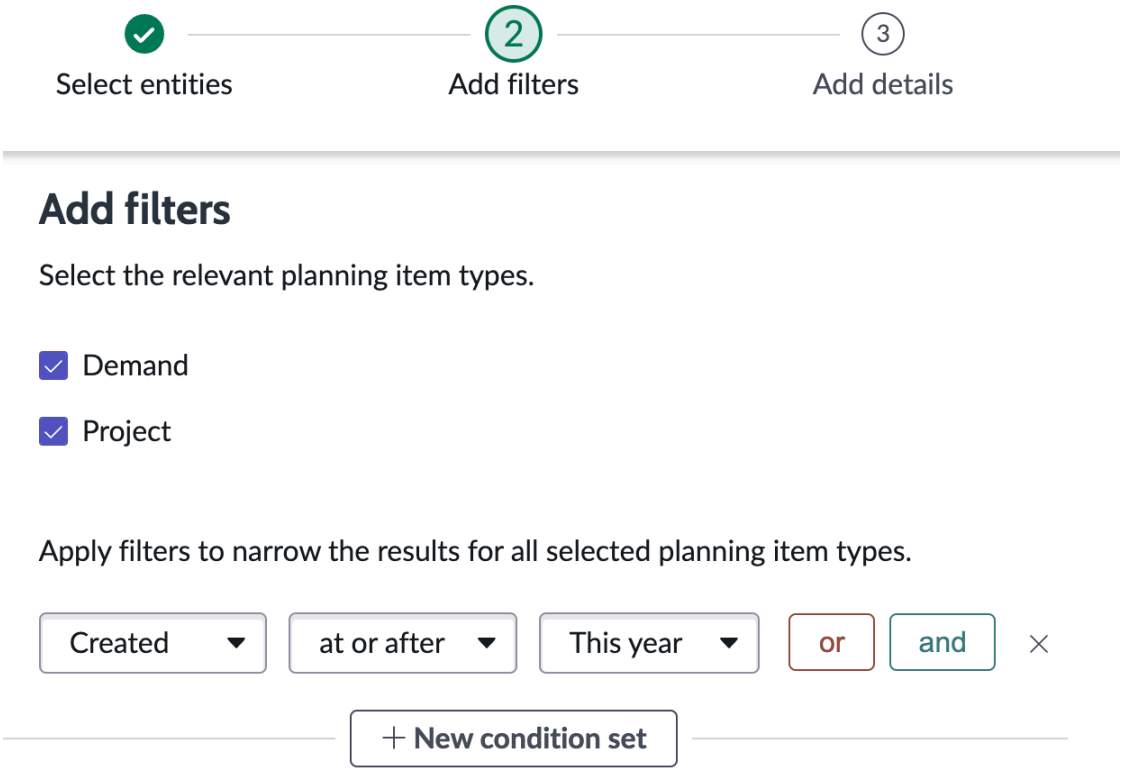


d. ポートフォリオ計画の詳細を入力します。

ポートフォリオ計画の名前、所有者、開始日と終了日、および説明を入力します。

> **重要:**
> ポートフォリオ計画の開始日と終了日は、計画に追加されるすべての計画立案アイテムの日付範囲フィルターとして機能します。

たとえば、 ポートフォリオ計画が 2023 年 3 月 1 日から 2024 年 7 月 6 日までの場合、2023 年 2 月の開始日と終了日で承認されたプロジェクトは、「2023 年作成」という基準を満たしていても計画に表示されません。

e. ドロップダウン値を使用するか、[採点フレームワーク] ウィンドウから採点フレームワークを選択します。
ポートフォリオ計画のカスタム採点フレームワークを作成するには、[採点フレームワークの詳細 **(Explore scoring frameworks)]** を選択します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[前へ] および [次へ] を使用して、ステップ間を移動できます。

4. [作成] を選択します。

タスクの結果

ポートフォリオ計画が作成され、ページが更新されて、この新しいポートフォリオ計画の [目標] ページ、[採点] ページ、および [計画] ページが表示されます。ホームページから、所有または共有しているすべてのポートフォリオ計画のリストを表示できます。

次の基準を満たす計画立案アイテムがポートフォリオ計画に表示されます。

- ステップ 3(b) で選択したエンティティタイプの 1 つに属する計画立案アイテム
- ステップ 3(c) で選択した計画立案アイテムタイプと一致する計画立案アイテム
- 承認された開始日または終了日がポートフォリオ計画タイムライン内にある計画立案アイテム
- 承認された開始日と承認された終了日の両方がない計画立案アイテム

注:
プロジェクトポートフォリオ管理 年にプロジェクトに変換されたデマンドがある場合、結果の (デマンドから変換された) プロジェクト計画立案アイテムのみがポートフォリオ計画に表示されます。

次のタスク

- ポートフォリオ計画の目標を定義し、それに合わせて自身の作業を調整します。「戦略的計画ワークスペース での目標管理」を参照してください。
- バックログを分析し、ポートフォリオ計画の作業に優先順位を付けます。「戦略的計画ワークスペースでのポートフォリオ計画作業の優先順位付け」を参照してください。
- ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する際に、要件に応じてポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にします。「ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする」を参照してください。

ポートフォリオ計画の複製

既存のポートフォリオ計画のデータを使用してポートフォリオ計画を作成します。作成するポートフォリオ計画が既存のポートフォリオ計画と類似している場合は、既存のポートフォリオ計画を複製することで時間を節約できます。表示アクセス権または編集アクセス権で共有されたポートフォリオ計画を複製することもできます。

始める前に

必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

このタスクについて

[ポートフォリオ計画を複製] オプションを選択すると、選択したポートフォリオ計画とそのすべてのデータ (目標、優先順位付け、ロードマップ) がポートフォリオ計画にコピーされます。また、コピーされたアイテムとその子アイテムの間のすべての依存関係と関係も保持されます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. ポートフォリオ計画ヘッダーから、[その他のアクション] アイコン (⋮ を選択し、[ポートフォリオ計画の複製] を選択します。
4. [ポートフォリオ計画を複製] ウィンドウで、詳細を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [ポートフォリオ計画名 **(Portfolio plan name)**] フィールドにポートフォリオ計画の名前を入力します。
デフォルトでは、名前は *ABC (Copy)* です。ここで、ABC はコピー元のポートフォリオ計画の名前です。

b. オプション: コピー元のポートフォリオ計画のユーザーにアクセス権を付与するには、[同じユーザーおよびグループと共有 **(Share with same users and groups)**] オプションを選択します。
このアクションでは、コピー元のポートフォリオ計画に対してユーザーが持っていたのと同じ読み取りアクセス権と編集アクセス権が付与されます。

c. [**Confirm** (確認)] を選択します。

タスクの結果
新しいポートフォリオ計画が作成され、新しいポートフォリオ計画にアクセスするためのリンクが画面に生成されます。

次のタスク
- 新しいポートフォリオ計画に従って、ポートフォリオ計画の目標を表示または更新します。「戦略的計画ワークスペース での目標管理」を参照してください。
- バックログを分析し、ポートフォリオ計画の作業に優先順位を付けます。「戦略的計画ワークスペースでのポートフォリオ計画作業の優先順位付け」を参照してください。
- ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する際に、要件に応じてポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にします。「ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする」を参照してください。

ポートフォリオ計画の変更

戦略的計画 ワークスペースでポートフォリオ計画の詳細を更新するか、削除して、計画の優先度の変更を反映します。

始める前に
ポートフォリオ計画の作成。


必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

このタスクについて
注:
ポートフォリオ計画の所有者または編集者のみが編集できます。

手順
1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. ポートフォリオ計画ヘッダーから、その他のアクションアイコン ( ) を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

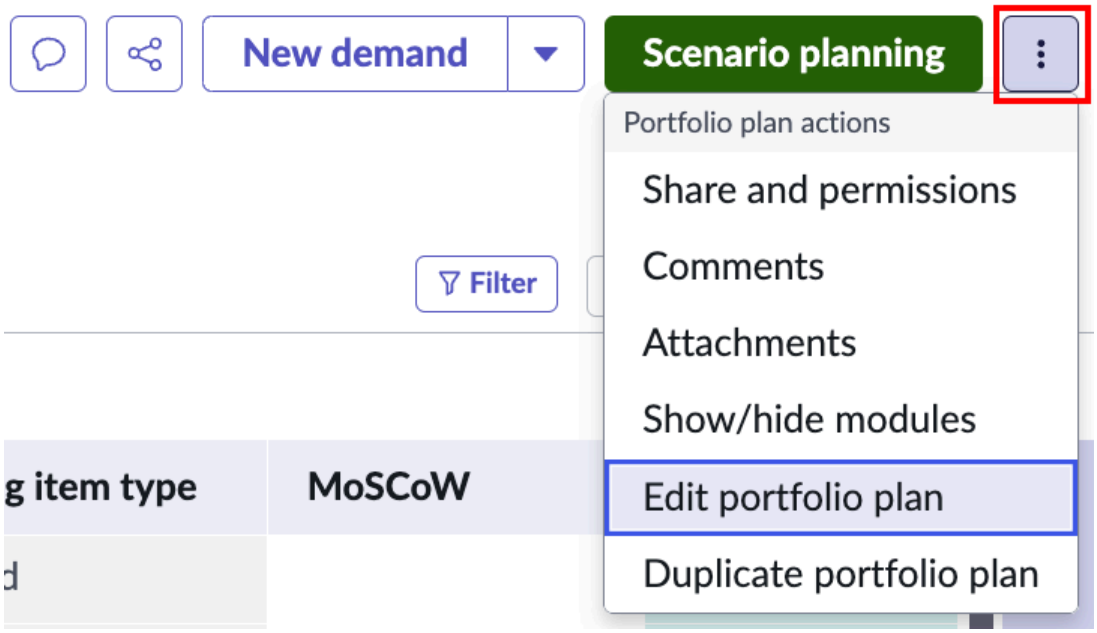

4. ポートフォリオ計画の詳細を更新するか、削除します。

関連情報

- ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する
- ポートフォリオ計画でのコラボレーション
- ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする

ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする

ポートフォリオマネージャーは、必要に応じてポートフォリオ計画の機能 (目標、採点、優先順位付け、ロードマップなど) を表示または非表示にして、ステークホルダーと必要なデータのみを共有できるようにします。

このタスクについて
ポートフォリオ計画の機能を非表示にすると、ステークホルダーにとって重要なデータのみを共有し、ポートフォリオ計画内の他のデータへのアクセスを制限することができます。

> **注:**
> 表示アクセス権を提供し、機能 (採点など) を非表示にするステークホルダー とポートフォリオ計画を共有する と、閲覧者は有効な機能のみを表示でき、共有ポートフォリオ計画の非表示の機能 (採点) は表示されません。ただし、編集アクセス権を提供するポートフォリオ計画を共有すると、エディターは必要に応じて機能を有効または無効にしたり、共有ポートフォリオ計画内のデータを表示および編集したりできます。

始める前に
ポートフォリオ計画の作成。

必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder


手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、機能を表示または非表示にするポートフォリオ計画を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. ポートフォリオ計画の左ペインで、[モジュールを表示/非表示] を選択します。
4. [モジュールの表示/非表示] ウィンドウで、表示するモジュールと機能を選択し、非表示にするモジュールと機能の選択を解除します。

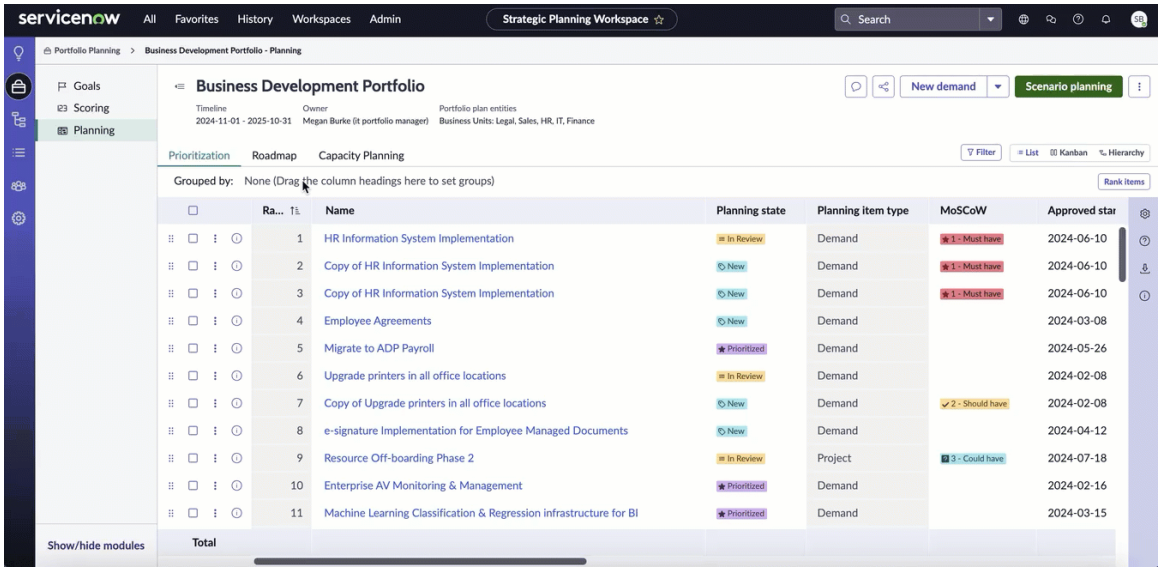

5. [変更を適用] を選択します。

関連情報

ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する

ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する

ポートフォリオ計画をステークホルダーや他の計画マネージャーと共有して、計画の進捗状況に対する可視化を得て、共同作業を開始できるようにします。

始める前に

- ポートフォリオ計画の作成。
- ポートフォリオ計画を共有するユーザーまたはグループがポートフォリオ計画への読み取りまたは編集アクセス権を取得するには、sn_align_core.ap_read_only または sn_align_core.apw_user ロールが必要です。

必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

このタスクについて

ポートフォリオを共有する個々のユーザーまたはグループを選択します。

ポートフォリオ計画を個々のユーザーまたはグループと共有すると、そのユーザーまたはグループはポートフォリオ計画の次のデータにアクセスできます。

- デフォルトでは、[計画] ページ ([優先順位付け] タブと [ロードマップ] タブ)
- ユーザーが sn_align_ws.spw_capacity_user または sn_align_ws.spw_capacity_read ロールを持っている場合は、[計画] ページの [キャパシティ] タブ
- ユーザーに sn_apw_advanced.spw_goal_user ロールがある場合は、[目標] ページ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. [計画] ページのポートフォリオ計画ヘッダーから、[ポートフォリオ計画を共有] アイコン ( ) を選択します。
4. [ポートフォリオ計画を共有] フォームで、ポートフォリオ計画を共有するユーザーを選択し、そのアクセス権を適切に設定します。
   a. [メンバーまたはグループ] フィールドに、個々のユーザーまたはグループの名前を入力します。
   b. [アクセス] フィールドで、選択した名前のアクセスレベルとして [ビューアー] または [エディター] を選択します。
      - エディターは、ポートフォリオ計画の設定とデータを表示および変更できます。
      - ビューアーは、コメントまたは添付ファイルの追加のみを行うことができます。設定やデータを変更することはできません。

        注:
        ユーザーにポートフォリオ計画への表示専用アクセス権が付与されている場合でも、sn_align_core.apw_user ロールが割り当てられていれば、ポートフォリオ計画で使用される計画立案アイテムテーブルまたは関連テーブルを編集できます。
5. [招待を送信] を選択します。

タスクの結果
選択した個人およびグループユーザーに、ポートフォリオ計画の共有がメールで通知されます。

次のタスク
ポートフォリオ計画でのコラボレーション。

ユーザーまたはグループのアクセスレベルを変更するか、アクセス権を削除します。

1. [ポートフォリオ計画を共有] フォームで、[アクセスを管理] を選択します。
2. ユーザーまたはグループカードから、[アクションメニュー] アイコン ( ) を選択します。
3. 適切なアクセスレベルを選択するか、[削除]を選択します。

関連情報

ポートフォリオ計画の変更

ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする

ポートフォリオ計画でのコラボレーション

ユーザーがフィードバックを確認して共有できるように、ポートフォリオ計画にコメントと添付ファイルを追加します。ステークホルダーと共同作業し、結果の共有を推進します。

始める前に
ポートフォリオ計画の作成。

必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
計画やデータポイントについてコメントし、添付ファイルを共有し、ワークスペース内の 1 つの場所からフィードバックを提供することで、すべてのステークホルダーがビジネスの優先順位と連携していることを確認します。

ポートフォリオ計画のヘッダーから追加する添付ファイルとコメントは、ポートフォリオ計画全体 (目標、優先順位付け、およびロードマップ) に適用されます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. [計画] ページのポートフォリオ計画ヘッダーから、[コメント] アイコン ( ) を選択します。
4. ポートフォリオ計画にコメントまたは添付ファイルを追加します。

関連情報

- ポートフォリオ計画の変更
- ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する
- ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする

戦略的計画ワークスペースでの計画立案アイテムの採点

戦略的計画ワークスペースで採点フレームワークを使用して、ポートフォリオ計画の作業を評価します。アサインされたスコアを使用して計画立案アイテムの優先度と実現可能性を判断し、リソースと財務の割り当てについて、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

次のセクションでは、戦略的計画ワークスペースにおけるポートフォリオ計画のアイテムの採点とランク付けについて説明します。

ポートフォリオ計画のアイテムにスコアを付ける

スコアを生成する採点フレームワーク属性を使用して、ポートフォリオ計画内のアイテムの優先順位付けとランキングに役立て、アイテムを採点します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 戦略的計画ワークスペース.
2. 採点を開始するポートフォリオ計画を選択して開きます。
   ポートフォリオ計画に採点フレームワークがアサインされていない場合：
   a. その他のアクションアイコン ( ) を選択します。
   b. [ポートフォリオ計画を編集] を選択します。
   c. [詳細を追加] ステップに移動します。
   d. ポートフォリオ計画のフレームワークを選択します。


   注:
   採点フレームワークの選択は、計画立案アイテムでのみ使用できます。

3. [採点] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. 採点フレームワークの各属性の値を入力します。



採点フレームワーク属性と採点式の詳細を確認するには、各フィールドの情報アイコン (ⓘ) を選択します。

タスクの結果
各アイテムのスコアは、採点属性値と計算式に基づいて入力されます。

注:
事前定義された採点フレームワークの最終スコアを生成するには、採点フレームワークのすべての属性に値が必要です。

関連情報

Strategic Planning での採点

Strategic Planning のカスタム採点フレームワーク

ポートフォリオ計画のアイテムのランク付け

計画立案アイテム属性と採点フレームワーク属性 (計画コスト、Moscow、優先度、スコアなど) に基づいて、アイテムにランクをアサインします。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 戦略的計画ワークスペース.
2. アイテムのランキングを開始するポートフォリオ計画を選択して開きます。
3. [計画] を選択します。
4. [優先順位付け] ビューで [アイテムのランク付け **(Rank items)**] を選択します。
5. ドロップダウンリストを使用して属性を選択します。
   たとえば、信頼性に基づいてアイテムをランク付けする場合は、属性として [信頼性] を選択します。計画立案アイテムの選択肢および番号タイプ属性でランク付けできます。
6. アイテムをランク付けする順序を選択します。
7. [適用] を選択します。

タスクの結果
ポートフォリオ計画のアイテムは、ランク付けされた属性に基づいてランク付けされます。

採点から **Excel** または **CSV** への計画立案アイテムデータのエクスポート

ポートフォリオ計画アイテムのデータをポートフォリオ計画から Microsoft Excel または CSV ファイルにエクスポートします。このデータを共有し、ビジネスステークホルダーと共同作業を行うことができます。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [採点] を選択します。
3. エクスポートする列がカスタマイズされていることを確認します。

   注:
   フィルターがビューに適用されると、フィルターされたデータがエクスポートされます。

4. カスタマイズされたサイドパネルを使用して、ポートフォリオ計画アイテムをエクスポートします。

   a. エクスポートアイコン ( ) を選択します。

   b. [エクスポート] ウィンドウの [ファイルタイプ] ドロップダウンから **[Excel]** または **[CSV]** を選択して、データをそれぞれ Microsoft Excel ファイルまたは CSV ファイルにエクスポートします。
   選択した形式のファイルがエクスポートされます。デフォルトでは、ファイルの名前は *ABC_Scoring_List* です。ここで、ABC はデータをエクスポートするポートフォリオ計画の名前です。

戦略的計画ワークスペース での目標管理

組織計画を達成してビジネスの成果を促進するために、戦略的計画ワークスペースでポートフォリオ計画の目標を作成し、そのターゲットを設定し、それらの目標とターゲットの進捗状況を評価します。

https://player.vimeo.com/video/1089949088?h=313cb311d3&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

戦略的計画 Workspace の目標ビューでは、[ダッシュボード]、[リスト]、および [階層] タブで、目標とターゲットの概要を確認できます。[ダッシュボード] タブ (旧称：[概要] タブ) には、特定のポートフォリオ計画のすべての目標の概要が表示されます。[リスト] タブは、特定のポートフォリオレベルの目標とターゲットを表示、作成、および管理するのに役立ちます。[階層] タブを使用すると、ポートフォリオ計画エンティティの目標とターゲットを階層的に表示できます。また、このタブは、現在のポートフォリオ計画の目標とターゲットとともに、(ポートフォリオ計画エンティティの) 親エンティティの目標を表示するのにも役立ちます。

目標の管理に必要なロール

アクセスレベル	必要なロール
目標への読み取りアクセス	• sn_align_core.apw_user • sn_apw_advanced.spw_goal_user_read
目標への編集アクセス	• sn_align_core.apw_user • sn_apw_advanced.spw_goal_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

目標ビューの [ポートフォリオ計画の詳細] セクション


目標ビューのポートフォリオ計画の詳細セクションには、ポートフォリオ計画の詳細と、ポートフォリオ計画を管理して目標を作成するためのオプションが表示されます。ヘッダーセクションは、目標ビューのすべてのタブで同じです。

[ポートフォリオ計画の詳細] セクションから、次のことができます。

- ポートフォリオ計画の目標を作成します。
- ステークホルダーや他の計画マネージャーとポートフォリオ計画を共有して、計画の進捗状況に対する可視化を得て、共同作業を開始できるようにします。
- ポートフォリオ計画にコメントと添付ファイルを追加して、ユーザーがフィードバックをレビューして共有できるようにすることで、ステークホルダーと共同作業を行い、成果の共有を促進します。
- 設定アイコン ( ) を使用して、[ダッシュボード] タブに表示するウィジェットやカードをカスタマイズします。この設定は、[ダッシュボード] タブが選択されている場合にのみ使用できます。

> **注:**
> ポートフォリオ計画を編集するためのアクセス権を持つユーザーのみが、ウィジェットやカードをカスタマイズできます。

目標ビューのヘッダーセクションの例



目標ビューの [ダッシュボード] タブ

[ダッシュボード] タブには、目標とターゲットのドリルダウン、詳細の表示、および管理に役立つ複数のウィジェットがあります。次の図では、[ダッシュボード] タブにサンプルの目標リストと 戦略的計画 Workspace での目標に適したさまざまな機能が示されています。

- 目標：ポートフォリオ計画に定義された目標とターゲットを表示および管理するのに役立つ複数のウィジェットを含むセクション。
  - 合計進捗状況：ポートフォリオ計画のすべてのエンティティからのすべての目標の平均進捗状況を表示します。
  - <ポートフォリオ計画のエンティティタイプ>別の進捗状況：ポートフォリオ計画のエンティティタイプ別の合計目標の平均進捗状況 (パーセンテージ) を表示します。たとえば、ポートフォリオ計画のエンティティタイプが部門の場合、ウィジェットには各部門の合計目標の平均進捗状況が表示されます。
  - ステータス：ステータス (赤、緑、黄など) に基づいて目標を表示します。
  - <ポートフォリオ計画のエンティティタイプ>別のステータス：ポートフォリオ計画のエンティティタイプ別の目標のステータスを表示します。たとえば、ポートフォリオ計画のエンティティタイプが部門の場合、ウィジェットには各部門の目標のステータスが表示されます。
  - 合計目標：ポートフォリオ計画に定義された合計目標の数を表示します。
  - 親目標に調整されていません：親目標にもポートフォリオ計画のエンティティにも直接関連付けられていない目標数を表示します。このような目標を親目標またはエンティティに関連付けて、工数が表示されるようにします。

> **注:**
> 目標と親目標の関連付けはオプションです。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ターゲットなし (With no targets)：ターゲットが設定されていない目標数を表示します。このような目標を達成するためのターゲットを設定します。
- 作業が調整されていない ：作業に関連付けられていない目標数を表示します。作業アイテム (プロジェクト、デマンド、およびエピック) を目標に関連付けて、目標を達成してターゲットを満たすために実行されている作業を簡単に表示できます。


「親目標に調整されていません」、「ターゲットなし (With no targets)」、および「作業が調整されていない」のカードは、調整の観点からシステムの目標を正しくレビューおよび定義するのに役立ちます。目標を定義して調整した後、これらのカードを非表示にすることができます。

[ダッシュボード] タブの [目標] セクションの例

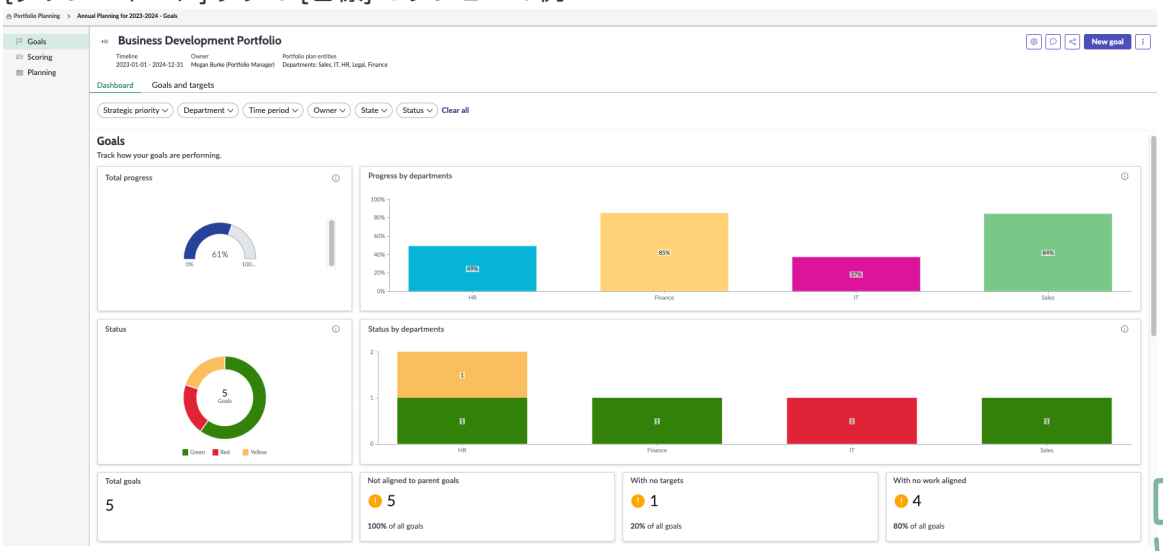

- ターゲット：ポートフォリオ計画に設定されたターゲットを表示および管理するのに役立つ複数のウィジェットを含むセクション。
  - ステータス：ステータスに基づくターゲット数を表示します。ステータスは、ターゲットが終了予定日までに完了する可能性が高いかどうかを示します。
  - 状態 (State)：ポートフォリオ計画のすべてのエンティティのターゲットの状態を表示します。
  - レビューの期限：1 週間以内に期限切れになるターゲット数、または 既に期限切れのターゲット数をそれぞれのレビュー期日の観点から表示します。ターゲットフォームの [チェックイン期限] フィールドは、チェックイン頻度に基づいてターゲットを定期的に更新するのに役立ちます。

[ダッシュボード] タブの [ターゲット] セクションの例

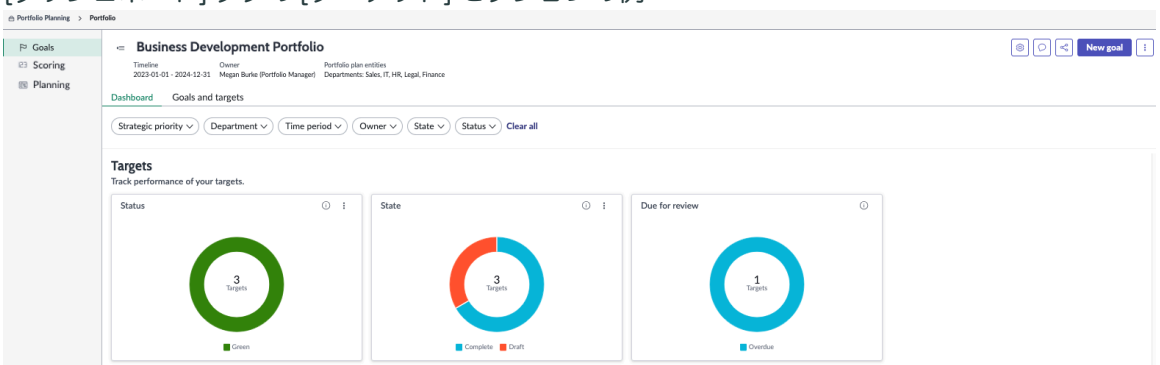


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


- 戦略的優先事項：目標がどの程度組織の長期戦略に沿っているかを確認し、目標を管理するのに役立つ [戦略的優先事項別] ウィジェットを含むセクション。

  [ダッシュボード] タブの [戦略的優先事項] セクションの例

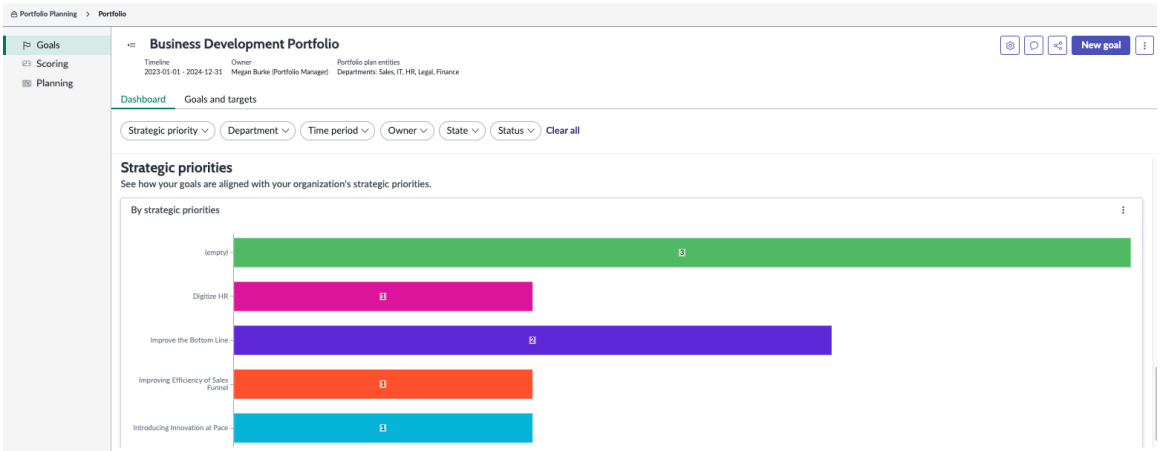  ポートフォリオ計画のデータのフィルタリング

  [ダッシュボード] タブのフィルタリングオプションを使用すると、目標とターゲットのデータを戦略的優先度、ポートフォリオ計画のエンティティタイプ、期間、所有者、状態、およびステータスでフィルタリングできるため、特定の情報に集中できます。

[目標とターゲット] タブのリストビュー

リストビューは、特定のポートフォリオ計画の目標とターゲットを表示、作成、および管理するのに役立ちます。[リスト] タブでは、ダウンストリームおよびアップストリームの目標が表示されないため、現在のポートフォリオ計画の目標とターゲットのみに集中できます。[リスト] タブは、ターゲットブレークダウンの実際の値を直接更新するのに役立ちます。ただし、[階層] タブからダウンストリームとアップストリームの目標とターゲットを表示できます。次の図では、[リスト] タブにサンプルの目標リストと 戦略的計画 Workspace での目標に適したさまざまな機能が示されています。


- 行コンテキストメニューアイコン ( ) を使用すると、サブ目標の作成、ターゲットの設定、選択した目標と作業との整合など、目標を管理するためのオプションを確認することができるようになります。
- アサインされたエンティティ：目標が属するエンティティの名前。
- カスタマイズ：[リスト] タブに表示する列をカスタマイズできます。[リスト] タブに表示する列を有効にするには、設定アイコン ( ) を選択します。
- チェックイン頻度:ターゲットのブレークダウン間隔を指定します。ターゲットを短い期間 (四半期など) にブレークダウンすると、ターゲットを四半期ごとに設定して、特定のブレークダウンターゲットに絞り込むことができます。
- [注釈を追加 (Add remarks)] アイコン ( )：ブレークダウン実績の更新時にビジネス上の根拠についてユーザーが入力した注釈を指定します。[注釈] アイコンを選択すると、[詳細] タブと [コメント] タブを含むブレークダウンサイドパネルが開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ターゲットブレークダウン：ターゲットブレークダウンの詳細を年ごとまたは四半期ごとの間隔で表示するのに役立ちます。このウィンドウで実際の値を入力または更新することもできます。
- 四半期ごと/年ごと：四半期ごとまたは年ごとにターゲットブレークダウンのビューをカスタマイズするのに役立ちます。

[リスト] タブの目標とターゲットビューの例

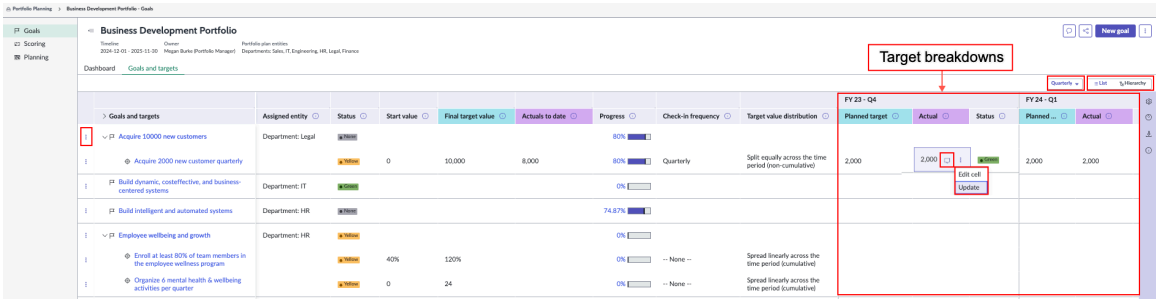


[目標とターゲット] タブの階層ビュー

階層ビューは、ポートフォリオ計画エンティティの目標とターゲットを階層的に表示するのに役立ちます。また、このタブは、現在のポートフォリオ計画の目標とターゲットとともに、(ポートフォリオ計画エンティティの) 親エンティティの目標を表示するのにも役立ちます。たとえば、次の図では、部門がポートフォリオ計画エンティティになっており、事業部門がその親エンティティになっています。[親エンティティの目標] オプションを有効にすると、現在のポートフォリオ計画の目標とターゲットとともに、(ポートフォリオ計画エンティティの) 親エンティティの目標が表示されます。[親エンティティの目標] オプションを有効にすると、ポートフォリオの目標を計画し、親エンティティの目標に合わせて調整できます。

- 親エンティティの目標：(ポートフォリオ計画エンティティの) 親エンティティの目標を表示します。これは、ポートフォリオ目標を計画し、親エンティティの目標に合わせて調整するのに役立ちます。
- カスタマイズ：[階層] タブに表示する列をカスタマイズできます。[階層] タブに表示する列を有効にするには、設定アイコン ( ) を選択します。
- 行コンテキストメニューアイコン ( ) を使用すると、サブ目標の作成、ターゲットの設定、選択した目標と作業との整合など、目標を管理するためのオプションを確認することができるようになります。
- 調整されていない目標 - 親エンティティに直接関連付けられていない (Unaligned goals – Not directly associated with parent entities)：親目標に直接関連付けられていない目標をリストします。このような目標レコードをサイドパネルから開き、目標が属する親エンティティの目標に基づいて [親目標] フィールドに入力できます。

[階層] タブの目標ビューの例

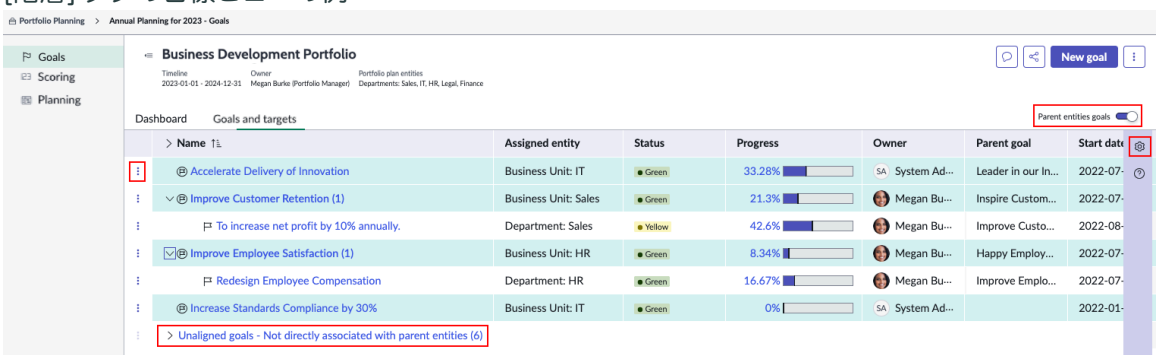

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

目標の例と推奨事項

ビジネス目標は、優先順位を確立し、会社を成功に導くための重要な部分です。達成可能な目標を設定する方法を理解することで、企業の短期的および長期的な軌道に乗る能力を大幅に向上させることができます。

戦略的優先事項とその目標およびターゲットの例を次に示します。

戦略的優先事項とその目標とターゲットの例

戦略的優先事項	目標	ターゲット
カスタマーエクスペリエンスの向上	顧客満足度を向上させる	2024 年第 4 四半期までに顧客満足度スコアが 90% 以上になる
		2024年末までに顧客からの苦情を20%削減
	顧客エンゲージメントの向上	12か月以内にプラットフォームのアクティブユーザーを15%増加させる
		2024年第4四半期までに顧客維持率を10%向上
イノベーションと製品開発を促進	新製品の市場投入までの時間を短縮	2024 年から毎年 3 つの新製品または機能を発売
		2025年までに製品開発サイクルを12カ月から8カ月に短縮
	イノベーションの文化を育む	年間予算の15%を研究開発に充てる
		従業員が提出したイノベーションプロジェクトの数を 18 か月以内に 25% 増やす
市場リーチの拡大	主要地域での市場シェア拡大	2025年までにアジア太平洋地域の市場シェア5%成長を達成
		2026年までに3つの新しい国際市場に拡大
	戦略的パートナーシップの構築	2024年までに、現地の販売代理店または再販業者と5つの新しい戦略的パートナーシップを確立する
		2025年末までにパートナーシップからの収益を20%増加させる
業務効率の向上	内部プロセスの最適化	2024 年第 3 四半期までにエンタープライズリソースプランニング (ERP) システムを実装する
		自動化により運用コストを 2025 年までに 10% 削減

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的優先事項とその目標とターゲットの例 (続く)

戦略的優先事項	目標	ターゲット
	従業員の生産性を向上	2024年末までに従業員満足度スコアを85%に引き上げる
		2025年までに従業員の離職率を15%削減

目標とターゲットを設定するための推奨事項

組織のビジネス成長のための目標とターゲットのセットアップ方法に関する推奨事項を次に示します。

目標:2024年に全体的な収益と市場シェアを拡大

ターゲット 1: 対象地域で市場シェアを10%拡大

ワークスペースで [ターゲット] フォーム を使用してターゲットを定義するための推奨セットアップは次のとおりです。

- 開始日:24/01/01
- 終了日:31/12/24
- タイプ:最大化
- 測定単位:パーセンテージ
- 開始値:40%(2023年末までに市場シェアがすでに40%であることを考慮)
- 最終目標値:50%
- チェックイン頻度:月次または四半期ごと
- ターゲット値分布:期間全体に直線的に広がる (累積)

ターゲット2: 第 4 四半期末までに 4 つの新製品またはサービスを発売する

ワークスペースで [ターゲット] フォーム を使用してターゲットを定義するための推奨セットアップは次のとおりです。

- 開始日:24/01/01
- 終了日:31/12/24
- タイプ:最大化
- 測定単位:カウント
- 開始値:0
- 最終ターゲット値:4
- チェックイン頻度:四半期ごと
- ターゲット値分布:期間全体に均等に分割 (非累積)

ターゲット3: 1,000 社の新規法人顧客を獲得

ワークスペースで [ターゲット] フォーム を使用してターゲットを定義するための推奨セットアップは次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 開始日:24/01/01
- 終了日:31/12/24
- タイプ:最大化
- 測定単位:カウント
- 開始値:0
- 最終ターゲット値:1000
- チェックイン頻度:月次または四半期ごと
- ターゲット値分布:期間全体に均等に分割 (非累積)、または期間全体に直線的に広がる (累積)

目標:顧客満足度と定着率の向上

ターゲット 1: ネットプロモータースコア (NPS) を 70 から 85 に引き上げる

ワークスペースで [ターゲット] フォーム を使用してターゲットを定義するための推奨セットアップは次のとおりです。

- 開始日:24/01/01
- 終了日:31/12/24
- タイプ:最大化
- 測定単位:カウント
- 開始値:70
- 最終ターゲット値:85
- チェックイン頻度:月次または四半期ごと
- ターゲット値分布:期間全体に直線的に広がる (累積)

ターゲット2: 顧客解約率を12%から8%に削減

ワークスペースで [ターゲット] フォーム を使用してターゲットを定義するための推奨セットアップは次のとおりです。

- 開始日:24/01/01
- 終了日:31/12/24
- タイプ:最小化
- 測定単位:パーセンテージ
- 開始値:12%
- 最終目標値:8%
- チェックイン頻度:月次または四半期ごと
- ターゲット値分布:期間全体に直線的に広がる (累積)

ターゲット3: 四半期ごとに顧客フィードバックサーベイを実施し、回答率 60% を達成

ワークスペースで [ターゲット] フォーム を使用してターゲットを定義するための推奨セットアップは次のとおりです。

- 開始日:24/01/01
- 終了日:31/12/24

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タイプ:最大化
- 測定単位:パーセンテージ
- 開始値:0
- 最終目標値:60%
- チェックイン頻度:四半期ごと
- ターゲット値分布:期間全体に直線的に広がる (累積)

目標:戦略的パートナーシップチャネルの構築

ターゲット 1: 新たに5つのコンサルティング会社とパートナーシップを締結

ワークスペースで [ターゲット] フォーム を使用してターゲットを定義するための推奨セットアップは次のとおりです。

- 開始日:24/01/01
- 終了日:31/12/24
- タイプ:最大化
- 測定単位:カウント
- 開始値:0
- 最終ターゲット値:5
- チェックイン頻度:月次または四半期ごと
- ターゲット値分布:期間全体に直線的に広がる (累積)

ターゲット2: パートナーを通じて $10 00K の収益を生み出す

ワークスペースで [ターゲット] フォーム を使用してターゲットを定義するための推奨セットアップは次のとおりです。

- 開始日:24/01/01
- 終了日:31/12/24
- タイプ:最大化
- 測定単位:通貨
- 開始値:0
- 最終ターゲット値:100K
- チェックイン頻度:月次または四半期ごと
- ターゲット値分布:期間全体に直線的に広がる (累積) か、期間全体に均等に分割する (非累積) ことができます。ターゲットの進捗状況を月ごとまたは四半期ごとに個別に追跡するか、集計レベルで追跡するかに応じて、このオプションを設定します。

戦略的計画 での目標の作成

ポートフォリオ計画の目標を作成し、ターゲットを設定して全体的な目標の進捗状況を測定し、目標を組織の戦略的優先事項と整合させます。

始める前に

必要なロール:sn_apw_advanced.spw_goal_user および (sn_align_core.apw_user または sn_gf.goal_admin)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
目標は本来、定性的なものが一般的です。目標は意欲的なものでなければならず、チームの意欲をかきたて、やりがいを与えることが期待されます。

目標の所有者か貢献者のみが目標を編集することができます。

注:
目標を作成してもポートフォリオ計画に表示されない場合は、[目標] フォームの [アサインされたエンティティタイプ] フィールドと [アサインされたエンティティ] フィールドに入力して、ポートフォリオ計画にそれらの目標を表示します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、目標を作成するポートフォリオ計画を選択します。
3. [優先順位付け] または [ロードマップ] を選択し、ドキュメントを作成する計画立案アイテムを選択します。
4. 目標 ページで、 新しい目標 を選択します。
5. フォームで、フィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「[目標] フォーム」を参照して ください。
6. **[Save** (保存)] を選択します。
   [ターゲットを保存して追加] を選択し、フローで目標のターゲットを追加することもできます。
   ターゲットのフィールド値の説明については、「 [ターゲット] フォーム」を参照してください。

次のタスク
目標のターゲットを設定します。詳細については、戦略的計画 での目標のターゲットの作成およびターゲット自動化のためのターゲットソースの構成を参照してください。

戦略的計画 での目標のターゲットの作成

目標の進捗状況を追跡して測定するために、目標の SMART ターゲットを作成します。

始める前に
必要なロール:sn_apw_advanced.spw_goal_user および (sn_align_core.apw_user または sn_gf.goal_admin)

このタスクについて
ターゲットのターゲットソースを構成すると、[ターゲット] フォームの [現在 までの実績] フィールドが自動的に更新されます。[store-future: BEGIN review] ターゲットの自動化の詳細については、「 でのターゲット実績の自動化 戦略的計画」を参照してください。[End]

SMART ターゲットは、S = 特定、M = 測定可能、A = 達成可能、R = 関連、T = 期限付きとして定義できます。

注:
- 目標の所有者または貢献者のみが目標のターゲットを作成することができます。
- また、ServiceNow® ESG Management アプリケーションがインストールされている場合、ターゲットフォームの [機密性] フィールドを有効化することで、特定のユーザーに対してターゲットレコードへのアクセスを制限することもできます。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、目標のターゲットを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. フォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「[ターゲット] フォーム」を参照して ください。
3. **[Save** (保存)] を選択します。
   [保存して新しいターゲットを追加] を選択し、フローの目標のターゲットをさらに追加することもできます。

タスクの結果

ターゲットの投稿を保存して [実績終了日] フィールドに入力すると、ターゲット進捗状況レコードが自動的に作成されます。ターゲット進捗レコードは、目標に対する各ターゲットの進捗状況を指定します。

> **注:**
> 目標を削除すると、[ターゲットの削除を許可] プロパティが **[** いいえ] に設定されていても、関連するターゲット (存在する場合) およびその進捗レコードも削除されます。

次のタスク

自動化の対象のターゲットが有効になっていない場合は、手動でターゲットの進捗状況を更新します。

手動ターゲットの進捗状況の更新

ターゲットのステータスが変更されたときにターゲットの進捗状況を更新します。

始める前に

必要なロール：sn_apw_advanced.spw_goal_user および sn_align_core.apw_user

このタスクについて

> **注:**
> 目標の所有者または貢献者のみが目標のターゲットを更新することができます。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、目標のターゲットレコードを開きます。
2. フォーム で、[実績終了日] フィールドを更新し、[注釈] フィールドにビジネス上の根拠を追加します。

   フィールド値の説明については、「[ターゲット] フォーム」を参照して ください。
3. [更新] または [保存] を選択します。

タスクの結果

[実績終了日] フィールドが更新されると、ターゲットとその目標の進捗値が自動更新されます。進捗値の計算方法については、「進捗値の計算」を参照してください。ターゲットブレークダウンを持つターゲットの進捗値の計算方法については、「戦略的計画 でのターゲットブレークダウン」を参照してください。

関連情報

- ターゲットブレークダウンの実際の値の更新
- 自動化されたターゲットの進捗状況の更新

自動化されたターゲットの進捗状況の更新

[ターゲット] フォームの [実績値を更新] 関連リンクを使用して、ターゲットの進捗状況を更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：sn_apw_advanced.spw_goal_user および sn_align_core.apw_user

このタスクについて

注:
目標の所有者または貢献者のみが目標のターゲットを更新することができます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、ターゲットが属する必要なポートフォリオ計画を選択します。
3. [目標] ビューで、[目標とターゲット] タブを選択します。
4. 進捗状況を更新するターゲットを選択します。
   [ターゲット] サイドパネルが開き、[詳細] タブが表示されます。

   ターゲットにブレークダウンがある場合、ターゲットを選択すると、[ターゲット] サイドパネルが開き、[進捗状況] タブが表示されます。[ターゲット] サイドパネルで [詳細] タブを選択します。
5. サイドパネルから [完全な詳細] を選択して [ターゲット] フォームを開きます。
6. [ターゲット] フォームで、[実績値を更新] 関連リンクを選択します。
   フィールド値の説明については、「[ターゲット] フォーム」を参照して ください。

タスクの結果
[実績終了日] フィールドが更新されると、ターゲットとその目標の進捗値が自動更新されます。進捗値の計算方法については、「進捗値の計算」を参照してください。ターゲットブレークダウンを持つターゲットの進捗値の計算方法については、「戦略的計画 でのターゲットブレークダウン」を参照してください。

関連情報

手動ターゲットの進捗状況の更新

ターゲットブレークダウンの実際の値の更新

目標またはターゲットの複製

既存の目標またはターゲットのコピーを作成して、目標を組織の戦略的優先事項に合わせます。作成する目標またはターゲットが既存のものと類似している場合は、既存のレコードを複製することで時間を節約できます。

始める前に
必要なロール：sn_apw_advanced.spw_goal_user および sn_align_core.apw_user

このタスクについて
目標は本来、定性的なものが一般的です。目標は意欲的なものでなければならず、チームの意欲をかきたて、やりがいを与えることが期待されます。

目標の所有者か貢献者のみが目標を編集することができます。

注:
目標を作成してもポートフォリオ計画に表示されない場合は、[目標] フォームの [アサインされたエンティティタイプ] フィールドと [アサインされたエンティティ] フィールドに入力して、ポートフォリオ計画にそれらの目標を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、目標を作成するポートフォリオ計画を選択します。
3. [目標] ページで、[目標とターゲット] を選択し、[リスト] または [階層 ビュー] を選択します。
4. コピーする目標またはターゲットの行コンテキストメニューアイコン (を選択し、[複製] を選択します。
   - 目標の場合、[目標] モーダルが開き、コピー元の目標のすべての詳細が表示されます。必要に応じて目標の詳細を更新し、[保存] を選択して目標を保存するか、[保存してターゲットを追加] を選択して目標を保存し、目標のターゲットを追加できます。フィールド値の説明については、「[目標] フォーム」を参照して ください。
   - ターゲットの場合、コピーされたターゲットはその目標のすぐ下に表示されます。このアクションでは、ターゲット実績はコピーされないことに注意してください。ターゲットレコードを開き、必要に応じて詳細を更新してから、目標のターゲットを保存できます。フィールド値の説明については、「[ターゲット] フォーム」を参照して ください。

   デフォルトでは、名前は *Copy of ABC* です。ここで、ABC はコピー元の目標またはターゲットの名前です。

次のタスク

目標のターゲットをさらに設定します。詳細については、「戦略的計画 での目標のターゲットの作成」または「ターゲット自動化のためのターゲットソースの構成」を参照してください。

でのターゲット実績の自動化 戦略的計画

ターゲット自動化機能を使用して、ターゲットの実績値を自動化します。

https://player.vimeo.com/video/1077953139?h=93de7e6865&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479%0Ahttps://youtu.be/pd0dWCbHRkA


次の手順をガイドラインとして使用し、実績の自動化を有効にし、ターゲット自動化機能を使用してターゲットにターゲットソースを構成します。

ターゲットのターゲット自動化を有効にするには、 [ターゲット] フォーム で次の手順を実行する必要があります。

1. [開始値]、[最終ターゲット値]、および [チェックイン頻度] を入力し、ターゲットの他の必須フィールドに入力します。
2. [実績値の自動化] フィールドを選択します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

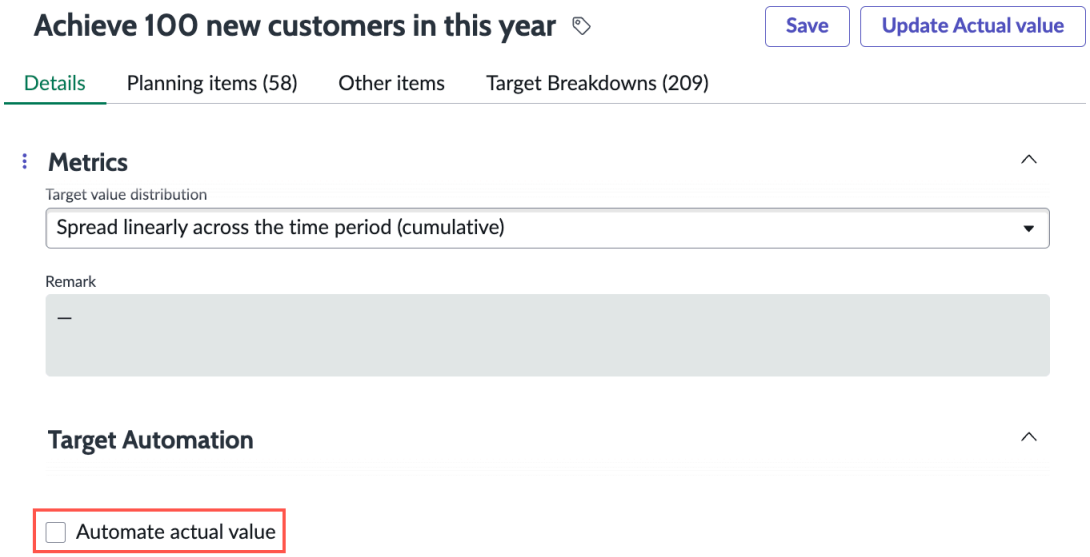

3. [実績値のソース] フィールドでターゲットソースを選択し、ターゲット自動化のために値をフェッチする必要があります。

ターゲットソースは、ターゲットの実績値を自動更新するためのターゲットの構成 (カスタムスクリプト、PA インジケーター、またはアセスメント) であり、ターゲットとその目標の進捗状況が自動的に更新されます。

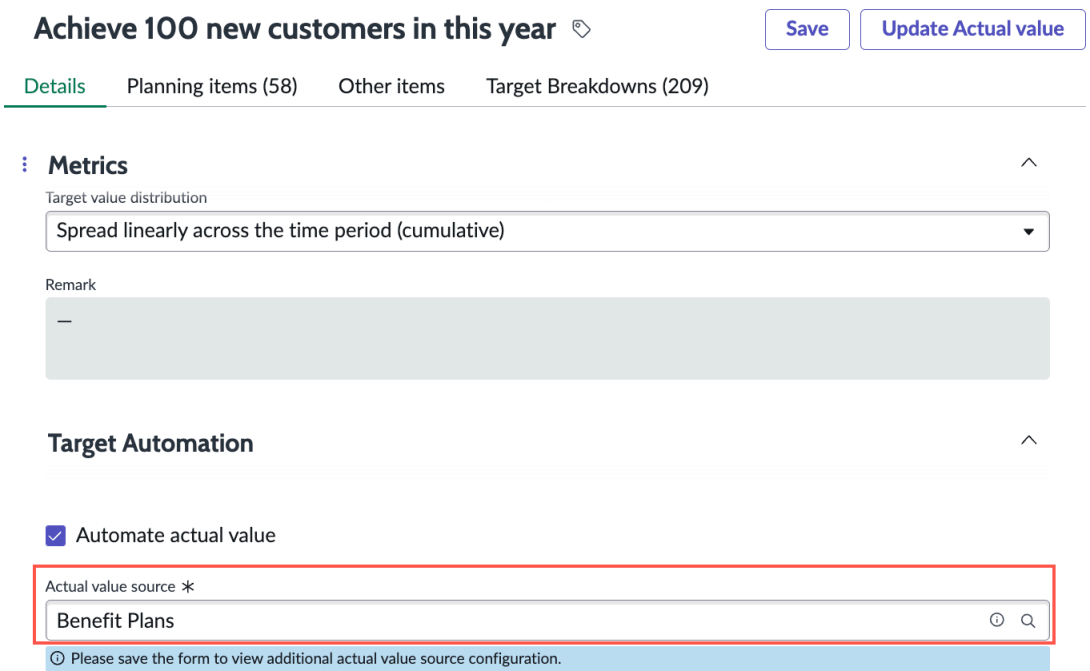

[利益計画] オプションまたはカスタムターゲットソースをターゲットのターゲットソースとして選択できます。ターゲットソースを選択した後、ターゲットレコードを保存して、追加の実績値のソース構成を表示します。


- 利益計画ターゲットソース:カスタムスクリプトを使用して作成され、目標またはターゲットに関連付けられた計画立案アイテムの利益計画の実績利益値がターゲット実績をフェッチするターゲットソース。その後、アプリケーションは、実績利益値に基づいてターゲットの実績値を更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ターゲットの実績値ソースとして [利益計画] ターゲットソース (利益計画の事前定義されたターゲット自動化スクリプト) を選択すると、[変数] セクションに **[benefit_plan**] フィールドが表示され、そこから、ターゲットの値を取得して実際の値を自動化するために必要な利益計画を選択できます。

> **注:**
> 目標またはターゲットに関連付けられた計画立案アイテムの利益計画のみが、ターゲット自動化のソースとして [**benefit_plan**] フィールドで選択できます。

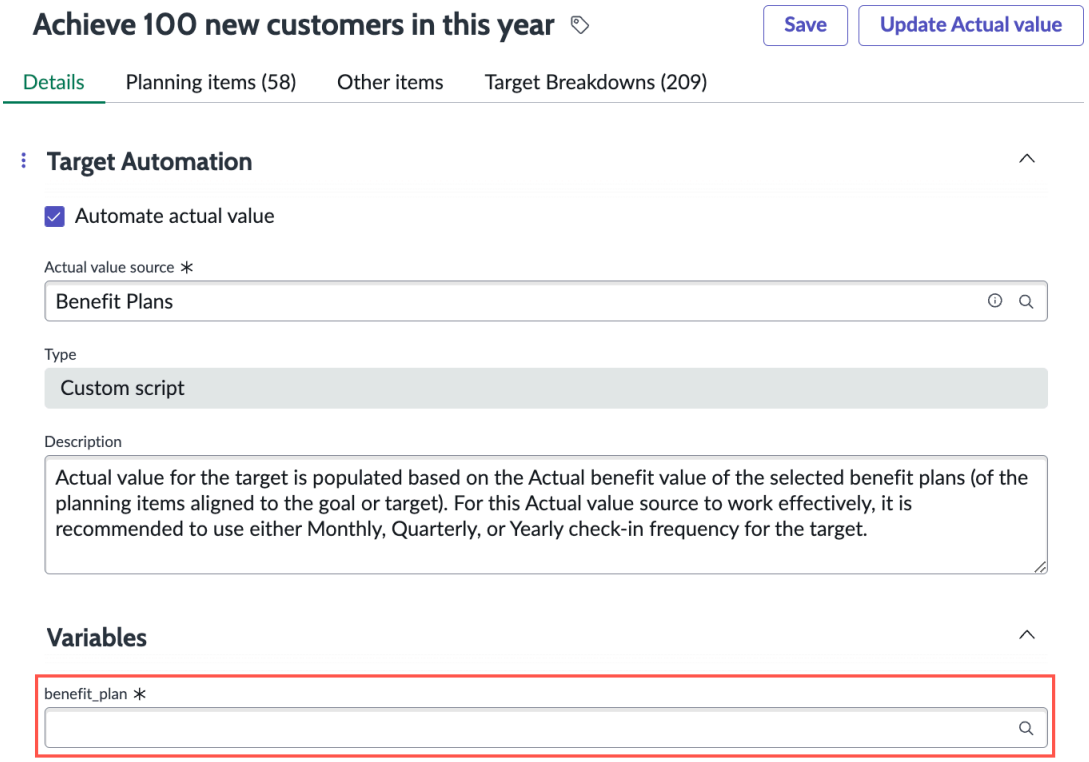

- カスタムターゲットソース - カスタムターゲットソースを作成し、それをソースとして構成して、ターゲットの実績値を更新します。ターゲットソースの作成方法については、「 ターゲットソースの作成」を参照してください。

目標のターゲットを作成する手順については、「 戦略的計画 での目標のターゲットの作成」を参照してください。

戦略的計画 でのターゲットブレークダウン

ターゲットを短い期間 (月次など) にブレークダウンすると、各月のターゲット値を設定して、その特定の月次ターゲットに焦点を当てることができます。ターゲットブレークダウンは、ターゲットに設定された [チェックイン頻度] と [ターゲット値分布] に基づいて自動的に作成されます。

ターゲットのチェックイン頻度は、[日次]、[週次]、[月次]、[四半期ごと]、または [年ごと] に設定できます。ターゲットのチェックイン頻度に基づいて、対応するターゲットブレークダウンが作成されます。たとえば、1 年間にわたるターゲットで [チェックイン頻度] が [月次] に設定されている場合、12 個の月次ターゲットブレークダウンが作成されます。計画ターゲット値は、ターゲットの [ターゲット値配布] 設定に基づいて、各ターゲットブレークダウンに自動的に設定されます。

> **注:**
> ターゲットブレークダウン機能は定性的ターゲットではサポートされていません。

次の例は、さまざまなターゲット配布タイプを持つターゲットに対してターゲット進捗状況を計算する方法を理解するのに役立ちます。

例 1:2025 暦年に 1200 人の新規顧客を獲得する (非累積的に追跡)


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この例では、2025 暦年に 1200 人の新規顧客を獲得するというターゲットを達成し、進捗状況を毎月 (非累積的に) 追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。

- 開始日と終了日をそれぞれ 2025-01-01 と 2025-12-31 に設定する
- 開始値と最終ターゲット値をそれぞれ 0 と 1200 に設定する
- ターゲットの [チェックイン頻度] を [月次] に設定します
- [ターゲット値分布] を [期間全体で均等に分割 (非累積)] に設定します

  このターゲット値分布は、最終ターゲット値が 12 の等しい値 (各ターゲットブレークダウンの計画ターゲット値) に分割され、最終的なターゲット値に集計されることを意味します。必要に応じて、後でそれぞれのターゲットブレークダウンレコードから計画ターゲット値を編集できます。

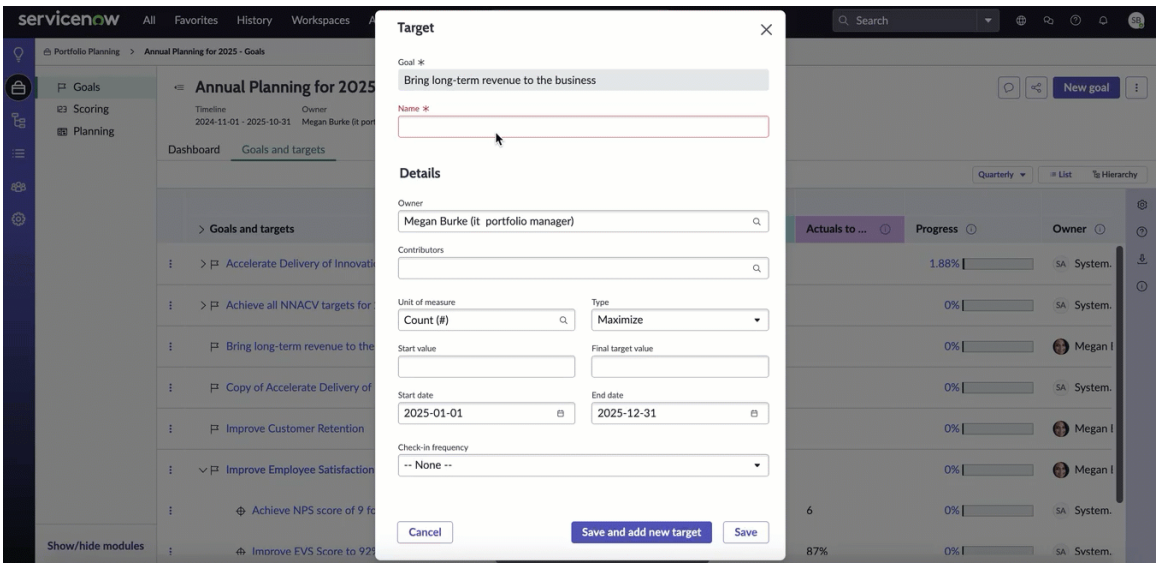

この場合、アプリケーションは 2025 暦年の 12 のターゲットブレークダウン (1 月、2 月,.....,12 月) を作成し、各ターゲットブレークダウンの計画ターゲット値を 100 に設定します (最終ターゲット値をターゲットブレークダウンの数で割った値)。

アプリケーションでは、各月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、ターゲットブレークダウンには特定の月に達成された実際の値を入力する必要があります。たとえば、1 月に 100 人の顧客を獲得した場合、1 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。2 月にさらに 100 人の顧客を獲得した場合、2 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。同様に、さらに 3 月に 100 個、4 月に 100 個取得した場合は、3 月と 4 月の両方のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。

アプリケーションでは、各月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、合計値をメインターゲットの実際の値にロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。

例 2:2025 暦年に 1200 人の新規顧客を獲得する (累積的に追跡)


この例では、2025 暦年に 1200 人の新規顧客を獲得するというターゲットを達成し、進捗状況を月次 (累積) で追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。

- 開始日と終了日をそれぞれ 2025-01-01 と 2025-12-31 に設定する
- 開始値と最終ターゲット値をそれぞれ 0 と 100 に設定する
- ターゲットの [チェックイン頻度] を [月次] に設定します

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [ターゲット値分布] を [期間全体に直線的に分散 (累積)] に設定します

  このターゲット値分布は、最終ターゲット値が 12 の計画ターゲット値に線形に分割されることを意味します (最後の月次ブレークダウンの値が最終ターゲット値と等しくなるようにします)。必要に応じて、後でそれぞれのターゲットブレークダウンレコードから計画ターゲット値を編集できます。

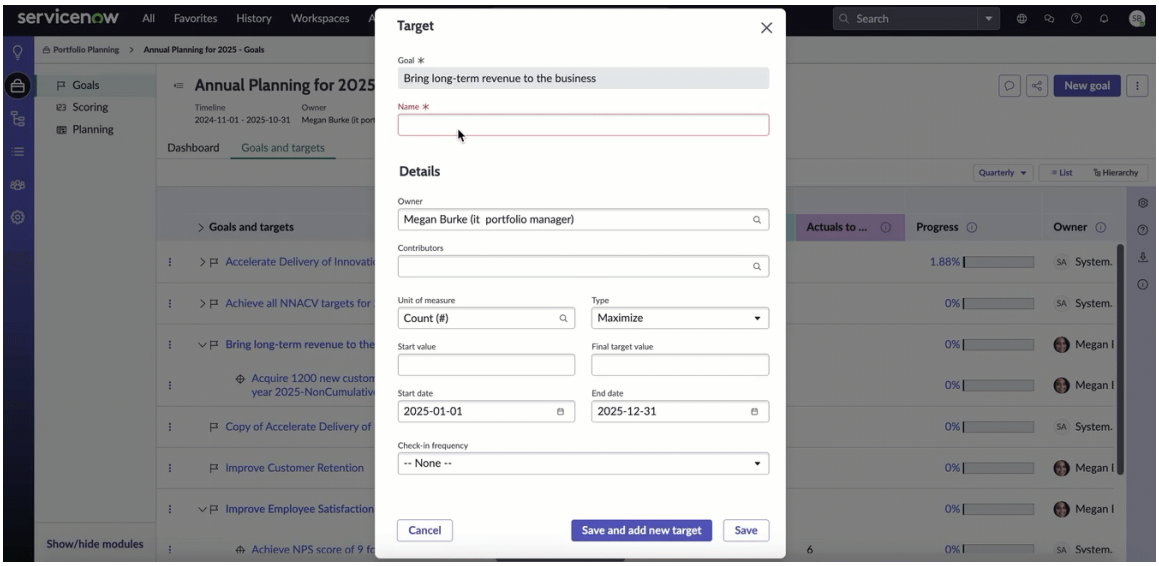

この場合、アプリケーションは 2025 暦年に対して 12 のターゲットブレークダウン (1 月、2 月,.....,および 12 月) を作成し、1 月、2 月,.....,、および 12 月のブレークダウンの計画ターゲット値をそれぞれ 100、200,.....,および 1200 に設定します。

アプリケーションでは最新の月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、最新の月次ターゲットブレークダウンに実際の累積値を入力する必要があります。たとえば、1 月に 100 人の顧客を獲得した場合、1 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。2 月にさらに 100 人の顧客を獲得した場合、2 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。同様に、さらに 3 月に 100 個、4 月に 100 個取得した場合は、3 月と 4 月のターゲットブレークダウンの実際の値として、それぞれ 300 と 400 を入力します。


アプリケーションでは、最新の月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、メインターゲットの実際の値にロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。

目標の進捗状況をグラフィカルに視覚化

ターゲットのサイドパネルにある [進捗状況] タブでは、計画ターゲット値とブレークダウンの実際の値に基づいて、ターゲット進捗状況の傾向がグラフで可視化されます。[進捗状況] タブから、計画ターゲットを編集し、ターゲット実績のチェックイン履歴を表示することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

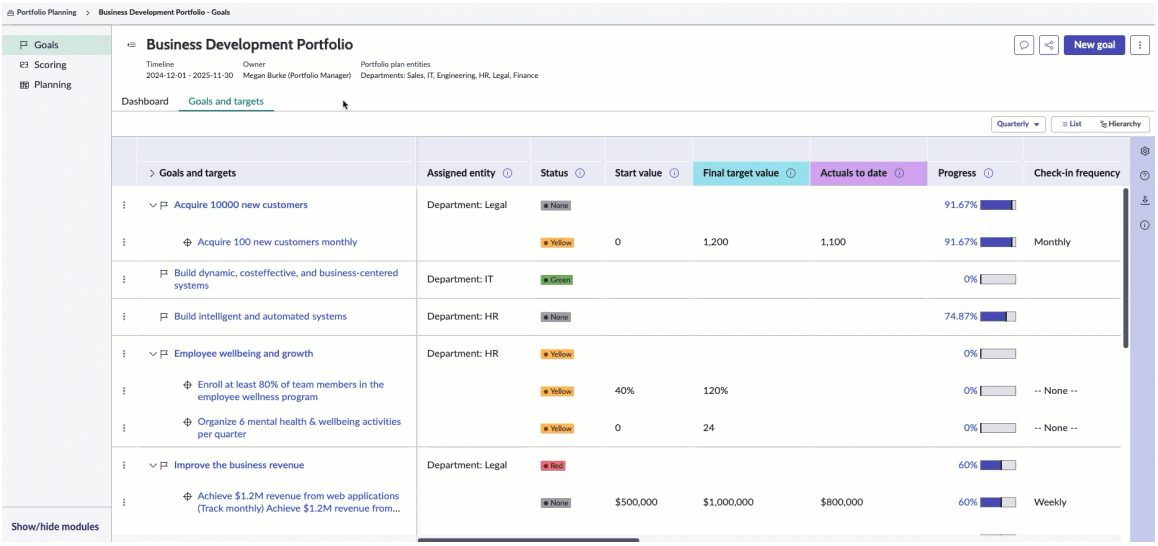

ターゲットブレークダウンのメリット

ターゲットブレークダウン機能は、ある期間のターゲットを設定するが、ターゲットの進捗状況を日次、週次、月次、四半期ごと、年ごとなどの短い期間で追跡する場合に役立ちます。たとえば、開始値と最終ターゲット値がそれぞれ 0 と 1200 の年のターゲットを設定したとします。また、四半期ごとに 100 の月次ターゲットを設定するとします。この場合、ターゲットを月次ターゲットにブレークダウンし、各月のターゲット値を設定することで、特定の月次ターゲットに焦点を当て、それらの月次ターゲットに対して実績を更新できます。

ターゲットブレークダウン機能には、次のようなメリットがあります。

- 長期的なターゲットを日次、週次、月次、四半期ごと、年次などの短期的な間隔に分解して、進捗状況をより適切に追跡またはレポートできるようにします
- 必要に応じて、各ターゲットブレークダウンの計画ターゲット値を設定または変更します
- 各ターゲットブレークダウンの実際の値を更新し、メインターゲットの進捗状況を追跡する
- ターゲット全体ではなく、特定の短期ターゲット(ターゲットブレークダウン)に焦点を当てる
- 短期および長期のターゲットの進捗状況を累積的または非累積的に追跡する
- 計画されたターゲットに対するターゲットのプロセスの傾向を折れ線グラフまたは棒グラフで可視化します

チェックイン頻度が [なし] に設定されている場合の実際の値の計算方法

ターゲットのチェックイン頻度が [なし] に設定されている場合は、メインターゲットレコードの [実績累計] フィールドに実際の値を入力する必要があります。入力する実際の値は、ターゲットの期間に関係なく累積する必要があります。チェックイン頻度が [なし] に設定されている場合、ターゲットブレークダウンは作成されません。

ターゲット自動化でのターゲットブレークダウン

ターゲットに対してターゲット自動化機能を有効にし、チェックイン頻度とターゲット値分布を設定した場合、ターゲット自動化機能によって、チェックイン期限に基づいてそれぞれのターゲットブレークダウンの実際の値が自動的に更新されます。ターゲットブレークダウンの実際の値が更新された後、その値はロールアップされ、メインターゲットの実際の値にロールアップされます。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。

ターゲットブレークダウンの実際の値の更新

ターゲットブレークダウンのステータスが変更されたときに、その実際の値を更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール:sn_apw_advanced.spw_goal_user および (sn_align_core.apw_user または sn_gf.goal_admin)

このタスクについて
ターゲットブレークダウンの実際の値を更新すると、そのターゲットの実際の値が自動的に更新されます。ターゲットの [実績終了日] フィールドが更新されると、ターゲットとその目標の進捗値が自動更新されます。

注:
目標の所有者または貢献者のみがターゲットブレークダウンを更新することができます。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、目標のターゲットレコードを開きます。

2. フォームで、ターゲットブレークダウンの [実績] フィールドを更新し、[注釈] フィールドにビジネス上の根拠を追加します。
フィールド値の説明については、「[ターゲットブレークダウン] フォーム」を参照して ください。

3. **[Save** (保存)] を選択します。

タスクの結果
[実績] フィールドが更新されると、ターゲットとその目標の進捗値が自動更新されます。進捗値の計算方法については、「進捗値の計算」を参照してください。ターゲットブレークダウンの実際の値がそのターゲットにどのようにロールアップされるかについては、「戦略的計画 でのターゲットブレークダウン」を参照してください。

関連情報

手動ターゲットの進捗状況の更新

自動化されたターゲットの進捗状況の更新

計画立案アイテムの目標またはターゲットへの関連付け

計画立案アイテムまたはその他の任意のアイテムで目標またはターゲット関係を作成し、現在または将来の作業を特定して関連付け、目標およびターゲットを達成します。

始める前に
必要なロール：sn_apw_advanced.spw_goal_user および sn_align_core.apw_user

このタスクについて
目標またはターゲットを計画立案アイテム (プロジェクト、デマンド、プログラム、エピック) に関連付けることができます。

[作業を調整] ウィンドウから、目標またはターゲットを一度に複数の計画立案アイテムに関連付けることができます。目標またはターゲットの [計画立案アイテム] タブから、目標またはターゲットを一度に 1 つの計画立案アイテムにのみ関連付けることができます。

計画立案アイテムテーブルが *planning_item_types_allow_list* プロパティに追加されている場合にのみ、[作業を調整] ウィンドウからカスタム計画立案アイテムとの目標またはターゲット関係を作成できます。詳細については、「戦略的計画 でのカスタムアイテムタイプの有効化」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
計画立案アイテム (プロジェクト、デマンド、またはエピック) で目標またはターゲット関係が作成されると、目標レコードの [計画立案アイテム] タブにレコードが表示されます。その他の任意のアイテムで目標またはターゲット関係が作成されると、レコードはそれぞれの目標またはターゲットレコードの [その他のアイテム] タブが表示されます。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、[目標/ターゲット関係] フォームを開きます。

2. [完了] または [保存] を選択します。

計画立案アイテムの主要目標またはターゲットの関連付けまたは更新

目標またはターゲットの達成に寄与する計画立案アイテムに対する主要目標またはターゲットを関連付けることができます。

始める前に
必要なロール：sn_apw_advanced.spw_goal_user および sn_align_core.apw_user

このタスクについて
計画立案アイテムフォームの [主要目標] フィールドおよび [プライマリターゲット] フィールドにそれぞれ入力することで、目標またはターゲットを計画立案アイテムにプライマリとして関連付けることができます。[プライマリターゲット] フィールドに入力すると、[主要目標] には入力されたターゲットの目標が自動的に入力されます。詳細については、「計画立案アイテムフォーム」を参照してください。

計画立案アイテムを目標またはターゲットと関連付けた後、目標のフォームの [計画立案アイテム] タブや計画立案アイテムのフォームの [目標/ターゲット関係] タブで、こうした関係を直接確認できるようになります。

注:

- デフォルトでは、目標またはターゲットを計画立案アイテムに初めて関連付けたときに、目標またはターゲットがプライマリになります。その後、目標またはターゲットの関連付け中に [プライマリ] フィールドが選択されていない限り、目標またはターゲットと計画立案アイテムの関連付けはセカンダリ関連付けになります。
- 計画立案アイテムに既に主要目標の関連付けがあり、別の目標をプライマリとして設定する場合、既存の主要目標の関連付けはセカンダリになり、新しい関連付けが計画立案アイテムのプライマリになります。
- イニシアチブや戦略的プログラムなどの戦略的アイテムでは、主要目標またはターゲットの関連付けはサポートされていません。
- 主要目標またはターゲットをカスタム計画立案アイテムに関連付けるには、カスタム計画立案アイテムが *planning_item_types_allow_list* プロパティに追加されていることを確認します。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、必要な計画立案アイテムのフォームを開きます。

2. [アイテムの詳細] サイドパネルや [詳細] タブで、関連付けや更新が必要な目標およびターゲットをそれぞれ [主要目標] フィールドおよび [プライマリターゲット] フィールドに入力したり更新したりします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

または、[目標/ターゲット関係] タブで [追加] を選択し、必要に応じて [目標] フィールドと [ターゲット] フィールドに入力して、[プライマリ] を選択することもできます。その場合、計画立案アイテムフォームの [主要目標] および [主要ターゲット] フィールドに自動的に入力されます。

フィールド値の説明については、「計画立案アイテムフォーム」を参照して ください。

3. [更新] または [保存] を選択します。

次のタスク

既存の目標またはターゲットの関連付けを削除する場合は、関連付けレコードを選択し、計画立案アイテムレコードの [目標/ターゲット関係] タブで [削除] オプションを選択することで、関連付けを削除できます。計画立案アイテムにプライマリ目標とセカンダリ目標の関連付けがある場合は、他の目標を計画立案アイテムのプライマリにした後にのみ、プライマリの関連付けを削除できます。

Excel または CSV への目標とターゲットのデータのエクスポート

ポートフォリオ計画から Microsoft Excel ファイルまたは CSV ファイルに目標とターゲットのデータをエクスポートします。このデータを共有し、ビジネスステークホルダーと共同作業を行うことができます。

始める前に

必要なロール：sn_apw_advanced.spw_goal_user および sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [目標] を選択します。
3. [目標] ページで、[リスト] ビューを選択します。
4. エクスポートする列がカスタマイズされていることを確認します。

   注:
   フィルターがビューに適用されると、フィルターされたデータがエクスポートされます。また、エクスポートされたファイルの目標レコードとターゲットレコードを区別するには、カスタマイズされたサイドパネルで [レコードタイプ] を選択します。

5. [カスタマイズ] サイドパネルを使用して、目標とターゲットのデータをエクスポートします。

   a. エクスポートアイコン ( ) を選択します。

   b. [エクスポート] ウィンドウの [ファイルタイプ] ドロップダウンから **[Excel]** または **[CSV]** を選択して、データをそれぞれ Microsoft Excel ファイルまたは CSV ファイルにエクスポートします。
   データは、選択したファイル形式でエクスポートされます。デフォルトでは、ファイルの名前は *ABC_goals_and_targets_list* です。ここで、ABC はデータをエクスポートするポートフォリオ計画の名前です。

戦略的計画ワークスペースでのポートフォリオ計画作業の優先順位付け

ポートフォリオの作業パイプラインを 戦略的計画ワークスペースでレビューします。適切な時期に適切な作業を優先順位付けできるように、計画立案アイテムを追加、更新、およびランク付けします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

優先順位付けビュー

戦略的計画 の優先順位付けページはバックログを表し、作業パイプラインのアイテムをリスト、カンバン、階層の各ビューで表示します。これらのビューの概要については、「戦略的計画 での優先順位付け」を参照してください。

注:
優先順位付け機能は、ポートフォリオ計画でのみ使用できます。

[優先順位付け] タブに表示される計画立案アイテム

デフォルトでは、ポートフォリオ計画には、計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] テーブルとその子テーブル内に作成されたレコードのみが表示されます。統合が確立されない限り、他の ServiceNow AI Platform テーブルに保存されているレコードは表示されません。

ポートフォリオ計画を通じてプロジェクトを管理するとします。計画立案アイテムプロジェクト [sn_align_project] テーブルにのみ保存されているプロジェクトレコードが [優先順位付け] タブに表示されます。ただし、PPM 標準を使用して作成されたプロジェクトは、PPM プロジェクト [pm_project] テーブルに保存されるため、デフォルトでは表示されません。戦略的計画 Workspace での表示を有効にするには、PPM との統合を設定して、戦略的計画 のテーブル が PPM のテーブルにマッピングされるようにします。

アジャイル開発 2.0 や SAFe のアプリケーションを使用して作成されたエピックの場合も同様です。「戦略的計画 with PPM、Agile 2.0、および SAFe の構成」を参照してください。



優先順位付け機能

[優先順位付け] ページでは、以下のアクションを実行できます。

機能	説明	UI の例
新しい計画立案アイテムの追加	[優先順位付け] ページからバックログに新しいアイテムを直接追加します。 ここで作成できる計画立案アイテムのタイプは、ポートフォリオ計画の構成によって異なります。	
計画立案アイテムの詳細の更新	リアルタイムのバックログ調整をスムーズに行えるように、[優先順位付け] ページビューから直接、計画立案アイテムの詳細を編集して、添付ファイルを追加し、それをステークホルダーと共同で作業します。	



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

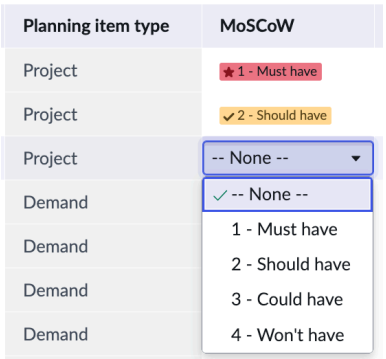機能	説明	UI の例
MoSCoW 値	リストビューと階層ビューの [必須]、[可能性]、[必要] または [なし] (MoSCoW) の値を使用して、計画立案アイテムを分類します。このカテゴリ設定では、ポートフォリオの作業を調整および優先順位付けする場合に、後で使用できる優先度のベースラインが作成されます。	
計画立案アイテムのランク付け	ドラッグ 機能を使用して再配置することで、計画立案アイテムの優先順位を決定します。	
ロードマップへのアイテムの優先順位付け	アイテムの計画立案ステータスを [優先順位付け] に設定して、ポートフォリオのロードマップに追加します。	
実行アプリで計画立案アイテムを開く	ServiceNow PPM、アジャイル開発 2.0、または SAFe アプリケーションを使用して計画された作業を実行している場合は、それらのアプリケーションで計画立案アイテムを開くことができます。 たとえば、計画立案アイテムがエピックの場合、[優先順位付け] ページからエピックフォームに直接移動できます。	
[優先順位付け] ページビューのカスタマイズ	優先順位付けページの表示方法を変更して、必要な形式で情報を表示できるようにします。 行と列のカスタマイズ、グループ化、ソートなどの設定はすべて、ポートフォリオ計画初期設定として保存することができます。したがって、これらの設定は、ポートフォリオ計画が共有されるすべてのユーザーまたはユーザーグループに適用されます。	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	説明	UI の例
優先順位付けへのフィルターの適用	[優先順位付け] または [ロードマップ] のすべてのビューにフィルターを適用して、ポートフォリオ計画の一貫したデータセットを表示できるようにします。	
列を水平方向にドラッグして並べ替え	リストビューおよび階層ビューの列の位置を水平方向にドラッグして並べ替えます。	

優先順位付けへの計画立案アイテムの追加

戦略的計画 ワークスペースのポートフォリオ計画の作業バックログに新しい計画立案アイテムを追加し、作業パイプラインが最新であることを確認します。

始める前に

ポートフォリオ計画の作成

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

ポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページを使用して、新しい計画立案アイテムを追加するか、アジャイル開発 2.0 (PPM)、または SAFe などの他の ServiceNow 実行システムからそれらをインポートします。

このタスクを実行するときは、リストビュー、カンバンビュー、または階層ビューを使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け] ページから、ポートフォリオ 計画の新しい計画立案アイテムを追加します。

   [その他のオプション] ドロップダウンを使用して、作成する計画立案アイテムを選択します。

4. フォームにて、簡単な説明や承認日を入力します。
   完全な詳細については、「計画立案アイテムフォーム」を参照してください。

   SPM の Now Assistアプリケーションがインストールされている場合、「計画立案アイテムの作成」スキルを使用して、デマンド、エピック、プロジェクト、ケイパビリティ、機能、ストーリーなどのアイテムタイプの計画立案アイテムの説明を絞り込むことができます。

5. **[Submit** (送信)] を選択します。
6. オプション: PPM、アジャイル開発 2.0、または SAFe を使用して計画された作業を実行する場合は、これらのアプリケーションから作業アイテムをインポートすることもできます。
   詳細については、「PPM、Agile 2.0、および SAFe での戦略的計画作業の実行」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果

[計画ステータス] フィールドが [新規] に設定された状態で新しいアイテムが作成され、アイテムの位置は現在のビューに基づいています。

- リストビュー：リストの下部に追加されます。
- カンバンビュー：**[4-** 優先度「低」] の水平レーンに追加されます。
- 階層ビュー：適切なグループに追加されます。

  たとえば、選択したレンズが [組織] であるとします。次に、新しいアイテムがその部門のグループ化に追加されます。

次のタスク

- 計画立案アイテムのランク付け。
- 優先順位付けビューから計画立案アイテムの詳細を更新する。
- 「[優先順位付け] ページビューのカスタマイズ」を参照してください。

計画立案アイテムの複製

既存の計画立案アイテムのコピーを作成して、戦略的計画ワークスペースでポートフォリオ計画の作業バックログに追加し、作業パイプラインが最新であることを確認します。作成する計画立案アイテムが既存の計画立案アイテムと類似している場合は、既存の計画立案アイテムを複製することで時間を節約できます。

始める前に

ポートフォリオ計画の作成

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

ポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページを使用して、新しい計画立案アイテムを追加するか、アジャイル開発 2.0 (PPM)、または SAFe などの他の ServiceNow 実行システムからそれらをインポートします。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け] ページで、[リスト] ビューを選択します。
4. コピーする計画立案アイテムの [その他のアクション] アイコン (⋮ を選択し、[複製] を選択します。
   新しい計画立案アイテムが作成され、コピー元の計画立案アイテムのすぐ下にアイテムが表示されます。また、新しい計画立案アイテムのランクは、コピー元の計画立案アイテムのランクに基づいて自動的に更新されます。

   デフォルトでは、名前は *Copy of ABC* です。ここで、ABC はコピー元の計画立案アイテムの名前です。
5. オプション: PPM、アジャイル開発 2.0、または SAFe を使用して計画された作業を実行する場合は、これらのアプリケーションから作業アイテムをインポートすることもできます。
   詳細については、「PPM、Agile 2.0、および SAFe での戦略的計画作業の実行」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- 計画立案アイテムのランク付け。
- 優先順位付けビューから計画立案アイテムの詳細を更新する。
- 「[優先順位付け] ページビューのカスタマイズ」を参照してください。

優先順位付けビューから計画立案アイテムの詳細を更新する

計画立案アイテムの詳細情報を更新または削除して、戦略的計画 優先順位付けページに最新の作業パイプラインが反映されるようにします。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
ポートフォリオの [優先順位付け] ページのリスト、カンバン、階層ビューを使用して、計画立案アイテムの詳細を更新します。グリッドビューからインラインで詳細を編集するか、サイドパネルを使用します。簡単な説明、MoSCoW、承認日などの詳細情報を編集して、スムーズなリアルタイムのバックログ調整を促進できます。計画立案アイテムの [完全な詳細] ページを使用して添付ファイルを追加し、ステークホルダーとコラボレーションします。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け] ページで、[リスト]、[カンバン]、または [階層] ビューを選択します。
4. アイテムの詳細を更新したり、アイテムにファイルを添付したり、アイテムを削除したりします。

   [完全な詳細] ページで編集できない特定の列の情報は、インラインでも編集できません。たとえば、計画コストや計画利益などです。これらのセルは、背景がグレー色になり視覚的に区別できるようになっています。

   属性別に優先順位付けアイテムリストをグループ化する場合、アイテムの簡単な説明をグリッドビューから直接編集することはできません。

計画立案アイテムのランク付け

ポートフォリオ計画のパイプラインに追加された計画立案アイテムをランク付けし、その優先度を決定して、ポートフォリオの作業の優先順位付けを開始できるようにします。

始める前に

- ポートフォリオ計画の作成。
- 優先順位付けリストビューの計画立案アイテムが、[ランク] 列で昇順にソートされていることを確認します。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

> **重要:**
> リストビューを使用して、ポートフォリオ計画の計画立案アイテムをスタックランクします。

ServiceNow システム内で、すべての計画立案アイテムにグローバルランクが割り当てられます。[優先順位付け] ページでアイテムを並べ替えてランクを変更し、計画ステータスを更新します。計画

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

立案アイテムをロードマップスケジュールに含めることを決定した場合は、アイテムの [計画ステータス] を [優先] としてマークし、優先順位付けページから直接ロードマップに追加します。

バックログ内の他のアイテムと関連性があるアイテムにおいては、[ランク] 列により、ランクをすばやく特定することができるようになります。計画立案アイテムのリストが長い場合、上位のアイテムを判断する上でこうした情報が役立ちます。カスタムのグループ化やソートがない場合、計画立案アイテムはランクでソートされ、行を並べ替えることができます。

注:
計画立案アイテムが既に他の属性でグループ化またはソートされている場合、行を並べ替えることはできません。グループ化またはソートを解除してから、行を並べ替えます。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け] タブの [リスト] ビューから、順序を並べ替えて、優先度に従って計画立案アイテムをランク付けします。

   計画立案アイテムのランキングがビジネスの優先度と一致するまで、このステップを繰り返します。必要なデータの可視化を高めるには：

   - 必要な列でリストをソートまたはグループ化します。「[優先順位付け] ページのリストビューをカスタマイズする」を参照してください。
   - フィルターを適用して計画立案アイテムをフィルタリングします。

   ヒント:

   行コンテキストメニューアイコン (⋮) の [一番上に移動] および [一番下に移動] オプションをそれぞれ使用して、計画立案アイテムに最高ランクと最低ランクをアサインすることもできます。

次のタスク
作業の優先順位付け

作業の優先順位付け

チームが作業を開始できるように、ポートフォリオ計画パイプラインのアイテムを確認して優先順位を付けて計画のロードマップに追加します。

始める前に

- ポートフォリオ計画の作成。
- 優先順位付けページの計画立案アイテムが、[ランク] 列で昇順でソートされていることを確認します。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
調整セッション中に、[優先順位付け] タブのリストビュー、カンバンビュー、または階層ビューでアイテムを確認し、優先順位付けします。アイテムに割り当てられた MoSCoW 値を使用して、作業の優先度を判断できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順


1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け] ページで、次のいずれかのビューから計画立案アイテムを [レビュー中] または [優先順位付け] としてマークします。

   計画立案アイテムは、[優先順位付け] とマークされると、[承認された開始日] フィールドと [承認された終了日] フィールドの値に基づいてポートフォリオロードマップに自動的に追加されます。ロードマップには、[計画ステータス] が [優先順位付け] に設定されているアイテムのみが表示されます。

   - 日付がポートフォリオ計画期間内にある場合、アイテムがロードマップに表示されます。
   - いずれかの日付フィールドが空白の場合、アイテムはロードマップの [予定外のアイテム] リストに追加されます。

   アイテムが [完了] または [キャンセル] とマークされている場合、デフォルトではそのアイテムは [優先順位付け] ページに表示されません。[計画ステータス] 列のフィルターを更新すると、完了またはキャンセルされたアイテムを表示できます。

4. オプション: リストビューから、一度に複数のアイテムの計画ステータスを更新できます。
   a. 更新する行から [計画ステータス **(Planning state)**] セルを 1 つ選択します。
   b. **Ctrl** キー (Windows OS の場合) または **command** キー (Mac OS の場合) を押したまま、更新する他の行の [計画ステータス **(Planning state)**] セルを選択します。
   c. 選択したセルの 1 つをダブルクリックし、ステータスを選択します。

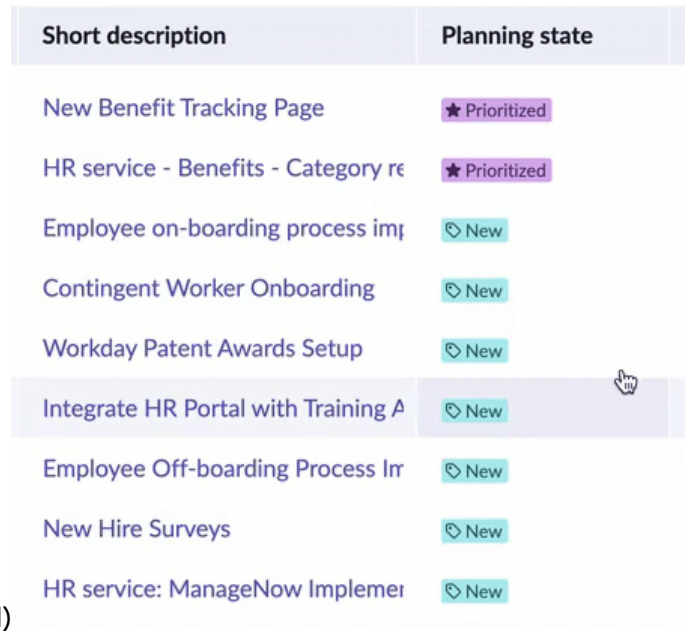

(Optional)

タグを使用した作業アイテムの分類

タグを追加し、要件に基づいて計画立案アイテムを分類します。

始める前に
ポートフォリオ計画の作成

必要なロール：sn_align_core.apw_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
タグを使用すると、計画立案アイテムを分類できます。タグ名を作成します。これにより、タグの理由に名前が付けられます。タグは、全員、一部の人、または自分だけに表示されるようにすることができます。可視化設定では、タグを使用して計画立案アイテムを検索できるユーザーを指定します。


計画立案アイテムに加えられたタグ付けの追加または削除は、[計画] ページと [採点] ページのすべてのビュー間で自動的に同期されます。計画立案アイテムにタグを付けた後、[優先順位付け] のリストビューおよび [採点] ページで、[フィルター] オプション (Filter) を使用して、計画立案アイテムの検索にタグを使用できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け] または [採点] のリストビューから、次のいずれかのオプションを使用して計画立案アイテムのタグを追加します。

   注:
   タグの可視化設定のデフォルトはプライベートであり、タグはそのタグを作成したユーザーにのみ表示されます。したがって、タグを作成したユーザーのみが、そのタグを使用して、そのタグでラベル付けされた計画立案アイテムを検索できます。

4. タグの可視化設定を変更するには、計画立案アイテムの [詳細] ページでタグを選択し、[表示可能] 設定を変更します。

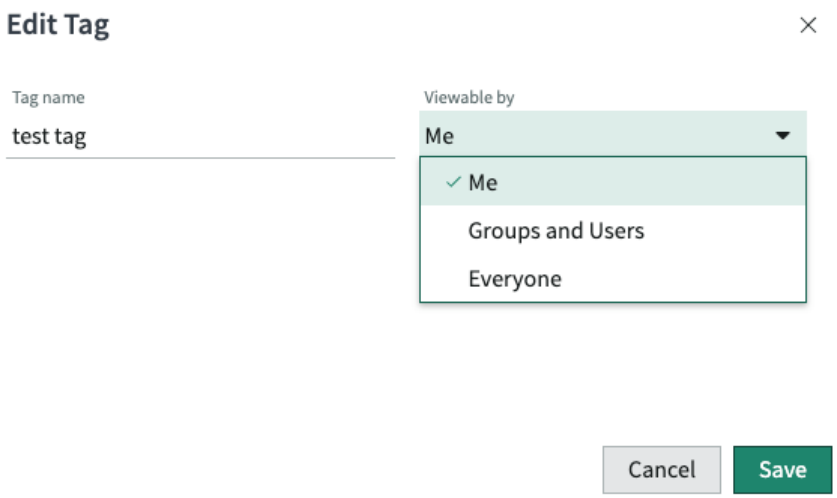


オプション	説明
自分	タグは、そのタグを作成したユーザーにのみ表示されます。タグを作成したユーザーのみが、そのタグを使用して、そのタグでラベル付けされた計画立案アイテムを検索できます。この設定がデフォルトです。
グループとユーザー	タグは特定のグループまたはユーザーに表示されます。このタグを表示できるグループとユーザーを指定できます。
全員	タグは全員に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	注: この可視化設定は、admin または tags_admin ロールのみが使用できます。

計画立案アイテムには複数のタグを付けることができ、それぞれに異なる可視化設定を設定できます。

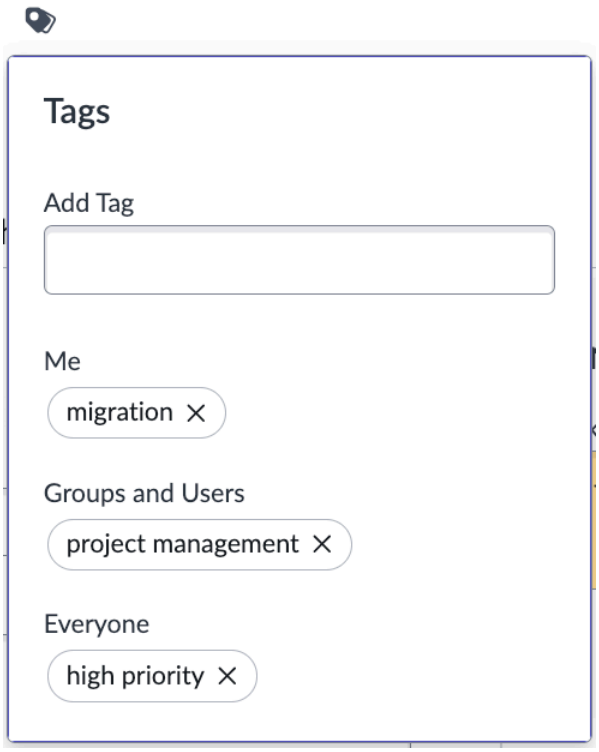

5. 計画立案アイテムからタグを削除するには、リストビューの [タグ] 列のセルをダブルクリックするか、計画立案アイテムの [詳細] ページで塗りつぶされたタグのアイコン ( ) を選択してタグのリストを開き、削除するタグの横にある **[X]** を選択します。

[優先順位付け] ページビューのカスタマイズ

[優先順位付け] ページのリスト、カンバン、階層の各ビューの表示方法をカスタマイズして、自分とステークホルダーにとって最も関連性の高い計画立案アイテム情報を表示できるようにします。

[優先順位付け] ページのリストビューをカスタマイズする

計画立案に最も関連する情報を表示できるように、列をグループ化、ソート、および非表示にして、[優先順位付け] ページのリストビューをカスタマイズします。

始める前に

ポートフォリオ計画の作成。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

このタスクでは、[優先順位付け] ページのリストビューをカスタマイズするためのさまざまなオプションについて説明します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カスタマイズ初期設定は、戦略的計画 にポートフォリオ計画の設定として保存されます。したがって、これらの設定は、ポートフォリオ計画が共有されるすべてのユーザーまたはユーザーグループに適用されます。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [カスタマイズ] サイドパネルを使用して、ページの行と列の表示を更新します。

   a. [カスタマイズ] アイコン () を選択します。

   b. [列] セクションから、データを表示または非表示にする列を選択します。

      ここで列を並べ替えて、バックログの表示順序を変更することができます。

      このページで列を追加して使用する場合、アドミニストレーターが追加の列を構成することができます。「戦略的計画 での優先順位付けのために追加する列の構成」を参照してください。

   c. [行] セクションで、**[1** 行おきに網掛け] トグルを使用して、行を表示する方法を選択します。

4. [優先順位付け] ページに表示されている 1 つまたは複数の列ごとにアイテムをグループ化します。

   タイプ選択や参照の属性ごとに計画立案アイテムをグループ化することもできます。グループ化の例としては、計画ステータス、計画立案アイテムタイプ、所有者、主要目標などが挙げられます。

   次のいずれかの方法で、計画立案アイテムをグループ化します。アクションを繰り返して、複数の属性でリストをグループ化します。
   カンバンビューまたは階層ビューに切り替えても、グループ化に影響はありません。リストビューに戻っても、同じ設定が保持されます。この設定は、ポートフォリオ計画のセッションごとに保存されます。
5. 列名をクリックして、計画立案アイテムを列でソートします。
   たとえば、[承認された開始日] でアイテムをソートすることができます。
6. 列をリストの左または右に固定します。

   a. 固定する列において、[列アクション] アイコン () を選択します。

   b. [列の固定] セクションで、[左に固定 **(Pin to left)]** または [右に固定 **(Pin to right)]** を選択します。
      デフォルトの選択は [固定を解除] です。

7. 選択に従って幅を調整するか、自動調整で幅を設定します。
   列の境界線でマウスを長押ししたままドラッグして、幅を調整します。[列アクション] () の [この列を自動調整] または [すべての列を自動調整] オプションを使用して、列幅を自動調整することができます。
8. [カスタマイズ] メニュー () から [列をリセット] を選択して、列をデフォルト設定にリセットします。

   このオプションを選択すると、列のカスタマイズ、グループ化、ソートがデフォルト設定に戻ります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これまでに優先順位付けページで行ったカスタマイズ設定は消去されます。この後に行われるあらゆるカスタマイズは、ポートフォリオの新しい初期設定として設定されます。

9. [優先順位付け] に表示されるデータにフィルターを適用します。

[優先順位付け] ページのカンバンビューをカスタマイズする

ポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページにあるカンバンビューの 戦略的計画 での表示方法をカスタマイズして、自分とステークホルダーにとって最も関連性の高い情報を表示できるようにします。

始める前に

ポートフォリオ計画の作成。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

カンバンビューの [優先順位付け] ページをカスタマイズするためのさまざまなオプションについて説明します。

カンバン設定は、ポートフォリオ計画レベルで保存されます。したがって、これらの設定は、ポートフォリオ計画が共有されるすべてのユーザーまたはユーザーグループに適用されます。


手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.

2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。

3. [カンバン] ビューを選択します。

4. [カスタマイズ] アイコン ( ) を選択して、設定に基づいてビューを更新します。
「優先順位付けとロードマップのための計画立案アイテムの表示設定のカスタマイズ」を参照してくださ

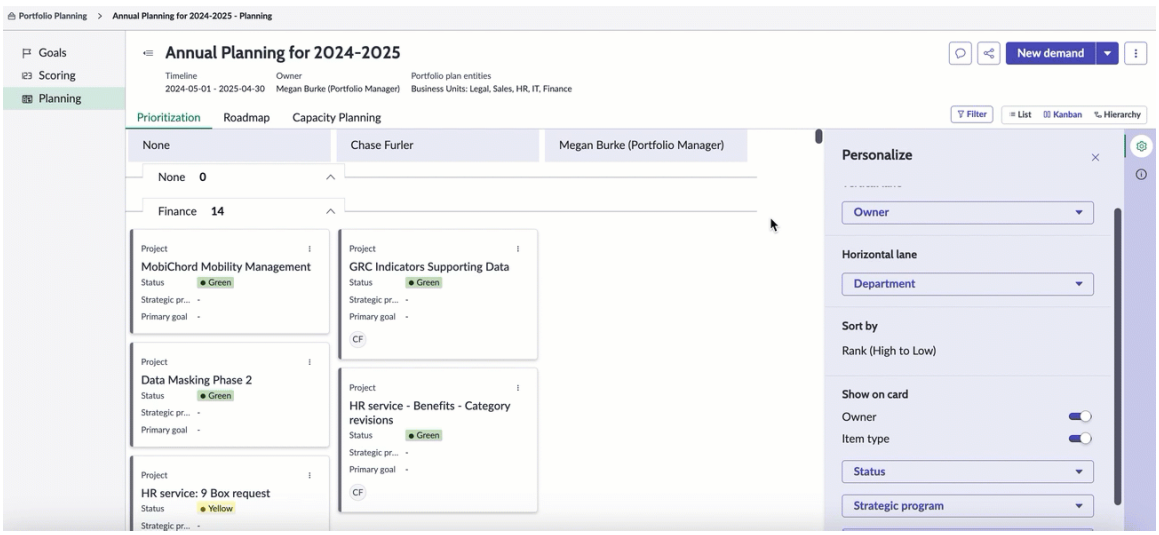

い。

重要:
カンバンボードに表示される垂直レーンと水平レーンのデフォルトの表示制限は、それぞれ 30 と 30 です。これらのレーンは、参照フィールドと選択フィールドのみをサポートしています。ユーザーは、カンバンカードのフィールドメトリクスを変更することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[優先順位付け] ページの階層ビューをカスタマイズする

戦略的計画 ワークスペースの [優先順位付け] ページの階層ビューをカスタマイズして、自分とステークホルダーにとって最も関連性の高い情報を表示できるようにします。

始める前に

ポートフォリオ計画の作成。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

選択した属性で計画立案アイテムをソートし、[カスタマイズ] サイドパネルを使用して列の表示をカスタマイズします。


カスタマイズ初期設定は、戦略的計画 にポートフォリオ計画の設定として保存されます。したがって、これらの設定は、ポートフォリオ計画が共有されるすべてのユーザーまたはユーザーグループに適用されます。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [カスタマイズ] サイドパネルを使用して、タイムラインビューとグリッドビューの列をカスタマイズします。

   a. [カスタマイズ] アイコン ( ) を選択します。

   [カスタマイズ] サイドパネルが開きます。

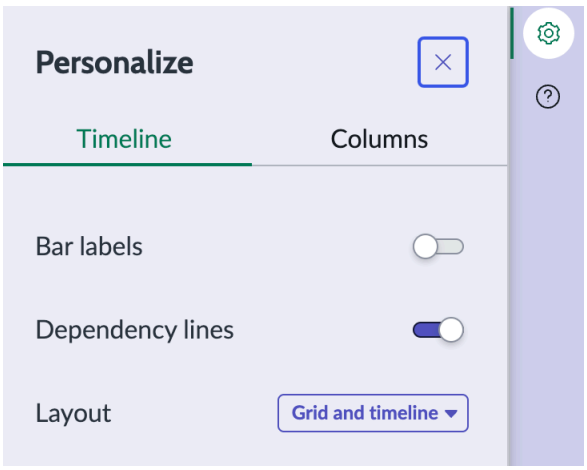

   b. [タイムライン] セクションで、アイテム名と依存関係線の表示を切り替えます。
   レイアウトを更新することもできます。グリッドとタイムラインビュー、グリッドビュー、またはタイムラインビューのみを選択します。

   c. [列] セクションから、グリッドビューに表示される計画立案アイテムフィールドを更新します。
   必要な列を選択し、[適用] をクリックします。

4. 列名をクリックして、計画立案アイテムを列でソートします。
   たとえば、[承認された開始日] でアイテムをソートすることができます。
5. [優先順位付け] に表示されるデータにフィルターを適用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポートフォリオ計画のアイテムのデータを **[Prioritization** (優先順位付け)] から **Excel** または **CSV** にエクスポートする

ポートフォリオ計画アイテムのデータをポートフォリオ計画から Microsoft Excel または CSV ファイルにエクスポートします。このデータを共有し、ビジネスステークホルダーと共同作業を行うことができます。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け] タブで、[リスト] ビューを選択します。
4. エクスポートする列がカスタマイズされていることを確認します。

   注:
   フィルターがビューに適用されると、フィルターされたデータがエクスポートされます。

5. カスタマイズされたサイドパネルを使用して、ポートフォリオ計画アイテムをエクスポートします。

   a. エクスポートアイコン ( ) を選択します。

   b. [エクスポート] ウィンドウの [ファイルタイプ] ドロップダウンから **[Excel]** または **[CSV]** を選択して、データをそれぞれ Microsoft Excel ファイルまたは CSV ファイルにエクスポートします。
   選択した形式のファイルがエクスポートされます。デフォルトでは、ファイルの名前は *ABC_Prioritization_List* です。ここで、ABC はデータをエクスポートするポートフォリオ計画の名前です。

戦略的計画ワークスペース の計画ロードマップ

戦略的計画ワークスペースのロードマップを使用して、今後のプロジェクトまたはイニシアチブの計画のレイアウトを作成しながら、それらをビジネス目標に合わせて調整します。ステークホルダー間のコラボレーションを促進し、外出先で計画を調整します。

戦略的計画 ワークスペースのロードマップには、ポートフォリオ計画ロードマップとフリーフォームロードマップの 2 つのタイプがあります。

ポートフォリオ計画の場合、[優先順位付け] ページから優先順位付けされた計画立案アイテムのみがロードマップに表示されます。詳細については、ロードマップのバックログアイテムの管理とバックログアイテムの優先順位付けに関する箇所を参照してください。

特定の期間におけるロードマップを作成することができます。この期間は、組織における目標達成の重点期間となることもあります。一元化されたビューから、 戦略的計画ワークスペースのロードマップ機能を使用して次の操作を実行できます。

- 単一タイプの計画立案アイテムを使用してシンプルなロードマップを作成したり、複数タイプの計画立案アイテムを同時に使用してハイブリッドなロードマップを作成したりする。
- 作業がビジネスの戦略的優先事項または目標にどのように整合しているかを視覚化する。
- 作業アイテム間の直接的および間接的な依存関係を作成したり活用したりして、組織横断的な作業が企業戦略とどのように整合されているかを把握する。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 対話を行ったりファイルを共有したりして、ステークホルダー間のコラボレーションを実現する。
- すべての作業アイテムのマイルストーンを使用して、戦略的な成果に焦点を当てる。
- 作業の進捗状況やステータスを追跡して、必要な是正処置を事前に判断する。

関連情報

戦略的計画 のロードマップ

フリーフォームロードマップを作成

スタンドアロンのビジュアルロードマップを作成して、会社のさまざまな部門から作業の概要計画を開始します。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

すべての部門のプロジェクトなど、組織の複数のユニットにわたる作業を計画するためのスタンドアロンロードマップを作成します。フリーフォームロードマップの詳細については、「戦略的計画 のロードマップ」を参照してください。

ロードマップの基礎となる開始点としてソーステーブルを選択します。簡易ロードマップのプロジェクト、エピック、プログラム、デマンド、SAFe エピック、および SAFe 機能テーブルのいずれかを選択するか、ハイブリッドロードマップの計画立案アイテムテーブルを選択します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. [新規] を選択します。
   これが ServiceNow インスタンス内の最初のフリーフォームロードマップである場合は、[最初のフリーフォームロードマップを作成] を選択します。
3. フリーフォームロードマップを作成ウィザードを使用して、ロードマップの詳細を入力します。

   a. ロードマップの基礎となるソーステーブルを選択します。

      アドミニストレーターは、他のテーブルがこのリストに表示されるように設定できます。詳細については、「[ポートフォリオ計画の構成] フォーム」を参照してください。

   b. ソーステーブルからデータをフィルターする条件を追加します。

      たとえば、ソーステーブルが [プロジェクト] の場合、関連するフィルター条件は、[事業部門] が [ファイナンス] かつ [アクティブ] が **[true]** になります。

   c. ロードマップの名前と予定日の詳細を入力します。

4. [作成] を選択します。

タスクの結果

- 新しいロードマップが作成され、表示されます。
- このロードマップは、戦略的計画 ワークスペースの ホームページの [フリーフォームロードマップ] タブにリストされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次のタスク

- ロードマップを使用して更新、カスタマイズ、および共同作業を行います。
- マイルストーンを追加するか、ロードマップで計画されているアイテムの依存関係を作成します。

関連情報

フリーフォームロードマップの詳細の更新

ロードマップビューからの計画立案アイテムの作成

予定外のアイテムをロードマップに計画する

ロードマップアイテムの依存関係を追加

フリーフォームロードマップでステークホルダーとコラボレーションする

フリーフォームロードマップをステークホルダーと共有する

フリーフォームロードマップの詳細の更新

フリーフォームロードマップの詳細を更新して、ロードマップの優先度またはタイムラインの変更を反映します。

始める前に
フリーフォームロードマップを作成。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. ロードマップを選択して開きます。
3. ロードマップヘッダーから、[その他のアクション] アイコン (⋮) を選択します。
4. フリーフォームロードマップを更新ウィザードを使用して、ロードマップの詳細を編集します。フィールドの詳細については、「フリーフォームロードマップを作成」を参照してください。
5. [更新] を選択します。

タスクの結果
ロードマップが更新され、ロードマップアイテムが最新の変更に従って表示されます。

関連情報

ロードマップビューからの計画立案アイテムの作成

予定外のアイテムをロードマップに計画する

ロードマップアイテムの依存関係を追加

フリーフォームロードマップでステークホルダーとコラボレーションする

フリーフォームロードマップをステークホルダーと共有する

フリーフォームロードマップをステークホルダーと共有する

ロードマップ計画に関係する作業のステークホルダーである組織のメンバーを追加して、ロードマップの進捗状況を可視化できるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- フリーフォームロードマップを作成。

- ステークホルダーとして追加するユーザーに、ロードマップにアクセスするための適切なロールがあることを確認します。ユーザーロールの詳細については、「戦略的計画ワークスペースとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
組織内の他のユーザーとステークホルダーにフリーフォームロードマップへのアクセス権を付与します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. ロードマップを選択して開きます。
3. ロードマップヘッダーで、[ロードマップを共有] アイコン ( ) を選択します。
4. [ロードマップを共有] フォームで、ロードマップを共有するユーザーを選択し、そのアクセス権を適切に設定します。

   a. [メンバーまたはグループ] フィールドに、個々のユーザーまたはグループの名前を入力します。

   b. [アクセス] フィールドで、選択したユーザーのアクセスレベルとして [ビューアー] または [エディター] を選択します。

      ビジネスステークホルダーユーザーの場合、編集アクセス権を付与した場合でも、ロードマップにコメントを追加することしかできません。

5. [招待を送信] を選択します。

次のタスク
ユーザーまたはグループのアクセスレベルを変更するか、アクセス権を削除します。

1. [ロードマップを共有] フォームで、[アクセスを管理] を選択します。
2. ユーザーまたはグループカードから、[アクションメニュー] アイコン ( ) を選択します。
3. 適切なアクセスレベルを選択するか、[削除]を選択します。

フリーフォームロードマップでステークホルダーとコラボレーションする

組織の他のユーザーがフィードバックを確認して共有できるように、フリーフォームロードマップにコメントと添付ファイルを追加します。ロードマップが会社の優先順位と一致していることを、協力して確認します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user または sn_roadmap_plng.roadmap_editor

このタスクについて
[コメント] サイドパネルを使用して、ロードマップレベルまたは計画立案アイテムレベルで添付ファイルまたはメモを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. 共同作業するロードマップを選択します。
3. ロードマップレベルまたは計画立案アイテムレベルで適切なタブを選択します。
4. 添付ファイルまたは作業メモを追加します。

フリーフォームロードマップビューの管理

ポートフォリオマネージャーは、グループ化、マイルストーンの選択、依存関係の選択、追跡モードなどのパーソナライズ設定を適用して、フリーフォームロードマップのカスタマイズされたビューを作成できます。ポートフォリオオーナーまたはエディターは、これらのカスタマイズされたビューをステークホルダーと共有して、フリーフォームロードマップでのコラボレーションを容易にすることができます。

フリーフォームロードマップビューのメリット

ポートフォリオマネージャーは、グループ化、マイルストーンの選択、依存関係の選択、追跡モードなどの設定を適用して、必要に応じてカスタマイズされたビューを作成できます。

- ビューは、プライベートまたはパブリックとして作成できます。
- 最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを作成できます。
- フリーフォームロードマップビューをステークホルダーと共有して、フリーフォームロードマップでのコラボレーションを有効にすることができます。
- 必要に応じて、共有ビューとプライベートビューを切り替えます。

フリーフォームロードマップビューの作成

要件に基づいてカスタマイズされたフリーフォームロードマップビューを作成し、再度ログインしたときにアクセスしてステークホルダーと共有してコラボレーションできるようにします。

始める前に
必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて
フリーフォームロードマップごとに、最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを作成できます。


手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. フリーフォームロードマップを選択して開きます。
3. 必要に応じてビューに変更を加えます。
   たとえば、 トラッキングモード の切り替えを有効にします。

   [新規ビューとして保存] オプションがフリーフォームロードマップヘッダーに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

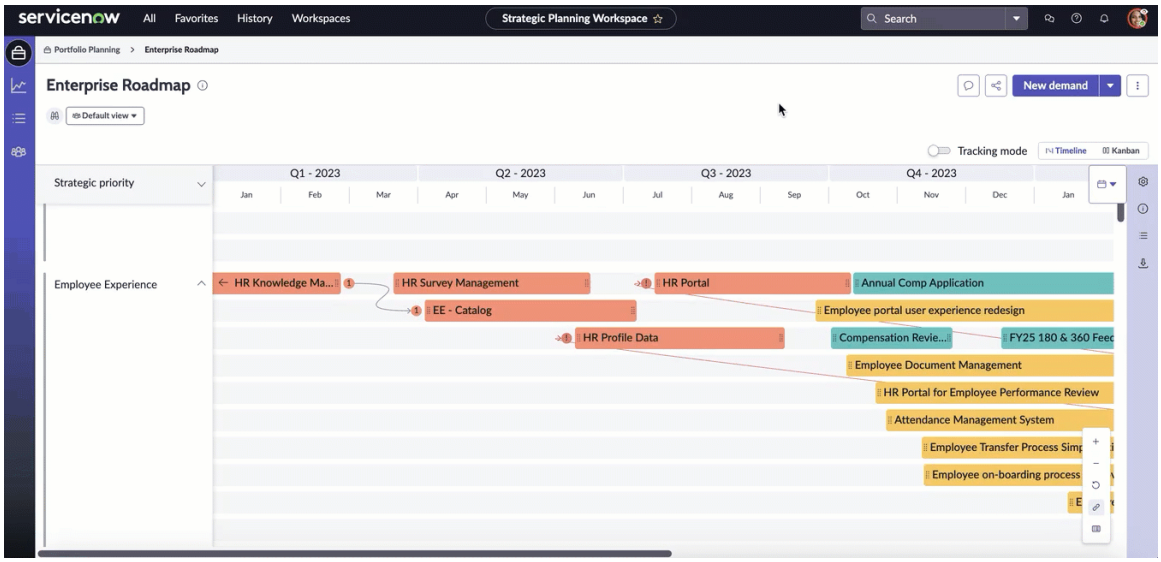

4. フリーフォームロードマップヘッダーから、[新規ビューとして保存] を選択します。
5. [新規ビューとして保存] ウィンドウで、詳細を入力します。

   a. [ビュー名] フィールドにビューの名前を入力します。

   b. オプション: [共有ビュー] トグルを選択して、このビューを公開します。
   [共有ビュー] トグルを選択すると、このフリーフォームロードマップを共有しているすべてのステークホルダーにビューが表示されます。

   c. **[Save** (保存)] を選択します。

タスクの結果
フリーフォームロードマップの共有ビューが作成され、このフリーフォームロードマップを共有しているすべてのステークホルダーに表示されます。

次のタスク

- フリーフォームロードマップをステークホルダーと共有して、フリーフォームロードマップでのコラボレーションを開始します。「フリーフォームロードマップをステークホルダーと共有する」を参照してください。
- フリーフォームロードマップビューを編集して、既存のビューに変更を加えます。「フリーフォームロードマップビューの編集」を参照してください。

フリーフォームロードマップビューの編集

要件に基づいてカスタマイズされたフリーフォームロードマップビューを編集して、再度ログインしたときにアクセスして、コラボレーションのためにステークホルダーと共有できるようにします。

始める前に
必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて

- フリーフォームロードマップビューの所有者のみが、共有 (公開) ビューを編集できます。
- フリーフォームロードマップごとに、最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. フリーフォームロードマップを選択して開きます。
3. フリーフォームロードマップヘッダーから、編集するか、カスタマイズ設定で上書きするビューを利用可能なフリーフォームロードマップビューのリストから選択します。
   選択したビューが表示されます。
4. 必要に応じてビューを変更します。
   たとえば、 トラッキングモード の切り替えを有効にします。

   ビューに変更を加えると、フリーフォームロードマップヘッダーに [ビューを保存] オプションが表示されます。
5. [ビューの保存] を選択します。
   ビューが更新され、加えられた変更が反映されます。
6. オプション: ビューの名前を編集するには、フリーフォームロードマップヘッダーから [フリーフォームロードマップ] ドロップダウンを選択し、名前を編集するビューの横にあるビューを編集アイコン (を選択します。
   [ビューの編集] ウィンドウで、詳細を入力します。

   a. 必要に応じて、[ビュー名] フィールドでビューの名前を更新します。

      注:
      フリーフォームロードマップビューの所有者のみがビューの名前を変更できます。

   b. オプション: [共有ビュー] トグルを選択してこのビューを公開するか、[共有ビュー] トグルを無効にしてビューをプライベートにします。

      重要:
      共有ビューをプライベートビューに変更すると、既存のステークホルダーのアクセス権が削除されます。

   c. **[Save** (保存)] を選択します。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次のタスク
フリーフォームロードマップをステークホルダーと共有して、フリーフォームロードマップでのコラボレーションを開始します。「フリーフォームロードマップをステークホルダーと共有する」を参照してください。

関連情報

フリーフォームロードマップビューの作成

フリーフォームロードマップビューの削除

フリーフォームロードマップビューの削除

カスタマイズされたフリーフォームロードマップビューが不要になった場合、または共有ビューが上限の 10 件または 3 件のプライベートビューに達した場合は、削除します。


始める前に
必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて

- フリーフォームロードマップビューの所有者またはフリーフォームロードマップの編集者のみがビューを削除できます。
- フリーフォームロードマップを削除すると、ビューに加えられた変更を含め、ビューが削除されます。ただし、このアクションにより、アイテム (プロジェクト、デマンド、エピック) はフリーフォームロードマップにそのまま保持されます。
- フリーフォームロードマップごとに、最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを使用できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. フリーフォームロードマップを選択して開きます。
3. フリーフォームロードマップヘッダーから [フリーフォームロードマップビュー] ドロップダウンを選択し、削除するビューの横にある [ビューを削除] アイコン (🗑) を選択します。
   [このビューを削除] ウィンドウが表示されます。
4. [このビューを削除] ウィンドウで、[削除] を選択します。

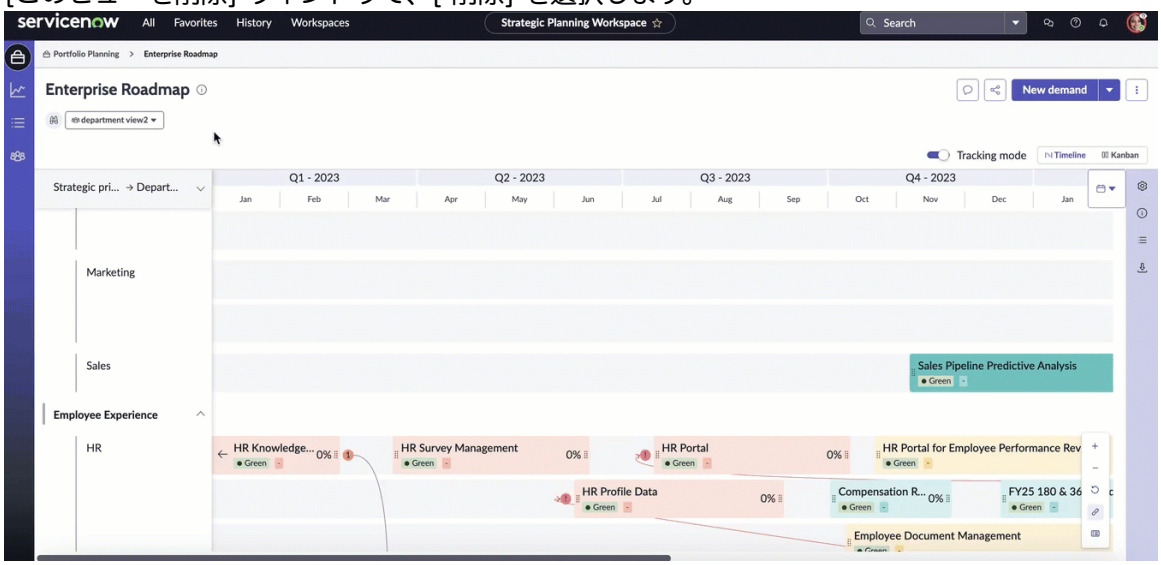

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

関連情報

フリーフォームロードマップビューの作成

フリーフォームロードマップビューの編集

フリーフォームロードマップの複製

既存のロードマップのデータを使用してロードマップを作成します。作成するロードマップが既存のロードマップと類似している場合は、既存のロードマップを複製することで時間を節約できます。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

すべての部門のプロジェクトなど、組織の複数のユニットにわたる作業を計画するためのスタンドアロンロードマップを作成します。フリーフォームロードマップの詳細については、「戦略的計画 のロードマップ」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 > フリーフォームロードマップ
2. コピーを作成するロードマップを選択します。
3. ロードマップヘッダーから、[その他のアクション] アイコン (⋮ を選択し、[ロードマップの複製] を選択します。
4. [ロードマップを複製] ウィンドウで、詳細を入力します。

   a. [ロードマップ名 **(Roadmap name)]** フィールドにロードマップの名前を入力します。
   デフォルトでは、名前は *ABC（Copy）* です。ここで、ABC はコピー元のロードマップの名前です。

   b. オプション: コピー元のロードマップのユーザーにアクセス権を付与するには、[同じユーザーおよびグループと共有 **(Share with same users and groups)]** オプションを選択します。
   このアクションでは、コピー元のロードマップに対してユーザーが持っていたのと同じ読み取りアクセス権と編集アクセス権が付与されます。

   c. [確認] を選択します。

タスクの結果

- 新しいロードマップが作成され、新しいロードマップにアクセスするためのリンクが画面に生成されます。
- このロードマップは、戦略的計画 ワークスペースの ホームページの [フリーフォームロードマップ] タブにリストされます。

次のタスク

- ロードマップを使用して更新、カスタマイズ、および共同作業を行います。
- マイルストーンを追加するか、ロードマップで計画されているアイテムの依存関係を作成します。

ロードマップビューからの計画立案アイテムの作成

ロードマップビューから直接、新しい計画立案アイテムを作成してポートフォリオロードマップまたはフリーフォームロードマップに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. ロードマップビューから、[新規 **<**アイテムタイプ**>]** オプションを選択します。

   - フリーフォームロードマップの場合、オプションはロードマップのソーステーブルによって異なります。
   - ポートフォリオ計画ロードマップの場合、オプションはポートフォリオ計画の構成によって異なります。

1 つの計画立案アイテムタイプ	複数の計画立案アイテムタイプ
	

   フリーフォームロードマップの場合、ソーステーブルが計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] テーブルの場合、オプションは *`freeform_planning_items_creation_list`* プロパティに設定された値によって異なります。デフォルトでは、プロジェクトとデマンドが利用可能です。アドミニストレーターと協力して、これらのオプションを構成します。「戦略的計画 でのカスタムアイテムタイプの有効化」を参照してください。

3. フォームの必須フィールド情報を入力します。
   完全なフィールドの詳細については、「計画立案アイテムフォーム」を参照してください。

   SPM の Now Assistアプリケーションがインストールされている場合、「計画立案アイテムの作成」スキルを使用して、デマンド、エピック、プロジェクト、ケイパビリティ、機能、ストーリーなどのアイテムタイプの計画立案アイテムの説明を絞り込むことができます。

4. **[Submit** (送信)] を選択します。

タスクの結果
新しいアイテムは、その承認済みの開始日と終了日に基づいて、ロードマップ上の場所に表示されます。

承認された開始日と終了日の両方のフィールドに入力しないと、作成したアイテムは未スケジュールアイテムのリストに移動されます。それらのアイテムを後でロードマップ計画に追加することができます。詳細については、「予定外のアイテムをロードマップに計画する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロードマップビューからの計画立案アイテムの管理

ロードマップに最新の計画が反映されるように、ポートフォリオ計画またはフリーフォームロードマップから計画立案アイテムの詳細を更新または削除します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
サイドパネルビュー、またはロードマップの完全な詳細ビューから、計画立案アイテムの詳細を編集します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. ロードマップビューで、更新または削除する計画立案アイテムをクリックします。

   サイドパネルが開き、[詳細] タブが表示されます。

   さらに、[完全な詳細] をクリックしてアイテムのレコードページを開くこともできます。[完全な詳細] ページでは、マイルストーンや依存関係など、関連リストを表示することもできます。フィールドの詳細については、「計画立案アイテムフォーム」を参照してください。

   SPM の Now Assistアプリケーションがインストールされている場合、「計画立案アイテムの作成」スキルを使用して、デマンド、エピック、プロジェクト、ケイパビリティ、機能、ストーリーなどのアイテムタイプの計画立案アイテムの説明を絞り込むことができます。

   > **注:**
   > フリーフォームロードマップが、プロジェクト [pm_project] やデマンド [dmn_demand] など、PPM テーブルのいずれかでビルドされている場合、完全な詳細ページからのみ更新が可能です。

3. 詳細を更新するか、アイテムを削除します。
   - 更新するには、フィールドの詳細を編集して [更新] をクリックします。

     完全な詳細ページが表示されている場合は、[保存] をクリックします。
   - 削除するには、次の手順を実行します。
     a. [完全な詳細] ページで、[その他のアクション] アイコン ( ) をクリックして、[削除] を選択します。
     b. **[OK]**をクリックして確認する。

関連情報
- ロードマップアイテムのマイルストーンを追加
- ロードマップアイテムの依存関係を追加

予定外のアイテムをロードマップに計画する

まだ開始日または終了日のないアイテムをポートフォリオ計画またはフリーフォームロードマップに追加します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


このタスクについて
ポートフォリオ計画またはフリーフォームロードマップの基準に一致しているが、開始日も終了日も設定されていない計画立案アイテムは、未スケジュールアイテムとして分類されます。計画を進めながら、未スケジュールアイテムリストを使用して、これらのアイテムをロードマップタイムラインにスケジュール設定します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. サイドバーから、[未スケジュールアイテム] ( ) を選択します。

3. サイドパネルの予定外のアイテムのリストから、計画立案アイテムをドラッグし、ロードマップ上の任意の場所にドロップします。

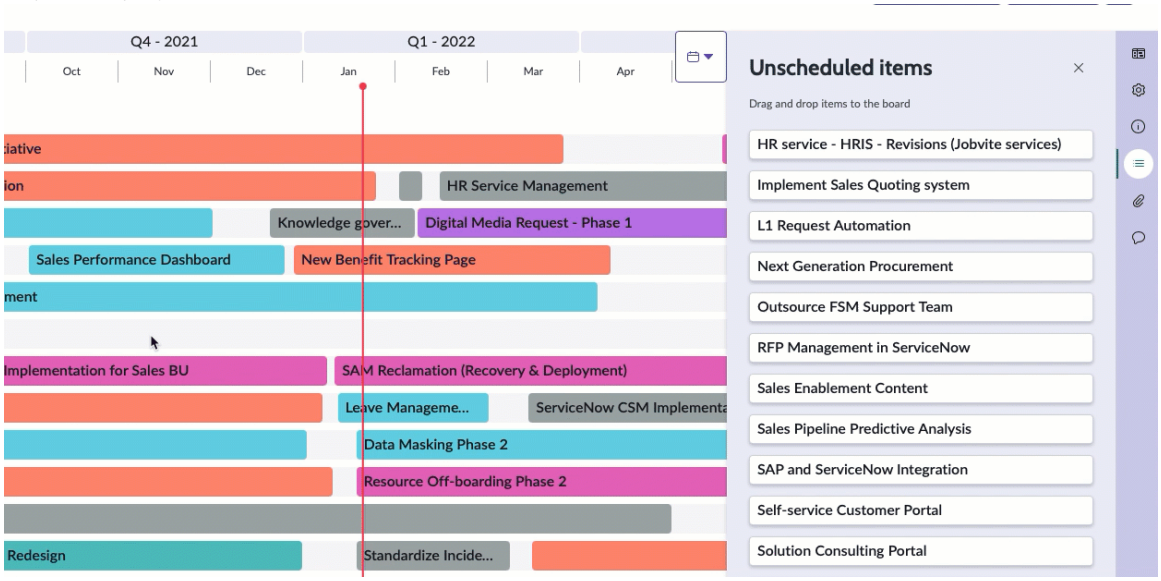

関連情報

ロードマップアイテムの再スケジュール

ロードマップアイテムの再スケジュール

ロードマップアイテムの予定日を更新して、スケジュールの優先度の変更を説明します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。


2. ロードマップアイテムに予定されている日付を変更するには、ロードマップアイテムバーのサイズを変更します。

> 注:
> ロードマップに沿ってデマンドの開始日が変更されると、関連するコスト計画のタイムラインがデマンドのタイムラインと一致するように自動的に更新されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. ロードマップアイテムを再スケジュールするには、選択したタイムライン領域にアイテムをドラッグアンドドロップします。

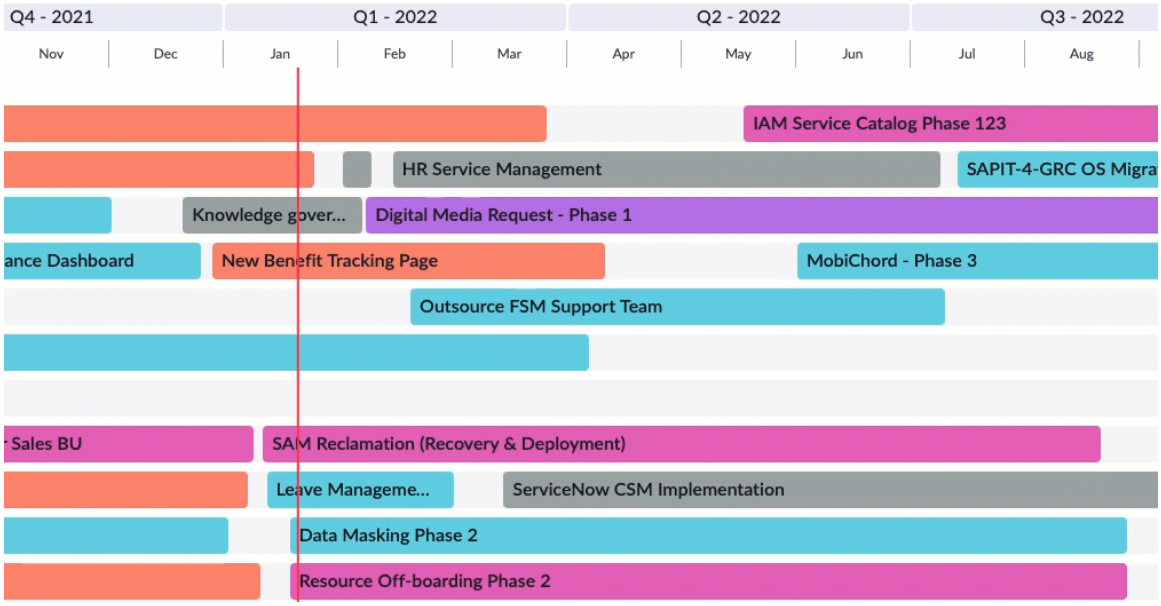

関連情報

- ロードマップのマイルストーンの追加
- ロードマップアイテムのマイルストーンを追加

ロードマップのマイルストーンの追加

マイルストーンを作成してロードマップに表示することにより、計画のタイムラインの重要な日付を追跡します。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user


このタスクについて

ポートフォリオ計画またはフリーフォームロードマップのタイムラインに、ロードマップビューから、開始日、期限、その他の重要なイベントなどのマイルストーンを直接作成します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. [その他のアクション] ドロップダウンから、[新しいマイルストーン] を選択します。



3. フォームのフィールドに入力します。

   フィールドの詳細については、「ロードマップのマイルストーンフォーム」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


自動翻訳

4. [送信] を選択します。
5. オプション: ロードマップにマイルストーンを追加するには、ステップ 2 ～ 4 を繰り返します。

タスクの結果

作成したマイルストーンはロードマップに表示されます。

以下は、計画期間のさまざまなマイルストーンを示すマイルストーンバーを含むサンプルロードマップの画像で

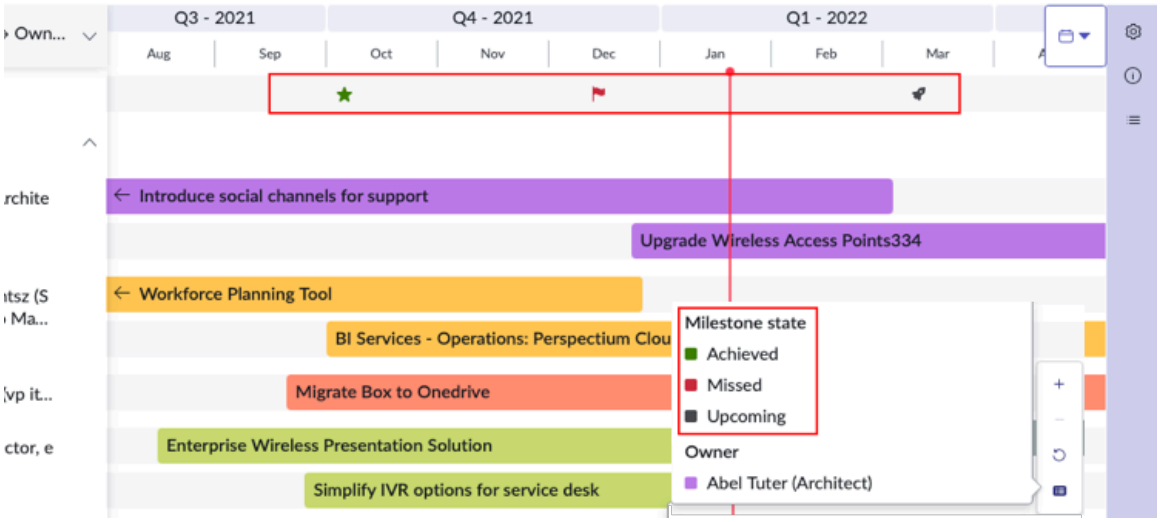


す。

凡例に表示されるマイルストーンの色は、マイルストーンのステータスを示します。

- 赤：達成できなかったマイルストーン。
- 緑：達成されたマイルストーン。
- グレー：今後のマイルストーン。

複数のマイルストーンが互いに近くにスケジュールされている場合、マイルストーンバーにグループ化されて表示されることがあります。この場合、マイルストーンバーを展開したり折りたたんだりして、その期間のすべてのマイルストーンを表示できます。

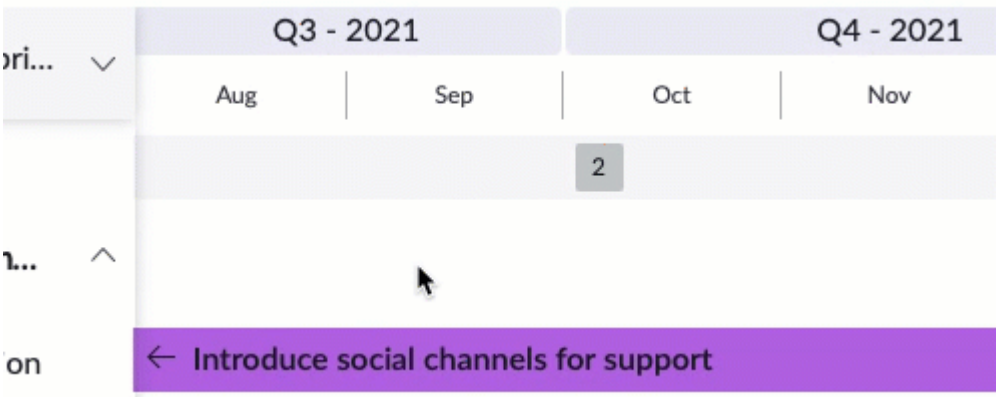

関連情報

戦略的計画 ワークスペースのロードマップでのマイルストーン表示のカスタマイズ

ロードマップマイルストーンを更新

ポートフォリオ計画またはフリーフォームロードマップに追加したマイルストーンを更新または削除して、計画の変更が反映されるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


始める前に
ロードマップのマイルストーンの追加。

必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. マイルストーンを再スケジュールするには、マイルストーンを選択したタイムライン領域にドラッグアンドドロップします。

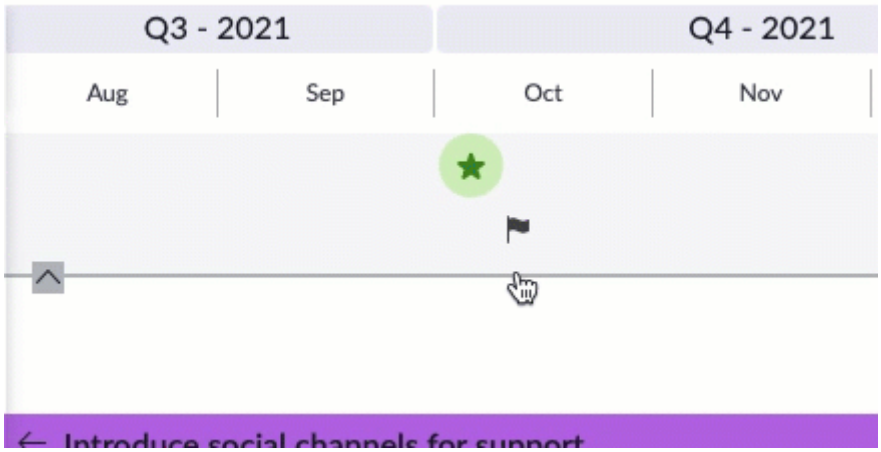

他の詳細を更新したり、マイルストーンを削除したりする場合は、次の手順に進みます。

3. ロードマップビューで、更新するマイルストーンをクリックします。
サイドパネルが開き、マイルストーンの詳細が表示されます。
4. マイルストーンを更新または削除します。
   - 更新するには、フィールドの詳細を編集して [保存] をクリックします。

     フォームフィールドの詳細については、「ロードマップ構成フォーム」を参照してください。
   - マイルストーンを削除するには、[削除] をクリックします。

     [OK] を選択して確定します。

関連情報

戦略的計画 ワークスペースのロードマップでのマイルストーン表示のカスタマイズ

ロードマップアイテムのマイルストーンを追加

ロードマップビューから直接マイルストーンを作成して、計画立案アイテム (デマンド、エピック、プログラムなど) の主要な結果を追跡します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
ロードマップアイテムを選択して、そのマイルストーンを作成します。ロードマップサイドパネルを使用して詳細を入力し、送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フリーフォームロードマップの場合、ソーステーブルが計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] またはその拡張のいずれかの場合のみマイルストーンはサポートされます。

重要:

ロードマップビューからプロジェクトマイルストーンを追加することはできません。プロジェクトマイルストーンを作成または更新すると、関連するプロジェクト計画に影響を与える可能性があります。そのため、プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) のプロジェクトワークスペースを使用してプロジェクトマイルストーンを作成または更新することをお勧めします。

ただし、次の場合、プロジェクトの既存のマイルストーンはすべてロードマップに表示されます 統合 戦略的計画 PPM あり.

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。
2. ロードマップビューから、マイルストーンを追加する計画立案アイテムをクリックします。
   サイドパネルが開き、アイテムの詳細が表示されます。
3. [マイルストーン] タブを選択します。
   または、[完全な詳細] をクリックして、完全な詳細ページから [マイルストーン] タブを選択することもできます。
4. [マイルストーンを追加] アイコン (アイコン) を選択します。
   アイテムにマイルストーンがない場合は、[新しいマイルストーン] を選択します。
5. フォームのフィールドに入力します。

   フィールドの詳細については、「計画立案アイテムのマイルストーンフォーム」を参照してください。
6. [保存] を選択します。
   [マイルストーン] タブに戻ると、マイルストーンが一覧表示されます。
7. オプション: アイテムにマイルストーンを追加するには、ステップ 2 ～ 6 を繰り返します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果

- 作成したマイルストーンは、ロードマップアイテムバーに示されます。

  以下は、マイルストーンがあることを示すロードマップアイテムを含むサンプルロードマップの画像で

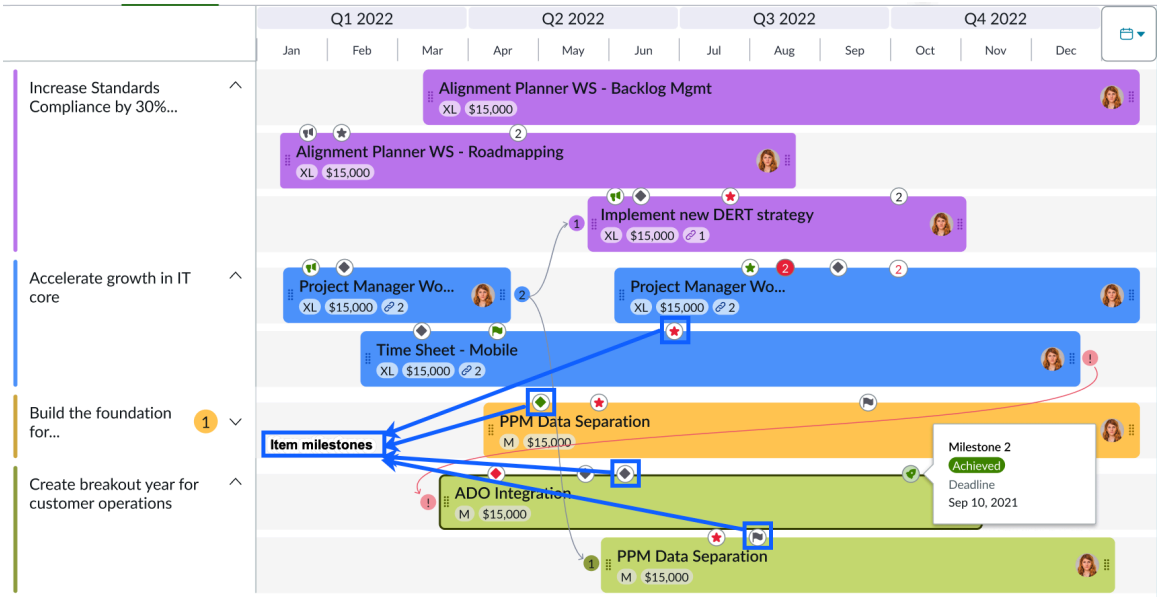

  す。

- これらのマイルストーンインジケーターの上にカーソルを合わせると、マイルストーン名、タイプ、期日などの詳細が表示されます。
- これらのインジケーターのいずれかをクリックすると、[アイテムの詳細] サイドパネルの [マイルストーン] タブが開きます。ここでは、この計画立案アイテムのすべてのマイルストーンのリストを確認できます。

次のタスク

- ロードマップのマイルストーン表示をカスタマイズする方法を説明します。
- どのようなときに計画立案アイテムのマイルストーンがエラーになりやすいかを説明します。
- 計画立案アイテムのマイルストーンを管理する方法を説明します。

ロードマップアイテムのマイルストーンを更新

計画立案アイテム (デマンド、エピック、プログラムなど) に追加したマイルストーンを更新または削除して、計画の変更が反映されるようにします。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

ポートフォリオロードマップまたはフリーフォームロードマップから、計画マイルストーンを選択して詳細を更新します。ロードマップサイドパネルを使用して、詳細を編集して送信します。

フリーフォームロードマップの場合、ソーステーブルが計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] またはその拡張のいずれかの場合のみマイルストーンはサポートされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:

ロードマップビューからプロジェクトマイルストーンを追加することはできません。プロジェクトマイルストーンを作成または更新すると、関連するプロジェクト計画に影響を与える可能性があります。そのため、プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) のプロジェクトワークスペースを使用してプロジェクトマイルストーンを作成または更新することをお勧めします。

ただし、次の場合、プロジェクトの既存のマイルストーンはすべてロードマップに表示されます 統合 戦略的計画 PPM あり.

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。
2. ロードマップビューから、計画立案アイテムをクリックして、[マイルストーン] タブを選択します。

   サイドパネルに、この計画立案アイテムに関連付けられているすべてのマイルストーンのリストが表示されます。

   または、[完全な詳細] をクリックしてアイテムのレコードページを開き、[マイルストーン] タブを選択できます。
3. 更新するマイルストーンをクリックします。
4. マイルストーンフォームから、詳細を更新するか、マイルストーンを削除します。
   - 更新するには、フィールドの詳細を編集して [保存] をクリックします。

     フォームフィールドの詳細については、「計画立案アイテムのマイルストーンフォーム」を参照してください。
   - マイルストーンを削除するには、[削除] をクリックします。

     [OK] を選択して確定します。

関連情報

戦略的計画 ワークスペースのロードマップでのマイルストーン表示のカスタマイズ

ロードマップアイテムの依存関係を追加

ポートフォリオまたはフリーフォームロードマップの計画立案アイテム間で、依存関係を作成して関係性を可視化して、スケジュールを調整できます。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

ポートフォリオロードマップまたはフリーフォームロードマップから、アイテム詳細のサイドパネルを使用して、2 つの計画立案アイテム間の依存関係を作成します。依存関係は、プロジェクト、エピック、デマンド、イニシアチブ、プログラム、作成したカスタム計画立案アイテムタイプに対応しています。

ロードマップ上の計画立案アイテムの依存関係は、同じロードマップまたは別のロードマップのアイテムにあるか、またはアイテムがまだ計画されていない可能性があります。ロードマップの依存関係について、詳しく説明します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳


注:
フリーフォームロードマップの場合、依存関係は、ロードマップのソーステーブルが計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] またはその拡張の 1 つである場合のみ利用できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。
2. ロードマップビューから、依存関係を追加する計画立案アイテムをクリックします。
   サイドパネルが開き、アイテムの詳細が表示されます。
3. 選択 その他 > 依存関係.
4. [依存関係] タブで、[依存関係を追加] アイコン (アイコン) を選択します。
5. フォームのフィールドに入力します。

   フォームフィールドについては、「依存関係フォーム」を参照してください。
6. [保存] を選択します。

タスクの結果
選択した計画立案アイテム間で依存関係が作成され、アイテム詳細のサイドパネルにある [依存関係] タブに一覧表示されます。

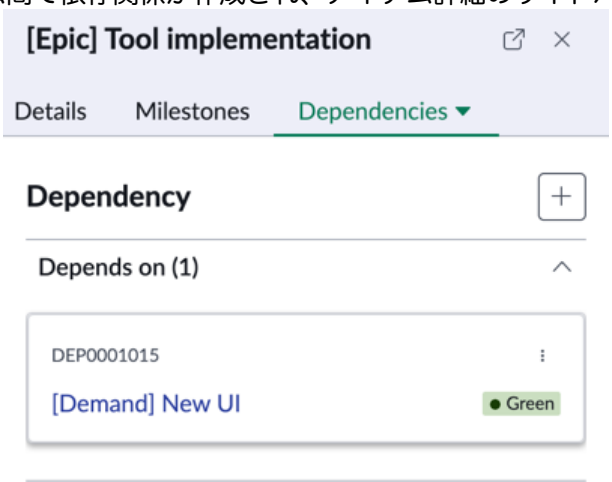


ロードマップで、ロードマップアイテムカードまたは依存関係線から依存関係の詳細を確認することができます。ロードマップにおける依存関係に対して利用可能な表示設定について説明します。

依存関係アイテムのいずれかがロードマップにない場合、依存関係の詳細情報が、外部計画立案アイテムへのリダイレクトリンクと併せて、ロードマップのアイテムカードに表示されます。この場合、アイテムは同じロードマップに属している場合も属していない場合もあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

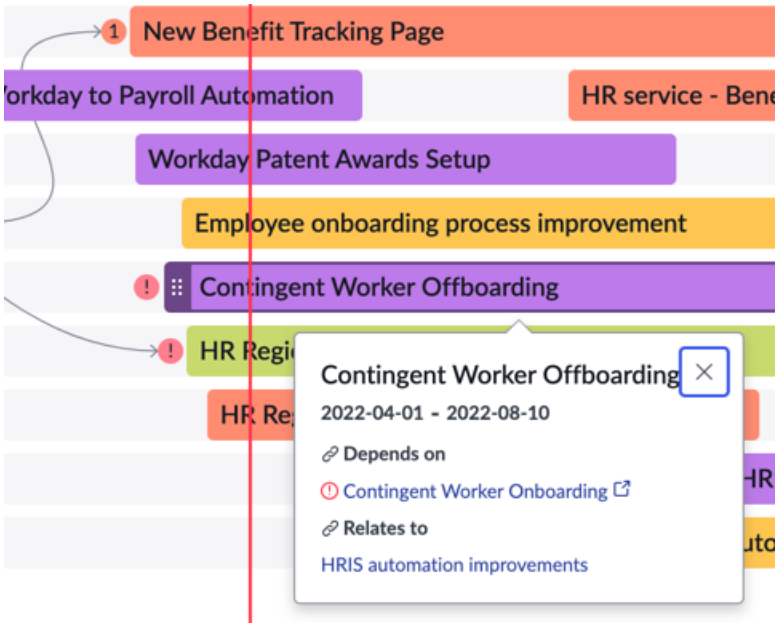

次のタスク

- ロードマップアイテムの依存関係エラーを解決する方法について説明します。
- 依存関係の詳細を更新するか、依存関係を削除します。「ロードマップアイテムの依存関係を更新」を参照してください。

ロードマップアイテムの依存関係を更新

ロードマップ上の計画立案アイテムの依存関係を更新または削除して、計画の変更が反映されるようにします。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
ロードマップサイドパネルを使用して、依存関係の詳細を変更するか依存関係を削除します。

フリーフォームロードマップの場合、依存関係は、ロードマップのソーステーブルが計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] またはその拡張の 1 つである場合のみ利用できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. ロードマップビューで、依存関係を更新または削除する計画立案アイテムをクリックします。

   サイドパネルが開き、アイテムの詳細が表示されます。

3. 選択 その他 > 依存関係.
   この計画立案アイテムの依存関係は、カードの形式でリストされます。

4. サイドパネルから、[その他のアクション] アイコン (⋮) を使用して編集または削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロードマップのカスタマイズ タイムラインビュー

タイムラインビューでのロードマップの表示方法をカスタマイズします。ロードマップアイテムをグループ化し、カテゴリ別に色分けし、数値データポイントを追加してマイルストーンや依存関係を表示することで、ロードマップを効率的に分析し、情報に基づいた意思決定を行うことができるようになります。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

このタスクでは、ロードマップのタイムラインビューをカスタマイズするためのさまざまなオプションについて説明します。適用するオプションを選択します。

ここで適用される設定は、ロードマップに従う初期設定として保存されます。ロードマップにアクセスできるすべてのユーザーに同じ設定が表示されます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. ロードマップのタイムラインのスケールを変更します。
   タイムスケールアイコン ( ) を選択し、[月]、[四半期]、または [年] を選択します。

   注:
   選択したタイムスケールビューは、ロードマップ設定に保存されます。

3. サイドパネルを使用して、ロードマップの外観をカスタマイズします。

   a. サイドバーから、[カスタマイズ] アイコン ( ) を選択します。

   b. 使用可能な属性でロードマップアイテムをグループ化し、色分けします。

      ロードマップアイテムを最大 2 つの属性でグループ化し、1 つの属性で色分けすることができます。

      アドミンと協力して、[グループごと]、[色別]、および [メトリクス] フィールドの他の属性を追加できます。「優先順位付けとロードマップのための計画立案アイテムの表示設定のカスタマイズ」を参照してください。

      重要:
      ロードマップアイテムを名前属性でグループ化しないでください。アイテムバーをあるグループから別のグループに移動すると、アプリケーションによってロードマップアイテムの名前が変更されるためです。

   c. [所有者] トグルを使用すると、ロードマップアイテムの所有者を可視化できるようになります。

   d. [メトリクス] セクションにフィールドを追加して、ロードマップアイテムバーに予定コストなどのデータポイントを表示します。

      最大 3 つのメトリクスを追加できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



e. ロードマップアイテム (プロジェクト、エピック、デマンドなど) にマイルストーンがある場合は、[マイルストーン] セクションの切り替えを使用して、それらの表示方法を調整します。
詳細については、「戦略的計画 ワークスペースのロードマップでのマイルストーン表示のカスタマイズ」を参照してください。

f. ロードマップアイテムに依存関係がある場合、[依存関係] セクションのトグルで表示方法を調整します。
詳細については、「戦略的計画 ワークスペースでのロードマップの依存関係表示のカスタマイズ」を参照してください。

g. 現在の日付のインジケーターを使用して、タイムライン上の現在の日付を特定します。
[その他の設定] セクションで、[現在の日付行] のトグルを有効化します。

4. [依存関係線を表示] アイコン ( ) を使用して、ロードマップアイテム間での依存関係の線表示をすばやく有効化または無効化します。
5. ズームオプションを使用して、ロードマップビューのズームイン、ズームアウト、およびズームのリセットを行います。



注:
選択したズームレベルは、ロードマップ設定として保存されません。

6. ロードマップに表示されているデータにフィルターを適用します。

ロードマップカンバンビューのカスタマイズ

ロードマップカンバンの表示方法をカスタマイズします。レーンの値を変更してカードの並べ替え方法を変更するか、カードメトリクスをカスタマイズしてカードに表示するフィールドのみを表示します。


始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順
1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [カンバン] ビューを選択します。
4. [カスタマイズ] アイコン ( ) を選択して、設定に基づいてビューを更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

「優先順位付けとロードマップのための計画立案アイテムの表示設定のカスタマイズ」を参照してくださ
い。

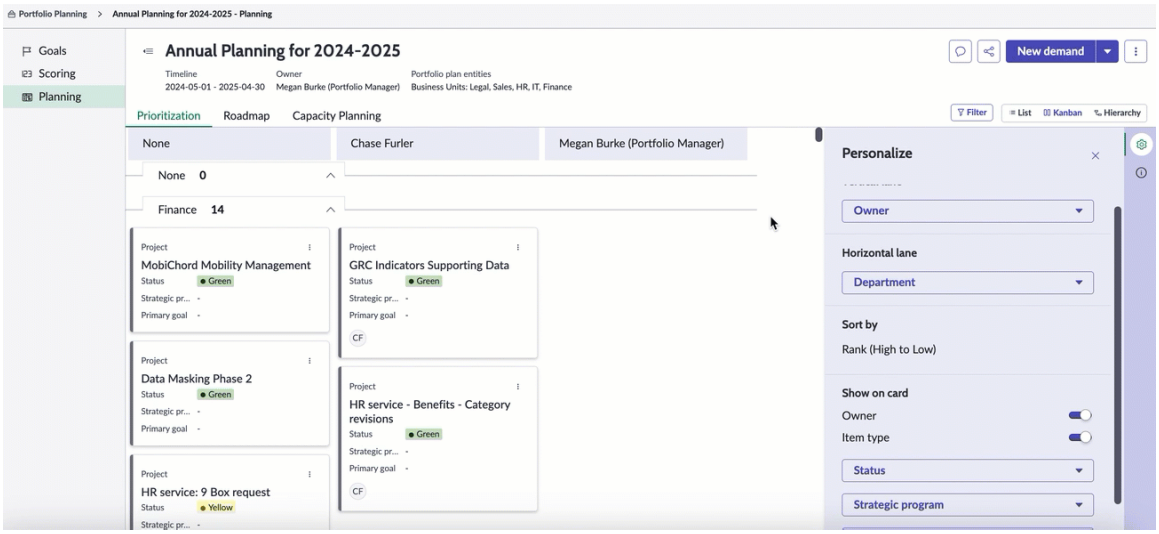

重要:
カンバンボードに表示される垂直レーンと水平レーンのデフォルトの表示制限は、それぞれ 30 と 30 です。これらのレーンは、参照フィールドと選択フィールドのみをサポートしています。ユーザーは、カンバンカードのフィールドメトリクスを変更することはできません。

ロードマップアイテムの進捗状況を追跡する

追跡モードを使用して、ポートフォリオ計画ロードマップまたはフリーフォームロードマップ上の作業アイテムの完了を視覚的に追跡します。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user


このタスクについて
トグルを使用して、ロードマップビューを計画モードから追跡モードに切り替えます。ロードマップアイテムカードは、ステータスと進捗状況を示す進捗状況バーに変わります。

注:
追跡モードでは、ロードマップアイテムとマイルストーンを作成、更新、または再スケジュールすることはできません。このビューは読み取り専用モードです。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画 ロードマップを開きます。

2. ロードマップの追跡ビューをオンにするには、追跡モードオプションを選択します。



3. オプション: 追跡モードでロードマップビューをカスタマイズします。

注:
ロードマップの計画立案モードで行ったグループ化とパーソナライズによる色分けは追跡モードに引き継がれますが、メトリクスは引き継がれません。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


a. [ステータス] と [完了率] をそれぞれ切り替えて、ロードマップアイテムの [ステータス] と [完了率] のヴィジビリティを有効または無効にします。

b. [メトリクス] セクションにフィールドを追加して、ロードマップアイテムバーに予定コストなどのデータポイントを表示します。
追跡モードでは、最大 2 つのメトリクスを追加できます。

c. マイルストーンの表示をカスタマイズします。
マイルストーンをアイコンだけで表示するか、ラベルと一緒に表示するかを選択できます。

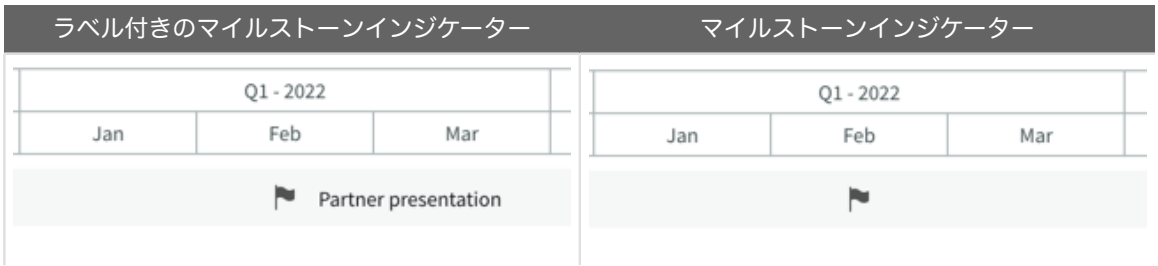

タスクの結果
ロードマップの追跡ビューは、カスタマイズ設定に従って表示されます。ロードマップ追跡のサンプルビューを次の画像に示します。

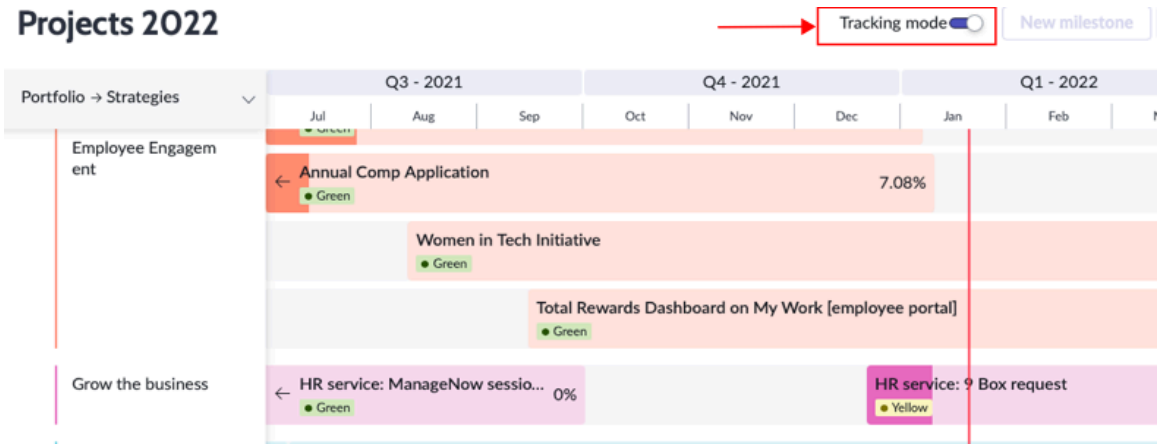

でのシナリオ計画による計画の最適化 戦略的計画ワークスペース


ポートフォリオマネージャーは、潜在的な結果を比較し、戦略的目標との整合性を評価し、最適なシナリオを本稼働計画として承認することで、ポートフォリオ計画を最適化します。

[優先順位付け] タブのシナリオ計画アイテム

[シナリオ] ページの [優先順位付け] タブでは、シナリオに対して計画立案アイテムを追加または削除したり、日付を調整したりできます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

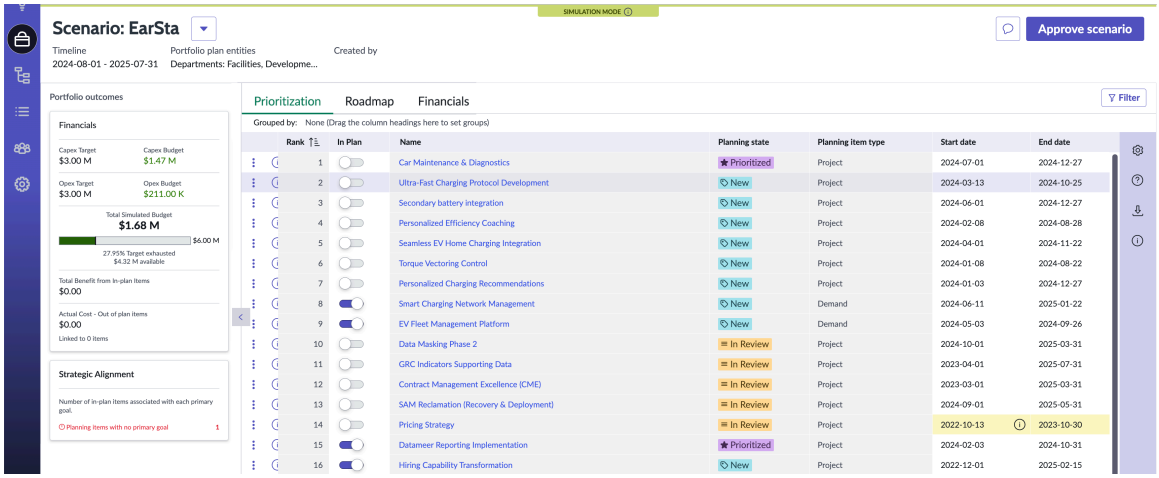


[ロードマップ] タブのシナリオ計画アイテム

[ロードマップ] タブには、シナリオ内の計画立案アイテムのガントチャートのようなビューが表示され、ポートフォリオ計画タイムライン全体での開始予定日と終了予定日が示されます。[ロードマップ] タブを使用すると、タイムライン全体で計画立案アイテムを表すバーをドラッグして日付を調整できます。

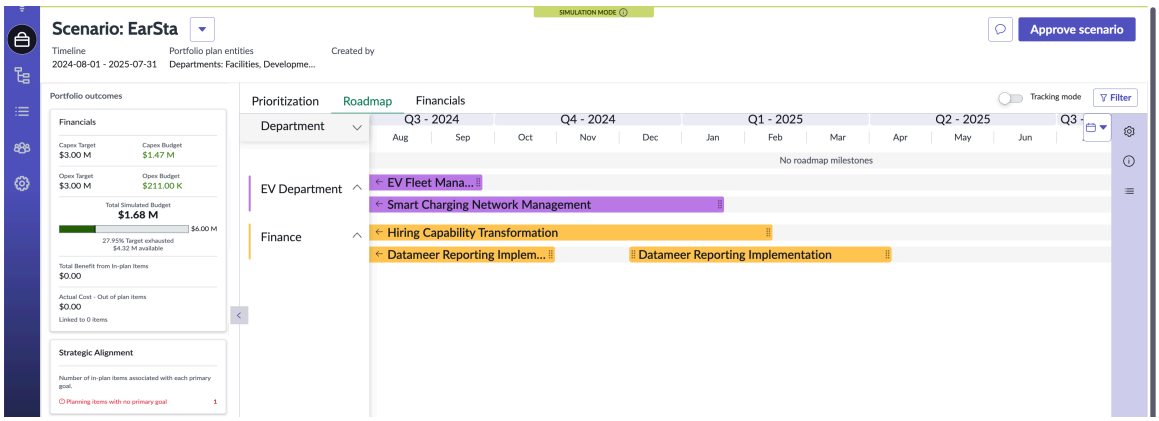

[財務] タブのシナリオ計画アイテム

[シナリオ] ページの [財務] タブでは、結果パネルを使用してカスタムターゲットと予算を設定し、割り当てられた予算をターゲットと比較できます。

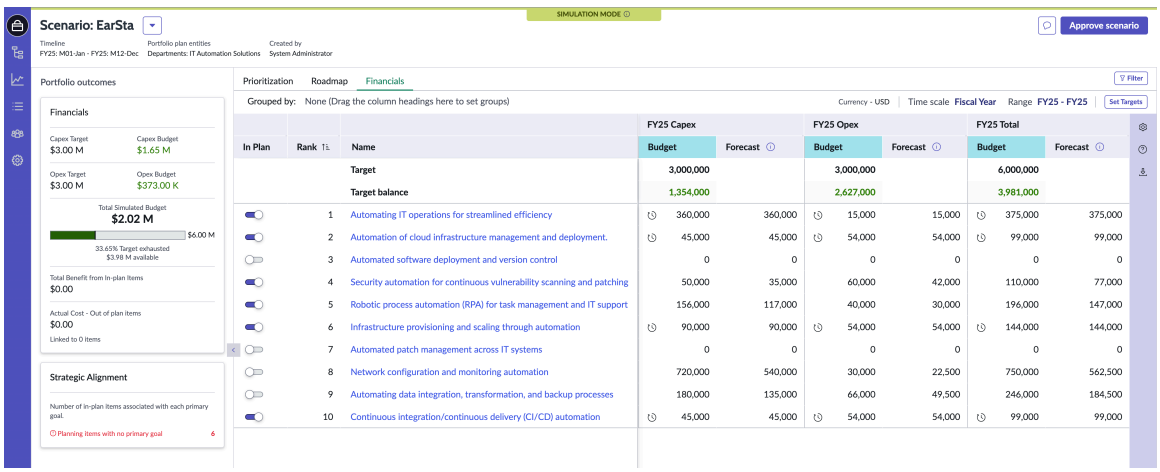

ポートフォリオマネージャーは、さまざまな予算の組み合わせを持つ複数のシナリオをシミュレートし、その結果を比較して、情報に基づいた意思決定を行い、リソースと戦略的目標のバランスを

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

取ることができます。シナリオ計画の財務ビューを使用して、財務情報のシミュレーションモードを取得できます。ポートフォリオマネージャー、プログラムマネージャー、ポートフォリオを担当するポートフォリオユーザーなどの戦略的計画立案ユーザーは、このビューを使用して、特定の計画サイクル (月次、四半期、年次、または 1 年以上最大 5 年) のポートフォリオ予算ターゲットを設定できます。この定義された予算を使用して、ポートフォリオユーザーは、ポートフォリオ内の計画立案アイテムに優先順位を付けて、優先順位付けされたアイテムがポートフォリオ予算内で実行できるかどうかを分析すると同時に、優先順位付けされたアイテムによる金銭的利益を確認できます。

重要:
予算割り当てプロパティを有効にして 、ポートフォリオレベルで計画立案アイテムに予算を割り当て、経費タイプまたは原価費目別に予算を割り当てる予算 属性を設定します 。

複数のシナリオを作成して比較し、ステークホルダーと協力して、金銭的利益リターンが改善された理想的な計画を承認します。承認されると、承認されたシナリオが定義された計画サイクルの新しいポートフォリオ計画になります。シナリオ承認後にポートフォリオで発生する変更の詳細については、「 シナリオの承認」を参照してください。

財務シナリオ計画は、定期的な計画サイクル、四半期レビュー、財務レビューサイクルなど、組織のニーズに応じて計画サイクルまたは実行サイクル全体を通じて実行できます。シナリオ計画の財務は、情報に基づいた意思決定に到達し、組織のニーズに合わせてポートフォリオ計画をカスタマイズするのに役立ちます。

注:

- シナリオ計画の財務は、エピック、プロジェクト、およびデマンドタイプの計画立案アイテムでのみサポートされています。
- 従来の投資枠管理を使用している顧客は、新しいエクスペリエンスに移行して財務シナリオ計画に取り組む必要があります。

タイムスケールと範囲フィルターを使用して、シナリオ計画の財務ビューをカスタマイズします。組織の計画サイクルに応じて、月次、四半期ごと、または年次の頻度で計画立案アイテムの予算を管理します。

シナリオ計画の [成果] パネル

シミュレーションの [結果] パネルには、投資および経費のターゲット金額と予算金額、このシミュレーションの予算ターゲットの設定、ターゲットからの使用済み予算と残りの予算、計画内項目からの利益、および計画外項目からの実績コスト会計など、ポートフォリオの財務情報が表示されます。集計データは、ターゲットデータと予算データを含むポートフォリオタイムライン範囲に基づいてフェッチされます。

識別のための結果パネルの表現。

[結果] パネルの表現

表示	定義
シミュレートされた予算合計の進捗状況バー表示のない金額の赤色のテキスト	このシナリオのターゲット金額の定義または設定はありません。
金額の赤いテキストとシミュレートされた合計予算の赤い進捗状況バー	計画立案アイテムに割り当てられた予算の合計が、シナリオの設定済みターゲット金額を超えています。
投資予算の金額 (赤)	投資予算の割り当てがシナリオの投資ターゲットを超えています。
経費予算の赤色テキストの金額	経費予算の割り当てがシナリオの経費ターゲットを超えています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[結果] パネルの表現 (続く)

表示	定義
予算金額の緑色のテキストと緑色の進捗状況バー	各経費タイプと合計予算の予算割り当てが、シナリオに設定されたターゲット内である。

シナリオ計画の機能

シナリオ計画では、次のアクションを実行できます。

機能	説明
シナリオの作成	シミュレートされた環境で現在の計画または別のシナリオからシナリオを作成し、そのシナリオを実際の計画や他のシナリオと比較します。
シナリオを比較	シナリオと実稼働計画を並べて比較し、トレードオフと計画に追加または削除されたアイテムを確認します。
シナリオの承認	最適なシナリオを承認します。
シナリオの管理	シナリオのリストを表示したり、シナリオの名前を変更したり、シナリオを削除したりします。

シナリオ計画のユースケース

シナリオ計画のユースケースの概要を次に示します。

- 会計年度の計画 - ACME Inc のポートフォリオマネージャーである Megan Burke は、翌会計年度の計画を立てており、計画立案アイテムに優先順位を付け、組織の戦略的目標に合わせる必要があります。Megan はポートフォリオ計画のシナリオを作成し、[優先順位付け] タブを使用してアイテムを目標に合わせます。Megan は、プログラムマネージャーや財務チームと話し合い、複数のシナリオを作成して比較します。Megan は、翌会計年度の適切に調整された戦略的ポートフォリオ計画として最適なシナリオを承認します。
- サイクル半ばの優先順位付け直し - 年度半ばに予定されている優先順位の変更により、現在のポートフォリオ計画の調整が必要になります。ACME Inc. のプロダクトマネージャーである John Doe は、シナリオを作成し、変更した優先順位を組み込みます。John は、プログラムマネージャーと財務チームのフィードバックに基づいて計画を調整し、計画を確定します。

シナリオの作成

シミュレートされた環境で実際の計画または別のシナリオからシナリオを作成し、そのシナリオを実際の計画や他のシナリオと比較します。

始める前に

必要なロール：

- sn_align_core.apw_user
- sn_align_ws.spw_financial_user - 財務の詳細を表示および編集します。

このタスクについて

シナリオを作成すると、潜在的な結果を可視化して予測できます。シナリオは、本稼働計画または別の既存のシナリオに基づいて作成できます。1 つ以上のシナリオを作成したら、それらを本稼働計画

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


と並べて比較し、最も望ましいシナリオを承認できます。承認したシナリオが本稼働計画になります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [シナリオを作成] を選択します。

> **注:**
> 最初のシナリオを作成する前に、[シナリオ] ページに [シナリオ計画] ボタンが表示されます。このような場合は、[シナリオ計画] を選択すると、[シナリオを作成] ボタンが表示されます。

   a. [シナリオ名] フィールドにシナリオの名前を入力します。
   b. オプション: [説明] フィールドにシナリオの詳細を入力します。
   c. [コピー元] フィールドで、[現在の計画 *(Current Plan)*] またはシナリオの作成ベースにする既存シナリオの名前を選択します。
   d. [作成] を選択します。
   [シナリオ計画] - [シナリオ名] ページが表示され、[優先順位付け] タブが開きます。[優先順位付け] タブには、本稼働計画またはシナリオのコピー元の既存のシナリオにあるすべての計画立案アイテムが一覧表示されます。計画立案アイテムの開始日と終了日は、本稼働計画で指定された日付または実際の実行日に基づいて決定されます。
   - [計画中 **(In Plan)**] トグル：デフォルトでは、計画ステータスが [優先順位付け] または [完了] であり、開始日がポートフォリオ計画タイムライン内にある計画立案アイテムに対して、[計画中 **(In Plan)**] トグルがオンになります。[計画中 **(In Plan)**] トグルは、ステータスが [新規]、[レビュー中]、または [キャンセル済み] のアイテムに対してオフになります。
   - 範囲外の日付を黄色でハイライト表示：ポートフォリオ計画タイムラインの範囲外である計画立案アイテムの日付は、黄色の背景でハイライト表示されます。このようなアイテムの場合、[計画中 **(In Plan)**] トグルはオフになります。
4. [優先順位付け] タブを使用して、追加の計画立案アイテムをシナリオに含めるか除外します。

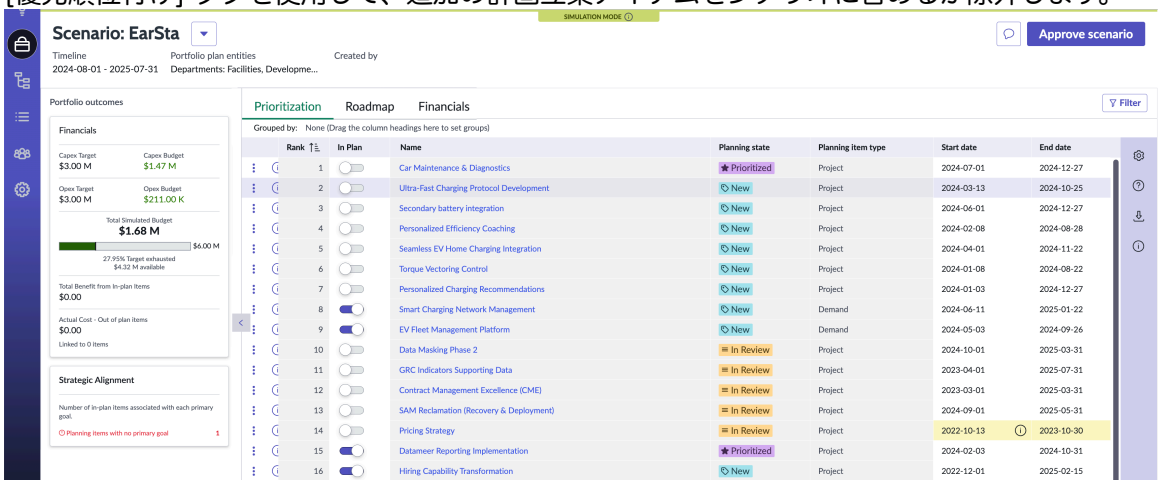


   a. オプション: シナリオから計画立案アイテムを除外するには、[計画中 **(In Plan)**] トグルをオフにします。
   b. オプション: シナリオに計画立案アイテムを含めるには、ポートフォリオ計画タイムライン内に収まるようにアイテムの開始日と終了日を編集し、[計画中 **(In Plan)**] トグルをオンにします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムライン範囲外のアイテムをシナリオに含めると、これらのアイテムは計画立案および優先順位付けのプロセスの間はシナリオに残ります。シナリオが承認されると、これらのアイテムの日付はシナリオの日付に合わせて更新されます。ただし、これらの更新日は元のポートフォリオ計画タイムラインから外れているため、アイテムは本稼働ポートフォリオ計画から移動されます。

5. [ロードマップ] タブを使用して、計画立案アイテムの依存関係を表示し、計画立案アイテムの日付を調整します。

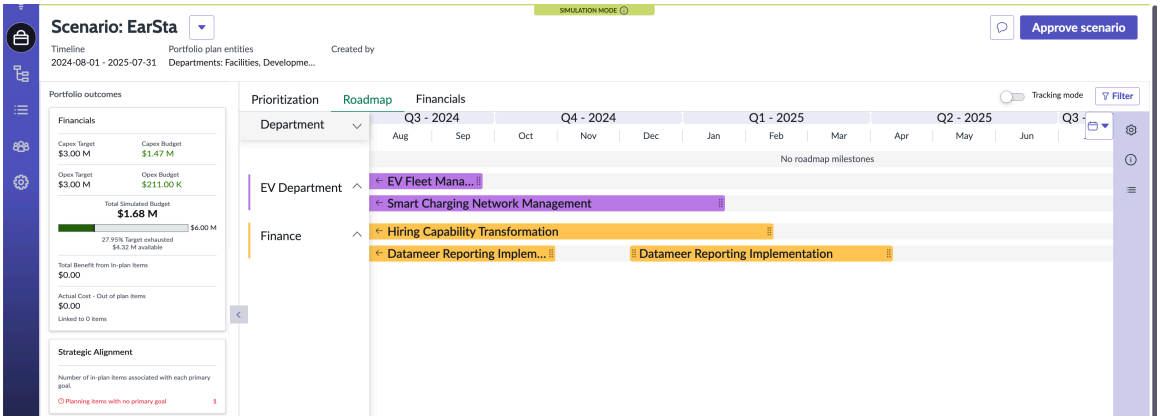


a. 計画立案アイテムのバーの開始または終了をドラッグして、開始日または終了日を変更します。

b. 計画立案アイテムのバーをドラッグして、計画タイムライン内で移動します。

c. さまざまな計画立案アイテムの依存関係とマイルストーンを表示します。

6. [財務] タブを使用して、適切なアイテムの優先順位付け、投資、実行を表示し、組織に最高の投資収益率をもたらします。

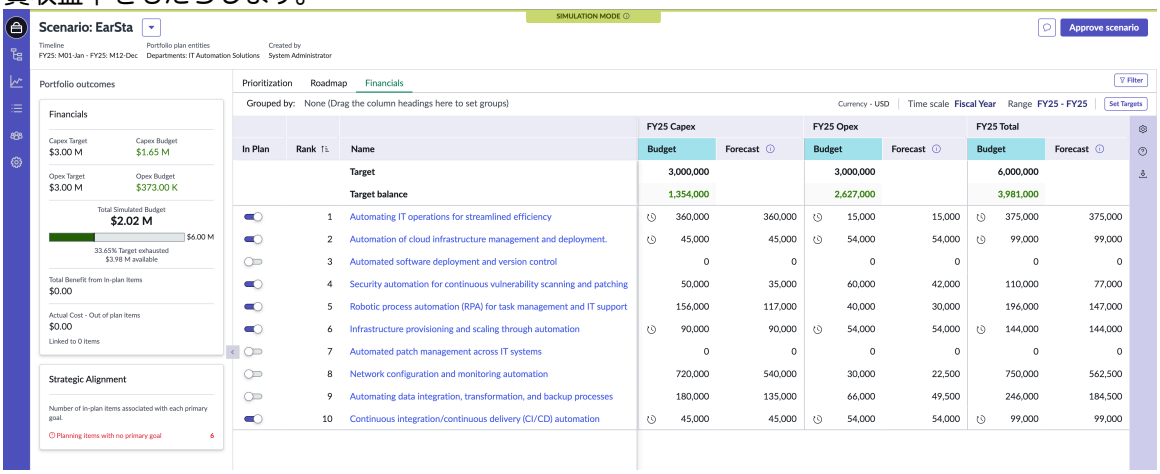

a. ポートフォリオ予算のターゲットを設定します。

i. [ターゲットの設定] ボタン ([Set Targets]) を選択します。

ii. [ターゲットを設定] ウィンドウで、インライン編集機能を使用して経費タイプまたは原価費目の予算を設定します。

> ヒント:
> [タイムスケール] と [範囲] を変更して、組織の計画サイクルに合わせて、月次、四半期ごと、または年次の頻度で各会計期間のターゲットを設定できます。ターゲットはより高いタイムスケールに設定され、会計期間間で均等に分割されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

シナリオにターゲットが設定されると、[ターゲット] 行に、会計期間および予算割り当ての選択肢別に定義されたターゲット金額が表示されます。

b. [計画内] トグルを使用して、シナリオに計画立案アイテムを含めたり除外したりします。

c. インライン編集機能を使用して、個々の計画立案アイテムの予算を追加または予算を削減します。

シナリオの作成中に予算に加えられた変更は、 を示すアイコンになります。

次のタスク

- 必要に応じて、さらにシナリオを作成します。
- シナリオを比較。シナリオアクションリストから [シナリオを比較] を選択すると、シミュレーションモードからシナリオを直接比較できます。
- シナリオの承認

シナリオを比較

シナリオを並べて比較して、プライマリ目標との整合性の確認、包括的な計画の評価、リソース使用率の最適化、実現可能性の確認、財務情報を行います。

始める前に

1 つ以上の計画立案シナリオを作成し、実行する計画立案アイテムを選択していることを確認します。詳細については、「シナリオの作成」を参照してください。

必要なロール：

- sn_align_core.apw_user
- sn_align_ws.spw_financial_user - 財務ウィジェットと詳細を表示します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.

2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。

3. [シナリオを作成] メニューから、[シナリオを比較] を選択します。
[シナリオを比較] ページが表示されます。


4. [比較するシナリオを追加] を選択し、比較に含めるシナリオを選択または選択解除します。
最大 5 つのシナリオを比較に追加できます。

5. [比較] を選択します。
[シナリオ] ページの [シナリオアクション] メニューから [シナリオを比較] を選択して、[シナリオを比較] ページを表示することもできます。[シナリオを比較] ページが表示され、[シナリオ] ページで現在の計画との比較に含まれるシナリオが開きます。
選択したシナリオが [シナリオを比較] ページに並べて表示されます。

6. 予算とターゲット、メリット、予算配分、トレードオフ、主要目標との整合性など、シナリオのさまざまな側面を比較します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

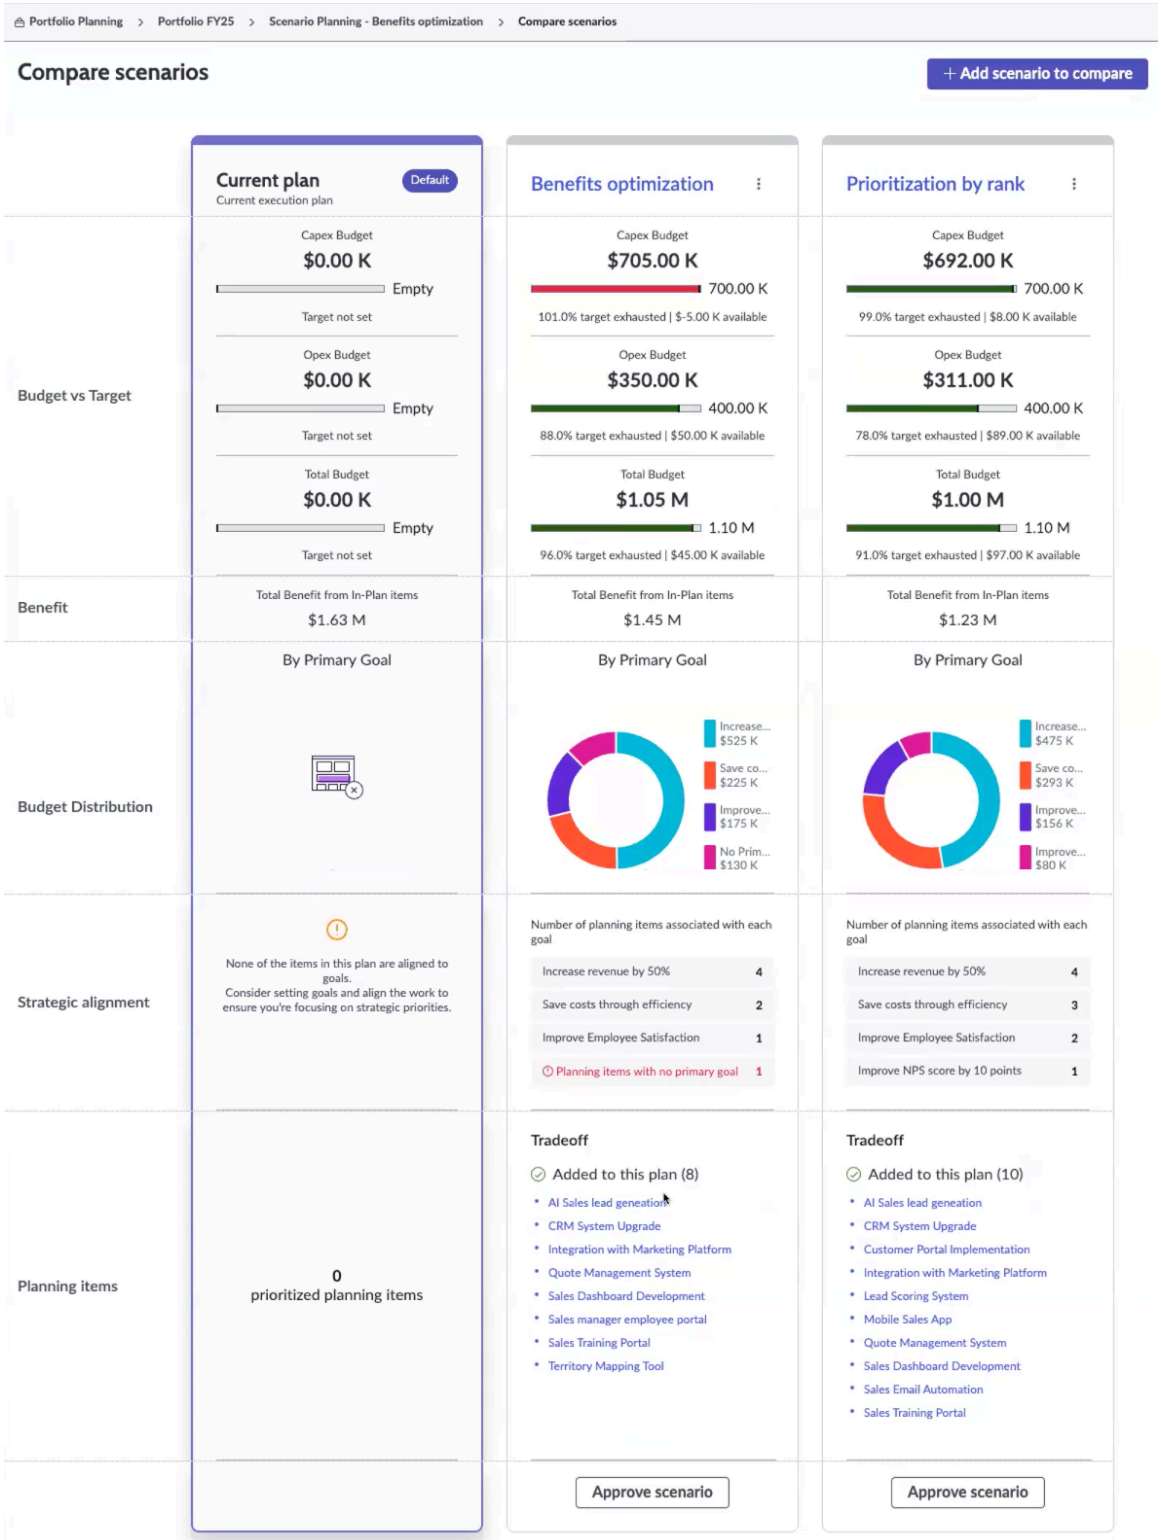

シナリオ比較の視覚的な手がかり

クライテリア	説明
主要目標のない計画立案アイテム	プライマリ目標のない計画立案アイテムは、赤色のフォントで示されます。
この計画から削除されました	シナリオが承認されたときに計画から削除されたアイテムには、赤色の X が付きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クライテリア	説明
この計画に追加されました	シナリオが承認されたときに計画に追加されたアイテムには、緑色のチェックマークが付きます。

次に、承認のシナリオの適合性を示すいくつかの指標を示します。

- すべての計画立案アイテムがプライマリ目標に沿っており、関連付けられていないアイテムはなく、組織の目標を効果的にサポートする重点的な戦略を提供します。
- トレードオフのセクションには、関連アイテムが含まれており、プロジェクトまたはイニシアチブのさまざまな側面に対処する包括的で包含的な計画を示しています。
- シナリオは現実的で達成可能であり、現在の制約と機能を考慮し、計画されたアクションを与えられた時間枠と予算内で実行できることを確認しています。
- ウィジェットを使用したファイナンシャルプランによるメリットの向上、設定されたターゲットに対して割り当てられた予算を検証するための [予算とターゲット]、より良い金銭的利益のあるシナリオを特定するための [メリット]、上位 4 つの目標に割り当てられた予算額を確認するための [予算配分]。

7. オプション: シナリオに関連する [シナリオの承認] ボタンを選択して承認します。
戦略的計画ワークスペースでの既存のシナリオの承認の詳細については、「 シナリオの承認」を参照してください。

次のタスク
シナリオの承認

シナリオの承認

組織の目標に沿っており、現在の計画にするための最良のビジネス成果が得られるシナリオを承認します。

始める前に
シナリオを比較済みで、承認するシナリオを選択していることを確認します。詳細については、「シナリオを比較」を参照してください。

必要なロール：

- sn_align_ws.scenario_approver
- sn_align_ws.spw_funding_user - 財務上の変更を表示して承認します。

このタスクについて
シナリオを承認するときに：

- [計画中 (In Plan)] ステータスの計画立案アイテムは、[優先順位付け] ステータスに更新されます。
- 計画から移動した計画立案アイテムは、[レビュー中] ステータスに変更されます。
- それに応じて承認日が修正されます。
- 計画立案アイテムの予算に加えられた変更は、予算として承認されます。

手順


1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [シナリオを作成] メニューから、[シナリオを比較] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[シナリオの承認] ボタンは、[シナリオ] ページでも使用できます。シナリオを作成すると、他のシナリオと比較せずにシナリオを直接承認できます。

4. 承認するシナリオに関連する [シナリオの承認] ボタンを選択して承認します。

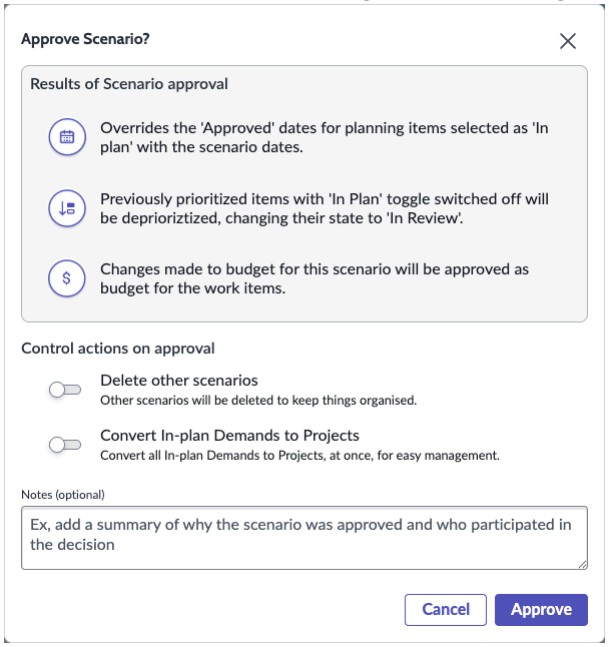

シナリオの承認中に、次のことができます。

- [計画内のデマンドをプロジェクトに変換] トグルを選択して、ポートフォリオ計画を自動的にビルドするために、優先化されたデマンドをプロジェクトに変換します。
- [他のシナリオを削除] トグルを選択して、残りのシナリオを削除します。
- [メモ] フィールドにシナリオを承認する理由を入力します。

5. [承認] を選択します。

シナリオの管理

[シナリオの管理] オプションを使用して、すべてのシナリオのリストの表示、シナリオの名前変更、またはシナリオの削除を行います。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. 移動先 シナリオを作成 > シナリオを管理します。.
   [シナリオ] ページの [最近のシナリオ] メニューで [シナリオの管理] を選択することもできます。
   [シナリオの管理] ダイアログに、現在の計画に関連するシナリオのリストが表示されます。
4. 次のいずれかのアクションを実行します。

でのユーザーキャパシティの計画 戦略的計画ワークスペース

リソースキャパシティを評価し、既存の割り当てを確認します。これは、 戦略的計画内のリソースのアサイン作業中に情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


自動翻訳

[リソースキャパシティを管理] 画面を使用して、リソースキャパシティの詳細を生成します。

[キャパシティ] 画面を使用して、ポートフォリオへのリソースキャパシティマッピングに関する詳細情報を表示します。

リソースキャパシティの管理

[リソースキャパシティを管理] 画面

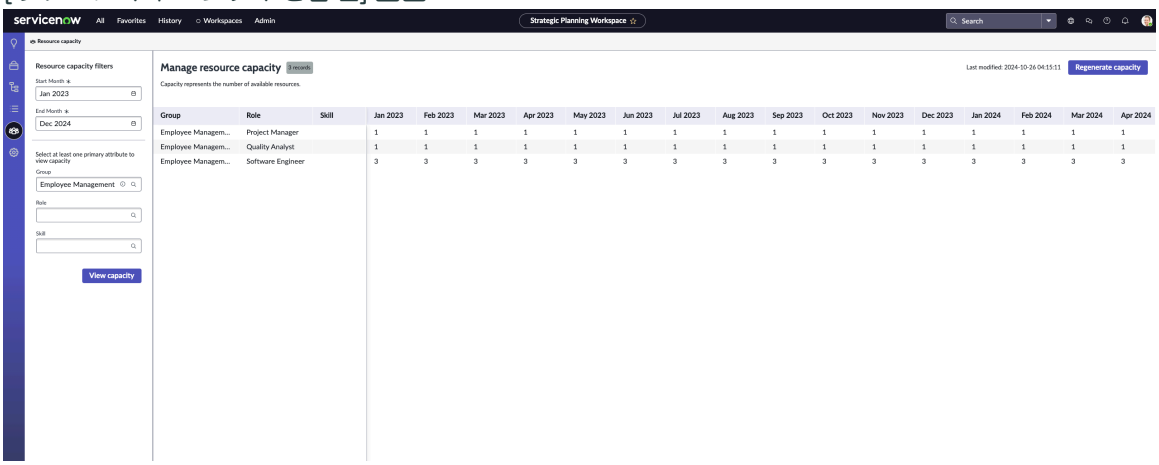

[リソースキャパシティを管理] を使用して、期間とプライマリ属性を選択して、利用可能なリソースの数を表示します。生成されたリソースキャパシティの詳細が保存されます。キャパシティを再生成して、リソース可用性の最新の変更を表示できます。

[リソースキャパシティ] 画面では、次のデータを表示できます。

- 生成されたキャパシティのリソース可用性。
- 月次ブレークダウンビューで利用可能なリソースの合計数。
- キャパシティの詳細を生成する最新の日付。
- 従業員プロファイルマッピングから最新のキャパシティの詳細を再生成してフェッチするオプション

[リソースキャパシティを管理] 画面では、次のことができます。


- 必要な日付範囲で特定のキャパシティ属性を持つリソースをフィルタリングして、利用可能なリソースの数を表示します。
- キャパシティの詳細を再生成し、リソース従業員プロファイルマッピングから最新の詳細を表示します。

リソース基準を選択

- プライマリ属性を選択すると、優先順位付けされた計画立案アイテムのリソースのアサインから利用可能なグループ、ロール、またはスキルが自動的に表示されます。
- 自動選択と手動選択オプションを切り替えて、すべての計画立案アイテムに割り当てられたリソース工数を表示するか、カスタムデータを表示します。
- リソース基準を定義して、優先順位付けされた計画立案アイテムのリソースのアサインから利用可能なグループ、ロール、またはスキルを表示します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

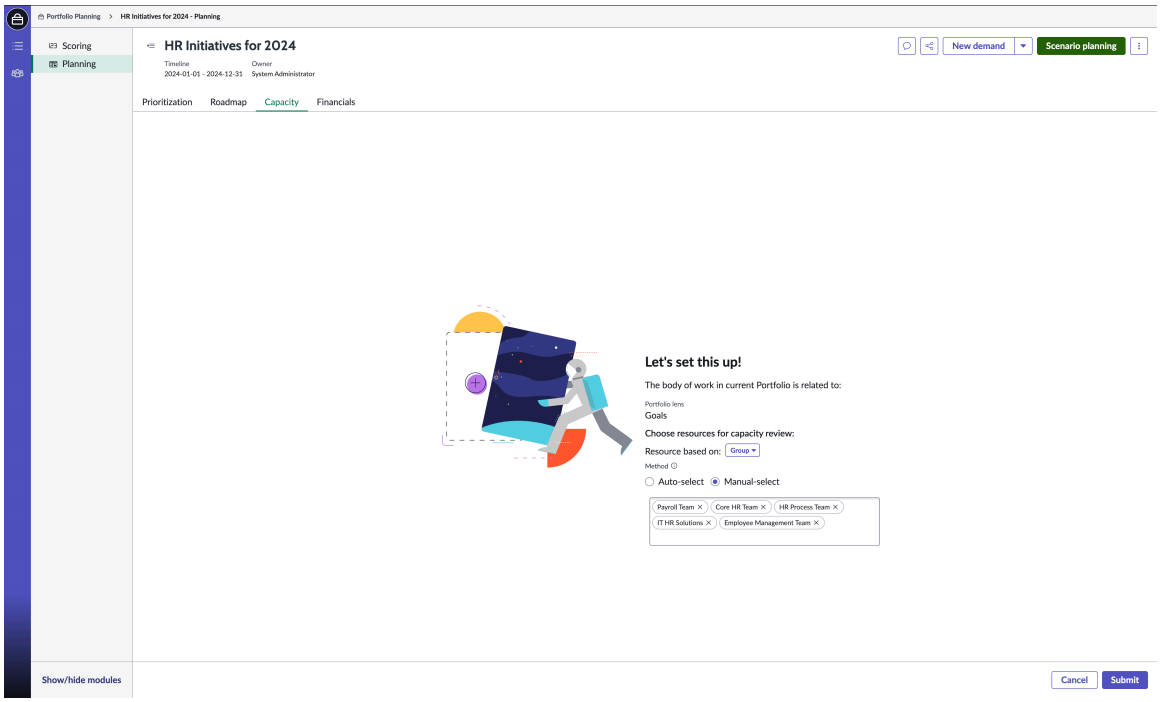

キャパシティ

[キャパシティ] 画面には、優先順位付けされた計画立案アイテムのリソース工数が表示されます。

- リソースキャパシティと割り当ての包括的な概要
- 現在のリソースキャパシティ割り当て
- インタラクティブなガントチャットにより、優先順位付けされた計画立案アイテムが下部トレイに表示され、作業を分析および計画できます。

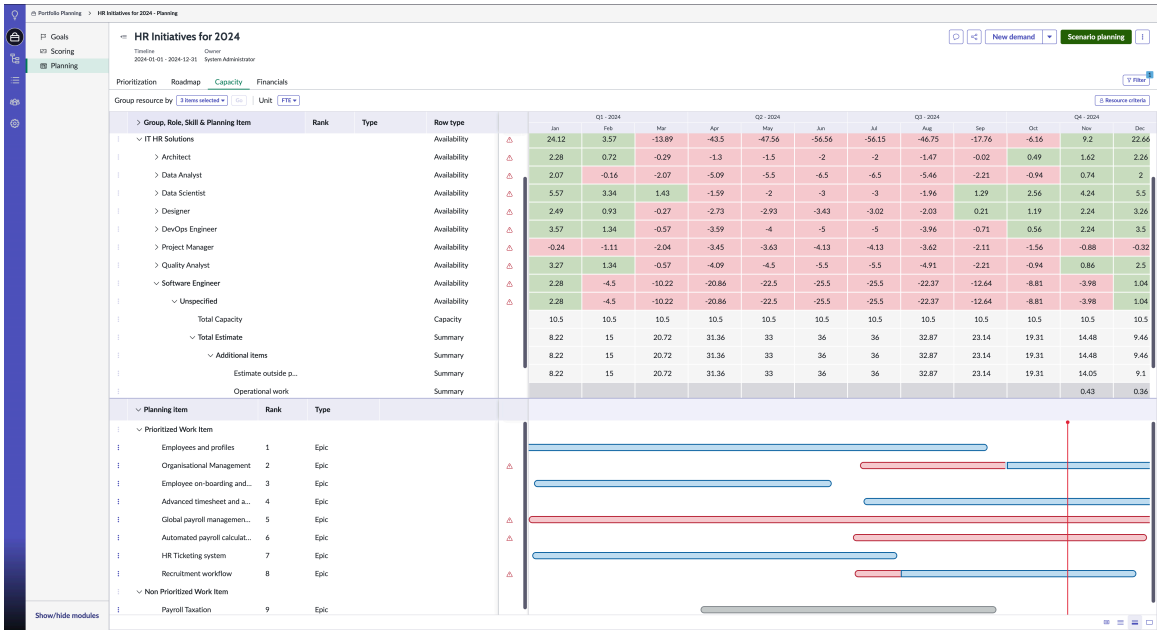

[キャパシティ] 画面について。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

キャパシティの凡例


色	説明
黄 (ガントバー)	リソースがアサインされていない計画立案アイテム。
青 (ガントバー)	計画立案アイテムのリソース推定がリソースキャパシティ内である。
赤 (セルとガントバー)	リソース推定の過剰割り当て。
緑 (セル)	リソースキャパシティ内のリソース推定。

キャパシティを使用すると、次のことができます。

- 現在のポートフォリオの優先順位付けされた計画立案アイテムのキャパシティ割り当てを表示し、将来のリソース要件をより適切に予測します。
- フィルターオプション (Filter を使用して、タイプ、ステータス、優先度、または必要な属性別に計画立案アイテムを表示し、キャパシティ計画を作成します。

  注:
  デフォルトのフィルターは、優先順位付けされた計画立案アイテムのみを表示するように設定されています。

- 割り当てられた運用リソースのアサインに基づいて更新されたリソースキャパシティを表示します。
- ヒートマップビューで合計リソースキャパシティを表示します。

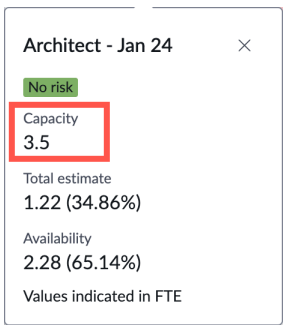

- 合計リソースキャパシティと推定合計を表示します。
- [追加アイテム] リストに、運用作業の工数とポートフォリオ外の推定の工数を表示します。
- [リソース基準] ( ) を選択して、人員の基準を再定義します。

Example: キャパシティにおける運用リソースのアサインの計算

リソースマネージャーは、運用リソースの割り当てを作成したり、従業員の既存の運用リソース計画を移行したりして、作業要件を満たすために必要な会議、トレーニング、休暇などを処理できます。

キャパシティが 2 FTE のグループで、リソースマネージャーがトレーニング用キャパシティの 10% でグループタイプの運用リソースのアサインを作成するとします。この運用アサインは、[キャパシティ] 画面の上部トレイにある 運用作業 ラインアイテムで確認できます。[運用作業] 品目の値は 0.2 で、これはグループの合計キャパシティの 10% です。

リソースマネージャーが休暇用にグループタイプの運用リソースのアサインを作成すると、[運用作業] 品目は更新されませんが、使用可能な合計キャパシティが減少します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースマネージャーが、4 月から 6 月までの四半期の休暇用にキャパシティの 25% で運用リソースのアサインを作成する同じグループを考えてみましょう。4 月から 6 月までの四半期のグループの使用可能な合計キャパシティは 1.5 FTE で、これは 25% の休暇を削減した後の合計キャパシティの 75% に相当します。

これはグループの合計キャパシティの 25% にあたる 0.5 FTE が削減されます。

注:
[運用作業] 品目は灰色でハイライト表示されます。

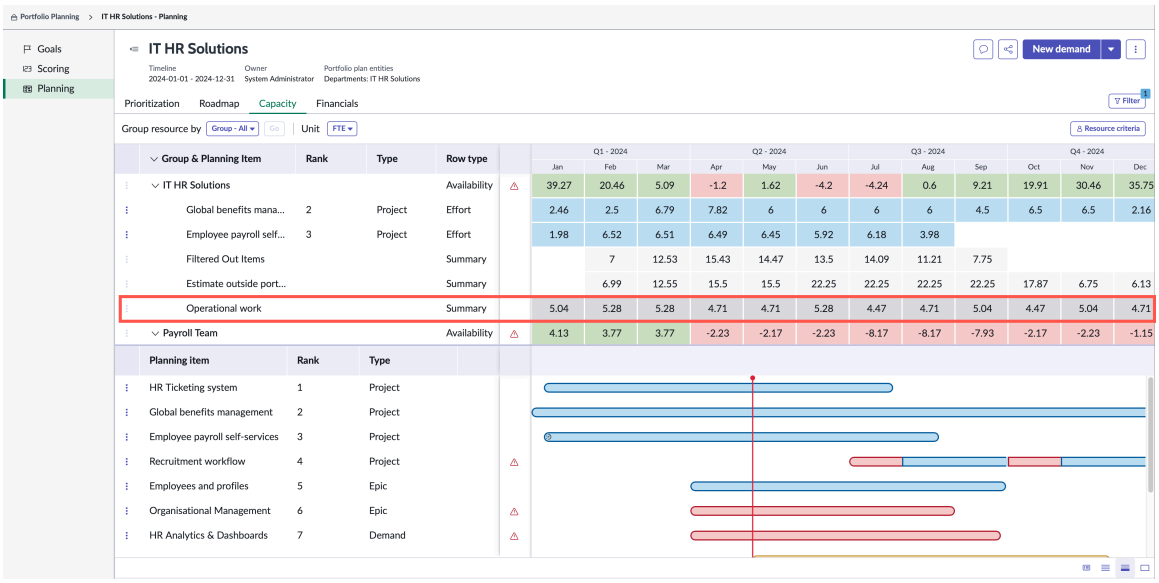

リソースキャパシティを生成

プライマリ属性を持つリソースの総キャパシティを生成して表示します。[キャパシティの詳細] は、ポートフォリオマネージャーがリソースの可用性に応じて計画立案アイテムを計画および管理するのに役立ちます。

始める前に

1. キャパシティ計画立案の計画属性を有効にする詳細については、「キャパシティ計画立案の計画属性を有効にする」を参照してください。
2. リソースの従業員プロファイルを生成する詳細については、「作業するリソースの従業員プロファイルの生成 キャパシティ」を参照してください。

必要なロール：sn_align_ws.spw_capacity_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. [リソースキャパシティ] オプション (

注:
キャパシティ計画立案で計画属性が有効になっていない場合は、空のステータス画面と構成オプションが表示されます。アドミニストレーターに連絡し、キャパシティ計画立案の計画属性を有効にしてもらいます。詳細については、「キャパシティ計画立案の計画属性を有効にする」を参照してください。

3. キャパシティの詳細を表示して再生成するには、次のいずれかのオプションを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
キャパシティ計画立案を使用して 、リソースキャパシティ、リソースから作業へのマッピングを表示し、リソース割り当ての優先順位を再設定して、優先順位付けされた計画立案アイテムを効果的に実行します。

でのキャパシティの使用 戦略的計画ワークスペース

ポートフォリオのリソースキャパシティを表示および分析して、リソースの割り当てを計画および再予測します。


始める前に
[リソースキャパシティを管理] を使用してリソースキャパシティを生成します。

必要なロール：sn_align_ws.spw_capacity_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. ポートフォリオ計画から計画を選択します。
3. 選択 計画 > キャパシティ.
4. リストからプライマリ属性を選択して、リソース基準を定義します。
   [グループ] を選択すると、優先順位付けされた計画立案アイテムのリソースのアサインから利用可能なすべてのグループが [自動選択] オプションに自動的に表示されます。手動選択オプションを使用して、リソースキャパシティを表示する提案を追加または削除できます。


   ヒント:
   リソース 基準 (ボタンを使用して、いつでもリソース基準を再定義および変更して、カスタム結果を表示できます。

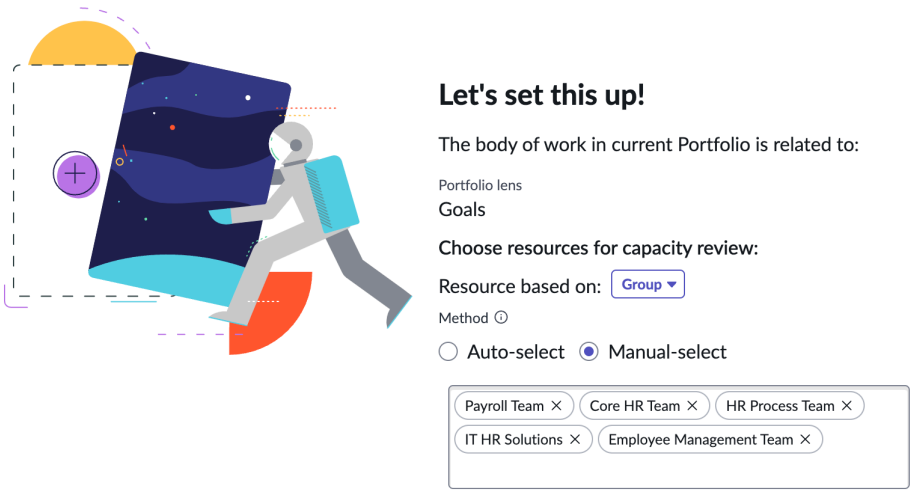

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. **[Submit** (送信)] を選択します。

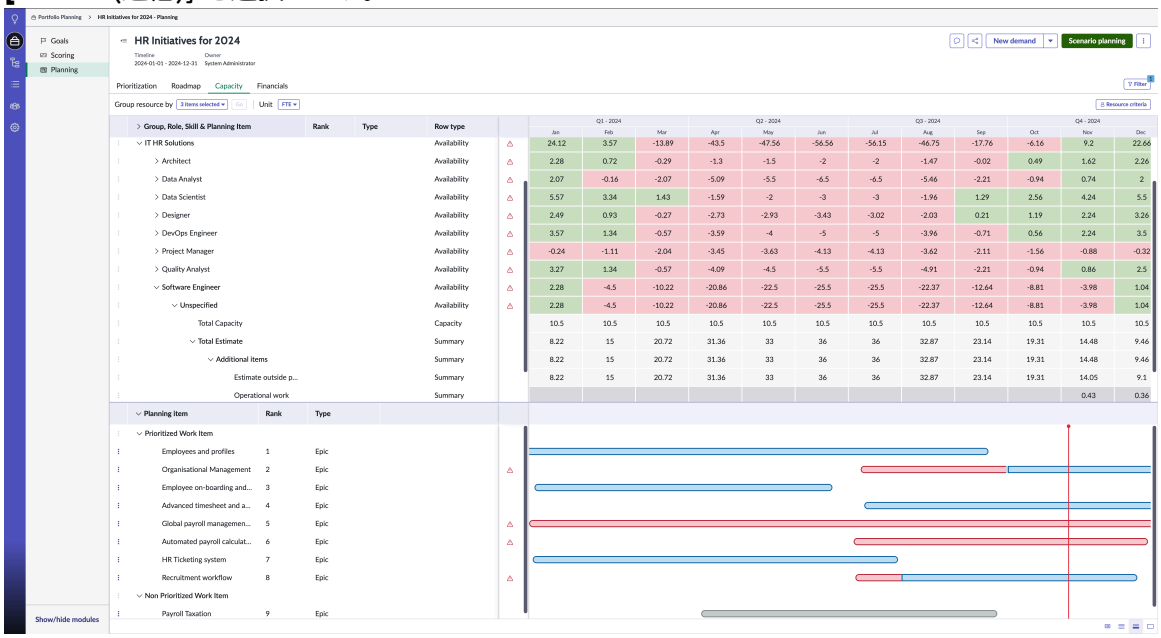

タスクの結果
選択した人員基準のリソースキャパシティ割り当ての [キャパシティ] 画面が表示されます。人員の基準の選択に基づいて、リソースキャパシティはグループ、スキル、およびロールでネストされます。

での計画立案アイテムの財務管理 戦略的計画ワークスペース

予算、予測としてのコスト計画、経費ラインとしての実際の経費を管理し、人件費を算出し、財務ベースラインを作成し、戦略的計画ワークスペースで必要な頻度で計画立案アイテムの財務パフォーマンスを表示、分析、および比較します。

包括的な財務ビューは、選択したアイテムの計画コストと実績コスト、予測 (以前の EAC - EAC - 完了時の推定)、残りの見積もり (以前の ETC - 完了までの推定)、実績 (以前の現在までの実績) などを把握するのに役立ちます。コスト計画を管理し、経費ラインを関連付けて、計画立案アイテムの実績を反映するように処理することができます。


コスト比較ビューまたはベースライン比較ビューから財務データを Microsoft Excel または CSV ファイルとしてエクスポートし、ステークホルダーと共有して計画立案アイテムとポートフォリオの財務実績を確認します。

コストビュー

計画コストを予測し、コスト計画と経費ラインを作成および管理して、計画立案アイテムの財務パフォーマンスを追跡し、最新のコストと実績を確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

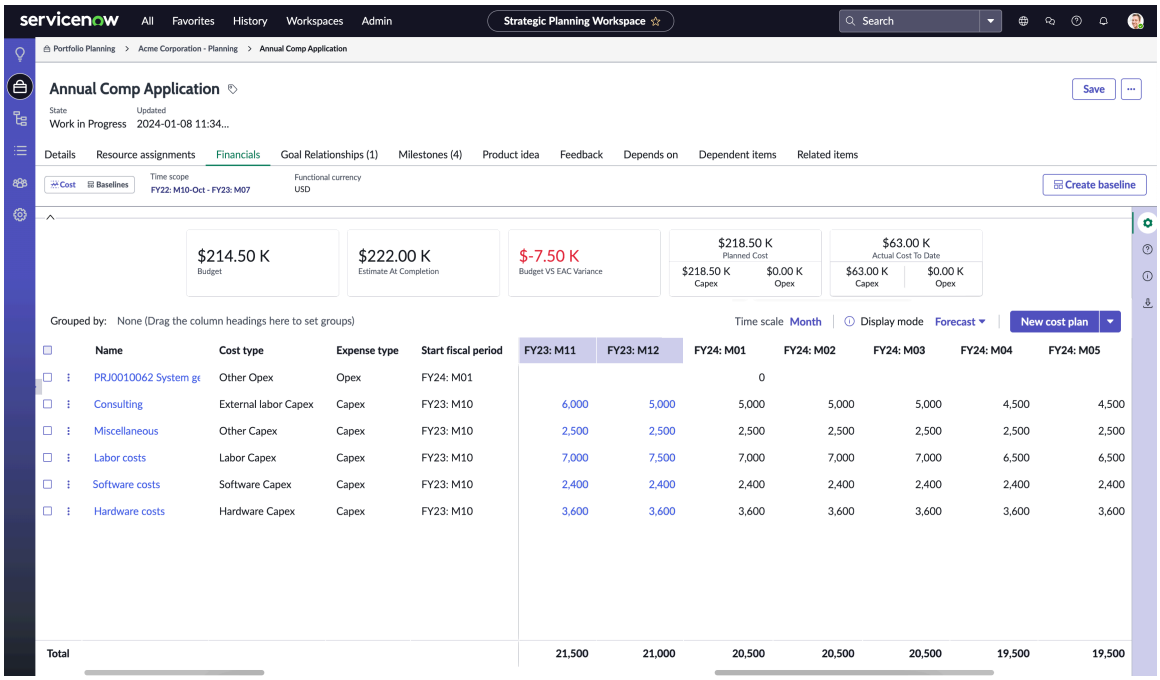

コスト画面では、次のことができます。

- プロジェクトマネージャーは、複数のプロジェクトレベルにわたって財務データの可視性と管理を強化することができます。財務のコストビューには、サブプロジェクトのコスト計画と経費ラインが表示され、財務を追跡できます。
- 親プロジェクトウィジェットには、予測コストと経費の連結値が表示されます。
- 親計画立案アイテムのコストビューから直接、任意のサブプロジェクトまたはデマンドの [プロジェクト/デマンド] 列を使用して、コストを特定して管理します。
- 将来の会計期間のすべてのコスト計画値を再予測するには、ダブルクリックして、最小タイムスケールビューで月別または期間別に値を編集します。
- 計画立案アイテムのコスト計画を管理します。詳細については、「コスト計画の追加、編集、または削除」を参照してください。
- 計画立案アイテムの経費ラインを追加または編集して、予定経費または予定外の経費を記録します。詳細については、「経費ラインの追加または編集」を参照してください。
- リソースのアサインに基づいて人件費を生成します。詳細については、「人件費の生成」を参照してください。
- ベースラインを作成して比較し、計画立案アイテムの財務スナップショットをキャプチャします。詳細については、「計画立案アイテムの財務ベースラインの作成と比較」を参照してください。
- ウィジェットを構成し て、計画立案アイテムの財務データの概要を取得します。
- サブプロジェクトのすべての財務詳細は集計され、親プロジェクトのコスト計画とウィジェットに表示されます。

ヒント:

コストビューでは、カスタマイズアイコン ( ) を使用して左ペインの列をカスタマイズしたり、ユーザー設定を保存して、列の非表示、表示、または調整、時間スコープの表示などに行ったカスタマイズを保持することで、ユーザーエクスペリエンスが強化されます。

表示モード

戦略的計画ワークスペース の計画立案アイテムの財務ページには、さまざまなモード間の表示モードドロップダウンがあり、計画立案アイテムのさまざまな形式の財務情報を表示できます。これらの

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビューは、プロジェクトマネージャーと資金調達ユーザーがファイナンシャルプランで作業する際に役立つ、焦点を絞った関連情報を提供します。

- 予測
- 予算と予測
- 計画と実績
- 計画済み

Financial Funding ロール [sn_align_ws.spw.funding_user] を持つユーザーには、[予算と予測] の代わりに [予算割り当て] オプションが表示されます。

表示モード値

モード	値
予測	計画立案アイテムの全スコープの実績、残りの推定、および予測を表示します。 タイムスケールを使用して、過去の会計期間の実績と、現在および将来の会計期間の計画コストを表示します。
予算と予測	会計期間の予算、実績、差異、および計画立案アイテムの全スコープの予測値を表示します。 このモードを使用すると、次のことができます。 • 最新の予測をさまざまなタイムスケールで承認された予算と比較します。 • 過去の会計期間の予算と実績、および現在および将来の会計期間の予算と計画を会計期間レベルで表示します。
予算の割り当て (資金調達ロール)	会計期間の予算、実績、差異、および計画立案アイテムの全スコープの予測値を表示します。 このモードを使用すると、資金調達ユーザーは次のことができます。 • 最新の予測を表示し、作業アイテムに承認できる予算を入力します。 • 過去の会計期間の差異を分析し、将来の会計期間の予算割り当てを処理します。 • 最新の予測を承認された予算と比較し、必要に応じて予算を修正します。
計画と実績	過去および現在の会計期間の計画コストを実際の経費と比較し、将来の会計期間の計画コストを表示します。
計画済み	インライン編集機能を使用して、全範囲の計画コストのみを表示し、計画コストを管理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- [予算割り当て] または [予算と予測の比較] 表示オプションが表示されない場合は、 予算割り当てプロパティを有効にし 、インスタンスレベルで 予算属性を設定します 。
- ネクストエクスペリエンスを使用して予算割り当てを処理するには、計画立案アイテムの予算を移行するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化。

最後に選択したビューは、ユーザー設定として保存されます。

財務ユーザーのデフォルトの表示モードとアクセスレベル

ユーザーロール	デフォルトモード	ロールレベルのアクセス
sn_align_ws.spw_funding_user	予算の割り当て	予算を割り当てて承認し、コスト計画と経費ラインを管理します。
sn_align_ws.spw_financial_user	予測	コスト計画と経費ラインを管理します。
business_stakeholder	予測	財務データを表示します。

ベースラインビュー

ベースラインを作成して、計画立案アイテムの財務上の変更のスナップショットをキャプチャします。オンデマンドのベースラインを作成することも、スケジューラージョブを使用して周期的に作成することもできます。

注:
親プロジェクトで作成されたベースラインには、すべての子プロジェクトのコスト計画と経費ラインが含まれ、プロジェクトとサブプロジェクトの財務実績のブレークダウンを計算してより正確に把握できます。

親プロジェクトの財務ベースラインを作成すると、子プロジェクトの財務レコードも計算されるため、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの財務健全性を 1 か所で追跡できます。


ベースラインを比較して、最新ステータスとベースライン間、または任意の 2 つのベースライン間のコストの差を比較します。

注:
各ベースラインには作成された順序に基づいて番号のタグが付けられます。現在の財務ベースラインは財務の詳細をリアルタイムでキャプチャし、常にフラグアイコン ( ) で表されます。

ベースライン比較ビューは、2 つのベースライン間の差異を理解するのに役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

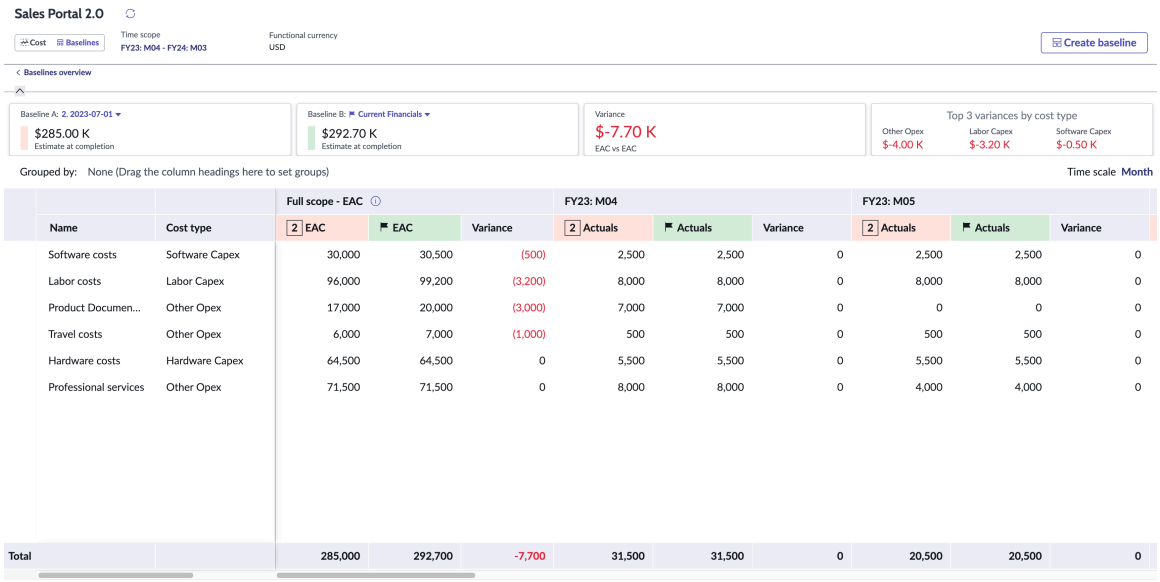

ベースラインを比較する場合は、ウィジェットを使用して以下を表示します。

- 各ベースラインには EAC を表示する 2 つの専用ウィジェットがあります。
- 3 番目のウィジェットには選択したベースラインの EAC 値の間の合計差異が表示されます。
- 4 番目のウィジェットには全体的な差異に寄与する上位 3 つの差異が原価費目別に表示されます。

ウィジェットとヘッダー行は色分けされ、選択したベースラインを識別するのに役立ちます。

ヒント:
いずれかのウィジェットからベースラインの名前を選択して、比較ビューから異なるベースラインを切り替えます。

ベースラインを比較すると、コスト計画とそれに関連する原価費目、フルスコープの EAC、実際の経費と計画コストのブレークダウンビューのリストが表示されます。

デフォルトでは、ブレークダウンビューのタイムスケールは [月] に設定されています。

- [タイムスケール] オプションを使用して、月次、四半期、および年次レベルで比較ブレークダウンビューを表示します。
- 会計期間、ウィジェットのデータ、および比較テーブルをフィルタリングするには、[時間スコープ] を選択します。

ウィジェットとヘッダー行は色分けされ、選択したベースラインを識別するのに役立ちます。

ヒント:
1 番目または 2 番目のウィジェットからベースラインの名前を選択して、さまざまなベースラインを比較します。

2 つのベースライン (ベースライン A：2023-10-01 とベースライン B：現在の財務) の比較ビューの例を見てみましょう。

Example: 異なるタイムスタンプでキャプチャされた **2** つのベースライン間で実績、計画、EAC を比較する方法

作成日に基づいて選択したベースラインについて、テーブルには作成日からの過去の会計期間の実績値と、現在および将来の会計期間の計画値が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2023 年 7 月から 2024 年 6 月までの計画立案アイテムを考えてみましょう。ベースライン A は 2023-10-01 に作成されました。2023 年 12 月の現在の財務ベースラインと 2023 年 10 月に取得したベースラインを比較すると、次のようになります。

1. ベースライン比較ビューには、2023 年 7 月から 2023 年 9 月までの [実績] 対 [実績] の列が表示されます。

			FY23: M07			FY23: M08			FY23: M09		
	Name	Cost type	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance
	Professional services	External labor Capex	3,500	3,500	0	3,500	3,500	0	4,700	4,700	0
	Travel costs	Other Opex	800	800	0	450	450	0	0	6,000	(6,000)
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
	other costs	Other Capex									
	Server costs	Hardware Capex									
Total			18,100	18,100	0	20,750	20,750	0	21,500	27,500	-6,000

2. 2023 年 10 月および 2023 年 11 月の [計画] 対 [実績]。

			FY23: M10			FY23: M11		
	Name	Cost type	2 Planned	Actuals	Variance	2 Planned	Actuals	Variance
	Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)
	Travel costs	Other Opex	450	500	(50)	450	600	(150)
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	3,000	3,500	(500)	3,000	3,000	0
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
	other costs	Other Capex		0	0		0	0
	Server costs	Hardware Capex					1,200	(1,200)
Total			20,250	20,800	-550	20,250	22,600	-2,350

3. 2023 年 12 月から 2024 年 6 月までの [計画] 対 [計画]。

			FY23: M12			FY24: M01			FY24: M02			FY24: M03		
	Name	Cost type	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance
	Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
	Travel costs	Other Opex	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)
	other costs	Other Capex		1,000	(1,000)									
	Server costs	Hardware Capex		1,000	(1,000)									
Total			20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000

注:
列は、前回の会計期間までの実績コストと現在から将来の会計期間の計画コストの合計である EAC を計算するように定義されます。

予算の割り当て

ポートフォリオマネージャーは、計画立案アイテムの予算を管理および承認できます。承認された予算は、プロジェクトマネージャーが作業を実行するための経費を計画して充足するのに役立ちます。

無駄のない予算業務と資金調達の実現可能性を利用して、月次、四半期ごと、または年次のレベルで、より短い計画サイクルの予算を計画および承認します。無駄のない予算業務は、ポートフォリオマネージャーが承認された予算のリターン価値を追跡し、将来の会計期間の予算をより適切に計画するのに役立ちます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
予算が毎月割り当てられる場合、予算合計は四半期および年次レベルにロールアップされます。同様に、予算が四半期または年次レベルで割り当てられる場合は、月次レベルまで均等にブレークダウンされます。

計画立案アイテムの予算を割り当て、承認、および処理する方法の詳細については、「戦略的計画での計画立案アイテムの予算管理」を参照してください。

ヒント:
予算割り当てビューでは、ポートフォリオマネージャーは EAC を確認して、プロジェクトマネージャーが行った財務予測を理解し、[コストを予算としてコピー] オプションを使用して、計画コスト全体を予算として割り当てます。

原価費目を属性として選択し、人件費、非労務などの個々の原価費目の予算を割り当てて承認します。

プロジェクトマネージャーは、表示モードの [予算と予測] オプションを使用して、承認された予算を必要なタイムスケールで表示できます。作業が進行し、実績がキャプチャされると、予算と予測のモードを使用して予算と実績コストを比較し、必要なタイムスケールでインライン編集機能を使用して実績が予算を超えている計画コストを再予測できます。

プロダクトマネージャーは、投資または経費別、原価費目別、および月次、四半期、または年次レベルの必要なタイムスケールで、最新のコストを承認された予算と比較できます。比較ビューは、経費タイプまたは原価費目におけるあらゆる差異を特定し、どの会計期間で発生したものであるかを把握できるよう、プロダクトマネージャーにインサイトを提供します。プロダクトマネージャーは、この情報を活用して、ポートフォリオマネージャーに追加の予算を要求できます。

既存のアクティブなプロジェクトとデマンドの予算を、クラシック UI から ネクストエクスペリエンス に移行できます。ネクストエクスペリエンス の財務には、月次ブレークダウンと原価費目別に詳細なレベルで予算を保存するための新しい予算データモデルがあります。アクティブなプロジェクトとデマンドの予算は、個別に移行することも、スケジュール済みジョブを使用して一括で移行することもできます。

- アクティブなプロジェクトの予算をクラシック UI から ネクストエクスペリエンス に移行します。詳細については、「ネクストエクスペリエンスへのアクティブなプロジェクトの予算の移行」を参照してください。
- アクティブなデマンドの予算をクラシック UI から ネクストエクスペリエンス に移行します。詳細については、「ネクストエクスペリエンスへのアクティブなデマンドの予算の移行」を参照してください。

注:
移行された予算は sn_invst_pln_invst_budget テーブルにキャプチャされ、必要な時間スコープに対して無駄のない予算業務を有効にします。

利益計画


金銭的利益計画は、計画立案アイテムの実行中に発生する潜在的な利益をキャプチャします。金銭以外の利益計画は、計画立案アイテムの実行中に発生した潜在的な非財務的利益をキャプチャします。金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの潜在的な利益をキャプチャできます。

簡単な財務

簡単な財務では、コストビューからコスト計画をキャプチャしなくても、詳細ページから概要レベルの投資、経費、利益などの計画を入力できます。簡単な財務の値は、計画コストと実績コストがキャプチャされるまで必要に応じて更新できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

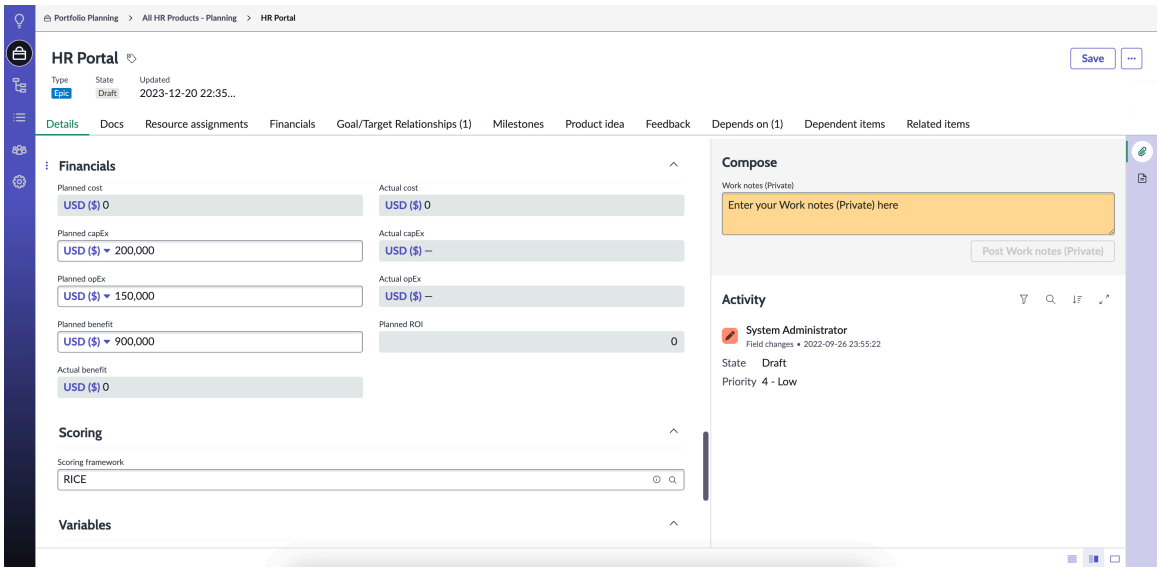

ベースライン機能を使用すると、ここにあるような簡単な財務の値をベースラインでキャプチャし、既存のベースラインと比較できます。以下のことを行うことができます。

- 簡単な財務を再予測し、ベースラインのリストから現在の財務を選択して比較します。
- プロジェクトの進行に合わせて計画経費と実際の経費をキャプチャし、財務ベースラインを簡単な財務ベースラインと比較して、計画立案アイテムの財務実績を追跡します。

コスト計画の追加、編集、または削除

必要な期間のコスト計画を作成して、予定経費と実際の経費を追跡します。コスト計画を編集して予定経費を調整し、スコープ対象外の予測を削除します。

始める前に

必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[ポートフォリオ計画] を選択します。
2. 計画立案モジュールから計画立案アイテムを選択します。
3. **[Financials** (財務)] タブをクリックします。

> **ヒント:**
> 初期計画コストをキャプチャした直後に財務ベースラインを作成して、計画コストのスナップショットを作成します。このベースラインを使用して、作業の進捗に応じて、後でベースラインと比較し、初期計画コストと実際の経費の差異を特定します。

これは、将来の経費を計画し、計画コストを再予測するのに役立ちます。

人件費の生成

[計画立案属性] ページで構成された財務属性に基づいて、属性ベースのリソースのアサインに対する [財務] ビューに人件費を生成します。

始める前に

必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[ポートフォリオ計画] を選択します。
2. 計画立案モジュールから計画立案アイテムを選択します。
3. **[Financials** (財務)] タブをクリックします。
4. [人件費の生成] (

) を選択します。
5. [人件費を生成] 確認ウィンドウで [生成] を選択します。

> 注:
> または、スケジュール済みジョブをアクティブ化して、必要な頻度でベースラインを自動的に作成することもできます。

戦略的計画での計画立案アイテムの予算管理

計画立案アイテムの予算を割り当て、管理、および承認します。無駄のない予算業務により、計画立案アイテムの全期間に予算を割り当てるのではなく、月次、四半期、年次のブレークダウンレベルなど、さまざまな会計期間の短い計画サイクルに予算を割り当てることができます。

始める前に

- 管理者は、予算業務で機能するようにプロパティを有効にします。詳細については、「戦略的計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化」を参照してください。
- 管理者は、原価費目別または経費タイプ別に予算を割り当てて承認する属性を設定します。詳細については、「予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する」を参照してください。
- 必要なロール：it_portfolio_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[ポートフォリオ計画] を選択します。
2. 計画立案モジュールから計画立案アイテムを選択します。
3. **[Financials** (財務)] タブをクリックします。
4. [予算の割り当て] トグルを有効にします (

)。
5. 月次、四半期、または年次レベルで選択したタイムスケールに対して、次のいずれかの方法で予算を管理できます。
   - [予算] 列の各セルをダブルクリックして、値を手動で入力します。
   - [予算] 列のオプションから [コストを予算としてコピー] を選択して、EAC を予算としてコピーします。

   EAC が予算としてコピーされた場合でも、グリッド内編集機能を使用して、各原価費目の予算をいつでも再予測できます。

   > 注:
   > 未承認の予算値は、 アイコンで示されます。

6. [予算の承認 **]** (

) を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

予算の承認の確認ウィンドウが表示されます。[この予算承認の財務ベースラインを作成します **(Create a financial baseline for this budget approval)]** オプションはデフォルトで有効になっており、最新の予算と財務見積もりがキャプチャされます。

> **ヒント:**
> 予算の承認中に作成された財務ベースラインは、実際の経費がキャプチャされた後に将来のベースラインと比較して、財務パフォーマンスを追跡できます。

7. 確認ウィンドウで、[承認] (Approve) を選択します。

タスクの結果

予算ウィジェットが更新され、最新の承認済み予算が反映されます。プロジェクトマネージャーは、原価費目別の [予算とコスト **(Budget vs cost)]** ビューを使用して、承認済み予算を表示し、それを計画コストと比較できます。

経費ラインの追加または編集

実績コストをキャプチャする経費ラインを作成または編集します。経費ラインをコスト計画に関連付けるか、スタンドアロンの経費ラインを作成して予定外の経費を記録できます。

始める前に

必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

このタスクについて

経費ラインは、特定のソースに関連付けることができるプロジェクトコスト計画の一部です。コスト計画に対して複数の経費ラインを作成できます。処理済みステータスの経費ラインのみが作業アイテムのロールアップに含まれます。
どのコスト計画にも関連付けられていない予定外の経費ラインについては、自動的にコスト計画が作成されるか、同じ経費タイプの既存のシステム生成コスト計画に関連付けられます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[ポートフォリオ計画] を選択します。

2. 計画立案モジュールから計画立案アイテムを選択します。

3. **[Financials** (財務)] タブをクリックします。

4. 次のいずれかのオプションを使用して、経費ラインを追加します。

5. [経費ラインを作成 (Create expense line)] フォームのフィールドに入力します。
フィールド名の説明については、「[経費ラインを作成] フォーム」を参照してください。

6. **[Save** (保存)] を選択します。

> **注:**
> サブプロジェクトに対して作成された経費ラインは、親プロジェクトの [コスト] 画面で表示できます。

計画立案アイテムの財務ベースラインの作成と比較

財務ベースラインを作成して比較し、プロジェクト経費のスナップショットを取得して、計画コストを実際の経費と比較します。

始める前に

必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[ポートフォリオ計画] を選択します。
2. 計画立案モジュールから計画立案アイテムを選択します。
3. **[Financials** (財務)] タブをクリックします。
4. ベースラインを作成または比較します。

> ヒント:
> プロジェクトまたはデマンドの既存の財務ベースラインをクラシック UI からネクストエクスペリエンスの財務に移行できます。

デマンドの財務ベースラインを移行する方法の詳細については、「デマンドの財務ベースラインをネクストエクスペリエンス に移行する」を参照してください。

プロジェクトの財務ベースラインを移行する方法の詳細については、「プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行する」を参照してください。

での計画立案アイテムの金銭的利益計画の管理 戦略的計画


金銭的利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの実行中に潜在的な利益をキャプチャします。

始める前に

- 計画立案アイテムの金銭的および金銭以外の利益計画の有効化
- 必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[ポートフォリオ計画] を選択します。
2. 計画立案モジュールから計画立案アイテムを選択します。
3. [金銭的な利益計画] 関連リストを選択します。

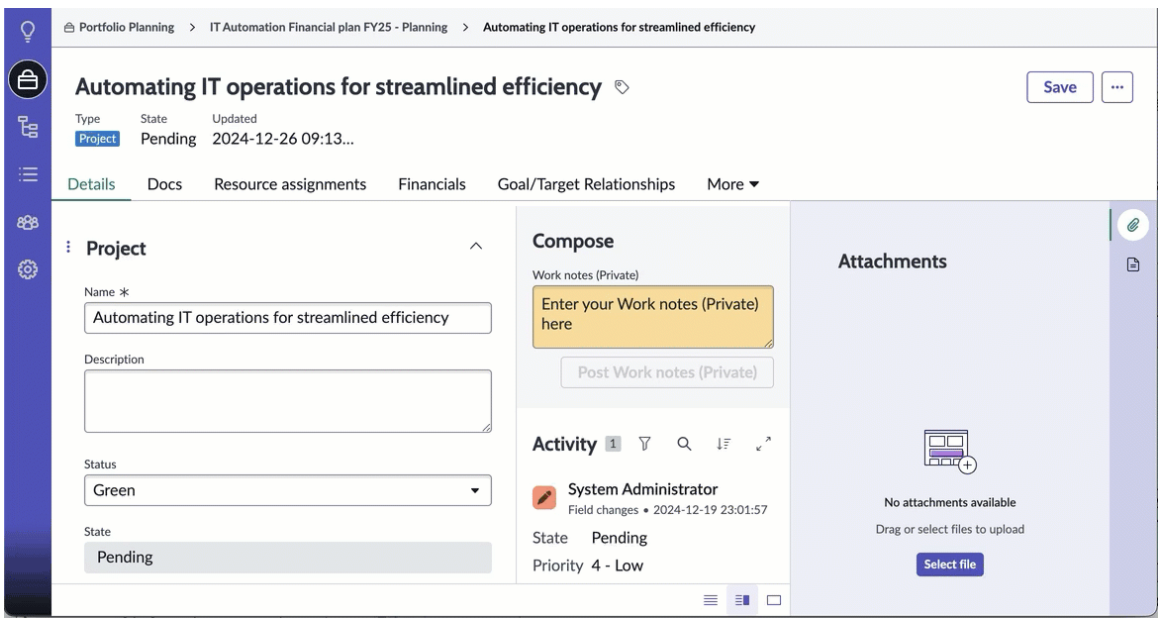

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 利益計画フォームの各フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[利益計画] フォーム」を参照してください。
5. [保存] を選択します。

での計画立案アイテムの金銭以外の利益計画の管理 戦略的計画


金銭的利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの実行中に潜在的な利益をキャプチャします。

始める前に

- 計画立案アイテムの金銭的および金銭以外の利益計画の有効化
- 必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[ポートフォリオ計画] を選択します。
2. 計画立案モジュールから計画立案アイテムを選択します。
3. [金銭以外の利益計画] 関連リストを選択します。

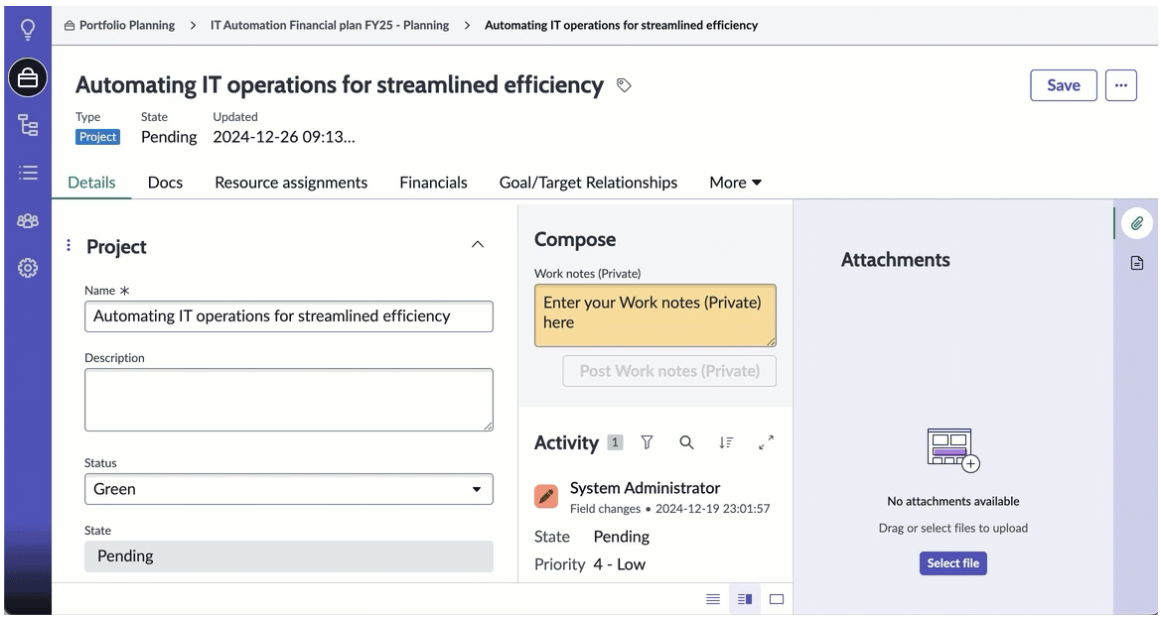

4. 利益計画フォームの各フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「金銭以外の利益計画フォーム」を参照してください。
5. [保存] を選択します。

財務を **Excel** または **CSV** ファイルとしてエクスポート

計画立案アイテムのコストまたはベースライン比較データをエクスポートして、ステークホルダーと簡単に共有できます。

始める前に

必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[ポートフォリオ計画] を選択します。
2. 計画立案モジュールから計画立案アイテムを選択します。
3. **[Financials** (財務)] タブをクリックします。
4. [エクスポート] オプション ( ) を選択します。
5. [エクスポート] サイドパネルで、[ファイルタイプ] リストから **[Excel]** または **[CSV]** を選択し、[エクスポート] ボタン () を選択します。

財務データは、name_fin_mmddyy の命名規則に従って Excel ファイルまたは CSV ファイルとしてダウンロードされます。命名規則の詳細は次のとおりです。

a. name：計画立案アイテムの名前から最初の 10 文字を取得します。

b. fin：ファイルに財務データがあることを示します。

c. mmddyy：このデータをエクスポートするときのシステムの日付形式です。
たとえば、2024 年 1 月 26 日に「Documentation」という名前の計画立案アイテムの財務データをダウンロードする場合、ファイル名は documentat_fin_012624 になります。

> **注:**
> 財務データは、コストビューとベースライン比較ビューからエクスポートできます。

でのポートフォリオ財務の管理 戦略的計画ワークスペース

ポートフォリオ財務の推定、承認済みコスト、利益、実績などの財務ブレークダウンを表示します。

ポートフォリオユーザーは、トップレベルのデマンド、プロジェクト、およびエピックのロールアップされた財務値を表示できます。

コストは、経費タイプ別または原価費目別に表示できます。ポートフォリオレベルの財務ビューを使用すると、予算 (計画立案アイテムの承認済み予算)、予測、差異 (承認済み予算と最新の予測の差)、実績、および各計画立案アイテムの投資、経費、合計、および利益の残りの推定など、さまざまな財務フィールドを表示できます。この情報を使用して、計画立案アイテムの財務ステータスを追跡し、次の計画サイクルで作業する際に考慮すべき計画立案アイテムについて十分な情報に基づいた意思決定を行い、支出超過を回避するために追跡することができます。

ポートフォリオ財務を使用すると、ポートフォリオマネージャーは次のことができます。

- 計画立案アイテムの財務実績とステータスを追跡します。
- 次のポートフォリオサイクルの計画と優先順位付けを行いながら、計画立案アイテムのコストと利益の概算を分析することで、情報に基づいた意思決定に到達します。
- 予算属性構成に応じて、経費タイプまたは原価費目に基づいて財務を表示します。
- 承認された予算を最新の予測および実績と比較することで、計画立案アイテムへの過剰な支出を回避します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:
新規および既存の顧客は、ポートフォリオレベルで計画立案アイテムの財務を表示するようにポートフォリオ財務を構成する必要があります。詳細については、「でのポートフォリオ財務の構成 戦略的計画」を参照してください。


ポートフォリオ財務ビューは、会計カレンダータイプが構成されたデマンド、エピック、およびプロジェクトのみをサポートします。

予算属性として経費タイプを含む予算ステータス別にグループ化されたポートフォリオ財務

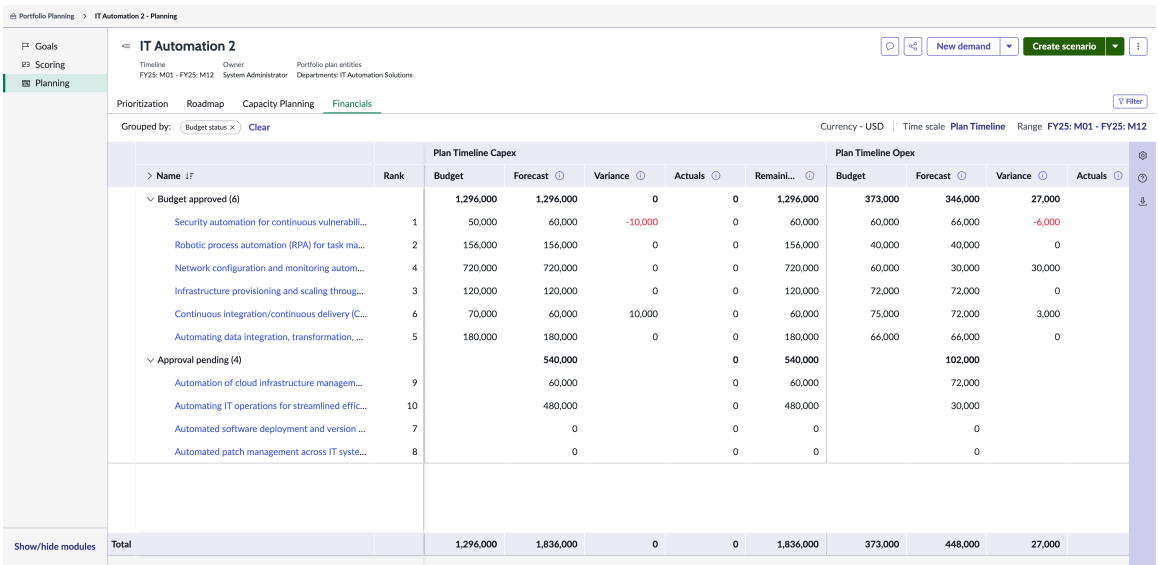

Name	Rank	Plan Timeline Capex Budget	Forecast	Variance	Actuals	Remaini...	Plan Timeline Opex Budget	Forecast	Variance	Actuals
Budget approved (6)		1,296,000	1,296,000	0	0	1,296,000	373,000	346,000	27,000	
Security automation for continuous vulnerabili...	1	50,000	60,000	-10,000	0	60,000	60,000	66,000	-6,000	
Robotic process automation (RPA) for task ma...	2	156,000	156,000	0	0	156,000	40,000	40,000	0	
Network configuration and monitoring autom...	4	720,000	720,000	0	0	720,000	60,000	30,000	30,000	
Infrastructure provisioning and scaling throug...	3	120,000	120,000	0	0	120,000	72,000	72,000	0	
Continuous integration/continuous delivery (C...	6	70,000	60,000	10,000	0	60,000	75,000	72,000	3,000	
Automating data integration, transformation, ...	5	180,000	180,000	0	0	180,000	66,000	66,000	0	
Approval pending (4)			540,000		0	540,000		102,000		
Automation of cloud infrastructure managem...	9		60,000		0	60,000		72,000		
Automating IT operations for streamlined effic...	10		480,000		0	480,000		30,000		
Automated software deployment and version ...	7		0		0	0		0		
Automated patch management across IT syste...	8		0		0	0		0		
Total		1,296,000	1,836,000	0	0	1,836,000	373,000	448,000	27,000	

予算属性として原価費目のタイプを持つ計画ステータス別にグループ化されたポートフォリオ財務

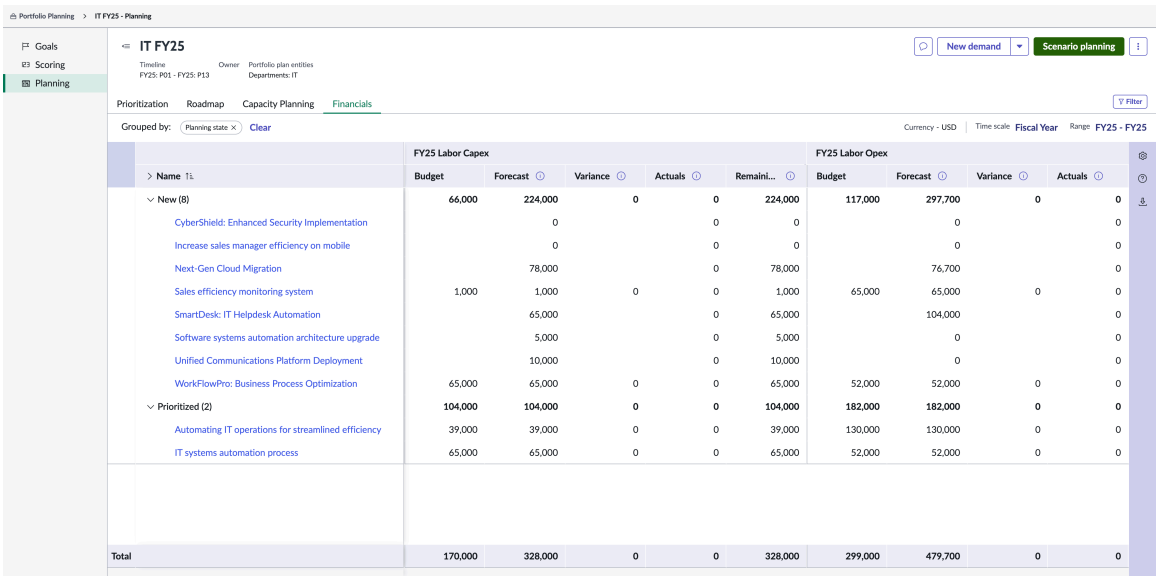

Name	FY25 Labor Capex Budget	Forecast	Variance	Actuals	Remaini...	FY25 Labor Opex Budget	Forecast	Variance	Actuals
New (8)	66,000	224,000	0	0	224,000	117,000	297,700	0	0
CyberShield: Enhanced Security Implementation		0		0	0		0		0
Increase sales manager efficiency on mobile		0		0	0		0		0
Next-Gen Cloud Migration		78,000		0	78,000		76,700		0
Sales efficiency monitoring system	1,000	1,000	0	0	1,000	65,000	65,000	0	0
SmartDesk: IT Helpdesk Automation		65,000		0	65,000		104,000		0
Software systems automation architecture upgrade		5,000		0	5,000		0		0
Unified Communications Platform Deployment		10,000		0	10,000		0		0
WorkFlowPro: Business Process Optimization	65,000	65,000	0	0	65,000	52,000	52,000	0	0
Prioritized (2)	104,000	104,000	0	0	104,000	182,000	182,000	0	0
Automating IT operations for streamlined efficiency	39,000	39,000	0	0	39,000	130,000	130,000	0	0
IT systems automation process	65,000	65,000	0	0	65,000	52,000	52,000	0	0
Total	170,000	328,000	0	0	328,000	299,000	479,700	0	0

注:
グループヘッダー行には、グループ内のすべての計画立案アイテムの予算、予測、差異、実績、および推定残額のロールアップ値が表示されます。

ポートフォリオ財務のデフォルトビューは、予算承認ステータス別にグループ化された計画立案アイテムを表示するように設定されています。[予算承認済み] グループ化では、予算が割り当てられ承認済みの計画立案アイテムが一覧表示されます。承認待ちグループ化では、予算がない計画立案アイテム、または要求された予算が承認されない場合に、計画立案アイテムが一覧表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ポートフォリオ財務ビューは、まだ 投資枠管理と互換性がありません。このビューには、アプリケーションから計画立案アイテムに割り当てられた適切な予算値が 投資枠管理 表示されない場合があります。これは将来の機能拡張として追加される予定です。

左側のグリッドには、計画立案アイテムの全期間における名前、ランク、計画立案ステータス、計画立案アイテムタイプ、承認された開始日、計画コストの合計、合計実績コスト、計画利益の合計、ROI などの計画立案アイテムの詳細。

右側のグリッドで、ポートフォリオタイムラインの投資、経費、合計、および利益ポートフォリオの予算、予測、差異、実績、および残りの推定などの計画立案アイテムの財務属性、または年、四半期、月、または期間別のブレークダウン。


ヒント:
左側のグリッドから計画立案アイテムの名前を選択して、その計画立案アイテムの財務レコードページに直接アクセスできます。

[エクスポート] オプション (を使用して、ポートフォリオ財務の詳細を Excel または CSV にエクスポートできます。

財務ビューのカスタマイズ

ポートフォリオ財務をカスタマイズして、必須パラメーターを表示およびアクセスすると、ポートフォリオと計画立案アイテムをより適切に計画できるようになります。

- タイムスケールと範囲を定義すると、月次、四半期、および年次ビューで財務をより詳細に把握できます。タイムスケールを使用して会計期間を選択し、タイムスケール内の範囲をフィルタリングして、特定の月、四半期、または年の財務を表示します。

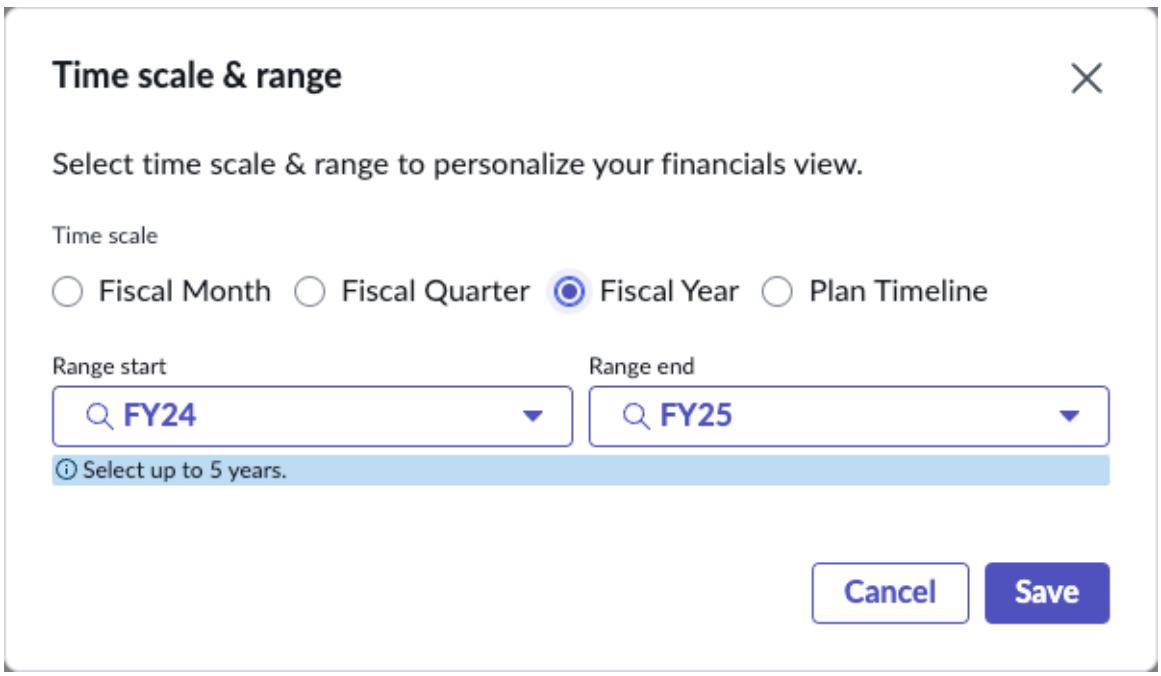

タイムスケールと範囲のパラメーター

タイムスケール	説明と範囲
会計月	月次ブレークダウン別のポートフォリオ財務ビュー。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムスケール	説明と範囲
	最大 12 か月を選択できます。
会計四半期	四半期ごとのブレークダウン別のポートフォリオ財務ビュー。 最大 4 つの四半期を選択できます。
会計年度	ポートフォリオ財務ビューの年次ブレークダウン別。 最大 5 年の期間を選択できます。
タイムラインを計画	ポートフォリオタイムライン全体のポートフォリオ財務ブレークダウン。

- グリッドのグループ化と列をカスタマイズします。

  [カスタマイズ] オプション ( ) を使用して右側のグリッドの列とグループを構成し、カスタムビューを構築します。



  たとえば、予算と実績のブレークダウンを比較する場合は、これら 2 つのオプションのみを選択して、設定を適用します。カスタマイズ設定の 左グリッド リストから必要な列を選択して、左グリッドをカスタマイズすることもできます。

- 計画立案アイテムをグループ化します。

  デフォルトでは、財務ビューは 予算ステータス 列でグループ化されます。[グループ化] 行から予算ステータスのグループ化を削除し、必要なヘッダーをドラッグアンドドロップしてこのビューを変更できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

での計画立案アイテムのドキュメント 戦略的計画

戦略的計画ワークスペースの一元的な場所から、計画立案アイテムに関するあらゆる種類のドキュメントを保存および管理します。

ドキュメントの概要

製品マネージャーとポートフォリオマネージャーは、ドキュメント機能を使用して計画立案アイテムの情報を保存できます。

- 各計画立案アイテムには、関連する情報をキャプチャするための個別のドキュメントページを含めることができます。

  たとえば、エピック計画立案アイテムの場合、高レベルの事業達成目標や技術的な製品要件のドキュメントページを作成します。

- 各計画立案アイテムには複数のドキュメントページを関連付けることができ、重要なアーティファクトを効果的に整理できます。
- プロジェクト概要、製品要件、ブレーンストーミングのアイデア、会議メモなどの事前定義されたテンプレートが利用可能です。これらのテンプレートのいずれかを使用して計画立案アイテムのドキュメントページを作成するか、空白のページから開始します。

ドキュメントの機能

ドキュメントの主な機能は次のとおりです。

- コンテンツを自動保存します。
- ライブユーザープレゼンスの機能を使用して、ドキュメントページを閲覧または作業しているユーザーを確認します。
- 事前定義されたテンプレートを使用してドキュメントを作成します。
- 見出し、リスト、配置などを含むリッチテキスト段落の書式設定を使用します。
- ブロックレベルの編集を使用して、テキストブロックを移動して配置を変更します。
- **/** コマンドを使用して、チームメンバーをインラインでタグ付けしたりテーブルを挿入したりします。
- 他の ServiceNow AI Platform テーブルへの参照を追加して、チーム間で作業を接続します。
- ファイルをアップロードするか Web URL を使用して、画像を挿入します。

  注:
  Google イメージリンクを挿入するエクスペリエンスが機能しない場合があります。


を使用したドキュメントコンテンツの要約 **SPM** の **Now Assist**

Now Assist機能を使用して、ドキュメントで選択したコンテンツを詳細化、短縮、要約したり、ドキュメント全体の概要を取得したりできます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 選択したテキストを要約、詳細化、または短縮します。



- ページ上のコンテンツ全体を要約します。

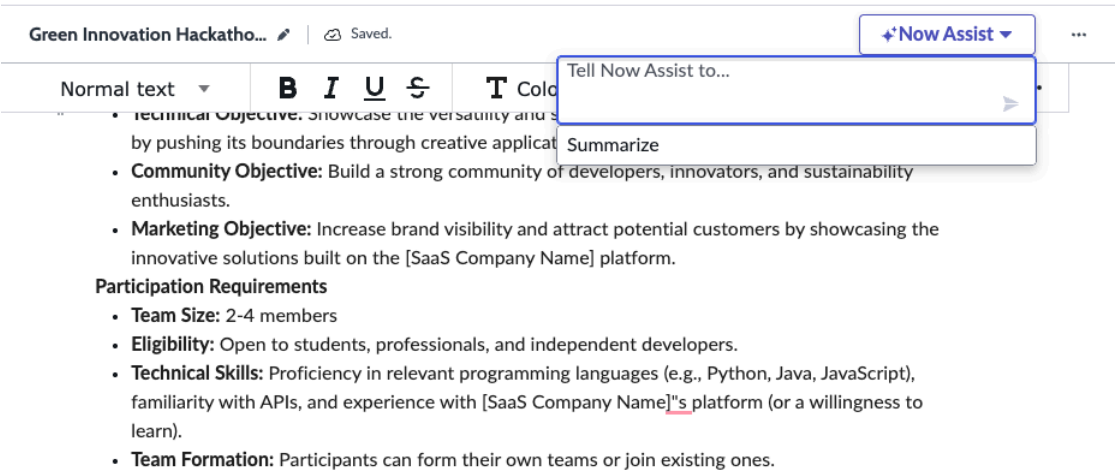

注:


- ドキュメント向け Now Assist には SPM Pro + ライセンスが必要です。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。
- 要約するコンテンツが他にもある場合は、一部のコンテンツを削除して再試行できます。
- これらのフィールドの情報は AI によって生成されるため、テキストを確認して正確であることを確認することをお勧めします。

計画立案アイテムドキュメント内でのリアルタイムコラボレーション

リアルタイムコラボレーションの機能を使用して、ドキュメントページを他の複数のエディターと同時に編集します。色付きのカーソルは、ページ上の各エディターの現在の位置を示します。ページのコンテンツを作業中または確認中の好みに基づいて、これらのライブプレゼンスインジケーターを表示するか非表示にするかを選択できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

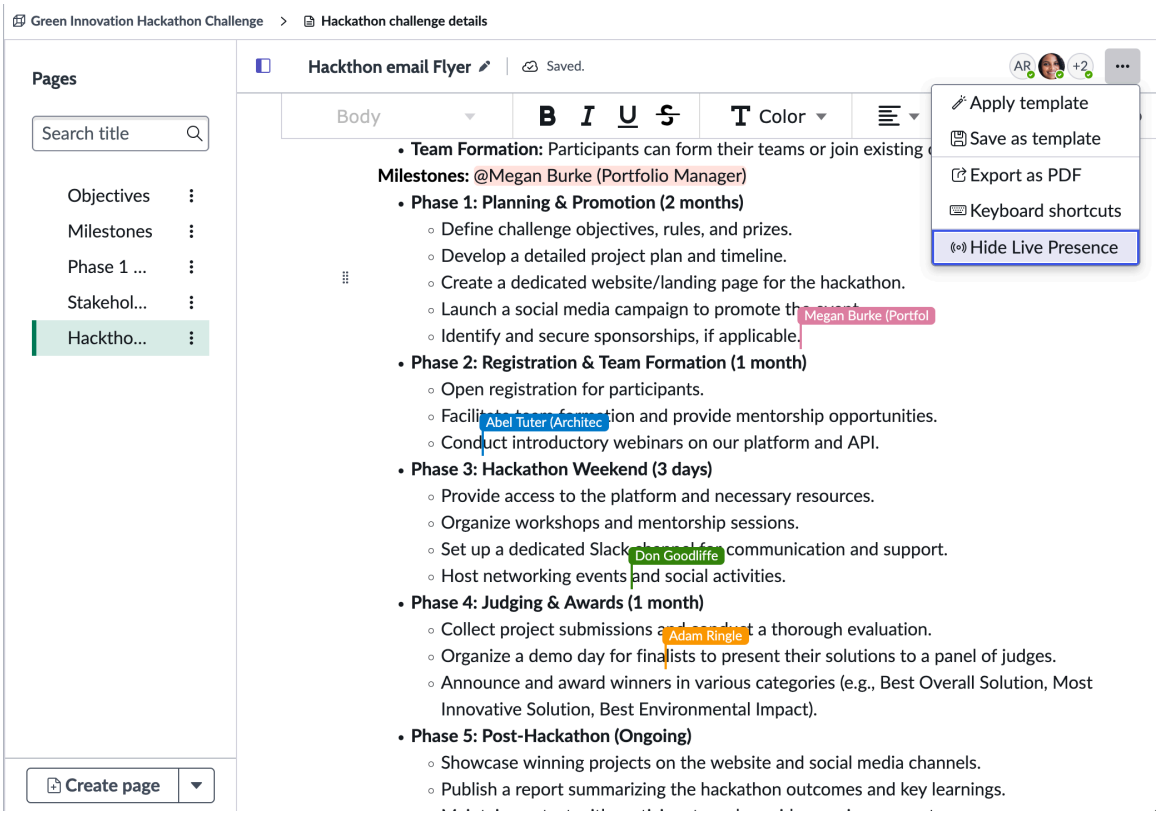

注:
膨大な数のユーザーが同じコンテンツブロックを同時に編集すると、アプリケーションのパフォーマンスに問題が発生する可能性があります。

計画立案アイテムのページとサブページの作成と管理

戦略的計画ワークスペースでページとサブページを作成、複製、削除することで、計画立案アイテムの情報を柔軟に整理します。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user


手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [優先順位付け] または [ロードマップ] ページから、ドキュメントページを作成する計画立案アイテムを選択します。
   [ロードマップ] ページから計画立案アイテムを選択した場合は、アイテムのサイドパネルの [詳細] タブから [完全な詳細] を選択します。
4. 計画立案アイテムのレコードページから、[ドキュメント] を選択します。
5. ページを作成するには、空白のページを作成するか、事前定義されたテンプレートから開始します。
   - 空白のページの場合は、[ページの作成] を選択します。
   - テンプレートから作成するには：


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [テンプレートからページを作成] を選択します。




b. テンプレートセンターからテンプレートを選択し、[ページの作成] を選択します。

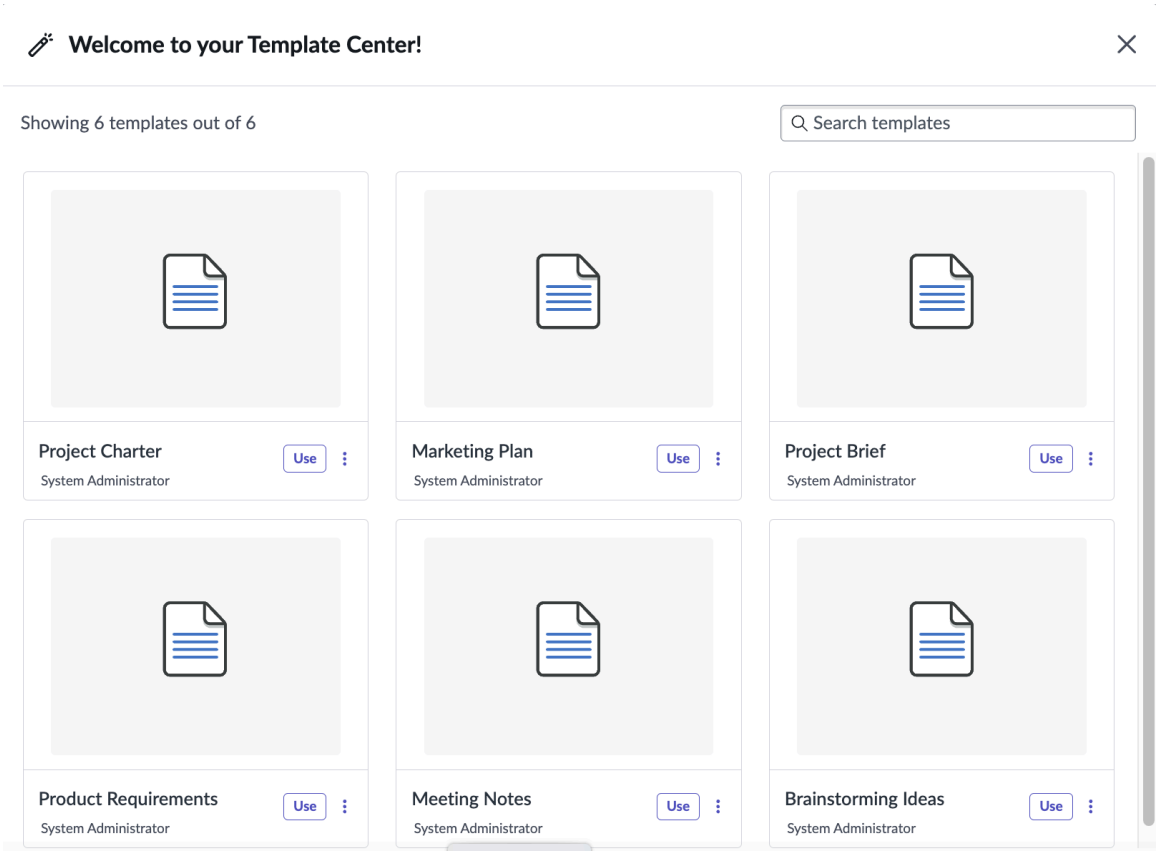

新しいページが作成され、「無題」という名前でドキュメントに追加されますが、名前は変更できます。

6. サブページを作成するには、「 ページ・アクション 」メニュー(⋮ を選択し、「 サブページの作成」を選択します。



7. ページまたはサブページを削除するには、[ページアクション] メニュー (⋮) を選択し、[削除] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

でのポートフォリオ計画ビューの管理 戦略的計画ワークスペース

ポートフォリオマネージャーは、列の選択、グループ化、フィルタリングなどのパーソナライズ設定を適用して、ポートフォリオ計画のカスタマイズされたビューを作成できます。ポートフォリオオーナーまたはエディターは、これらのパーソナライズされたビューをステークホルダーと共有して、ポートフォリオ計画でのコラボレーションを容易にすることができます。

ポートフォリオ計画ビューのメリット

ポートフォリオマネージャーは、列の選択、グループ化、フィルタリングなどの設定を適用して、必要に応じてカスタマイズされたビューを作成できます。

- ビューは、プライベートまたはパブリックとして作成できます。
- 最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを作成できます。
- ポートフォリオ計画ビューをステークホルダーと共有して、ポートフォリオ計画でのコラボレーションを有効にすることができます。
- 必要に応じて、共有ビューとプライベートビューを切り替えます。
- 各ビューでは、[優先順位付け]、[ロードマップ]、[キャパシティ]、および [財務] タブの表示設定が保存されます。

注:
ビューは計画立案モジュールでのみ使用でき、ライブモードでサポートされますが、シナリオモードではサポートされません。

ポートフォリオ計画ビューの作成

要件に基づいてカスタマイズされたポートフォリオ計画ビューを作成し、再度ログインしたときにアクセスしてステークホルダーと共有してコラボレーションできるようにします。

始める前に
必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて
ポートフォリオ計画ごとに、最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを作成できます。


手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. 必要に応じてビューに変更を加えます。
   たとえば、 **Department** 属性と値を **Finance** としてフィルターを適用します。

   [新規ビューとして保存] オプションがポートフォリオ計画ヘッダーに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

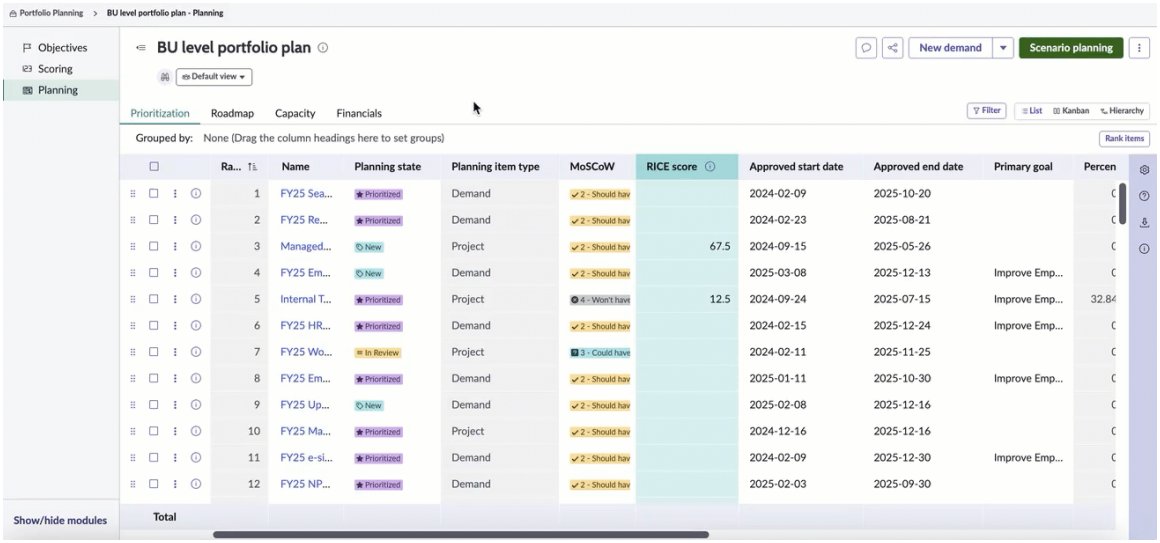

4. ポートフォリオ計画ヘッダーから、[新規ビューとして保存] を選択します。
5. [新規ビューとして保存] ウィンドウで、詳細を入力します。

   a. [ビュー名] フィールドにビューの名前を入力します。

   b. オプション: [共有ビュー] トグルを選択して、このビューを公開します。
   [共有ビュー] トグルを選択すると、このポートフォリオ計画を共有しているすべてのステークホルダーにビューが表示されます。

   c. **[Save** (保存)] を選択します。

タスクの結果
ポートフォリオ計画の共有ビューが作成され、このポートフォリオ計画を共有しているすべてのステークホルダーに表示されます。

次のタスク
- ポートフォリオ計画をステークホルダーと共有して、ポートフォリオ計画でのコラボレーションを開始します。「ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する」を参照してください。
- ポートフォリオ計画ビューを編集して、既存のビューに変更を加えます。「ポートフォリオ計画ビューの編集」を参照してください。

ポートフォリオ計画ビューの編集

要件に基づいてカスタマイズされたポートフォリオ計画ビューを編集して、再度ログインしたときにアクセスして、コラボレーションのためにステークホルダーと共有できるようにします。

始める前に
必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて
- 共有 (公開) ビューを編集できるのは、ポートフォリオ計画ビューの所有者のみです。
- ポートフォリオ計画ごとに、最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを設定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. ポートフォリオ計画ヘッダーから、編集するか、使用可能なポートフォリオ計画ビューのリストからカスタマイズ設定で上書きするビューを選択します。
   選択したビューが表示されます。
4. 必要に応じてビューを変更します。
   たとえば、 **Department** 属性と値を **Finance** としてフィルターを適用します。

   ビューに変更を加えると、[ビューを保存] オプションがポートフォリオ計画ヘッダーに表示されます。
5. [ビューの保存] を選択します。
   ビューが更新され、加えられた変更が反映されます。
6. オプション: ビューの名前を編集するには、ポートフォリオ計画ヘッダーから [ポートフォリオ計画ビュー] ドロップダウンを選択し、名前を編集するビューの横にあるビューの編集アイコン ( ) を選択します。
   [ビューの編集] ウィンドウで、詳細を入力します。

   a. 必要に応じて、[ビュー名] フィールドでビューの名前を更新します。


      注:
      ポートフォリオ計画ビューの所有者のみがビューの名前を変更できます。

   b. オプション: [共有ビュー] トグルを選択してこのビューを公開するか、[共有ビュー] トグルを無効にしてビューをプライベートにします。

      重要:
      共有ビューをプライベートビューに変更すると、既存のステークホルダーのアクセス権が削除されます。

   c. **[Save** (保存)] を選択します。

   (Optional) ビューの名前が更新されます。

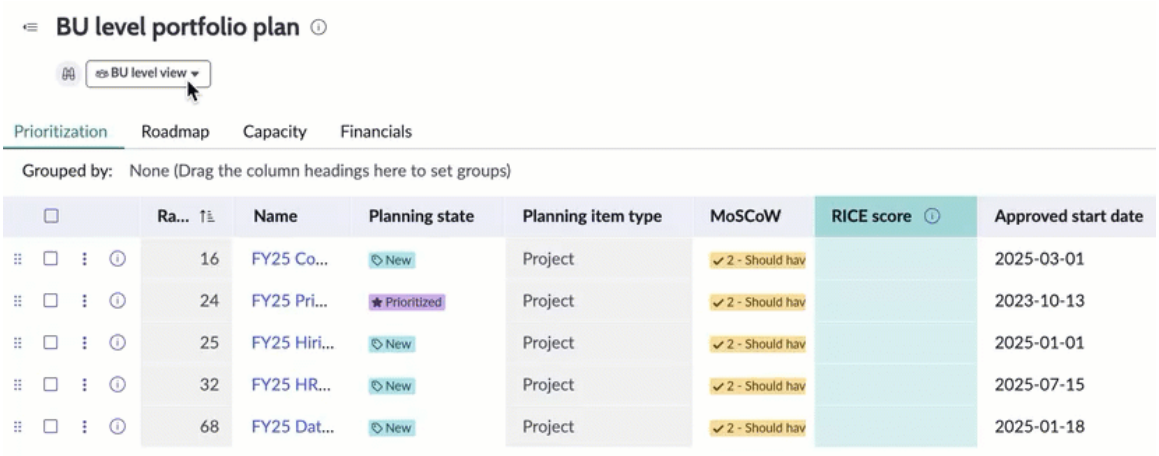

次のタスク
ポートフォリオ計画をステークホルダーと共有して、ポートフォリオ計画でのコラボレーションを開始します。「ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

関連情報

ポートフォリオ計画ビューの作成

ポートフォリオ計画ビューの削除

ポートフォリオ計画ビューの削除

不要になった場合、または共有ビューが最大 10 回、プライベートビューが 3 回という上限に達した場合は、カスタマイズされたポートフォリオ計画ビューを削除します。

始める前に


必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて

- ポートフォリオ計画ビューの所有者またはポートフォリオ計画の編集者のみがビューを削除できます。
- ポートフォリオ計画を削除すると、ビューに加えられた変更を含め、ビューが削除されます。ただし、このアクションにより、アイテム (プロジェクト、デマンド、エピック) はポートフォリオ計画にそのまま残ります。
- ポートフォリオ計画ごとに、最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを設定できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. ポートフォリオ計画ヘッダーから [ポートフォリオ計画ビュー] ドロップダウンを選択し、削除するビューの横にあるビューの削除アイコン (を選択します。
   [このビューを削除] ウィンドウが表示されます。
4. [このビューを削除] ウィンドウで、[削除] を選択します。

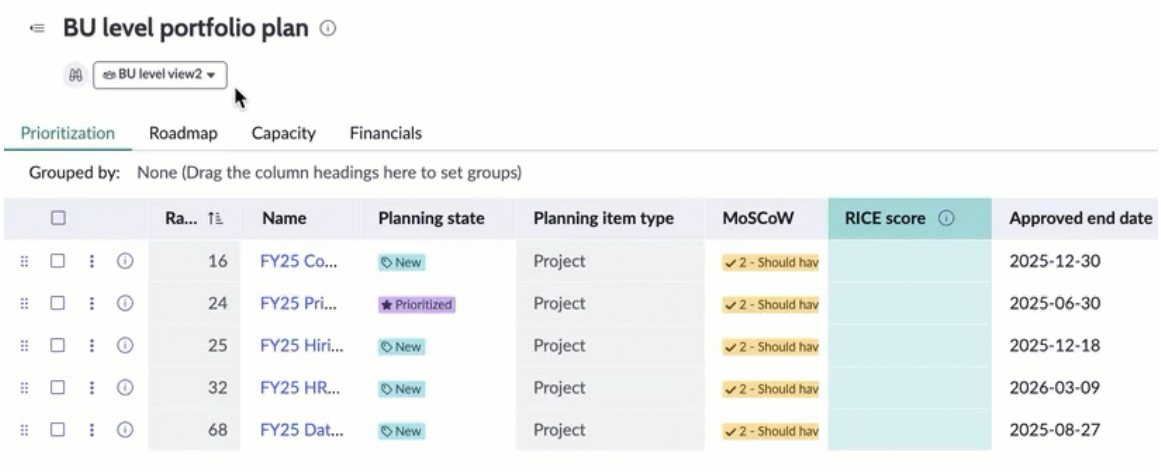

関連情報

ポートフォリオ計画ビューの作成

ポートフォリオ計画ビューの編集

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PPM、Agile 2.0、および **SAFe** での戦略的計画作業の実行

プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) や アジャイル開発 2.0 などの ServiceNow アプリケーションや、大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) などの 戦略的計画 で計画された作業がスムーズに実行できるようになります。

戦略的計画 と PPM、Agile 2.0、および SAFe の 間で計画立案アイテムをインポート、エクスポート、および管理します。

計画システムと実行システムの統合

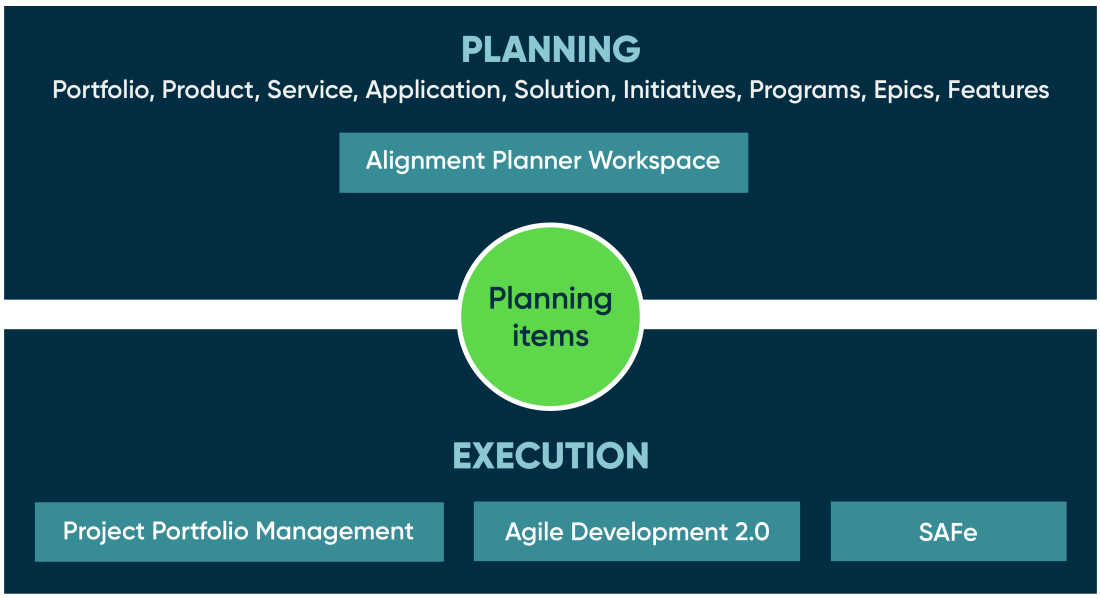

戦略的計画ワークスペース へのレコードのインポート

関連するテーブルマップ、フィールドマップ、および選択マップが構成された後に、アジャイル開発 2.0 からレコードをインポートします。

始める前に

必要なロール：sn_ament_core.apw_admin


手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 統合.
2. **[ServiceNow** 内部] 配置統合タイプを選択します。
3. [インポート] をクリックします。
4. [インポート要求を作成] フォームで、レコードをインポートする日付範囲を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インポート要求を作成

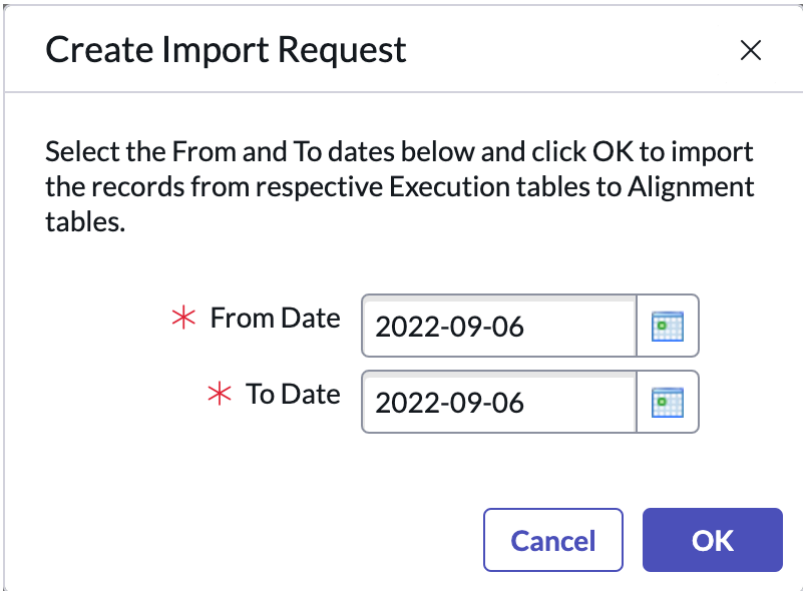

5. **[OK]** を選択します。

> **注:**
> 指定された日付内に作成されたレコードがインポートされます。

タスクの結果
インポート要求が作成され、要求の進捗状況を追跡するためのリンクが共有されます。

> **注:**
> 特定のテーブルマップのレコードをインポートする場合は、それぞれのテーブルマップで使用できる [インポート] ボタンをクリックします。

エラーログの表示

エラーログを表示して、統合プロセス中に発生した可能性のある問題の原因を理解します。

始める前に
必要なロール：sn_ament_core.apw_admin

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > 統合.
2. エラーログを表示するには、[統合エラー] タブを選択します。

ポートフォリオ計画ステータスまたはロードマップのエクスポート先 Microsoft PowerPoint

ポートフォリオ計画およびフリーフォームロードマップの目標、作業アイテム、ロードマップ、および主要メトリクスのステータスを Microsoft PowerPoint ファイルにエクスポートして、ビジネスステークホルダーが最新の進捗状況を常に把握できるようにします。レポートへのデータのコピーを回避することで時間を節約し、ServiceNow インスタンスにアクセスできないステークホルダーとも連携できるようにすることで、成果の共有を促進します。

始める前に
戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート のインストール。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:
PowerPoint へのエクスポートは現在、FedRAMP、NSC DOD IL5、オーストラリアの IRAP で保護されたデータセンターのお客様、セルフホスト型のお客様、またはその他の制限された環境のお客様は利用できません。将来のリリースで可用性の更新を確認してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

https://player.vimeo.com/video/1004219064?h=242c60b94c&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

ポートフォリオ計画の状況レポートを生成するために、次の 3 つの PowerPoint テンプレートがデフォルトで提供されています。

- [ポートフォリオ計画のステータス (Portfolio plan status)]：ランク別に優先順位付けされた上位 5 つのアイテムの個々の詳細スライドが含まれています。
- [ポートフォリオ計画と目標のステータス (Portfolio plan & goals status)]：このポートフォリオの目標とターゲットのスライド、達成された目標、リスクのある目標、およびランク別に優先順位付けされた上位 5 つのアイテムの個々の詳細なスライドが含まれています。
- [ロードマップテンプレート - デフォルト (Roadmap Template - default)]：このポートフォリオのロードマップのスライドが含まれます。一度に最大 1 年間のロードマップデータをエクスポートできます。

事前定義されたテンプレートを更新するか、独自のブランド化されたテンプレートを作成することで、生成されたレポートに表示されるデータのタイプをカスタマイズできます。「Microsoft PowerPoint テンプレートの作成」を参照してください。


手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画およびフリーフォームロードマップの目標、作業アイテム、ロードマップ、および主要メトリクスのステータスを Microsoft PowerPoint ファイルにエクスポートします。

タスクの結果

関連するデータが含まれる PowerPoint ファイルが生成されます。

次の画像は、エクスポートされたロードマップの例を示しています。

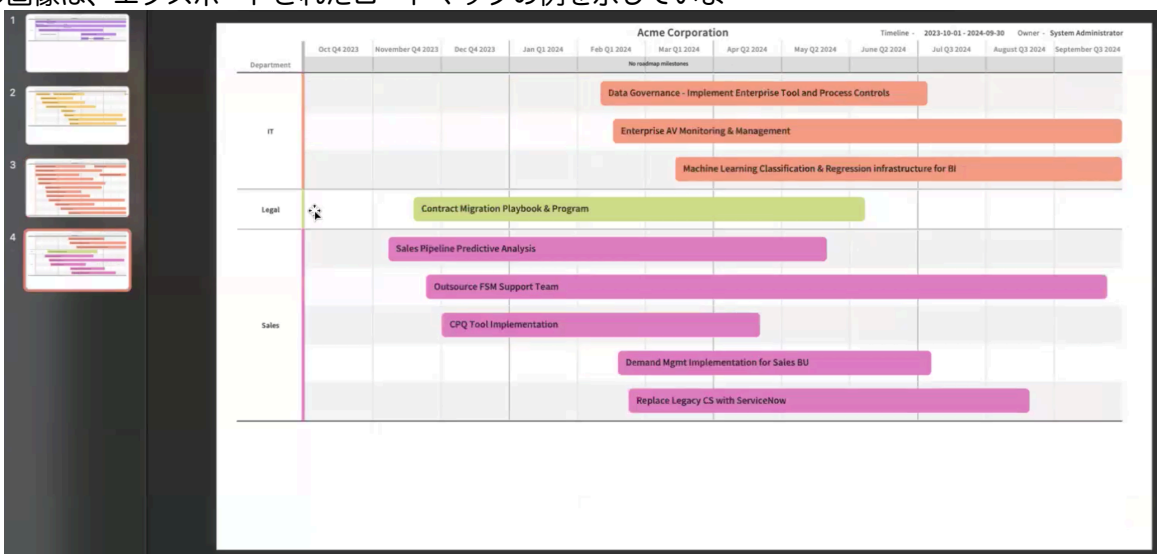

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的計画ワークスペースの参照

フィールド、ユーザーロール、テーブル、ガイドライン、ドメインセパレーション情報など、戦略的計画 に関する追加の詳細を提供するための参照情報。



戦略的計画 ワークスペースのロードマップでのマイルストーン表示のカスタマイズ

ロードマップビューでのマイルストーンの表示方法を選択することで、ロードマップタイムラインや計画立案アイテムのマイルストーンを簡単に追跡できます。

ロードマップの [カスタマイズ] ( ) サイドパネルには、ロードマップのマイルストーン表示をカスタマイズするためのさまざまな切り替え機能があります。



- ポートフォリオ計画ロードマップでは、これらの切り替えを常に使用できます。
- フリーフォームロードマップの場合、これらの切り替えは、ロードマップのソーステーブルが計画立案アイテムテーブル [sn_align_core_planning_item] またはその拡張のいずれかである場合のみ使用できます。

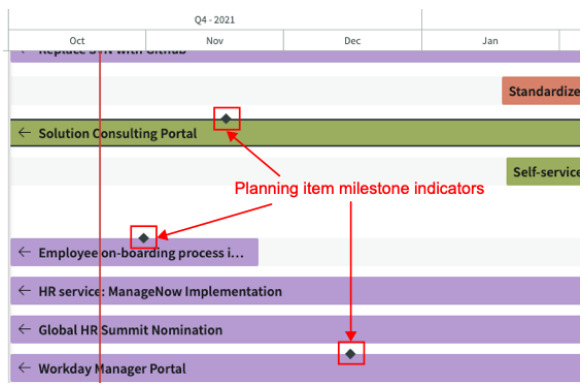

マイルストーンの切り替え	ロードマップビュー
ロードマップのマイルストーン ロードマップタイムラインのマイルストーンを表示します。	
アイテムマイルストーン 計画立案アイテムのマイルストーンを表示します。	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マイルストーンの切り替え	ロードマップビュー
マイルストーンのみ すべての計画立案アイテムバーを非表示にして、ロードマップ上のマイルストーンのみを表示します。 この切り替えを選択すると、[グループごと] フィールドと [色別] フィールドが変更され、無効になります。この切り替えをオフにすると、以前のカスタマイズ設定が使用可能になります。 このビューでは、マイルストーンインジケーターが色分けされていることも確認できます。 • 赤：欠落 • 緑：達成 • 黒/ダークグレー：予定 **注:** アイテムレベルのマイルストーンの合計数 (未スケジュールアイテムのマイルストーンを含む) が 100 を超える場合、そのアイテムのマイルストーンインジケーターはロードマップに表示されません。アドミンと協力して、この数を希望の値に変更することができます。詳細については、「優先順位付けおよびロードマップのアイテムの表示制限の更新」を参照してください。	
マイルストーンラベル マイルストーンラベルを表示します。	ラベル付きのマイルストーンインジケーター  ラベルなしのマイルストーンインジケーター 

戦略的計画 ワークスペースでのロードマップの依存関係表示のカスタマイズ

ロードマップビューでの依存関係の表示方法を選択することで、計画立案アイテム間の関係性の識別の効率を向上します。




ロードマップの [カスタマイズ] ( ) サイドパネルには、ロードマップにおける依存関係表示をカスタマイズするためのさまざまな切り替え機能があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ポートフォリオ計画ロードマップでは、これらの切り替えを常に使用できます。
- フリーフォームロードマップの場合、これらの切り替えは、ロードマップのソーステーブルが計画立案アイテムテーブル [sn_align_core_planning_item] またはその拡張のいずれかである場合のみ使用できます。



依存関係トグル	ロードマップビュー
依存関係を表示 計画立案アイテムバーの左右にある円の形態で依存関係を示します。 これらの円 (1) の中に数字が示されています。これは、アイテムが共有する依存関係の番号を表します。また、赤色で表示 (!) されている場合は、依存関係が競合していることを表します。 注: [依存関係] セクションで他の 2 つのトグルを使用するには、このトグルを有効にする必要があります。	ロードマップにおける依存関係の円 
依存関係行 依存関係を計画立案アイテム間の線で示します。 これらの線は、次の場合にのみ表示されます。 • 依存関係にある両方の計画立案アイテムが同じロードマップ内にある • 依存関係のタイプが [依存] である	計画立案アイテム間の依存関係の線 
依存関係のあるアイテムのみ ロードマップをフィルタリングして、少なくとも 1 つの [依存] タイプを持つ計画立案アイテムのみを表示します。 ここで表示されるアイテムは、現行のロードマップ内外のアイテムに依存している可能性があります。	依存関係のあるアイテムのみを表示するロードマップ 

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的計画ワークスペースとともにインストールされるコンポーネント

戦略的計画 アプリケーションのインストールでは、数種類のコンポーネント (ユーザーロール、スケジュール済みジョブ、システムのプロパティ、カスタムスクリプトなど) がインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

戦略的計画ワークスペースとともにインストールされるロール

戦略的計画ワークスペースのロール

ロールタイトル [名前]	説明	含まれるロール
戦略的計画 ワークスペースアドミニストレーター [sn_align_core.apw_admin]	戦略的計画 アプリケーションのすべての機能にアクセスできます。 **注:** 目標とキャパシティ計画立案には、それぞれ sn_apw_advanced.spw_goal_user_read ロールと sn_align_ws.spw_capacity_read ロールでのみアクセスできます。	• it_portfolio_manager • sn_align_core.apw_user • sn_gf.goal_admin • view_changer
戦略的計画 ワークスペースユーザー [sn_align_core.apw_user]	ポートフォリオ計画、フリーフォームロードマップ、計画立案アイテムを作成、更新、および削除できます。 このロールは、ポートフォリオマネージャーや製品マネージャー、事業部門リーダー、その他の計画立案ペルソナなどのユーザーに付与できます。	• sn_align_cmn_int.user • sn_milestones.milestone_ • sn_gf.stategy_planner • sn_gf.goal_user • sn_align_core.ap_read_o • model_manager
sn_align_core.ap_read_only	• 共有されているポートフォリオ計画 ([計画立案] ページと [採点] ページ) とフリーフォームロードマップを表示できます。 • 共有されているポートフォリオ計画とロードマップにメモ、コメントまたは添付ファイルを追加できます。 • ポートフォリオ計画ビューとフリーフォームロードマップビューを作成、編集、削除できます。 **注:** オーナーのみが、ポートフォリオ計画ビューまたはフリーフォームロードマップビューを編集または削除できます。	• sn_milestones.milestone_ • sn_dpr_model.product_e • sn_dpr_model.product_f

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的計画ワークスペースのロール (続く)

ロールタイトル [名前]	説明	含まれるロール
マイルストーンエディター [sn_milestones.milestone_editor]	ロードマップ上のマイルストーンを作成、更新、および削除できます。	sn_milestones.milestone_vi
マイルストーンビューア [sn_milestones.milestone_viewer]	ロードマップにマイルストーンを表示できます。	なし
ビジネスステークホルダー [business_stakeholder]	• ポートフォリオ計画とフリーフォームロードマップを作成および更新できます。 • 共有されているポートフォリオ計画とロードマップにメモ、コメントまたは添付ファイルを追加できます。 • ロードマップをカスタマイズできます。 • [キャパシティ計画立案] 画面で、計画立案アイテムに対して生成されたリソースキャパシティを表示できます。 • ポートフォリオ計画に定義された目標を表示できます。 注: このロールを持つユーザーには、ロードマップアイテムを作成または編集するためのアクセス権がありません。	• sn_align_core.ap_read_o • sn_align_ws.spw_capacit • sn_apw_advanced.spw_g

自動翻訳

シナリオ計画のロール

ロールタイトル [名前]	説明	含まれるロール
sn_align_ws.scenario_approver	ポートフォリオのシナリオを承認できます。	sn_align_core.apw_user

目標ロール

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
sn_gf.goal_user_read	目標を表示できます。このロールは、プロジェクトユーザーやデマンドユーザーなどのユーザーに付与できます。	なし
sn_gf.goal_user	• 目標、サブ目標、および関連するターゲットを作成、表示、編集、および削除できます。	sn_gf.goal_user_read

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

目標ロール (続く)

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
	注: ○ **[sn_gf.allow_goal_deletion]** システムプロパティが [はい] に設定されている場合、目標やサブ目標を削除できるのは、目標やその直接の親目標の所有者および貢献者のみです。 ○ **[sn_gf.allow_goal_deletion]** システムプロパティが [はい] に設定されている場合、関連ターゲットを削除できるのは、目標のターゲットの所有者および貢献者のみです。 ○ 目標を編集できるのは、目標やその直接の親目標の所有者および貢献者のみです。 ○ ターゲットを編集できるのは、目標やターゲットの所有者および貢献者のみです。 • 目標関係性 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルから、作業アイテムと目標の間の既存の目標関係性を削除できます。	
sn_gf.goal_admin	• 目標とターゲットを作成します。 • 他のユーザーが作成した目標とターゲットを編集します。 • ターゲットブレークダウンを編集します。	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

目標ロール (続く)

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
	注: ターゲットブレークダウンを編集するには、ユーザーに sn_apw_advanced.spw_goal_user ロールも割り当てられている必要があります。 • 目標設定を更新できます。 • ターゲット自動化機能の有効化の一環として、ターゲットソースとコンテキスト変数を作成できます。 注: sn_gf.goal_admin ロールは ゴールフレームワーク インストールの一部としてインストールされますが、この特権は SPM のゴールフレームワーク のインストール時にロールに追加されます。	
sn_gf.strategy_planner_read	すべての戦略的計画と戦略値を表示できます。	なし
sn_gf.stategy_planner	戦略的計画と戦略値を作成、表示、編集、および削除できます。 注: • 戦略的計画は、戦略的計画の所有者とスポンサーのみが編集できます。 • 戦略値は、戦略計画のスポンサーのみが編集できます。	sn_gf.strategy_planner_read
sn_gf.epmo_stategy_planner	任意の目標を作成、表示、編集、および削除できます。	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user • sn_gf.goal_admin • sn_gf.strategy_planner

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

目標ロール (続く)

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
sn_apw_advanced.spw_goal_user	戦略的計画ワークスペースで [目標] ページを表示し、目標とターゲットを編集できます。	• sn_apw_advanced.spw_goal_user_read • sn_gf.goal_user
sn_apw_advanced.spw_goal_user_read	戦略的計画ワークスペースで [目標] ページを表示できます。	sn_gf.goal_user_read

PPM、Agile **2.0** と **SAFe** のアラインメントプランナーワークスペース統合 ロール

ロールタイトル [名前]	説明	含まれるロール
戦略的計画 統合ユーザー [sn_align_cmn_int.user]	戦略的計画 と Agile、SAFe、PPM の間で計画立案アイテムをインポート、エクスポート、および管理します。	connection_admin

キャパシティロール

ロールタイトル [名前]	説明	含まれるロール
sn_align_ws.spw_capacity_user	リソースキャパシティの詳細を生成できます。	sn_align_ws.spw_capacity_read
sn_align_ws.spw_capacity_read	リソースキャパシティの詳細を表示できます。	なし

財務計画立案ロール

ロールタイトル [名前]	説明	含まれるロール
sn_align_ws.spw_financial_user	• 財務を表示し、コスト計画と経費ラインを作成し、計画立案アイテムの財務ベースラインを作成および比較できます。 • シナリオ計画で財務値を作成、編集、および表示できます。	なし
sn_align_ws.spw_funding_user	シナリオを比較しながら財務ウィジェットを表示し、財務の変更を含むシナリオを承認できます。	sn_align_ws.spw_financial_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的計画ワークスペースとともにインストールされるテーブル

Table (テーブル)	説明
カスタム計画立案アイテム 1 [sn_align_core_custom_planning_item_1]	追加の計画立案アイテムタイプの情報を保存します。
カスタム計画立案アイテム 2 [sn_align_core_custom_planning_item_2]	追加の計画立案アイテムタイプの情報を保存します。
カスタム計画立案アイテム 3 [sn_align_core_custom_planning_item_3]	追加の計画立案アイテムタイプの情報を保存します。
カスタム計画立案アイテム 3 [sn_align_core_custom_planning_item_3]	追加の計画立案アイテムタイプの情報を保存します。
カスタム計画立案アイテム 4 [sn_align_core_custom_planning_item_4]	追加の計画立案アイテムタイプの情報を保存します。
カスタム計画立案アイテム 5 [sn_align_core_custom_planning_item_5]	追加の計画立案アイテムタイプの情報を保存します。
デマンド [sn_align_core_demand]	デマンド計画立案アイテムタイプで作成されたレコードを保存します。
エピック [sn_align_core_scrum_epic]	エピック計画立案アイテムタイプで作成されたレコードを保存します。 これらのレコードは、スクラムまたは SAFe エピックである可能性があります。
イニシアチブ [sn_ament_core_initiative]	イニシアチブ計画立案アイテムタイプで作成されたレコードを保存します。
レンズ [sn_align_core_lens]	レンズ構成のデータを保存します。
レンズ構造 [sn_align_core_lens_structure]	レンズエンティティのデータとさまざまなレンズ間でのそれらの関係を保存します。
マイルストーン [sn_milestones_milestone]	マイルストーンのデータを保存します。
計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item]	すべての計画立案アイテムタイプのデータを保存します。
ポートフォリオ計画	ポートフォリオ計画のデータを保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Table (テーブル)	説明
[sn_align_ws_portfolio_plan]	
プロジェクト [sn_align_core_project]	プロジェクト計画立案アイテムタイプで作成されたレコードを保存します。
ロードマップ構成 [sn_align_ws_roadmap_configuration]	ポートフォリオロードマップとフリーフォームロードマップの作成に使用されるテーブルの構成データを格納します。
戦略的プログラム [sn_align_core_program]	戦略的プログラムの計画立案アイテムタイプで作成されたレコードを保存します。

目標テーブル

テーブル	説明
コンテキスト変数 [sn_gfa_context_variable]	ターゲットソースのコンテキスト変数の詳細を保存します。
目標 [sn_gf_goal]	目標の詳細を保存します。
目標がアサインされたエンティティ構成 [sn_gf_assigned_entity_config]	アサインされたエンティティタイプのテーブルにアサインされたエンティティ構成を保存して、目標ユーザーが目標を必須のアサインされたエンティティに関連付けることができるようにします。
目標コア [sn_gf_core_goal]	目標のコア (基本) 詳細を保存します。目標 [sn_gf_goal] テーブルは、目標コア [sn_gf_core_goal] テーブルを拡張します。
目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship]	目標とアイテム (プロジェクト、デマンド、プログラム、スクラムエピック、スクラム機能、SAFe エピック、SAFe 機能、および計画立案アイテム) の間の関係を定義します。
戦略計画 [sn_gf_strategic_plan]	計画立案組織階層ごとに定義された戦略計画を保存します。
戦略的優先事項 [sn_gf_strategy]	組織に対して定義された戦略的優先事項を保存します。
戦略値 [sn_gf_stategy_value]	戦略計画の戦略値を保存します。
ターゲット [sn_gf_goal_target]	目標のターゲット詳細を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

目標テーブル (続く)

テーブル	説明
ターゲットブレークダウン [sn_gfa_target_breakdown]	ターゲットに指定されたブレークダウン間隔に基づいて作成された、ターゲットのターゲットブレークダウンの詳細を保存します。
ターゲット進捗状況 [sn_gf_goal_target_progress]	目標のターゲット進捗状況の詳細を保存します。
ターゲットソース [sn_gfa_target_source]	ターゲットの実績値を自動化するためのターゲットソース構成の詳細を保存します。
ユニット [sn_gf_units]	ターゲットの進捗状況を測定するために利用可能な単位を保存します。

戦略的計画 **with** PPM、Agile 2.0、および **SAFe** テーブル

テーブル	説明
フィールドマップ [sn_align_cmn_int_field_map]	戦略的計画 と実行アプリケーションの間の作業アイテムのフィールドマッピング。
配置統合 [sn_align_cmn_int_integrations_setup]	インスタンスの統合セットアップ情報。
テーブルマップ [sn_align_cmn_int_table_map]	戦略的計画 と実行アプリケーションの間の作業アイテムのテーブルマップ。
統合マッピング [sn_align_cmn_int_integration_mapping]	戦略的計画 と実行アプリケーションの間の作業アイテムの統合マッピング。
インポート要求 [sn_align_cmn_int_import_request]	レコードを PPM、 アジャイル開発 2.0、または SAFe から 戦略的計画 にインポートするために作成されたインポート要求の情報を保存します。
インスタンスマッピング [sn_align_cmn_int_instance_mapping]	戦略的計画 と実行アプリケーション間のインスタンスマッピング情報を保存します。
統合エラー [sn_align_cmn_int_integration_error]	統合エラーのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的計画 **with** PPM、Agile 2.0、および **SAFe** テーブル (続く)

テーブル	説明
選択マップ [sn_align_cmn_int_choice_map]	戦略的計画 と実行アプリケーションの間の作業アイテムのワークフロー選択マッピング。

財務テーブル

テーブル	説明
投資ベースライン [sn_invst_pln_invst_investment_baseline]	財務ベースラインに関する情報を保存します。
投資ベースラインヘッダー [sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header]	財務ベースラインに関するすべての情報と投資テーブルを保存します。
投資予算 [sn_invst_pln_invst_budget]	必要な時間スコープで無駄のない予算業務に取り組むために、移行された予算情報を保存します。

採点テーブル

テーブル	説明
採点フレームワーク [sn_apw_advanced_scoring_framework]	RICE、WSJF、価値と工数、または新しいカスタムフレームワークなどの採点フレームワークのレコードを保存します。
採点フレームワークの属性 [sn_apw_advanced_scoring_attributes]	達成、影響、信頼性、工数、価値、ジョブのサイズ、時間の重要度など、各採点フレームワークの属性を保存します。これらの属性は Glide 変数タイプフィールドのものです。

デジタルプロダクトリリースデータモデルテーブル

テーブル	説明
製品の機能拡張 [sn_dpr_model_product_enhancement]	製品機能の製品拡張に関する情報を保存します。
製品の特徴 [sn_dpr_model_product_feature]	顧客の製品に付加価値を与える機能に関する情報を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的計画ワークスペースとともにインストールされるスケジュール済みジョブ

目標のスケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
目標、戦略、および作業アイテムデータをゴールフレームワークと関連する計画立案アイテムテーブルに移行	既存の目標データを ゴールフレームワーク テーブルに移行します。移行するデータとそのデータの移行方法については、「目標データの移行」を参照してください。
アサインされたエンティティの目標関係を移行する	[会社]、[事業部門]、[部門]、[ポートフォリオ] 以外のレンズエンティティとの m2m 関係を作成している場合、目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルのデータに基づく [目標] フォーム にある [アサインされたエンティティタイプ] フィールドと [アサインされたエンティティ] フィールドに値が入力されます。
戦略的アイテムの目標関係の計画立案アイテム値をクリア	戦略的アイテム (プログラムおよびイニシアチブ) の既存の目標関係レコードの計画立案アイテム値をクリアします。
SPM のゴールフレームワーク を使用してターゲットの実績値を更新	各ターゲットソースからデータを収集してターゲットの実績値を更新し、ターゲットの進捗状況が更新され、ターゲットの進捗状況が目標にロールアップされるようにします。
ターゲットブレークダウンを使用して目標デモデータを作成 (Create Goals Demo Data with Target Breakdowns)	ターゲットのターゲットブレークダウンデモデータを作成します。

財務のスケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
計画立案アイテムの財務ベースラインを作成 (Create Financial Baseline For Planning Items)	計画立案アイテムの財務ベースラインを定義した周期で自動的に作成します。
アクティブなデマンドとプロジェクトの予算を移行 (Migrate budget for active demands and projects)	計画立案アイテムの予算を一括アクションとして移行します。
人件費の生成	スケジュール済みジョブをアクティブ化して、プロジェクトとデマンドの属性ベースのリソースのアサインに対する人件費を自動的に生成します。
エピックの人件費を生成	スケジュール済みジョブをアクティブ化して、エピックの属性ベースのリソースのアサインに対する人件費を自動的に生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的計画ワークスペースとともにインストールされるカスタムスクリプト

目標カスタムスクリプト

名前	説明
福利厚生計画 事前定義されたスクリプトがあるターゲットソース。	金銭的または金銭以外の利益計画レコードからの [実績利益] フィールドまたは [金銭以外の実績利益] フィールドから必要な値を取得することによって、ターゲットフォームの [実績値] フィールドを更新する事前定義されたスクリプト。スクリプトテンプレートについては、「Predefined target automation script for benefit plans (利益計画の事前定義されたターゲット自動化スクリプト)」を参照してください。 **注:** 利益計画カスタムスクリプトは、PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理) がインストールされている場合にのみ使用できます。

戦略的計画ワークスペースとともにインストールされるシステムプロパティ

ポートフォリオ計画およびポートフォリオ計画コアのシステムプロパティ

名前	説明
sn_align_ws.portfolio_plan_items_limit	計画立案ページにロードする計画立案アイテムの数を定義するオプション。 **注:** システムプロパティの値が 250 を超えると、UI のパフォーマンスが低下する可能性があります。デフォルト値は 250 です。
sn_align_ws.item_milestone_limit	[ロードマップ] タブにロードするマイルストーンアイテムの数を定義するオプション。デフォルト値は 50 です。
sn_align_ws.is_scenario_planning_disabled	scenario_planning機能を有効にするオプション。
sn_align_core.planning_item_types_allow_list	ポートフォリオ計画の構成を許可する計画立案アイテムタイプを定義するオプション。

目標システムプロパティ

名前	説明
glide.ui.sn_gf_goal_target_activity.fields	目標とターゲットのフィールドのアクティビティストリームを有効にするオプション。
sn_align_ws.goal_hierarchy.max_records	目標ビューの [階層] タブにロードする目標の数を指定します。 **注:** システムプロパティの値が 500 を超えると、目標 UI のパフォーマンスが低下する恐れがあります。デフォルト値は 500 です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

目標システムプロパティ (続く)

名前	説明
sn_gf.allow_goal_deletion	目標の削除を有効にするオプション。デフォルト値は true です。
sn_gf.allow_target_deletion	ターゲットの削除を有効にするオプション。デフォルト値は true です。
sn_gf.goal_calendar_type	目標を設定するためのカレンダータイプを設定するオプション。使用可能なカレンダータイプは、グレゴリオ暦と会計期間です。デフォルト値は [グレゴリオ暦] です。
sn_gf.weighted_average_enabled	加重平均ロジックでサブ目標とターゲットから目標の進捗状況を計算できるようにするオプション。
sn_gfa_disable_target_breakdown	インスタンスレベルでターゲットブレークダウン機能を有効にするオプション。デフォルト値は false です。
sn_gfa.target_breakdown_decimals	ターゲットブレークダウンの生成中にターゲット値に表示する小数点以下桁数を定義するオプション。デフォルト値は 2 です。
sn_gfa.weeklyCheckInDayToMapMonth	月にマッピングする週次ターゲットブレークダウンの終了日を定義するオプション。デフォルト値は金曜日です。

戦略的計画 **(PPM** システムプロパティを使用)

名前	説明

com.sn_align_cmn_int.bulk_import	• タイプ：選択リスト
	• デフォルト値：INSERT
	• 他の可能な値：
	  ○ 挿入
	  ○ <値 2 名>：
	• 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
	• 詳細を見る： 一括インポートの設定

ドメインセパレーションと 戦略的計画

戦略的計画 ではドメインセパレーションがサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート」を参照してください。

戦略的計画でのドメインセパレーションの概要

さまざまなドメインで、レンズ、ポートフォリオ計画、計画立案アイテム、およびロードマップを作成できます。

戦略的計画におけるドメインセパレーションの仕組み

ServiceNow インスタンスでドメインセパレーションを有効にした後、戦略的計画 のデータは自動的にドメインセパレーションされます。つまり、さまざまなドメインの計画階層、計画立案アイテム、および計画組織のデータは、これらのドメインにアクセスできるユーザーにのみ表示されます。

戦略的計画 のドメインセパレーションテーブル

戦略的計画 でインストールされるすべてのテーブルは、ドメインセパレーションをサポートしています。テーブルの完全なリストについては、「戦略的計画ワークスペースとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

戦略的計画 **Workspace** での計画立案アイテムの並べ替えエラー

戦略的計画 ワークスペースの優先順位付けのリストビューでアイテムの並べ替えに失敗するシナリオを確認してください。

ポートフォリオ計画の作業パイプライン内の計画立案アイテムのランクを更新するために、[優先順位付け] ページのリストビューからアイテムを並べ替えることができます。その際、ランキング構成のエラーが原因で並べ替えが失敗する可能性があります。計画立案アイテムの並べ替えが失敗する可能性があるシナリオは次のとおりです。

シナリオ 1：Global ranking プラグインがアクティブでない

ServiceNow インスタンスで Global Ranking Application プラグイン (com.snc.sdlc.ranking) がアクティブかどうかを確認します。アクティブでない場合は、アドミニストレーターに連絡してアクティブにしてください。

シナリオ 2：計画立案アイテムにランク構成がない

並べ替えしているすべての計画立案アイテムにランク構成があるかどうかを確認します。ない場合は、アドミニストレーターに連絡して、これらの計画立案アイテムタイプのランク構成を更新してください。

シナリオ 3：ターゲット行にグローバルランクがない

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

並べ替えるターゲット位置の前または後の計画立案アイテムにグローバルランクがあるかどうかを確認します。ない場合は、システムアドミニストレーターに連絡してグローバルランクを生成してください。

関連情報


計画立案アイテムのランク付け

戦略的計画 **Workspace** のアイテムマイルストーンエラー


ポートフォリオ計画ロードマップまたはフリーフォームロードマップにおける計画立案アイテムのマイルストーンが 戦略的計画 Workspace でエラーステータスになることがある場合のシナリオを説明します。

既存の計画立案アイテムを再スケジュールすると、アイテムのマイルストーンがアイテムの承認された開始日または終了日から外れる場合があります。

ロードマップで計画立案アイテムを再スケジュールしても、マイルストーンの期日は変更されません。そのため、マイルストーンの期日がアイテムの日付範囲外である場合、その範囲外のマイルストーンのインジーターは非表示になり、エラーステータスに移行します。まだアイテムの日付範囲内にあるマイルストーンのインジケーターが表示されます。

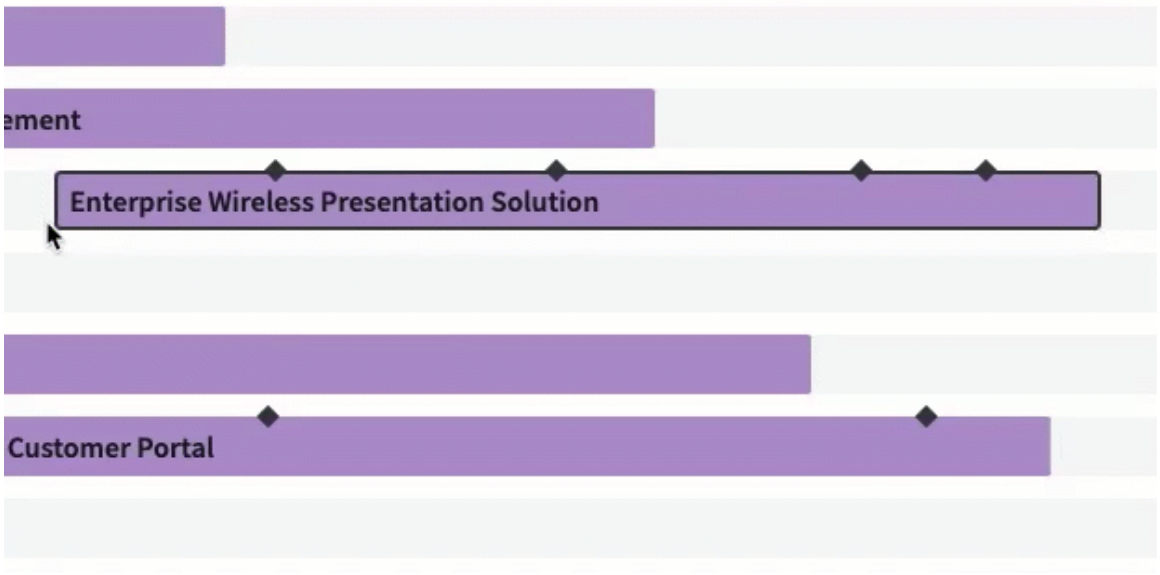

アイテムのスケジュールと同期していないマイルストーンは、サイドパネルの [マイルストーン] タブから表示できます。サイドパネルから、計画の変更を反映するようにマイルストーンの期日を編集および調整できます。「ロードマップアイテムのマイルストーンを更新」を参照してください。

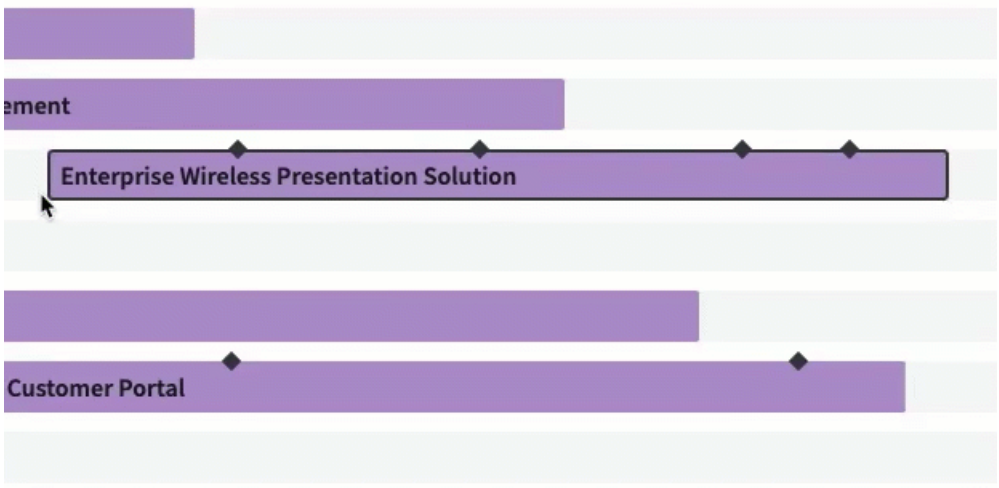

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> ロードマップビューからプロジェクトマイルストーンを更新することはできません。プロジェクトマイルストーンを更新すると、関連付けられているプロジェクトのコストとリソース計画に影響を与える可能性があります。そのため、プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) のプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトマイルストーンを更新することをお勧めします。

関連情報

- ロードマップアイテムの依存関係を追加
- ロードマップアイテムの依存関係を更新
- 戦略的計画 ワークスペースでのロードマップの依存関係表示のカスタマイズ

戦略的計画 **Workspace** のアイテム依存関係エラー


戦略的計画 および ポートフォリオ計画 におけるポートフォリオ計画ロードマップまたはフリーフォームロードマップにおける計画立案アイテムの依存関係がエラーステータスになることがある場合のシナリオを説明します。

アイテム間のスケジュールが競合している場合は、2 つの計画立案アイテム間の依存関係がエラーになることがあります。線形の依存関係 (線形依存性) では、一方のアイテムの作業を開始するにはもう一方のアイテムの作業を完了する必要があるというように、アイテムがスケジュールされます。

> **注:**
> エラース状況は、計画立案アイテムの関係タイプが [依存] になっている場合にのみ表示されます。

ここで示されているサンプルロードマップの場合、従業員のオンボーディングプロセスの改善での作業の開始は、新規雇用に関する特定のオンボーディングパスの完了に依存しています。こうした関係が、線形の依存関係と見なされます。この場合、従業員のオンボーディングプロセスの改善は、新規雇用に関する特定のオンボーディングパスの終了日より前に開始するようにスケジュール設定されています。このような競合がある場合、ロードマップではエラーアイコン (!) とともに表示され、[アイテムの詳細] サイドパネルの [依存関係] タブにも表示されるようになっています。

このようなエラーを解消するには、計画立案アイテムのスコープを確認し、開始日や終了日を更新してスケジュールを適宜調整する必要があります。

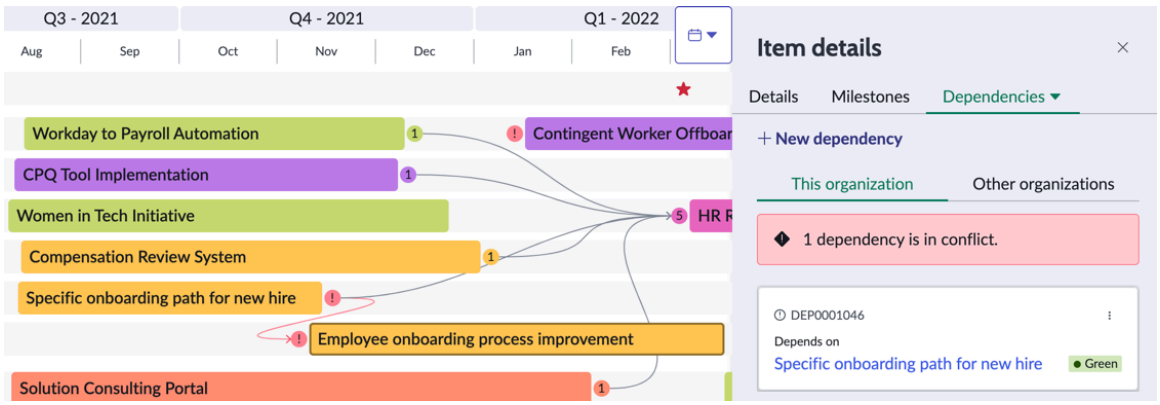

関連情報

- ロードマップアイテムの依存関係を追加
- ロードマップアイテムの依存関係を更新

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プロジェクトポートフォリオ管理、アジャイル開発 2.0、および SAFe での 戦略的計画 の管理

次の指針に従って、戦略的計画 が PPM、アジャイル開発 2.0、および SAFe と適切に統合されていることを確認してください。

- レコードが連動された後は、テーブルマップのフィルター条件を変更しないでください。既に連動されたレコードは新しいフィルター条件と一致しない可能性があり、フィルター条件を変更するとデータ不整合が発生する可能性があります。フィルター条件を変更する必要がある場合は、データの不整合の問題を回避するために、連動されたレコードの関連属性を必ず手動で更新してください。
- テーブルマップを作成するときは常に、関連するフィールドマップと選択マップも設定されていることを確認してください。
- テーブルマップのインポートジョブが実行中 (処理中) のときは、テーブルマップまたはそのフィールドマップを変更しないでください。
- 計画立案アイテムフォームの [変換先] フィールドを使用して、変換元の元のレコードを特定できます。
- 参照または Glide リストのフィールドタイプのフィールドマップを作成する間、実行テーブルと配置テーブルが 2 つの異なるテーブルを参照しているときは常に [ルックアップ] フィールドと [ルックアップ] 列の値が追加されていることを確認してください。
- データ同期に失敗した場合は、次のことを確認します。
  - その配置統合レコード内の [統合エラーログ] 関連リスト。
  - [配置テーブルフィルター] (インポート用) および [実行テーブルフィルター] (エクスポート用) の条件が満たされていること。
  - 配置統合とテーブルマップの両方で [アクティブ] フラグがチェックされていること。
  - 各テーブルマップに適切なフィールドと選択肢が設定されていること。
- [実行 **URL]** フィールドを表示する場合は、配置計画立案アイテムレコードを構成して表示します。
- 同期された計画立案アイテムの [実行 URL] フィールドが空白の場合は、次の場所に移動します: 戦略的計画 > 統合 をクリックし、[計画立案アイテムの実行 **URL** を修正] をクリックします。このアクションでは、実行 URL フィールドを作成して更新します。
- プロジェクト、デマンド、およびエピックテーブルマップに [主要目標] フィールドが導入され、配置テーブルと実行テーブルの間の [目標] フィールドの統合がサポートされています。
- プロジェクトをインポートまたはエクスポートしようとしている場合は、(そのプロジェクトの一部である) デマンドが同期されていることを確認してください。
- 任意の実行テーブルのテーブルマップを作成できます。展開されたテーブル (pm_portfolio、rm_epic, dmn_demand、pm_project) のいずれかからテーブルマップが作成されていない場合、またはテーブルマップから拡張されていない場合は、テーブルマップレコードのインターフェイスをサポートするビジネスルールを作成する必要があります。ビジネスルールの作成に関する詳細については、「カスタムテーブルマップ構成を適用するビジネスルールの作成」を参照してください。

戦略的計画 のフォームフィールドの情報

戦略的計画 アプリケーションで使用されるフォームのフィールド情報。

アクションのアサインフォーム

[アクションのアサイン] フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して **[New]** アクションボタンを [APW リストメニュー構成 (APW List Menu Configuration)] ページに追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[目標] フォーム

フィールド	説明
アクションラベル	アクションラベルの名前。「New」と入力します。
アクション名	アクションの名前。「create-new-uxf」と入力します。
実装方法	アクションの実装。**[UXF** クライアントアクション] を選択します。
テーブル	アクションが作成されるテーブルの名前。**[sys_ux_list_menu_config]** を選択します。
クライアントアクションを指定	クライアントアクション。[新しいレコードを作成] を検索して選択します。
ビュー	アクションボタンが表示されるフォームのビュー。

選択マップフォーム

選択マップフォームのフィールドについて理解します。このフォームを使用して、選択マップを作成します。

選択マップフォーム

フィールド	説明
実行テーブル列	マッピングする必要がある、選択した実行テーブルのフィールド列。このフィールドの値は、フィールドマップ構成での選択に基づいて自動的に追加されます。
実行の選択	選択した実行テーブルコラムフィールドの選択フィールド値を選択します。
配置テーブル列	マッピングする必要がある、選択した配置テーブルのフィールド列。このフィールドの値は、フィールドマップ構成での選択に基づいて自動的に追加されます。
配置の選択	選択した配置テーブルコラムフィールドの選択フィールド値を選択します。

コンテキスト変数フォーム

コンテキスト変数フォームを使用して、構成された入力値に基づいてターゲットの実績値を計算するためのターゲットソースのコンテキスト変数を作成します。

コンテキスト変数フォーム

フィールド	説明
タイプ	コンテキスト変数タイプ。 さまざまなフィールドタイプについては、「フィールドタイプ」を参照してください。
アプリケーション	アプリケーションスコープの名前。
ラベル	コンテキスト変数タイプを作成するラベルの名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

コンテキスト変数フォーム (続く)

フィールド	説明
列名	コンテキスト変数タイプを作成するコンテキスト変数の ID。
選択リストの仕様	[実績値ソース構成] セクションのターゲットフォームにコンテキスト変数を表示するオプション。
既定値	ターゲットの実績値を更新するために考慮するデフォルト値。

[コスト計画を作成] フォーム

このフォームを使用して、計画立案アイテムのコスト計画を作成します。

[コスト計画を作成] フォーム

フィールド	説明
名前	コスト計画の名前。
入力通貨 (Entered currency)	単位コスト値をキャプチャする通貨。
単価	コスト計画の計画コスト。
数量	コスト計画の数量。
合計計画コスト	コスト計画の合計計画コスト値。
会計期間の開始	コスト計画の会計期間の開始月。
会計期間の終了	コスト計画の会計期間の終了月。
コスト配分	会計期間または期間ごとに計画コストを割り当てます。 このリストから値を選択します。 • [会計期間全体で均等に分割 **(Split equally across fiscal periods)]** - 期間全体にわたるすべての会計期間にコストを均等に分配します。 • [会計期間ごとに繰り返し **(Recurring per fiscal period)]** - 期間全体にわたって各会計期間のコストが繰り返し発生します。
原価費目	コスト計画の原価費目。 リストから原価費目のフォームを選択します。 **注:** 選択した原価費目に基づいて、[ロール] フィールドと [製品モデル] フィールドが表示されます。
従業員タイプ	Read-onlyフィールド。 • 外部：コストタイプが外部労働設備投資または外部労働運用費用の場合。 • 内部：コストタイプが労働設備投資または労働運用費用の場合。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[コスト計画を作成] フォーム (続く)

フィールド	説明
ロール	コスト計画を経費計上するロールの名前。
製品モデル	コストタイプがソフトウェア、ハードウェア、またはその他の設備投資または運用コストの場合に使用できます。 コスト計画を経費計上するモデルをリストから選択します。 コスト計画を経費計上するハードウェア支出のモデル名。

[経費ラインを作成] フォーム

このフォームを使用して、実際の経費の経費ラインを作成します。

[Expense Line を作成] フォーム

フィールド	説明
番号	経費ラインの自動生成番号。
総計	発生した経費。
簡単な説明	経費の簡単な説明を入力します。 経費ラインを識別するための一意で具体的な詳細を記載します。
日付	経費が発生した日付。
処理日	経費の処理日。
コスト計画	経費ラインを記録するための関連コスト計画名。
原価費目	経費の原価費目。 デフォルトでは、コスト計画の原価費目が選択されています。
状況	経費ラインのステータス。 処理済みの経費ラインのみが投資エンティティに考慮されます。
経費タイプ	経費タイプ (内部または外部) を定義します。 デフォルトでは、経費タイプは [原価費目] フィールドエントリから考慮されます。
レートカード	レートカードの名前。
サマリータイプ	経費ラインのビジネス目的。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

依存関係フォーム

依存関係フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 Workspace のロードマップにおける計画立案アイテム間の依存関係を追加したり確立したりします。

依存関係フォーム

フィールド	説明
計画立案アイテム	依存関係を作成するためにロードマップから選択した計画立案アイテム。これを後続のアイテムと見なします。 このフィールドは、選択内容に基づいて自動的に入力されます。
関係性タイプ	次のいずれかを選択します。 • 依存：一方のアイテムの作業開始が、もう一方のアイテムの作業終了に依存しています。この依存関係は、線形関係と見なされます。 • 関連：2 つのアイテムの作業は互いに関連していますが、互いの作業完了においては、厳密な依存関係がありません。この依存関係は、非線形関係と見なされます。
計画立案アイテム	必要な計画立案アイテム。これを先行アイテムと見なします。
番号	システムで生成された依存関係の一意の識別番号。

関連情報

- 計画立案アイテムの依存関係
- ロードマップアイテムの依存関係を追加

フィールドマップフォーム

フィールドマップフォームのフィールドについて理解します。このフォームは、対応するテーブルマップのマッピングを作成するために使用されます。

フィールドマップフォーム

フィールド	説明
実行テーブル	戦略的計画 のテーブルとマッピングする必要がある アジャイル開発 2.0、SAFe、または PPM のテーブル。このフィールドの値は、テーブルマップ構成での選択に基づいて自動的に追加されます。
実行テーブル列	マッピングする必要がある、選択した実行テーブルのフィールド列。
配置テーブル	アジャイル開発 2.0、SAFe、または PPM のテーブルとマッピングする必要がある 戦略的計

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールドマップフォーム (続く)

フィールド	説明
	画 のテーブル。このフィールドの値は、テーブルマップ構成での選択に基づいて自動的に追加されます。
配置テーブル列	マッピングする必要がある、選択した配置テーブルのフィールド列。
フロータイプ	マッピングを配置から実行、実行から配置、またはその両方で行うかどうかを指定します。 ここで、配置は 戦略的計画 を意味し、実行は PPM、アジャイル開発 2.0、および SAFe アプリケーションを意味します。

必要に応じて、カスタムフィールドを作成し、必要なソースフィールドにマッピングすることもできます。たとえば、実行プロジェクト番号を表示する場合は、ポートフォリオ計画コアアプリケーションスコープ内のプロジェクト計画立案アイテム [sn_align_core_project] テーブルに「プロジェクト番号」というカスタムフィールドを作成できます。次に、プロジェクトフィールドマップを使用して、このフィールドをプロジェクトテーブル (pm_project) の [番号] フィールドにマッピングします。

目標がアサインされたエンティティ構成フォーム

目標がアサインされたエンティティ構成フォームを使用して、アサインされたエンティティタイプのテーブルを構成して、目標ユーザーが目標を必須のアサインされたエンティティに関連付けることができるようにします。

目標がアサインされたエンティティ構成フォーム

フィールド	説明
アサインされたエンティティテーブル	目標をアサインするエンティティテーブル。
アプリケーション	アプリケーションスコープの名前。
アサインされたエンティティフィールド	目標フォームの参照フィールド。

[目標] フォーム

目標フォームを使用して、組織の戦略的優先事項の目標を作成します。

注:
ESG ワークスペース および 戦略的計画 のユーザーの場合、ワークスペースのフォームに他のフィールド (デフォルトとカスタムのどちらのフォームビューにも追加されていないもの) を表示するには、デフォルト/カスタムのフォームレイアウトを構成します。フォームレイアウトの構成方法については、「フォームレイアウトの構成」を参照してください。

[目標] フォーム

フィールド	説明
名前	目標の名前。
状況	目標のステータス。ステータスには、[ドラフト]、[処理中]、[承認済み]、[完了] [保留中]、[達成]、[未達成] があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[目標] フォーム (続く)

フィールド	説明
カテゴリ	目標のカテゴリ。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • アプリケーション合計 • 総コスト • 経費 • 投資 • クラウドアプリケーション • 自家製アプリケーション • サポート費 • 人件費 • 標準コンプライアンス • 戦略的 • オペレーショナル • 戦術的 • 人工知能
ステータス	目標のステータス。ステータスには、[赤]、[黄]、[緑] または [なし] があります。
進行状況	目標の完了率。目標にサブ目標やターゲットがある場合、進捗状況の値は自動的に計算されます。 進捗値の計算方法の詳細については、「進捗値の計算」を参照してください。
説明	目標の簡単な説明。

目標フォームの親情報セクション

フィールド	説明
戦略的優先事項	この目標の作成対象の戦略的優先事項の名前。
親目標	この目標が寄与する親目標の名前。
親目標への影響	親目標の下にある兄弟目標やその他の目標と比較して、この目標の重要度を表す数値。デフォルトでは、 値は (1) [どちらでもない]です。 使用可能なオプションは、次のとおりです。 • **(0)** 影響なし • **(1)** どちらでもない • **(2)** 中 • **(3)** 高

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

目標フォームの親情報セクション (続く)

フィールド	説明
	• **(4)** 非常に高 • **(5)** 最大 注: このフィールドは、**[sn_gf.weighted_average_enabled]** システムプロパティが [はい] に設定されている場合にのみ使用できます。

目標フォームの [所有者と貢献者] セクション

フィールド	説明
アサインされたエンティティタイプ	目標をアサインするエンティティタイプ。例：事業部門、部門、会社、ポートフォリオ。
アサインされたエンティティ	目標をアサインするエンティティ。たとえば、ポートフォリオ計画が事業部門、HR、および IT で作成されている場合、[アサインされたエンティティタイプ] を [事業部門] として、[アサインされたエンティティタイプ] を [HR] または [IT] として入力します。 注: ポートフォリオ計画に目標を表示するには、[アサインされたエンティティタイプ] フィールドと [アサインされたエンティティ] フィールドに入力する必要があります。
所有者	目標の所有者。デフォルトでは、目標を作成するユーザーの名前が入力されます。
貢献者	目標の達成に貢献するユーザー。

目標フォームの [期間] セクション

フィールド	説明
開始日	目標の開始日。デフォルトでは、現在の四半期の開始日が入力されます。サブ目標の場合、その親目標の開始日が入力されます。
終了日	目標の終了日。デフォルトでは、現在の四半期の終了日が入力されます。サブ目標の場合、その親目標の終了日が入力されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

目標フォームの [その他] セクション

フィールド	説明
コメント	コラボレーションを促進するための、目標に関する詳細なコメント。
チーム	目標を達成するためのさまざまなアクティビティを担当するアサイン先グループ。
分類	目標の分類タイプ。利用可能なオプションは、[環境]、[ソーシャル]、[ガバナンス] です。このフィールドは、ESG ワークスペース ユーザーにのみ適用されます。

関連情報

EAP の反復目標と作業アイテム目標

目標設定フォーム

目標設定に使用されるカレンダータイプ、目標進捗状況の加重平均計算、目標やターゲットの削除など、目標を管理するための目標設定フォームを使用します。

目標設定フォーム

プロパティ	説明
加重平均ロジックを有効にして、サブ目標とターゲットから目標の進捗状況を計算します。	有効にすると、[親目標への影響] および [目標への影響] のフィールドが、目標 [sn_gf_goal] とターゲット [sn_gf_goal_target] のテーブルにそれぞれ表示されます。親目標の進捗値は、加重平均ロジックを適用して計算されます。 デフォルト値は [はい] です。 親目標の進捗状況の値は、進捗値と、サブ目標とターゲットの [親目標への影響] および [目標への影響] のフィールドでそれぞれ定義された値に基づいて計算されます。 進捗値の計算方法の詳細については、「進捗値の計算」を参照してください。
目標の削除を許可します。	目標を削除できます。 デフォルト値は [はい] です。
ターゲットの削除を許可します。	ターゲットを削除できます。 デフォルト値は [はい] です。 注: 目標を削除すると、[ターゲットの削除を許可] プロパティが [いいえ] に設定されていても、関連するターゲット (存在する場合) も削除されます。
目標の設定に使用されるカレンダータイプ。	目標の設定に使用されるカレンダータイプ。利用可能なカレンダータイプは、グレゴリオ暦と会計期間です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

目標設定フォーム (続く)

プロパティ	説明
	デフォルト値は [グレゴリオ暦] です。
インスタンスレベルでターゲットブレークダウンを無効にします。	ターゲットブレークダウン機能を無効にできます。この機能を有効にすると、ターゲットブレークダウンは、ターゲットに設定されたブレークダウン間隔に基づいて自動的に作成されます。 デフォルト値は false です。

目標/ターゲット関係フォーム

目標/ターゲット関係フォームを使用して、目標と計画立案アイテム、戦略アイテム、またはその他の任意のアイテム間の関係を作成します。

計画立案アイテムと戦略アイテムの目標/ターゲット 関係フォームのフィールド

フィールド	説明
目標	計画立案アイテムを関連付ける目標の名前。
ターゲット	計画立案アイテムを関連付けるターゲットの名前。
プライマリ	目標/ターゲット関係をプライマリにするオプション。 このフィールドを選択すると、計画立案アイテムフォームの [主要目標] および [主要ターゲット] フィールドに自動的に入力されます。
計画立案アイテムタイプ	計画立案アイテムのタイプ。
計画立案アイテム	目標と併せて目標関係が作成される計画立案アイテム。

アイテム (エンティティタイプ、製品モデル) の目標/ターゲット関係フォームフィールド

フィールド	説明
テーブル	参照テーブルの名前。
ドキュメント ID	選択した参照テーブルの列のドキュメント ID。 このフィールドの推奨値は、[テーブル] フィールドで選択された参照テーブルによって異なります。

ハイライト表示される値フォーム

ハイライト表示される値フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 ワークスペースのポートフォリオ計画の [優先順位付け] ページでハイライト表示されるフィールドをカスタマイズします。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
テーブル	ハイライト表示された列を含むテーブル。「**sn_align_core_planning_item**」と入力します。
アプリケーション	ServiceNow インスタンスのスコープ。デフォルトでは、このフィールドは [ポートフォリオ計画] に設定されています。
フィールド	ワークスペースでハイライト表示されているテーブルの列。

ハイライト表示される値の条件フォーム

ハイライト表示される値の条件フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 ワークスペースでハイライト表示されたフィールドの表示を設定します。

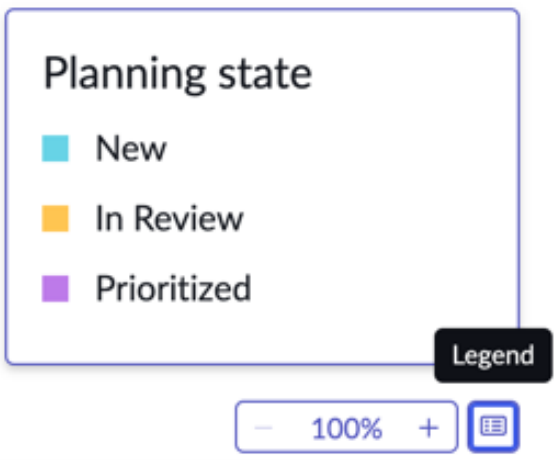フィールド	説明
条件	フィールド値の条件。 たとえば、ステータスが緑だとします。
色	指定された条件を満たすフィールド値の色。
アプリケーション	ServiceNow インスタンスのスコープ。デフォルトでは、このフィールドは [ポートフォリオ計画] に設定されています。
順番	[優先順位付け] ページの階層ビューにある凡例でこの色が表示される順番。 たとえば、[計画ステータス] 列の場合、値 [新規] には順序 1 が指定されます。 
アイコンを表示	フィールド値の横にアイコンを表示するオプション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
アイコン	フィールド値の横に表示されるアイコン。このフィールドは、[アイコンを表示] フィールドが選択されている場合にのみ表示されます。

レンズフォーム

レンズフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 にレンズを作成します。

レンズフォーム

フィールド	説明
名前	レンズの名前
有効	レンズがアクティブかどうかを示します。
説明	レンズの簡潔な説明。 このレンズのビジネス目的と、このレンズを使用する計画マネージャーを指定できます。
計画立案アイテム	このレンズを使用して計画できる作業のタイプ。 目的の計画立案アイテムを [利用可能] リストから [選択済み] リストに移動します。

追加の計画立案アイテムタイプが必要な場合は、作成できます。「戦略的計画 での新しい計画立案アイテムタイプの定義」を参照してください。

関連情報

戦略的計画でのレンズの作成または変更

レンズ構造フォーム

レンズ構造フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 のレンズの構造を定義します。

レンズ構造フォーム

フィールド	説明
エンティティ	レンズエンティティのソーステーブル。 エンティティは、レンズの視点での計画レベルを表します。 このレンズの視点から計画ペルソナに関連するエンティティを選択します。たとえば、部門、製品モデル、ビジネスゴールです。
エンティティフィルター	エンティティソースからデータをフィルターするための条件。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レンズ構造フォーム (続く)

フィールド	説明
	フィルターされたデータは、選択および計画する計画ペルソナのワークスペースに表示されます。
最上位エンティティ	このエンティティがレンズ構造のトップレベルエンティティであるかどうかを示します。
親エンティティ	現在のレンズ構造でこのエンティティの 1 レベル上にあるエンティティ。 このフィールドは、[最上位エンティティ] フィールドが選択されていない場合にのみ使用できます。
親エンティティへの参照	親エンティティテーブルを参照する現在のエンティティテーブルの列。 例： • エンティティ：戦略的プログラム **[sn_align_core_program]** • 親エンティティ：部門 **[cmn_department]** この場合、部門 [cmn_Department] テーブルを参照する戦略的プログラム [sn_align_core_program] テーブルのフィールドは [部門] になります。 このフィールドは、[最上位エンティティ] フィールドが選択されていない場合にのみ使用できます。

関連情報

戦略的計画 のレンズ構造の追加または変更

リスト適用性フォーム

リスト適用性フォームのフィールド情報について説明します。この情報を使用して、戦略的計画ワークスペースの新しく作成されたリストの対象者を定義します。

フィールド	説明
リスト	対象者を定義するリストの名前。
アプリケーション	デフォルトでは、このフィールドは [ポートフォリオ計画] に設定されています。
適用	このリストの対象者。 このフィールドを **[Alignment Workspace ホーム対象者 (Alignment Workspace Home Audience)]**に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
有効	この適用性をリストに有効にするオプション。

計画立案アイテムタイプフォーム

戦略的計画 において新しい計画立案アイテムタイプを新たに追加するのに必要な新規テーブルフォームのフィールドについて説明します。

新しいテーブルフォーム

フィールド	説明
ラベル	テーブルの一意のラベル。
名前	このフィールドは、[ラベル] フィールドの入力から自動生成されます。
アプリケーション	このフィールドは、スコープに基づいて自動的に [ポートフォリオ計画] に設定されます。 このフィールドに別の値が表示されている場合は、 ServiceNow インスタンスが ポートフォリオ計画 スコープ内にあることを確認してください。
拡張テーブル	この新しいテーブルが計画立案アイテムのタイプである場合は、[計画立案アイテム] を選択します。

新しい計画立案アイテムタイプフォームの [コントロール] セクション

フィールド	説明
ユーザーロール	このテーブルに対する 戦略的計画 ユーザーへのアクセスを許可するために、このフィールドを **[sn_align_core.apw_user]** に設定します。

新しい計画立案アイテムタイプフォームの [アプリケーションのアクセス] セクション

アプリケーションのアクセス
[読み取り可能]、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] フィールドを有効にします。

関連情報

戦略的計画 での新しい計画立案アイテムタイプの定義

計画立案アイテムフォーム

戦略的計画 で利用可能なさまざまな計画立案アイテムタイプのフォームのフィールドについて説明します。これらのフォームを使用して、計画立案アイテムを新たに追加したり、既存のアイテムの詳細情報を更新したりします。

アドミニストレーターが作成したカスタムアイテムタイプなど、戦略的計画 の計画立案アイテムタイプはすべて、計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] テーブルの拡張です。ワークスペースに表示される計画立案アイテムフォームのフィールドは、ポートフォリオ計画用に構成されたアイテムタイプに基づいています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次に示すとおり、デフォルトで利用可能な計画立案アイテムタイプはさまざまです。使用する計画立案アイテムタイプのフォームフィールドの詳細については、以下のセクションを参照してください。

- デマンド計画立案アイテムフォーム
- エピック計画立案アイテムフォーム
- イニシアチブ計画立案アイテムフォーム
- プロジェクト計画立案アイテムフォーム
- 戦略的プログラムの計画立案アイテムフォーム

関連情報

ロードマップビューからの計画立案アイテムの作成

優先順位付けへの計画立案アイテムの追加

エピック計画立案アイテムフォーム

エピックフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 でエピックタイプの計画立案アイテムの詳細を作成または編集します。

これらのフィールドは、計画立案アイテムの [完全な詳細] ページに表示されます。

エピック計画立案アイテムフォーム

フィールド	説明
名前	計画立案アイテムの簡単な説明
説明	計画立案アイテムの詳細情報 SPM の Now Assistアプリケーションがインストールされている場合は、[計画立案アイテムの作成] スキルを使用してエピックの説明を絞り込むことができます。
状況	計画立案アイテムに関する現在の進捗状況
所有者	この計画立案アイテムにアサインされたユーザー
[計画] ステータス	戦略的計画 バックログの計画立案アイテムに関する進捗状況
完了率 (%)	この計画立案アイテムにおける作業完了率
方法論	使用されるアジャイル方法論。
実現要因	このエピックが実現要因かどうかを示すオプション
MoSCoW	重要度に基づくこの計画立案アイテムの優先度。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 1：必要 • 2：あるとよい • 3：あってもよい • 4：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エピック計画立案アイテムフォーム (続く)

フィールド	説明
ポートフォリオ	この計画立案アイテムが関連付けられているポートフォリオ。
製品	この計画立案アイテムが関連付けられている製品。
戦略的プログラム	この計画立案アイテムが関連付けられている戦略的プログラム。
製品の機能拡張	この計画立案アイテムが関連付けられている製品拡張。
主要目標	主要目標としてこの計画立案アイテムに関連付けられている目標
プライマリターゲット	プライマリターゲットとしてこの計画立案アイテムに関連付けられているターゲット。
作業メモ	作業の進行に伴う計画立案アイテムの更新や検討を記録するためのメモ
戦略的優先事項	この計画立案アイテムが関連している戦略的優先度。

エピック計画立案アイテムフォームの [日付] セクション

フィールド	説明
承認された開始日	この計画立案アイテムにおいて承認された開始日
承認された終了日	この計画立案アイテムにおいて承認された終了日
実開始日	この計画立案アイテムの作業が開始された実際の日付
終了実績日時	この計画立案アイテムの作業が完了した実際の日付
開始予定日	この計画立案アイテムの開始予定日
終了予定日	この計画立案アイテムの終了予定日

エピック計画立案アイテムフォームの [詳細] セクション

このセクションでは、投資タイプ、実行タイプ、影響を受けるビジネスアプリケーションなど、この計画立案アイテムに関する付加的な詳細情報を取得します。

フィールド	説明
優先度	この計画立案アイテムの優先度
フェーズ	この計画立案アイテムのフェーズ。 このフィールドは、計画立案アイテムタイプがプロジェクトである場合にのみ使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エピック計画立案アイテムフォームの [詳細] セクション
このセクションでは、投資タイプ、実行タイプ、影響を受けるビジネスアプリケーションなど、この計画立案アイテムに関する付加的な詳細情報を取得します。

(続く)

フィールド	説明
ビジネスケイパビリティ	この計画立案アイテムのビジネス機能
ビジネスアプリケーション	この計画立案アイテムが関連するビジネスアプリケーション
影響を受けるその他のビジネスアプリケーション	この計画立案アイテムにより影響を受けるビジネスアプリケーション
推定値なし	推定値が欠落しているエピック内のストーリー数。
数による完了率 (%)	エピック内で完了した作業のパーセンテージ。ストーリー数は、この値の計算に使用されます。
完了数	エピック内の完了したストーリーの数。
完了推定	エピック内のすべての完了したストーリーの推定合計値。
T シャツサイズ	デマンドのサイズ。
合計数	エピックのストーリーの数。
推定合計	エピック内のすべてのストーリーの推定合計値。
推定による完了率 (%)	エピック内で完了した作業のパーセンテージ。ストーリーの推定値は、この値の計算に使用されます。

エピック計画立案アイテムフォームの **[WSJF** スコア] セクション
エピックが **SAFe** エピックである場合は、このセクションを使用します。

フィールド	説明
WSJF スコア	加重最短ジョブ優先 (WSJF) スコアは、ジョブの優先順位付けと並べ替えを行い、結果として最適なビジネス価値となるようにするために使用されます。WSJF スコアが最も高いエピックは、実装の優先度が最も高くなります。 このフィールドは、このセクションの他のフィールド値に基づいて自動的に入力されます。
ユーザー/ビジネス価値	収益への影響や、同様の機能を提供する市場内の他のソリューションなどのパラメーターに基づく、ジョブのビジネス価値。
ジョブの大きさ	ジョブの推定完了期間。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エピック計画立案アイテムフォームの **[WSJF** スコア] セクション
エピックが **SAFe** エピックである場合は、このセクションを使用します。

(続く)

フィールド	説明
時間の重要度	期限を過ぎた場合のビジネスへの影響。たとえば、期限が変更された場合に、予測収益が時間経過とともにどのように減少するかなどです。
リスクの削減	次のような質問に答えることで、このエピックがどの程度のリスク回避に役立つかを分析します。 • ジョブは他の方法でビジネスに付加価値をもたらしますか？ • ジョブは新しいビジネス機会をもたらしますか？ • このジョブは将来の納品のリスクを軽減しますか？

エピック計画立案アイテムフォームの [財務] セクション
このセクションでは、コスト、投資、経費、利益、ROI、その他の推定など、この計画立案アイテムに関する財務的な詳細情報を取得します。

フィールド	説明
計画コスト	この計画立案アイテムにかかる計画コスト
計画投資	この計画立案アイテムに対する計画資本的支出
計画経費	この計画立案アイテムに対する計画運用支出
計画利益	この計画立案アイテムによる計画利益
実績利益	この計画立案アイテムにより達成された実績利益
実績コスト	この計画立案アイテムの実績コスト
実績投資	この計画立案アイテムに対する実際の資本的支出額
実績経費	この計画立案アイテムに対する実際の運用経費
計画 ROI	この計画立案アイテムの計画投資利益率

関連情報

ロードマップビューからの計画立案アイテムの作成

優先順位付けへの計画立案アイテムの追加

デマンド計画立案アイテムフォーム

デマンドフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 でデマンドタイプの計画立案アイテムの詳細を作成または編集します。

これらのフィールドは、計画立案アイテムの [完全な詳細] ページに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド計画立案アイテムフォーム

フィールド	説明
名前	計画立案アイテムの簡単な説明
説明	計画立案アイテムの詳細情報 SPM の Now Assistアプリケーションがインストールされている場合は、[計画立案アイテムの作成] スキルを使用して、デマンドの説明を絞り込むことができます。
状況	計画立案アイテムに関する現在の進捗状況
所有者	この計画立案アイテムにアサインされたユーザー
[計画] ステータス	戦略的計画 バックログの計画立案アイテムに関する進捗状況。
カテゴリ	この計画立案アイテムのカテゴリ。[戦略的] または [稼働] から選択
MoSCoW	重要度に基づくこの計画立案アイテムの優先度。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 1：必要 • 2：あるとよい • 3：あってもよい • 4：なし
ポートフォリオ	この計画立案アイテムが関連付けられているポートフォリオ。
Program (プログラム)	この計画立案アイテムが関連付けられているプログラム。
製品	この計画立案アイテムが関連付けられている製品。
戦略的プログラム	この計画立案アイテムが関連付けられている戦略的プログラム。
プライマリゴール	主要目標としてこの計画立案アイテムに関連付けられている目標
製品の機能拡張	この計画立案アイテムが関連付けられている製品拡張。
プライマリターゲット	プライマリターゲットとしてこの計画立案アイテムに関連付けられているターゲット。
作業メモ	作業の進行に伴う計画立案アイテムの更新や検討を記録するためのメモ
戦略的優先事項	この計画立案アイテムが関連付けられている戦略的優先度

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド計画立案アイテムフォームの [日付] セクション

フィールド	説明
承認された開始日	この計画立案アイテムにおいて承認された開始日
承認された終了日	この計画立案アイテムにおいて承認された終了日
開始予定日	この計画立案アイテムの作業開始予定日。この値は、[承認された開始日] フィールドからコピーされます。
終了予定日	この計画立案アイテムの作業完了予定日。この値は、[承認された終了日] フィールドからコピーされます。

デマンド計画立案アイテムフォームの [詳細] セクション
このセクションでは、投資タイプ、実行タイプ、影響を受けるビジネスアプリケーションなど、この計画立案アイテムに関する付加的な詳細情報を取得します。

フィールド	説明
投資クラス	[実行] と [変更]から選択
投資タイプ	この計画立案アイテムの投資タイプ。たとえば、このアイテムの作業完了により製品のユーザーエクスペリエンスが向上する場合、[エンドユーザーエクスペリエンス] を選択します。
優先度	この計画立案アイテムの優先度
ビジネスアプリケーション	この計画立案アイテムが関連するビジネスアプリケーション
影響を受けるその他のビジネスアプリケーション	この計画立案アイテムにより影響を受けるビジネスアプリケーション
ビジネスケイパビリティ	この計画立案アイテムのビジネス機能

デマンド計画立案アイテムフォームの [ビジネスケース] セクション
このセクションでは、計画立案アイテムのリスク、スコープ、ブロッカーなど、この計画立案アイテムにおけるビジネスの詳細情報を取得します。

フィールド	説明
ビジネスケース	この計画立案アイテムに投資するビジネスケース
実行リスク	この計画立案アイテムの作業が完了した場合のビジネス上のリスク
不実行リスク	この計画立案アイテムの作業が未完了の場合のビジネス上のリスク
イネーブラー	このデマンドの実現要因。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド計画立案アイテムフォームの [ビジネスケース] セクション
このセクションでは、計画立案アイテムのリスク、スコープ、ブロッカーなど、この計画立案アイテムにおけるビジネスの詳細情報を取得します。

(続く)

フィールド	説明
バリア	この計画立案アイテムに対するブロッカー (もしある場合)
スコープの範囲内	この計画立案アイテムの定義された基準
スコープの範囲外	この計画立案アイテムでは不要な、明確に定義された基準
仮定	この計画立案アイテムで作業するための前提 (もしある場合)

デマンド計画立案アイテムフォームの [財務] セクション
このセクションでは、コスト、投資、経費、利益、ROI、その他の推定など、この計画立案アイテムに関する財務的な詳細情報を取得します。

フィールド	説明
計画コスト	この計画立案アイテムにかかる計画コスト
計画投資	この計画立案アイテムに対する計画資本的支出
計画経費	この計画立案アイテムに対する計画運用支出
計画 ROI	この計画立案アイテムの計画投資利益率
収支	この計画立案アイテムの収支
計画利益	この計画立案アイテムによる計画利益

デマンド計画立案アイテムフォームの [アセスメントデータ] セクション

フィールド	説明
影響	この計画立案アイテムがビジネスに与える影響
リスク	この計画立案アイテムに関連するリスクに関する数値
値	この計画立案アイテムにより得られる値に関する数値
スコア	計画立案アイテムのスコア。

関連情報

- ロードマップビューからの計画立案アイテムの作成
- 優先順位付けへの計画立案アイテムの追加

イニシアチブ計画立案アイテムフォーム

イニシアチブフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 でイニシアチブタイプの計画立案アイテムの詳細を作成または編集します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらのフィールドは、計画立案アイテムの [完全な詳細] ページに表示されます。

イニシアチブ計画立案アイテムフォーム

フィールド	説明
名前	計画立案アイテムの簡単な説明
説明	計画立案アイテムの詳細情報 SPM の Now Assistアプリケーションがインストールされている場合は、[計画立案アイテムの作成] スキルを使用してイニシアチブの説明を絞り込むことができます。
状況	計画立案アイテムに関する現在の進捗状況
所有者	この計画立案アイテムにアサインされたユーザー
[計画] ステータス	戦略的計画 Workspace の計画立案アイテムのステータス。
完了率 (%)	この計画立案アイテムにおける作業完了率
MoSCoW	重要度に基づくこの計画立案アイテムの優先度。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 1：必要 • 2：あるとよい • 3：あってもよい • 4：なし
作業メモ	作業の進行に伴う計画立案アイテムの更新や検討を記録するためのメモ
戦略的優先事項	この計画立案アイテムが関連付けられている戦略的優先度

イニシアチブ計画立案アイテムフォームの [詳細] セクション

フィールド	説明
承認された開始日	この計画立案アイテムにおいて承認された開始日
承認された終了日	この計画立案アイテムにおいて承認された終了日
実開始日	この計画立案アイテムの作業が開始された実際の日付
終了実績日時	この計画立案アイテムの作業が完了した実際の日付
優先度	この計画立案アイテムの優先度
ビジネスケイパビリティ	この計画立案アイテムのビジネス機能

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

イニシアチブ計画立案アイテムフォームの [詳細] セクション (続く)

フィールド	説明
ビジネスアプリケーション	この計画立案アイテムが関連するビジネスアプリケーション
影響を受けるその他のビジネスアプリケーション	この計画立案アイテムにより影響を受けるビジネスアプリケーション

[イニシアチブ計画立案アイテム] フォームの [ビジネスケース] セクション

フィールド	説明
概要	この計画立案アイテムのビジネスケース概要
バックグラウンド	この計画立案アイテムのバックグラウンド
制限事項	この計画立案アイテムに適用される制限事項。
アプローチ	この計画立案アイテムで作業するために計画されたアプローチ
メリット	この計画立案アイテムによるビジネス上のメリット

イニシアチブ計画立案アイテムフォームの [財務] セクション

このセクションでは、コスト、投資、経費、利益、ROI、その他の推定など、この計画立案アイテムに関する財務的な詳細情報を取得します。

フィールド	説明
計画コスト	この計画立案アイテムにかかる計画コスト
計画投資	この計画立案アイテムに対する計画資本的支出
計画経費	この計画立案アイテムに対する計画運用支出
計画利益	この計画立案アイテムによる計画利益
実績利益	この計画立案アイテムにより達成された実績利益
実績コスト	この計画立案アイテムの実績コスト
実績投資	この計画立案アイテムに対する実際の資本的支出額
実績経費	この計画立案アイテムに対する実際の運用経費
計画 ROI	この計画立案アイテムの計画投資利益率

関連情報

ロードマップビューからの計画立案アイテムの作成

優先順位付けへの計画立案アイテムの追加

プロジェクト計画立案アイテムフォーム

プロジェクトフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 Workspace でプロジェクトタイプの計画立案アイテムの詳細を作成または編集します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらのフィールドは、計画立案アイテムの [完全な詳細] ページに表示されます。

プロジェクト計画立案アイテムフォーム

フィールド	説明
名前	計画立案アイテムの簡単な説明
説明	計画立案アイテムの詳細情報 SPM の Now Assistアプリケーションがインストールされている場合は、[計画立案アイテムを書く (Write planning item)] スキルを使用して、プロジェクトの説明を絞り込むことができます。
ステータス	計画立案アイテムのステータス
所有者	この計画立案アイテムにアサインされたユーザー
ステータス	計画立案アイテムに関する現在の進捗状況
完了率 (%)	この計画立案アイテムにおける作業完了率
[計画] ステータス	戦略的計画 または ポートフォリオ計画 バックログの計画立案アイテムに関する進捗状況
MoSCoW	重要度に基づくこの計画立案アイテムの優先度。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 1：必要 • 2：あるとよい • 3：あってもよい • 4：なし
ポートフォリオ	この計画立案アイテムが関連付けられているポートフォリオ。
Program (プログラム)	この計画立案アイテムが関連付けられているプログラム。
製品	この計画立案アイテムが関連付けられている製品。
戦略的プログラム	この計画立案アイテムが関連付けられている戦略的プログラム。
製品の機能拡張	この計画立案アイテムが関連付けられている製品拡張。
主要目標	主要目標としてこの計画立案アイテムに関連付けられている目標
プライマリターゲット	プライマリターゲットとしてこの計画立案アイテムに関連付けられているターゲット。
作業メモ	作業の進行に伴う計画立案アイテムの更新や検討を記録するためのメモ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト計画立案アイテムフォーム (続く)

フィールド	説明
戦略的優先事項	この計画立案アイテムが関連している戦略的優先度。

プロジェクト計画立案アイテムフォームの [日付] セクション

フィールド	説明
開始予定日	この計画立案アイテムの作業開始予定日。この値は、[承認された開始日] フィールドからコピーされます。
終了予定日	この計画立案アイテムの作業完了予定日。この値は、[承認された終了日] フィールドからコピーされます。
承認された開始日	この計画立案アイテムにおいて承認された開始日
承認された終了日	この計画立案アイテムにおいて承認された終了日
実開始日	この計画立案アイテムの作業が開始された実際の日付
終了実績日時	この計画立案アイテムの作業が完了した実際の日付

プロジェクト計画立案アイテムフォームの [詳細] セクション

このセクションでは、投資タイプ、計画立案アイテムのフェーズ、実行タイプ、影響を受けるビジネスアプリケーションなど、この計画立案アイテムに関する付加的な詳細情報を取得します。

フィールド	説明
投資クラス	この計画立案アイテムの投資クラス。[実行] と [変更]から選択
投資タイプ	この計画立案アイテムの投資タイプ。たとえば、このアイテムの作業完了により製品のユーザーエクスペリエンスが向上する場合、[エンドユーザーエクスペリエンス] を選択します。
デマンド	この計画立案アイテムが関連付けられているデマンド
実行タイプ	この計画立案アイテムの実行方法論[ウォーターフォール]、[アジャイル]、[ハイブリッド] から選択します。 このフィールドは、計画立案アイテムタイプがプロジェクトである場合にのみ使用できます。
優先度	この計画立案アイテムの優先度

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト計画立案アイテムフォームの [詳細] セクション
このセクションでは、投資タイプ、計画立案アイテムのフェーズ、実行タイプ、影響を受けるビジネスアプリケーションなど、この計画立案アイテムに関する付加的な詳細情報を取得します。

(続く)

フィールド	説明
フェーズ	この計画立案アイテムのフェーズ。 このフィールドは、計画立案アイテムタイプがプロジェクトである場合にのみ使用できます。
ビジネスアプリケーション	この計画立案アイテムが関連するビジネスアプリケーション
影響を受けるその他のビジネスアプリケーション	この計画立案アイテムにより影響を受けるビジネスアプリケーション
ビジネスケイパビリティ	この計画立案アイテムのビジネス機能

[プロジェクト計画立案アイテム] フォームの [ビジネスケース] セクション
このセクションでは、計画立案アイテムのリスク、スコープ、ブロッカーなど、この計画立案アイテムにおけるビジネスの詳細情報を取得します。

フィールド	説明
ビジネスケース	この計画立案アイテムに投資するビジネスケース
実行リスク	この計画立案アイテムの作業が完了した場合のビジネス上のリスク
不実行リスク	この計画立案アイテムの作業が未完了の場合のビジネス上のリスク
実現要因	このプロジェクトの実現要因
障害	この計画立案アイテムに対するブロッカー (もしある場合)
スコープの範囲内	この計画立案アイテムの定義された基準
スコープの範囲外	この計画立案アイテムでは不要な、明確に定義された基準
仮定	この計画立案アイテムで作業するための前提 (もしある場合)

[プロジェクト計画立案アイテム] フォームの [財務] セクション
このセクションでは、コスト、投資、経費、利益、ROI、その他の推定など、この計画立案アイテムに関する財務的な詳細情報を取得します。

フィールド	説明
計画コスト	この計画立案アイテムにかかる計画コスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[プロジェクト計画立案アイテム] フォームの [財務] セクション
このセクションでは、コスト、投資、経費、利益、ROI、その他の推定など、この計画立案アイテムに関する財務的な詳細情報を取得します。

(続く)

フィールド	説明
計画投資	この計画立案アイテムに対する計画資本的支出
計画経費	この計画立案アイテムに対する計画運用支出
計画利益	この計画立案アイテムによる計画利益
実績利益	この計画立案アイテムにより達成された実績利益
ETC	この計画立案アイテムの作業を完了するためにかかる推定コスト
実績コスト	この計画立案アイテムの実績コスト
実績投資	この計画立案アイテムに対する実際の資本的支出額
実績経費	この計画立案アイテムに対する実際の運用経費
計画 ROI	この計画立案アイテムの計画投資利益率
予定リターン	この計画立案アイテムの収支
完了時の推定 (EAC)	この計画立案アイテムの作業完了時点での推定コスト。

プロジェクト計画立案アイテムフォームの [スコア] セクション
このセクションでは、スコア、ビジネス価値スコア、リスクスコア、サイズスコアなど、この計画立案アイテムのスコアリングの詳細をキャプチャします。

フィールド	説明
スコア	
価値スコア	この計画立案アイテムにより得られるビジネス価値のスコア。
リスクスコア	この計画立案アイテムに関連するリスクのスコア。
サイズスコア	タスクの完了に必要なジョブのスコア。

関連情報

ロードマップビューからの計画立案アイテムの作成

優先順位付けへの計画立案アイテムの追加

戦略的プログラムの計画立案アイテムフォーム

戦略的プログラムフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画で戦略的プログラムタイプの計画立案アイテムの詳細を作成または編集します。

これらのフィールドは、計画立案アイテムの [完全な詳細] ページに表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

戦略的プログラムの計画立案アイテムフォーム

フィールド	説明
名前	計画立案アイテムの簡単な説明
説明	計画立案アイテムの詳細情報 SPM の Now Assistアプリケーションがインストールされている場合は、[計画立案アイテムの作成] スキルを使用して戦略的プログラムの説明を絞り込むことができます。
状況	計画立案アイテムに関する現在の進捗状況
イニシアチブ	この計画立案アイテムが関連付けられているイニシアチブ。
所有者	この計画立案アイテムにアサインされたユーザー
完了率 (%)	この計画立案アイテムにおける作業完了率
MoSCoW	重要度に基づくこの計画立案アイテムの優先度。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 1：必要 • 2：あるとよい • 3：あってもよい • 4：なし
作業メモ	作業の進行に伴う計画立案アイテムの更新や検討を記録するためのメモ

戦略的プログラムの計画立案アイテムフォームの [詳細] セクション

フィールド	説明
承認された開始日	この計画立案アイテムにおいて承認された開始日
承認された終了日	この計画立案アイテムにおいて承認された終了日
実開始日	この計画立案アイテムの作業が開始された実際の日付
終了実績日時	この計画立案アイテムの作業が完了した実際の日付
優先度	この計画立案アイテムの優先度
ビジネスケイパビリティ	この計画立案アイテムのビジネス機能
ビジネスアプリケーション	この計画立案アイテムが関連するビジネスアプリケーション
影響を受けるその他のビジネスアプリケーション	この計画立案アイテムにより影響を受けるビジネスアプリケーション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的プログラムの計画立案アイテムフォームの [ビジネスケース] セクション

フィールド	説明
概要	この計画立案アイテムのビジネスケース概要
バックグラウンド	この計画立案アイテムのバックグラウンド
制限事項	この計画立案アイテムに適用される制限事項
アプローチ	この計画立案アイテムで作業するために計画されたアプローチ
利点	この計画立案アイテムによるビジネス上のメリット

戦略的プログラムの計画立案アイテムフォームの [財務] セクション

このセクションでは、コスト、投資、経費、利益、ROI、その他の推定など、この計画立案アイテムに関する財務的な詳細情報を取得します。

フィールド	説明
計画コスト	この計画立案アイテムにかかる計画コスト
計画投資	この計画立案アイテムに対する計画資本的支出
計画経費	この計画立案アイテムに対する計画運用支出
計画利益	この計画立案アイテムによる計画利益
実績利益	この計画立案アイテムにより達成された実績利益
実績コスト	この計画立案アイテムの実績コスト
実績投資	この計画立案アイテムに対する実際の資本的支出額
実績経費	この計画立案アイテムに対する実際の運用経費
計画 ROI	この計画立案アイテムの計画投資利益率

関連情報

ロードマップビューからの計画立案アイテムの作成

優先順位付けへの計画立案アイテムの追加

計画立案アイテムのマイルストーンフォーム

計画立案アイテムのマイルストーンフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 Workspace のロードマップに計画立案アイテムのマイルストーンを作成します。

フィールド	説明
名前	マイルストーンに使用したい名前。
タイプ	マイルストーンタイプ。次のいずれかを選択します。 • 期限 • 主要マイルストーン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	• 重要なイベント • 開始の日付 • 重要な日付
期日	マイルストーンの日付。
ステータス	マイルストーンのステータス。次のいずれかを選択します。 • 予定 • 欠落 • 達成
担当者	マイルストーンにアサインされているユーザー。
説明	マイルストーンに関する簡単な説明。

関連情報

ロードマップアイテムの依存関係を追加

ロードマップアイテムの依存関係を更新

戦略的計画 ワークスペースでのロードマップの依存関係表示のカスタマイズ

[ポートフォリオ計画の構成] フォーム

[ポートフォリオ計画の構成] フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 Workspace でポートフォリオ計画の計画立案アイテムの表示設定を作成または更新します。

[ポートフォリオ計画の構成] フォーム

フィールド	説明
ソーステーブル	ポートフォリオ計画を構成するテーブル。 例：戦略的優先事項 **[sn_gf_strategy]**。
開始日フィールド	開始日の値の取得元フィールド。
終了日フィールド	終了日の値の取得元フィールド。
アイテム名フィールド	アイテムの名前の取得元フィールド。
アイテムオーナーフィールド	アイテムオーナーの名前の取得元フィールド。

[ポートフォリオ計画構成] フォームの [ロードマップタイムラインの構成] セクション

フィールド	説明
フィールド別にグループ化	ロードマップアイテムをグループに分類できるフィールドのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ポートフォリオ計画構成] フォームの [ロードマップタイムラインの構成] セクション (続く)

フィールド	説明
	たとえば、[ステータス] 属性を使用して、アイテムを [ドラフト]、[準備完了]、[対応中] などの状況グループに分類できます。
フィールド別の色	ロードマップアイテムを色で分類できるフィールドのリスト。 たとえば、[計画立案アイテムタイプ] 属性を使用して、特定のタイプに属するアイテムの各グループに一意の色を割り当てることができます。
メトリクスフィールド	ロードマップアイテムのメトリクスとして使用されるフィールドのリスト。 たとえば、[計画利益] や [実績コスト] などです。 これらの値は、ロードマップアイテムにマウスカーソルを合わせると表示されます。
ステータスフィールド	ロードマップアイテムの名前に使用されるフィールド。
完了率フィールド	ロードマップアイテムの完了を追跡するために使用されるフィールド。 このフィールド値は、追跡モードでロードマップアイテムの進捗状況を視覚化するために使用されます。

[ポートフォリオ計画構成] フォームの [カンバン構成] セクション

フィールド	説明
スイムレーン	優先順位付けカンバンビューでボード上のスイムレーンに使用するフィールド。
垂直レーン	優先順位付けカンバンビューでボードの垂直レーンに使用するフィールド。
カンバンカードのメトリクス	計画立案マネージャーが [優先順位付けカンバン] ビューの計画立案アイテムカードに表示するデフォルトのメトリクス。
スイムレーン	ロードマップビューでボードのスイムレーンに使用するフィールド。
垂直レーン	ロードマップビューでボードの垂直レーンに使用するフィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ポートフォリオ計画構成] フォームの [カンバン構成] セクション (続く)

フィールド	説明
カンバンカードのメトリクス	計画立案マネージャーがカンバンボードのロードマップビューの計画立案アイテムカードに表示するデフォルトのメトリクス。

[ポートフォリオ計画構成] フォームの [ランクの構成] セクション

フィールド	説明
ランクの構成	ポートフォリオ計画の作成に使用されるテーブル。 このフィールドの値は、[ソーステーブル] フィールドで選択されたテーブルです。

関連情報

上位レベルの計画立案に備えたポートフォリオ計画構成の作成

製品の機能拡張フォーム

製品拡張フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、 戦略的計画 で製品機能拡張の詳細を作成または編集します。

これらのフィールドは、製品の機能拡張の [完全な詳細] ページに表示されます。

製品の機能拡張フォーム

フィールド	説明
製品	この製品拡張が作成された製品の名前。
製品の機能	この製品拡張が関連付けられている製品機能。
バージョン	製品の機能拡張のバージョン。
名前	製品の機能拡張の名前。
状況	製品の機能拡張のステータス。
アサイン先グループ	製品の機能拡張にアサインされたユーザーグループ。
アサイン先	製品の機能拡張にアサインされているユーザー。
説明	製品の機能拡張の簡単な説明。
開始日	製品の機能拡張の開始日。
終了日	製品の機能拡張の終了日。

進捗値の計算

目標の進捗値や完了率の値は、さまざまな式を使用して自動的に計算されます。計算式は、ターゲットのみを含む目標であるか、サブ目標とターゲットの組み合わせであるか、また加重平均計算が有効になっているかどうかによって異なります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

シナリオ	目標の進捗値の計算に使用される式
• 目標にターゲットがある。 • 目標にサブ目標がない。 • [目標への影響] フィールドはターゲットで定義されている。	目標の進捗値 = 関連するターゲットの進捗値の合計/ターゲットの数
• 目標にサブ目標とターゲットがある。 • [親目標への影響] および [目標への影響] フィールドは、サブ目標とターゲットでそれぞれ定義されている。	目標の進捗値 = サブ目標と関連するターゲットの進捗値の合計/サブ目標とターゲットの数
• 目標に 2 つのターゲット (ターゲット 1 とターゲット 2) がある。 • 目標にサブ目標がない。 • [目標への影響] フィールドは、ターゲットで定義されており、**[sn_gf.weighted_average_enabled]** システムプロパティが [はい] に設定されている。	目標の進捗値 = [(ターゲット 1 の進捗値 * ターゲット 1 の重み付けスケール) + (ターゲット 2 の進捗値 * ターゲット 2 の重み付けスケール)] / (ターゲット 1 の重み付けスケール + ターゲット 2 の重み付けスケール)
• 目標に 2 つのターゲット (ターゲット 1 とターゲット 2) がある。 • 目標に 2 つのサブ目標 (サブ目標 1 とサブ目標 2) がある。 • [親目標への影響] および [目標への影響] フィールドは、サブ目標とターゲットでそれぞれ定義されており、**[sn_gf.weighted_average_enabled]** システムプロパティが [はい] に設定されている。	目標の進捗値 = [(サブ目標 1 の進捗値 * サブ目標 1 の重み付けスケール) + (サブ目標 2 の進捗値 * サブ目標 2 の重み付けスケール) + (ターゲット 1 の進捗値 * ターゲット 1 の重み付けスケール) + (ターゲット 2 の進捗値 * ターゲット 2 の重み付けスケール)] / (サブ目標 1 の重み付けスケール + サブ目標 2 の重み付けスケール + ターゲット 1 の重み付けスケール + ターゲット 2 の重み付けスケール)

目標 (G1) に 2 つのターゲット (T1 と T2) があり、T1 と T2 の [目標への影響] フィールドがそれぞれ 2 と 3 に設定されているとします。T1 と T2 の現在の進捗値は、それぞれ 40% と 20% です。この場合、G1 の進捗値は次のように計算されます。

- G1 進捗に対する T1 の貢献度 = 2/(2+3)*40 = 16%
- G1 進捗に対する T2 の貢献度 = 3/(2+3)*20 = 12%
- したがって、G1 の進捗 = 16% + 12% = 28%

ロードマップのマイルストーンフォーム

ロードマップのマイルストーンフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 Workspace でロードマップのタイムラインに関するマイルストーンを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
名前	マイルストーンに使用したい名前。
タイプ	マイルストーンタイプ。次のいずれかから選択します。 • 重要なイベント • 開始の日付 • 重要な日付 • 期限 • 主要マイルストーン
期日	マイルストーンの日付。
担当者	マイルストーンにアサインされているユーザー。

関連情報

- ロードマップのマイルストーンの追加
- ロードマップマイルストーンを更新

ロードマップ構成フォーム

ロードマップ構成フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、ロードマップ設定に新しいテーブルを追加し、戦略的計画 にてその詳細を構成します。

ロードマップ構成フォーム

フィールド	説明
ソーステーブル	ロードマップをビルドするために使用するテーブル。
開始日フィールド	ロードマップアイテムの開始日に使用されるフィールド。 例：[開始予定日]。
終了日フィールド	ロードマップアイテムの終了日に使用されるフィールド。 例：[終了予定日]。
アイテム名フィールド	ロードマップアイテムの名前に使用されるフィールド。 例：[簡単な説明]。
アイテムオーナーフィールド	ロードマップアイテムのオーナーに使用されるフィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロードマップ構成フォーム (続く)

フィールド	説明
	例：[担当者]。
ステータス	ロードマップアイテムの名前に使用されるフィールド。
完了率 (%)	ロードマップアイテムの完了を追跡するために使用されるフィールド。 このフィールド値は、追跡モードでロードマップアイテムの進捗状況を視覚化するために使用されます。
フィールド別のグループ	ロードマップアイテムをグループに分類できるフィールドのリスト。 たとえば、[ステータス] 属性を使用して、アイテムを [ドラフト]、[準備完了]、[対応中] などの状況グループに分類できます。
フィールド別の色	ロードマップアイテムを色で分類できるフィールドのリスト。 たとえば、[計画立案アイテムタイプ] 属性を使用して、特定のタイプに属するアイテムの各グループに一意の色を割り当てることができます。
メトリクスフィールド	ロードマップアイテムのメトリクスとして使用されるフィールドのリスト。 たとえば、[計画利益] や [実績コスト] などです。 これらの値は、ロードマップアイテムにマウスカーソルを合わせると表示されます。

関連情報

優先順位付けとロードマップのための計画立案アイテムの表示設定のカスタマイズ

スケジュール済みスクリプト実行フォーム

スケジュール済みジョブは、特定の時間または繰り返しスケジュールで実行できる自動化された作業です。

目標、戦略、および作業アイテムデータを **Goal Framework** と関連する計画立案アイテムテーブルに移行

[目標、戦略、および作業アイテムデータを **Goal Framework** と関連計画立案アイテムテーブルに移行 **(Migrate Goal, Strategy, and Work item data to the Goal Framework and related Planning item tables)]** ジョブを使用して、既存の目標データを ゴールフレームワーク テーブルに移行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スケジュール済みスクリプト実行フォーム

パラメーター	説明
目標データの移行	• 既存のすべての目標レコードを目標 [goal] テーブルから目標 [sn_gf_goal] テーブルに移行します。sys_id は同じままです。対応するターゲットレコードがターゲット [sn_gf_goal_target] テーブルに作成されます。 • 目標と作業アイテム (プロジェクト、デマンド、プログラム) 間の既存の関係を、最初の目標 (Glide リストの順) を主目標とする目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルに作成します。
戦略データの移行	企業戦略 [enterprise_strategy]、事業部門戦略 [business_unit_strategy]、および戦略的達成目標 [strategic_objective] のテーブルから、既存のすべての戦略レコードを戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルに移行します。sys_id は同じままです。
目標戦略 M2M データの移行	ゴールフレームワーク では、1 つの目標は 1 つの戦略にのみマッピングできます。既存の目標にマッピングされた 2 つの戦略がある場合、目標のクローンが作成され (1 つは汎用目標として、もう 1 つはサブ目標として)、両方に同じ戦略が設定されます。また、サブ目標については、最初の目標が親目標として設定されます。 たとえば、既存の目標 (G1) が 5 つの戦略 (S1、S2、S3、S4、および S5) にマッピングされているシナリオを考えてみましょう。この場合、G1 の 4 つのクローンがサブ目標 (G2、G3、G4、および G5) として作成され、親目標が G1 として設定されます。親目標 (G1) と サブ目標 (G2、G3、G4、および G5) については、[戦略] フィールドにそれぞれ (S1、S2、S3、S4、および S5) が入力されます。 **注:** クローンされたサブ目標の名前には、`Cloned SubGoal:` のプリフィックスが付き、その後に親の目標名が続きます。
戦略/作業アイテム関係性データの移行	• 戦略と作業アイテム (プロジェクト、デマンド、プログラム) 間の既存の関係を目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルに移行します。 • 目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルに、目標に対する、(現在の戦略としての) 戦略と作業アイテム間の関連付けがない場合、現在の戦略の戦略値でダミー目標が作成されます。そして、目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルに、ダミー目標と作業アイテムとの目標関係が作成されます。 **注:** ダミー目標の名前にはプリフィックス `Goal:` が付き、その後に戦略名が続きます。

アサインされたエンティティの目標関係を移行する

[アサインされたエンティティの目標関係を移行] ジョブを使用して、[目標] フォーム の [アサインされたエンティティタイプ] および [アサインされたエンティティ] フィールドを、従来のフィールド ([事業部門]、[部門]、[会社]、[ポートフォリオ]、およびカスタマイズされたエンティティフィールド) に入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スケジュール済みスクリプト実行フォーム

パラメーター	説明
アサインされたエンティティの目標関係を移行する	(戦略的計画 ユーザーの場合) [会社]、[事業部門]、[部門]、[ポートフォリオ] 以外のレンズエンティティとの m2m 関係を作成している場合、目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルのデータに基づく [目標] フォーム にある [アサインされたエンティティタイプ] フィールドと [アサインされたエンティティ] フィールドに値が入力されます。 ユーザーがすでに m2m 関係を作成している場合は、このスクリプトを使用して、それぞれのポートフォリオ計画のこれらの目標にアクセスして管理するために、それらの関係を m2m テーブルから目標テーブルに移動できます。 目標に、割り当てエンティティテーブルタイプとの関係が 1 つしかない場合、[エンティティタイプのアサイン **(Assign entity type)]** フィールドと [エンティティのアサイン **(Assign entity)]** フィールドが、目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルに基づいて 設定されます。 目標に割り当てエンティティテーブルタイプとの関係が複数ある場合、関係の数 (n) のクローンされたサブ目標が作成され、[エンティティタイプのアサイン **(Assign entity type)]** フィールドと [エンティティのアサイン **(Assign entity)]** フィールドが、それぞれのクローンされたサブ目標の目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルにあるデータに基づき、目標 [sn_gf_goal] テーブルに入力されます。

計画立案アイテムの人件費を生成するための [スケジュール済みスクリプト実行] フォーム

[スケジュール済みスクリプト実行] フォームを使用して、計画立案アイテムに対して「人件費を生成」と「エピックの人件費を生成」スケジュール済みジョブを有効にします。

[アイテムのスケジュール] フォーム

フィールド	説明
名前	このスケジュール済みジョブを識別する名前
アクティブ	スケジュール済みジョブがアクティブであり、指定された日時に実行する必要があることを示すオプション
実行	スケジュール済みジョブの実行に使用する時間間隔： • 日次：指定された時刻に毎日実行されます。 • 週次：指定された時刻と曜日に、毎週実行されます。 • 月次：指定された日の時刻に、毎月実行されます。 • 定期的：指定した繰り返し間隔で実行されます。 • **1**回：1 回のみ実行されます。 • オンデマンド：オンデマンドですぐに実行されます。 • ビジネスカレンダー：エントリ開始：[ビジネスカレンダー] フィールドで選択したビジネスカレンダーのエントリ開始日に実行されます。ビジネスカレンダーに定義した各ビジネスエントリの開始日にスケジュール済みジョブが実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アイテムのスケジュール] フォーム (続く)

フィールド	説明
	たとえば、ビジネスカレンダーが会計年度を表し、各エントリの開始日が会計月である場合、スケジュール済みジョブは毎月最初の日に実行されます。 • ビジネスカレンダー：エントリ終了：[ビジネスカレンダー] フィールドで選択したビジネスカレンダーの終了日に対して実行されます。この選択は、[ビジネスカレンダー：エントリ開始] と同じ方法で実行されますが、関連するビジネスカレンダーエントリの終了日に対して実行されます。 注: [ビジネスカレンダー：エントリ開始 **(Business Calendar: Entry Start)**] または [ビジネスカレンダー：エントリ終了 **(Business Calendar: Entry End)**] を選択すると、オフセット係数を適用して、選択したビジネスカレンダーの時間スパンの前または後にジョブを実行するようにスケジュールを設定できます。詳細については、[オフセットタイプ **(Offset Type)**] フィールドと [オフセット **(Offset)**] フィールドを参照してください。 ビジネスカレンダーの作成と使用、およびビジネスカレンダーエントリの定義の詳細については、「Creating business calendars」および「Define business calendar entries」を参照してください。
タイムゾーン	スケジュール済みジョブの実行時間を指定するときに [時間] フィールドエントリで使用するタイムゾーン。タイムゾーンエントリを次のように選択します。 • なし：スケジュール済みジョブを作成しているログインユーザーのデフォルトのタイムゾーンを使用します。 たとえば、ユーザーのアサインされたタイムゾーンが米国太平洋標準時であり、[時間] フィールドに 16:45 と入力した場合、スケジュール済みジョブは米国太平洋標準時の午後 4 時 45 分に実行されます。 • システムのタイムゾーンを使用：実行するインスタンスに指定されたデフォルトのシステムタイムゾーンを使用します。 たとえば、インスタンスのデフォルトのシステムタイムゾーンがヨーロッパ/ロンドンであり、[時間] フィールドに 22:15 と入力した場合、スケジュール済みジョブはロンドン時間の午後 10 時 15 分に実行されます。 • 実際のタイムゾーン。 たとえば、[米国/東部] を選択し、[時間] フィールドに 13:30 と入力した場合、スケジュール済みジョブは米国東部標準時の午後 1 時 30 分に実行されます。
日	スケジュール済みジョブを実行する日。 • [実行] が [週次] の場合は、曜日を選択します。たとえば、水曜日を選択します。 • [実行] が [月次] に設定されている場合は、月の日を選択します。たとえば、毎月 25 日の場合、25 を選択します。 このフィールドは、[実行] フィールドで [月次] または [週次] を選択した場合にのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アイテムのスケジュール] フォーム (続く)

フィールド	説明
繰り返し間隔	スケジュール設定された各ジョブ実行の繰り返し間隔の期間。期間を日数、時間数、または分数で入力します。例： • 4 日ごとにスケジュール済みジョブを実行するには、[日数] フィールドに「04」と入力します。 • 26 時間ごとに実行するには、[時間] フィールドに「26」と入力します。 • 13:30:25 の間隔で繰り返す必要がある場合は、[時間] フィールドに「13」と入力し、その後のラベルのない 2 つのフィールドに「30」と「25」を入力します。 これらのフィールドは、[実行] フィールドで [定期的] を選択した場合にのみ表示されます。 **注:** この設定では、夏時間の変更は考慮されません。たとえば、期間に 1 日を選択した場合、計算によりジョブの開始時間が 24 時間追加されます。開始時間が夏時間 (DST) の期間であり、そのタイムゾーンが DST でない場合、ジョブは 1 時間オフセットされて実行されます。
ビジネスカレンダー	スケジュール済みジョブに対するビジネスカレンダーの開始日または終了日を決定するために使用しているビジネスカレンダーエントリ。このフィールドは、[時間] フィールドで [ビジネスエントリ：開始日 **(Business Entry: Start Date)**] または [ビジネスエントリ：終了日 **(Business Entry: End Date)**] を選択した場合にのみ表示されます。
オフセットタイプ (Offset Type)	このジョブをスケジュール設定するために選択したビジネスカレンダーに適用する時間オフセットのタイプ (存在する場合)。 • 過去 **(Past)**：オフセット係数を適用して、選択したビジネスカレンダーの時間スパンの開始前に実行するジョブをスケジュール設定します。 • 将来 **(Future)**：オフセット係数を適用して、選択したビジネスカレンダーの時間スパンの終了後に実行するジョブをスケジュール設定します。 • なし：このジョブのスケジュール設定に時間オフセットを適用しません。 オフセット係数を追加すると、次のユースケースに対するビジネスカレンダーで定義された正式な時間スパンの前または後にジョブの実行をスケジュール設定できます。 • 選択したビジネスカレンダーの時間スパン外である特定の時間にジョブをスケジュール設定します。 • 選択したビジネスカレンダーの時間スパンに沿って複数のジョブを順番に実行するように調整します。 [オフセットタイプ] フィールドと [オフセット] フィールドは、[実行] フィールドで [ビジネスカレンダー：エントリ開始] または [ビジネスカレンダー：エントリ終了] を選択した場合にのみ表示されます。
オフセット (OffSet)	このジョブをスケジュール設定するために選択したビジネスカレンダーに適用する時間オフセットの量 (日、時間、分、秒)。たとえば、ビジネスカレンダーの開始日よりも

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アイテムのスケジュール] フォーム (続く)

フィールド	説明
	3 日、14 時間、10 分、45 秒前にジョブを開始するようにスケジュール設定する場合は、次のようにします。 • [オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [過去 **(Past)]** を選択します。 • [日数] フィールドに「**3**」と入力します。 • [時間] フィールドに「**14**」、「**10**」、「**45**」と入力します。 [オフセット日数 **(Offset days)]** フィールドと [時間] フィールドは、[実行] フィールドで [ビジネスカレンダー：エントリ開始] または [ビジネスカレンダー：エントリ終了] を選択し、[オフセットタイプ] フィールドで [過去] または [予定] を選択した場合にのみ表示されます。
時刻	スケジュール済みジョブを実行する時刻。時間、分、秒を 24 時間形式で表します。[タイムゾーン] フィールドで選択した内容によって、このエントリのタイムゾーンが決まります。 **注:** 時間値は常に、ServiceNow AI Platform® に UTC 時間で保存されてから、適切な時間に変換されます。この変換は、選択した [タイムゾーン] と [時間] フィールドのエントリによって異なります。 このフィールドは、[実行] フィールドで [日次]、[週次]、または [月次] を選択した場合にのみ表示されます。
開始中	最初にスケジュール設定されたジョブ生成の日時。カレンダー日時を選択します。このフィールドは、[実行] フィールドで [定期的] を選択した場合にのみ表示されます。
優先度	スケジュール済みジョブの数値の優先度： • 必須ジョブの優先度値を 100 未満に設定します。 • 必須でないジョブの優先度値を 100 より高く設定します。 • すべてのスケジュール済みジョブの 70 パーセント以上が [期限切れ] の場合、100 を超える値でマークされたジョブは実行されません。
実行方法	スケジュール済みジョブを作成して実行するユーザーの名前。スケジュール済みジョブを作成するユーザーの代わりにスケジュール済みジョブをシステムにアサインするには、システムまたはダミーユーザーを作成し、このフィールドに追加します。
条件付き	関連するスクリプトで特定の条件が満たされた場合にスケジュール済みジョブの実行を有効にするオプション。
条件	スケジュール済みジョブを実行するかどうかを決定する条件付きスクリプト。スクリプトの最後の式はブール値 (true/false) で評価されます。このテキストボックスは、[条件を使用 **(Use conditions)]** を選択した場合にのみ表示されます。
開始中	最初にスケジュール設定されたジョブ生成の日時。カレンダー日時を選択します。このフィールドは、[実行] フィールドで [定期的] を選択した場合にのみ表示されます。

テーブルマップフォーム

テーブルマップフォームのフィールドについて理解します。このフォームを使用して、アジャイル開発 2.0、SAFe、PPM と統合するレコードに新しいカスタムテーブルマップを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

テーブルマップフォーム

フィールド	説明
配置統合	配置統合タイプを指定します。デフォルトでは、値は **[ServiceNow** 内部] です。
実行テーブル	戦略的計画 のテーブルとマッピングする必要がある アジャイル開発 2.0、SAFe、または PPM のテーブル。例：欠陥 [rm_defect]。
配置テーブル	アジャイル開発 2.0、SAFe、または PPM のテーブルとマッピングする必要がある 戦略的計画 のテーブル。例：マイルストーン [sn_milestones_milestone]。
マイルストーンテーブルマップ	このフィールドは、プロジェクト [pm_project] テーブルマップにのみ関連します。これは、プロジェクトポートフォリオ管理ワークスペースから 戦略的計画 にプロジェクトのマイルストーンを統合するための新しいマイルストーンテーブルマップ (sn_milestones_milestone) への参照です。他のすべてのテーブルマップでは、[マイルストーンテーブルマップ] フィールドは使用できません。
実行テーブルフィルター	PPM、アジャイル開発 2.0、または SAFe から関連レコードを取得するためのフィルター条件。たとえば、[ポートフォリオ] が [HR] である、[アクティブ] が [True] である、などです。
配置テーブルフィルター	戦略的計画 から関連レコードを取得するためのフィルター条件。
アクティブフラグ	テーブルマップ同期がアクティブであることを確認します。このフィールドはデフォルトでオンになっています。
添付ファイルを同期する	添付ファイルがアプリケーション間で同期されていることを確認します。このフィールドはデフォルトでオンになっています。

自動翻訳

利益計画のターゲット自動化スクリプト

事前定義された利益計画スクリプトをターゲットソースとして使用して、関連する作業アイテムの利益計画からターゲットの実績値を自動化します。

次の事前定義された利益計画スクリプトを使用して、ターゲットにターゲットソースを設定します。スクリプトは、金銭または金銭以外の利益計画に必要なデータをフェッチし、ターゲットの実績値を更新します。このスクリプトはそのまま使用することも、要件に応じて変更することもできます。コンテキスト変数を作成して、このターゲットソースに設定することもできます (利益計画)。

```
result = '';
var benefitPlans = new GlideRecord(sn_gfa.GFAdvancedConstants.BENEFIT_PLAN_TABLE);
benefitPlans.addQuery('sys_id', 'IN', benefit_plan);
benefitPlans.query();

var nonMonetaryBenefitSum = 0;
var monetaryBenefitSum = 0;
var hasMonetary = false;
var hasNonMonetary = false;
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
while (benefitPlans.next() && !(hasMonetary && hasNonMonetary)) {
    if (!gs.nil(benefitPlans.getValue('currency'))) {
        monetaryBenefitSum += parseInt(benefitPlans.getValue('actual_benefit'));
        hasMonetary = true;
    } else {
        nonMonetaryBenefitSum += parseInt(benefitPlans.getValue('nm_actual_benefit'));
        hasNonMonetary = true;
    }
}

if (hasMonetary && hasNonMonetary)
    gs.addErrorMessage(gs.getMessage('The Benefit Plan list can contain either monetary or
 non-monetary benefit plans.'));
else
    result = hasMonetary ? monetaryBenefitSum : nonMonetaryBenefitSum;
```

[ターゲットブレークダウン] フォーム

[ターゲットブレークダウン] フォームを使用して、ターゲットブレークダウンと目標の進捗状況を追跡して測定します。

[ターゲットブレークダウン] フォーム

フィールド	説明
ブレークダウン期間	ターゲットブレークダウンの期間。
親ブレークダウン	ターゲットブレークダウンの年。
ターゲット	ターゲットブレークダウンの親ターゲット。
ステータス	ターゲットブレークダウンのステータス。ステータスは、ターゲットブレークダウンが終了予定日までに完了する可能性が高いかどうかを示します。
ブレークダウン	親ターゲットで指定されたブレークダウン間隔。
計画されたターゲット	ターゲットブレークダウンのターゲット値。
実績	ターゲットブレークダウンの実際の値。
注釈	実績を更新する場合のビジネス上の根拠について入力した注釈。

[ターゲット] フォーム

目標の進捗状況を追跡して測定するために、目標フォームを使用します。

注:
ESG ワークスペースおよび 戦略的計画 のユーザーの場合、ワークスペース内のフォームに他のフィールド (デフォルトビューとカスタムフォームビューのどちらにも追加されていないもの) を表示するには、デフォルトまたはカスタムのフォームレイアウトを構成します。フォームレイアウトの構成方法については、「フォームレイアウトの構成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ターゲット] フォーム

フィールド	説明
名前	ターゲットの名前。
目標	関連付けられた目標の名前。このフィールドは、[目標] フォームの [ターゲット] 関連リストからターゲットを作成するときに自動的に入力されます。
説明	ターゲットの簡単な説明。
状況	ターゲットのステータス：ドラフト、処理中、承認済み、完了。
ステータス	ターゲットのステータス。ステータスは、ターゲットブレークダウンが終了予定日までに完了する可能性が高いかどうかを示します。

進捗状況	実行が完了したターゲットの割合。この値は自動的に計算されます。
	
	[タイプ] フィールドが [最大化] に設定されている場合、進捗状況の値は次の式を使用して計算されます。
	
	`Progress = (Actual value - Base value) / (Target value - Base value) x 100`
	
	[タイプ] フィールドが [最小化] に設定されている場合、進捗状況の値は次の式を使用して計算されます。
	
	`Progress = (Base value - Actual value) / (Base value - Target value) x 100`
	
	重み付けスケールが定義されているときの進捗値の計算方法の詳細については、「進捗値の計算」を参照してください。

目標への影響	目標の他のターゲットと比較したターゲットの重要度を表す数値。サブ目標が存在する場合は、相対的な重み付けとその後の進捗状況の計算でも考慮されます。デフォルトでは、 値は **(1)** [どちらでもない] です。 使用可能なオプションは、次のとおりです。 • **(0)** 影響なし • **(1)** どちらでもない • **(2)** 中 • **(3)** 高 • **(4)** 非常に高 • **(5)** 最大 **注:** このフィールドは、**[sn_gf.weighted_average_enabled]** システムプロパティが [はい] に設定されている場合にのみ使用できます。
オーナー	ターゲットの所有者。デフォルトでは、ターゲットを作成するユーザーの名前が入力されます。
貢献者	ターゲットの達成に貢献するユーザー。デフォルトでは、関連付けられた目標の貢献者が入力されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ターゲットフォームの [期間] セクション

フィールド	説明
開始日	ターゲットの開始日。デフォルトでは、関連付けられた目標の開始日が入力されます。
終了日	ターゲットの終了日。デフォルトでは、関連付けられた目標の終了日が入力されます。

ターゲットフォームの [メトリクス] セクション

フィールド	説明
測定単位	指定された値の測定タイプ。コスト、時間、レートなど、使用する測定項目。使用可能な測定タイプは、単位 [sn_gf_units] テーブルに格納されています。測定単位は、ターゲットのタイプを定性的または定量的として定義します。定量的ターゲットに使用可能な単位は **[#]**、**[$]**、**[%]**、および [日] です。定性的ターゲットに使用可能な単位は [はい]/[いいえ] です。
タイプ	達成の方向を示すターゲットタイプ。 • 最大化：進行方向は基準値からターゲット値に向かっており、基準値はターゲット値よりも小さくなければなりません。 • 最小化：進行方向は基準値からターゲット値に向かっており、ターゲット値は基準値よりも小さくなければなりません。 • マイルストーン：固定タイプ。ターゲットの達成度をキャプチャするには、定性的ターゲット値 (ターゲットの [測定単位] フィールドで設定) のみが許可されます。[マイルストーン] オプションは、定性的ターゲットにのみ適用されます。 [タイプ] フィールドは、値が定性的ターゲットの [マイルストーン] として入力され ([測定単位] フィールドが定性的ターゲット値に設定されている場合)、読み取り専用になります。
開始値	ターゲットの開始値。開始値は、現在値または現在の値と見なすこともできます。 [実際の値] フィールドに値を入力すると、このフィールドは読み取り専用になります。[基準値] フィールドの値を更新するには、[実際の値] フィールドをクリアします。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが [最大化] または [最小化] に設定されている場合に使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ターゲットフォームの [メトリクス] セクション (続く)

フィールド	説明
最終ターゲット値	ターゲットの最終ターゲット値。目標値は意欲的で、チームにやりがいを起こさせるものでなければなりません。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが [最大化] または [最小化] に設定されている場合に使用できます。
ベースライン参照	将来のパフォーマンスの参考となる、ターゲットの過去の達成度。この値は参照のみを目的としており、ターゲット進捗の計算には考慮されません。
現在までの実績	特定の時点でのターゲットの実際値。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが [最大化] または [最小化] に設定されている場合に使用できます。
チェックイン頻度	ターゲットのブレークダウン間隔と、所有者または貢献者がターゲットの実際の値を更新する頻度を指定するオプション。ターゲットを短い期間にブレークダウンすると、ターゲットを短い期間に設定して、特定のブレークダウンターゲットに絞り込むことができます。使用可能なオプションは、[日次]、[週次]、[月次]、[四半期ごと]、 および [年次] です。このフィールドを [なし] 以外の利用可能なオプションに設定すると、ターゲットブレークダウンが自動的に作成されます。ターゲットブレークダウンの詳細については、「戦略的計画 でのターゲットブレークダウン」を参照してください。 **注:** ターゲットブレークダウン機能は定性的ターゲットではサポートされていません。
ターゲット値配布	累積または非累積で計算されるターゲットを指定するオプション。利用可能なオプションは、[期間 全体に均等に分割 (非累積)] と [期間 全体に直線的に広がる (累積)] です。 このフィールドは、[チェックイン頻度] フィールドが [なし] 以外の利用可能なオプションに設定されている場合にのみ使用できます。
備考	実績を更新する場合のビジネス上の根拠についてユーザーが入力した注釈。
チェックイン期限	ターゲットの所有者または貢献者がターゲットの実績値を更新する必要がある期日。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ターゲットフォームの [メトリクス] セクション (続く)

フィールド	説明
機密	ターゲットレコードのアクセスを [許可されたグループ] および [許可されたユーザー] フィールドに入力された特定のユーザーに制限するオプション。 このフィールドは、ESG Management アプリケーションがインストールされていて、かつ *sn_grc.enable_record_confidentiality* プロパティが有効な場合に利用できます。このフィールドは、ターゲットの目標フォームの [分類] フィールドが [環境]、 [ソーシャル]、または [ガバナンス] として設定されている場合にのみ適用されます。このフィールドを設定するために必要なロールは sn_esg.reader です。 **注:** ターゲットレコードが機密とされているかどうかに関係なく、ターゲットの進捗状況の値は目標までロールアップされて、目標の進捗値が計算されます。
許可されたグループ	ターゲットレコードにアクセスできるユーザーグループ。このフィールドは、ESG ワークスペース ユーザーにのみ適用されます。 このフィールドに入力されているユーザーグループでも、sn_esg.reader ロールがなければ、機密レコードにアクセスすることはできません。 このフィールドは、[機密] フィールドが **true** に設定されている場合に使用できます。
許可されたユーザー	ターゲットレコードにアクセスできるユーザー。このフィールドは、ESG ワークスペース ユーザーにのみ適用されます。 このフィールドに入力されているユーザー名でも、sn_esg.reader ロールがなければ、機密レコードにアクセスすることはできません。 このフィールドは、[機密] フィールドが **true** に設定されている場合に使用できます。
コメント	コラボレーションを促進するための、ターゲットに関する詳細なコメント。

[ターゲット] フォームの [ターゲット自動化] セクション

フィールド	説明
実際の値の自動化	ターゲットのターゲット自動化機能を有効にするオプション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ターゲット] フォームの [ターゲット自動化] セクション (続く)

フィールド	説明
実際の値のソース	ターゲットのレビュー期日にターゲットの実績値を自動更新するためにデータがフェッチされるターゲットソーステーブル。 このフィールドは、[実績値の自動化] フィールドが **true** に設定されている場合に使用できます。

ターゲットフォームの [変数] セクション

このセクションは、[実績値ソース] フィールドで選択されるターゲットソースで使用可能なコンテキスト変数に基づいて表示されます。

[実績値ソース] を [利益計画] (利益計画の事前定義されたターゲット自動化スクリプト) として選択すると、このセクションに [利益計画] フィールドが表示され、ターゲットの実際の価値を自動化するために必要な利益計画を選択できます。

注:
利益計画カスタムスクリプトは、PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理) がインストールされている場合にのみ使用できます。選択する福利厚生プランが見つからない場合は、Heisenberg UI から次の場所に移動して同じものを検索して選択できます エンタープライズゴール管理 > ターゲット ターゲットフォームを開きます。

ターゲットソースフォーム

ターゲットソースフォームを使用して、ターゲットのソースを構成し、ターゲットの実績値が自動更新されるようにします。

ターゲットソースフォーム

フィールド	説明
名前	ターゲットソースの名前。
有効	このターゲットソースの使用を有効にするオプション。
タイプ	ターゲットソースのタイプ。利用可能なオプションは次のとおりです。 • アセスメント/サーベイ • **PA** インジケーター • カスタムスクリプト
詳細	事前定義されたスクリプトを使用して、ターゲット ソースタイプ [アセスメント/サーベイ] の [カスタムスクリプト] オプションを有効にします。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが [アセスメント/サーベイ] に設定されている場合に使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ターゲットソースフォーム (続く)

フィールド	説明
アセスメントメトリクスタイプ	ターゲットソースのアセスメントメトリクスタイプ。 ヒント: フィールドに [評価方法] = [アセスメント] のメトリクスタイプが入力されている場合、ターゲットソースのコンテキスト変数が自動的に作成されます。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが [アセスメント/サーベイ] に設定されている場合に使用できます。
アセスメントメトリクスカテゴリ	アセスメントメトリクスタイプのアセスメントメトリクスカテゴリ。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが [アセスメント/サーベイ] に設定されている場合に使用できます。
説明	ターゲットソースの簡単な説明。
PA インジケーター	ターゲットソースの PA インジケーター。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが **[PA** インジケーター] に設定されている場合に使用できます。
ブレークダウン	PA インジケーターのブレークダウン このフィールドは、[タイプ] フィールドが **[PA** インジケーター] に設定されている場合に使用できます。
カスタムスクリプト	ターゲットソースの ServiceNow AI Platform テーブルから必要なデータをフェッチするカスタムスクリプト。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが [カスタム] に設定されている場合に使用できます。または、 [タイプ] フィールドが [アセスメント/サーベイ] に設定されていて、[詳細] フィールドが **true** に設定されている場合。

UX リストカテゴリフォーム

UX リストカテゴリフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 ワークスペースの [リスト] メニューのリストに追加のカテゴリを作成します。

フィールド	説明
タイトル	ワークスペースでのカテゴリの表示名。
アプリケーション	アプリケーションスコープ。アプリケーションスコープが [ポートフォリオ計画]に設定されていることを確認します。
順番	このカテゴリがワークスペースに表示される順番。
有効	ワークスペースでのこのカテゴリの表示を有効にするオプション。
説明	カテゴリの簡単な説明。
設定	リストカテゴリが参照している構成。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	デフォルトでは、このフィールドは **[APW リストメニュー構成 (APW List Menu Configuration)]** に設定されています。

関連情報

戦略的計画 ワークスペースでのリストのカスタマイズ

UX リストフォーム

UX リストフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 ワークスペースの [リスト] メニューの追加のリストを作成します。

フィールド	説明
タイトル	ワークスペースでのカテゴリの表示名。
アプリケーション	アプリケーションスコープ。アプリケーションスコープが [ポートフォリオ計画]に設定されていることを確認します。
順番	このカテゴリがワークスペースに表示される順番。
カテゴリ	ワークスペースでこのリストが表示されるカテゴリ。
有効	ワークスペースでのこのカテゴリの表示を有効にするオプション。
テーブル	リストのソーステーブル。
設定	リストカテゴリが参照している構成。 デフォルトでは、このフィールドは **[APW リストメニュー構成 (APW List Menu Configuration)]** に設定されています。
条件	ソーステーブルのデータをフィルターする条件。
列	ワークスペースのリストに表示する必要があるテーブルの列。
列でグループ化	レコードのリストをグループ化するために使用される属性。
表示	ワークスペースのリストに表示する列を決定するビュー。ビューを選択すると、[列] フィールドが無効になります。

関連情報

戦略的計画 ワークスペースでのリストのカスタマイズ

ビュールールフォーム

ビュールールフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、戦略的計画 の新規計画立案アイテムタイプのフォームビューに関するワークスペースビュールールを定義します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

新しいビュールールフォーム

フィールド	説明
名前	計画立案アイテムのルールを識別する一意の名前。 例：**new_pi_type-alignment-planner**
アプリケーション	 このフィールドは、スコープに基づいて、自動的に **[Strategic Planning]** に設定されます。 このフィールドに別の値が表示されている場合は、ServiceNow インスタンスが **[Strategic Planning]** スコープ内にあることを確認してください。
テーブル	作成した計画立案アイテムテーブルを選択します。
表示	次のいずれかを選択します。 • APW デフォルト • デフォルト

関連情報

戦略的計画 の新規計画立案アイテムフォームに対するワークスペースビュールールの作成

ウィジェットの関連性フォーム

これらのフォームのフィールドを使用して、ウィジェットをプロジェクトテーブルに関連付け、財務で表示します。

ウィジェットの関連性フォーム

フィールド	説明
関連性 ID	ウィジェットに関連付けるレコード。ルックアップアイコンを使用して、テーブルを特定して選択します。 関連するレコードにアクセスするには、 [テーブル名] リストで [テーブル **[sys_db_objects]]** テーブルを選択し、[ドキュメント] リストで [投資] を選択する必要があります。
関連付けテーブル	ウィジェットに関連付けるテーブル。 リストからテーブル [sys_db_objects] を選択する必要があります。
ウィジェット	ウィジェットの一意の名前。
順番	プロジェクトワークスペースの [財務] タブの他のウィジェットに関連するウィジェットの位置。 ウィジェットは番号順に表示され、最も小さい番号が最初に表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ウィジェットの関連性フォーム (続く)

フィールド	説明
カードに表示	[財務] タブにウィジェットを表示するオプション。
デフォルトで含める	[財務] タブにデフォルトでウィジェットを表示するオプション。

ウィジェットの新規レコードフォーム

これらのフォームフィールドを使用して、プロジェクト管理用の新しいウィジェットを作成します。

ウィジェットフォーム

フィールド	説明
名前	ウィジェットの一意の名前。
スクリプト化	ウィジェットの値がコードスクリプトから取得されたことを示すオプション。 デフォルトでは、このオプションは選択され、読み取り専用です。
ラベルを表示	ラベルまたは色インジケーターを表示するためのオプション。 このチェックボックスをオフにすると、[色] フィールドが表示され、色を設定できます。
有効	ウィジェットのステータスを示すためのオプション。 プロジェクトワークスペースの [財務] タブには、アクティブなウィジェットのみを表示できます。
親ウィジェット	現在のウィジェットの親であるウィジェット。 現在のウィジェットが、選択したウィジェットの [子ウィジェット] 関連リストに表示されます。 最大 3 個の子ウィジェットを親ウィジェットに追加できます。
フォーマッターが必要	ウィジェットに通貨フォーマッターが必要かどうかを指定するためのオプション。

スクリプト	ウィジェットに表示される要求されたメトリクス値を返すコードスクリプト。
	
	スクリプトでは、コンテキストオブジェクトとフィルターオブジェクトを使用します。コンテキストオブジェクトには、すべてのプロジェクト財務フィールド (capex_costs、opex_costs、budget_cost など) が含まれています。
	
	次のサンプルスクリプトは、ウィジェットに表示するプロジェクトの [完了時の推定 (EAC)] メトリクス値を返します。
	
	`var context = JSON.parse(context);`
	`var filter = context.filters;`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウィジェットフォーム (続く)

フィールド	説明

	var now_GR = new GlideRecord('pm_project');
	gr.addEncodedQuery(filter['pm_project']);
	gr.query();
	if(gr.next())
	gr.getValue('forecast_cost');
	Collapse

簡単な説明	ウィジェットの説明。

エンタープライズアジャイル計画 は 戦略的計画 の値のいずれか


ServiceNow® エンタープライズアジャイル計画 は、チーム間のコミュニケーションとコラボレーションを簡素化し、さまざまなチームとの調整を促進します。直感的なワークスペースを使用して、柔軟な作業とチーム構造の構成により、アジャイルフレームワークを組織全体に拡張します。

https://player.vimeo.com/video/1059081473?h=9af475911c&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

エンタープライズアジャイル計画 (EAP) は SPM Pro ライセンスを使用して ServiceNow Store から戦略的計画アプリケーションをインストールすると利用できます。


開始

探索

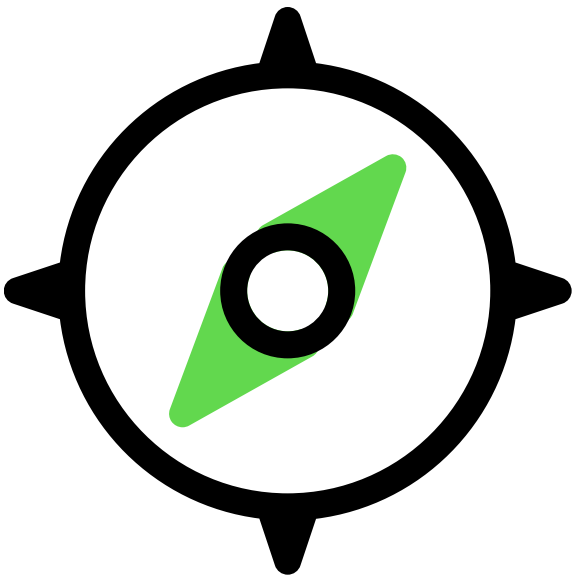

Enterprise Agile Planning の機能について説明します。

構成

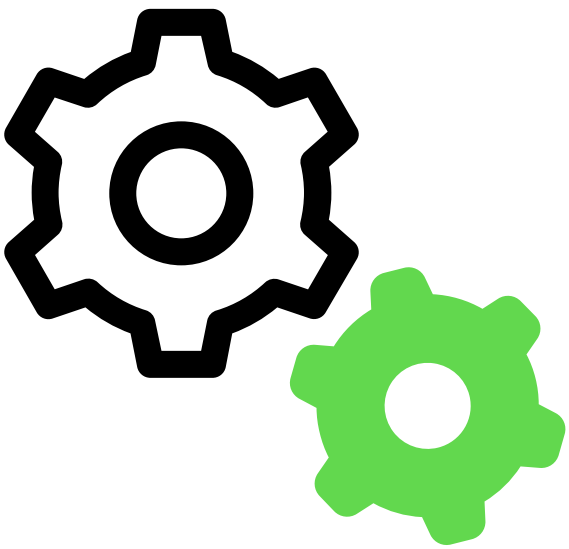

アジャイル構成、チームレベル、および作業タイプを設定します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用方法



バックログを作成し、プログラムインクリメントを計画し、アサインされた作業の進捗状況を評価します。

参照

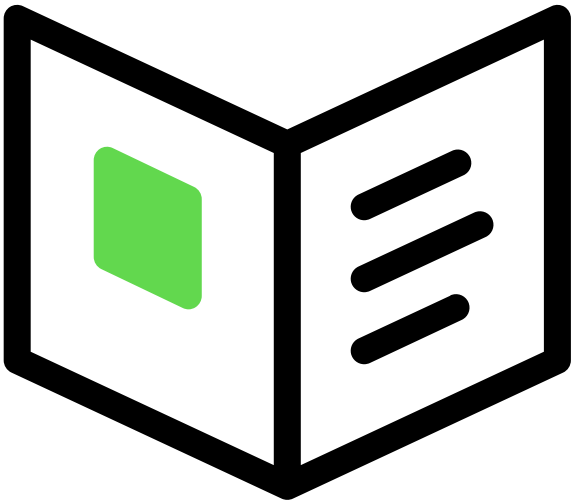

ロール、テーブル、プロパティ、フォーム、リストなどの EAP コンポーネントの詳細を取得します。

トラブルシューティングとサポート

- で質問や回答をする 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) フォーラム ServiceNow コミュニティ
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

エンタープライズアジャイル計画 の探索

エンタープライズアジャイル計画 (EAP) の詳細およびそれが組織にもたらすメリットについて説明します。

エンタープライズアジャイル計画 のメリット

スクラムリーダー、プロダクトオーナー、ポートフォリオマネージャー、ソリューショントレーニングエンジニア、アジャイルリリーストレーニングエンジニアなどは、次の EAP 機能を使用してアジャイルフレームワークを拡張できます。

メリット	機能
バックログを管理して作業に優先順位を付ける。	バックログ
PI とスプリントの作成、チームへの作業のアサイン、チームレベルの反復へのこの作業のスケジューリングなどのアクティビティを作成して計画する。	バックログ
チームとアジャイルリリーストレイン (ART) 間の依存関係を管理する。	計画ボード
アクティビティを追跡して進捗状況を可視化する。	バックログ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メリット	機能
リアルタイムかつ非同期的にコラボレーションしてブロッカーの解決策について話し合う。	バックログ
定期的に運用されていないカンバンチームの作業を管理し、進捗状況を効率的に追跡します。	カンバンタイプのチームのバックログと計画ボード
チーム階層と作業階層を柔軟に構成する。	EAP のアジャイル構成
アジャイルチームとその作業アイテムに関するあらゆる種類のドキュメントを一元的に保存および管理します。	でドキュメントを使用したコラボレーション EAP
ページコンテンツを要約してインサイトを得たり、Now Assist を使用してコンテンツを絞り込んでコンテンツの品質を向上させたりします。	SPM の Now Assist を使用した EAP のドキュメントコンテンツの要約と絞り込み
Now Assist を使用して作業アイテムのストーリーを自動的に生成することで、時間を節約し、手作業を削減します。	Now Assist for SPM を使用したエピックと機能のストーリーの生成
反復レベルまたはチームレベルの反復で目標を定義して、チームがビジネス価値に準拠し、組織の目標に貢献する作業のヴィジビリティを高める。	EAP の反復目標と作業アイテム目標
データを可視化した事前構成済みのダッシュボードを使用して、チームの進捗状況やパフォーマンスを分析し、主要なメトリクスを追跡する。	EAP ダッシュボード

エンタープライズアジャイル計画の構成

チームが EAP でバックログ管理と PI 計画を開始できるように、構成を有効化し、チームをアジャイル構造に追加して、計画カレンダーを定義します。

構成の概要

次のタスクには EAP admin (sn_apw_advanced.eap_admin) ロールが必要です。

1. 戦略的計画 のインストール。

   エンタープライズアジャイル計画 は戦略的計画ワークスペース内で利用できます。

2. EAP ロールをユーザーにアサインします。「エンタープライズアジャイル計画 とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
3. EAP の構成、チームレベルの階層、および作業アイテムタイプのロールアップについて説明します。

   「EAP のアジャイル構成」を参照してください。

4. (オプション) EAP での構成の作成と更新。
5. EAP 構成のアクティブ化
6. EAP の構成にチームを追加して、アジャイル構造を定義します。「EAP でのアジャイル構造の定義」を参照してください。
7. アジャイル構造でチームのダッシュボードを設定します。

次のタスクにはシステムアドミニストレーターロールが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. (オプション) 追加の計画カレンダータイプを作成します。「EAP での計画カレンダーの作成」を参照してください。
2. EAP での反復カレンダーエントリの作成。
3. (オプション) デフォルトで使用できるタイプとは異なるタイプのチームまたは作業アイテムが必要な場合は、カスタムタイプを作成できます。「EAP でのカスタムチームタイプの作成」および「EAP でのカスタム作業アイテムタイプの作成」を参照してください。


EAP のアジャイル構成

アドミンと協力してチームのニーズに応じて構成を更新できるように、エンタープライズアジャイル計画 (EAP) で利用可能なさまざまなSAFe構成について説明します。

デフォルト EAP 構成

構成には、チームレベルの構造と作業アイテムタイプが含まれます。関連するチームレベル、作業アイテムタイプ、および計画カレンダーマッピングを含む次のアジャイル構成をデフォルトで使用できます。

- 完全な構成
- 基本構成
- 大規模なソリューション構成
- ポートフォリオ構成
- カンバンの構成

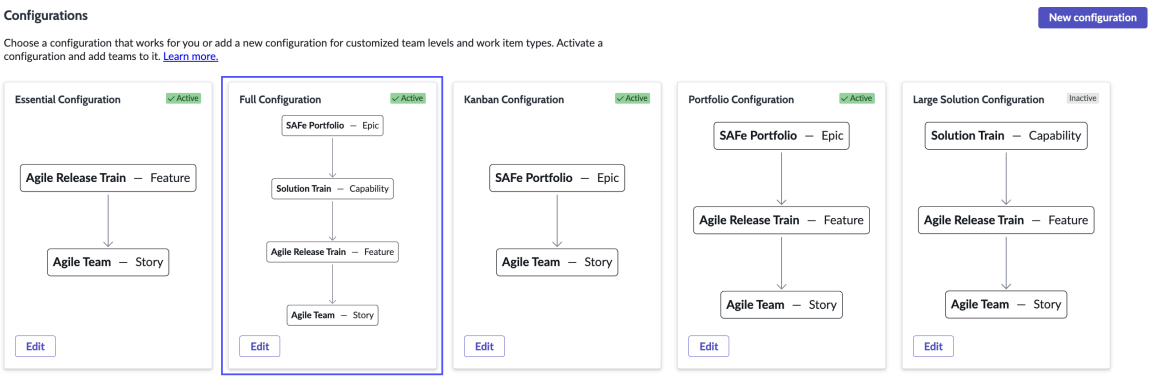


戦略的計画 デモデータをインストールした場合は、[完全な構成] が有効になります。別の構成を有効にするか、新しい構成を定義するかを選択できます。

詳細については、「EAP 構成のアクティブ化」または「EAP での構成の作成と更新」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

既定のチームレベルと作業アイテム階層

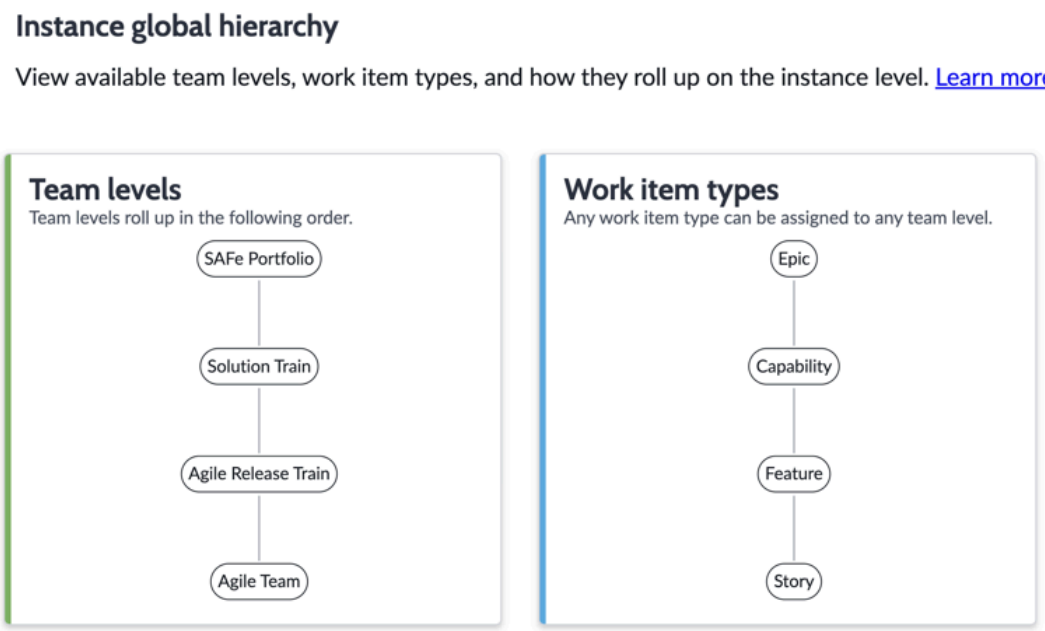

- EAP チームは、[ポートフォリオ] > [ソリューショントレイン (Solution Train)] > [アジャイルリリーストレイン] > [アジャイルチーム] の階層に従います。
- 作業アイテムタイプは、[エピック] > [ケイパビリティ] > [機能] > [ストーリー] の階層に従います。

  ただし、新しい構成をセットアップしたり、既存の構成を編集したりするときに、任意の作業アイテムタイプを任意のチームレベルに割り当てることができます。たとえば、機能をソリューショントレインレベルにマッピングしたり、ストーリーを ART レベルにマッピングしたりすることができます。組織内のチームの運用方法に基づいて、EAP 構成を柔軟に定義または更新できます。

- EAP で使用されるすべての作業アイテムタイプは、EAP 計画立案アイテム [sn_align_core_eap_planning_item] テーブルから拡張され、さらに 戦略的計画 の計画立案アイテム [sn_align_core_planning_item] テーブルから拡張されます。
- ストーリーレコードはストーリー [rm_story] テーブルに保存されます。

  カスタム作業アイテムタイプを作成することもできます。「EAP でのカスタム作業アイテムタイプの作成」を参照してください。

EAP での構成の作成と更新

エンタープライズアジャイル計画 (EAP) で独自のアジャイル構成を定義するか、既存の構成を更新します。

始める前に

戦略的計画 のインストール。

ServiceNow インスタンスのアプリケーションスコープを「戦略的計画 (Strategic Planning)」に設定します。


必要なロール：sn_apw_advanced.eap_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. [設定] メニューから、 エンタープライズアジャイル計画 > 設定.
3. 構成を作成するか、既存の構成を更新するかを選択します。
   - 作成するには、[新規構成] を選択します。
   - 更新するには、使用可能な構成のいずれかから [編集] を選択します。

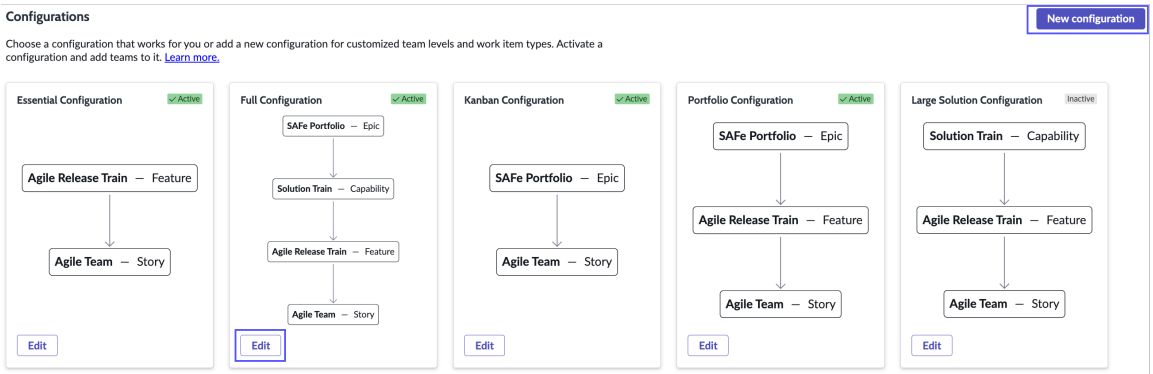

4. フォームのフィールドに入力または更新します。


新規構成フォーム

フィールド	説明
構成名	構成を識別する名前。
状況	構成のステータス。このフィールドのデフォルト値は [非アクティブ] です。 エンタープライズアジャイル計画 でアジャイルチームが使用できるようにするには、[アクティブ] に変更します。
Agile Development と同期 (Sync with Agile Development)	計画の間隔やスプリントなどの反復を アジャイル開発 2.0と同期するには、このオプションを選択します。詳細については、「EAP と アジャイル開発 2.0 の統合」を参照してください。 チームがカンバンタイプの場合、このオプションをオフのままにしておくことができます。

5. この構成内で使用できるようにする作業アイテムタイプを選択します。
   ここで有効にした作業アイテムタイプのみが、バックログおよび計画ボードでアジャイルチームで使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

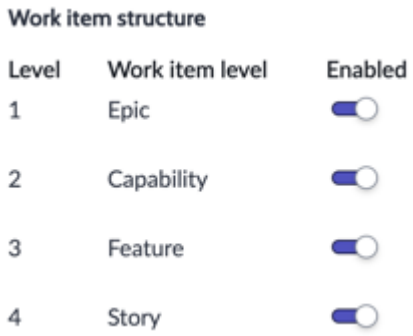


6. 構成に含めるチームレベルを選択します。

   ここで有効にしたチームレベルに基づいて、それらのエンティティのみをアジャイル構造に追加できます。たとえば、構成で [ソリューショントレイン **(Solution Train)]** チームレベルを有効にしていない場合、ソリューショントレインをアジャイル構造に追加したり、バックログまたは計画ボードからソリューショントレインの作業を計画したりすることはできません。

7. 既定の作業アイテムタイプを選択して、各チームレベルとその計画カレンダーで使用可能にします。

   定期的に実施されるスクラムチーム

   計画カレンダーはアジャイルリリーストレイン (ART) とアジャイルチームに対してのみ設定でき、デフォルトで利用可能な計画カレンダータイプは [計画の間隔] と [スプリント] です。別のカレンダーが必要な場合は、作成します。「EAP での計画カレンダーの作成」を参照してください。

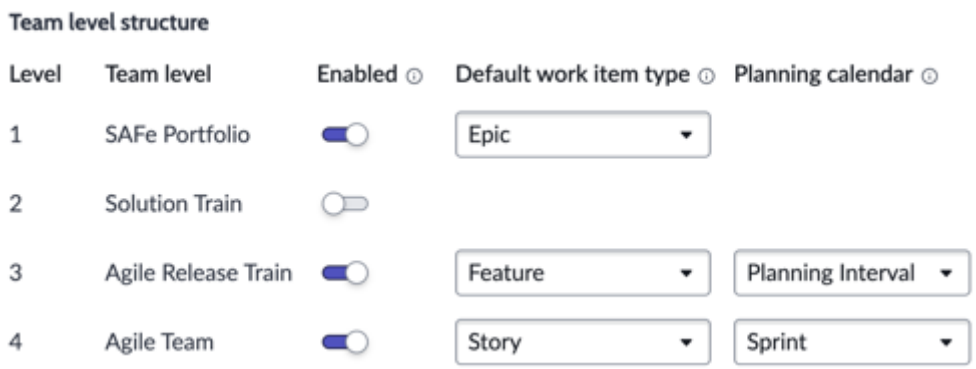


   カンバンチーム

   チームがカンバンスタイル (定期的な計画間隔スケジュールのない継続的なワークフロー構造) で運営している場合は、[計画カレンダー] フィールドを [なし] に設定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

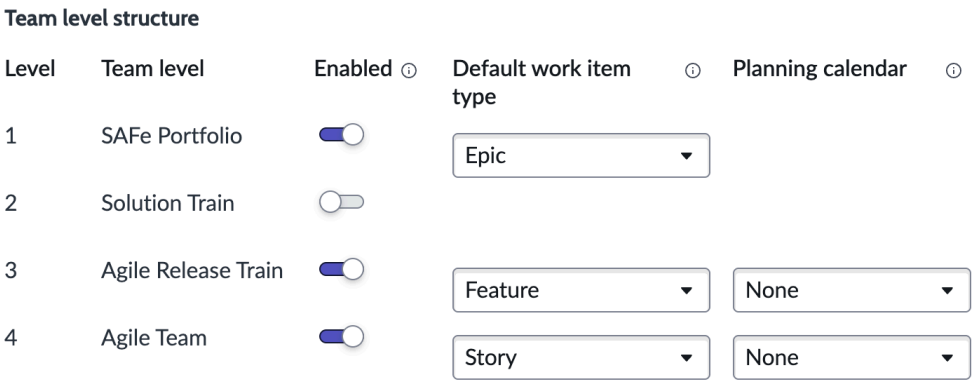

8. **[Save** (保存)] を選択します。

次のタスク

- チームが関連付けられているアクティブな構成の計画カレンダーの選択を更新した場合は、関連するダッシュボード構成も更新します。このアクションにより、それらのチームに表示されるメトリクスが正確であることが保証されます。「での計画カレンダー変更のダッシュボードの更新 EAP」を参照してください。
- EAP 構成のアクティブ化

EAP でのアジャイル構造の定義

組織のエンティティとチームを エンタープライズアジャイル計画 (EAP) の構成に追加して、ユーザーが EAP のバックログおよび計画ボードでそれらの作業を計画できるようにします。

始める前に

EAP 構成のアクティブ化。

ServiceNow インスタンスの [アプリケーションスコープ] が [戦略的計画 **(Strategic Planning)]** に設定されていることを確認します。

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_admin

このタスクについて

https://player.vimeo.com/video/1067467329?h=d09d828790&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

構成に基づいて、ポートフォリオ、ソリューショントレイン、ART、アジャイルチームなどのエンティティを、構成のさまざまなチームレベルに追加します。

> **注:**
> このタスクの例として、[完全な構成 **(Full Configuration)]** を使用して説明します。EAP で他の構成にエンティティとチームを追加するためのガイダンスとして、以下の手順を使用します。

手順


1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.

2. [設定] メニューから、 エンタープライズアジャイル計画 > アジャイル構造.

3. 構成名の横にある [+] アイコン (+) を選択して、ポートフォリオを追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

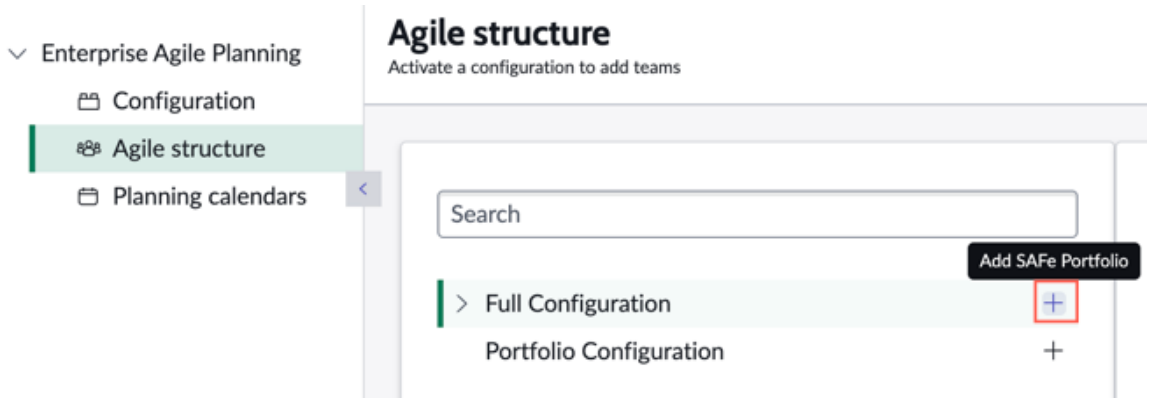

a. [SAFe ポートフォリオ] フォームに、名前、説明、親ポートフォリオなどの詳細を入力します。


b. [送信] を選択します。

c. アクションを繰り返して、必要な数のポートフォリオを追加します。

4. 他のエンティティをポートフォリオに追加するには、このアクションを繰り返します。

- ポートフォリオにソリューショントレインを追加します。
- ソリューショントレインに、アジャイルリリーストレイン (ART) を追加します。
- ART に、アジャイルチームを追加します。

  アジャイルチームとして追加するチームのタイプは [アジャイル] である必要があります。新しいチームが必要な場合、または既存のチームが見つからない場合は、アドミニストレーターにお問い合わせください。詳細については、「アジャイル開発 2.0 のアサイン先グループ」を参照してください。

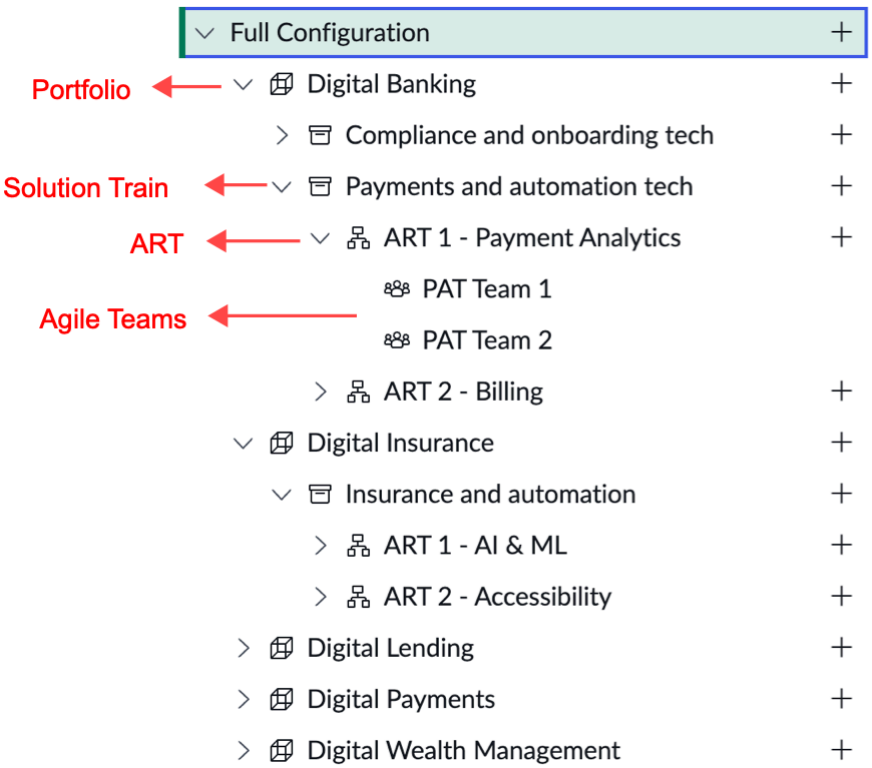

EAP 構成のアクティブ化

エンタープライズアジャイル計画 (EAP) で新規または既存の構成をアクティブ化して、ユーザーがチームの作業計画を開始できるようにします。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
ServiceNow インスタンスのアプリケーションスコープを「戦略的計画 (Strategic Planning)」に設定します。

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_admin

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. [設定] メニューから、 エンタープライズアジャイル計画 > 設定.

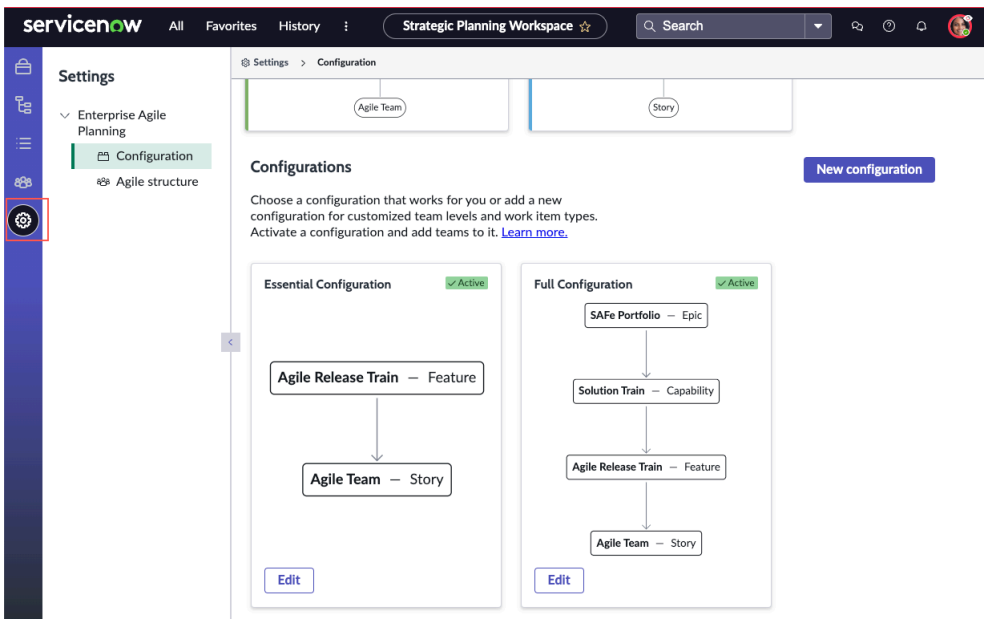

3. 使用可能な構成のいずれかから [編集] を選択します。
4. 構成フォームで、[ステータス] フィールドを [アクティブ] に設定します。
5. [保存] を選択します。

次のタスク
構成にチームを追加します。「EAP でのアジャイル構造の定義」を参照してください。

EAP バックログおよび計画ボードでのその他の作業項目タイプの表示の構成

ポートフォリオ、ソリューショントレイン、アジャイルリリーストレイン、アジャイルチームなどの EAP チームの [バックログ] ページと [計画ボード] ページでさまざまな作業アイテムタイプを表示できるようにします。

始める前に
インスタンスの アプリケーションスコープ が **[Strategic Planning]** に設定されていることを確認します。

必要なロール：admin

このタスクについて
EAP チームの計画ボードには、既定の構成で有効になっている作業項目のみが表示されます。たとえば、[完全な構成] を含むソリューショントレインの場合、バックログおよび計画ボードにはデフォルトでケイパビリティのみが表示されます。製品マネージャーまたはチームメンバーが、機能、エピック、ストーリーなどの他の作業項目タイプの表示を切り替える場合は、チームレベルの構成の詳細を更新して表示できます。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクでは、Enterprise アジャイル構成の詳細テーブル [sn_apw_advanced_eap_configuration_detail] でアジャイルチームの [計画作業タイプ] または [バックログ作業タイプ] フィールドを更新するためのガイダンスを提供します。


手順

1. 移動先 すべて > エンタープライズアジャイル計画 > **EAP** 構成.

2. 作業アイテムタイプの選択を更新する必要がある構成を選択します。

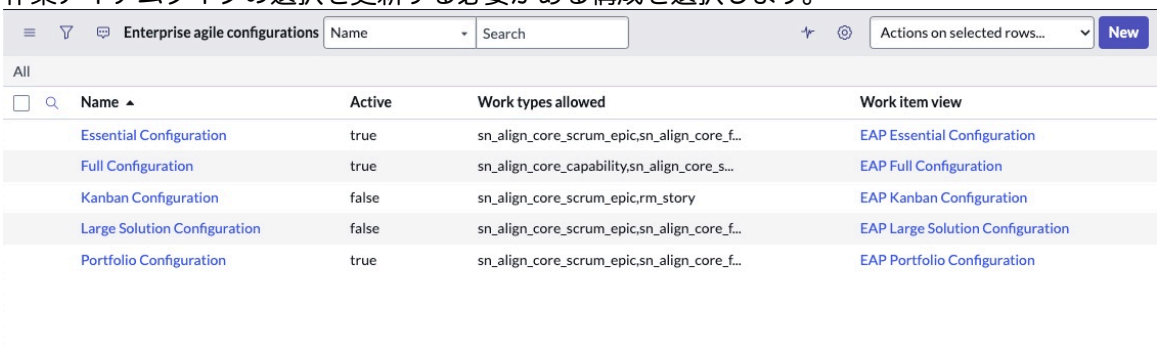

3. [Enterprise アジャイル構成の詳細] 関連リストで、更新するチームレベルを選択します。

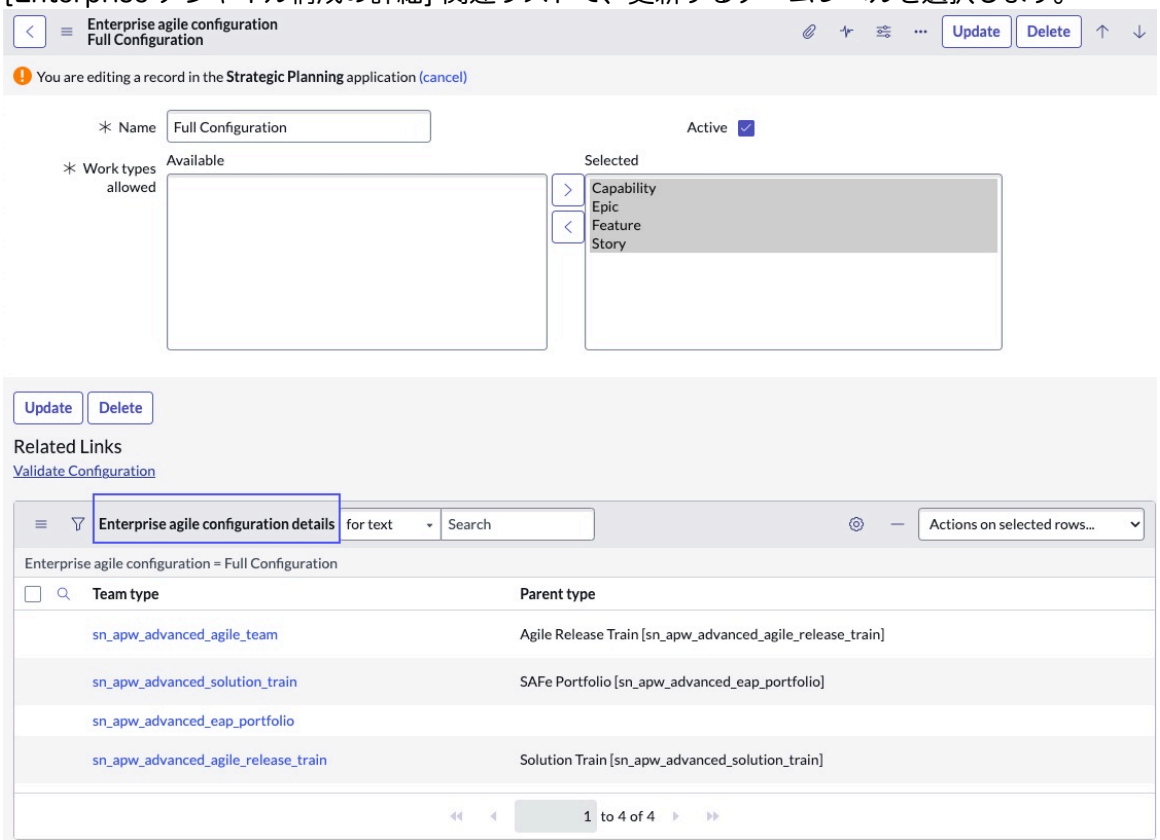


4. 次のフィールドで作業タイプを更新します。

- [バックログ] ページで複数の作業アイテムタイプを表示できるようにするバックログ作業タイプ。
- [計画ボード] ページで複数の作業アイテムタイプを表示できるようにする計画作業タイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

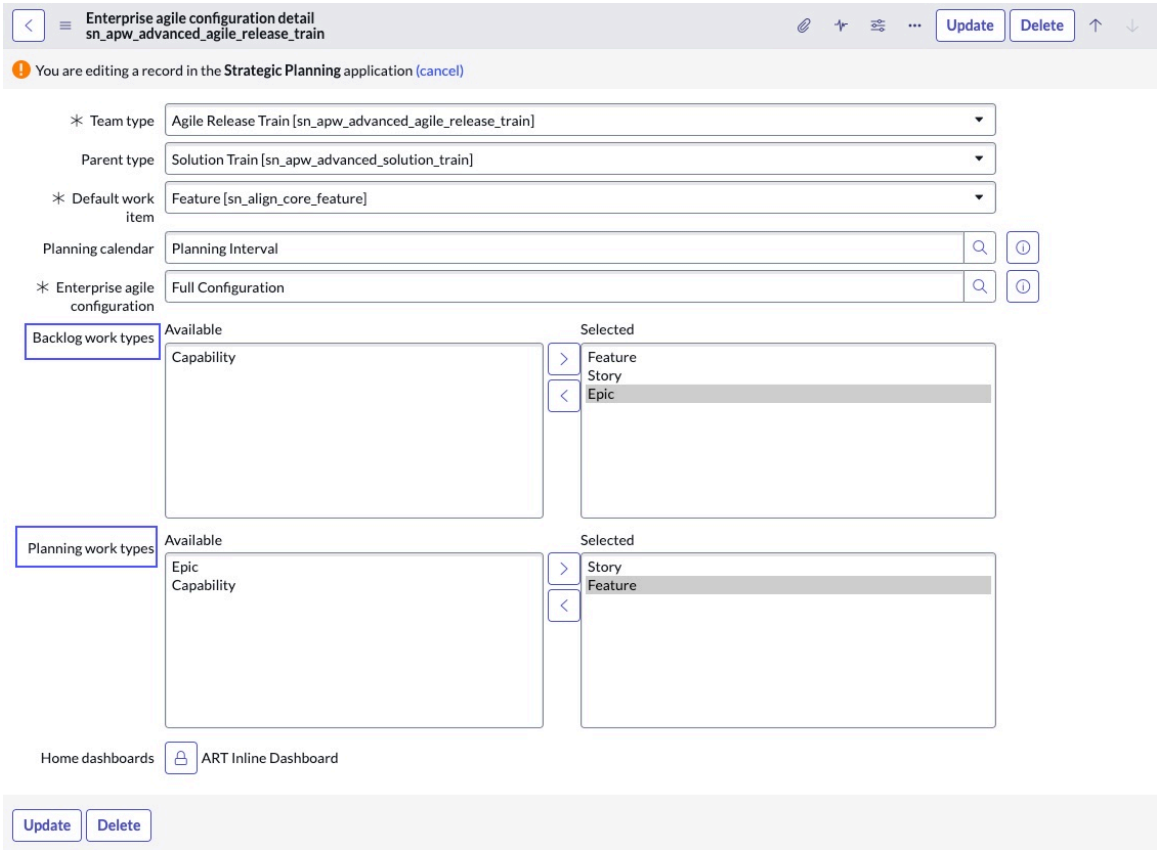

5. [更新] を選択して、フォームへの変更を保存します。

6. 他のチームレベルで複数の作業タイプを有効にするには、手順 3 ～ 5 を繰り返します。

関連情報

でのチームバックログの管理 EAP

での PI 計画の実行 EAP

EAPバックログの反復の表示制限を設定する

システムプロパティを作成して、 エンタープライズアジャイル計画 のバックログで EAP チームに表示される反復回数の制限を変更します (EAP)。

始める前に
インスタンスのアプリケーションスコープが **[Strategic Planning]** に設定されていることを確認します。

必要なロール：admin

このタスクについて
既定では、EAP チームの [バックログ] ページに表示されるイテレーションの数は 6 です。組織のプロセスでバックログに表示する反復回数を増やす必要がある場合は、システムプロパティ *`sn_apw_advanced.eap_backlog_iterations_limit`* を作成し、表示制限を更新します。

手順

1. sys_properties.list に移動します。

2. [New (新規)] を選択します。

3. フォームで、フィールドに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

システムプロパティフォーム

フィールド	説明
サフィックス	*sn_apw_advanced.eap_backlog_iterations_limit*
タイプ	整数
値	バックログ内の望ましい最大反復回数

その他のフォームフィールドの詳細については、「システムプロパティの追加」のフィールド説明テーブルを参照してください。

4. **[Submit** (送信)] を選択します。

EAP構成のエピック方法論を更新する

アジャイルワークフローに基づいて、 エンタープライズアジャイル計画 構成のエピック方法論を SAFe またはスクラムに変更します。

始める前に

ServiceNow インスタンスのアプリケーションスコープを「戦略的計画 (Strategic Planning)」に設定します。

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_admin または admin


このタスクについて

デフォルトでは、 EAP 構成のエピック方法論は **SAFe** に設定され、この構成に対して作成されたすべてのエピックは SAFe エピックです。アジャイルチームの希望する作業方法に基づいて、エピック方法論をスクラムに変更するか、SAFe として保持することができます。

> **注:**
> EAP構成のエピック方法論は、関連付けられている作業アイテムがない場合にのみ更新できます。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > エンタープライズアジャイル計画 > **EAP** 構成.
2. Enterprise アジャイル構成のリストから、方法を変更する構成を見つけます。
3. [エピック方法論] セルをダブルクリックして、値を変更および更新します。

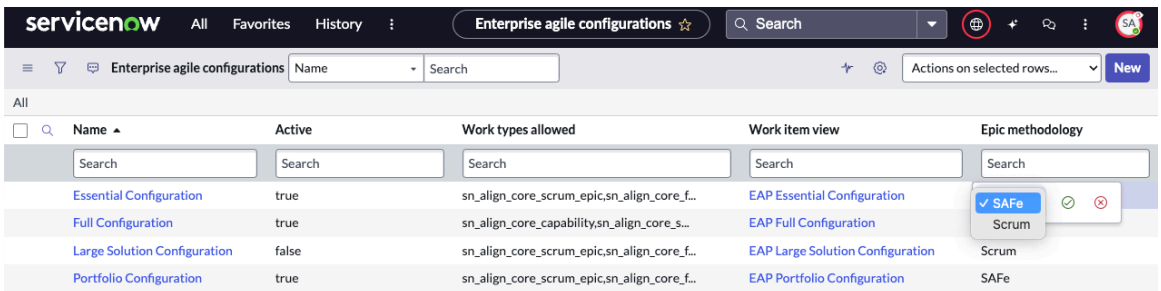

ServiceNowインスタンスに [エピック方法論] 列が表示されない場合は、リストヘッダーの [カスタマイズリストの更新] アイコン ( ) を使用して列の設定をカスタマイズします。

EAP での計画カレンダーの作成

リリースなど、組織で使用する追加の計画カレンダーを作成して、選択したカレンダーで作業を計画および追跡できるようにします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
[スプリント] と [計画の間隔 (Planning Interval)] は、デフォルトで利用可能な 2 つの計画カレンダーです。別の計画カレンダーを作成するには、EAP の設定メニューから作成します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. [設定] メニューから、 エンタープライズアジャイル計画 > 計画カレンダー.
3. **[New** (新規)] を選択します。
4. フォームのフィールドに入力します。

Enterprise アジャイルカレンダーフォーム

フィールド	説明
名前	カレンダーの一意の名前。
ラベル	このカレンダーが EAP アプリケーションでどのように表示されるかを示すラベル。
複数形ラベル	このカレンダーのラベルの複数形。
反復タイプ	このカレンダーが属するタイプ。[計画の間隔 **(Planning Interval)]** と [スプリント] から 1 つを選択します。
親	このカレンダーの親カレンダー。 たとえば、計画の間隔がスプリントの親など。
説明	カレンダー、そのユースケース、およびその他の詳細の簡単な説明。

5. [保存] を選択します。

次のタスク
新しく作成されたカレンダーのエントリを作成します。「EAP での反復カレンダーエントリの作成」を参照してください。

EAP の計画カレンダーの上書き

エンタープライズアジャイル計画 の構成時に設定されたデフォルトのカレンダーを上書きすることで、Agile リリーストレーニング (ART) またはアジャイルチームの計画カレンダーを柔軟に変更できます。

始める前に
ServiceNow インスタンスのアプリケーションスコープを「戦略的計画 (Strategic Planning)」に設定します。

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_admin

このタスクについて
カレンダーの上書きオプション EAP 設定は、チームが EAP で使用する計画カレンダーを変更するのに役立ちます。このようにして、チームは独自の計画カレンダーを選択できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

新しいカレンダーは、現在のカレンダーの終了日より後に有効になります。カレンダーを遅かれ早かれ有効にする場合は、現在のカレンダーで反復を追加または削除する必要があります。

新しいカレンダーは子チームに自動的に適用されます。たとえば、ART の計画カレンダーが変更された場合、この ART に関連付けられているすべての子 EAP チームは新しい計画カレンダーに従う必要があります。

この変更は、更新した ART にのみ適用されます。


手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. [設定] メニューから [アジャイル構造] を選択し、ART に移動します。
3. ART の [詳細] タブで、[計画カレンダーの上書き] フィールドの値を選択します。
   ここで選択する計画カレンダーには、このチームとその子チームに対して反復を作成できるように、カレンダーエントリーが必要です。
4. [保存] を選択します。
   このページには、新しいカレンダーが既存のカレンダーを上書きする日付が表示されます。

   たとえば、ここに示すスクリーンショットでは、新しいカレンダーの [計画の間隔] が 2024 年 7 月 30 日である既存のカレンダーを上書きするように設定されています。以前のカレンダーの使用に戻す場合は、次の操作を行います。
   - 2024 年 7 月 30 日までに、[計画カレンダーの上書き] フィールドをクリアします。
   - 2024 年 7 月 30 日以降、古いカレンダーを [計画カレンダーの上書き] フィールドの値として設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

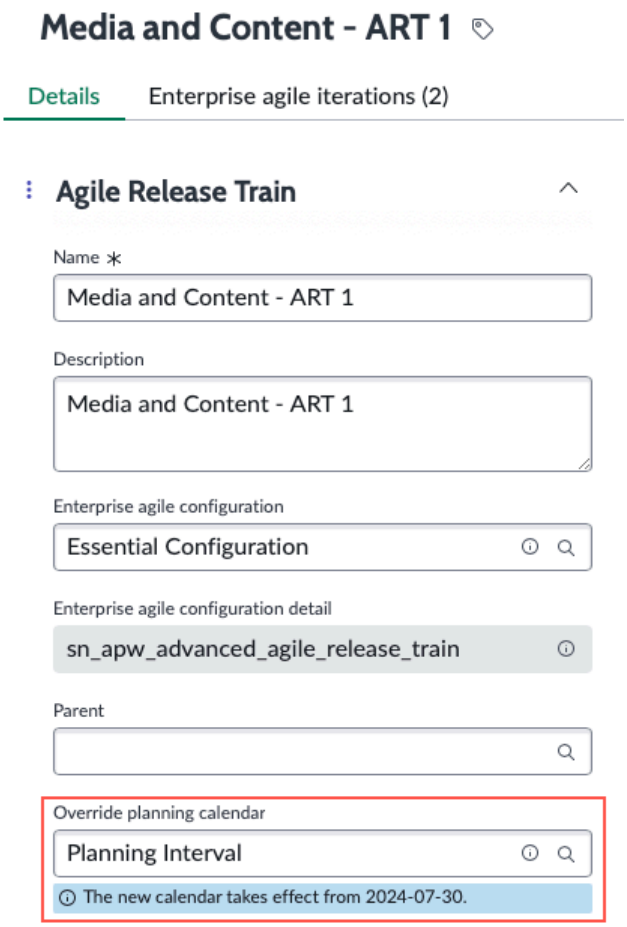

新しいカレンダーが有効になると、子チームは今後のすべての反復でそれを継承します。アジャイルチームの場合、[計画カレンダーの上書き] フィールドは読み取り専用であり、親 ART とは別に変更することはできません。

EAP での反復カレンダーエントリの作成

計画カレンダーのタイムラインを定義して、チームが エンタープライズアジャイル計画 のバックログおよび計画ボードで独自の反復を作成できるようにします。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

このタスクについては、例として計画の間隔 (PI) とスプリントを使用して説明します。これらはワークスペースでデフォルトで利用可能なカレンダーであり、PI はスプリントの親として設定されます。


このタスクを終えるまでに、PI とその子スプリントのタイムラインを定義します。EAP チームは、この定義されたタイムライン内で、選択した命名規則に従って独自のチーム固有の PI とスプリントを作成できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. [設定] メニューから、 エンタープライズアジャイル計画 > 計画カレンダー.
3. [計画の間隔 **(Planning Interval)**] を選択して、エントリを登録します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [新しいカレンダーエントリ **(New calendar entry)]** を選択します。
5. フォームで、エントリの名前と、計画の間隔の開始日と終了日を入力します。
   たとえば、2024 年 1 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日までの PI を作成するとします。
6. PI の開始日と終了日に基づいて、スプリントカレンダーのカレンダーエントリを作成します。
   a. [スプリントに子エントリを作成 **(Create child entries on Sprint)]** を選択します。
   b. [子エントリの数 (スプリント) **(Number of child entries (Sprint))]** フィールドに、この PI に対して作成するスプリントの数を入力します。
   c. [スプリント期間 (日数) **(Sprint length (days))]** フィールドに、スプリントを構成する日数を入力します。
   2024 年 1 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日までの PI について、それぞれ 14 日間の長さの 6 つのスプリントを作成できます。

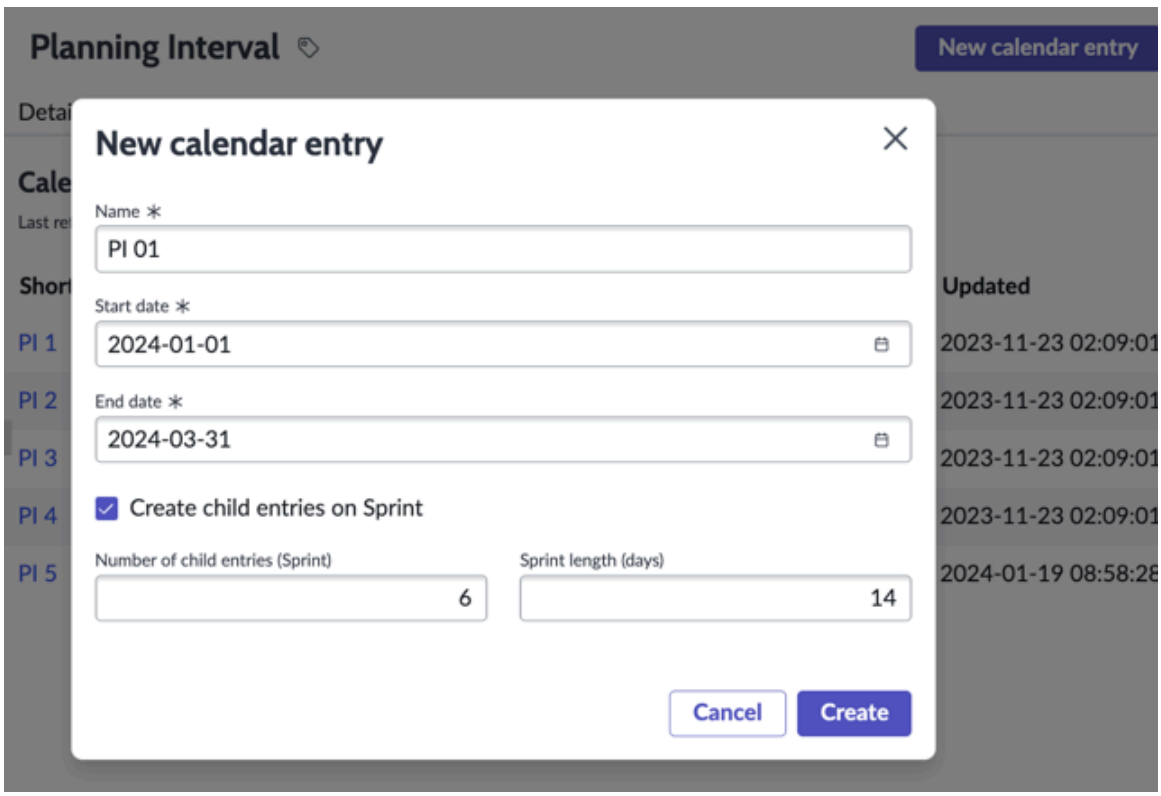


7. [作成] を選択します。

タスクの結果
PI とその子スプリントは定義したタイムラインで作成されます。EAP チームは、独自の命名規則を使用して独自の PI とスプリントの反復を作成できます。

Example:
PI 1 は 2024 年 1 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日に作成されます。この PI 内で、それぞれ長さが 14 日間の 6 つの子スプリントが作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

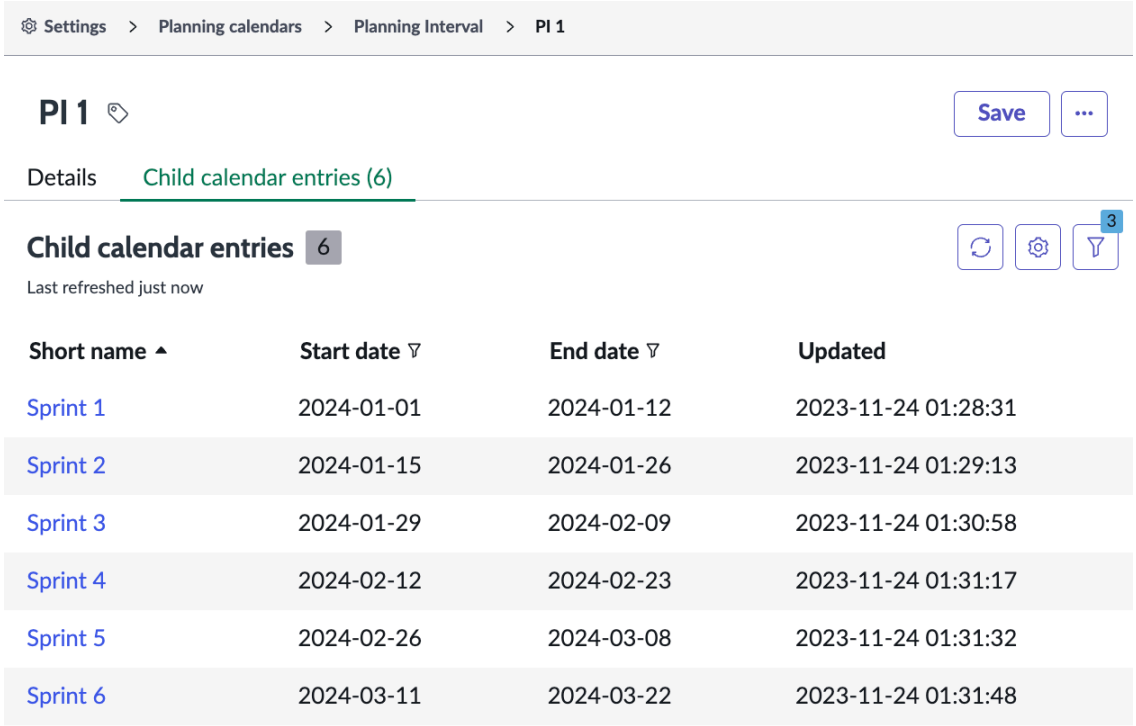

Short name	Start date	End date	Updated
Sprint 1	2024-01-01	2024-01-12	2023-11-24 01:28:31
Sprint 2	2024-01-15	2024-01-26	2023-11-24 01:29:13
Sprint 3	2024-01-29	2024-02-09	2023-11-24 01:30:58
Sprint 4	2024-02-12	2024-02-23	2023-11-24 01:31:17
Sprint 5	2024-02-26	2024-03-08	2023-11-24 01:31:32
Sprint 6	2024-03-11	2024-03-22	2023-11-24 01:31:48


デジタルバンキングのポートフォリオでは、チームは次のように独自の ART とスプリントを作成します。

- Payment Analytics ART は、**Digi bank ST2 ART1 PI1** と **Digi bank ST2 ART1 PI2** の 2 つの PI を作成します。
- アジャイルチームの PAT チーム 1 と PAT チーム 2 は、次の PI 内でスプリントを作成します。
  - PAT チーム 1 は、**PAT 1** スプリント **1**、**PAT 1** スプリント **2** などを作成します。
  - PAT チーム 2 は、**PAT 2** スプリント **1**、**PAT 2** スプリント **2** などを作成します。

チームは、これらの PI とスプリントを使用して作業をスケジュールできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

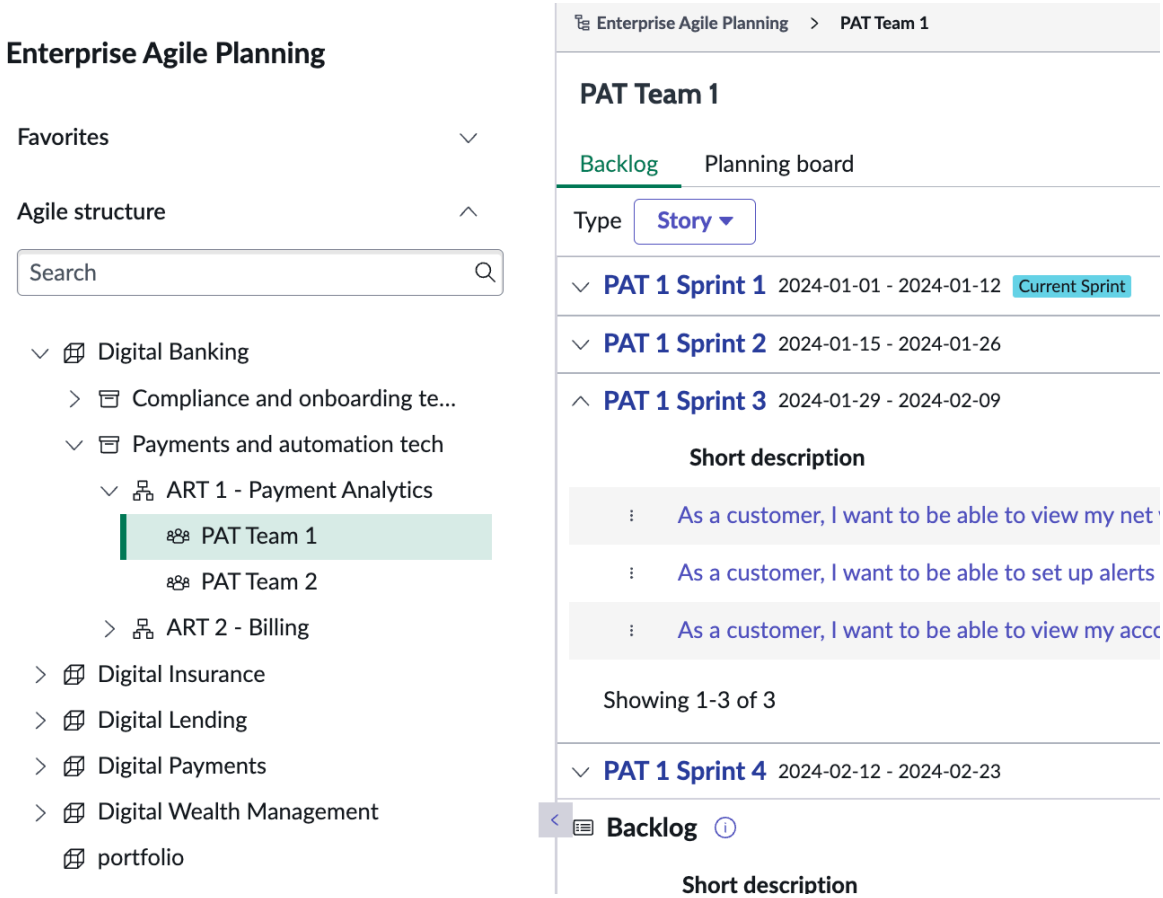

EAP でのカスタムチームタイプの作成

エンタープライズアジャイル計画 のアジャイル構成に含めるカスタムチームタイプを作成します。

始める前に
インスタンスのアプリケーションスコープを [ポートフォリオ計画コア (Portfolio Planning Core)] に設定します。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

   フィールドの詳細については、「[作業アイテムタイプ] フォーム」を参照してください。
4. オプション: [モジュールの作成] チェックボックスの選択を解除します。
5. [送信] を選択します。

EAP でのカスタム作業アイテムタイプの作成

エンタープライズアジャイル計画 のアジャイル構成に含めるカスタム作業アイテムタイプを作成します。

始める前に
インスタンスのアプリケーションスコープを [ポートフォリオ計画コア (Portfolio Planning Core)] に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

   フィールドの詳細については、「[作業アイテムタイプ] フォーム」を参照してください。
4. オプション: [モジュールの作成] チェックボックスの選択を解除します。
5. [送信] を選択します。

次のタスク
新しい作業アイテムタイプのテーブルに対して、関連するフォームビューとリストビューを作成します。「EAP 作業アイテムのフォームビューの作成または更新」および「EAP 作業アイテムのリストビューの作成または更新」を参照してください。

EAP 作業アイテムのフォームビューの作成または更新

作業アイテムタイプのフォームビューを作成または更新して、エンタープライズアジャイル計画 の [バックログ] ページおよび [計画ボード] ページに表示されるフィールドがチームの要件に合うようにします。

始める前に
インスタンスのアプリケーションスコープを [ポートフォリオ計画コア (Portfolio Planning Core)] に設定します。

必要なロール：admin

このタスクについて
作業アイテムテーブルのフォームビューの構成によって、ワークスペースに表示されるフィールドが決まります。EAP の作業アイテムタイプの場合、必要なフォームビューは次のとおりです。

- EAP デフォルト：[完全な詳細] ページに表示するフィールドを決定します。
- EAP プレビュー：バックログまたは計画ボードのサイドパネルに表示するフィールドを決定します。
- EAP 新規：バックログまたは計画ボードから作業アイテムを作成するときに表示するフィールドを決定します。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [拡張テーブル] 列の **[EAP** 計画立案アイテム **(EAP planning item)]** を使用して、テーブルのリストをフィルタリングします。
3. 作成した作業アイテムタイプを選択します。
4. [レイアウトフォーム] 関連リンクを選択します。
5. フォームビューを作成するか、更新します。
6. [保存] を選択します。

次のタスク
EAP 作業アイテムのリストビューの作成または更新。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

EAP 作業アイテムのリストビューの作成または更新

作業アイテムタイプの EAP リストビューを作成または更新して、エンタープライズアジャイル計画の [バックログ] ページに表示される列がチームの要件に合うようにします。

始める前に

インスタンスのアプリケーションスコープを [ポートフォリオ計画コア (Portfolio Planning Core)] に設定します。

必要なロール：admin

このタスクについて

EAP リストビューの構成は、ワークスペースの [バックログ] ページで作業アイテムに表示される列を決定します。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [拡張テーブル] 列の **[EAP** 計画立案アイテム **(EAP planning item)]** を使用して、テーブルのリストをフィルタリングします。
3. 作成した作業アイテムタイプを選択します。
4. [リストレイアウト] 関連リンクを選択します。
5. EAP リストビューを作成するか、その構成を更新します。
6. [保存] を選択します。

でのカスタムダッシュボードの構成 EAP

カスタムダッシュボードを エンタープライズアジャイル計画 構成に関連付けて、チームの主要なメトリクスを追跡および測定します。

ダッシュボード構成の概要

ダッシュボードを使用して、進捗状況、ブロッカー、チームパフォーマンスの傾向など、アジャイルチームのメトリクスを可視化します。デフォルトのダッシュボードを関連付けるかカスタムクエリを使用してダッシュボードを作成して、アジャイルチームの特定のメトリクスを表示および追跡できます。

EAP には、さまざまなデフォルト構成で次のダッシュボードがあります。

EAP 構成のデフォルトダッシュボード

チームレベル	完全な構成	基本構成	大規模なソリューション構成	ポートフォリオ構成	カンバンの構成
ポートフォリオ	ポートフォリオインラインダッシュボード	NA	NA	ポートフォリオインラインダッシュボード	カンバンポートフォリオダッシュボード
ソリューショントレーニング	ソリューショントレーニングインラインダッシュボード	NA	ソリューショントレーニングインラインダッシュボード	NA	NA

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

EAP 構成のデフォルトダッシュボード (続く)

チームレベル	完全な構成	基本構成	大規模なソリューション構成	ポートフォリオ構成	カンバンの構成
アジャイルリリーストレイン	ART インラインダッシュボード	ART インラインダッシュボード	NA	NA	NA
アジャイルチーム	• アジャイルチームインラインダッシュボード • アジャイルチームテクニカルダッシュボード • アジャイルチームインラインダッシュボード	• アジャイルチームインラインダッシュボード • アジャイルチームテクニカルダッシュボード • アジャイルチームインラインダッシュボード	• アジャイルチームインラインダッシュボード • アジャイルチームテクニカルダッシュボード • アジャイルチームインラインダッシュボード	• アジャイルチームインラインダッシュボード • アジャイルチームテクニカルダッシュボード • アジャイルチームインラインダッシュボード	カンバンチームダッシュボード

異なる構成におけるこれらのデフォルトダッシュボードの可用性の詳細については、「EAP レポートとダッシュボード」を参照してください。

重要:
インラインダッシュボードのみをコピーおよびカスタマイズできます。

次のタスクには、admin または EAP admin (sn_apw_advanced.eap_admin) ロールが必要です。

1. EAP での構成の作成と更新。
2. EAP でのダッシュボードの作成。
3. EAP ダッシュボードへのタグの追加。
4. EAP の読み取り専用ロールとダッシュボードの関連付け。
5. アジャイル構成への EAP ダッシュボードの追加。
6. (オプション) でのスクリプト拡張ポイントの実装の作成 EAP。

EAP でのダッシュボードの作成

ダッシュボードを作成するかデフォルトの EAP ダッシュボードを複製して編集することで、ダッシュボードを作成してカスタムアジャイル構成の主要なメトリクスを追跡します。

始める前に

EAP での構成の作成と更新

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > プラットフォームアナリティクス > ダッシュボード.
2. ダッシュボードを作成するか、アジャイル構成のデフォルトのダッシュボードの 1 つを変更します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ダッシュボードを作成するには、[新規ダッシュボードを作成] を選択します。詳細については、「Create a dashboard with the in-line editor」を参照してください。
- 既存のダッシュボードを変更するには、そのコピーを作成して、必要なウィジェットを使用できるようにします。詳細については、「Duplicate a Platform Analytics dashboard」を参照してください。

  注:
  [複製] オプションは、インラインダッシュボードでのみ使用できます。

3. 可視化とウィジェットを追加します。

   詳細については、「Create a dashboard with the in-line editor」のステップ 6 ～ 10 を参照してください。

   デフォルトインジケーターについては、「エンタープライズアジャイル計画 のインジケーター」を参照してください。

4. [保存] を選択します。

次のタスク
EAP ダッシュボードへのタグの追加。

EAP ダッシュボードへのタグの追加

EAP ダッシュボードのタグを追加して、ダッシュボードを識別できるようにします。タグ付きのダッシュボードが参照修飾定義リストに表示され、ダッシュボードを構成の詳細に追加できるようになります。

始める前に
EAP でのダッシュボードの作成。

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_admin または admin


手順

1. **par_dashboard.list** に移動します。
2. [カスタマイズリストの更新] オプションを使用して、ビューに [タグ] 列を追加します。
3. タグを追加するダッシュボードの [タグ] 列に「**EAP** ダッシュボード」と入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タグがダッシュボードに追加されます。

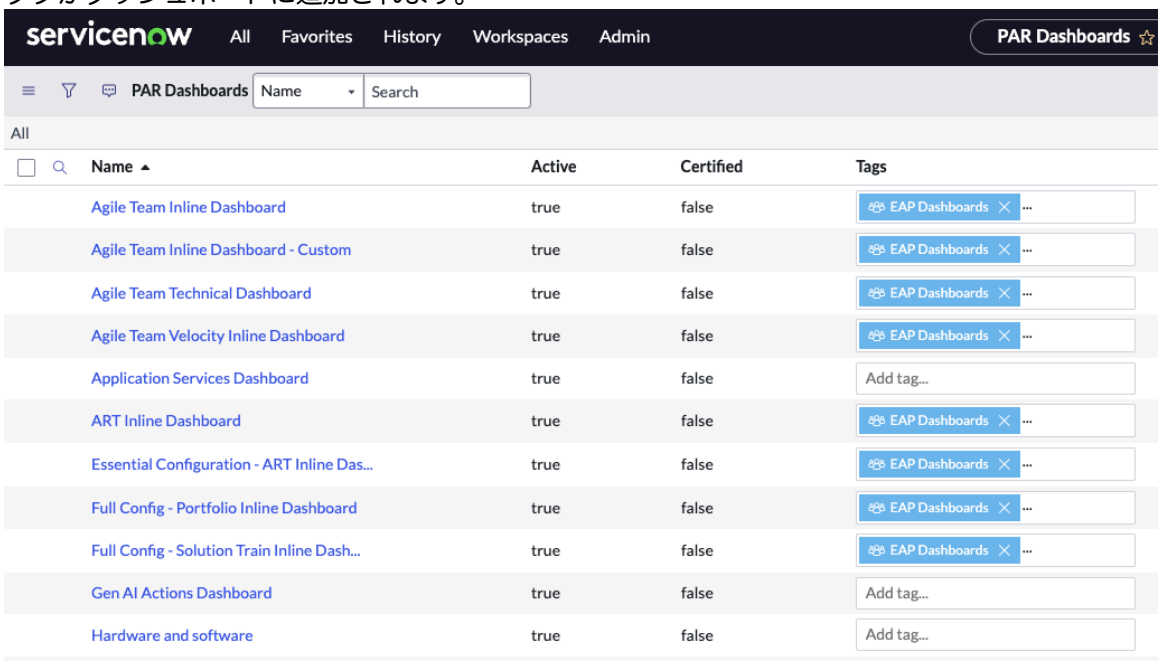

次のタスク
EAP の読み取り専用ロールとダッシュボードの関連付け。

EAP の読み取り専用ロールとダッシュボードの関連付け

EAP の読み取り専用 (sn_apw_advanced.eap_read_only) ロールをダッシュボードに関連付けます。このロールを持つユーザーは、アジャイル構成内のチームのダッシュボードを表示および編集できます。

始める前に

- EAP ダッシュボードへのタグの追加。
- ServiceNow インスタンスのアプリケーションスコープを「戦略的計画 (Strategic Planning)」に設定します。

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_admin または admin

手順

1. PAR ダッシュボード権限 [par_dashboard_permission] テーブルに移動します。
2. 作成したダッシュボードを見つけます。
3. [ロール] 列のセルをダブルクリックし、「**sn_apw_advanced.eap_read_only**」と入力します。
4. [保存] を選択します。
   ロールはダッシュボードに関連付けられます。

次のタスク
アジャイル構成への EAP ダッシュボードの追加。

アジャイル構成への **EAP** ダッシュボードの追加

ダッシュボードをアジャイル構成に追加して、プロダクトマネージャーまたはスクラムチームメンバーが エンタープライズアジャイル計画 ワークスペースでアジャイルチームの [ホーム] タブからダッシュボードにアクセスできるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- EAP の読み取り専用ロールとダッシュボードの関連付け。
- ServiceNow インスタンスのアプリケーションスコープを「戦略的計画 (Strategic Planning)」に設定します。

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_admin または admin

このタスクについて
単一または複数のダッシュボードをアジャイル構成に追加できます。デフォルト構成を使用している場合、デフォルトのダッシュボードがアジャイル構成に自動的に関連付けられます。ただし、カスタム構成を作成する場合は、選択したデータソースのメトリクスを表示するためにダッシュボードをその構成に関連付ける必要があります。

手順

1. **sn_apw_advanced_eap_configuration_detail.list** に移動します。
2. 列オプションを使用して、エンタープライズアジャイル構成別にレコードをグループ化します。
3. アジャイル構成で、詳細を表示するアジャイルチームを選択します。
4. [ホームダッシュボード] フィールドから、チームに必要なダッシュボードを追加します。
5. [更新] をクリックします。
   選択したダッシュボードが、選択した構成の [ホーム] タブに追加されます。

でのスクリプト拡張ポイントの実装の作成 **EAP**

デフォルトのスクリプト化済みの拡張点を更新するか、デフォルトの拡張ポイントをテンプレートとして使用してスクリプト化済みの拡張点を作成し、EAP ダッシュボードに表示されるデータをフィルタリングできるようにします。

始める前に
EAP の読み取り専用ロールとダッシュボードの関連付け。

必要なロール：admin

このタスクについて
スクリプト化済みの拡張点を使用すると、さまざまなデータソースからの情報をフィルタリングするカスタムクエリを作成できます。デフォルトでは、各 EAP 構成は拡張ポイントに関連付けられています。各拡張ポイントは、関連付けられているすべてのチームタイプを処理します。新しい EAP 構成を作成するたびに、スクリプト化された拡張ポイントの実装を作成する必要があります。

> **重要:**
> このタスクは、カスタム構成の場合、またはデフォルトのダッシュボードをカスタマイズする場合にのみ実行します。デフォルト構成を使用している場合、このタスクは必要ありません。

手順

1. 移動先 すべて > スクリプト化拡張ポイント.
2. *EAPDashboardsEncodedQueryProvider (sn_apw_advanced* を検索して開きます。EAPDashboardsEncodedQueryProvider) スクリプト拡張ポイント。
3. [実装を作成] 関連リンクを選択して、このスクリプト拡張ポイントの実装を作成します。
   新しい実装レコードフォームが表示されます。
4. 新しく作成した実装の [名前] フィールドを、任意のカスタム名に更新します。
   名前にスペースが含まれていないことを確認してください。たとえば、実装の名前を **MyConfigEAPDashboardsEncodedQueryProvider** に変更します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

5. **[Update** (更新)] を選択します。
6. *EAPDashboardsEncodedQueryProvider (sn_apw_advanced*を開きます。EAPDashboardsEncodedQueryProvider) スクリプト拡張ポイント。
7. [実装] 関連リストで、新しく作成した実装レコードの [クラス] をクリックして開きます。
8. [スクリプト] フィールドを更新して、以下を含めます。
   - getConfigId 関数で、EAP 構成のsys_idを入力します。
   - fetchEncodedQueries 関数にクエリを入力して、イテレーション ID、チームの種類、チーム ID など、EAP 構成の各レベルの情報をフィルター処理します。

   デフォルトの大規模ソリューション構成のスクリプト例を次に示します。

```
fetchEncodedQueries: function(teamType, teamId, iterationId) {
      switch (teamType) {
         case "sn_apw_advanced_agile_team":
            return {
               rm_story: `iteration=${iterationId}`,
               sn_apw_advanced_eap_iteration: `sys_id=${iterationId}`,
               sn_gf_goal_m2m_relationship:
 `table_name=sn_apw_advanced_eap_iteration^entity_id=${iterationId}`,
               sn_apw_advanced_eap_iteration_db_view: `iter_eap_team=${teamId}`
            };
         case "sn_apw_advanced_agile_release_train":
            return {
               sn_align_core_feature: `iteration=${iterationId}`,
               sn_apw_advanced_eap_iteration: `sys_id=${iterationId}`,
               sn_gf_goal_m2m_relationship:
 `table_name=sn_apw_advanced_eap_iteration^entity_id=${iterationId}`,
               sn_apw_advanced_eap_iteration_db_view: `iter_parent=${iterationId}`
            };
         case "sn_apw_advanced_solution_train":
            return {
               sn_apw_advanced_eap_iteration: `eap_team.parent=${teamId}`,
               sn_align_core_capability:
 `eap_team=${teamId}^OReap_team.parent=${teamId}`
            };
         default:
            return {
               sn_align_core_eap_planning_item: `iteration=${iterationId}`,
            };
      }
   },

   getConfigId: function() {
      return "e4e11e0977243110740fefc0aa5a99f9";
   },
```

9. [**Update** (更新)] を選択します。

タスクの結果

次回 EAP チームの [ホーム] タブを再ロードすると、実装に加えた更新に従ってフィルタリングされたデータがダッシュボードに表示されます。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

での計画カレンダー変更のダッシュボードの更新 **EAP**

エンタープライズアジャイル計画で現在アクティブな構成の計画カレンダーに変更がある場合は、EAPダッシュボード構成を更新します。

製品マネージャーがアクティブなチームと作業アイテムを含む EAP 構成の計画カレンダーを更新すると、それらのチームの [ホーム] タブのレポートが影響を受けます。アドミニストレーターは、この EAP 構成に対応するダッシュボードを更新する必要があります。このアクションにより、チームに表示されるレポートとメトリクスが正確になります。


たとえば、[完全な構成] のアジャイルチームの [計画カレンダー] の値は [スプリント] から [なし] に更新されます。その後、[ホーム] タブには、バーンアップ チャートやバーンダウン チャート、スプリント速度などのスプリント関連のレポートが表示されなくなります。

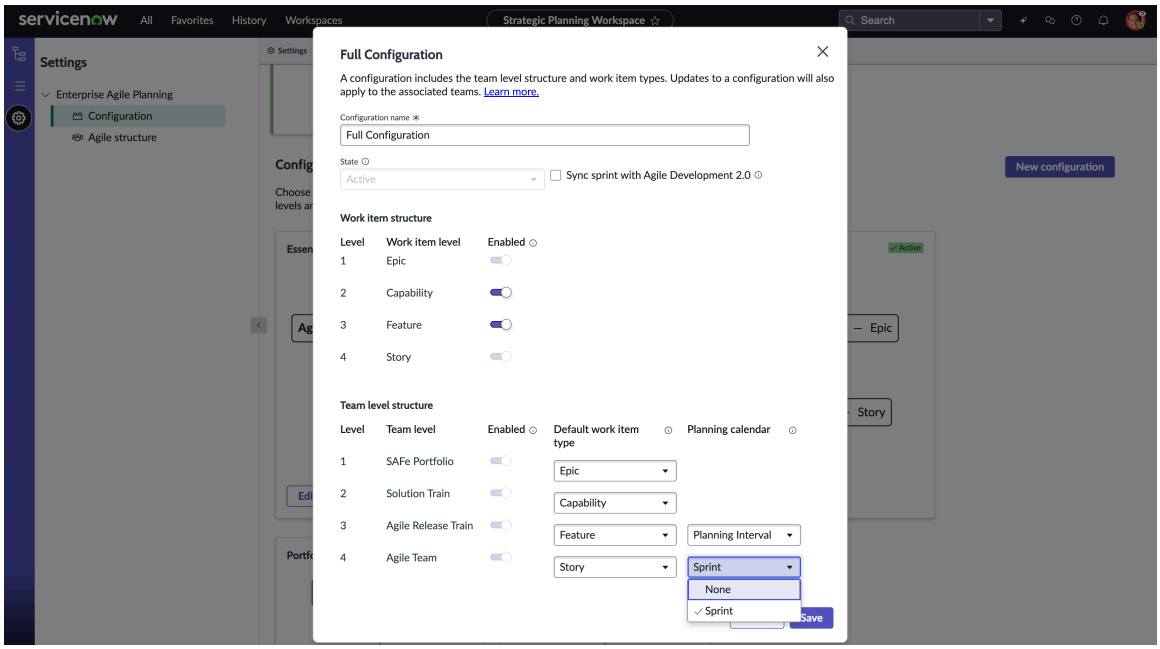

この変更を確実に行うには、最新の計画カレンダーに従って新しいダッシュボードを構成し、[完全な構成] の既存のアジャイルチームダッシュボードを新しいダッシュボードに置き換える必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

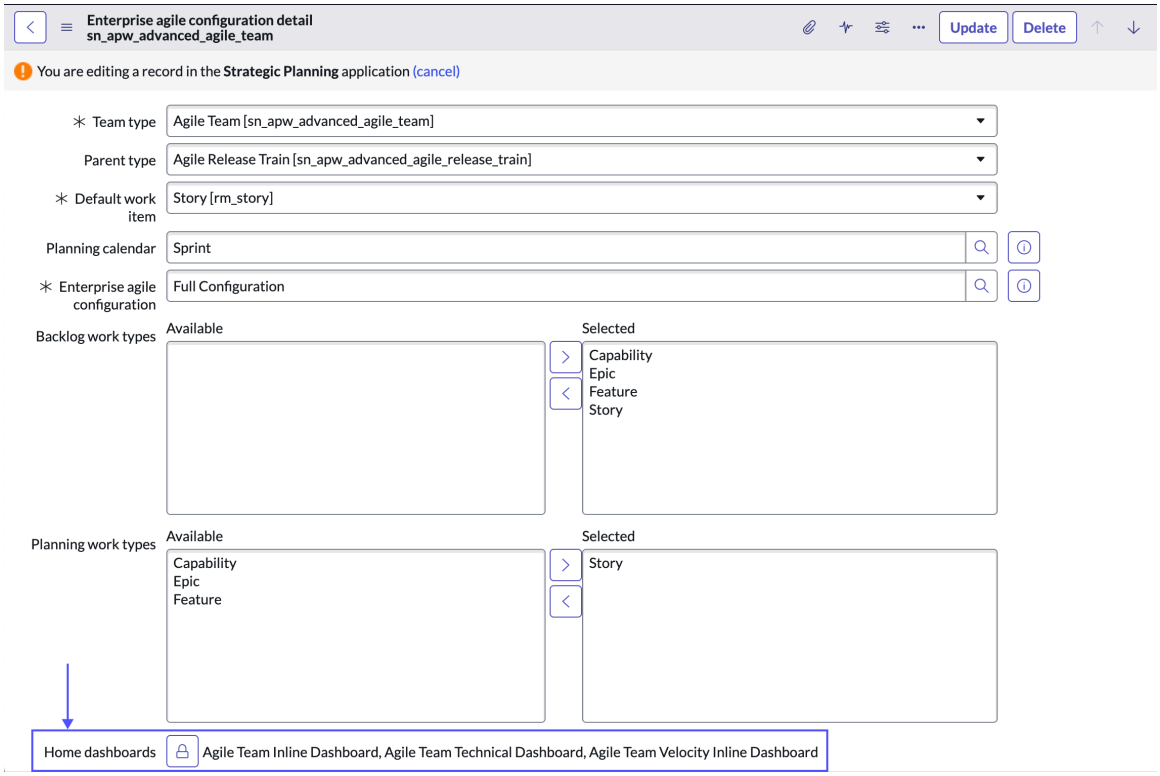

この手順には、次に示す一連のタスクが含まれます。

1. 最新の計画カレンダーの場合は、ダッシュボードを作成するか、既存のダッシュボードを複製して、チームが必要とするレポートを追加します。参照 EAP でのダッシュボードの作成。
2. EAP ダッシュボードへのタグの追加。
3. EAP の読み取り専用ロールとダッシュボードの関連付け。
4. 新しく作成したダッシュボードを、計画カレンダーの変更がある EAP 構成に追加します。「アジャイル構成への EAP ダッシュボードの追加」を参照してください。
5. (オプション) でのスクリプト拡張ポイントの実装の作成 EAP。

SAFe から EAP への移行

大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) アプリケーションから エンタープライズアジャイル計画へのデータの正常な移行に必要なプロセスについて説明します。

https://vimeo.com/showcase/11420435/embed

SAFe から EAP にデータを移行するためのガイド付きセットアップ

ガイド付きセットアップには一連のタスクがあり、ServiceNow のインスタンスで必要なタスクを実施するのに役立ちます。移動先 すべて > 戦略的計画 > エンタープライズアジャイル計画 > **SAFe** 移行ガイド付きセットアップ.

ガイド付きセットアップには、次のタスクが含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAFe から EAP への移行タスク

1. SAFe から移行するための EAP 構成の検証。

   既存の SAFe 構成に基づいて、インスタンスで適切な EAP 構成がアクティブ化されていることを確認し、この構成に適切な作業タイプ (エピック、機能、およびストーリー) が許可されていることを確認します。

   たとえば、ServiceNow Essential SAFe アプリケーションのユーザーである場合は、EAP で基本構成をアクティブ化し、EAP のエピックと機能が作業タイプとして許可されていることを確認する必要があります。

2. SAFe と EAP 間のテーブル、フィールド、および選択肢のマッピングの検証。

   SAFe アプリケーションのテーブル、列、選択フィールド、およびカスタムテーブルが、EAP のものに正しくマッピングされていることを確認します。

   > **注:**
   > デフォルトでは、SAFe ストーリー [sn_safe_story] テーブルと SAFe スクラムタスク [sn_safe_scrum_task] テーブルのすべての列が、ストーリー [rm_story] テーブルとスクラムタスク [rm_scrum_task] テーブルに移行されます。列を含めたり除外したりするには、「SAFe ストーリーおよび SAFe スクラムタスクテーブルから EAP へ移行する列の変更」を参照してください。

3. EAP への SAFe データの移行開始。
4. 既存の SAFe グループのタイプとして [アジャイルチーム] を追加します。「EAP 移行のために「Agile Team」タイプを SAFe グループに追加する」を参照してください。
5. EAP ロール sn_apw_advanced.eap_read_only、sn_apw_advanced.eap_user、および sn_apw_advanced.eap_admin を SAFe グループまたはチーム内の個々のユーザーにアサインします。

   「Assign a role to a group」または「Assign a role to a user」を参照してください。

SAFe から移行するための EAP 構成の検証

現在の SAFe 構成に適切な EAP 構成がアクティブであり、必要な作業タイプが選択されていることを確認します。

始める前に

ServiceNow インスタンスで現在使用されている SAFe アプリケーション (Essential SAFe または Portfolio SAFe) を確認します。

必要なロール：admin

このタスクについて

https://player.vimeo.com/video/1049452534?h=ee0299eb63&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > エンタープライズアジャイル計画 > **EAP** 構成.
2. 必要な EAP 構成をアクティブ化し、必要な作業タイプが許可されていることを検証します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. EAP 構成情報レコードを開きます。

b. [アクティブ] フィールドを有効にします。

- Essential SAFe の場合：[基本構成] をアクティブ化します。
- Portfolio SAFe の場合：[ポートフォリオ構成] をアクティブ化します。

c. [許可される作業タイプ] フィールドで、[エピック]、[機能]、および [ストーリー] が [選択済み] リストに追加されていることを確認します。

3. フォームを保存します。

次のタスク
SAFe と EAP 間のテーブル、フィールド、および選択肢のマッピングの検証。

SAFe と EAP 間のテーブル、フィールド、および選択肢のマッピングの検証

SAFe からの移行を開始する前に、大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) アプリケーションとエンタープライズアジャイル計画 間のテーブル、フィールド、および列の選択肢のデフォルトマッピングが要件に従っていることを検証します。

始める前に
SAFe から移行するための EAP 構成の検証。

必要なロール：admin

このタスクについて

https://player.vimeo.com/video/1023012765?h=9fdc807e46&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

手順

1. **sn_apw_advanced_safe_eap_mig_setup.list** に移動します。
2. **[SAFe** から **EAP** への移行 **(SAFe to EAP migration)]** レコードを選択します。
3. [テーブルマップ] 関連リストから、SAFe と EAP の間のテーブルマッピングを確認します。
4. 各テーブルマッピングレコードを開き、フィールドマッピングを検証します。

   たとえば、**sn_safe_epic** レコードを開いて、SAFe エピックのフィールドが EAP エピックにどのようにマッピングされているかを確認します。

   フィールドマッピングを変更する必要がある場合は、そのレコードを開いてフィールドを更新します。

5. [フィールドマップ] 関連リストから、列の選択肢レコードを開き、SAFe と EAP 間のフィールドの選択肢マッピングを確認します。

   たとえば、**sn_safe_epic** テーブルマップで [ステータス] フィールドマップレコードを開き、[ステータス] フィールドの選択肢が SAFe と EAP の間でどのようにマッピングされているかを確認します。

   フィールドマッピングを変更する必要がある場合は、そのレコードを開いてフィールドを更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- SAFe ストーリー [sn_safe_story] テーブルと SAFe スクラムタスク [sn_safe_scrum_task] テーブルの場合、すべてのデフォルトの列が、ストーリー [rm_story] テーブルとスクラムタスク [rm_scrum_task] テーブルに移行されます。列を含めたり除外したりするには、*sn_apw_advanced.SAFeEAPStoryTaskMigrationAPI* スクリプトインクルードを更新します。「SAFe ストーリーおよび SAFe スクラムタスクテーブルから EAP へ移行する列の変更」を参照してください。
- EAP への SAFe データの移行開始。

SAFe ストーリーおよび SAFe スクラムタスクテーブルから EAP へ移行する列の変更

SAFe ストーリーおよび SAFe スクラムタスクテーブルでは、必要な列のデータのみが エンタープライズアジャイル計画 に移行されるようにしてください。スクリプトインクルードを更新することで、要件に従って列を含めたり除外したりできます。

始める前に
SAFe と EAP 間のテーブル、フィールド、および選択肢のマッピングの検証。

必要なロール：admin

このタスクについて

https://player.vimeo.com/video/1020716174?h=3cf2011632&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード.
2. **sn_apw_advanced.SAFeEAPStoryTaskMigrationAPI** スクリプトインクルードを検索して開きます。
3. [スクリプト] フィールドのコメントに従って、SAFe ストーリーテーブルおよび SAFe スクラムタスクテーブルの列を含めたり除外したりします。
4. フォームを保存します。

次のタスク
EAP への SAFe データの移行開始。

EAP への SAFe データの移行開始

SAFe-EAP 移行要求を送信し、大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) テーブルと エンタープライズアジャイル計画 テーブル間のデータの移行を開始します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

https://player.vimeo.com/video/1049439810?h=256249f11c&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > エンタープライズアジャイル計画 > **SAFe** 移行要求.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

   フィールドの詳細については、「[SAFe-EAP 移行要求] フォーム」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:

- 計画の間隔 (以前はプログラムインクリメントと呼ばれていました) は、チームごとに 1 回のみ移行できます。移行要求で選択した日付より前の計画の間隔と、移行の完了後に作成された計画の間隔は、自動移行 (ガイド付きセットアップ) では移行できません。

  たとえば、PI 1 > PI 2 > PI 3 の順序で移行要求を送信します。

- SAFe ART の構成が作成後に変更された場合は、ART の現在の構成を持つ PI のみを移行することをお勧めします。
- ポートフォリオ SAFe 移行では、SAFe エピックが SAFe 機能に関連付けられているが、どのポートフォリオにもリンクされていない場合、このエピックは自動移行で移行されません。
- 移行は、同じクライテリアに対して複数回実行できます。このような場合、新しく作成されたレコードは EAP に移行されます。
- すでに移行されている SAFe レコードに変更が加えられた場合、これらの変更は EAP レコードと同期されません。

4. [送信] を選択します。

重要:
要求を送信しても、移行はトリガーされません。[SAFe 移行要求] リストから送信済みのレコードを開き、[移行開始] を選択します。

タスクの結果
データ移行の進捗状況を監視します。

- 移行が成功すると、[インポート要求] 関連リストに、SAFe から EAP に移動されたレコードの失敗数、挿入数、合計数などのデータ移行の詳細が表示されます。
- 移行でエラーが発生した場合、[移行エラー] 関連リストに、SAFe から EAP への移行に失敗したレコードの詳細が表示されます。

次のタスク
EAP 移行のために「Agile Team」タイプを SAFe グループに追加する。

EAP 移行のために「Agile Team」タイプを SAFe グループに追加する

既存の SAFe グループの [タイプ] フィールドに「**Agile Team**」を追加して、これらのチームがワークスペースで EAP ユーザーに表示されるようにします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

https://player.vimeo.com/video/1062964725?h=f69cc5c0e8&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479


手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework** (大規模アジャイルフレームワーク **(SAFe)**) > **SAFe** チーム.
2. SAFe チームレコードを開きます。
3. [他のアクション] メニューから、フォームビューを [デフォルトビュー] に変更します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [タイプ] フィールドが表示されていない場合は、デフォルトビューのフォームレイアウトを構成して含めます。
   フォームレイアウトの構成については、「Show or hide fields on a form」を参照してください。
5. 値「**Agile Team**」を [タイプ] フィールドに追加します。




6. EAP に移行するすべての SAFe チームに対して、手順 3 ～ 6 を繰り返します。

Enterprise Agile Planning の使用

チームのバックログを管理し、スプリントとイテレーションを計画し、依存関係を追加し、戦略的計画ワークスペースのエンタープライズアジャイル計画を使用してチームレベルと作業項目レベルのドキュメントを使用して共同作業を行います。

でのチームバックログの管理 EAP

エンタープライズアジャイル計画 の [バックログ] ページを使用して、作業アイテムを作成、更新、および優先順位付けします。さらに、作業アイテムを計画の間隔 (PI) やスプリントなどの反復にスケジュールします。

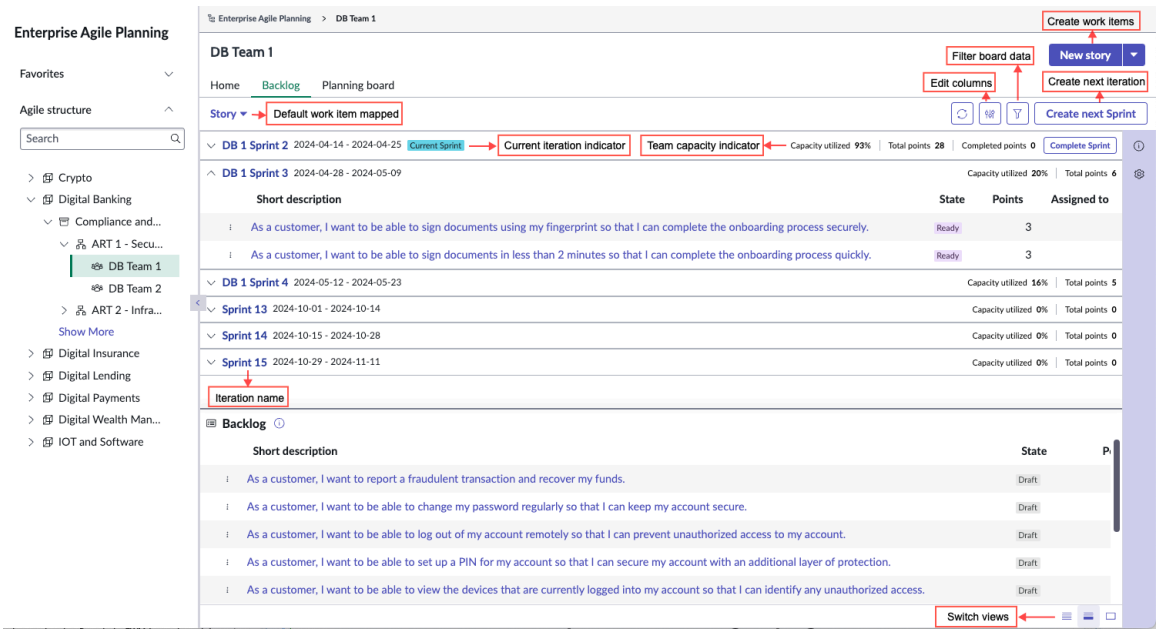

次のセクションでは、バックログの概要と EAP バックログで実行できるアクションについて説明します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レイアウトとデフォルトのグループ化

アジャイルチーム、アジャイルリリーストレイン (ART)、ソリューショントレイン、ポートフォリオなど、さまざまなチームレベルにわたるバックログのレイアウトは同じままです。変更は、作業アイテムをグループ化する方法にあります。アジャイル構造で下から上に移動すると、チームにアサインされた作業は次のようにグループ化されます。

重要:
チーム階層とチーム内の反復は、EAP 構成に基づいています。次の情報は、デフォルトの [完全な構成] に適用されます。

- アジャイルチーム：スプリント別にグループ化されます。
- ART：計画の間隔別にグループ化されます。
- ソリューショントレイン：子 ART 別にグループ化されます。
- ポートフォリオ：子ソリューショントレイン別にグループ化されます。


これらのグループのいずれにも該当しない作業アイテムは、[バックログ] セクションに表示されます。

デフォルトでは、[バックログ] ページに表示される反復回数は 6 に設定されています。アドミンと協力して、システムプロパティを使用してこの数を変更できます。詳細については、「EAPバックログの反復の表示制限を設定する」を参照してください。

カンバンチームのレイアウトとデフォルトのグループ化

カンバン構成を使用するチームのバックログは、次のようにグループ化されます。

- ポートフォリオ:アサインされた作業アイテムは子チーム別にグループ化されます。子チームにアサインされていない作業アイテムは、[バックログ] セクションに表示されます。

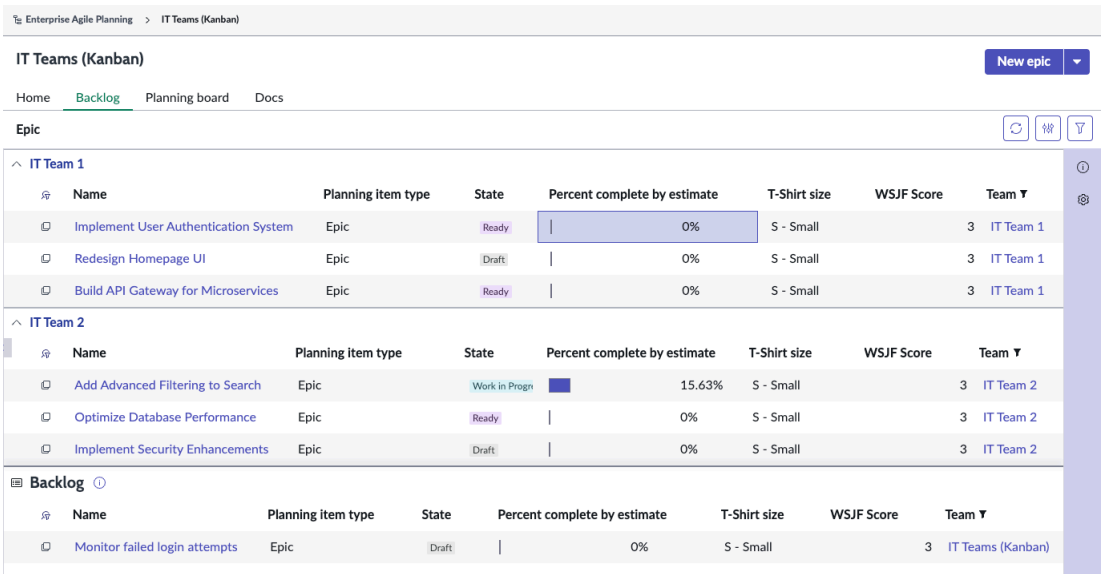

- チーム:アサインされた作業がリストに表示されます。


デフォルトの作業アイテム

バックログに表示される作業アイテムは、構成でこのチームにマッピングされているタイプです。アジャイル構造内で上に移動すると、アサインされる作業のレベルも上がります。アジャイルチームレベルでは、ストーリーの情報が表示されます。ART およびポートフォリオを上に移動すると、機

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

能、ケイパビリティ、およびエピックの情報が表示されます。ただし、どのレベルでも、表示される作業アイテムのタイプを変更できます。

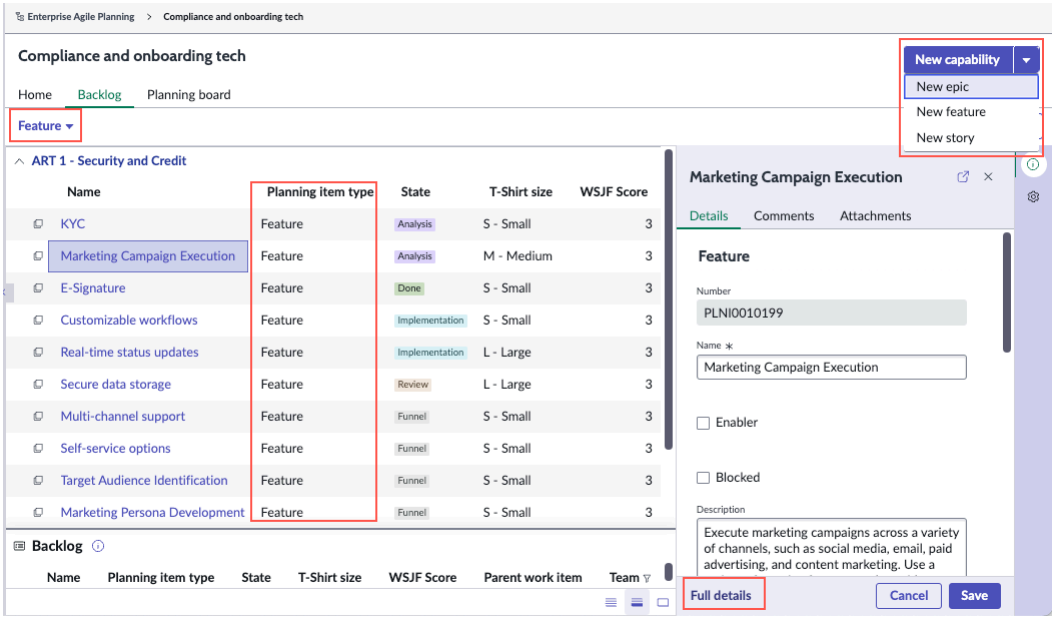

たとえば、このスクリーンショットでは、[ケイパビリティ] はその構成に基づいて [コンプライアンスおよびオンボーディング技術 **(Compliance and onboarding tech)**] ソリューショントレインにマップされたデフォルトのアイテムタイプです。この選択を変更して、このチームにアサインされた他のタイプの作業を表示できます。この選択を [機能] に変更すると、この ART に割り当てられているすべての機能を表示できます。同様に、デフォルトのアイテムタイプが [ケイパビリティ] であっても、このソリューショントレインに異なるタイプの作業アイテムを作成してアサインできます。


プライマリ列を選択して、サイドパネル内の任意の作業アイテムの詳細を表示します。作業アイテムのすべてのフィールドと関連リストにアクセスするには、サイドパネルから [完全な詳細] を選択します。

注:
EAP チームの [バックログ] ページには、既定の構成で有効になっている作業項目のみが表示されます。たとえば、[完全な構成] の ART の場合、バックログにはデフォルトで機能のみが表示される場合があります。ケイパビリティ、エピック、ストーリーなどの他の作業アイテムタイプを表示する場合は、アドミンと協力して必要な EAP 構成の詳細を更新します。詳細については、「EAP バックログおよび計画ボードでのその他の作業項目タイプの表示の構成」を参照してください。

列レベルのデータのフィルタリング

EAPバックログのデータに列レベルのフィルターを使用して、必要な作業アイテムをすばやく見つけます。列フィルタリングオプション ( ) を使用すると、[バックログ] タブに表示される任意の列 (タイプ選択、文字列、または参照) のデータをフィルタリングできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

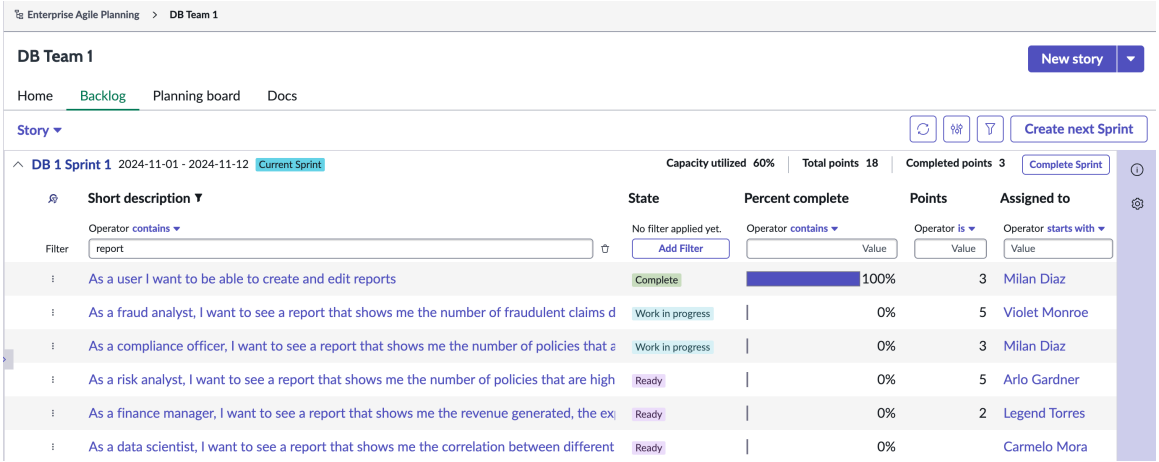

バックログ内のアクション

バックログ内では、次のアクションを実行できます。

- チームの PI やスプリントなどの反復を作成します。
- チームのバックログに作業を追加します。
- バックログからの作業をさまざまな反復にスケジュールします。
- インライン編集を行って、[ステータス]、[アサイン先]、[ストーリーポイント] などの作業の情報を更新します。
- 計画立案アイテム (グループ内) を並べ替えて優先順位付けします。
- これらの反復を開始して完了します。
- 未完了の作業をバックログに移動します。
- 表示されるデータをフィルタリングします。
- 表示する列を選択します。

EAP でチーム作業の作成とスケジュールを開始するには、次のタスクを使用します。

EAP バックログからの次の **PI** およびスプリントの作成

計画の間隔 (PI) とスプリントの反復を作成して、チームが エンタープライズアジャイル計画 (EAP) のバックログから作業の優先順位付けとスケジューリングを開始できるようにします。

始める前に

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user

このタスクについて

バックログから、アジャイルリリーストレイン (ART) とチームに次の反復を作成します。チームと計画カレンダーの EAP 構成に基づいて、PI、スプリント、または作成した他のカレンダーの反復を作成できます。

このタスク例として、デフォルトの完全な構成を使用して説明します。ここでは ART が計画の間隔にマッピングされ、アジャイルチームはスプリントにマッピングされます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. 左側のナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、ART を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. ART の計画の間隔を作成します。
   a. 選択した ART の [バックログ] タブで、[次の計画の間隔を作成 **(Create next Planning Interval)]** を選択します。
   b. 確認ダイアログボックスで、[作成] を選択します。

   選択した ART の PI が作成されます。開始日と終了日は、システムアドミンが作成した次に利用可能なビジネスカレンダースパンに基づきます。

   PI のデフォルト名は **<カレンダー名> <n+1>** です。

   - 「カレンダー名」は、システムアドミンが作成したビジネスカレンダーエントリの名前です。
   - 「**n**」は、最後に作成された PI の番号です。

     たとえば、ビジネスカレンダーエントリの名前が「**Greenbacks PI**」として設定されており、「Greenbacks PI 1」と「Greenbacks PI 2」がすでに存在する場合、新しい PI の名前は「**Greenbacks PI 3**」になります。

   PI が作成されたら、命名規則に従ってこの名前を編集できます。「EAP での反復詳細の更新」を参照してください。

   システムアドミンがカレンダーエントリとその日付を定義する方法の詳細については、「EAP での反復カレンダーエントリの作成」を参照してください。

   > **注:**
   > この ART にアジャイルチームが追加されている場合は、それらのチームにもスプリントが自動的に作成されます。チームに対して作成されるスプリントの数は、PI の日付と一致する子カレンダースパンに基づいています。この ART に後でアジャイルチームを追加する場合、スプリントは自動的にそれらのチームに追加されません。その場合は、手順 4 に進みます。

4. アジャイルチームのスプリントを作成します。
   a. 左側のナビゲーションパネルから、アジャイルチームを選択します。
   b. このチームの [バックログ] タブで、[次のスプリントを作成 **(Create next Sprint)]** を選択します。
   c. [作成] を選択して確定します。

   このスプリントのデフォルトの名前と日付は、システムアドミンによって定義されたビジネスカレンダーエントリに従います。

   スプリントが作成されたら、命名規則に従ってこの名前を編集できます。「EAP での反復詳細の更新」を参照してください。

次のタスク

- EAP での反復詳細の更新。
- EAP バックログでの作業アイテムの反復スケジュール。

EAP での反復詳細の更新

PI またはスプリントの詳細を編集して、名前、チームキャパシティ、コミットポイントなどの詳細を更新します。

始める前に

EAP バックログからの次の PI およびスプリントの作成。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. 左側のナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、EAP チームを選択します。
3. ART またはアジャイルチームの [バックログ] タブで、反復の名前を選択してサイドパネルで詳細を開きます。
4. サイドパネルから、名前、キャパシティ、コミットポイントなどの詳細を編集します。

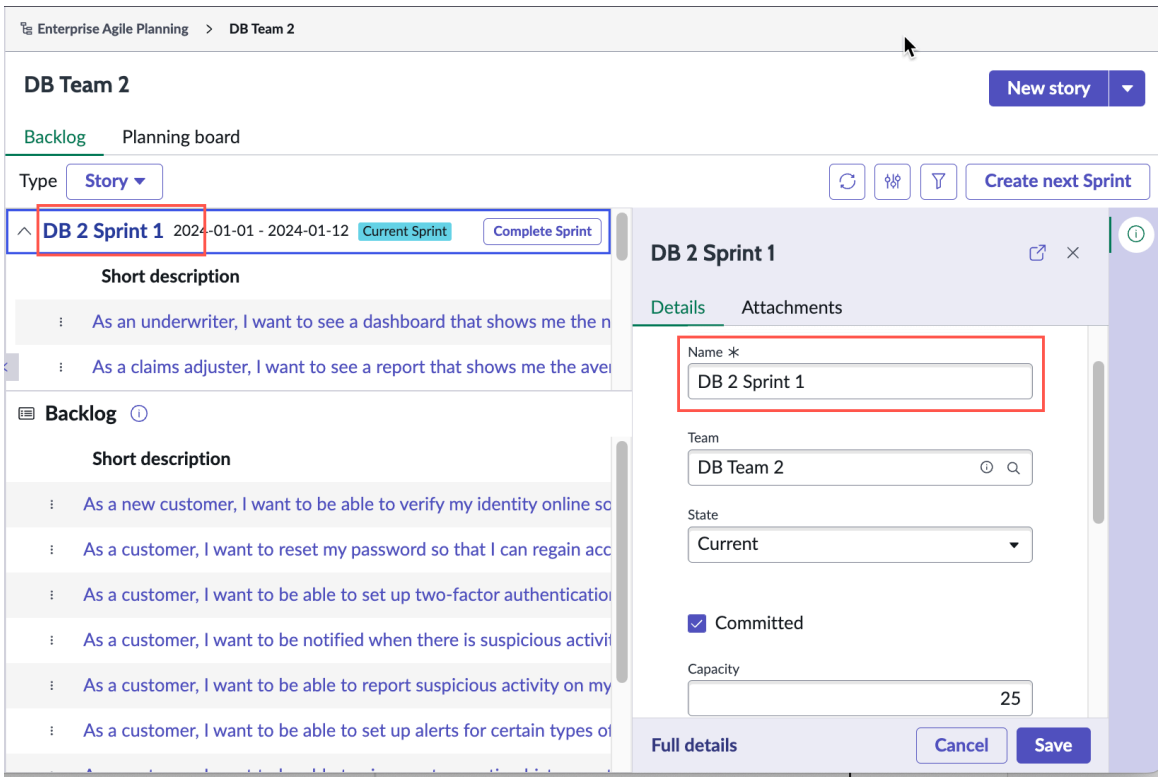

5. [保存] を選択して変更を保存します。

関連情報

EAP バックログでの作業アイテムの反復スケジュール

EAP バックログでのチームの作業アイテムの作成

チームが エンタープライズアジャイル計画 でバックログに作業を追加できるように、ストーリー、機能、エピック、またはケイパビリティを作成します。

始める前に
必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user


手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. 左側のナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、EAP チームを選択します。
3. ページヘッダーから、[新しい **<**作業アイテムタイプ**>]** を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

画面に表示されるアイテムタイプは EAP チームの構成によって異なります。または、[その他のオプション] メニューから別のアイテムタイプを選択することもできます。



4. フォームのフィールドに入力します。

   フォームに表示されるフィールドは、選択した作業アイテムタイプによって異なります。

5. [送信] を選択します。

タスクの結果

フォームに入力した値に基づいて、新しい作業アイテムがページのいずれかのセクションに追加されます。

成功メッセージから作業アイテムを開いて、情報を追加できます。

次のタスク

- 説明を Now Assistで絞り込みます。「計画立案アイテムの書き込みスキルを使用して計画立案アイテムのコンテンツを絞り込む」を参照してください。

  この機能を使用するには、 SPM の Now Assist の計画立案アイテムの書き込みスキルをアクティブ化する必要があります。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。

- EAP バックログでの作業アイテムの反復スケジュール。

で親作業アイテムから子アイテムへの作業のブレークダウン **EAP**

ワークスペースの親レコードページから子作業アイテムを直接作成することで エンタープライズアジャイル計画 作業のブレークダウンを簡素化します。

始める前に

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user

このタスクについて

https://player.vimeo.com/video/1079893987?h=7eb7c4b082&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

作業アイテムの [完全な詳細] ページから、関連するすべてのタイプの子作業アイテムを作成できます。たとえば、 EAP 構成に基づいて、エピックの [完全な詳細] ページにはその子作業アイテム (ケイパビリティ、機能、またはストーリー) の個別のタブが表示され、ケイパビリティの [完全な詳細] ページには機能とストーリーの個別のタブが表示されます。

これらの関連タブのそれぞれで [新規] ボタンを使用して、親作業アイテムレコードから作業をブレークダウンします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
すべてのデフォルトの EAP 構成のビューには、作業ブレークダウンを有効にするための子アイテム固有の関連リストが含まれています。新規またはカスタム構成の場合は、EAP アドミンと協力して、これらの関連リストを構成の EAP ビューに含めてください。

このタスクでは、エピックの子アイテムとして機能レコードを作成する例を使用して、親作業アイテムレコードページから子アイテムを直接作成するためのガイダンスを提供します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. 左側のナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、EAP チームを選択します。
3. バックログまたは計画ボードから、子項目を作成する作業項目を開き、[完全な詳細] を選択します。
4. 子アイテムを作成する関連タブを選択します。
   既に関連付けられている子アイテムがタブに表示されます。デジタルオンボーディングエピックには、すでに 6 つのケイパビリティ、1 つの機能、2 つのストーリーが関連付けられています。
5. [新規] を選択して子アイテムを作成します。
   たとえば、デジタルオンボーディングエピックに新しい機能を追加するには、[機能] タブから [新規] を選択します。
   子アイテムの詳細を入力する空のフォームが開きます。[親作業アイテム] フィールドは自動的に親レコード (この場合は デジタルオンボーディング) に設定されます。
6. 子作業項目の詳細を入力し、 [保存] を選択します。
   新しく作成された子作業アイテムの完全な詳細ページが開きます。
7. ブレッドクラムナビゲーションを使用して、親作業アイテムレコードページに戻ります。

次のタスク

- 説明を Now Assistで絞り込みます。「計画立案アイテムの書き込みスキルを使用して計画立案アイテムのコンテンツを絞り込む」を参照してください。

  この機能を使用するには、 SPM の Now Assist の計画立案アイテムの書き込みスキルをアクティブ化する必要があります。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。

- EAP バックログでの作業アイテムの反復スケジュール。

での作業アイテムのストーリーの作成 **EAP**

作業アイテムのフォームから直接ストーリーを作成します。手動で作成するか、エンタープライズアジャイル計画 (EAP) ワークスペースでNow Assistを使用して生成して時間を節約します。

始める前に
必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user


このタスクについて
このタスクでは、エピック、ケイパビリティ、機能 などの作業アイテムのストーリーを作成する手順を詳しく説明し エピックのストーリーの作成例を使用します。他の子作業アイテムを作成するには、「 で親作業アイテムから子アイテムへの作業のブレークダウン EAP」を参照してください。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. ナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、 EAP チームを選択します。
3. [バックログ] ページまたは [計画ボード] ページから、ストーリーを作成する作業アイテムを選択します。
   この例では、エピックが選択され、その詳細がサイドパネルに表示されます。
4. サイドパネルから、[完全な詳細] を選択します。

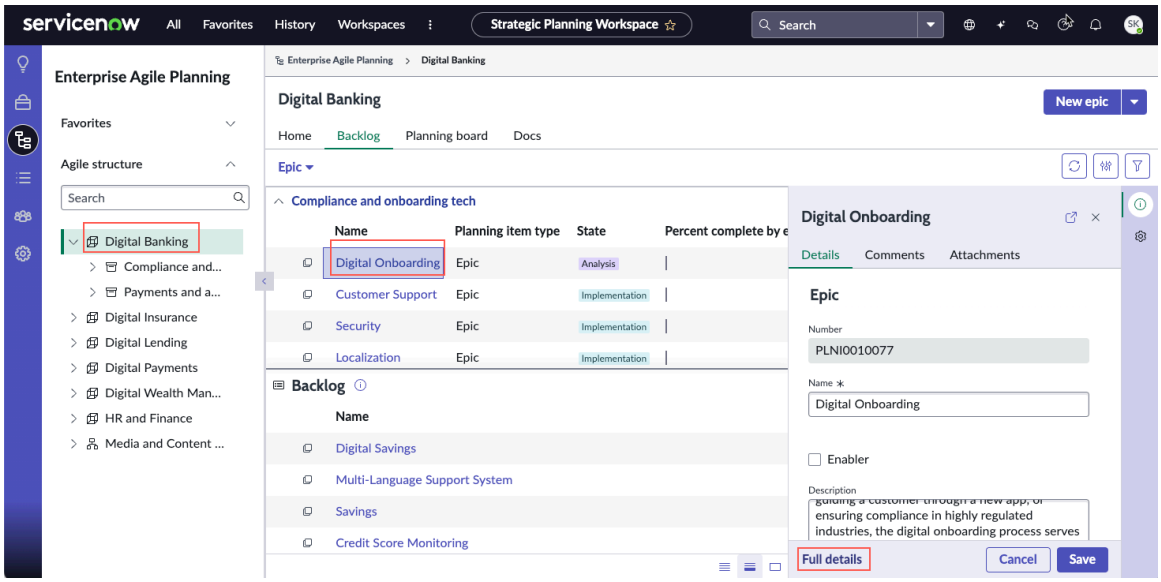


5. 作業アイテムの詳細ページから、手動または Now Assistを使用してストーリーを作成します。
   新しく作成されたストーリーは、作業アイテムの詳細ページの [ストーリー] タブに一覧表示されます。

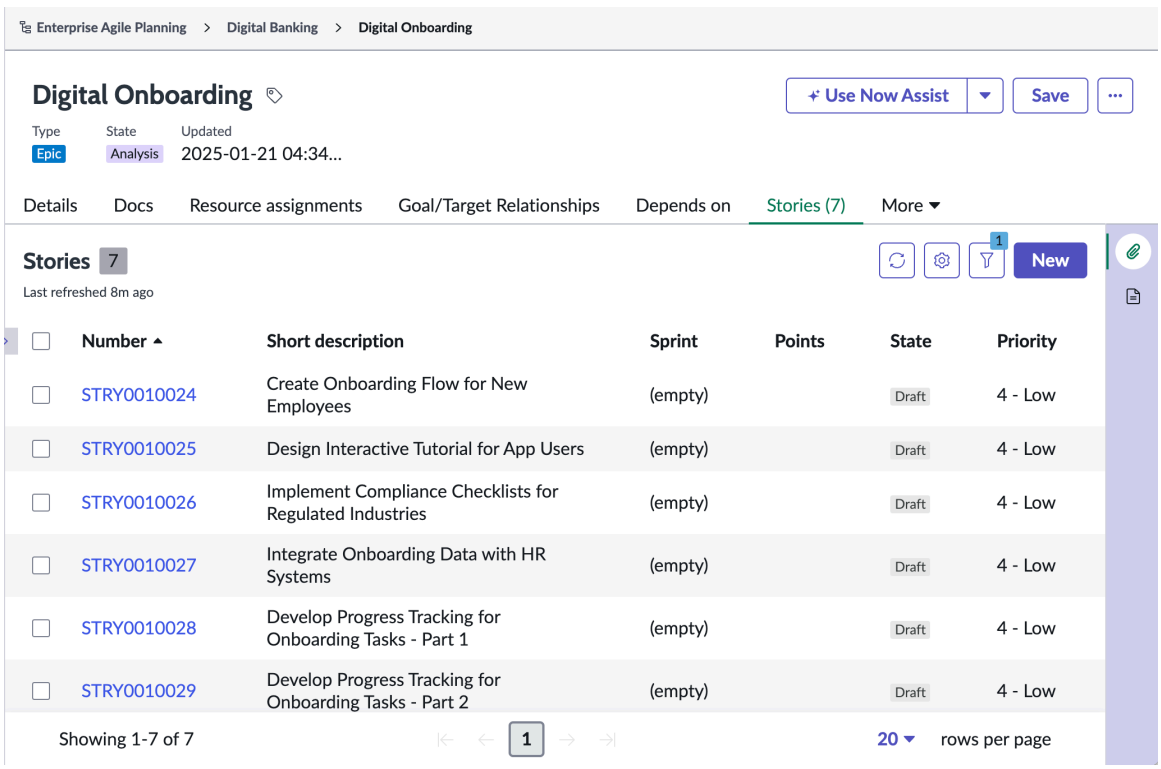

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. ストーリーを開いて、詳細を更新したり削除したりすることができます。
ストーリーの [完全な詳細] ページから、次のアクションを実行できます。
   - 説明を Now Assistで絞り込みます。「計画立案アイテムの書き込みスキルを使用して計画立案アイテムのコンテンツを絞り込む」を参照してください。

     この機能を使用するには、 SPM の Now Assist の計画立案アイテムの書き込みスキルをアクティブ化する必要があります。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。
   - ストーリーの他のフィールドを更新します。
   - 依存関係またはスクラムタスクをストーリーに追加します。
   - ストーリーにファイルを添付ファイルとして追加します。
   - ヘッダーの [その他のアクション] メニューから [削除] を選択して、ストーリーを削除します。

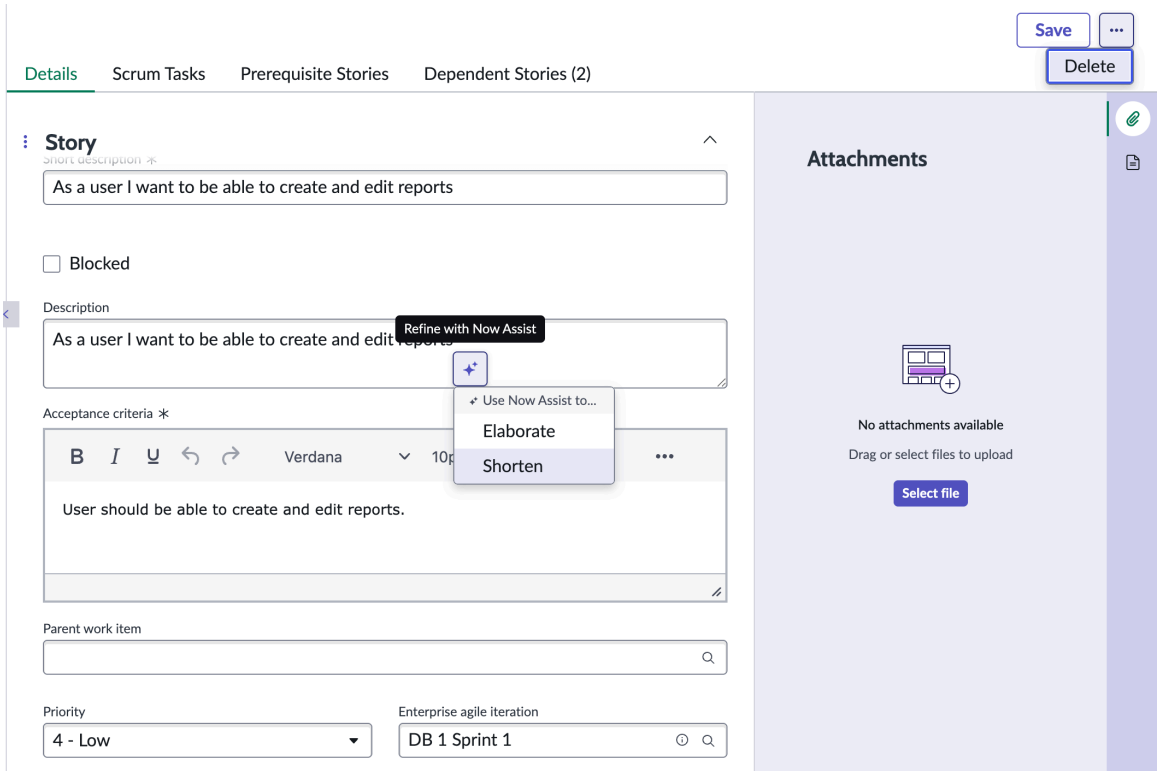

EAP バックログでの作業アイテムのコピー作成

既存のアイテムと詳細が類似している作業アイテムを作成する場合は、その既存のアイテムのコピーを作成することで時間と労力を節約できます。

始める前に

EAP バックログでのチームの作業アイテムの作成。

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user

手順


1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. 左側のナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、EAP チームを選択します。
3. [バックログ] ページで、コピーを作成するアイテムを見つけます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

4. その他アイコン (⋮) を選択し、[コピーを作成] を選択します。

   または、作業アイテムを右クリックして、これらのオプションを表示することもできます。



タスクの結果
選択した作業アイテムのコピーが作成され、必須フィールドの情報がコピーされます。この新しい作業アイテムは、元の作業アイテムと同じセクションに追加されます。たとえば、[バックログ] セクションからストーリーのコピーを作成した場合、コピーしたストーリーは [バックログ] セクションに追加されます。

次のタスク
作業アイテムの [完全な詳細] ページから、 Now Assistで説明を絞り込むことができます。「計画立案アイテムの書き込みスキルを使用して計画立案アイテムのコンテンツを絞り込む」を参照してください。この機能を使用するには、 SPM の Now Assist の計画立案アイテムの書き込みスキルをアクティブ化する必要があります。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。

関連情報

でのチームバックログの管理 EAP

EAP バックログでの作業アイテムの反復スケジュール

EAP バックログでの作業アイテムの反復スケジュール

エンタープライズアジャイル計画 で、バックログの調整を実行し、チームのバックログから次の反復の作業をスケジュールします。

始める前に

- EAP バックログからの次の PI およびスプリントの作成。
- EAP バックログでのチームの作業アイテムの作成。

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. 左側のナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、EAP チームを選択します。
3. アイテムを [バックログ] セクションから反復に移動します。


   a. [バックログ] セクションから、反復にスケジュールするアイテムを見つけます。
   バックログ調整セッション中に、ストーリーポイントを推定して、この作業アイテムにインラインで追加できます。

   b. 詳細アイコン (⋮) を選択し、既存の反復へのストーリーの移動を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

または、作業アイテムを右クリックして、これらのオプションを表示することもできます。

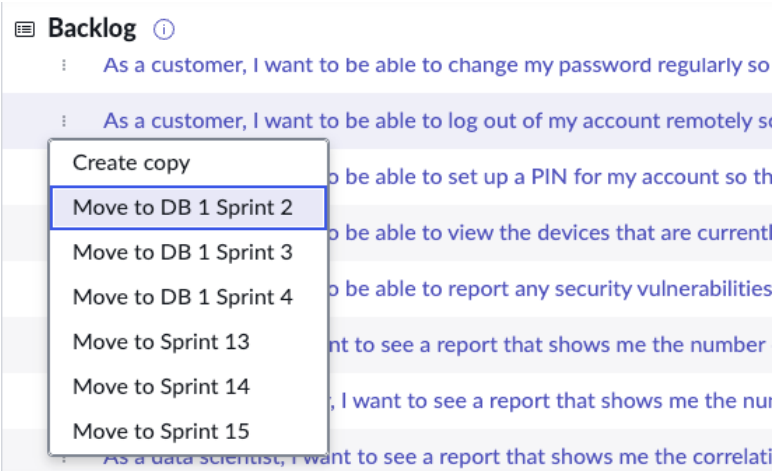


4. 反復間でアイテムを移動します。

a. 反復から、再スケジュールするアイテムを見つけます。

b. 詳細アイコン (⋮) を選択し、再スケジュールする反復を選択するか、アイテムをバックログに移動します。

または、作業アイテムを右クリックして、これらのオプションを表示することもできます。

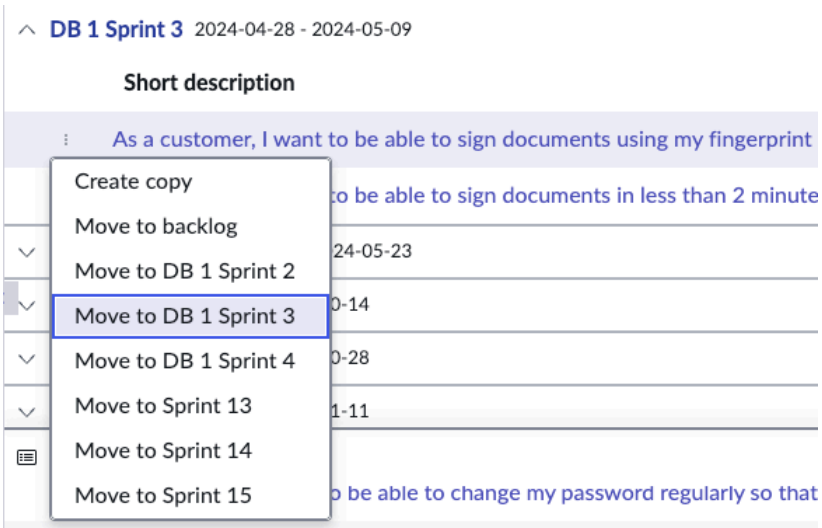

5. このプロセスを繰り返して、チームの次の反復のスケジュール作業を完了します。

次のタスク

- EAP での ART の作業計画。
- EAP での反復の開始または完了。
- ダッシュボードを使用してチームのパフォーマンスと進捗状況を分析します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

EAP での反復の開始または完了

スプリントまたは PI の反復を開始すると、チームは作業を開始してその進捗状況を追跡できます。チームがアサインされた作業を完了したら、エンタープライズアジャイル計画 のバックログから直接、この反復を完了としてマークします。

始める前に

必要なロール：sn_cwm.cwm_user


手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. 左側のナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、EAP チームを選択します。
3. 反復を完了します。

   a. [バックログ] ページで、完了する反復を見つけて **[<反復>の完了 (Complete <iteration>)]** を選択します。

   - スプリントの場合、オプションは [スプリントの完了] として表示されます。
   - PI の場合、オプションは [計画の間隔の完了 **(Complete Planning Interval)]** として表示されます。

   注:
   計画の間隔を完了としてマークする前に、関連するすべての子スプリントを完了する必要があります。




   b. 現在の反復で未完了のまま残っている作業の量に応じて、その完了を確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 現在の反復に未完了の作業アイテムがある場合は、未完了のアイテムをバックログまたは将来の反復に移動するように求められます。

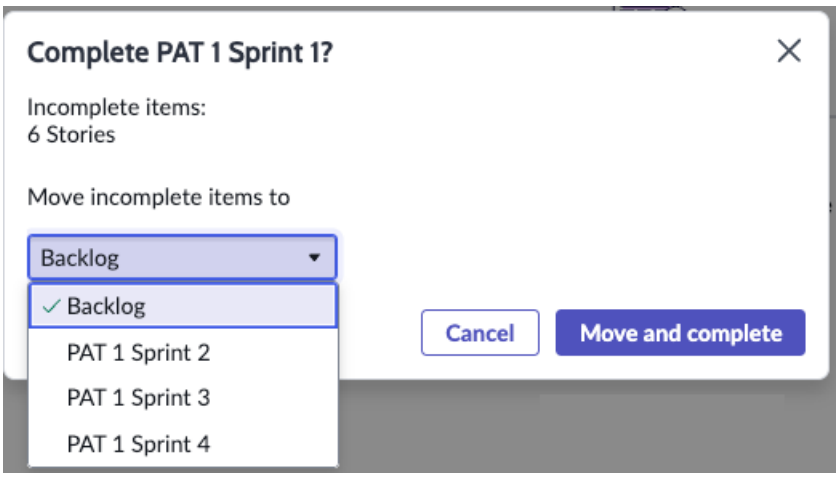


- アサインされたすべての作業が完了すると、確認しなくても反復が自動的に完了としてマークされます。

4. 反復を開始します。

a. [バックログ] ページで、開始する反復を見つけて、**[<反復>の開始 (Start <iteration>)]** を選択します。

- スプリントの場合、オプションは [スプリントの開始] として表示されます。
- PI の場合、オプションは [計画の間隔の開始 **(Start Planning Interval)]** として表示されます。

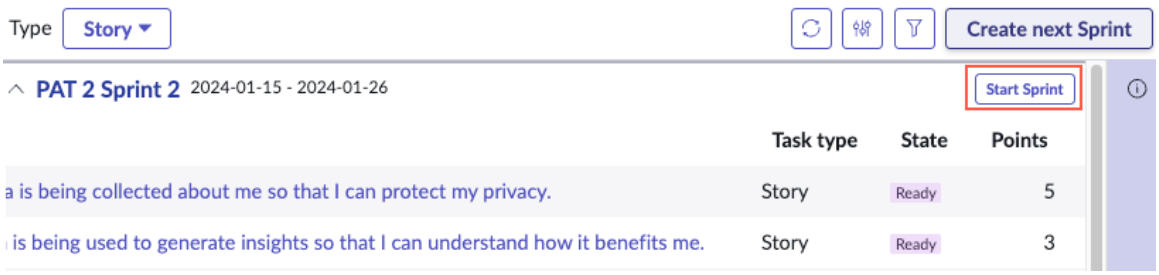

EAP でお気に入りに対するチームの追加または削除

頻繁に操作する EAP チームをお気に入りに追加すると、ワークスペースでチームを検索して移動する手間を省くことができます。

始める前に

EAP でのアジャイル構造の定義。

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user

手順


1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. チームをお気に入りに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 左側のナビゲーションパネルから、お気に入りに追加するチームを見つけます。

b. チーム名の横にある [お気に入りに追加] アイコン (☆) を選択します。

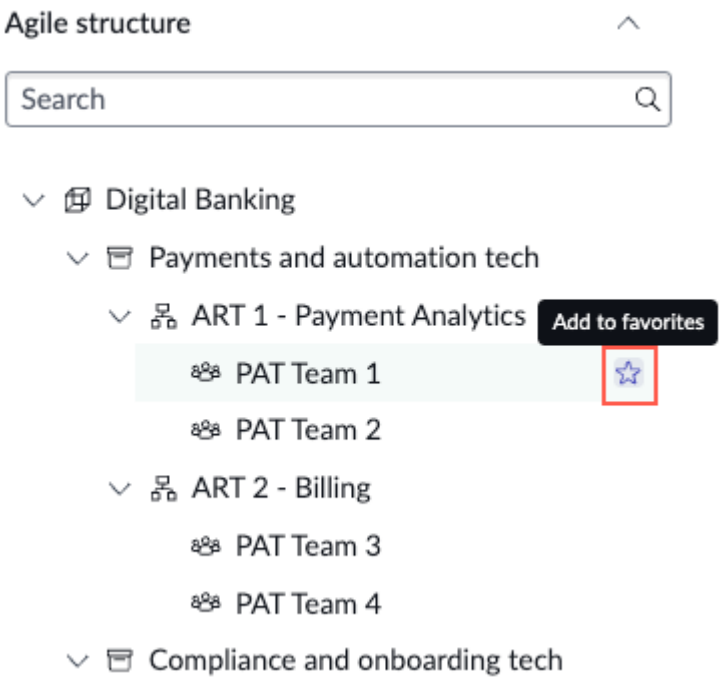


チームがナビゲーションパネルの [お気に入り] セクションに追加されます。

3. お気に入りからチームを削除します。

a. [お気に入り] セクションで、削除するチームを見つけます。

b. チーム名の横にある [お気に入りから削除] アイコン (★) を選択します。

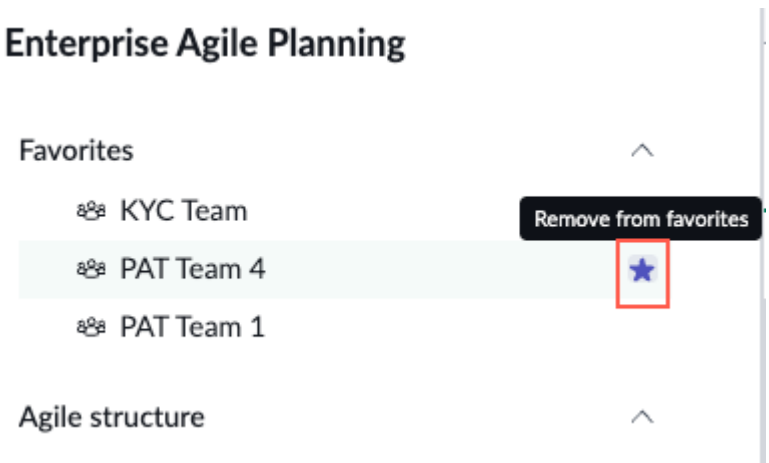

チームが [お気に入り] セクションから削除されます。

EAP バックログデータのカスタマイズとフィルタリング

表示する列を選択し、フィルターを適用してページのデータを絞り込むことで、自分とチームに最も関連性の高い情報を [バックログ] タブに表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. 左側のナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、EAP チームを選択します。
3. [バックログ] ページで列を追加または削除し、表示順序を変更します。


   a. [列を編集] ( ) を選択します。

   b. [利用可能な列] セクションから、[バックログ] に表示する列を選択します。

   c. [選択された列] セクションから、[バックログ] に表示しない列を削除します。

   d. [選択された列] セクションから列を再配置して、[バックログ] での表示順序を変更します。

   e. [適用] を選択します。

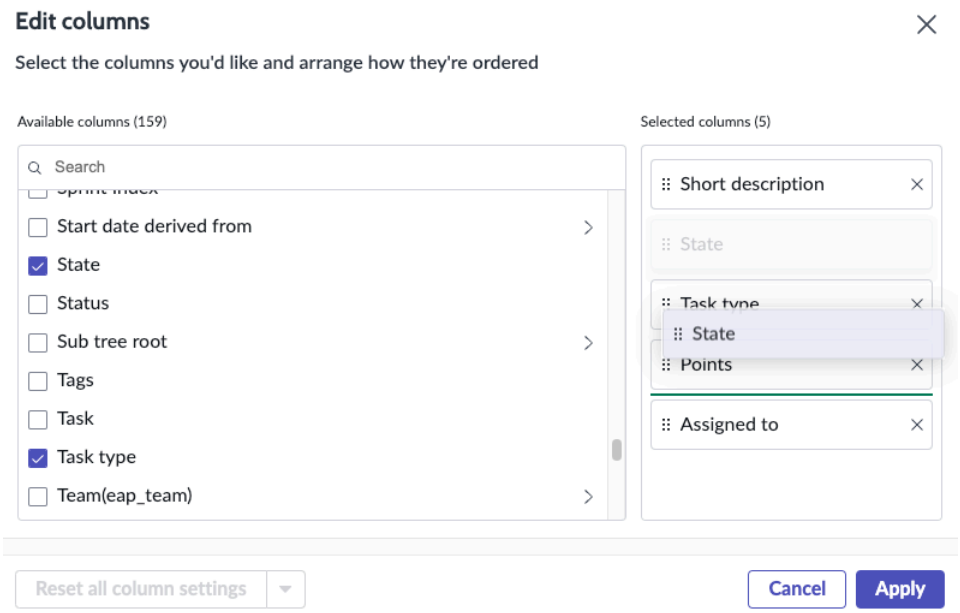

4. 作業アイテムにフィルターを適用して、バックログに表示されるデータを絞り込みます。

   a. [フィルター] ( ) を選択します。


   b. 作業アイテムをフィルタリングする条件を追加します。

      複数の条件を追加できます。これらの条件は、[バックログ] ページに表示される作業アイテムの [タイプ] に適用されます。


   c. オプション: [フィルターの保存] を選択すると、同じ条件を再作成して別のデータセットに適用する必要がなくなります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

d. [適用] を選択します。

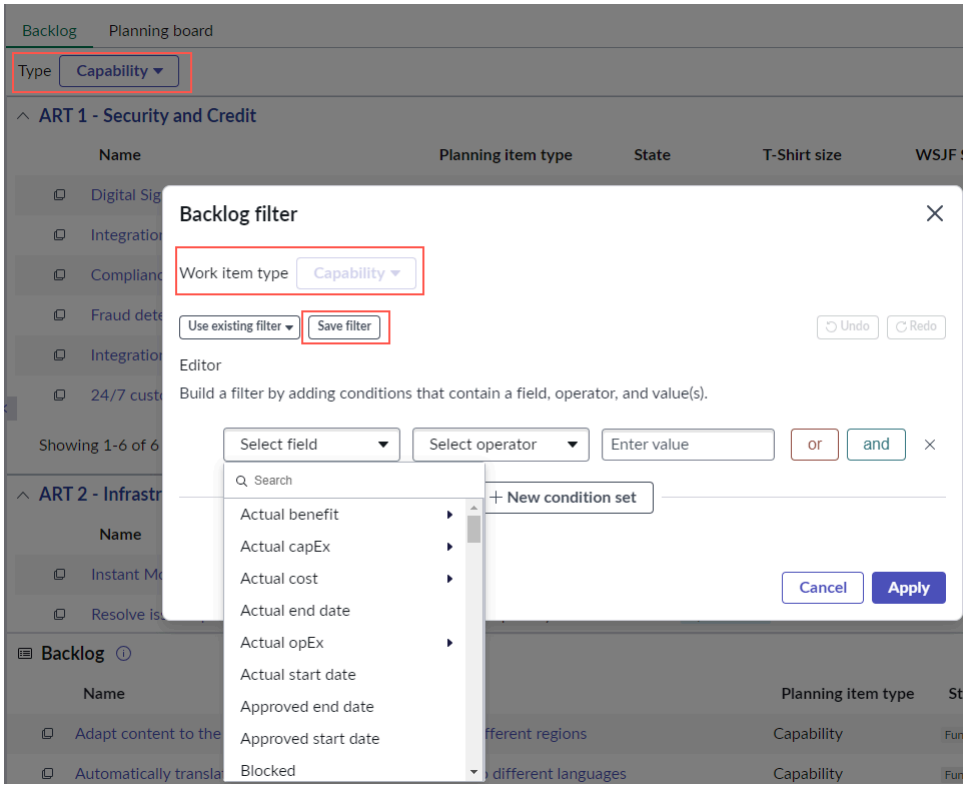

5. ART の場合、計画の間隔またはチームで作業アイテムのグループ化をカスタマイズできます。



での **PI** 計画の実行 **EAP**


エンタープライズアジャイル計画 の計画ボードを使用して、反復全体で複数のチームの作業を計画します (ビッグルーム計画立案など)。作業の進捗状況を追跡し、作業アイテム間の依存関係を作成して可視化して、ビジネスの優先順位との整合性を確認しながら変更に迅速に対応できるように作業を再スケジュールします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

計画ボードのレイアウト

アジャイルリリーストレーニング (ART) の計画ボード

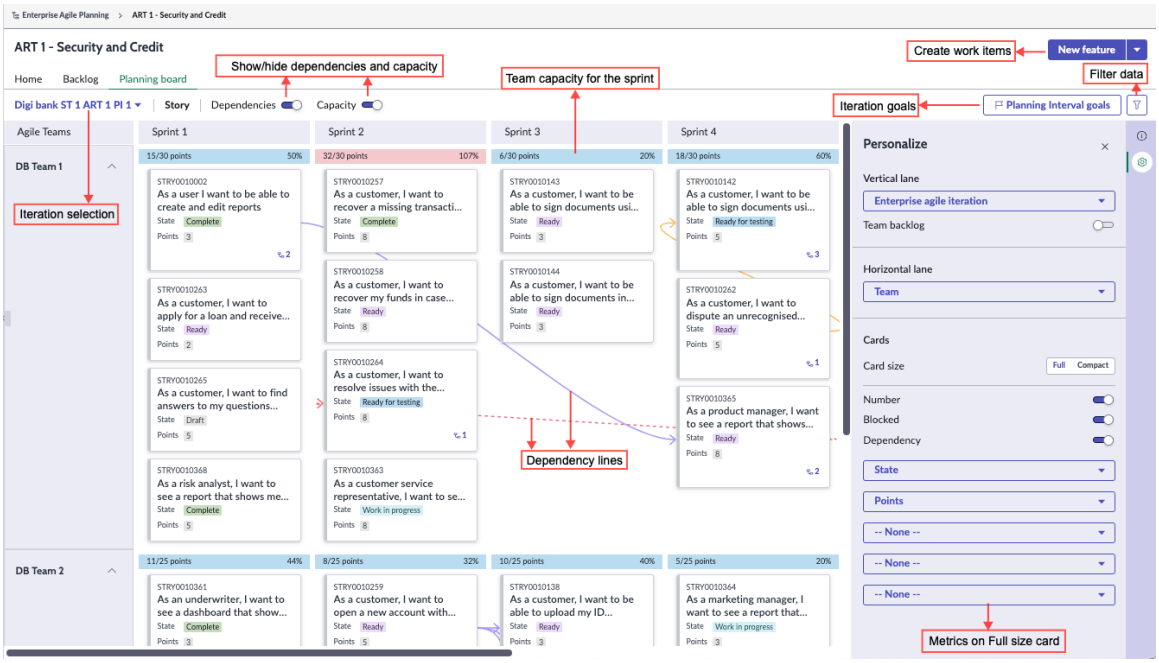

EAP 構成に基づいて、アジャイルチーム、ART、ソリューショントレイン、ポートフォリオなどのさまざまなチームレベルにわたる計画ボードのレイアウトは次のようになります。

- ART、ソリューショントレイン、およびポートフォリオ：水平レーンと垂直レーンの違いを含む 2 次元カンバンボードレイアウト。
- アジャイルチーム：作業アイテム状況が垂直レーンとして表示されるシンプルなカンバンボード。

作業アイテムはカードとして表示されます。圧縮またはフルサイズでカードを表示するように選択できます。フルサイズのカードには、アイテム番号、状況などのデータポイントや、イネーブラー、依存関係、ブロック済みのインジケーターが表示されます。一方、圧縮カードには簡単な説明のみが表示されます。

デフォルトの作業アイテムのグループ化

アジャイル構造で下から上に移動すると、各チームのカードは次のようにグループ化されます。

重要:
チーム階層とチーム内の反復は、EAP 構成に基づいています。次の情報は、デフォルトの [完全な構成] に適用されます。

- アジャイルチーム：反復の場合、垂直レーンはストーリーの状況を表します。

  たとえば、スプリントがアジャイルチーム用に構成された計画カレンダーである場合、計画ボードのカードは選択したスプリントにアサインされた作業を表します。アジャイルチームの場合、計画ボードにストーリーが表示されます。

- ART：反復の場合、ストーリーカードは子チーム別に水平方向にグループ化され、垂直レーンは子チームの反復を表します。


  計画の間隔 (PI) が ART に構成された計画カレンダーである場合、垂直レーンは選択した PI 内のスプリントを表します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ソリューショントレイン：子 ART 別に水平方向にグループ化され、垂直レーンはアイテムの状況を表します。
- ポートフォリオ：子ソリューショントレーニング別に水平方向にグループ化され、垂直レーンはアイテムの状況を表します。
- [依存関係] トグルが有効になっている場合は、作業アイテム間の依存関係を可視化できます。
- [キャパシティ] トグルが有効になっている場合は、チームの作業負荷を可視化できます。

EAP チームの計画ボードには、既定の構成で有効になっている作業項目のみが表示されます。たとえば、[完全な構成] の ART の場合、計画ボードにはデフォルトで機能のみが表示されます。製品マネージャーまたはチームメンバーが、ケイパビリティ、エピック、ストーリーなどの他の作業アイテムタイプの表示に切り替える場合は、アドミンと協力して必要な EAP 構成の詳細を更新します。詳細については、「EAP バックログおよび計画ボードでのその他の作業項目タイプの表示の構成」を参照してください。



ヒント:
ART の場合、この構成を更新した後に初めて計画ボードでストーリーの表示から別の作業アイテムタイプに切り替えた場合、作業アイテムカードが表示されないことがあります。これを解決するには、計画ボードのカスタマイズの 垂直レーンの選択 が Enterprise アジャイル反復に設定されていないことを確認します。


カンバンチームのレイアウトとデフォルトのグループ化

カンバンチームの計画ボードは、次のようにグループ化されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ポートフォリオ:アサインされた作業アイテムは 2 次元のカンバンボードに表示され、チームは水平レーン、アサインされた作業のステータスが垂直レーンとして表示されます。子チームにアサインされていない作業アイテムは、[ポートフォリオ] セクションに表示されます。

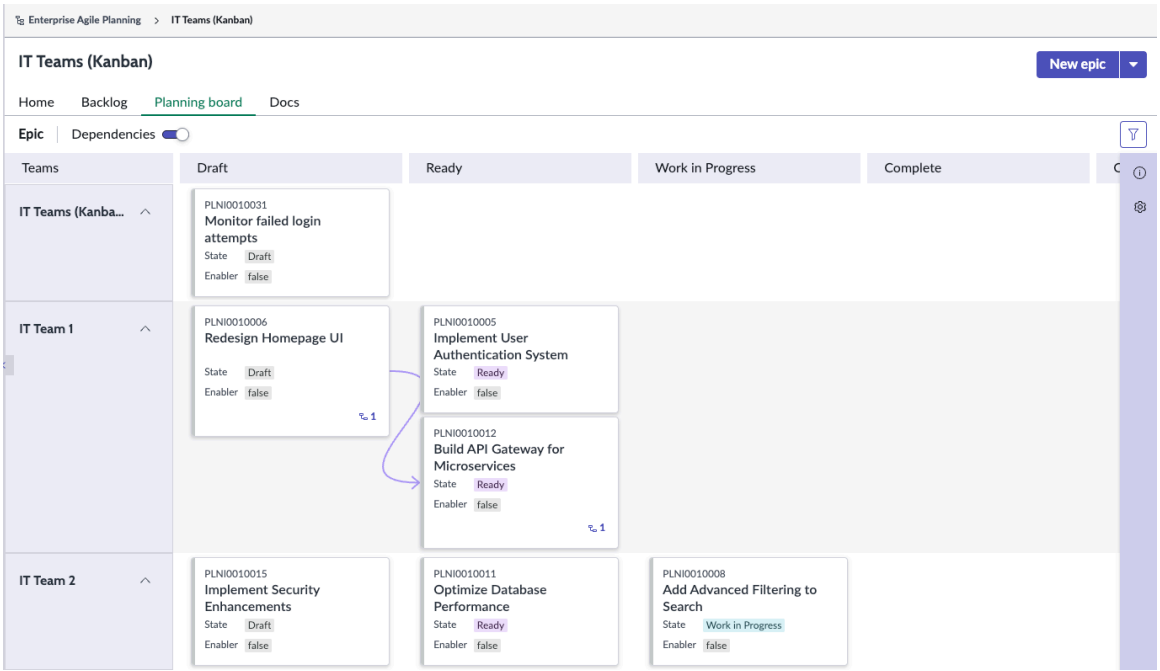

- チーム:アサインされた作業は 1 次元カンバンボードで表示されます。

バックログと同様に、計画ボードから表示される作業アイテムの [タイプ] を変更したり、複数のタイプの作業アイテムを作成したりすることができます。

エンタープライズアジャイル計画 内で PI 計画を開始するには、次のタスクを使用します。

EAP での ART の作業計画

エンタープライズアジャイル計画 で計画ボードを使用して、ART 内のすべてのチームにわたって複数の計画の間隔で作業を計画し、さまざまなチームと調整して依存関係を管理し、ブロッカーをリアルタイムで解決します。

始める前に

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user

このタスクについて

このタスクは、計画の間隔 (PI) をカレンダーとする Agile リリーストレイン (ART) を使用して説明されています。この ART には子チームが関連付けられており、子チームにはスプリントが定義されています。

ボードで、計画会議中にストーリーカードを別のレーンに移動するか、チームの新しいストーリーを追加します。[依存関係] トグルを有効にして、チームの作業全体の依存関係とブロッカーを表示します。


手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. 左側のナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、ART を選択して [計画ボード] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 計画ボードには、デフォルトで ART の現在の反復が表示されます。別の反復を選択することもできます。




- [バックログ] ページで完了した作業のスケジュールに基づいて、ストーリーカードがスプリントレーンに表示されます。

3. [依存関係] トグルを有効にして、ストーリー間の依存関係を表示します。
依存関係の作成方法によっては、ストーリーのスケジュール変更が必要になる場合があります。ストーリーの依存関係の詳細については、EAP での作業アイテム間の依存関係の作成と管理 を参照してください。
4. [キャパシティ] トグルを有効にして、各スプリントのチームの作業負荷を表示します。

   キャパシティバーの色は、作業負荷の視覚的なインジケーターとして機能します。

   - 赤：チームは過負荷状態です。
   - グレイ：チームのキャパシティは 100% です。
   - 青：チームのキャパシティは 100% を下回っています。

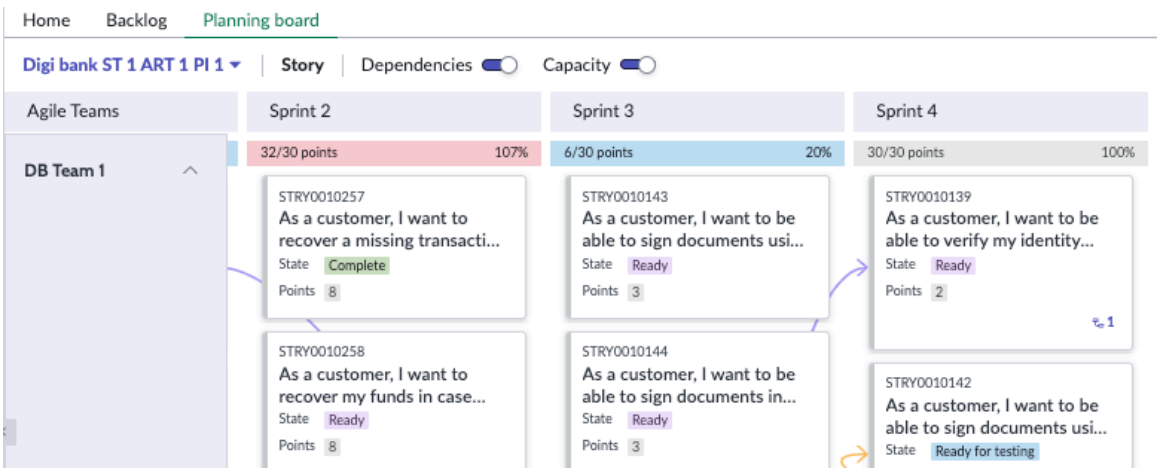

5. サイドパネルで開いているカードをクリックして、ストーリーでチームと共同作業します。
計画会議中に、複数のチームと共同作業し、優先度、ストーリーポイント、ブロックされた理由などのストーリー情報を更新します。

   [添付ファイル] タブでファイルをアップロードし、サイドパネルの [コメント] タブでメモを追加したりチームメンバーを @ メンションしたりすることもできます。

   スクラムタスクなどのストーリーの追加情報にアクセスする場合は、サイドパネルから [完全な詳細] を選択します。

6. ストーリーを別のスプリントに再スケジュールするか、カードをそれぞれのレーンにドラッグして別のチームに再アサインします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
アサインしてスケジュールした作業について、EAP ダッシュボードを使用してアジャイル構造のさまざまなレベルで進捗状況を追跡します。「EAP レポートとダッシュボード」を参照してください。

EAP での作業アイテムの依存関係

作業アイテムの依存関係と、それらが エンタープライズアジャイル計画 でチームの計画ボードにどのように表示されるかについて説明します。

依存関係の概要

計画立案の際は、作業アイテムがそれぞれどのように関係しているのかを把握することが重要です。作業アイテム間の依存関係を把握することで、課題の特定、解決に向けた調整、およびチーム間のコラボレーションの全体的な改善が可能になります。各アイテムの依存関係を把握しない限り、適切な反復に適切な作業をスケジュールできないというリスクが生じる可能性があります。EAP の依存関係を開始する方法については、「EAP での作業アイテム間の依存関係の作成と管理」を参照してください。

依存関係線の色

EAP の計画ボードで、[依存関係] トグルを有効にして、チーム間の依存関係行を表示します。依存関係線の色はストーリーがどのようにスケジュールされているかを示しています。

- 紫：前提条件ストーリーは、依存ストーリーよりも前のスプリントにスケジュールされています。この依存関係を変更する必要はありません。
- 黄：前提条件ストーリーは、依存ストーリーと同じスプリントにスケジュールされています。この場合、ストーリーの再スケジュールは必要な場合と不要な場合があります。
- 赤：前提条件ストーリーは、依存ストーリーよりも後のスプリントにスケジュールされています。この場合、ストーリーを再スケジュールする必要があります。


注:
これらの色は通常、計画カレンダーを含むため、ART チームおよびアジャイルチームの計画ボードに適用されます。

- 依存関係はソリューショントレインまたはポートフォリオの計画ボードに紫色で表示され、スケジュールの競合は示しません。
- 依存関係は同じスプリントにスケジュールされているため、アジャイルチームの計画ボードに黄色で表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ART の依存関係線

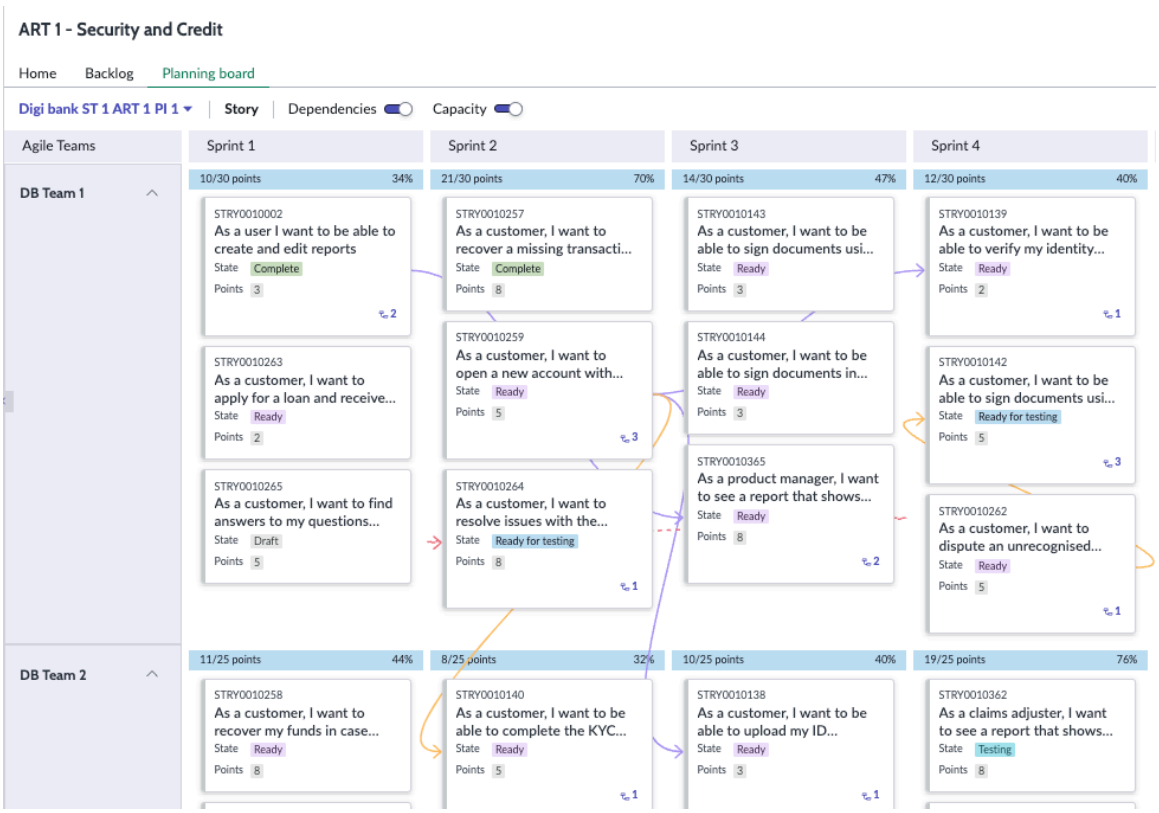


作業アイテムの [依存関係] 関連リスト

作業アイテムに追加された依存関係は、作業アイテムの [完全な詳細] ページに表示されます。依存アイテムと前提条件アイテムは、この作業アイテムの関連リストに一覧表示されます。これらの関連リストから新しい依存関係を追加することもできます。

これらの関連リストの名前は、エピック、ケイパビリティ、機能、およびストーリーによって異なります。表示しているアイテムのタイプに基づいて、リストには依存アイテム、依存先、前提条件ストーリー、および依存ストーリーと名前が付けられる場合があります。

次のスクリーンショットは、ストーリーの [依存関係]関連リストを示しています。

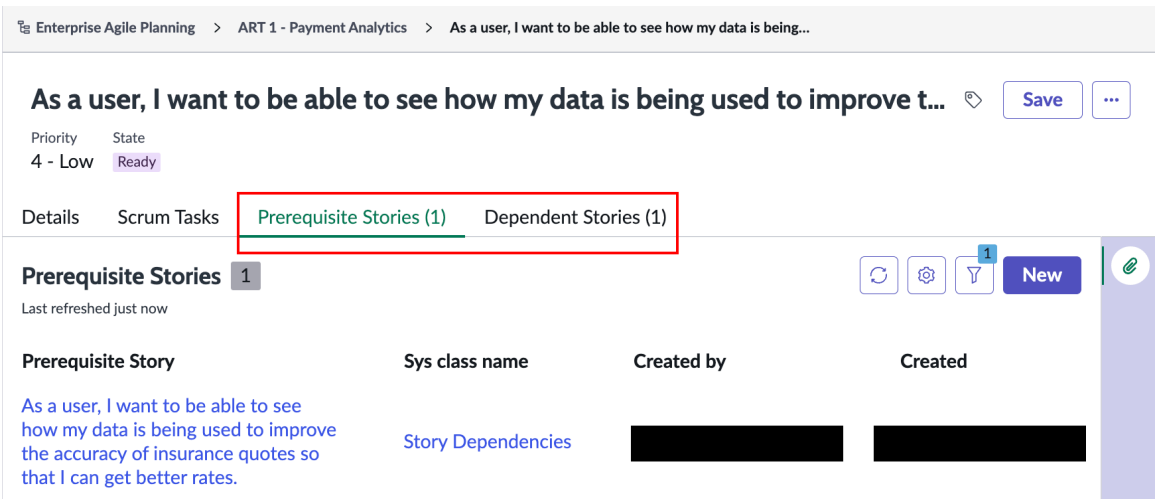

関連情報

EAP での作業アイテム間の依存関係の作成と管理

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

EAP での作業アイテム間の依存関係の作成と管理

チーム間および反復間で作業アイテムの依存関係をリアルタイムで描画し、エンタープライズアジャイル計画 の計画ボードを使用してコラボレーション中に視覚的に分析します。

始める前に

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user

このタスクについて

このタスクは、例として、計画の間隔 (PI) をカレンダーとするアジャイルリリーストレイン (ART) のストーリーを使用して説明されています。アジャイルチーム、ソリューショントレイン、またはポートフォリオの作業アイテムの依存関係の作成、更新、および削除にも同じガイダンスが適用されます。


- 別のストーリーによる依存関係があるストーリーは、前提条件ストーリーと呼ばれます。
- 別のストーリーに依存するストーリーは、依存ストーリーと呼ばれます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. 左側のナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、EAP チームを選択します。
3. 依存関係があるストーリーを特定し、計画ボードのインタラクティブ機能を使用してストーリー間に依存関係線を描画します。

   a. 依存ストーリーカードで、[依存関係線の追加] アイコン ( ) をクリックします。
   依存関係の点線が表示されます。

   b. 前提条件ストーリーカードを選択して、依存関係線の描画を終了します。

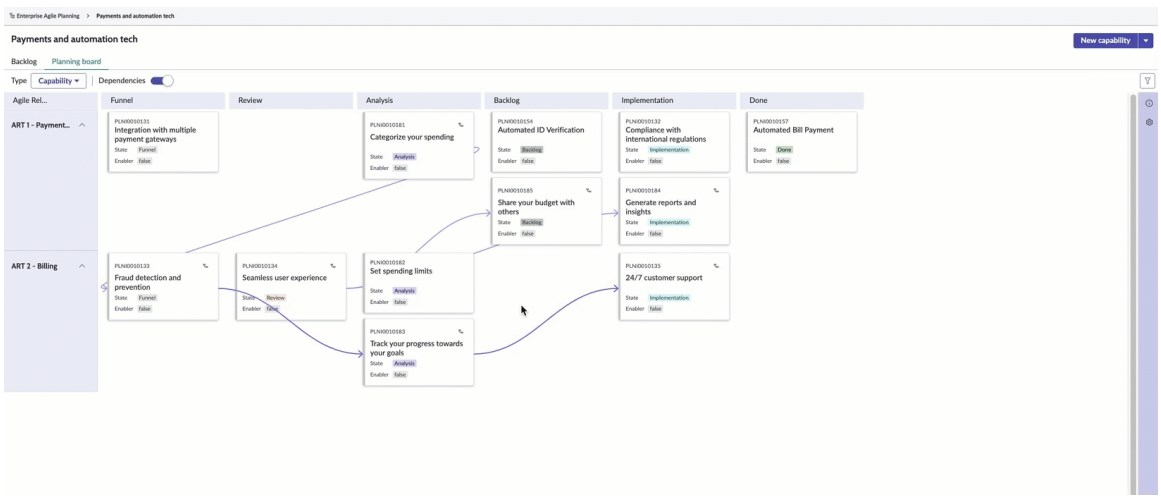

   ボードの作業アイテムに依存関係が追加されます。

4. 依存関係線の色が黄色または赤の場合は、それを確認し、必要に応じてストーリーを再スケジュールします。
5. 依存関係を削除して、要件の変更に対応します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 依存関係がある作業アイテムカードの完全な詳細ページに移動します。

b. [前提条件ストーリー] 関連リストまたは [依存ストーリー] 関連リストから、削除する依存関係を見つけます。

> **注:**
> これらの関連リストの名前は、エピックとソリューショントレインで異なります。

c. [システムクラス名] 列から、[ストーリーの依存関係] を選択します。

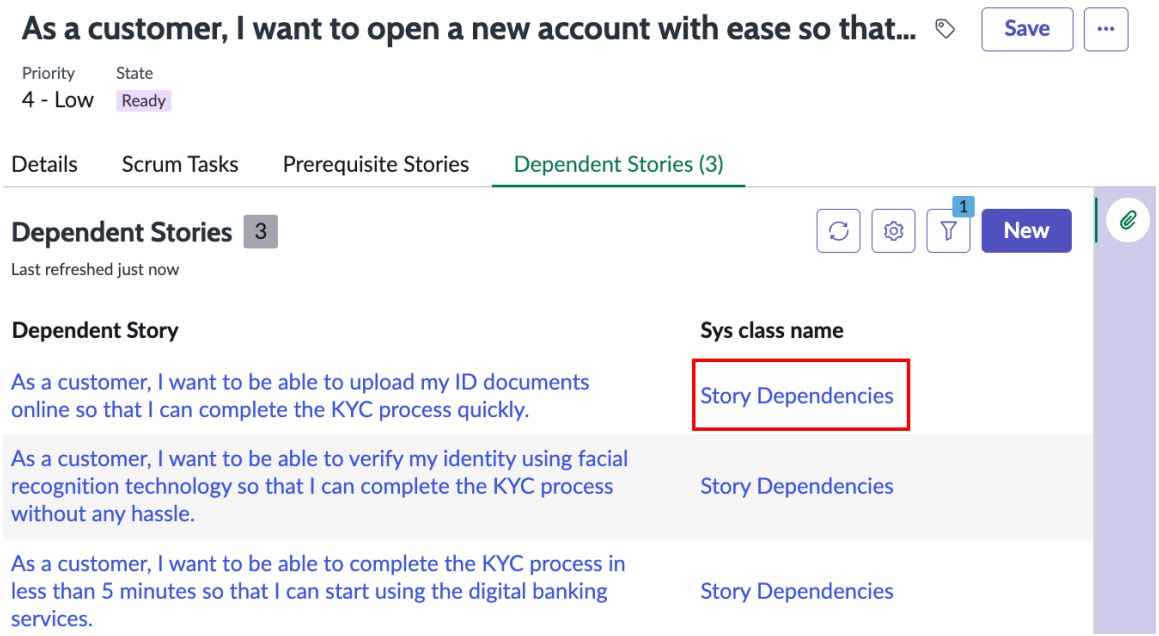

d. 依存関係アイテムヘッダーから、[その他のアクション] アイコン ( ) を選択して、[削除] を選択します。

e. **[OK]** を選択して依存関係の削除を確定します。

EAP 計画ボードのカスタマイズ

カードに表示するメトリクスとインジケーターを選択して、エンタープライズアジャイル計画 ワークスペースの計画ボードで重要な情報が一目でわかるようにします。

始める前に

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user

手順


1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. 左側のナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、EAP チームを選択します。
3. 計画ボードから、計画ボードの [パネルのカスタマイズ] アイコン ( ) を選択します。
4. [カスタマイズ] サイドパネルから、次の 1 つまたは複数を更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


- 垂直レーンと水平レーンのグループ化の選択。

  注:
  [ステータス] が垂直レーンとして選択されている場合、計画ボードに表示される列は、選択した EAP チームのアジャイル方法論 (スクラムまたは SAFe) に基づきます。

- カードサイズ:コンパクトまたはフル。

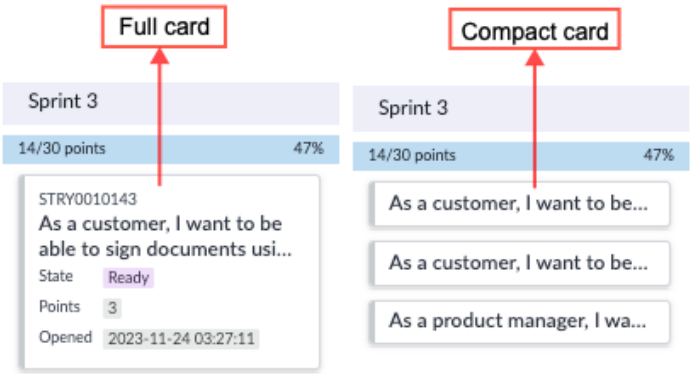

- カードに表示するインジケーターとデータポイント。
選択内容は自動的にカードに適用されます。次のスクリーンショットは、ART 計画ボードとそのカスタマイズオプションを示しています。

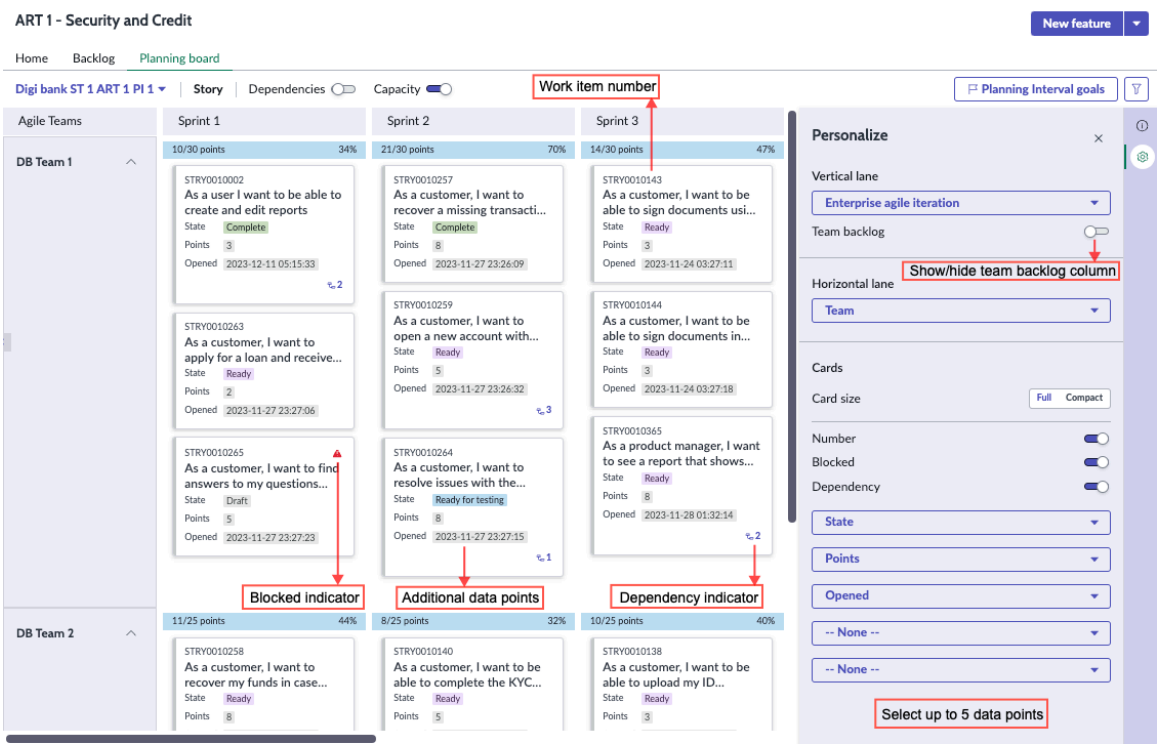

5. 必要な選択をすべて行ったら、サイドパネルを閉じます。

でドキュメントを使用したコラボレーション EAP

アジャイルチームとその計画立案アイテム (エピック、ケイパビリティ、機能) に関するあらゆる種類のドキュメントを、エンタープライズアジャイル計画 ワークスペースの一元的な場所で保存および管理します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

https://player.vimeo.com/video/1029774226?h=8e0cab6b63&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

ドキュメントの概要

EAPチームに関連付けられたプロダクトマネージャー、チームリーダー、およびチームメンバーは、アジャイル構造レベルと作業レベル (エピック、ケイパビリティ、および機能) で情報を保存および管理できます。

- EAP内の各計画立案アイテムまたはチームは、関連する情報をキャプチャするための個別のドキュメントを持つことができます。

  たとえば、エピックの場合、高レベルの事業達成目標や技術的な製品要件のためにドキュメントを作成します。チームレベルでも同様に、ドキュメントを使用して、チームの詳細、スクラム会議、反復の概要などに関連する情報をキャプチャできます。

- 各計画立案アイテムまたはアジャイル構造レベルには複数のドキュメントを関連付けることができ、各ドキュメントには複数のページを含めることができるため、主要なアーティファクトを効果的に整理できます。また、アジャイル構造では、これらのページを複数のドキュメントに整理できます。
- 反復のレトロスペクティブ、マーケティング計画、会議メモなどの事前定義されたテンプレートが利用可能です。これらのテンプレートのいずれかを使用してドキュメントのページを作成するか、空のページから開始します。要件に応じてテンプレートを作成または変更することもできます。

ドキュメントの機能

ドキュメントの主な機能は次のとおりです。

- コンテンツを自動保存します。
- ライブユーザープレゼンスの機能を使用して、ドキュメントを閲覧または作業しているユーザーを確認します。
- 事前定義されたテンプレートを使用してドキュメントを作成します。チームの要件に合わせてテンプレートを編集できます。
- 見出し、リスト、配置などを含むリッチテキスト段落の書式設定を使用します。
- ブロックレベルの編集を使用して、テキストブロックを移動して配置を変更します。
- **/** コマンドを使用して、チームメンバーをインラインでタグ付けしたりテーブルを挿入したりします。
- 他の ServiceNow AI Platform テーブルへの参照を追加して、チーム間で作業を接続します。
- ファイルをアップロードするか Web URL を使用して、画像を挿入します。

> **注:**
> Google イメージリンクを挿入するエクスペリエンスが機能しない場合があります。


を使用したドキュメントコンテンツの要約 **SPM** の **Now Assist**

Now Assist機能を使用して、ドキュメントで選択したコンテンツを詳細化、短縮、要約したり、ドキュメント全体の概要を取得したりできます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 選択したテキストを要約、詳細化、または短縮します。



- ページ上のコンテンツ全体を要約します。

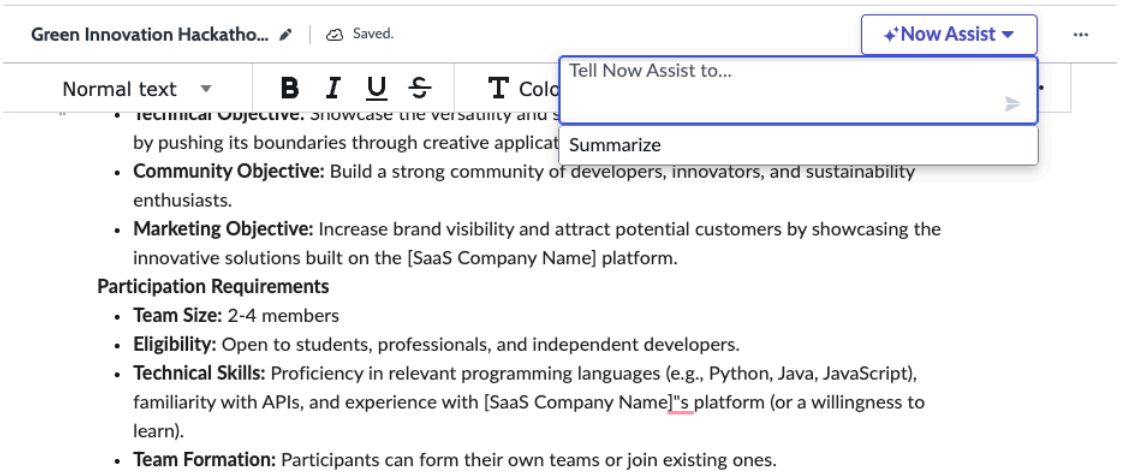

自動翻訳


注:

- EAP でドキュメントコンテンツを要約するには、EAP ドキュメント要約 Now Assist スキルをアクティブ化する必要があります。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。
- 要約するコンテンツが他にもある場合は、一部のコンテンツを削除して再試行できます。
- 出力は AI によって生成されたものであるため、正確であることを確認してください。

EAP ドキュメント内でのリアルタイムコラボレーション

リアルタイムコラボレーションの機能を使用して、他の複数のエディターと同時にドキュメントページを編集します。色付きのカーソルは、ページ上の各エディターの現在の位置を示します。ページのコンテンツを作業中または確認中の好みに基づいて、

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

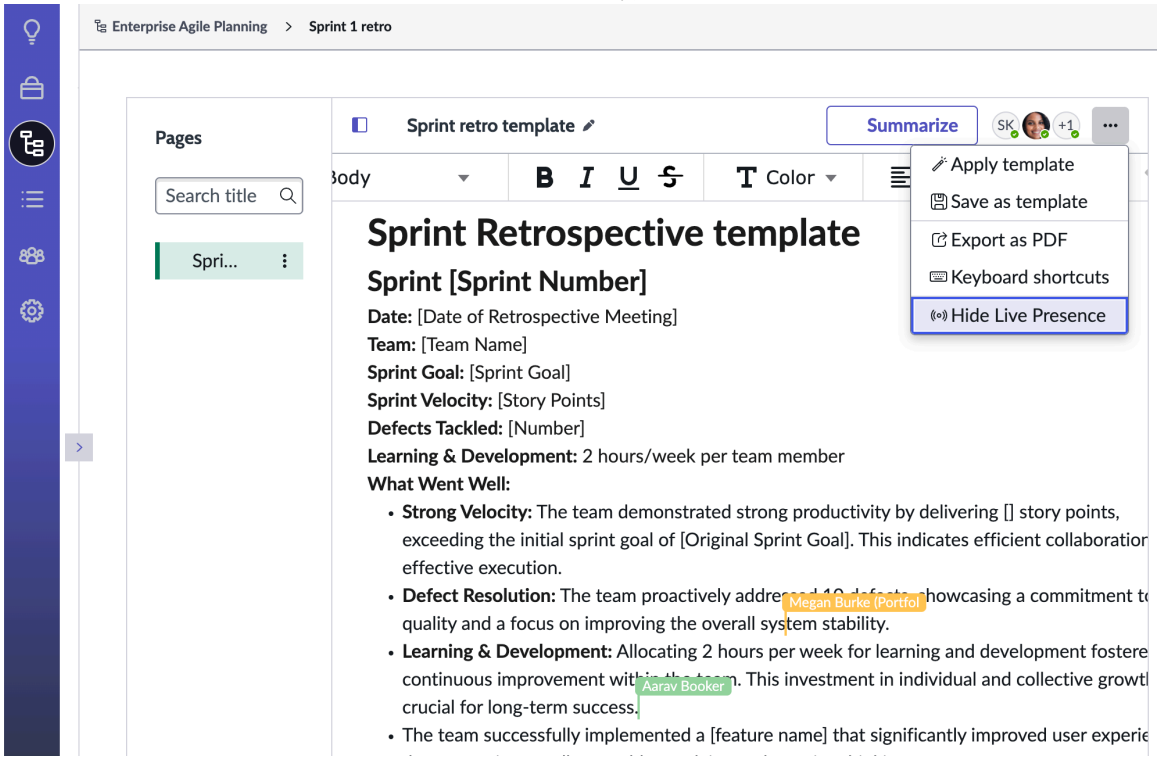これらのライブプレゼンスインジケーターを表示するか非表示にするかを選択できま 

す。

> **注:**
> 多数の同時編集者を使用すると、アプリケーションのパフォーマンスが低下する可能性があります。

EAP でのドキュメント作成

エンタープライズアジャイル計画 ワークスペースでドキュメントを使用して、作業、反復、およびチームに関連する情報を保存し、ユーザーとタスクレコードを参照し、リアルタイムで共同作業を行います。

始める前に

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user

このタスクについて

チームレベルまたは計画立案アイテムレベルでドキュメントを作成します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. ドキュメントを作成するチームまたは計画立案アイテムに移動します。
3. [新規] を選択して、チームまたは計画立案アイテムの新しいドキュメントを作成します。
4. ドキュメントのタイトルを入力し、[作成] を選択します。

   ドキュメントが作成されて無題の空白ページが開き、情報のキャプチャを開始できるようになります。ドキュメント内に複数のページを作成できます。

次のタスク

EAP におけるドキュメント内のページとサブページの管理。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

を使用した **EAP** のドキュメントコンテンツの要約と絞り込み **SPM** の **Now Assist**

Now Assist機能を使用して、ドキュメントで選択したコンテンツを詳細化、短縮、要約したり、エンタープライズアジャイル計画 (EAP) でドキュメント全体の要約を取得したりできます。

始める前に


- EAP でのドキュメント作成。
- EAP ドキュメント要約Now Assistスキルをアクティブ化します。「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user

このスキルへのアクセスを必要とするカスタムロールがある場合は、アクセスが必要なロールの ACL を更新します。詳細については、「Implement access control in Now Assist AI agents」を参照してください。

手順


1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. ドキュメントに移動します。
3. ドキュメントから、要約または絞り込みたいページを開きます。
4. 選択したテキストをページ上で要約するか、ページ全体を要約するかを選択します。
   - 選択したテキストを絞り込むには:
     a. ページ上のコンテンツの単一のブロックまたは複数のブロックを選択します。
     b. **[Now Assist]** を選択し、オプションを選択します。
        i. [要約を作成] を選択して、選択したテキストを要約します。
        ii. 既存の コンテキストに基づいて選択したテキストを長くするために詳細を設定します。
        iii. 短縮して 、選択したテキストを簡潔にします。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


- ページのコンテンツ全体を要約するには、ドキュメントヘッダーから **[Now Assist**] を選択し、[要約を作成] を選択します。



ヒント:
要約するコンテンツが他にもある場合は、一部のテキストを削除して再試行できます。

Now Assist がテキストを分析し、別のポップアップに出力を生成します。

5. オプション: 生成された出力に基づいて、結果をさらに絞り込んだり、生成されたコンテンツをドキュメントに挿入したりできます。

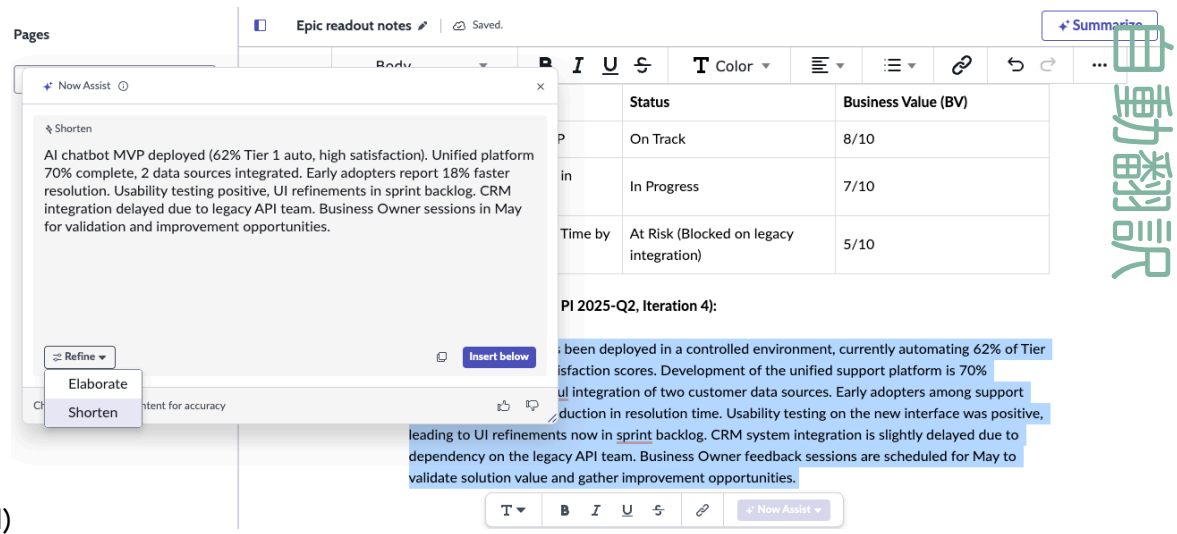

(Optional)

6. オプション: [クリップボードにコピー] アイコン ( ) を選択して生成された出力をコピーし、メールの送信、メモへの保存などの目的に使用します。

重要:
出力は AI によって生成されたものであるため、正確であることを確認してください。

EAP におけるドキュメント内のページとサブページの管理


エンタープライズアジャイル計画ワークスペースのドキュメント内のページとサブページを作成、複製、削除することで、チームと作業アイテムの情報を柔軟に整理します。

始める前に
必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. ドキュメントに移動します。
3. ページを作成するには、空白のページを作成するか、事前定義されたテンプレートから開始します。
   - 空白のページの場合は、[ページの作成] を選択します。
   - テンプレートから作成するには：
     a. [テンプレートからページを作成] を選択します。



     b. テンプレートセンターからテンプレートを選択し、[ページの作成] を選択します。

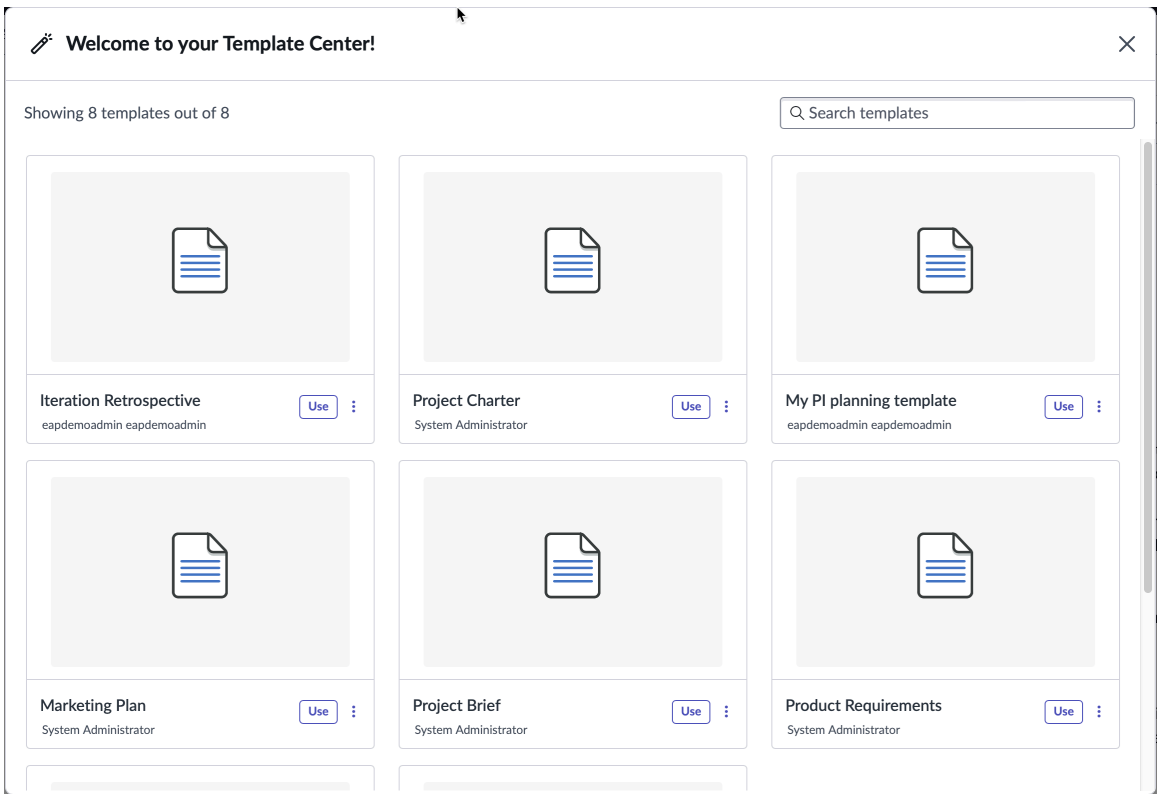


新しいページが作成され、「無題」という名前でドキュメントに追加されますが、名前は変更できます。

4. サブページを作成するには、[ページアクション] メニュー (⋮) を選択し、[サブページの作成] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。




5. ページまたはサブページを削除するには、[ページアクション] メニュー (⋮) を選択し、[削除] を選択します。

EAP の反復目標と作業アイテム目標

エンタープライズアジャイル計画 内で、PI レベルまたはスプリントレベルの目標を定義するか、作業アイテムを企業の目標に関連付けます。

反復目標

計画の間隔 (PI) またはスプリント計画中に、チームの機能目標を作成し、現在の反復での達成を計画している内容を詳述します。EAP 構成とチーム構造に応じて、チームの [計画ボード] タブから計画の間隔レベルまたはスプリントレベルで目標を作成できます。

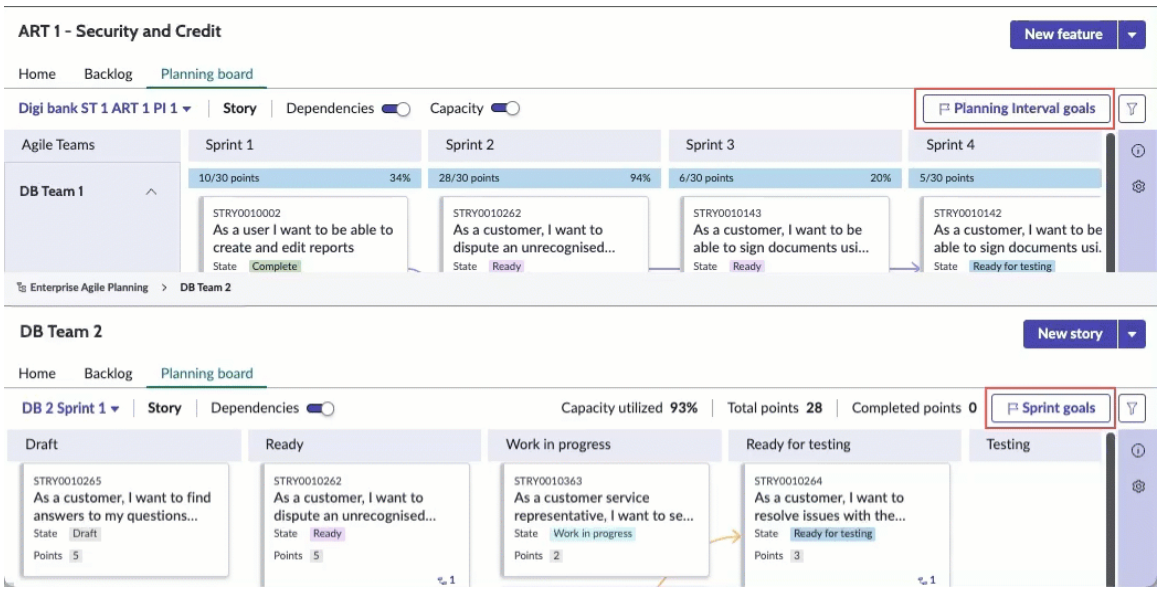

EAP で反復目標を作成する方法については、「EAP での PI またはスプリントの反復目標の作成」を参照してください。


作業アイテム目標

作業アイテム (エピック、ケイパビリティ、機能、またはストーリー) と、ポートフォリオレベルまたはエンタープライズレベルの目標および OKR との関係を確立します。作業アイテムに目標が追加されると、これらのアイテムに取り組んでいるチームは、自分たちの作業が寄与する価値をより詳細に把握できます。


作業アイテムの詳細の [主要目標] フィールドを使用して、目標を作業アイテムに個別に追加できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

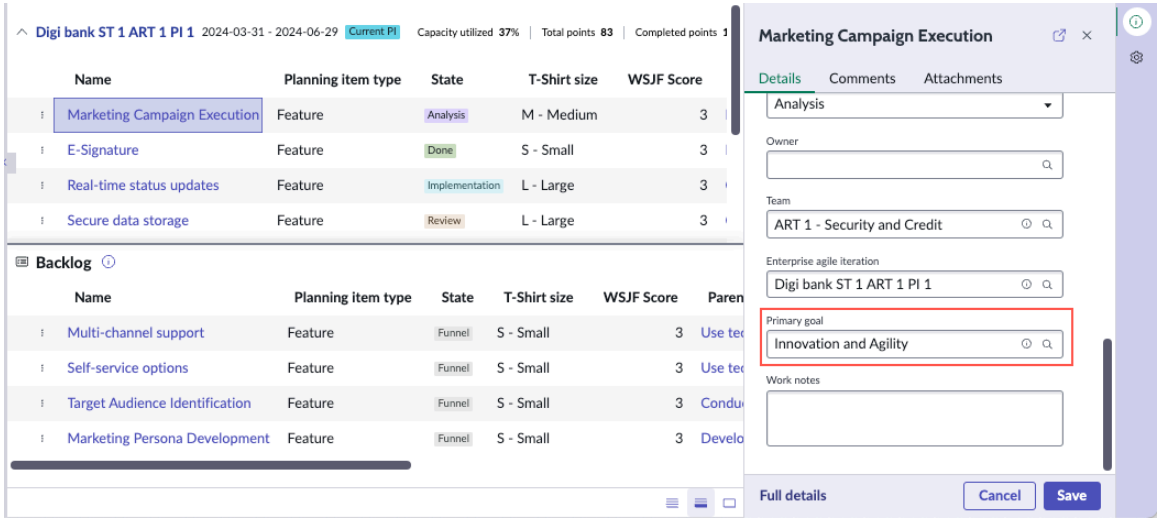

製品マネージャー、チームリーダー、またはチームメンバーは、ダッシュボードの作業アイテム配布レポートで関連付けられている目標に関して、作業配布を表示することもできます。

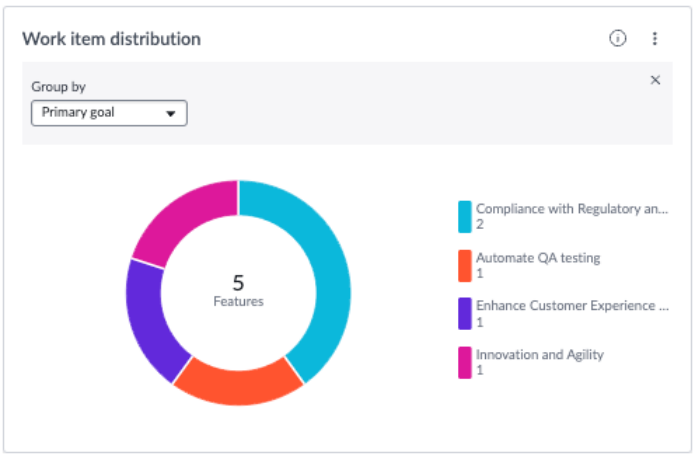

EAP での PI またはスプリントの反復目標の作成

アジャイルチームの反復目標を作成して、計画の間隔またはスプリントで達成すべき全体的な目標を強調します。

始める前に

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user

手順


1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. 左側のナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、ART またはアジャイルチームを選択して [計画ボード] を選択します。
   - 計画ボードには、デフォルトで ART の現在の反復が表示されます。別の反復を選択することもできます。
   - 計画ボードには、デフォルトでアジャイルチームの現在のスプリントが表示されます。別のスプリントを選択することもできます。
3. 現在のアジャイルチームレベルに応じて、[計画の間隔の目標 **(Planning Interval goals)**] または [スプリントの目標 **(Sprint goals)**] を選択します。
   [目標] タブには、PI またはスプリントの既存の目標が表示されます。
4. [新しい目標] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [新しい反復ゴール] ダイアログボックスで、目標の名前と説明を入力します。
6. [保存] をクリックします。

タスクの結果
PI またはスプリントの目標が作成され、[目標] タブに表示されます。

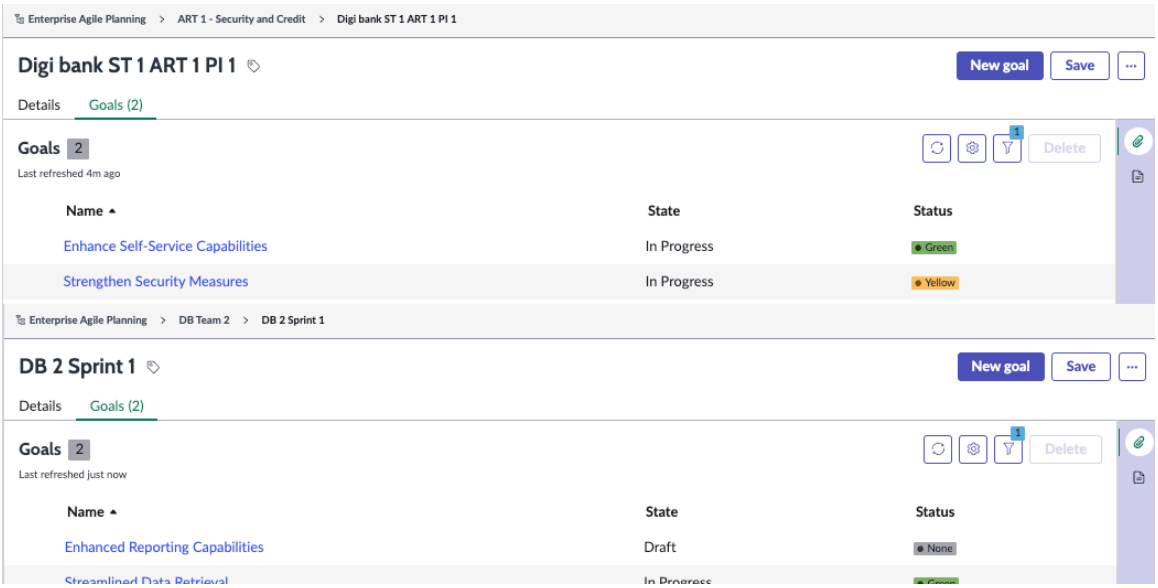

次のタスク
フィールドを更新して、目標に詳細を追加したり、サブ目標を追加したりすることができます。目標のフォームフィールドの詳細については、「[目標] フォーム」を参照してください。

EAP を Jira および Azure DevOps と統合

TBD TBD.

EAP レポートとダッシュボード

EAP ダッシュボードを使用して、メトリクスを可視化し、ブロッカーを特定して、アジャイルチームのパフォーマンス傾向を分析します。

ポートフォリオマネージャー、製品マネージャー、チームリーダー、またはチームメンバーは、EAP ダッシュボードを使用してチームのパフォーマンスに関するインサイトを取得します。EAP ダッシュボードは、ポートフォリオ、ソリューショントレーニング、ART、チームなどのアジャイル構造の各レベルで利用できます。

デフォルトのダッシュボードを使用するか、カスタムダッシュボードを構成してアジャイル構成に関連付けることができます。詳細については、「でのカスタムダッシュボードの構成 EAP」を参照してください。

EAP では、構成に基づいて、さまざまな階層レベルに対して次のデフォルトのインラインおよびテクニカルダッシュボードが用意されています。

ダッシュボード	利用可能
EAP ポートフォリオダッシュボード	• 完全な構成 • ポートフォリオ構成


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ダッシュボード	利用可能
EAP ソリューショントレーニングダッシュボード	• 完全な構成 • 大規模なソリューション構成
EAP ART ダッシュボード	• 完全な構成 • ポートフォリオ構成 • 大規模なソリューション構成 • 基本構成
EAP アジャイルチームダッシュボード アジャイルチームダッシュボードは、次のもので構成されます： • アジャイルチームインラインダッシュボード • アジャイルチームテクニカルダッシュボード • アジャイルチームインラインダッシュボード	• 完全な構成 • ポートフォリオ構成 • 大規模なソリューション構成 • 基本構成
カンバンポートフォリオダッシュボード	カンバンの構成
カンバンチームダッシュボード	カンバンの構成

EAP ポートフォリオダッシュボード

ポートフォリオダッシュボードには、ポートフォリオ内のすべてのアクティブな作業アイテムの概要が表示されます。

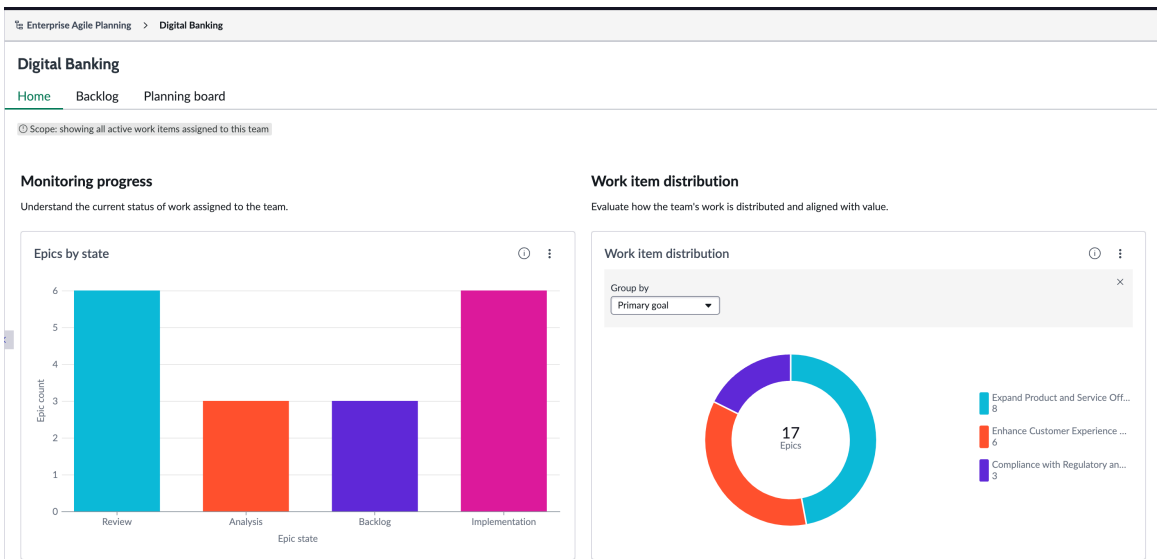

デフォルトのダッシュボードを使用するか、カスタムダッシュボードを構成してアジャイル構成に関連付けることができます。詳細については、「でのカスタムダッシュボードの構成 EAP」を参照してください。

必要な EAP ロール

ダッシュボードを表示するには、EAP の読み取り専用 (sn_apw_advanced.eap_read_only) ロールが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


ポートフォリオダッシュボードへのアクセス

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. ナビゲーションパネルのアジャイル構造セクションから、 EAP ポートフォリオを選択します。
3. [**Home**] タブを選択します。

ユースケース

ユーザー	ダッシュボードの使用法
• ポートフォリオマネージャー • プロダクトマネージャー • チームリーダー • チームメンバー	ポートフォリオ内のチームにアサインされたアクティブな作業アイテムと作業アイテムの分布を表示します。

レポート


役職	タイプ	ソーステーブル	説明
ステータス別エピック (Epics by state)	棒グラフ 	sn_align_core_scrum_epic	このポートフォリオにアサインされ、現在のステータス別にグループ化されたエピック。
作業アイテム分布 (Work item distribution)	ドーナツグラフ 	sn_align_core_scrum_epic	選択した属性の作業アイテムの分布。次のいずれかのオプションを使用して、データをグループ化できます: • プライマリゴール • [主要目標] > [カテゴリ] • 戦略的プログラム • Owner (所有者) • 部門

のカンバンポートフォリオダッシュボード **EAP**

エンタープライズアジャイル計画 (EAP) のカンバンポートフォリオダッシュボードには、カンバン構成のEAPポートフォリオの進捗状況メトリクスと作業アイテムのステータスが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

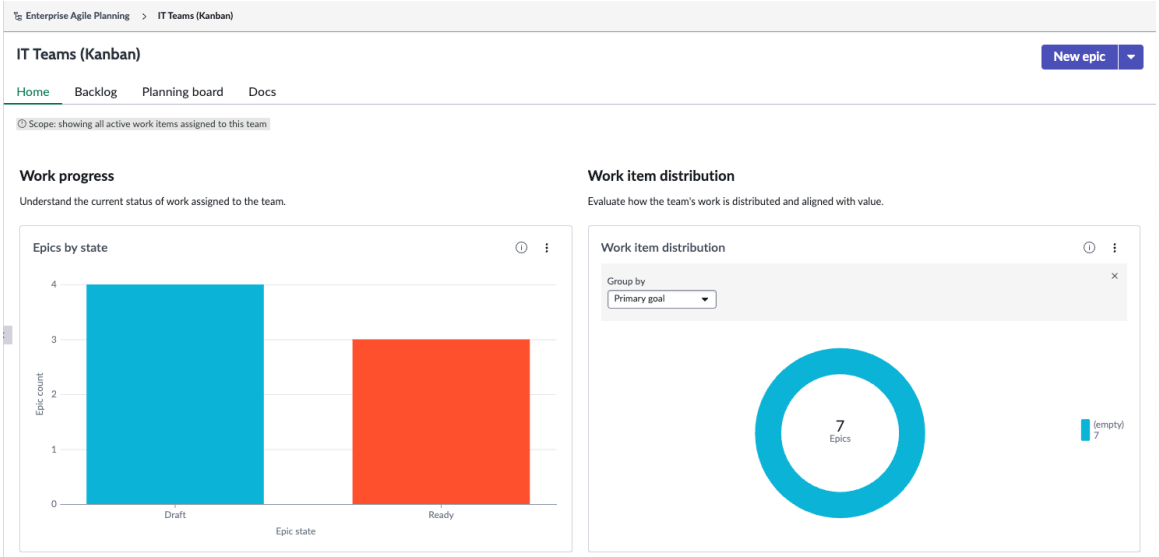

必要な EAP ロール

sn_apw_advanced.eap_read_only または sn_apw_advanced.eap_user。

カンバンポートフォリオダッシュボードへのアクセス

ダッシュボードを開くには、次の手順を実行します。

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. ナビゲーションパネルの [アジャイル構造] セクションから、カンバン EAP ポートフォリオを選択します。
3. [**Home**] タブを選択します。

ユースケース

組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用するかの例については、次のユースケースを参照してください。



ユーザー	ダッシュボードの使用法
• ポートフォリオマネージャー • プロダクトマネージャー • チームリーダー • チームメンバー	ポートフォリオ内のチームにアサインされたアクティブな作業アイテムと、作業アイテムの分布を表示します。

レポート

タイトル	タイプ	ソーステーブル	説明
ステータス別エピック (Epics by state)	棒グラフ	sn_align_core_scrum_epic	このカンバンポートフォリオにアサインされ、現在のステータス


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	ソーステーブル	説明
			別にグループ化されたエピック。
作業アイテム分布 (Work item distribution)	ドーナツグラフ 	sn_align_core_scrum_epic	選択した属性の作業アイテムの分布。次のいずれかのオプションを使用して、データをグループ化できます: • プライマリゴール • [主要目標] > [カテゴリ] • 戦略的プログラム • Owner (所有者) • 部門

EAP ソリューショントレーニングダッシュボード

ソリューショントレーニングダッシュボードは、機能、作業アイテム、チームのパフォーマンスなど、チームの作業アサインステータスのスナップショットを提供します。

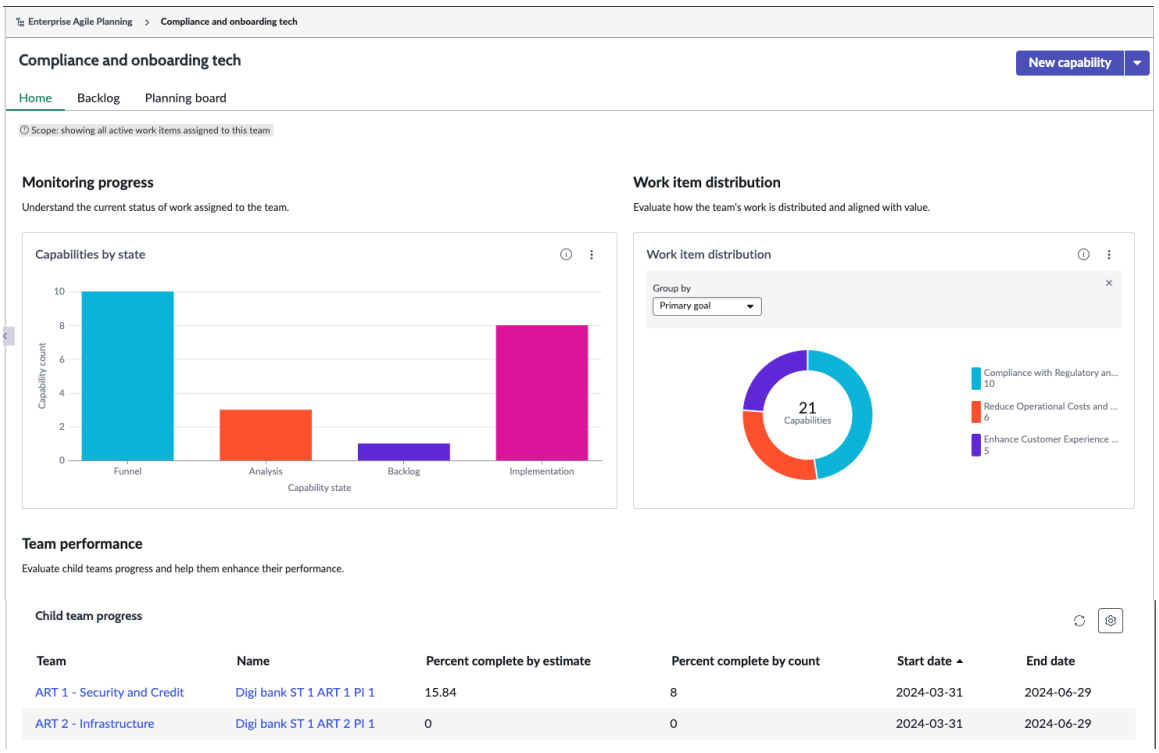

デフォルトのダッシュボードを使用するか、カスタムダッシュボードを構成してアジャイル構成に関連付けることができます。詳細については、「でのカスタムダッシュボードの構成 EAP」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

必要な EAP ロール

ダッシュボードを表示するには、EAP の読み取り専用 (sn_apw_advanced.eap_read_only) ロールが必要です。


ソリューショントレーニングダッシュボードへのアクセス

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. ナビゲーションパネルの [アジャイル構造] セクションから、 EAP ソリューショントレインを選択します。
3. [**Home**] タブを選択します。

ユースケース

ユーザー	ダッシュボードの使用法
• ポートフォリオマネージャー • プロダクトマネージャー • チームリード • チームメンバー	ソリューショントレーニングでチームにアサインされた機能のステータス、作業アイテムの分布、およびチームのパフォーマンスを表示します。

レポートとデータの可視化

タイトル	タイプ	ソーステーブル	説明
ステータス別機能 (Capabilities by state)	棒グラフ 	sn_align_core_capability	現在のステータス別にグループ化され、このソリューショントレーニングにアサインされた機能。
作業アイテム分布 (Work item distribution)	ドーナツグラフ 	sn_align_core_capability	選択した属性の作業アイテムの分布。次のいずれかのオプションを使用して、データをグループ化できます: • プライマリゴール • [主要目標] > [カテゴリ] • 戦略的プログラム


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	ソーステーブル	説明
			• Owner (所有者) • 部門
チームパフォーマンス	リスト	sn_apw_advanced_eap_iteration	子チームの進捗状況を評価し、パフォーマンスの向上を支援します。 ⚙ アイコンを選択すると、レポートの列を選択して並べ替えることができます。

EAP ART ダッシュボード

ART ダッシュボードは、計画の間隔 (PI) の全体的な進捗状況のスナップショットを提供します。

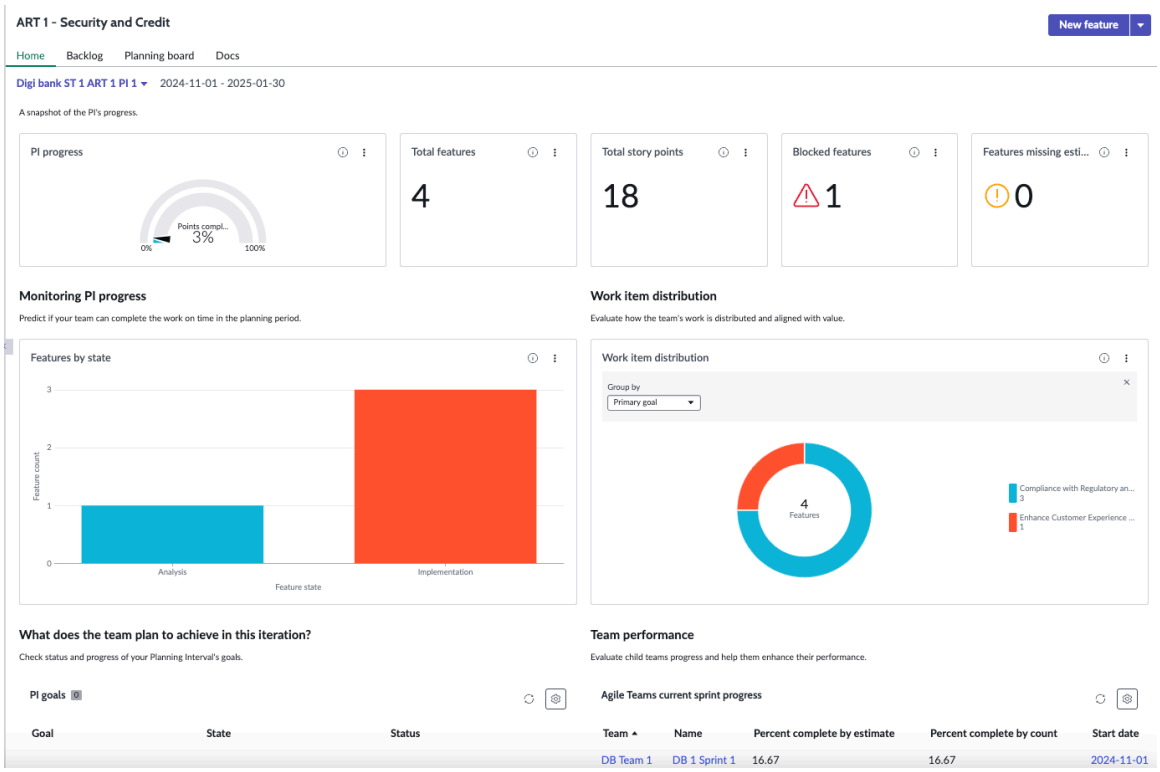

デフォルトのダッシュボードを使用するか、カスタムダッシュボードを構成してアジャイル構成に関連付けることができます。詳細については、「でのカスタムダッシュボードの構成 EAP」を参照してください。

必要な EAP ロール

ダッシュボードを表示するには、EAP の読み取り専用 (sn_apw_advanced.eap_read_only) ロールが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ART ダッシュボードへのアクセス

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. ナビゲーションパネルの [アジャイル構造] セクションから、 EAP ART を選択します。
3. [**Home**] タブを選択します。

ユースケース


ユーザー	ダッシュボードの使用法
• ポートフォリオマネージャー • プロダクトマネージャー • チームリード • チームメンバー	計画の間隔の目標、機能、全体的な進捗状況、およびチームのパフォーマンスの進捗状況とステータスを表示します。

レポートとデータの可視化

タイトル	タイプ	ソーステーブル	説明
PI 進捗状況 (PI progress)	ゲージ 	sn_apw_advanced_eap_iteration	この計画の間隔の合計スコープ外で完了したポイントの割合。
機能合計 (Total features)	単一スコア 	sn_align_core_feature	この計画の間隔にスケジュールされている機能の合計数。
ブロックされた機能 (Blocked features)	単一スコア	sn_align_core_feature	この PI にスケジュール設定されている、ブロックされた機能の数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	ソーステーブル	説明
			
合計ストーリーポイント (Total story points)	単一スコア 	sn_align_core_feature	この計画の間隔にスケジュール設定されたすべての機能の合計ストーリーポイント。
推定が欠如している機能 (Features missing estimates)	単一スコア 	sn_align_core_feature	この反復にスケジュールされている、推定のない子ストーリーを持つ機能の数。
ステータス別機能 (Features by state)	棒グラフ 	sn_align_core_feature	現在のステータス別にグループ化され、この PI に対してスケジュールされた機能。
作業アイテム分布 (Work item distribution)	ドーナツグラフ 	sn_align_core_feature	選択した属性の作業アイテムの分布。次のいずれかのオプションを使用して、データをグループ化できます: • プライマリゴール • [主要目標] > [カテゴリ] • 戦略的プログラム

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


タイトル	タイプ	ソーステーブル	説明
			• Owner (所有者) • 部門
チームがこの反復で達成する目標 (What does the team plan to achieve in this iteration?)	リスト 	sn_gf_goal	計画の間隔の目標のステータスと進捗状況。
チームパフォーマンス	リスト 	sn_apw_advanced_eap_iteration	子チームの進捗状況を評価し、パフォーマンスの向上を支援します。 ⚙ アイコンを選択すると、レポートの列を選択して並べ替えることができます。

EAP アジャイルチームダッシュボード

アジャイルチームダッシュボードには、 エンタープライズアジャイル計画 (EAP) ワークスペースのアジャイルチームのスプリントの進捗状況とチームパフォーマンスの詳細が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

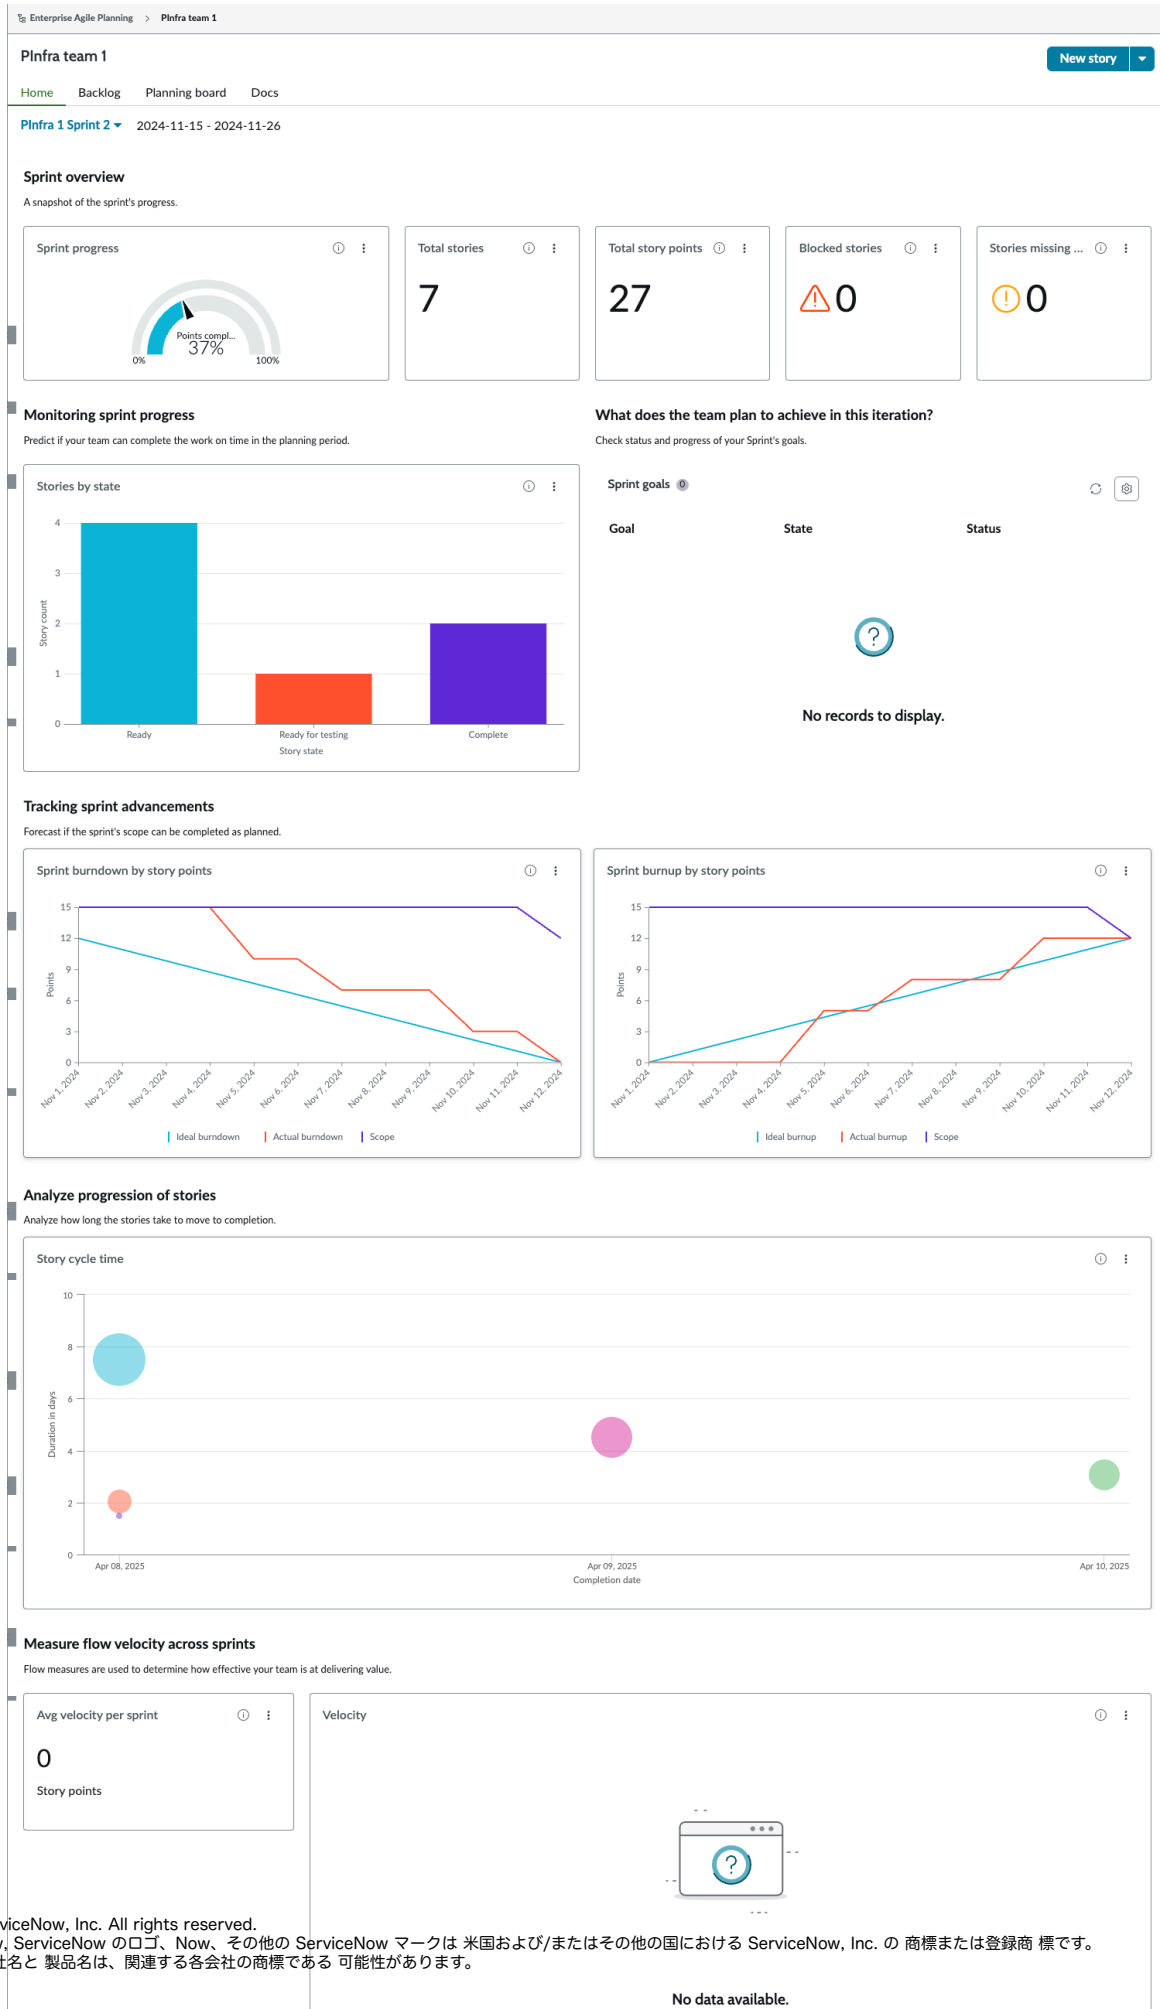

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトのダッシュボードを使用するか、カスタムダッシュボードを構成してアジャイル構成に関連付けることができます。詳細については、「でのカスタムダッシュボードの構成 EAP」を参照してください。

必要な **EAP** ロール

ダッシュボードを表示するには、EAP の読み取り専用 (sn_apw_advanced.eap_read_only) ロールが必要です。

アジャイルチームダッシュボードへのアクセス

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. ナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、 EAP チームを選択します。
3. [**Home**] タブを選択します。

ユースケース


ユーザー	ダッシュボードの使用法
• ポートフォリオマネージャー • プロダクトマネージャー • チームリーダー • チームメンバー	スプリントの目標、ストーリー、全体的な進捗状況、チームのパフォーマンスの進捗状況とステータスを表示します。

レポート

役職	タイプ	ソーステーブル	説明
スプリント進捗状況 (Sprint progress)	ゲージ 	sn_apw_advanced_eap_iteration	このスプリントの合計スコープ外で完了したポイントの割合。
合計ストーリー数 (Total stories)	単一スコア	rm_story	このスプリントにスケジュールされているストーリーの数。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

役職	タイプ	ソーステーブル	説明
			
ブロック済みストーリー	単一スコア 	rm_story	このスプリントに対してブロックされているストーリーの数。
合計ストーリーポイント (Total story points)	単一スコア 	rm_story	このスプリントにスケジュールされているすべてのストーリーの合計ポイント。
推定が欠如しているストーリー (Stories missing estimates)	単一スコア 	rm_story	このスプリントにスケジュールされているストーリーのうち、ストーリーポイントがないストーリーの数。
ステータス別ストーリー (Stories by state)	棒グラフ 	rm_story	現在のステータス別にグループ化された、このスプリントにスケジュールされているストーリー。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

役職	タイプ	ソーステーブル	説明
チームがこの反復で達成する目標 (What does the team plan to achieve in this iteration?)	リスト 	sn_gf_goal	スプリントの目標のステータスと進行状況。 レポートの列を並べ替えるには、[設定] アイコン (
ストーリーポイント別のスプリントバーンダウン	傾向図 	この傾向では、次のインジケーターを使用します。 • EAP:現在の反復のすべてのストーリーのストーリーポイントの合計。 • EAP:現在の反復のアクティブなストーリーのストーリーポイントの合計。	スプリントの理想的なペースと現在のペースを比較したバーンダウン傾向。このレポートは、スプリントの終了前にスコープを完了できるかどうかを分析するのに役立ちます。
ストーリーポイント別のスプリントバーンアップ	傾向図 	この傾向では、次のインジケーターを使用します。 • EAP：現在の反復の完了済みストーリーのストーリーポイントの合計。 • EAP：現在の反復のすべてのストーリーのストーリーポイントの合計	スプリントの理想的なペースと現在のペースを比較したバーンアップ傾向。このレポートは、スプリントの終了前にスコープを完了できるかどうかを分析するのに役立ちます。
スプリントあたりの平均速度	単一スコア 	sn_apw_advanced_eap_iteration	チームがスプリントごとに完了できるストーリーポイントの数。このメトリクスを使用して、チームの平均パフォーマンスを評価できます。
速度	傾向図	sn_apw_advanced_eap_iteration	過去 90 日間にこのチームによって完了したストーリーポイントの傾向。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


役職	タイプ	ソーステーブル	説明
			
ストーリーサイクルタイム	バブル チャート 	sn_apw_advanced_story_cycle_time	各ストーリーが「進行中」ステータスから「完了」ステータスに移行するまでにかかった時間。 グラフの各バブルはストーリーを表し、グラフには過去 30 日間に完了したストーリーが表示されます。バブルの x 軸からの高さは、進行中ステータスから完了ステータスに移行するまでの時間 (日数) を示します。ストーリーバブルの大きさは、ストーリーポイントに基づき、相対的なものです。 そのチャートのバブルにカーソルを合わせると、ストーリーポイント、完了までの期間 (日数)、名前などのストーリーデータが表示されます。 ストーリーポイントが異なるストーリーのサイクル時間を比較し、チームがストーリーを完了するのに要した時間の傾向を分析できます。 **注:** 現在、サイクルタイムチャートでは、ストーリーバブルを選択してストーリーにドリルダウンすることはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

EAP のカンバンチームダッシュボード

EAP のカンバンチームダッシュボードは、 エンタープライズアジャイル計画 (EAP) ワークスペースのカンバン構成に従って、アジャイルチームの作業アイテムのステータスと進行状況のメトリクスを提供します。

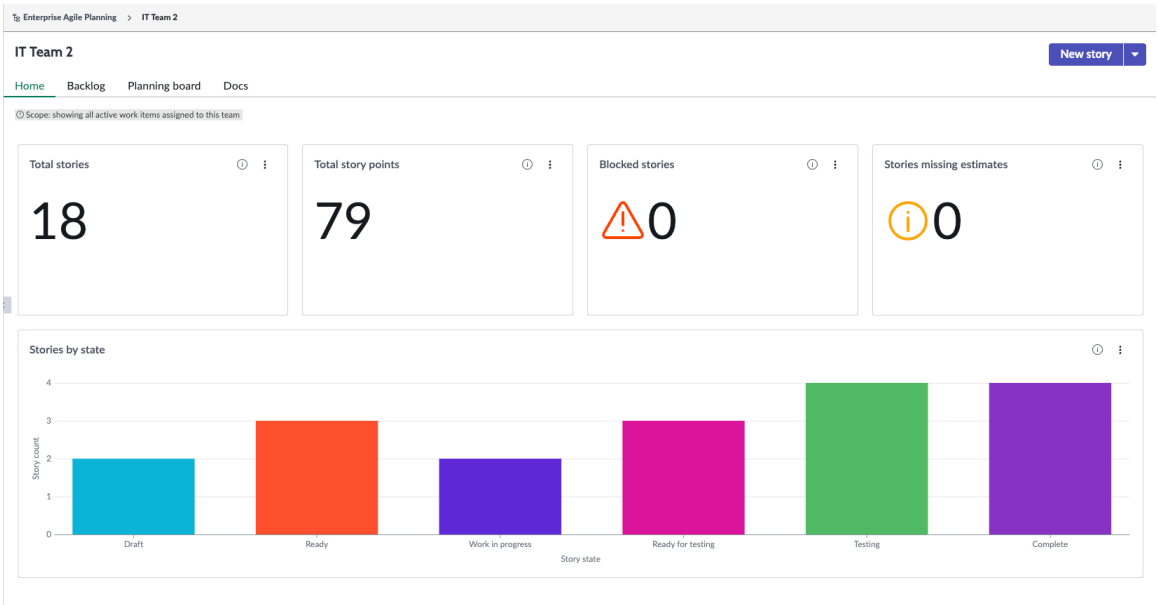

必要な EAP ロール

sn_apw_advanced.eap_read_only または sn_apw_advanced.eap_user。

カンバンチームダッシュボードへのアクセス

ダッシュボードを開くには、次の手順を実行します。

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. ナビゲーションパネルの [アジャイル構造] セクションから、カンバン EAP ポートフォリオを選択します。
3. [**Home**] タブを選択します。

ユースケース

組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用するかの例については、次のユースケースを参照してください。

ユーザー	ダッシュボードの使用法
• ポートフォリオマネージャー • プロダクトマネージャー • チームリーダー • チームメンバー	カンバンチームにアサインされた作業アイテムの進捗状況とステータスを表示します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レポート

タイトル	タイプ	ソーステーブル	説明
合計ストーリー数 (Total stories)	単一スコア 	rm_story	このチームにアサインされたストーリーの数。
合計ストーリーポイント (Total story points)	単一スコア 	rm_story	このチームにアサインされているすべてのストーリーの合計ポイント。
ブロック済みストーリー	単一スコア 	rm_story	このチームにアサインされ、ブロックされているストーリーの数。
推定が欠如しているストーリー (Stories missing estimates)	単一スコア 	rm_story	このチームにアサインされているストーリーポイントのないストーリーの数。
ステータス別ストーリー (Stories by state)	棒グラフ	rm_story	このチームにアサインされ、現在のステータス別にグループ化されたストーリー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	ソーステーブル	説明
			

エンタープライズアジャイル計画の参照

参照トピックでは、Enterprise Agile Planning (EAP) の構成と使用に使用するリスト、フォーム、ロール、テーブル、およびその他のコンポーネントに関する追加情報を提供します。

エンタープライズアジャイル計画 とともにインストールされるコンポーネント

戦略的計画 アプリケーションをインストールすると、いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が エンタープライズアジャイル計画 とともにインストールされます。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	含まれるロール
EAP アドミン [sn_apw_advanced.eap_admin]	チームを EAP 構成に追加したり、削除したりできます。	sn_apw_advanced.eap_user
EAP ユーザー [sn_apw_advanced.eap_user]	• 作業アイテムを作成、更新、削除できます。 • 計画間隔やスプリントなどの反復を作成および変更できます。 • チームのバックログおよび計画ボードにアクセスできます。	• scrum_master • sn_apw_advanced.eap_read_only • now_assist_panel_user このロールは、SPM Pro+ ライセンスを使用してアクティブ化される SPM の Now Assist プラグインでのみ使用できます。
EAP 読み取り専用ロール [sn_apw_advanced.eap_read_only]	EAP チームのバックログおよび計画ボードを表示できます。	• scrum_user • workspace_user • canvas_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
アジャイルリリーストレイン [sn_apw_advanced_agile_release_train]	EAP 構成のアジャイル構造に対して作成されたすべてのアジャイルリリーストレインの情報を格納します。 このテーブルは、Enterprise アジャイルチーム [sn_apw_advanced_eap_team] テーブルを拡張します。
アジャイルチーム [sn_apw_advanced_agile_team]	EAP 構成のアジャイル構造に対して作成されたすべてのアジャイルチームの情報を格納します。 このテーブルは、Enterprise アジャイルチーム [sn_apw_advanced_eap_team] テーブルを拡張します。
ケイパビリティ [sn_align_core_capability]	EAP で作成された作業アイテムのすべてのケイパビリティタイプの情報を格納します。 このテーブルは、EAP 計画立案アイテム [sn_align_core_eap_planning_item] テーブルを拡張します。
EAP 計画立案アイテム [sn_align_core_eap_planning_item]	すべての EAP 作業アイテムタイプのベーステーブル。 このテーブルは、計画立案アイテムエントリ [sn_align_core_planning_item] テーブルを拡張します。
Enterprise アジャイルカレンダー [sn_apw_advanced_eap_calendar]	計画間隔やスプリントなどの反復タイプの情報を格納します。 このテーブルはビジネスカレンダー [business_calendar] テーブルを拡張します。
Enterprise アジャイルカレンダーエントリ [sn_apw_advanced_eap_calendar_span]	ビジネスカレンダースパンのカレンダーエントリについて、定義されたタイムラインの情報または日付スパンを格納します。 たとえば、スプリントカレンダータイプでは、3 か月にわたる 6 つのカレンダーエントリを作成できます。このテーブルには、これらの各スプリントカレンダーエントリの日付スパンが格納されます。 このテーブルはビジネスカレンダーエントリ [business_calendar_span] テーブルを拡張します。
Enterprise アジャイル構成	完全な構成、ポートフォリオ構成、その他のデフォルト構成やカスタム構成などのアジャイル構成の情報を格納します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
(sn_apw_advanced_eap_configuration)	
Enterprise アジャイル構成の詳細 [sn_apw_advanced_eap_configuration_detail]	構成のチームタイプに関連付けられたデフォルトの作業アイテムタイプと計画カレンダーの詳細を格納します。 以下も保存されます。 • 構成のアジャイル構造におけるチーム階層。 • [バックログ] ページおよび [計画ボード] ページで利用可能な作業アイテムタイプ。
Enterprise アジャイル反復 [sn_apw_advanced_eap_iteration]	キャパシティ、合計ポイント、状況など、チームレベルの反復の詳細を格納します。
Enterprise アジャイル反復タイプ [sn_apw_advanced_eap_iteration_type]	計画間隔やスプリントなどの計画カレンダータイプに関する情報を格納します。
Enterprise アジャイルチーム [sn_apw_advanced_eap_team]	構成のアジャイル構造で作成された ART、ソリューショントレイン、アジャイルリリーストレイン、ポートフォリオなどのすべての EAP チームのベーステーブル。
Enterprise アジャイルチームの構造 [sn_apw_advanced_eap_team_structure]	チーム階層の情報が含まれています。
Enterprise アジャイル作業の構造 [sn_apw_advanced_eap_work_structure]	作業アイテムタイプ階層の情報が含まれています。
エピック [sn_align_core_scrum_epic]	EAP で作成されたすべてのエピック作業アイテムの情報を格納します。 このテーブルは、EAP 計画立案アイテム [sn_align_core_eap_planning_item] テーブルを拡張します。
機能 [sn_align_core_feature]	EAP で作成されたすべての機能作業アイテムの情報を格納します。 このテーブルは、EAP 計画立案アイテム [sn_align_core_eap_planning_item] テーブルを拡張します。
ソリューショントレイン [sn_apw_advanced_solution_train]	EAP 構成のアジャイル構造に対して作成されたすべてのソリューショントレインの情報を格納します。 このテーブルは、Enterprise アジャイルチーム [sn_apw_advanced_eap_team] テーブルを拡張します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
SAFe ポートフォリオ [sn_apw_advanced_eap_portfolio]	EAP 構成のアジャイル構造に対して作成されたすべてのポートフォリオの情報を格納します。 このテーブルは、Enterprise アジャイルチーム [sn_apw_advanced_eap_team] テーブルを拡張します。
ストーリー [rm_story]	作成されたすべてのストーリーの情報を格納します。 このテーブルは、戦略的計画 とともにインストールされる アジャイル開発 2.0 アプリケーションに併せてインストールされます。

EAP と アジャイル開発 2.0 の統合

エンタープライズアジャイル計画 で構成を設定する際に、アジャイル開発 2.0 との統合を確立できます。接続されているテーブルと情報にアクセスする方法の詳細について説明します。

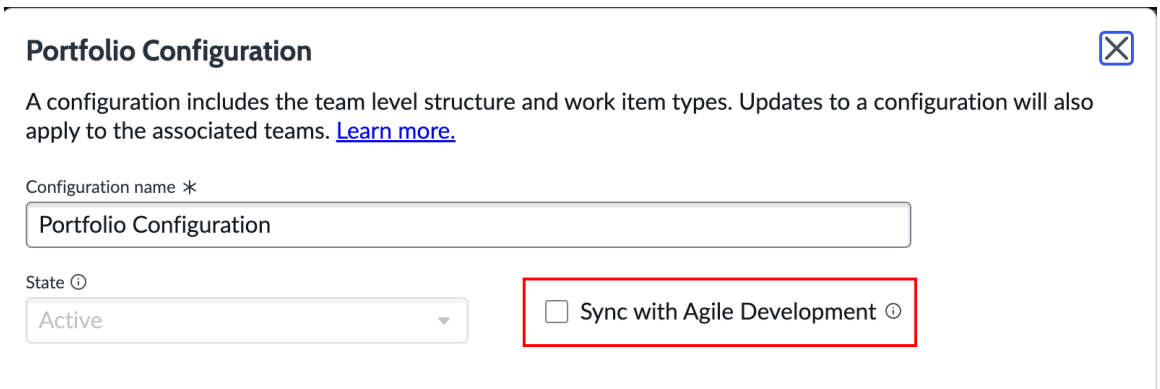

EAP 構成フォームで **[Agile Development** と同期 **(Sync with Agile Development)]** オプションを有効にすると、次のテーブルの情報が 2 つのアプリ間で同期されます。

EAP テーブル	アジャイル開発 2.0 テーブル
Enterprise アジャイル反復 [sn_apw_advanced_eap_iteration]	スプリント [rm_sprint]

構成に対してこの同期が確立されると、次の機能が変更されます。

スプリントの作成と更新

- スプリントの作成は、EAP から行うことをお勧めします。
- EAP でスプリントを作成すると、関連するスプリントが アジャイル開発 2.0 に作成されます。

  EAP のスプリントの日付が rm_sprint テーブルのレコードと重複している場合、アジャイル開発 2.0 に新しいスプリントは作成されません。重複しない日付のスプリントを作成するか、rm_sprint テーブルから既存のスプリントを削除するかを選択できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アジャイル開発 2.0 のスプリントの開始予定日と終了予定日のフィールドは読み取り専用になり、EAP の反復にマップされたビジネスカレンダースパンから派生します。
- EAP でスプリントの詳細を更新すると、アジャイル開発 2.0 の対応するスプリントの詳細が更新されます。
- EAP からスプリントを削除すると、対応するレコードがスプリント [rm_sprint] テーブルから削除されます。
- スプリント [rm_sprint] テーブルで、EAP の反復の親と、この反復が属する EAP チームの参照フィールドが作成されます。

ストーリーの作成と更新

- この構成でスプリントにスケジュール設定されているすべてのストーリーには、アジャイル開発 2.0 のスプリントからアクセスできます。

  アジャイルボードからこのスプリントの進捗状況を追跡できます。
- ストーリーの詳細に加えられた変更や進捗状況は、両方のアプリケーションに表示されます。
- ストーリー [rm_story] テーブルで、EAP フィールド関連リストの EAP チーム、反復、構成、および親作業アイテムの参照フィールドが作成されます。
- ストーリーが別のスプリントに再スケジュールされたり、アジャイルボードのバックログに移動されたりすると、EAP でストーリーが更新され、その逆も同様です。

注:
EAP のストーリーレコードは、デフォルトでは アジャイル開発 2.0 プラグインとともにインストールされるストーリー [rm_story] テーブルに保存されます。

[チームタイプ] フォーム

エンタープライズアジャイル計画 において新しいチームタイプを追加するのに必要な新規テーブルフォームのフィールドについて説明します。

新しいテーブルフォーム

フィールド	説明
ラベル	テーブルの一意のラベル。
名前	このフィールドは、[ラベル] フィールドの入力から自動生成されます。
アプリケーション	このフィールドは、スコープに基づいて、自動的に [ポートフォリオ計画コア **(Portfolio Planning Core)]** に設定されます。 このフィールドに別の値が表示されている場合は、ServiceNow インスタンスのスコープを [ポートフォリオ計画コア **(Portfolio Planning Core)]** に設定します。
拡張テーブル	**[Enterprise** アジャイルチーム **(Enterprise agile team)]** を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

新しいチームタイプフォームの [コントロール] セクション

フィールド	説明
ユーザーロール	このテーブルに対する EAP ユーザーへのアクセスを許可するために、このフィールドを **[sn_apw_advanced.eap_user]** に設定します。

新しいチームタイプフォームの [アプリケーションのアクセス] セクション

アプリケーションのアクセス
[読み取り可能]、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] フィールドを有効にします。

関連情報

EAP でのカスタムチームタイプの作成

[作業アイテムタイプ] フォーム

エンタープライズアジャイル計画 に新しい作業アイテムタイプを追加するのに必要な新規テーブルフォームのフィールドについて説明します。

新しいテーブルフォーム

フィールド	説明
ラベル	テーブルの一意のラベル。
名前	このフィールドは、[ラベル] フィールドの入力から自動生成されます。
アプリケーション	このフィールドは、スコープに基づいて、自動的に [ポートフォリオ計画コア **(Portfolio Planning Core)]** に設定されます。 このフィールドに別の値が表示されている場合は、ServiceNow インスタンスのスコープを [ポートフォリオ計画コア **(Portfolio Planning Core)]** に設定します。
拡張テーブル	**[EAP** 計画立案アイテム **(EAP planning item)]** を選択します。

作業アイテムタイプフォームの [コントロール] セクション

フィールド	説明
ユーザーロール	このテーブルに対する EAP ユーザーへのアクセスを許可するために、このフィールドを **[sn_apw_advanced.eap_user]** に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

作業アイテムタイプフォームの [アプリケーションのアクセス] セクション

アプリケーションのアクセス
[読み取り可能]、[作成可能]、[更新可能]、および [削除可能] フィールドを有効にします。

関連情報

EAP でのカスタム作業アイテムタイプの作成

EAP のアジャイル構成

[SAFe-EAP 移行要求] フォーム

[SAFe-EAP 移行要求] フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) データを エンタープライズアジャイル計画 に移行する要求を送信します。

[SAFe-EAP 移行要求] フォーム

フィールド	説明
要求名	移行要求の一意の名前。
EAP 構成	SAFe 構成と一致する EAP の構成。 たとえば、ServiceNow インスタンスで Portfolio SAFe を使用している場合は、[ポートフォリオ構成] を選択します。
SAFe テーブル	EAP に移行する SAFe テーブルのデータ。 • [ポートフォリオ] を選択した場合は、SAFe ポートフォリオテーブル、その直接の子 ART、SAFe チーム、およびそれらに関連付けられた反復と作業アイテムのデータが移行されます。 • **[ART]** を選択した場合は、ART テーブル、それらの親ポートフォリオ、子 SAFe チーム、およびそれらに関連付けられた反復と作業アイテムのデータが移行されます。
レコードのフィルタリング	フィルター条件に一致する SAFe ポートフォリオ/ART が選択対象として表示されます。
移行可能なレコード (Records available for migration)	前のフィールドで適用したフィルター条件に一致するレコードが [利用可能] リストに表示され、そこから選択できます。 [選択済み] リストに移動されたレコードのみが移行の対象と見なされます。
次の日付以降に開始される PI (PIs starting on or after)	開始予定日が選択した日付以降であるプログラムインクリメントが移行されます。
次の日付より後の作業アイテム更新 (Work items update after)	選択した日付より後に更新されたエピック、機能、およびストーリーが移行されます。
ステータス	移行要求のステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

EAP への SAFe データの移行開始

SAFe から EAP への移行

エンタープライズアジャイル計画 のインジケーター

EAP ダッシュボードに含まれるインジケーター。

インジケーター	説明	追加されたバージョン
EAP：現在の反復の完了済みストーリーのストーリーポイントの合計	現在の反復の完了済みストーリーのストーリーポイントの合計は、単位で毎日測定されます。	Washington DC
EAP：現在の反復のすべてのストーリーのストーリーポイントの合計	現在の反復のすべてのストーリーのストーリーポイントの合計は、単位で毎日測定されます。	Washington DC
EAP：現在の反復のアクティブなストーリーのストーリーポイントの合計	現在の反復のアクティブなストーリーのストーリーポイントの合計は、単位で毎日測定されます。	Washington DC

これらのインジケーターを使用して EAP ダッシュボードに表示できるメトリクスの詳細については、「EAP レポートとダッシュボード」を参照してください。

EAPバックログの作業アイテム並べ替えエラー

エンタープライズアジャイル計画ワークスペースのバックログで作業アイテムの並べ替えが失敗する可能性があるシナリオを確認します。

EAPバックログの異なるセクションで作業アイテムを並べ替えているときに、ランク付け構成のエラーが原因で並べ替えが失敗することがあります。作業アイテムの並べ替えが失敗する可能性があるシナリオは次のとおりです。

シナリオ 1：Global ranking プラグインがアクティブでない

ServiceNow インスタンスで Global Ranking Application プラグイン (com.snc.sdlc.ranking) がアクティブかどうかを確認します。アクティブでない場合は、アドミニストレーターに連絡してアクティブにしてください。

シナリオ 2: 作業アイテムにランク構成がない

並べ替えるすべての作業アイテムにランク構成があるかどうかを確認します。そうでない場合は、アドミンに連絡して、これらの作業アイテムタイプのランク構成を更新してください。

シナリオ 3：ターゲット行にグローバルランクがない




並べ替えるターゲット位置の前または後の作業アイテムにグローバルランクがあるかどうかを確認します。ない場合は、システムアドミニストレーターに連絡してグローバルランクを生成してください。

のダッシュボード 戦略的計画ワークスペース

戦略的計画ワークスペースのダッシュボードは、製品マネージャーとポートフォリオマネージャーがパフォーマンスを監視し、進捗状況を追跡し、アイデア、フィードバック、戦略、計画、実行に関連する情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

探索	使用方法	統合
		
でダッシュボードを使用する主なメリットを学ぶ 戦略的計画	ダッシュボードを使用して、パフォーマンスを監視し、進捗状況を追跡し、情報に基づいた意思決定を行う方法について説明します	既存の プラットフォームアナリティクス ダッシュボードを次に追加 戦略的計画ワークスペース

トラブルシューティングとサポート

- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

でのダッシュボードの探索 戦略的計画ワークスペース

製品およびポートフォリオマネージャーは、 戦略的計画 ワークスペースのダッシュボードを使用して、パフォーマンスを監視し、進捗状況を追跡し、アイデア、フィードバック、戦略、計画、実行に関連する情報に基づいた意思決定を行うことができます。これらのダッシュボードでは、 プラットフォームアナリティクス を活用して履歴データの傾向と定期的なレポートを提供します。

戦略的計画ワークスペース で利用可能な 4 つの標準ダッシュボードを次に示します。

- 製品アイデアダッシュボード
- フィードバックダッシュボード
- 戦略実行ダッシュボード
- 実行ダッシュボード

デフォルトのダッシュボードを使用するか、独自のダッシュボードを作成してパフォーマンスを監視し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

ダッシュボードのメリット

- データの可視化を作成し、 プラットフォームアナリティクス エクスペリエンスを使用してダッシュボードに追加します。
- パフォーマンスを監視し、進捗状況を追跡し、アイデア、フィードバック、戦略、計画、および実行に関連する情報に基づいた意思決定を行います。
- 既存のダッシュボードを複製し、すぐに利用可能なダッシュボードを変更することなく、必要に応じてカスタマイズします。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- すぐに利用可能なダッシュボードを使用するか、必要に応じて独自のダッシュボードを構成します。
- ステークホルダーとダッシュボードを共有してコラボレーションを可能にします。
- ダッシュボード内で直接フィルターを適用して、関連データを表示します。
- 適用されたフィルターは、ユーザーのカスタマイズの一部として保存され、次回ログインするときに使用できます。

戦略的計画ワークスペースダッシュボードの使用と管理に関するガイダンスについては、「でのダッシュボードの使用 戦略的計画ワークスペース」を参照してください。

のフィードバックダッシュボード 戦略的計画ワークスペース

フィードバックダッシュボードは、プロダクトマネージャーがフィードバックの量とステークホルダーの傾向を追跡して、繰り返し発生する問題点を明らかにし、優先順位付けの決定を通知し、応答性を示すのに役立ちます。

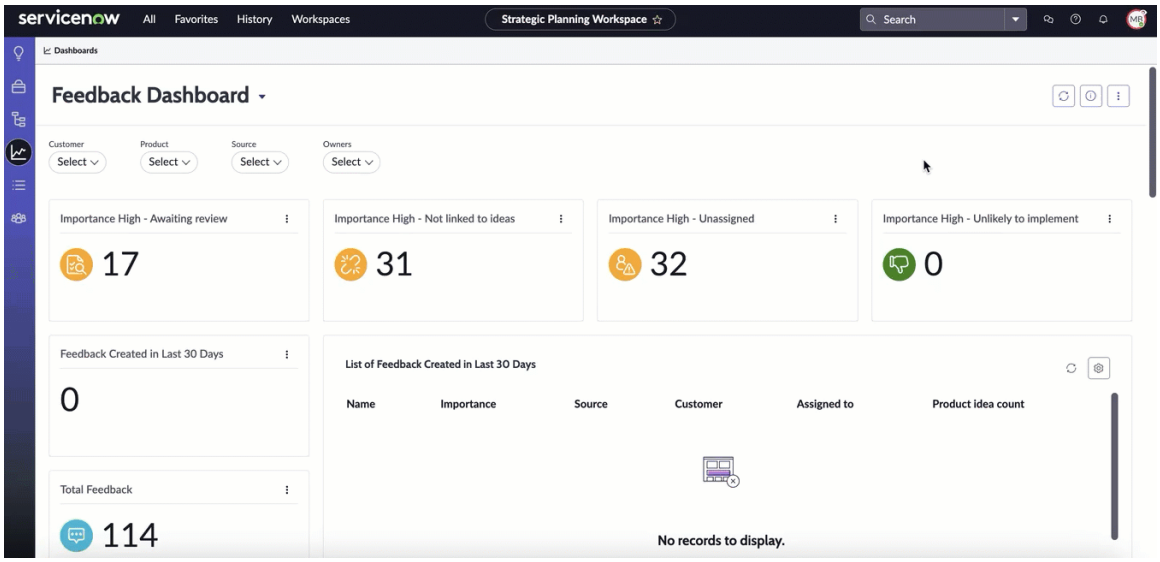

フィードバックダッシュボード

ウィジェット/可視化	説明
重要性:高:レビュー待ち	重要度が高く (1 - 高)、ステータスが [送信済み] または [詳細情報が必要] のフィードバックアイテムの数。
重要性高:アイデアにリンクされていません	アイデアにリンクされていない、重要度が高い (1 ～ 高) フィードバックアイテムの数。
重要性高 - 未アサイン	誰にもアサインされていない、重要度が高いフィードバックアイテム (1 ～ 高) の数。
重要性が高い - 実装する可能性は低い	重要度が高く (1 - 高)、ステータスが [実装する可能性は低い] のフィードバックアイテムの数。
過去 30 日間に作成されたフィードバック	過去 30 日以内に作成されたフィードバックアイテムの数。
過去 30 日間に作成されたフィードバックのリスト	過去 30 日以内に作成されたフィードバックアイテムのリスト (名前、重要性、ソース、顧客、担当者、製品アイデア数などの詳細を含む)。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィードバックダッシュボード (続く)

ウィジェット/可視化	説明
合計フィードバック	これまでに受信したフィードバックアイテムの合計数。
フィードバックの配布	重要度別にグループ化され、顧客別に積み重ねられたフィードバックアイテムの可視化。
全体的なフィードバック分布	重要度別にグループ化されたフィードバックアイテムの可視化。
過去 30 日間のアイデアにリンクされたフィードバック	過去 30 日以内にアイデアにリンクされ、重要度別にグループ化されたフィードバックアイテムの可視化。
場所別のフィードバック数	場所別のフィードバックアイテムの数。

の製品アイデアダッシュボード 戦略的計画ワークスペース

製品アイデアダッシュボードは、製品マネージャーが送信されたアイデアの健全性、フロー、成熟度を理解するのに役立ち、イノベーションの進展を支援し、バックログのボトルネックを防ぐのに役立ちます。

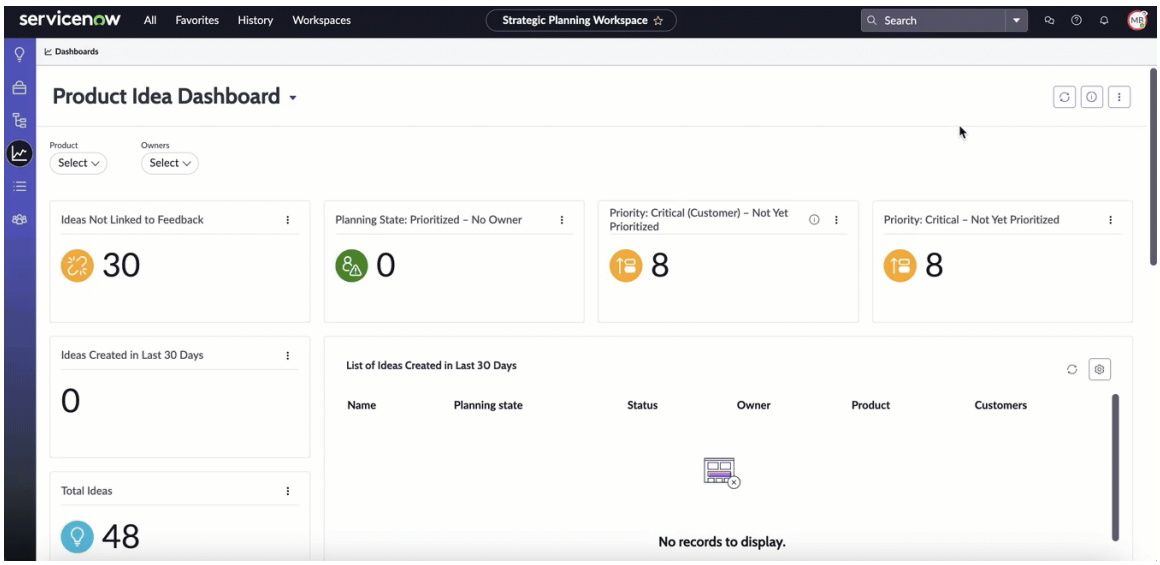

製品アイデアダッシュボード

ウィジェット/可視化	説明
フィードバックにリンクされていないアイデア	フィードバックにリンクされていないアイデアの数。
[計画] ステータス:優先順位付け - 所有者なし	計画ステータスが [優先順位付け] であるが、所有者がアサインされていないアイデアの数。
優先度:重大 (顧客) - まだ優先順位付けされていない	アイデアの数:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品アイデアダッシュボード (続く)

ウィジェット/可視化	説明
	• [計画] ステータスが [優先順位付け] または [完了] ではない • 優先度が 1 - 重大で、かつ • [顧客] フィールドに値が入力されています
優先度:重大 - 未優先	アイデアの数: • [計画] ステータスが [優先順位付け] または [完了] ではなく、かつ • 優先度が 1 - 重大
過去 30 日間に作成されたアイデア	過去 30 日以内に作成されたアイデアの数。
過去 30 日間に作成されたアイデアのリスト	過去 30 日以内に作成されたアイデアのリスト (名前、計画ステータス、ステータス、オーナー、製品、顧客などの詳細を含む)。
合計アイデア数	これまでに受信したアイデアの合計数。
すべてのアイデアの内訳	計画ステータス別にグループ化されたすべてのアイデアの可視化。
ブレークダウン:フィードバックにリンクされていないアイデア	過去 30 日以内にフィードバックにリンクされなかったアイデアを、計画ステータス別にグループ化して可視化。
アイデアアナライザー	影響度別にグループ化され、優先度別に積み重ねられたアイデアの可視化。

自動翻訳


の実行ダッシュボード 戦略的計画ワークスペース

実行ダッシュボードは、ポートフォリオマネージャーとプロダクトマネージャーが作業アイテム全体の配送の進捗状況をリアルタイムで可視化するのに役立ち、ポートフォリオリードが遅延を検出し、コースを早期に修正し、戦略を順調に進めることを可能にします。

実行ダッシュボードは、[概要]、[財務]、[金銭と依存関係]、[キャパシティ]、[RIDAC]、[データ品質]、[地理] などのさまざまなタブでさまざまなアナリティクスを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

実行ダッシュボードの [概要] タブ

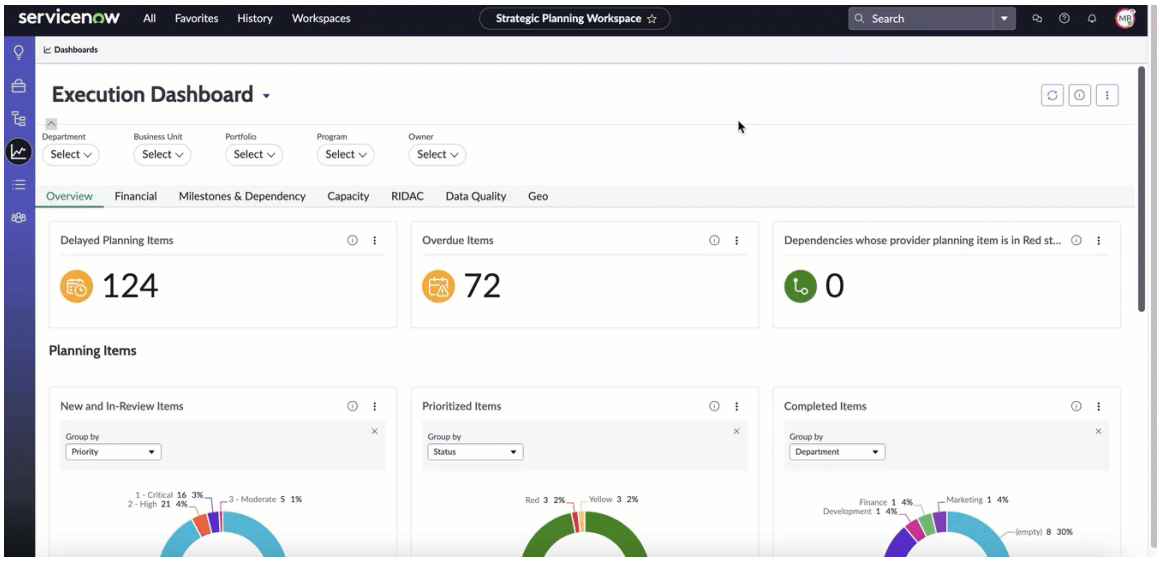


ウィジェット/可視化	説明
遅延計画立案アイテム	承認された開始日が過去の日付であるにもかかわらず、優先順位が付けられているがまだ開始されていない (実際の開始日が記録されていない) 計画立案アイテム。
期限切れのアイテム	承認された終了日が過去の日付であるにもかかわらず、未完了のままである (実際の終了日が記録されていない) 優先順位付けされた計画立案アイテム。
プロバイダー計画立案アイテムが赤のステータスである依存関係	すべての依存計画立案アイテムに影響を与える、プロバイダー計画立案アイテムのステータスが赤の依存関係。
プランニングアイテム	
新規およびレビュー中のアイテム	優先度別にグループ化された新規およびレビュー中の計画立案アイテムの可視化。他の利用可能なオプションを使用してアイテムをグループ化することもできます。
優先順位付けされたアイテム	ステータス別にグループ化された優先順位付けされた計画立案アイテムの可視化。他の利用可能なオプションを使用してアイテムをグループ化することもできます。
完了済みアイテム	ステータスが [完了] である計画立案アイテムの可視化。他の利用可能なオプションを使用してアイテムをグループ化することもできます。
実行アイテム	
プロジェクト	ステータス別にグループ化されたプロジェクト数の可視化。他の利用可能なオプションを使用してアイテムをグループ化することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウィジェット/可視化	説明
デマンド	ステータス別にグループ化されたデマンド数の可視化。他の利用可能なオプションを使用してアイテムをグループ化することもできます。

実行ダッシュボードの [財務] タブ

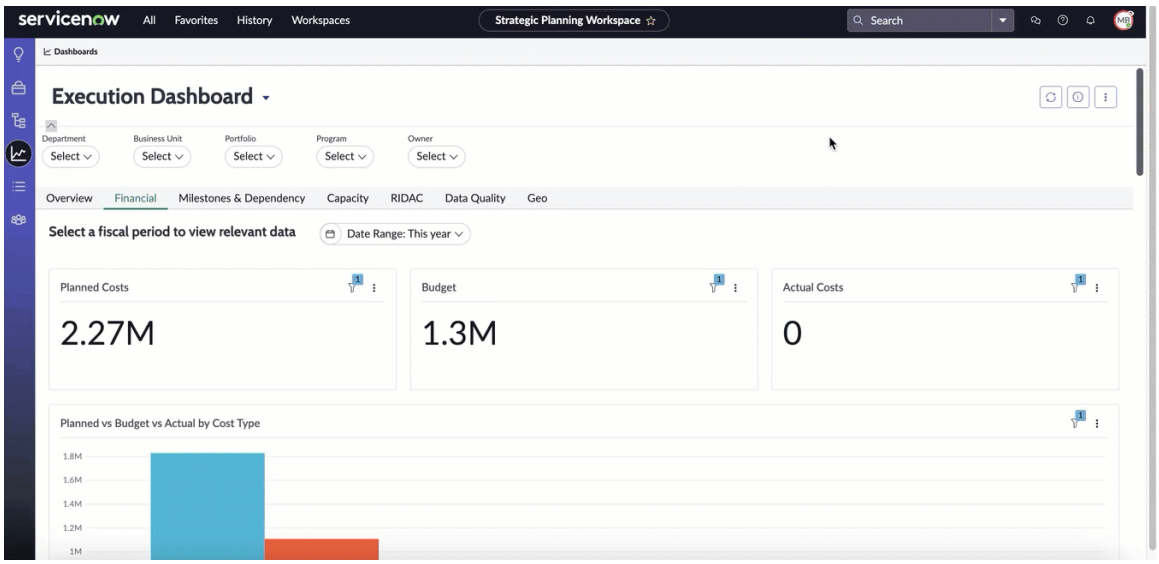


ウィジェット/可視化	説明
関連データを表示する会計期間を選択	日付範囲を 今年 または 昨年 として選択し、それに応じてデータをフィルタリングして表示するオプション。日付範囲をクリアすると、ポートフォリオ計画の開始日から考慮したデータが表示されます。
計画コスト	計画を実行するためのコスト概算。
予算	計画を実行するための推定予算。
実績コスト	計画の実行中に発生した実績コスト。
コストタイプ別の計画と予算と実績	原価費目別の計画、予算、実績の可視化。
計画、予算、実績	計画、予算、実績別のコストの可視化。
投資タイプ別の予算	投資タイプ別の予算の可視化。
福利厚生	
計画利益	計画された金銭的利益。
実績金銭的利益。	達成された金銭的利益。
保留中の金銭的利益。	処理待ちステータスの金銭的利益。
カテゴリ別の福利厚生	収益、コスト削減、顧客満足度スコアなどのカテゴリ別の利益。
金銭的利益	計画利益と実績利益に関する金銭的利益の可視化。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

実行ダッシュボードの [マイルストーンと依存関係] タブ

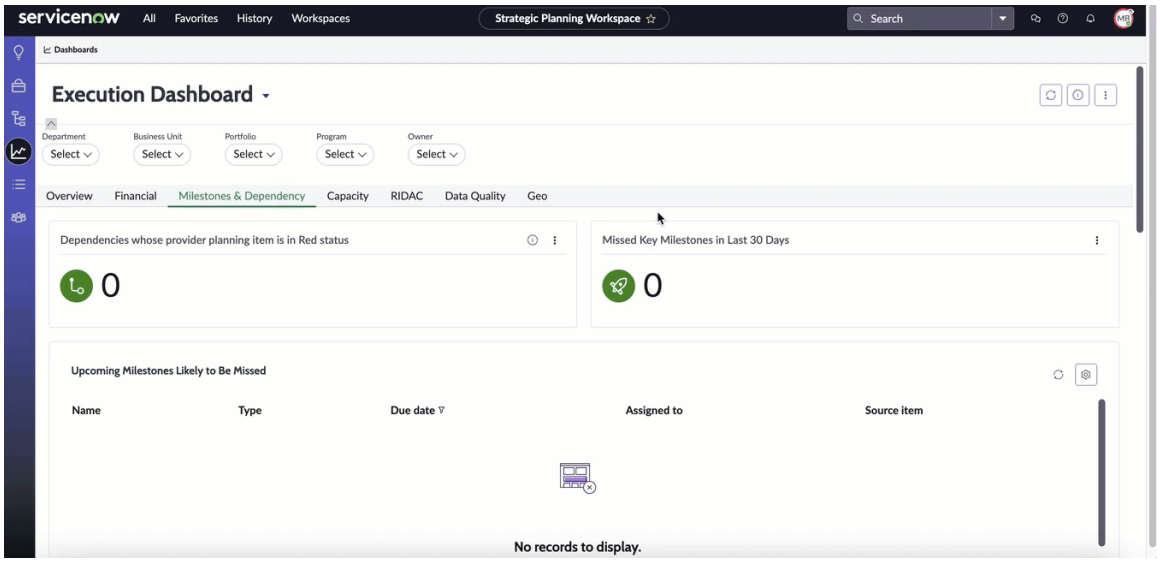


ウィジェット/可視化	説明
プロバイダー計画立案アイテムが赤のステータスである依存関係	すべての依存計画立案アイテムに影響を与える、プロバイダー計画立案アイテムが赤のステータスになっている依存関係の数。
過去 30 日間に実行されなかった主要マイルストーン	過去 30 日以内に主要マイルストーンを達成できなかった計画立案アイテムの数。
達成されない可能性が高い今後のマイルストーン	重要なマイルストーンが間もなく達成されない計画立案アイテムのリスト。名前、タイプ、期日、アサイン先、ソースアイテムなどの詳細が含まれます。
過去 30 日間に実行されなかったマイルストーン	過去 30 日以内に主要マイルストーンを達成できなかった計画立案アイテムのリスト。詳細、名前、タイプ、期日、アサイン先、ソースアイテムなどの詳細が含まれます。
過去 30 日間に達成したマイルストーン	過去 30 日以内に主要マイルストーンが達成された計画立案アイテムのリスト。詳細、名前、タイプ、期日、アサイン先、ソースアイテムなどの詳細。
マイルストーンアナライザー	ステータス別にグループ化され、タイプ別に積み重ねられた主要なマイルストーンの可視化。他の利用可能なオプションを使用して、アイテムをグループ化して積み重ねることもできます。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

実行ダッシュボードの [キャパシティ] タブ

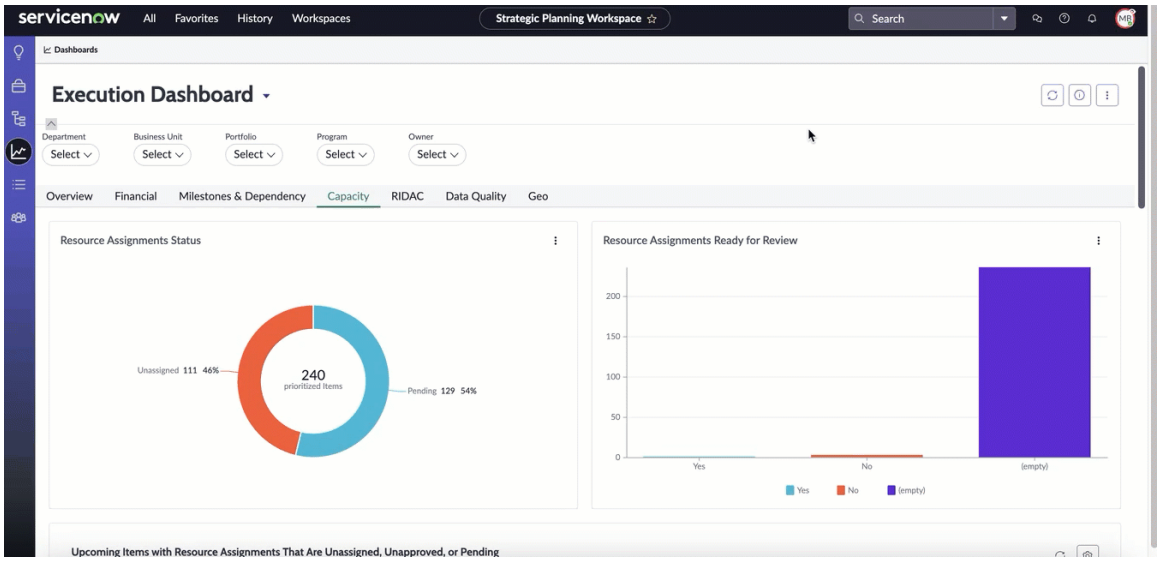

ウィジェット/可視化	説明
リソースのアサインステータス	リソースのアサインステータスの可視化。
リソースのアサインのレビュー準備完了	レビュー準備完了のリソースのアサイン数の可視化。
未アサイン、未承認、または処理待ちのリソースのアサインがある予定のアイテム	リソースのアサインステータスが [未アサイン]、[未承認]、または [処理待ち] である今後の計画立案アイテムのリスト。
グループ、ロール、スキル別のリソースのアサイン	グループ、ロール、およびスキル別のリソースのアサイン数の可視化。


実行ダッシュボードの **[RIDAC]** タブ

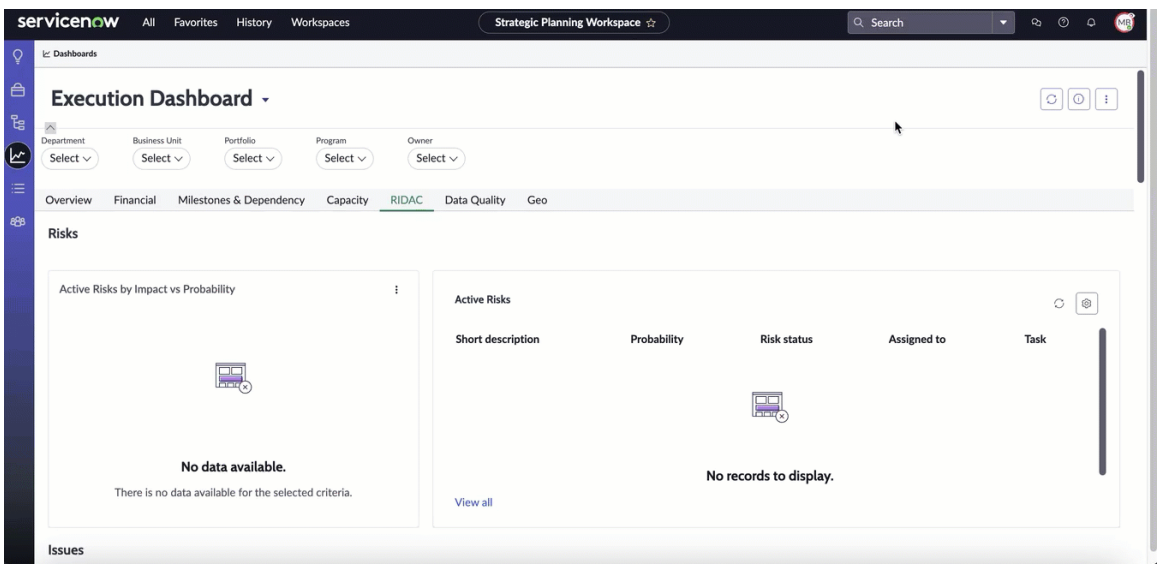

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

実行ダッシュボードの [データ品質] タブ

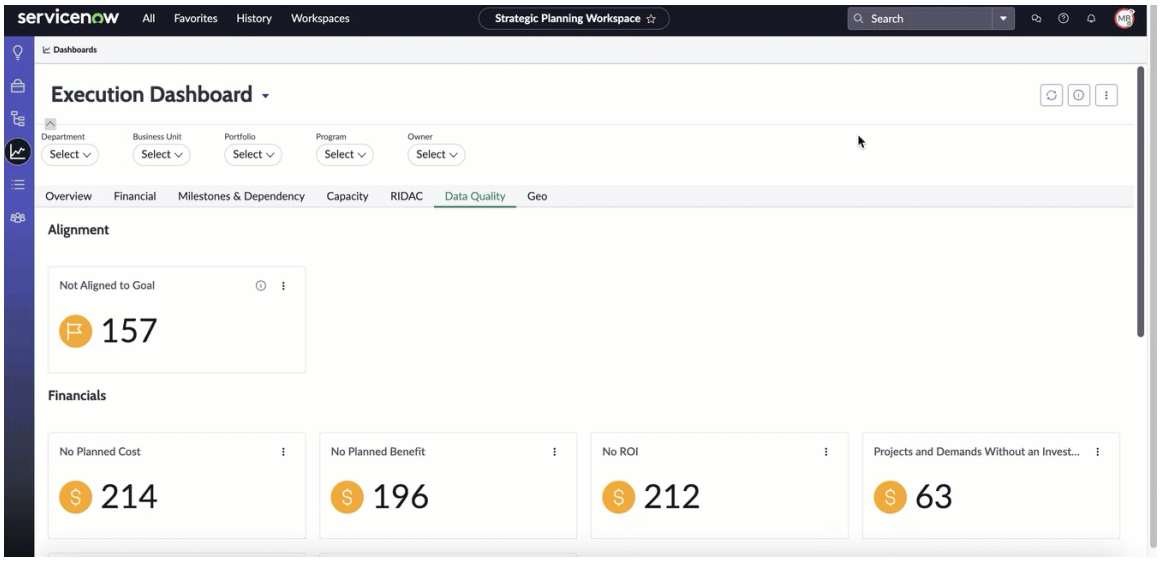

ウィジェット/可視化	説明
位置調整	
目標に対して未調整	目標に関連付けられていない作業アイテムの数。
財務	
計画コストなし	コストの見積もりがまだ実行のために行われていない作業アイテムの数。
計画利益なし	利益の推定がまだ完了していない作業アイテムの数。
ROI なし	ROI がまだ推定されていない作業アイテムの数。
投資タイプのないプロジェクトとデマンド	投資タイプがまだ定義されていないプロジェクトとデマンドの数。
予定利益のない金銭的利益計画	利益がまだ定義されていない金銭的利益計画の数。
スポンサーなしの利益計画	スポンサーがまだアサインされていない金銭的利益計画の数。
他の属性を持つ計画立案アイテム	
リソースのアサインがありません	リソースがアサインされていない計画立案アイテムの数。
予定外のアイテム	まだスケジュールされていない計画立案アイテムの数。
ポートフォリオなし	ポートフォリオが定義されていない計画立案アイテムの数。
プログラムなし	プログラムが定義されていない計画立案アイテムの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウィジェット/可視化	説明
部門がありません	部門が設定されていない計画立案アイテムの数。
事業部門なし	事業部門が設定されていない計画立案アイテムの数。
オーナーなし	所有者がアサインされていない計画立案アイテムの数。

実行ダッシュボードの [地理] タブ


ウィジェット/可視化	説明
場所別の計画コスト	計画を実行するための場所別のコスト概算。

の戦略実行ダッシュボード 戦略的計画ワークスペース

戦略実行ダッシュボードは、ポートフォリオマネージャーが戦略とビジネス成果の整合性を監視し、目標の進捗状況を迅速に評価して、インパクトの大きい展開を確実に行うのに役立ちます。

戦略実行ダッシュボードは、タブと実行ハブを通じてさまざまな分析を提供します。

戦略実行ダッシュボードの [戦略の概要] タブ

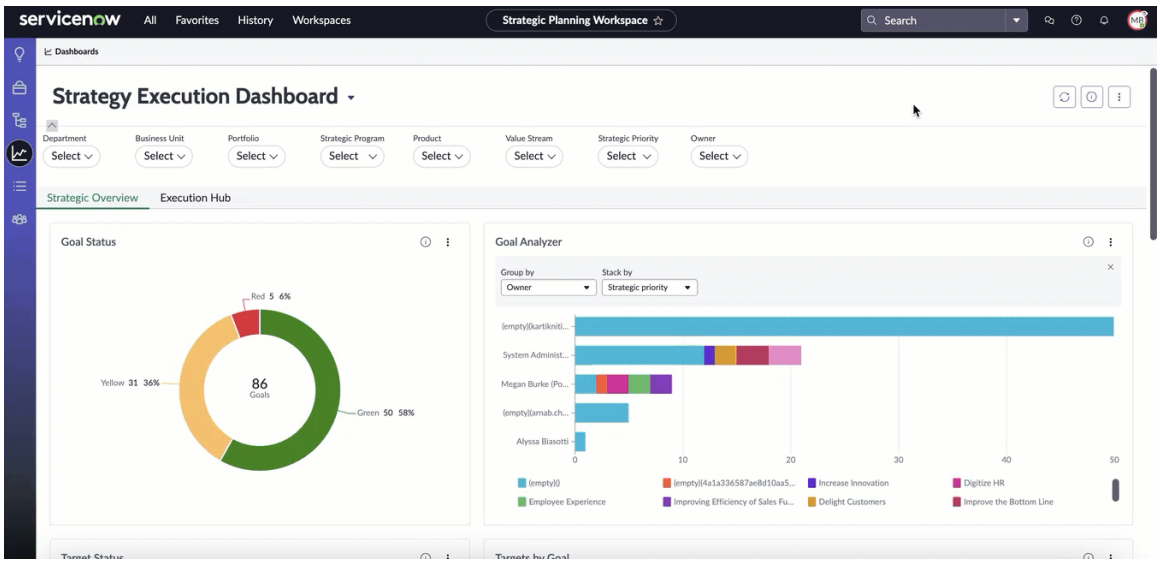

戦略実行ダッシュボードの [戦略の概要] タブ

ウィジェット/可視化	説明
ゴールステータス	処理中または承認済み、あるいはステータスが緑、黄、赤の目標。
ゴールアナライザー	オーナー別にグループ化され、戦略的優先度別に積み重ねられたゴールの可視化。
ターゲットステータス	ステータスが [赤]、[緑]、[黄]、および [なし] のターゲット数の可視化。
目標別のターゲット	目標とともにターゲットを可視化します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略実行ダッシュボードの [戦略の概要] タブ (続く)

ウィジェット/可視化	説明
目標とターゲット	名前、ステータス、進捗状況などの詳細を含む、目標とターゲットのリスト。

戦略実行ダッシュボードの [実行] タブ

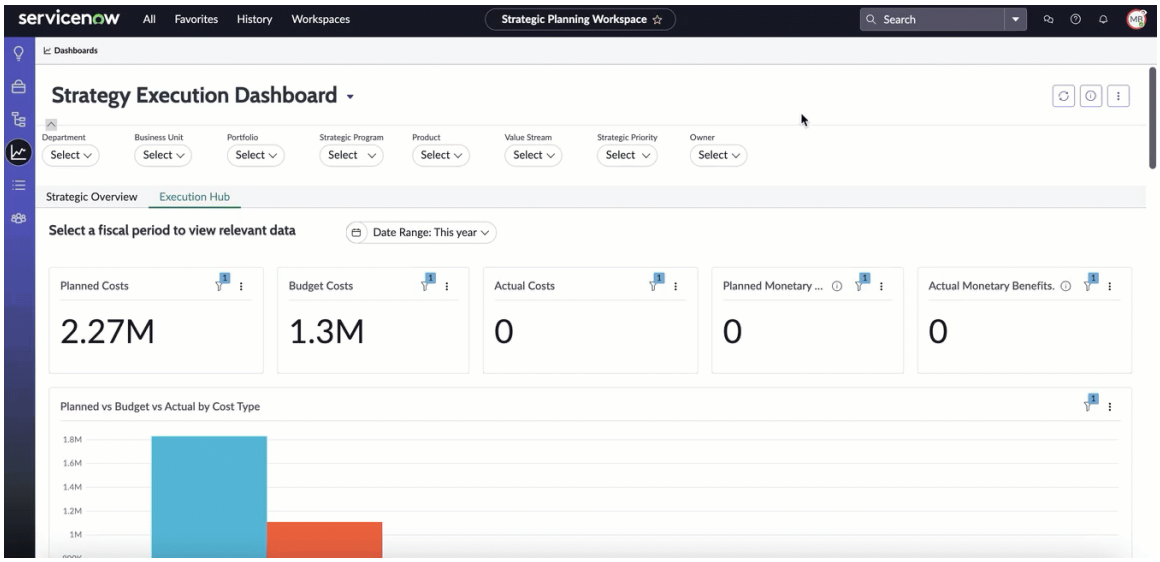

ウィジェット/可視化	説明
関連データを表示する会計期間を選択	日付範囲を 今年 または 昨年 として選択し、それに応じてデータをフィルタリングして表示するオプション。日付範囲をクリアすると、ポートフォリオ計画の開始日から考慮したデータが表示されます。
計画コスト	計画を実行するためのコスト概算。
合計予算	計画を実行するための推定予算。
実績コスト	計画の実行中に発生した実績コスト。
計画利益	計画された金銭的利益。
実際の金銭的利益	達成された金銭的利益。
コストタイプ別の計画と予算と実績	原価費目別の計画、予算、実績の可視化。
投資タイプ別の予算	投資タイプ別の予算の可視化。
補足データ	
新規およびレビュー中のアイテム	優先度別にグループ化された新規およびレビュー中の計画立案アイテムの可視化。
優先順位付けされたアイテム	ステータス別にグループ化された優先順位付けされた計画立案アイテムの可視化。
完了済みアイテム	ステータスが [完了] である計画立案アイテムの可視化。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウィジェット/可視化	説明
遅延計画立案アイテム	承認された開始日が過去の日付であるにもかかわらず、優先順位が付けられているがまだ開始されていない (実際の開始日が記録されていない) 計画立案アイテム。
期限切れのアイテム	承認された終了日が過去の日付であるにもかかわらず、未完了のままである (実際の終了日が記録されていない) 優先順位付けされた計画立案アイテム。
プロバイダー計画立案アイテムが赤のステータスである依存関係	すべての依存計画立案アイテムに影響を与える、プロバイダー計画立案アイテムのステータスが赤の依存関係。
過去 30 日間に実行されなかった主要マイルストーン	過去 30 日以内に主要マイルストーンを達成できなかった計画立案アイテムの数。
達成されない可能性が高い今後のマイルストーン	重要なマイルストーンが間もなく達成されない計画立案アイテムのリスト。名前、タイプ、期日、アサイン先、ソースアイテムなどの詳細が含まれます。
リソースのアサインステータス	リソースのアサインステータスの可視化。
リソースのアサインのレビュー準備完了	レビュー準備完了のリソースのアサイン数の可視化。
未アサイン、未承認、または処理待ちのリソースのアサインがある予定のアイテム	リソースのアサインステータスが [未アサイン]、[未承認]、または [処理待ち] である今後の計画立案アイテムのリスト。

でのダッシュボードの使用 戦略的計画ワークスペース

戦略的計画ワークスペース のプラットフォームアナリティクスダッシュボードを使用すると、パフォーマンスを監視し、進捗状況を追跡し、アイデア、フィードバック、戦略、計画、実行に関連する情報に基づいた意思決定を行うことができます。

ダッシュボードの管理に必要なロール

すぐに利用可能なダッシュボードにアクセスするために必要なロール

アクセスレベル	必要なロール
戦略実行ダッシュボードと実行ダッシュボードの読み取り、複製、共有	sn_align_core.ap_read_only **注:** 財務関連ウィジェットおよびキャパシティ計画立案ウィジェットでデータを表示するには、ユーザーに適切なロールが必要です。
Product Idea Dashboard および Product Feedback Dashboard の読み取り、複製、共有	pf_read
戦略実行ダッシュボードと実行ダッシュボードの編集	アドミン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

すぐに利用可能なダッシュボードにアクセスするために必要なロール (続く)

アクセスレベル	必要なロール
製品アイデアダッシュボードと製品フィードバックダッシュボードの編集	アドミン

ダッシュボードの作成または編集に必要なロール (すぐに利用可能なダッシュボードを除く)

アクセスレベル	必要なロール
ダッシュボードを作成	sn_align_core.apw_user
ダッシュボードを編集	sn_align_core.apw_user **注:** 自分が所有するダッシュボードまたは編集権限を付与されたダッシュボードを編集できます。

注:
ダッシュボードでウィジェットを作成するには、 ServiceNow AI Platformで使用可能なデータソーステーブルを構成します。ただし、主要なデータ、メトリクス、または可視化を表示するには、ソーステーブルへの読み取りアクセス権が必要です。

たとえば、予算データを表示するようにコスト計画ブレークダウンテーブルを設定するダッシュボードでウィジェットを作成する場合、コスト計画ブレークダウンテーブルへの読み取りアクセス権がある場合にのみ、予算サマリーがダッシュボードに表示されます。同様に、このダッシュボードをステークホルダーと共有する場合、予算サマリーを表示するには、ステークホルダーがコスト計画ブレークダウンテーブルへの読み取りアクセス権も持っている必要があります。

プラットフォームアナリティクスダッシュボードを管理するために必要なロールの詳細については、「Platform Analytics dashboard roles」を参照してください。

自動翻訳

ダッシュボードの表示

ダッシュボードに主要なデータとメトリクスを表示してパフォーマンスを監視し、進捗状況を追跡し、アイデア、フィードバック、戦略、計画、実行に関連する情報に基づいた意思決定を行います。


始める前に
必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて
ダッシュボードは、複数のソースからのデータを 1 つのわかりやすい形式に統合します。ダッシュボード内の各ウィジェットには、主要なデータと測定基準が表示され、可視化が含まれる場合があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ダッシュボード.
   デフォルトでは、実行ダッシュボードは [ダッシュボード] ページに表示されます。
2. [ダッシュボードの変更] ドロップダウンから、表示するダッシュボードを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

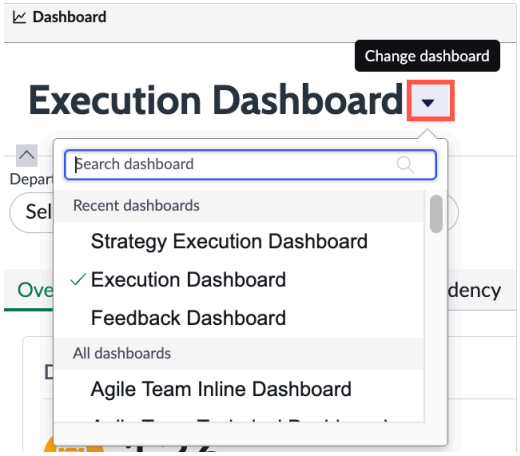

選択したダッシュボードが表示されます。

3. オプション: 主要なデータとメトリクスを表示する必要なタブを選択します。
ダッシュボード内の各ウィジェットには、主要なデータと測定基準が表示され、可視化が含まれる場合があります。
4. オプション: ウィジェットを選択すると、リストビューでデータの詳細が表示されます。
編集アクセス権がある場合は、必要に応じてリストビューから個々のレコードの詳細を直接更新できます。

関連情報

ダッシュボードを作成

ダッシュボードの複製

ダッシュボードを共有

プラットフォームアナリティクスダッシュボードの追加

ダッシュボードを作成

プラットフォームアナリティクスエクスペリエンスでは、データの可視化、フィルター、その他の要素を含む共有可能なダッシュボードを作成できます。インラインエディターで利用可能な要素を使用して、必要に応じてさまざまなタイプのウィジェットを作成できます。

始める前に

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

ダッシュボードは、複数のソースからのデータを 1 つのわかりやすい形式に統合します。ダッシュボード内の各ウィジェットには、主要なデータと測定基準が表示され、可視化が含まれる場合があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ダッシュボード.
デフォルトでは、実行ダッシュボードは [ダッシュボード] ページに表示されます。
2. ダッシュボードヘッダーから、[その他のアクション] アイコン ( ) を選択し、[新規作成] を選択します。
3. [新規ダッシュボード] ウィンドウで、詳細を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [名前] フィールドにダッシュボードの名前を入力します。

b. オプション: [説明] フィールドにダッシュボードの簡単な説明を入力します。

c. **[Create new dashboard** (新規ダッシュボードを作成)] を選択します。

タスクの結果
ダッシュボードが作成されました。

次のタスク
セクション、フィルター、画像、リスト、プロセスマイニングマップ、リッチテキストを追加して、必要に応じてダッシュボードを編集します。詳細については、「ダッシュボードを編集」を参照してください。

関連情報
- ダッシュボードの表示
- ダッシュボードの複製
- ダッシュボードを共有
- プラットフォームアナリティクスダッシュボードの追加

ダッシュボードを編集

セクション、フィルター、画像、リスト、プロセスマイニングマップ、およびリッチテキストを追加して、必要に応じてダッシュボードをカスタマイズまたは編集します。ダッシュボードが共有されている場合、行った変更はすべてグローバルに適用されます。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

注:

- 自分が所有するダッシュボードまたは編集権限を付与されたダッシュボードを編集できます。
- 製品アイデアダッシュボード、フィードバックダッシュボード、戦略実行ダッシュボード、実行ダッシュボードなどのすぐに利用可能なダッシュボードを編集できるのは、アドミンのみです。ただし、 すぐに利用可能なダッシュボードを複製 し、必要に応じてカスタマイズすることができます。

次の要素を使用して、ダッシュボードを作成または編集できます。

Strategic Planning のダッシュボード要素

要素	説明
データの可視化	現在のインスタンスデータまたはインポートした一時データを視覚的に表現できます。データの可視化には、ダッシュボードデザイナーで作成した可視化と、ライブラリからのデータの可視化が含まれます。
フィルター	指定した基準に基づいて、ダッシュボード上の可視化をフィルタリングできます。個々のタブまたはタブの上にフィルターを配置して、すべてのタブの要素にフィルターを適用することができます。フィルターには、データフィルター

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Strategic Planning のダッシュボード要素 (続く)

要素	説明
	とドメインフィルターの両方が含まれます。ダッシュボードデザイナーでフィルターを作成することも、ライブラリからフィルターを選択することもできます。
見出し	ダッシュボードの上部またはダッシュボードのセクションにテキストを配置する場所を提供します。見出しの書式設定は 6 つの見出しレベルに制限されています。
イメージ	ダッシュボードに静止画像またはアニメーション画像を保持します。
リスト：簡易	ダッシュボードの対象者向けにカスタマイズできるテーブルデータを表示します。
プロセスマイニング：マップ	プロセスの一部であるさまざまな状況とそれらの状況間の移行をマッピングします。プロセスのオブジェクトがどのステータスにあるか、およびそれらがステータスを変更する速度を確認します。既存のプロセスマイニングプロジェクトが必要です。
リッチテキスト	フォント選択、テキストサイズ、ハイライト表示、ハイパーリンクなど、テキストまたは HTML として書式設定できるテキストを保持します。HTML マークアップを編集するには、[構成] パネルから HTML エディターを開き、[コードタグ] < >アイコンを選択します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

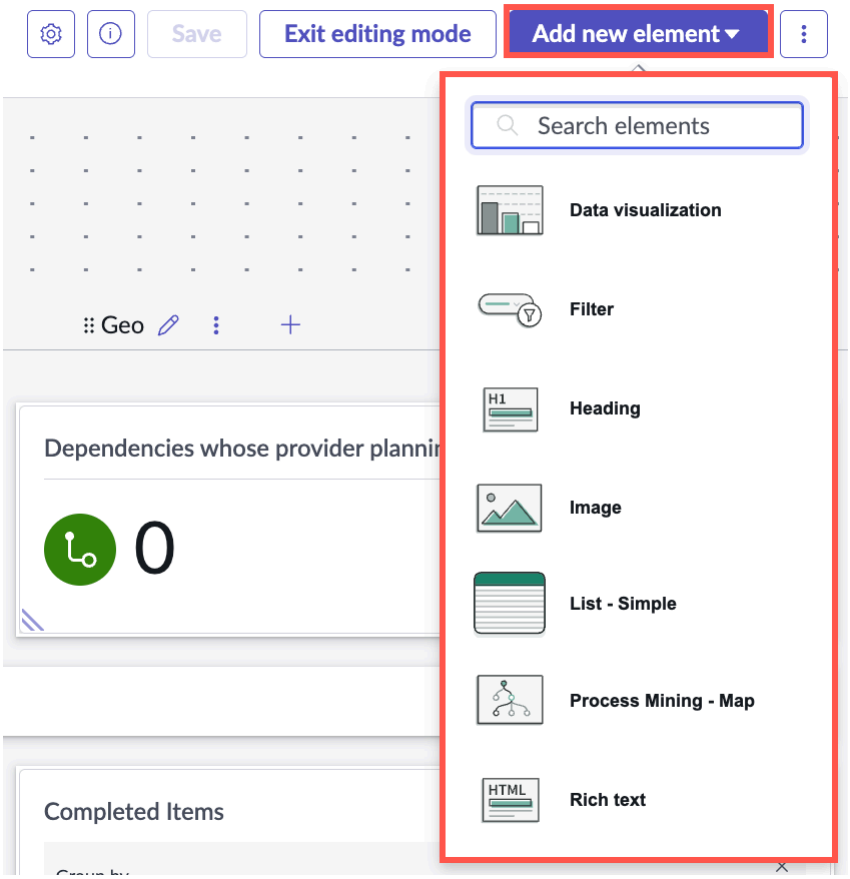

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ダッシュボード.
   デフォルトでは、実行ダッシュボードは [ダッシュボード] ページに表示されます。
2. [ダッシュボードの変更] ドロップダウンから、編集するダッシュボードを選択します。

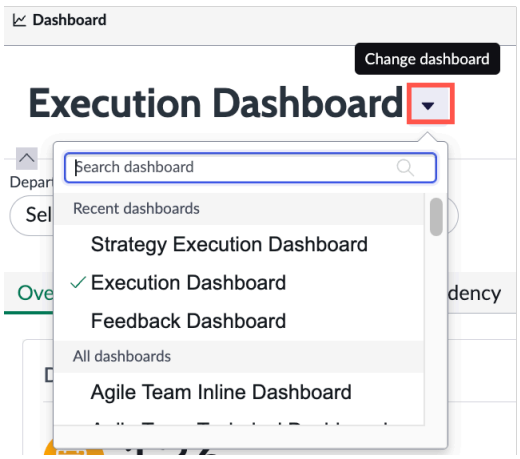

   選択したダッシュボードが表示されます。
3. ダッシュボードヘッダーから [編集] を選択します。
4. 必要に応じて、ウィジェットをドラッグして移動またはサイズ変更します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. ダッシュボードヘッダーから [保存] を選択します。
6. ダッシュボードヘッダーから、[編集モードを終了] を選択します。

タスクの結果
ダッシュボードが最新の変更で更新されます。

次のタスク

- 必要に応じて要素を追加し、ダッシュボードをカスタマイズします。
- 戦略的計画 でプラットフォームアナリティクスエクスペリエンスを使用してダッシュボードを編集する詳細な手順については、「Edit Platform Analytics dashboards」を参照してください。

関連情報

ダッシュボードの表示

ダッシュボードを作成

ダッシュボードの複製

ダッシュボードを共有

プラットフォームアナリティクスダッシュボードの追加

ダッシュボードの複製

作成するダッシュボードが既存のダッシュボードと類似している場合は、既存のダッシュボードを複製することで時間を節約できます。ダッシュボードを複製した後、必要に応じてタブとウィジェットをカスタマイズできます。

始める前に

- ダッシュボードを共有するユーザーまたはグループがポートフォリオ計画への読み取りまたは編集アクセス権を取得するには、それぞれ sn_align_core.ap_read_only または sn_align_core.apw_user ロールが必要です。
- ダッシュボードを複製すると、元のダッシュボードのすべての設定と詳細がコピーされます。元のダッシュボードにローカルに存在するコンテンツは、新しいダッシュボードに複製されます。元のダッシュボードに、共有のビジュアル化など、ライブラリ内のコンテンツへの参照が含まれている場合、それらの参照は複製されます。ライブラリ内の要素を編集するためのロール要件は、後者に適用されます。


必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ダッシュボード.
   デフォルトでは、実行ダッシュボードは [ダッシュボード] ページに表示されます。
2. [ダッシュボードの変更] ドロップダウンから、複製するダッシュボードを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

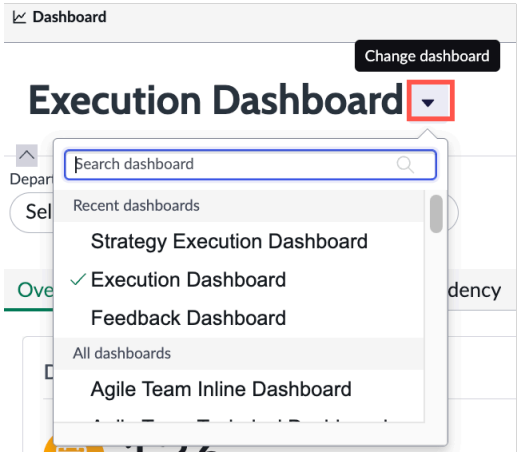

選択したダッシュボードが表示されます。

3. ダッシュボードヘッダーから、[その他のアクション] アイコン ( ) を選択し、[複製] を選択します。
4. [ダッシュボードを複製中 (Duplicating dashboard)] ウィンドウで、詳細を入力します。

   a. [新しい名前] フィールドにポートフォリオ計画の名前を入力します。
   デフォルトでは、名前は *ABC (Copy)* です。ここで、ABC は複製元のダッシュボードの名前です。

   b. オプション: [説明] フィールドにゴールの簡単な説明を入力します。

   c. [複製] を選択します。

   ダッシュボードの複製には時間がかかる場合があります。[バックグラウンドで続行] を選択して、その間もアプリケーションを使用し続けます。

タスクの結果
ダッシュボードが新しい名前でコピーされます。ダッシュボードの外観は元のダッシュボードと同じです。

次のタスク
セクション、フィルター、画像、リスト、プロセスマイニングマップ、リッチテキストを追加して、必要に応じてダッシュボードを編集します。詳細については、「ダッシュボードを編集」を参照してください。

関連情報
- ダッシュボードの表示
- ダッシュボードを作成
- ダッシュボードを共有
- プラットフォームアナリティクスダッシュボードの追加

ダッシュボードを共有

ステークホルダー、計画マネージャー、ポートフォリオマネージャー、または製品マネージャーとダッシュボードを共有して、作業の進捗状況を可視化し、コラボレーションを促進します。共有ダッシュボードの表示専用権限、または表示権限と編集権限の両方を付与できます。

始める前に
必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


このタスクについて
共有ダッシュボードにアクセスするには、ダッシュボードを共有するユーザーまたはグループに適切なロールが割り当てられている必要があります。

ダッシュボードにアクセスするために必要なロール

ダッシュボード	必要なロール
• 戦略実行ダッシュボード • 実行ダッシュボード	sn_align_core.ap_read_only 注: 財務関連ウィジェットおよびキャパシティ計画立案ウィジェットでデータを表示するには、ユーザーに適切なロールが必要です。
• 製品アイデアダッシュボード • 製品フィードバックダッシュボード	pf_read

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ダッシュボード.
   デフォルトでは、実行ダッシュボードは [ダッシュボード] ページに表示されます。
2. [ダッシュボードの変更] ドロップダウンから、共有するダッシュボードを選択します。

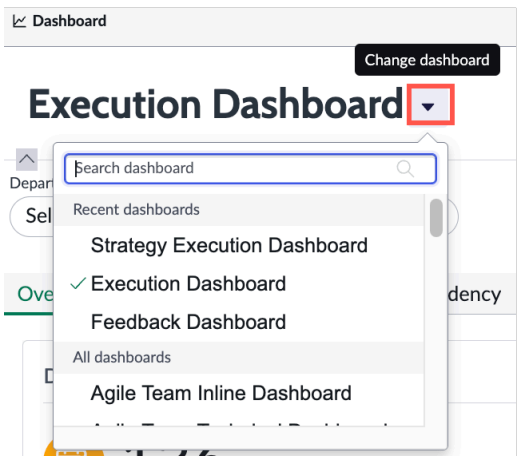

選択したダッシュボードが表示されます。

3. ダッシュボードヘッダーから、[その他のアクション] アイコン (を選択し、[共有] を選択します。
4. [共有ダッシュボード] ウィンドウで、詳細を入力します。

   a. 個々のユーザーまたはユーザーグループにそれぞれアクセスを提供する には、[アクセス権を付与する] フィールドにユーザー名またはグループ名を入力します。
   ロールを選択して、そのロールが割り当てられたすべてのユーザーにダッシュボードアクセス権を付与することもできます。

   b. オプション: [受信者がこのダッシュボードに関連付けられた共有権限を追加、編集、または削除できるようにする] を選択して、ユーザーが新しいユーザーにアクセス権を付与したり、既存の権限を変更または削除したりできるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


c. 必要に応じて、[閲覧者として追加] または [編集者として追加] を選択します。

> **注:**
> [エディターとして追加] を選択できるのは、sn_align_core.apw_user ロールが割り当てられている場合のみです。

選択したユーザー、グループ、ロールが [アクセスを管理] に表示されます。

ユーザー、グループ、またはロールを選択し、[共有可能] オプションを有効にすることで、共有権限を管理することもできます。

d. [**Confirm** (確認)] を選択します。

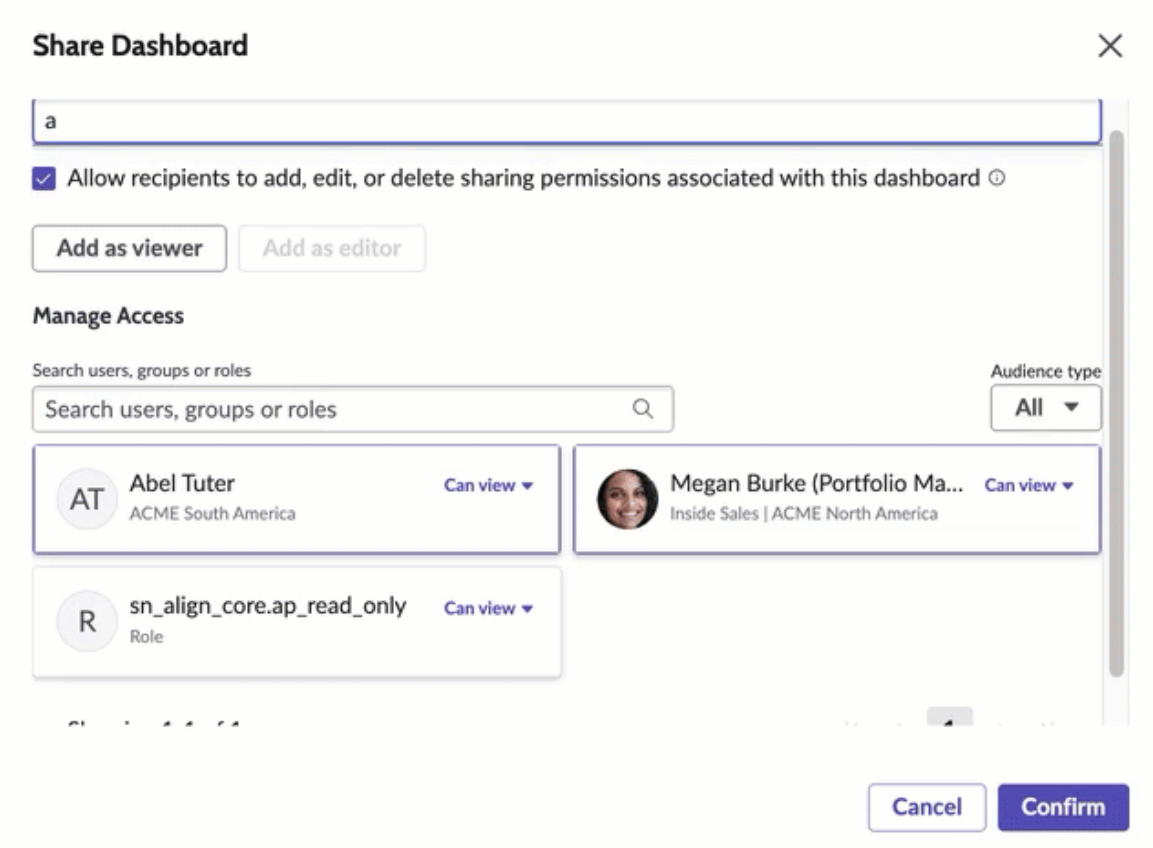

タスクの結果
ダイアログを再度開くと、ダッシュボードを共有したロール、グループ、ユーザーが、付与した権限とともに表示されます。

次のタスク
ダッシュボードを共有したユーザーの権限は、各ユーザー、グループ、またはロールの [表示可能]/[共有可能] リストの下にある [ダッシュボードの共有] ダイアログで変更できます。

関連情報

- ダッシュボードの表示
- ダッシュボードを作成
- ダッシュボードの複製
- プラットフォームアナリティクスダッシュボードの追加

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プラットフォームアナリティクスダッシュボードの追加

プラットフォームアナリティクスを使用して作成された既存のダッシュボードがある場合は、それらを戦略的計画ワークスペースに追加して、1 つの場所から直接アクセスできます。

始める前に
必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて
任意の プラットフォームアナリティクス ダッシュボードを 戦略的計画ワークスペースに追加できます。

手順

1. 移動先 すべて > プラットフォームアナリティクス > アナリティクスセンター.
   [ダッシュボード] セクションがページに表示されます。
2. ブックマークされたダッシュボードまたは認定されたダッシュボードを、[ブックマーク 済み] または [認定 済み] タブから選択します。
   追加するダッシュボードがブックマークまたは認定されていない場合は、[ダッシュボード] セクションから [すべて表示] を選択し、[ダッシュボード] ページからダッシュボードを選択します。

   選択したダッシュボードが表示されます。
3. ダッシュボードヘッダーから [編集] を選択します。
4. ダッシュボードヘッダーから、[ダッシュボードの詳細を表示] アイコン (
   a. [詳細] サイドパネルで、[ダッシュボードの可視化] フィールドに「戦略的計画ワークスペース」を入力します。
5. ダッシュボードヘッダーから [保存] を選択します。
6. ダッシュボードヘッダーから、[編集モードを終了] を選択します。

タスクの結果
ダッシュボードが 戦略的計画ワークスペースに表示されます。

関連情報

ダッシュボードの表示

ダッシュボードを作成

ダッシュボードの複製

ダッシュボードを共有

戦略的計画ワークスペース の用語集

戦略的計画ワークスペース 固有の用語や概念について説明します。

用語集はアルファベット順にグループ化されています。

F | G | L | P | Q | R | 土 | 木 | W |

F

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィードバック

フィードバックは、チャット、顧客との会議、メール、ソーシャルメディア、アイデアポータルなどのさまざまなソースから収集された提案または入力です。詳細については、「Strategic Planning でのフィードバック」を参照してください。

フリーフォームロードマップ

会社のさまざまな部門から作業の概要計画を開始するためのスタンドアロンのビジュアルロードマップ。フリーフォームロードマップを使用すると、複数のポートフォリオにわたる作業など、会社のさまざまな部門からの作業を柔軟に計画および追跡できます。詳細については、「フリーフォームロードマップ」を参照してください。

G

目標

組織が組織計画を達成するために設定する目標。目標は本来、定性的なものが一般的です。詳細については、「目標」を参照してください。

L

レンズ

計画立案の視点は、組織内のさまざまなレベルの計画立案マネージャーによって異なります。レンズを使用すると、カスタマイズされたポートフォリオ計画を作成し、高レベルのイニシアチブと目標で作業の優先順位付けと調整を行うことができます。詳細については、「 レンズ」を参照してください。

レンズ構造

エンティティで構成されるレンズの構造。レンズのエンティティは、会社のさまざまなレベルの計画立案を表します。こうしたいずれかのレベルでポートフォリオ計画をビルドできます。レンズの下部エンティティに関連付けられた計画立案アイテムタイプは、ポートフォリオ計画を使用して計画できる作業のタイプを表します。詳細については、「レンズ構造」を参照してください。

P

計画立案アイテム

さまざまな計画立案組織が使用する作業アイテムのタイプ。たとえば、エンタープライズレベルの計画立案ではイニシアチブを計画立案アイテムとして使用できますが、プロジェクトレベルの計画立案ではプロジェクトを計画立案アイテムとして使用できます。計画立案アイテムの他の例は、デマンドまたはスクラムエピックです。

ポートフォリオ計画

レンズを使用してビルドされた計画マネージャーごとのカスタム計画。ポートフォリオ計画を使用すると、計画立案マネージャーは目標を定義し、これらの目標のターゲットを設定し、作業のロードマップを作成して目標と計画された作業の整合性を確保できます。詳細については、「 ポートフォリオ計画」を参照してください。

優先順位付け

優先順位付けは、ポートフォリオ計画のすべての新規および既存の作業をレビューし、そのバックログを表すのに役立ちます。ポートフォリオマネージャーは、データポイントを使用してアイテムをスタックランクし、どのアイテムを他のアイテムよりも優先するかを決定できます。詳細については、「戦略的計画 での優先順位付け」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品アイデア

製品アイデアは、収集したフィードバックから作成される改善またはソリューションです。これらの製品アイデアは、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、影響度を評価し、優先順位を付けて開発します。詳細については、「 製品アイデア」を参照してください。

Q

定性的ターゲット

定性的ターゲットは通常測定できませんが、ターゲットが達成されたかどうか(つまり、はい/いいえ)を追跡できます。詳細については、「 定性的ターゲット」を参照してください。

定量的ターゲット

目標のために作成されたターゲットで、数値ベース、カウント可能、測定可能なターゲットです。詳細については、「ターゲット」を参照してください。

R

RICE

各基準を採点することによりアイテムに優先順位付けして、評価するためのフレームワークです。これは、チームが 4 つの主要な基準 (リーチ、影響、信頼性、工数) に基づいてアイテムを評価および比較するのに役立ちます。詳細については、「RICE」を参照してください。

ロードマップ

今後のプロジェクトまたはイニシアチブの計画を事業達成目標に合わせたレイアウト。各ロードマップは上位レベルの作業ブロックであり、エンタープライズプロジェクトマネージャー、ポートフォリオマネージャー、プロジェクトマネージャーなどのさまざまな計画立案ペルソナによって優先順位が付けられます。詳細については、「戦略的計画 のロードマップ」を参照してください。

ロードマップのマイルストーン

ロードマップレベルで作成されたロードマップマイルストーンは、そのロードマップのタイムライン中に開始日や重要なイベントを追跡するのに役立ちます。ロードマップマイルストーンは、ロードマップマネージャーがユーザーに知らせたいイベントまたは期限を示す日付です。詳細については、「 ロードマップのマイルストーン」を参照してください。

土

戦略的優先事項

組織計画の目標。戦略的優先度は、指定された期間に目標を達成するのに役立ちます。

木

ターゲット

目標の尺度。ターゲットは定性的または定量的にすることができます。詳細については、「ターゲット」を参照してください。

ターゲットブレークダウン

ターゲットのブレークダウン。メインターゲットのターゲット値は、メインターゲットを簡単に達成できるように特定のブレークダウンターゲットに焦点を当てるために、より短い期間 (月次など) に分割されます。詳細については、「 ターゲットブレークダウン」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ターゲットソース

ターゲットとその目標の進捗状況が自動的に更新されるように、ターゲットの実績値を自動更新するターゲットの構成。ServiceNow AI Platform 上の任意のテーブルまたはテーブルの組み合わせ (利益計画、コスト計画、サーベイ、インシデント、PA インジケーターなど) をターゲットソースとして構成できます。詳細については、「ターゲットソース」を参照してください。

W



WSGF

最大のメリットを得るためにアイテムを順序付けするためのフレームワークです。特に、頻繁に優先順位を変更することにより経済的価値が向上する場合に役立ちます。このスコアは、相対的な遅延コストと相対的なジョブ期間、ビジネス価値、時間の重要度、リスク削減、およびジョブサイズに基づいています。詳細については、「WSJF」を参照してください。

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist



ServiceNow® 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assistアプリケーションを使用して、ドキュメントで戦略的計画またはテキストでフィードバックを要約したり、会話エクスペリエンスでデマンドを作成したり、プロジェクトの簡潔なプロジェクトサマリーを生成したり、エピックからストーリーを生成したりします。製品マネージャー、プロジェクトマネージャー、およびデマンドマネージャーは、 Now Assist スキルと AI エージェントを使用して、プロジェクトとワークフローを簡素化できます。

開始するには

探索	構成	AI エージェントを使用
		
SPM の Now Assist に関する詳細	開始するためのアプリケーションの構成 SPM の Now Assist	の生成 AI エージェントを使用する SPM の Now Assist

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用方法	参照	
		
の生成 AI 機能を使用する SPM の Now Assist	のフォームとフィールドについて説明します。SPM の Now Assist	

重要:

- 国内の SKU をお持ちのお客様は、すべてのモデルプロバイダーを利用できるわけではなく、一部の Now Assist 製品/機能は現在、国内のお客様はご利用いただけません。詳細については、Now Support ナレッジベースの KB1584492 記事を参照してください。将来のリリースでモデルプロバイダーの可用性の更新を必ず確認してください。
- 現在、 Now Assist 製品/機能の一部は、FedRAMP、NSC DOD IL5、オーストラリアの IRAP で保護されたデータセンターのお客様、セルフホスト型のお客様、またはその他の制限された環境ではご利用いただけません。詳細については、Now Support ナレッジベース記事「KB0743854」を参照してください。将来のリリースで可用性の更新を必ず確認してください。
- 現在、一部の Now Assist 製品/機能は一部の地域の顧客のみが利用できます。将来のリリースで可用性の更新を必ず確認してください。

Now Assist スキルと AI エージェントの AI モデルプロバイダーとして、 Now LLM サービス、Azure OpenAI、 Google Gemini、 、または Anthropic Claude on AWS を使用できます。での構成コントロールの使用 AI コントロールタワー 利用可能なオプションを定義するには、 Now Assist アドミン 慰める.

トラブルシューティングとサポート

- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

AI の制限事項

このアプリケーションは、データ内のパターンに基づいて予測を生成する急速に進化している研究分野である人工知能 (AI) と機械学習を使用しています。その結果、このアプリケーションは必ずしも正確、完全、または適切な情報を生成するとは限りません。さらに、このアプリケーションがユースケースに合わせて完全にトレーニングまたはテストされているという保証はありません。これらの問題を軽減するために、ユースケースに対する正確性、害、および適切性について、このアプリケーションの使用をテストおよび評価し、出力を人間が監視し、意思決定の目的で AI で生成された出力のみに依存しないようにするのは、ユーザーの責任です。これは、医療、ファイナンス、法務、雇用、セキュリティ、インフラストラクチャなど、結果が影響を与える分野にこのアプリケーションを

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

展開することを選択した場合に特に重要です。ServiceNow の AI 利用規定 に従うことに同意するものとします。このポリシーは ServiceNow によって更新される場合があります。

データ処理

このアプリケーションでは、ServiceNow 顧客の個々のインスタンスから一元化された ServiceNow 環境にデータを転送する必要があります。この環境は、インスタンスが存在するデータセンターとは異なるデータセンターリージョンに配置されている可能性があり、場合によっては Microsoft Azure などのサードパーティクラウドプロバイダーにも転送されます。このデータは、コアコンプライアンスポータル から利用可能なポリシーを含む、ServiceNow の内部ポリシーと手順に従って処理されます。

データコレクション

ServiceNow は、このアプリケーションの入力、出力を収集して使用し、出力を編集して、ServiceNow モデルや AI 製品などの ServiceNow テクノロジーを開発および改善します。さらに、このアプリケーションは タスクデータ (ケース支援の場合) およびチャットのトランスクリプト (チャット支援の場合)。 お客様は、「Now Assistオプトアウトに関するページ 」の説明に従って、いつでも将来のデータコレクションをオプトアウトできます。

詳細については、 Now Assist ドキュメント .

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の探索

複数のSPMワークスペースで戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assistを使用して、生産性を向上させながら、同じタスクを手動で処理するために費やす時間と労力を削減するのに役立つ生成 AI のスキルと機能を含めることができます。プロジェクトのプロジェクトサマリーを受信するようにメールをスケジュールすることもできます。

スキル

SPM の Now Assist アプリケーションには生成 AI のスキルと機能が含まれており、製品、プロジェクト、ポートフォリオ、およびデマンドマネージャーがNow Assistスキルを活用してプロセスとワークフローを合理化できるようにします。

計画立案アイテムスキルを書く

製品アイデア、デマンド、エピック、プロジェクト、ケイパビリティ、機能、ストーリーの 戦略的計画ワークスペース フォーム全体で説明フィールドで AI 支援を有効にすることで、レコード品質を向上させます。計画立案アイテムの [詳細 **(Elaborate**)] オプションと [短縮 **(Shorten**)] オプションを使用してテキストの絞り込みを有効にし、プロダクトマネージャーとアジャイルチームメンバーがコンテンツをより効果的に作成および編集できるようにすることができます。

アジャイルストーリーの生成


EAPワークスペースでアジャイルストーリー生成スキルを使用して、エピックまたは機能に関する高品質のストーリーの推奨事項を生成します。Now Assist、エピックまたは機能の名前、説明、ドキュメントコンテンツ、および既存のストーリーを使用して、ストーリーの推奨事項を提供します。推奨事項に基づいて、次のいずれかを実行するように Now Assist に依頼できます。

- ストーリーの推奨事項を複数のストーリーに分割します。
- 複数のストーリーの推奨事項を 1 つのストーリーにまとめます。
- 元の推奨事項に従ってストーリーを生成します。
- ストーリーの推奨事項を削除します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- ストーリーのタイトル、ペルソナ、説明など、推奨事項内の詳細の変更を提案します。
- 新しいストーリーの推奨事項の生成を提案します。

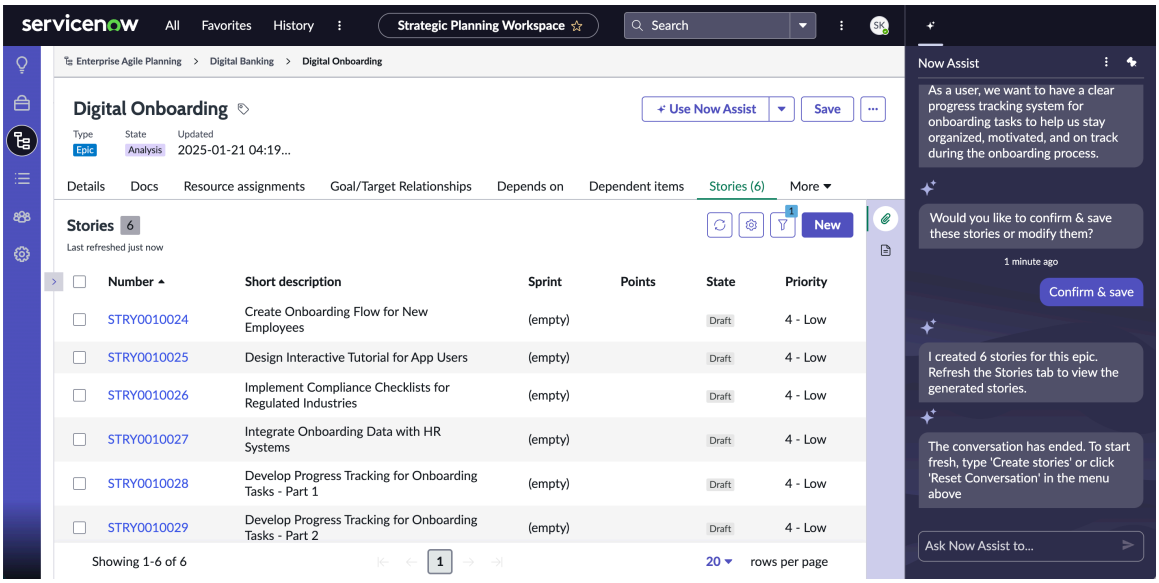

したがって、Now Assist のストーリー生成スキルを使用すると、次のことができます。

- 最初の障害を取り除き、エピックまたは機能のストーリーを作成します。
- ストーリー作成プロセスを自動化することで、時間を節約し、生産性を向上させます。
- ペルソナ、結果、受け入れ条件に対応して、ストーリーの完全性を確保します。

アジャイルストーリーの生成スキルは、 Yokohama パッチ 3 リリースおよび Strategic Planning v4.5.0 以降でサポートされています。以前のバージョンの Yokohama リリースを使用している場合は、エピックからのみストーリーを生成するストーリー生成スキルをアクティブ化できます。

マルチフィードバック要約またはフィードバック要約


長い顧客フィードバックコメントを簡潔にした有益なサマリーを製品マネージャーに提供します。製品マネージャーは、1 つまたは複数のフィードバックレコードの名前と説明からサマリーを生成できるので、フィードバックコンテキストをすばやく理解できます。生成されたサマリーは、直接実行アイテムに変換できます。 Now Assist 、フィードバックの入力データに使用されるフィールドに 60 個以上の単語が含まれている場合にのみ、フィードバックからサマリーを生成できます。60 語という最小語は、要約を作成するのに十分な情報があることを確認することで、エクスペリエンスを最適化します。

次の例は、マルチフィードバック要約スキルを使用した複数のフィードバックレコードの要約を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


マルチフィードバック要約スキル

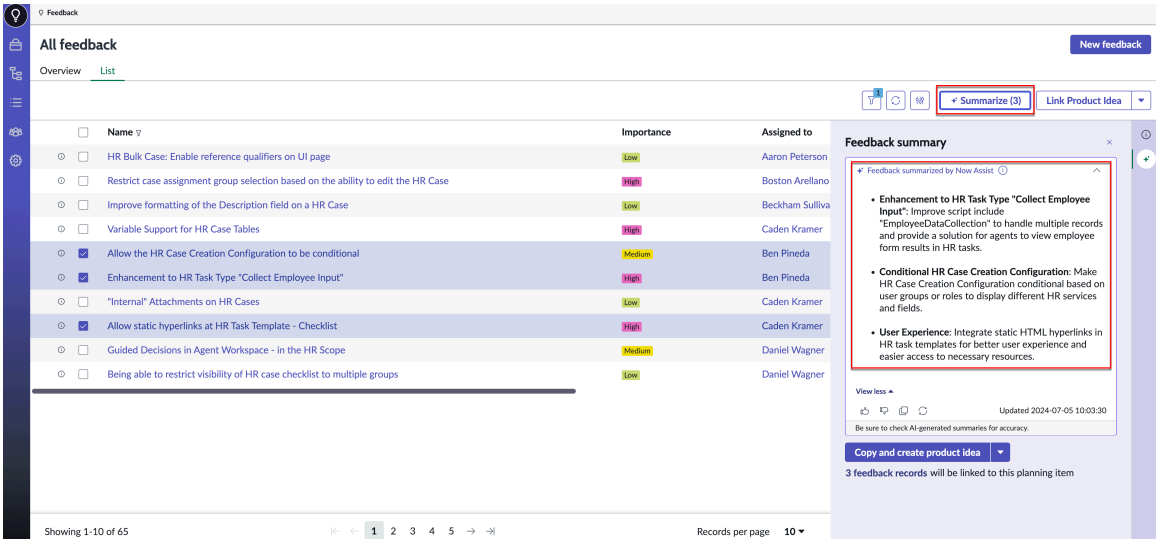

プロジェクトのドキュメント要約、計画立案アイテムのドキュメント要約、または EAP ドキュメントの要約

ドキュメントの Now Assist を使用して、選択したテキストまたは完全なテキストを簡潔にした有益なサマリーを製品マネージャーに提供します。製品マネージャーは、プロジェクトドキュメント要約 (プロジェクトワークスペース)、計画アイテムドキュメント要約 (戦略的計画)、または EAP ドキュメント要約 (Enterprise Agile Planning) スキルを使用して、重要な情報をすばやく理解するために、選択したコンテンツまたは完了したコンテンツをドキュメントで要約、詳細化、短縮することができます。

ドキュメントの **Now Assist**

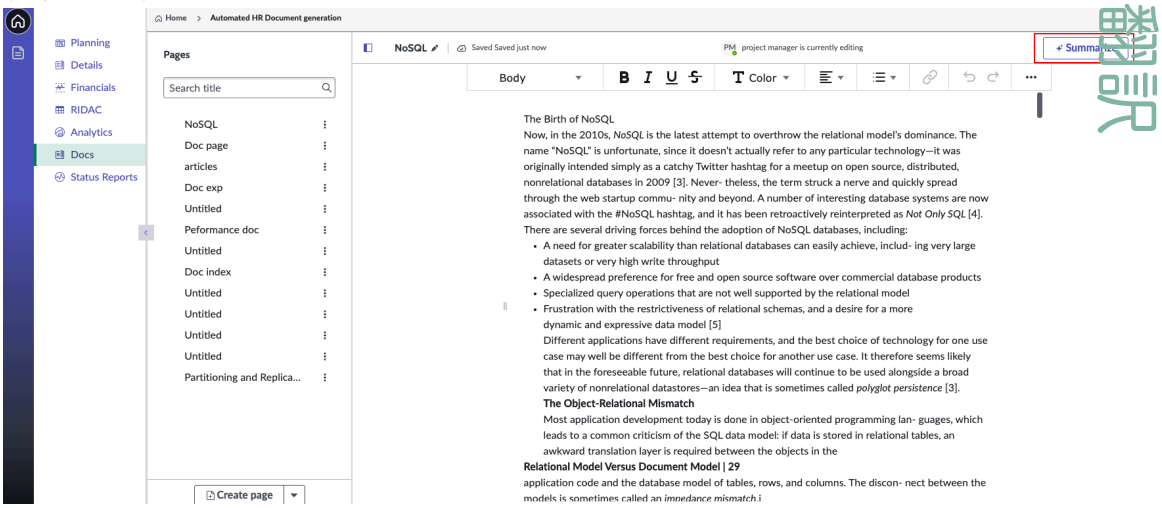

プロジェクトサマリーをメールで送信するスキルを使用して、各プロジェクトの進捗状況と変更を監視します。プロジェクトマネージャーは、最小限の労力でプロジェクトのサマリーを生成する頻度をスケジュールし、メールで受け取ることができます。マイルストーン、リソースのアサイン、プロジェクト、プロジェクトタスクなどの重要な要素を追跡できます。また、重点を置くべき重要な要素に優先順位を付けることもできます。また、プロジェクトサマリーメールを受信する頻度を決定することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Now Assist プロジェクトサマリースキルをメールで送信



✨ AI generated this project summary using project details and history. Be sure to check it for accuracy and make edits before sharing.

Please find your project summary for PRJ0010004 - Migrate to Cloud based Recruitment Platform by Now Assist

This summary provides an overview from the 2024-10-17 through the 2024-10-17.

Overall Project Insights

- The project has transitioned from 'Work in Progress' to 'Pending' state, indicating a potential delay in the project start date. The start date has been shifted from August 2023 to October 2024, and the end date has been adjusted accordingly. No changes in budget or forecast costs have been observed.

Top Insights Needing Attention

- The project has experienced a significant delay of over a year, which requires immediate attention.
- Resource task (PRJTASK0011981) is in 'Red' status with a close due date (October 7, 2024), indicating a potential risk or issue.
- Two new milestones (PRJTASK0011982 and PRJTASK0011980) and one new project task (PRJTASK0011979) have been introduced, which could have a significant impact on the project.
- Resource allocation (PRJTASK0011979) has a 'Yellow' status, indicating a potential risk or issue.

Milestone Insights

- Task analysis (PRJTASK0011982) has a close due date (October 25, 2024), which requires attention.
- Resource task (PRJTASK0011981) is in 'Red' status with a close due date (October 7, 2024), indicating a potential risk or issue.
- Resource planning (PRJTASK0011980) has been newly introduced, which could have a significant impact on the project.

Resource Assignment Insights

- Adam Q1 has two pending resource assignments (RA0001307 and RA0001309), which could impact the project schedule.
- Barbara D1's resource assignment (RA0001306) has been approved, indicating a potential resource availability for the project.

Project Task Insights

- Resource allocations (PRJTASK0011979) has a 'Yellow' status, indicating a potential risk or issue.
- Cloud management (PRJTASK0011985) has been newly introduced, which could have a significant impact on the project.

PRJ0010004 - Migrate to Cloud based Recruitment Platform

デマンド作成のための会話エクスペリエンス。

Now Assist 会話型カタログ作成機能を使用して、従業員サービス管理 (ESM) (ESC) ポータル内でデマンドを作成するプロセスを簡素化します。

- デマンドの作成に適したアイテムを見つけるためにカタログアイテムのリストを検索することは避けてください。
- チャットでコンテキストに応じた質問に回答して、[デマンド] フォームの関連フィールドに自動入力します。

仮想エージェント でNow Assistの表示場所として Microsoft Teams とモバイルが有効になっている場合、ユーザーは会話エクスペリエンスを使用してこれらのアプリケーションでもデマンドを作成できます。

注:
このスキルは、 Now Assist アドミン コンソールのプラットフォームカテゴリで利用できます。

Now Assist アドミン コンソール

アドミニストレーターは、戦略的計画ワークスペースの Now Assist アドミンコンソールを使用して、ワークスペースの Now Assist 機能とスキルを有効にして管理できます。Now Assist アドミンコンソールの詳細については、「Overview tab in Now Assist Admin」を参照してください。

AI エージェント

ServiceNow AI エージェントは、LLM (大規模言語モデル) を使用して、基本的な応答から複雑な問題解決までのタスクを処理し、ライブエージェントワークフローを最適化します。Now Assist AI エージェントの詳細については、「 での AI エージェントエージェントワークフローの使用 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist」を参照してください。

関連情報

- Exploring Now Assist Admin
- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成
- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の使用

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

での AI エージェントエージェントワークフローの使用 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist

SPM の Now Assistの参照

AI Agent Studio

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist に関するサポート情報

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist アプリケーションに関連する重要な情報の簡単な概要を把握できます。

サポート対象のバージョン

SPM の Now Assist アプリケーションは、Xanadu パッチ 3 リリース以降でサポートされています。

サポート対象のユーザーインターフェイス

SPM の Now Assist アプリケーションは、戦略的計画ワークスペース、プロジェクトワークスペース、および エンタープライズアジャイル計画 でサポートされています。

ライセンスの要件

SPM の Now Assist アプリケーションには、SPM Pro Plus のライセンスが必要です。

アプリケーション情報

最新の SPM の Now Assist (sn_spm_gen_ai) ストアアプリをアクティブ化して、 Now Assist スキルを使用します。

このストアアプリには、次の依存関係があります。

- Now Assist for Platform (sn_genai_platform)
- 戦略的計画
- プロジェクトワークスペース
- エンタープライズアジャイル計画

詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。

関連情報

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の探索

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の使用

SPM の Now Assistの参照

での AI エージェントエージェントワークフローの使用 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成

admin ロールを持っている場合は、 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist アプリケーションを構成して、 戦略的計画、プロジェクトワークスペース、または エンタープライズアジャイル計画で生成 AI スキルを有効にすることができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
エンタープライズアジャイル計画でアジャイルストーリーの生成スキルを有効にするには、次のタスクを完了します。

- Turn on the Now Assist panel 。
- に移動し、AI 検索がアクティブになり、使用する準備ができていることを確認します すべて > **AI** 検索 > **AI** 検索ステータス

必要なロール：admin

このタスクについて
Now Assist アドミンコンソールを使用して、SPM の Now Assist を構成します。このコンソールには、プラグインをアクティブ化して生成 AI スキルを構成するために必要なものがすべて含まれています。詳細については、「Overview tab in Now Assist Admin 」を参照してください。

次の表に、Now Assist アドミンコンソールからアクセスできる機能とスキルを示します

Now Assist アドミンコンソールの **SPM** 機能とスキル

SPM 機能	スキル
フィードバック	• フィードバック要約作成 • マルチフィードバックの要約
デマンド	デマンド作成のための会話エクスペリエンス
ドキュメント	• プロジェクトドキュメント要約作成 (プロジェクトワークスペース) • 計画立案アイテムのドキュメント要約 (Strategic Planning) • EAP ドキュメント要約作成 (Enterprise Agile Planning)
プロジェクト管理	メールプロジェクトのサマリー
ストーリー	アジャイルストーリーの生成 アジャイルストーリーの生成スキルは、 Yokohama パッチ 3 リリースおよび Strategic Planning v4.7.0 以降でサポートされています。Yokohamaリリースの以前のバージョンを使用している場合は、エピックからのみストーリーを生成することを含むストーリー生成スキルをアクティブ化できます。
製品アイデア、デマンド、エピック、プロジェクト、ケイパビリティ、機能、またはストーリー	計画立案アイテムの書き込み

デマンド作成のための SPM の Now Assist アプリケーションと会話エクスペリエンスのシステム要件は次のとおりです。


- Now Assist プラットフォーム向け
- 戦略的計画
- プロジェクトワークスペース
- SPM Pro Plus ライセンス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


手順

1. 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist プラグイン (sn_spm_gen_ai) をインストールします。
   - アプリケーションの依存関係の詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist に関するサポート情報」を参照してください。
   - インストールプロセスの詳細については、「Install Now Assist plugins」を参照してください。
2. 移動先 すべて > **Now Assist** スキル
   既に Now Assist アドミン コンソールが表示されている場合は、画面の **[Now Assist** スキル] タブを選択できます。
3. [テクノロジー] カテゴリを選択し、[SPM] を選択します。
4. Now Assist スキルカードで、[スキルをアクティブ化] を選択して必要なスキルをアクティブ化します。

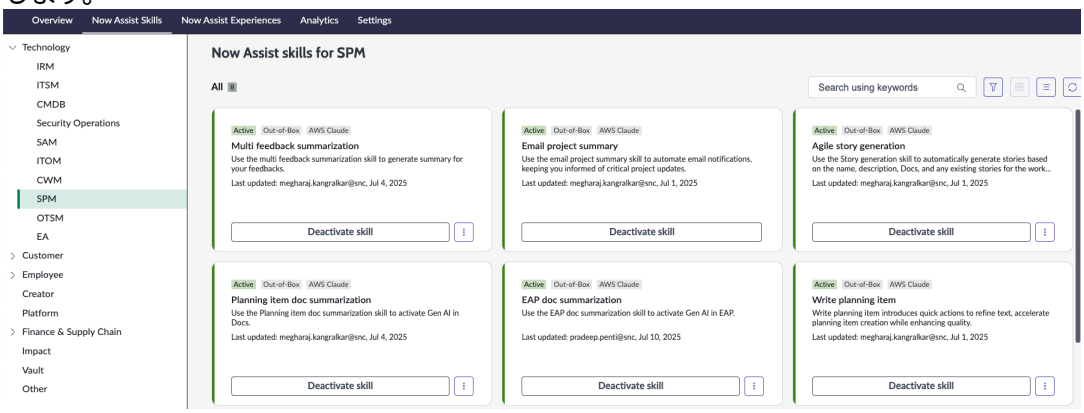

5. 選択したスキルの入力と表示パラメーターを確認します。
   a. 入力を選択:
      - テーブルやフィールドなどのデータソースを確認します。ほとんどのスキルの入力はデフォルトで選択されており、変更できません。各スキルの入力の詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist のスキルの入力」を参照してください。

スキルの入力画面の選択

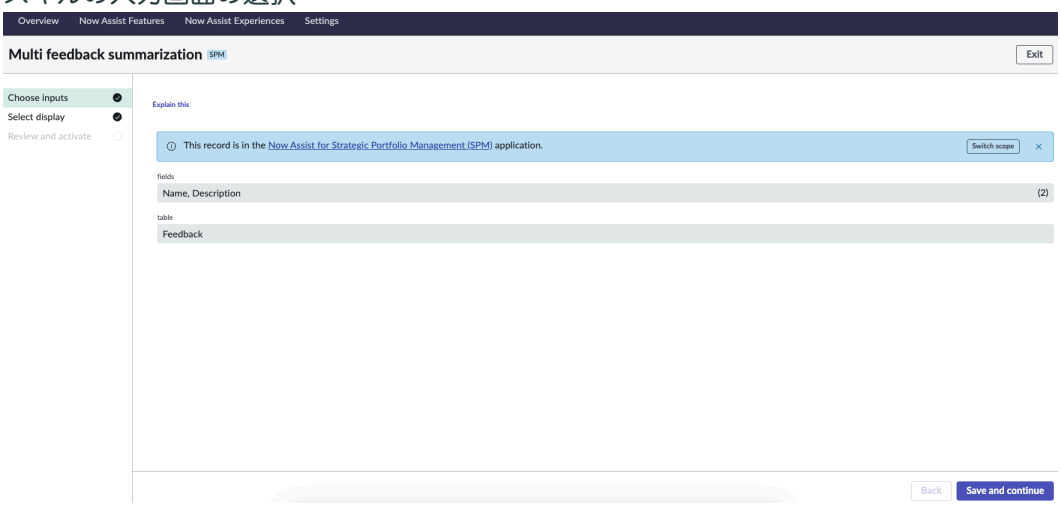

      - **[Save and continue** (保存して続行)] を選択します。

   b. 表示を選択：スキルが表示される場所を確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 製品内デスクトップ:このオプションを有効にすると、 戦略的計画 ワークスペース内にスキルが表示されます。
- **Now Assist** パネル:このオプションを有効にすると、戦略的計画ワークスペースから起動したときにNow Assistパネル内にスキルが表示されます。

  注:
  スキルに基づいて表示オプションを使用できます。

- **[Save and continue** (保存して続行)] を選択します。

c. レビューとアクティブ化: 選択肢の概要を確認し 、[アクティブ化] を選択してスキルをアクティブ化します。

注:
Now Assist スキルへのアクセスが必要なカスタムロールの ACL を更新します。詳細については、「Implement access control in Now Assist AI agents」を参照してください。

スキル入力の詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist のスキルの入力」を参照してください。

6. このプロセスを繰り返して、 SPMに利用可能な他のスキルをアクティブ化します。

タスクの結果
スキルが構成され、アクティブ化されます。

関連情報

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の使用

Overview tab in Now Assist Admin

Configuring Now Assist Admin features

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist のスキルの入力

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist アプリケーションの各スキルの入力について説明します。スキルの入力を構成することで、スキルをいつどのように使用するかを決定できます。

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist概要

選択したスキルに応じて、入力を構成できます。これらの設定は、スキルをどのように使用するかを決定します。入力は、フィードバックサマリーの生成に使用されるテーブルやフィールドなど、スキルに使用されるデータを識別します。admin ロールを持っていて、入力フィールドが編集可能な場合は、スキルの入力データを変更できます。

フィードバック要約スキルの入力

フィードバック要約スキルには、フィードバックのサマリーが生成されるときに使用されるテーブルとフィールドを識別する入力が含まれます。データソースには、スキルが依存するテーブルとフィールドが含まれています。次の表に、フィードバック要約スキルの入力を示します。

フィードバック要約スキルの入力

入力	説明
テーブル	フィードバック [sn_align_core_feedback]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィードバック要約スキルの入力 (続く)

入力	説明
フィールド	• 名前 • 説明

アジャイルストーリーの生成スキル入力

アジャイルストーリーの生成スキルには、エピックと機能のストーリーの推奨事項を生成するために使用されるテーブルとフィールドを識別する入力が含まれます。次の表に、入力データの詳細を示します。

アジャイルストーリー生成スキルのエピック入力データ

入力	説明
テーブル	エピック [sn_align_core_scrum_epic]
フィールド	• 名前 • 説明
生成する最大ストーリー	これは、ユーザーがエピックのストーリーを作成するように求められたときに Now Assist 推奨するデフォルトのストーリー数です。 admin ロールを持っている場合は、この番号を変更できます。3、4、5 から選択します。

アジャイルストーリー生成スキルの機能入力データ

入力	説明
テーブル	機能 [sn_align_core_feature]
フィールド	• 名前 • 説明
生成する最大ストーリー	これは、ユーザーが機能のストーリーを作成するように求められたときに Now Assist が推奨するデフォルトのストーリー数です。 admin ロールを持っている場合は、この番号を変更できます。3、4、5 から選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

計画立案アイテムスキル入力の書き込み

計画立案アイテムスキルを作成するための入力データ

入力	説明
計画立案アイテムのフィールド	説明
ストーリーフィールド	• 説明 • 受け入れ条件
テーブル	製品アイデア [sn_align_core_product_idea] デマンド [sn_align_core_demand] 機能 [sn_align_core_capability] エピック [sn_align_core_scrum_epic] プロジェクト [sn_align_core_project] 機能 [sn_align_core_feature] ストーリー [rm_story]

関連情報

- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成
- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の探索
- での AI エージェントエージェントワークフローの使用 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist
- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の使用
- SPM の Now Assistの参照

での **Now Assist** を使用した会話型デマンドの作成の有効化 仮想エージェント

必要なスキルをアクティブ化し、会話エクスペリエンスを使用して仮想エージェントでエージェントアシストからデマンドを作成できるようにするために必要な構成について学習します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > **Now Assist** アドミン > スキル.
2. [プラットフォーム] カテゴリを選択します。
3. Now Assist マルチターンカタログ注文スキルカードで、[オンにする] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- インスタンスに AI 検索がインストールされ、プロビジョニングされていることを確認します。移動先 すべて > **AI** 検索 > **AI** 検索ステータス
- Now Assist を 仮想エージェント で設定します。「Configuring assistants overview」を参照してください。
- ユーザーのデマンドを作成するときに、仮想エージェントでエージェントアシスト尋ねる質問プロンプトを追加または変更できます。「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist でデマンド作成のための質問の構成」を参照してください。

戦略的ポートフォリオ管理 **(SPM)** 向け **Now Assist** でデマンド作成のための質問の構成

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist アプリケーションでデマンドを作成するときに、仮想エージェントの Now Assist の新しい質問を追加するか、既存の質問を変更します。

始める前に
以下のプラグインがインストールされていることを確認します。

- Now Assist for Platform (v4.0.2)
- IT Service Management (ITSM) の Now Assist
- 会話型カタログ要求での Now Assist

> **注:**
> 会話型カタログ要求に Now Assist をインストールすると、他のすべての依存プラグインが自動的にインストールされます。

- [会話エクスペリエンス (Conversational experience)] スキルを有効にします。
- 仮想エージェントの Now Assist を構成します。詳細については、「仮想エージェントの Now Assist の構成 (Configure Now Assist in Virtual Agent)」を参照してください。

> **注:**
> 仮想エージェントの Now Assist の表示場所として Microsoft Teams とモバイルが有効になっている場合、エンドユーザーは会話エクスペリエンスを使用して、これらのアプリケーションでもデマンドを作成できます。

必要なロール：admin または catalog_admin

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > 会話型カタログの概要.
2. [新規デマンドを作成] カタログアイテムを選択します。
3. [仮想エージェントの **Now Assist]** を選択して、サポートされていない会話型カタログアイテムの質問タイプと提案を特定し、会話型にします。
   サポートされていないフィールドの詳細については、「Configure Now Assist in Conversational Catalog Request」を参照してください。
4. [変数] 関連リストで既存の質問を確認し、[詳細表示で編集] を選択して質問を追加または変更します。

スクリプトインクルードを使用してメールのプロジェクトサマリーのヘッダーとフッターを更新する

スクリプトインクルードを使用して、プロジェクトサマリーのメールテンプレートを変更します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
SPM の Now Assistがインストールされ、プロジェクトサマリーをメールで送信するスキルがアクティブであることを確認します。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **UI** > スクリプトインクルード.
2. *ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants*スクリプトインクルードを開き、メールのヘッダーの*ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants.EMAIL_HEADER_HTML*定数を更新します。

   この例では、メールのヘッダーのスクリプトインクルードを次のように示しています。

   ```
   ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants.EMAIL_HEADER_HTML = `<p><span
   style="color: white;"><a href="https://www.servicenow.com/" target="_blank"
   rel="noopener noreferrer nofollow"><span style="color: white; text-decoration:
   none;"><span style="color: blue;"><img style="height: 30px; width: 150px; border: none;"
   src="sn_spm_gen_ai.sn-logo-project-insights.png" alt="servicenow logo" height="30px"
   border="0" /></span></span></a></span></p>`;
   ```

3. メールフッターの *ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants.EMAIL_FOOTER_HTML* 定数を更新します。

   この例では、メールのフッターのスクリプトインクルードを次のように示しています。

   ```
   ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants.EMAIL_FOOTER_HTML = `<p
    style="border-top: 1px solid #293e40; line-height: 0;"><span style="color:
    #999999;"> </span></p><div style="caret-color: #212121; color: #212121;
    font-family: Aptos; font-size: 16px; width: 100%; margin: 0 auto; padding: 0;
    background-color: #ffffff;">     <!-- Logo Section -->     <div style="line-height:
    0.8;">       <span>         <a href="https://www.servicenow.com/" target="_blank"
    rel="noopener noreferrer nofollow" style="text-decoration: none;">           <img
    src="sn_spm_gen_ai.sn-logo-project-insights.png" alt="servicenow logo" style="height:
    20px; width: auto; border: none;" />         </a>       </span>     </div>     <!-- Address
    and Footer Information -->     <div style="font-family: 'Century Gothic', CenturyGothic,
    Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 0.8; color: #293e40; margin-top: 5px;">
         <p style="margin-bottom: 0; padding: 0; line-height: 0.8; font-size: 10px;">
    <span>2225 Lawson Lane, Santa Clara, CA 95054, United States</span>       </p>       <p
    style="margin-bottom: 0; padding: 0; line-height: 0.8; font-size: 10px; color: #293e40;">
    <span>© 2024 ServiceNow. All rights reserved</span>       </p>     </div>   </div>`;
   ```

   完了すると、プロジェクトサマリーメールテンプレートがヘッダーとフッターでカスタマイズされます。

でのプロジェクトタスクの監視エージェントワークフローの構成 **AI** エージェントスタジオ

AI エージェントスタジオで AI エージェントを構成して、プロジェクトタスクを監視します。

始める前に
プロジェクトタスクの監視を使用するには、プロジェクトサマリーをメールで送信するスキルが有効になっていることを確認してください。スキルをアクティブ化する方法の詳細については、 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成を参照してください。

必要なロール：admin または it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > **AI** エージェントスタジオ > 作成と管理.
2. リストから、[プロジェクトタスクの監視] を選択します。
   プロジェクトタスクの監視エージェントワークフローから、各 AI エージェントはデフォルトでアクティブとして出荷されます。

   > **注:**
   > 現在のエージェントワークフローでそのロールが必要ない場合でも、Now Assist パネル (NAP) ロールを持つユーザーのみがエージェントにアクセスできます。

3. [プロジェクトタスクの監視] エージェントワークフロートリガーを有効にします。
   a. [主要な要件を定義] 画面で、[続行] を選択します。
   b. [優先トリガーを追加] 画面から、[続行] を選択します。
   c. [表示の選択] 画面で、[保存してテスト] を選択します。

   エージェントワークフロートリガーは、このエージェントワークフローの AI エージェントを呼び出すイベントを定義します。トリガーにより、AI エージェントはプロジェクトタスクに対する特定の重要な更新時にのみ作業を開始できます。

4. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを選択します。

   プロジェクトマネージャーは、特定のプロジェクトのプロジェクトメールサマリースキルを有効にし、プロジェクトサマリーメールの頻度を設定する必要があります。メール頻度の設定方法の詳細については、 Email project summary スキルを使用してプロジェクトサマリーメールをスケジュールするを参照してください。

5. 特定のプロジェクトの [プロジェクトサマリーをメールで送信] モーダルで AI エージェントを有効にします。
   a. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、任意のプロジェクトを開きます。
   b. 計画ページで、その他のアクション アイコン (•••) を選択し、 プロジェクト サマリーの電子メール送信 を選択します。
   c. [プロジェクトの概要をメールで送信] ウィンドウで、要件に応じて [頻度] を [毎週]、[隔週]、または [月次] として選択します。
   d. [この日を、週次または隔週の曜日、または月次周期の日付として] を選択します。
   e. [ユーザー] を選択し、[クリティカルパスタスクの変更を含める] を選択します
   f. [スケジュール] または [スケジュールして送信] を選択し、プロジェクトのメール周期をスケジュールして送信します。

   > **注:**
   > [スケジュール] を選択すると、プロジェクトサマリーメールをスケジュールでき、選択した頻度に従ってプロジェクトサマリーが共有されます。[スケジュールして送信] を選択して、選択した頻度に従って概要とスケジュールを即座に送信することもできます。詳細については、「Email project summary スキルを使用してプロジェクトサマリーメールをスケジュールする」を参照してください。

   選択したプロジェクトに対して、プロジェクトタスクの監視エージェントが有効になっています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

Configure Now Assist AI agents

Install Now Assist AI agents

での AI エージェントエージェントワークフローの使用 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) プロジェクトタスクの監視エージェントワークフロー用の AI エージェント

での **AI** エージェントエージェントワークフローの使用 戦略的ポートフォリオ管理 **(SPM)** 向け **Now Assist**

SPM の AI エージェントを使用して、プロジェクトタスクを自律的に監視します。

SPM の **AI** エージェントで利用可能なエージェントワークフロー

エージェントワークフロー名	説明	利用可能な **AI** エージェント
プロジェクトタスクの監視	プロジェクトのクリティカルパス上のプロジェクトタスクを自律的に監視します。終了予定日の遅延、ステータスの更新を赤、ステータスの更新から未完了またはスキップなど、重要な更新を検出します。 これらの変更が発生すると、AI エージェントはプロジェクトマネージャーへのプロジェクトサマリーメールを自律的にトリガーし、アラートをトリガーした特定の更新を強調表示します。	• プロジェクトサマライザー • プロジェクト適格性アナライザー

AI エージェントをお探しですか?

- Now Assist アプリケーションとともにインストールされた AI エージェントが、エージェント型ワークフローでは使用されていない可能性があります。インスタンスで利用可能なすべてのエージェントを表示する方法については、「 AI エージェントの検索 」を参照してください。
- インスタンスにインストールされていない可能性のあるエージェントを見つけるには、ServiceNow Storeの AI エージェントマーケットプレイス にアクセスしてください。

重要:

デフォルトでは、すべてのエージェントワークフローと AI エージェントレコードは読み取り専用です。

AI エージェントを自律的に実行するには、次の手順を実行する必要があります。

- エージェントワークフローを有効にします。
- エージェントワークフロー内のすべての AI エージェントは、デフォルトでアクティブになっています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

AI Agent Studio

Configure Now Assist AI agents

でのプロジェクトタスクの監視エージェントワークフローの構成 AI エージェントスタジオ

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) プロジェクトタスクの監視エージェントワークフロー用の AI エージェント

プロジェクトタスクの監視エージェントワークフローを使用して、AI エージェントを使用してプロジェクトサマリーメールを自律的に生成します。AI エージェントは、プロジェクトマネージャーがプロジェクトのリスクを管理し、問題を解決し、プロジェクトに関してアクション可能な意思決定を行うのに役立ちます。

プロジェクトタスクの監視の概要

プロジェクトタスクの監視エージェントワークフローは、プロジェクトサマリーメールをトリガーし、主要なプロジェクトの更新をリアルタイムで可視化するのに役立ちます。メールプロジェクトサマリースキルを使用してプロジェクトサマリーを生成し、プロジェクトマネージャーにメールで送信します。

このプロアクティブな監視およびアラートシステムは、プロジェクトマネージャーの時間と労力を節約し、プロジェクトスケジュールを順調に進めるために迅速に対応できます。これらの AI エージェントを活用することで、プロジェクトマネージャーは運用を最適化し、価値実現までの時間を短縮し、プロジェクト全体の効率を高めることができます。

メールの概要には、次のセクションが含まれています。

- プロジェクトの重要な最新情報
- プロジェクト全体のインサイト
- 注意が必要な上位のインサイト
- マイルストーンインサイト
- リソースのアサインに関するインサイト
- プロジェクトタスクインサイト

このエージェントワークフローを変更する場合は、 複製し、 特定のニーズに合わせて設定を調整し、代わりにエージェントワークフローの複製バージョンをアクティブ化できます。

プロジェクトタスクエージェントワークフローの監視

AI エージェントを使用して、プロジェクトサマリーメールを自律的に生成します。プロジェクトタスクの監視を使用するには、プロジェクトサマリーをメールで送信するスキルが有効になっていることを確認してください。スキルをアクティブ化する方法の詳細については、 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成を参照してください。

プロジェクトタスクの監視エージェントワークフローにアクセスするには:

1. 移動先 すべて > **AI** エージェントスタジオ > 作成と管理.
2. [プロジェクトタスクの監視] を選択します。

監視プロジェクトタスクエージェントワークフローと関連する AI エージェントを構成するには、「 でのプロジェクトタスクの監視エージェントワークフローの構成 AI エージェントスタジオ」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトタスクの監視エージェントワークフローで使用される AI エージェント

次の AI エージェントは、[プロジェクトタスクの監視] エージェントワークフローに使用されます。

- プロジェクトサマライザー
- プロジェクト適格性アナライザー

[store-future: BEGIN review]

監視プロジェクトタスクエージェントワークフロー用に AI エージェントにマッピングされたツール

次の表は、[プロジェクトタスクの監視] エージェントワークフローで使用される AI エージェントにマッピングされるツールを示しています。

プロジェクトタスクの監視エージェントワークフローで使用されるツール

名前	説明
プロジェクトサマライザー	プロジェクトサマリーを生成します
プロジェクト適格性アナライザー	• プロジェクトメールインサイトスキルが有効になっているかどうかを確認します • 指定されたタスク番号のプロジェクト詳細を取得します • メールインサイト構成をフェッチし、重大な更新を確認します

[End]

[store-future: BEGIN review]

プロジェクトタスクの監視エージェントワークフローのトリガー

[トリガーを定義] 画面で、トリガーに次の条件が設定されている場合に、エージェントワークフローの実行が開始されます。

- [ターゲットテーブル] フィールドを [プロジェクトタスク] に設定します。
- [実行方法] フィールドの値を [タスク] にアサイン済み (Assigned to [task])] に設定します。
- 以下の条件を設定します。
  - **[Status] [is] [Red]** および
  - **[State] [is] [Closed Incomplete] [or] [Closed Skipped]** および
  - [終了予定日] [前より後] および
  - [担当者][空でない]

[End]

その他のエージェントワークフロー

プラットフォームワークフローに関連付けられている他のエージェントワークフローについて詳しくは、 Platform agentic workflows を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

Now Assist AI agents

Install Now Assist AI agents

AI Agent Studio

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の使用

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist アプリケーションを使用すると、フィードバックの要約、デマンドの作成、ドキュメントサマリーの生成、明確さと整合性のための計画立案アイテムの説明の調整を行うことができます。また、プロジェクトの概要を電子メールですばやく作成して共有し、AI エージェントを使用してプロジェクトタスクを自律的に監視することもできます。

関連情報

での AI エージェントエージェントワークフローの使用 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist を使用したフィードバックの要約

フィードバックレコードの名前と説明からサマリーを生成すると、各フィードバックレコードを手動で読み取らずに大量のフィードバックを迅速に分析できます。このタスクは、戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist アプリケーションのマルチフィードバック要約スキルを使用して実行できます。

https://player.vimeo.com/video/1016235687?h=c41764ac08&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

始める前に
このスキルへのアクセスを必要とするカスタムロールを持つユーザーがいる場合は、それらのロールの ACL を更新し、それらのカスタムロールを製品内ロールに追加する必要があります。

必要なロール：pf_user

このタスクについて
フィードバックまたはマルチフィードバック要約スキルを使用すると、製品について受け取ったフィードバックに関する十分な詳細を取得できるため、製品の機能、使いやすさ、およびパフォーマンスを改善できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[フィードバック] を選択します。
2. [フィードバック] ページから、任意のフィードバックフィルターカードを選択します。
3. フィードバックのリストから、1 つ以上のフィードバックレコードを選択します。

   サマリーコンテンツがロードされている間にサイドパネルのローダーを表示して、より魅力的なロードエクスペリエンスを実現します。

   1 つのフィードバックレコードのサマリーを生成する場合は、リストレベルまたはレコードレベルで生成できます。レコードレベルでは、フィードバックサマリーが Now Assist コンポーネントに表示されます。コンポーネントはデフォルトでは折りたたまれており、展開するとサマリーが表示されます。


4. [要約を作成] を選択します。

   Now Assist アイコンにカーソルを合わせると、そのアニメーションが表示されます。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィードバック要約スキルを使用して、単一のフィードバックレコードのサマリーを生成できます。この画像は、単一のフィードバックレコードに対して AI で生成されたサマリーを示しています。

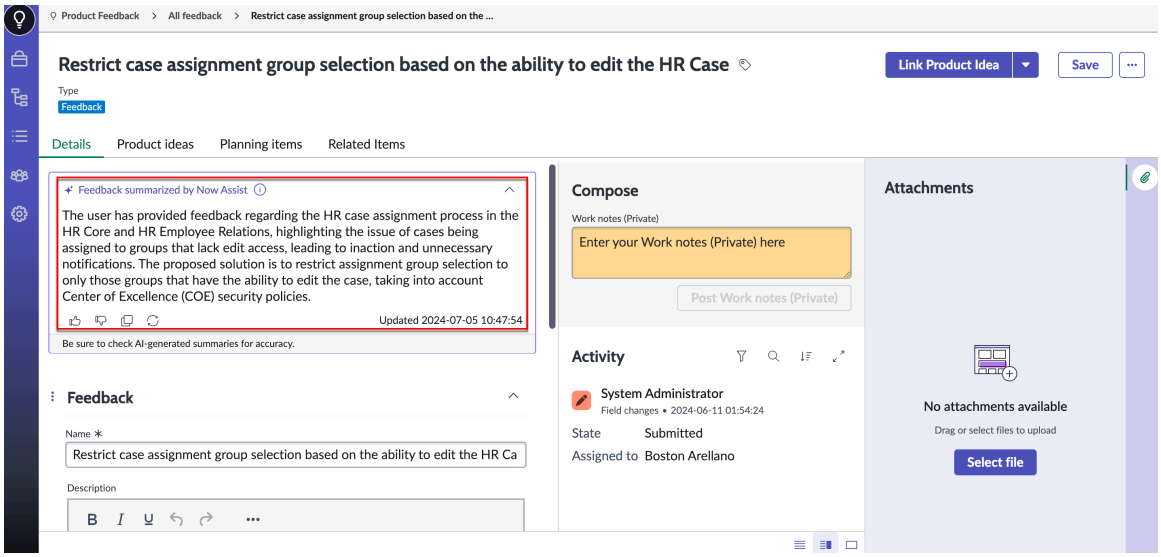

マルチフィードバック要約スキルを使用して 1 つまたは複数のフィードバックの要約を生成できます。たとえば、優先度の高いフィードバックを分析してフィルター処理し、レコードを要約して、要件に関するインサイトを得ることができます。

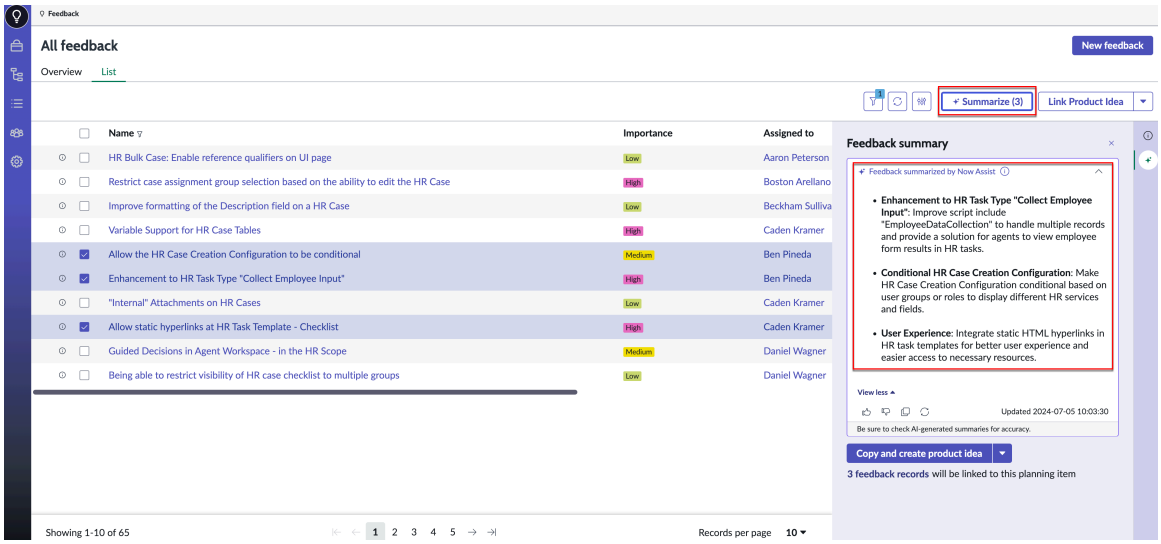

注:
これらのフィールドの情報は自動的に生成されるため、テキストを確認して正確であることを確認することをお勧めします。

フィードバックまたはマルチフィードバック要約スキルは、フィードバックレコードの名前と説明の情報を使用して、フィードバックからパラグラフまたは箇条書きのサマリーを生成します。

フィードバックリストとドキュメントの [要約を作成] ボタンに Now Assist アイコンのホバーアニメーションを表示します。

5. オプション: フィードバックの要約が完了したら、サマリーの展開または折りたたみ、フィードバックの提供、コピー、またはケースに関する情報の表示を行うことができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> フィードバック要約またはマルチ要約スキルは、フィードバックレコードをチェックして、サマリーを生成するのに十分な情報が利用可能かどうかを判断します。要約するのに十分なフィードバックコンテンツがない場合は、コンテンツを追加して再試行できます。

サイドパネルで、レコードのプレビューアイコン (ⓘ) を選択して追加の詳細を表示するか、生成されたサマリーのプレビューアイコン (✦) を選択してサマリー出力を表示できます。

6. オプション: [エピックのコピーと作成 **(Copy and create epic)]** を選択して、生成されたサマリーをコピーし、計画立案アイテムを作成します。

   (Optional) フィードバックを計画立案アイテムにリンクすることで、時間を節約し、ワークフローを簡素化します。これにより、サマリーをコピーする必要がなくなります。フィードバック で作業アイテムをすばやく作成し、ロードマップに表示できます。

関連情報

会話エクスペリエンスを使用したデマンドの作成

仮想エージェントの Now Assist の会話エクスペリエンスを使用して、仮想エージェントをサポートするアプリケーションからのデマンドを作成します。

始める前に

次のタスクが完了していることを確認します。

- 仮想エージェントをサポートするアプリケーションをインストールします。
- デマンド作成のための会話エクスペリエンスの構成を完了します。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。

必要なロール：なし

このタスクについて

https://player.vimeo.com/video/986004158?h=d45fb142d9&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

仮想エージェントをサポートするアプリケーション (従業員サービスセンター (ESC) など) では、チャットでデマンドを作成するプロンプトから作業を開始します。仮想エージェントでは、一連の質問を通じて、カタログアイテムに設定した質問に対する情報の入力を求められます。仮想エージェントの Now Assist がコンテキストを理解し、質問への回答として提供された情報を適切なカタログアイテム (この場合はデマンド) にマッピングします。


手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > 従業員センター.
2. [チャットウィンドウを開く] を選択します。
3. 仮想エージェントとの会話を開始するための指示を入力します。

   [デマンドを作成] などの基本的な指示から始めることも、デマンドの情報を含む詳細な指示から始めることもできます。次の例は、チャットで各指示がどのように処理されるかを示しています。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

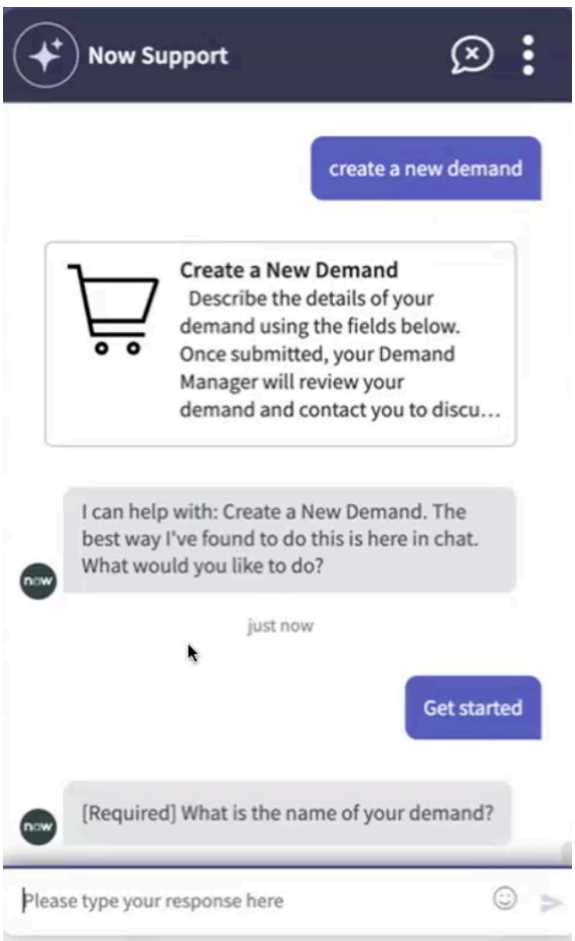説明	説明
簡易：デマンドを作成します	仮想エージェントは会話を開始し、一連の質問を通じてデマンドに関する詳細情報を求めます。 ○ デマンドの名前は何ですか？ ○ このデマンドの理由は何ですか？ ○ このデマンドの実行に関連するリスクは何ですか？ 入力した情報は、[デマンド] フォームのフィールドに入力するために使用されます。「**skip**」と入力すると、必須でないフィールドに関連する質問への回答をスキップできます。 
詳細：「Upgrade MyApp」という名前でデマンドを作成し、アップグレードとしてビジネスの根拠を作成し、マイルストーンの未達成として実行しない場合のリスクを作成します。	指定したコンテキストを使用して、仮想エージェントでは [デマンド] フォームの関連フィールドと自動的に照合します。 次に、デマンドや仮定の実行に関連するリスクなど、指定していないフィールドの情報のみを入力するように指示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

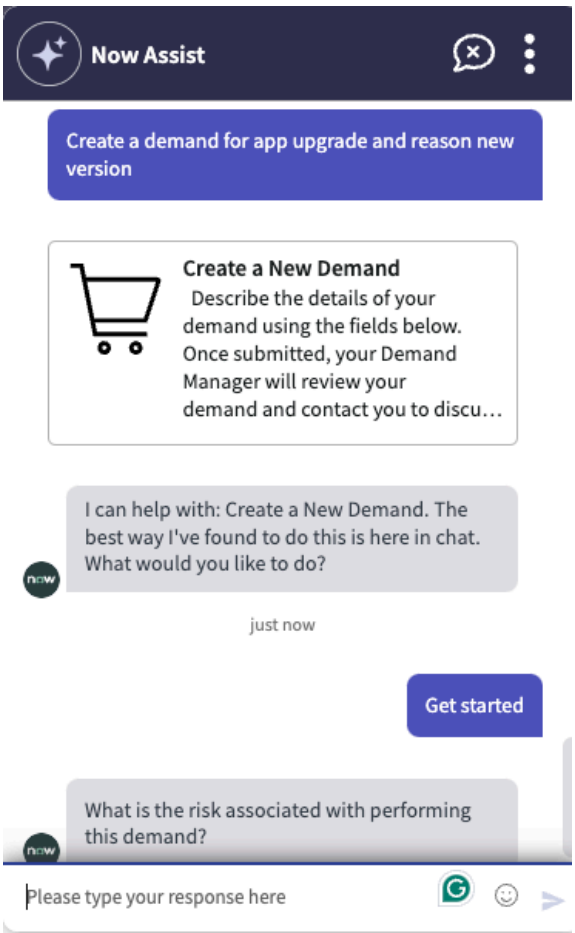説明	説明
	「**skip**」と入力すると、必須でないフィールドに関連する質問への回答をスキップできます。 

4. 仮想エージェントによって [デマンド] フォームのフィールドに入力された情報を確認します。変更を加えるか、送信するかを選択できます。
5. オプション: デマンドの添付ファイルを追加します。
   指定した情報が送信され、デマンドが作成されます。仮想エージェントによってデマンドが作成され、その番号、簡単な説明、ステータスなどの情報が提供されます。

   これで会話は完了です。

関連情報

Using Now Assist in Virtual Agent

を使用した **EAP** での作業アイテムからのストーリーの生成 **SPM** の **Now Assist**

エンタープライズアジャイル計画 (EAP) ワークスペースの [Now Assist] パネルを使用して、エピックと機能をストーリーに分類します。作業アイテムの詳細に基づいて、 Now Assist ストーリーを生成します。

始める前に
エンタープライズアジャイル計画のアジャイルストーリー生成スキルをアクティブ化します。「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

必要なロール:sn_apw_advanced.eap_user または
sn_apw_advanced.eap_read_only、now_assist_panel_userあり

このスキルへのアクセスを必要とするカスタムロールがある場合は、アクセスが必要なロールの ACL を更新します。詳細については、「Implement access control in Now Assist AI agents」を参照してください。

このタスクについて


https://player.vimeo.com/video/1062571498?h=68874331c2&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. ナビゲーションパネルの [アジャイル構造 (Agile structure)] セクションから、作業項目タイプとしてエピックまたは機能を持つ EAP チームを選択します。
3. [バックログ] ページまたは [計画ボード] ページから、ストーリーを作成するエピックまたは機能を選択します。
   作業アイテムの詳細がサイドパネルに表示されます。
4. オプション: サイドパネルから、[完全な詳細] を選択します。
5. インスタンスヘッダーから **[Now Assist**] を選択して Now Assist パネルを開きます。
6. Now Assistパネルで、「ストーリーの作成」を選択します。

   Now Assist は、作業アイテムの名前、説明、ドキュメントコンテンツ、および既存のストーリーに基づいて、ストーリーの推奨事項を生成します。

   ステップ 4 を実行していない場合は、エピックまたは機能番号を入力するように求められます Now Assist 。指定した作業アイテム番号を参照して、それに対するストーリーの推奨事項を提供します。



   表示される最初のストーリーの推奨事項の数は、このスキルの入力データ設定によって異なります。アドミンと協力して、この番号を変更できます。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist のスキルの入力」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

7. ストーリーの推奨事項を確認し、ストーリーを確認、結合、分割、削除するか、[その他] を選択して変更を提案するか、さらにストーリーを作成します。

   ヒント:
   Now Assistが現在の作業アイテムのストーリーの推奨事項に取り組んでいる間、新しいチャットを開始して、別のエピックまたは機能のストーリーを作成できます。Now Assistパネルヘッダーから [新規チャット] ( ) を選択します。[すべてのチャット] ( ) を選択すると、チャットを切り替えることができます。

8. これらのアクションのいずれかを反復処理でき、推奨事項に問題がなければ、 [確認して保存] を選択します。
   Now Assist 確認済みの推奨事項を使用してストーリーを作成します。新しく作成されたストーリーは、エピックと機能の詳細ページの [ストーリー] タブに表示されます。

を使用したドキュメントコンテンツの生成と改善 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist

カスタムプロンプトを使用して、ドキュメントで直接 SPM の Now Assist を含むコンテンツを生成します。さらに、既存のセクションを要約し、必要に応じて詳しく説明し、ドラフトを調整して生産性を向上させます。

始める前に

必要なロール:sn_align_core.ap_read_only、sn_align_core.pf_read、sn_apw_advanced.eap_read_only、sn_apw_advance
または sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて

ドキュメントで Now Assist を直接操作して、新しいコンテンツを作成したり、コンテキストを追加したり、既存のセクションを改善したりできます。これにより、ページを離れることなく、より迅速にドラフトを作成し、アイデアを絞り込み、作業を関連性のある状態に保つことができます。

コンテンツの生成と改善機能は、 戦略的計画ワークスペース、 ポートフォリオ計画ワークスペース、 プロジェクトワークスペースで使用できます。

このタスクを例として プロジェクトワークスペース を使用して説明します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、必要なプロジェクトを開きます。
2. ドキュメントから、作業するページを開き、任意のユースケースに Now Assist を使用します。
   Now Assist がテキストを分析し、別のポップアップに出力を生成します。
3. オプション: 生成された出力に基づいて、結果をさらに絞り込むことができます。
4. オプション: [クリップボードにコピー] アイコン ( ) を選択して生成された出力をコピーし、メールの送信、メモへの保存などの目的に使用します。

   重要:
   出力は AI によって生成されたものであるため、正確であることを確認してください。

を使用した EAP のドキュメントコンテンツの要約と絞り込み SPM の Now Assist

Now Assist機能を使用して、ドキュメントで選択したコンテンツを詳細化、短縮、要約したり、エンタープライズアジャイル計画 (EAP) でドキュメント全体の要約を取得したりできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に


- EAP でのドキュメント作成。
- EAP ドキュメント要約Now Assistスキルをアクティブ化します。「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。

必要なロール：sn_apw_advanced.eap_user


このスキルへのアクセスを必要とするカスタムロールがある場合は、アクセスが必要なロールの ACL を更新します。詳細については、「Implement access control in Now Assist AI agents」を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > エンタープライズアジャイル計画.
2. ドキュメントに移動します。
3. ドキュメントから、要約または絞り込みたいページを開きます。
4. 選択したテキストをページ上で要約するか、ページ全体を要約するかを選択します。
   - 選択したテキストを絞り込むには:
     a. ページ上のコンテンツの単一のブロックまたは複数のブロックを選択します。
     b. **[Now Assist]** を選択し、オプションを選択します。
        i. [要約を作成] を選択して、選択したテキストを要約します。
        ii. 既存の コンテキストに基づいて選択したテキストを長くするために詳細を設定します。
        iii. 短縮して 、選択したテキストを簡潔にします。



   - ページのコンテンツ全体を要約するには、ドキュメントヘッダーから **[Now Assist**] を選択し、[要約を作成] を選択します。




自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヒント:
要約するコンテンツが他にもある場合は、一部のテキストを削除して再試行できます。

Now Assist がテキストを分析し、別のポップアップに出力を生成します。

5. オプション: 生成された出力に基づいて、結果をさらに絞り込んだり、生成されたコンテンツをドキュメントに挿入したりできます。

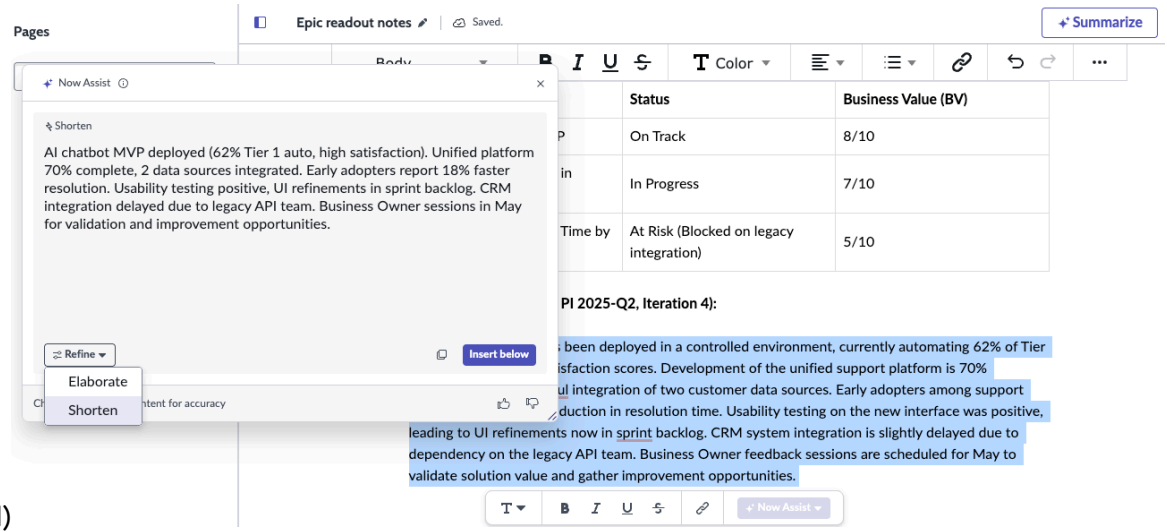

(Optional)

6. オプション: [クリップボードにコピー] アイコン ( ) を選択して生成された出力をコピーし、メールの送信、メモへの保存などの目的に使用します。

重要:
出力は AI によって生成されたものであるため、正確であることを確認してください。

の計画立案アイテムのドキュメントを要約するスキルを使用して、選択したコンテンツまたは完了したコンテンツのサマリーを生成します 戦略的計画

戦略的計画 でNow Assistによって生成されたサマリーから、ドキュメントの詳細をすばやく把握できます。

始める前に

計画立案アイテムのドキュメント要約スキルがアクティブであることを確認します。

このスキルへのアクセスを必要とするカスタムロールを持つユーザーがいる場合は、それらのロールの ACL を更新し、それらのカスタムロールを製品内ロールに追加する必要があります。

必要なロール:sn_align_core.ap_read_only、sn_align_core.pf_read、sn_apw_advanced.eap_read_only、sn_apw_advance または sn_align_core.ap_read_only

このタスクについて

Now Assist によって生成されたサマリーを使用して、ドキュメント、会議メモ、プロジェクトレポートなどを読む時間を最小限に抑えます。また、学習ニーズに合ったソース資料をドキュメントにコピーアンドペーストして、簡単なサマリーを生成することもできます。

手順


1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、フィードバックから製品アイデアなどの計画立案アイテムレコードを開きます。
2. [ドキュメント] タブから、要件に応じて次のいずれかのアクションを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. オプション: ドキュメントでコンテンツの要約が完了したら、フィードバックを提供したり、コンテンツに関する情報をコピーしたり、表示したりできます。

(Optional)

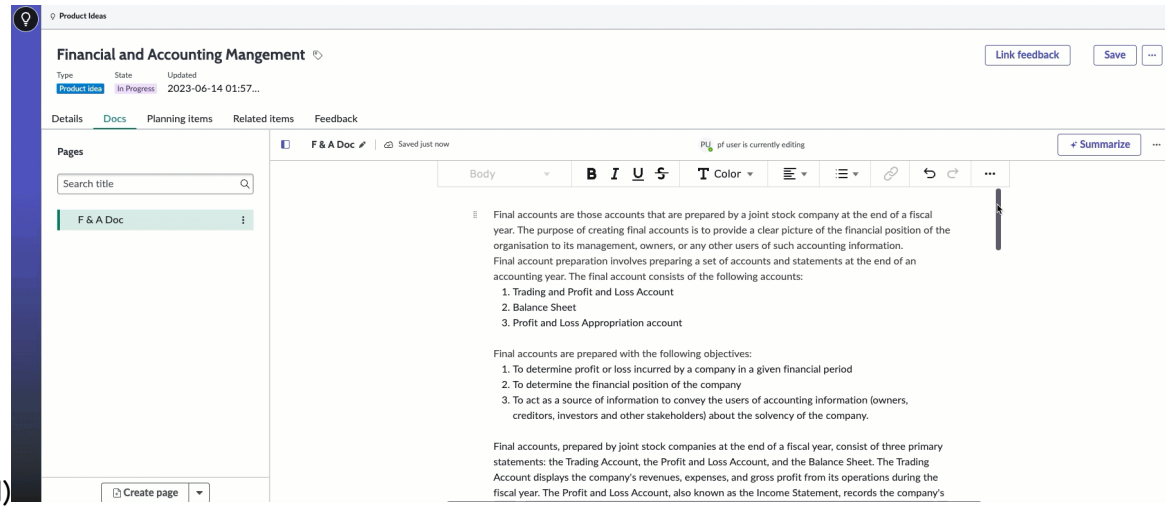

注:
これらのフィールドの情報は AI によって生成されるため、テキストを確認して正確であることを確認することをお勧めします。

Now Assist スキルをアクティブ化できるのはアドミニストレーターのみです。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。

計画立案アイテムのドキュメント要約スキルは、ドキュメントコンテンツをチェックして、要約を生成するのに十分な情報が利用可能かどうかを判断します。要約するのに十分なコンテンツがない場合は、コンテンツを追加して再試行できます。

注:
[要約 を作成 (Summarize)] ボタンは、計画立案アイテムのドキュメント要約スキルがアクティブな場合にのみ表示されます。選択したテキストが Now Assistのトークン制限を超えた場合、計画立案アイテムのドキュメント要約スキルを実行できません。要約するコンテンツが他にもある場合は、一部のコンテンツを削除して再試行できます。

のプロジェクトドキュメント要約スキルで、選択したコンテンツまたは完了したコンテンツのサマリーを生成します プロジェクトワークスペース

プロジェクトワークスペース で生成されたサマリーから、ドキュメントの詳細をすばやく把握できます。

https://player.vimeo.com/video/1038147968?h=9451c75819&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

始める前に
プロジェクトのドキュメント要約がアクティブであることを確認します。

このスキルへのアクセスを必要とするカスタムロールを持つユーザーがいる場合は、それらのロールの ACL を更新する必要があります。

必要なロール:project_manager、it_project_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、必要なプロジェクトを開きます。
2. ドキュメントから、要件に応じて次のいずれかのアクションを実行します。

   注:
   読み取りロールを持つユーザーは、コンテンツ全体の要約も可能です。

3. オプション: ドキュメントでページの要約が完了したら、フィードバックを提供したり、ページに関する情報をコピーしたり、表示したりできます。

   注:
   これらのフィールドの情報は AI によって生成されるため、テキストを確認して正確であることを確認することをお勧めします。

   Now Assist スキルをアクティブ化できるのはアドミニストレーターのみです。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。

   プロジェクトのドキュメント要約スキルは、ドキュメントの内容をチェックして、概要を生成するのに十分な情報が利用可能かどうかを判断します。要約するのに十分なコンテンツがない場合は、コンテンツを追加して再試行できます。

   注:
   [要約 を作成 (Summarize)] ボタンは、プロジェクトドキュメント要約スキルがアクティブな場合にのみ表示されます。選択したテキストが Now Assistのトークン制限を超えた場合、プロジェクトのドキュメント要約スキルを実行できません。要約するコンテンツが他にもある場合は、一部のコンテンツを削除して再試行できます。

Email project summary スキルを使用してプロジェクトサマリーメールをスケジュールする

プロジェクトサマリーメールをスケジュールして、 プロジェクトワークスペースでプロジェクトの最も重要な変更に優先順位を付けて追跡します。

https://player.vimeo.com/video/1039117096?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

始める前に
Email project summary スキルがアクティブであることを確認します。

このスキルへのアクセスを必要とするカスタムロールを持つユーザーがいる場合は、それらのロールの ACL を更新する必要があります。

必要なロール:project_manager、it_project_manager

このタスクについて
Email project summary スキルを使用すると、簡潔なプロジェクトサマリーを生成できます。プロジェクトの概要はメールで共有されます。プロジェクトマネージャーは、マイルストーン、リソースのアサイン、プロジェクト、プロジェクトタスクなどの重要な要素を監視できます。また、プロジェクトに優先順位を付け、プロジェクトサマリーメールを受信する頻度を決定することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、任意のプロジェクトを開きます。
2. 計画ページで、その他のアクション アイコン (•••) を選択し、 プロジェクト サマリーの電子メール送信 を選択します。
3. [プロジェクトサマリーをメールで送信] モーダルから、要件に応じて [頻度] を [週次]、[隔週]、または [月次] として選択します。
4. [この日を、週次または隔週の曜日、または月次周期の日付として] を選択します。

   注:
   メールでサマリーを送信するには、プロジェクトマネージャーのメール ID が必要です。

   [概要メールを無効にする] チェックボックスをオンにすると、概要メールを無効にすることができます。

5. リストから [ユーザー] を選択します。
   - プロジェクトマネージャーは、プロジェクトのデフォルトのメール受信者として自動的に設定されます。
   - 1 人または複数のユーザーを選択できます。sn_ppm_readロールを持つユーザー、またはプロジェクト情報の読み取りアクセス権または表示アクセス権を持つユーザーのみがユーザーリストに表示されます。
   - メールが受信者に送信されると、プロジェクトマネージャーは [宛先] リストに配置され、他のすべての受信者は [CC] リストに含まれます。
   - 機密プロジェクトの場合、プロジェクトを表示する権限を持つユーザーのリストに受信者を含める必要があります。
6. [クリティカルパスタスクの変更を含める] を選択して、プロジェクトタスクが [プロジェクトサマリーをメールで送信] モーダルから直接 AI エージェントを監視できるようにします。
   クリティカルパスタスクの変更によってプロジェクトのタイムラインが遅れる可能性がある場合は、通知を受け取ることができます。これらの AI 主導のアラートは、リスクがエスカレートする前にアクションを実行するのに役立ちます。
7. [スケジュール] を選択して、プロジェクトのメール周期をスケジュールします。

   注:
   これらのフィールドの情報は AI によって生成されるため、テキストを確認して正確であることを確認することをお勧めします。

   プロジェクトサマリーをメールで送信するスキルは、プロジェクトのさまざまなスナップショットをさまざまなタイミングでキャプチャします。たとえば、週次スケジュールを選択した場合、スキルは今週のプロジェクトのスナップショットをキャプチャし、来週の別のスナップショットをキャプチャします。これらのスナップショットはバックエンドに保存されます。次に、 Now LLM サービス 2 つのスナップショットを比較し、注目すべき重要な変更 (マイルストーンの遅延や予算の増加など) を強調表示します。スキルは、これらの重要な更新のサマリーを作成し、プロジェクトレコードへのリンクを含むメールをプロジェクトマネージャーに送信します。プロジェクトサマリーにより、プロジェクトマネージャーは変更を手動で確認することなく、重要な更新について最新情報を得ることができます。

8. オプション: [スケジュール] を選択してスケジュールし、プロジェクトのサマリーをすぐに送信します。
   [スケジュールして送信] を選択すると、プロジェクトサマリーがすぐに受信され、選択した頻度に基づいてサマリーも受信されます。メールは、プロジェクトマネージャーとともに選択された受信者に送信されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: プロジェクトサマリーメールをスケジュールする

週単位の頻度を選択し、月曜日 (2025-07-07 に該当する) を選択したとします。受信者を追加した後、[クリティカルパスタスク変更] チェックボックスをオンにして、プロジェクトタスクモニター AI エージェントを有効にしておきます。

- [スケジュール] を選択すると、プロジェクトサマリーは、2025-07-07 からプロジェクトが非アクティブになるまで毎週月曜日にお客様と受信者にメールで送信されます。
- [スケジュールして送信] を選択すると、最初のサマリーメールがすぐに届き、選択した頻度と日に応じたサマリーも届きます。

関連情報

計画立案アイテムの書き込みスキルを使用して計画立案アイテムのコンテンツを絞り込む

戦略的計画ワークスペースの [製品アイデア]、[デマンド]、[エピック]、[プロジェクト]、[ケイパビリティ]、[機能]、および [ストーリー] フォームの説明フィールドで AI 支援によるテキストの絞り込みを有効にすることで、レコード品質を向上させます。プロダクトマネージャーとアジャイルユーザーが、[詳細 (Elaborate)] オプションと [短縮 (Shorten)] オプションを使用して計画立案アイテムのコンテンツを効率的に調整し、十分な情報を含む計画立案アイテムを作成できるようにします。

始める前に

計画立案アイテムの作成スキルがアクティブであることを確認します。

このスキルへのアクセスを必要とするカスタムロールを持つユーザーがいる場合は、それらのロールの ACL を更新し、それらのカスタムロールを製品内ロールに追加する必要があります。

必要なロール

sn_align_core.apw_user、sn_apw_advanced.pf_user、sn_apw_advanced.eap_user

このタスクについて

製品アイデア、デマンド、エピック、プロジェクト、ケイパビリティ、機能、ストーリーなどの戦略的計画作業アイテムの説明の改善に手作業で費やす時間を短縮します。これらの作業アイテムの説明フィールド内で、[Now Assist で絞り込む (Refine with Now Assist)] メニューを使用して、テキストを短くしたり、詳細にしたりします。

計画立案アイテムの作成スキルは、作業アイテムの明確さと完全性を向上させ、計画立案アイテム情報の欠落や不明瞭さによるやり直しを減らすのに役立ちます。


スキルは、計画立案アイテムの説明フィールドを使用してコンテンツの推奨事項を提供します。ストーリーのコンテンツを絞り込むとき、計画立案アイテムの作成スキルでは、説明フィールドと受け入れ基準フィールドが考慮されます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース.
2. 製品アイデア、デマンド、エピック、プロジェクト、ケイパビリティ、機能、ストーリーなどの計画立案アイテムを開きます。
3. 説明フィールドから **[Now Assist** で絞り込む] メニューを選択し、要件に基づいて [短縮] または [詳細] を選択します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



説明フィールドから **[Now Assist** で絞り込む] メニューに直接アクセスするには、フィールドをシングルクリックします。

4. [置換] を選択して、説明フィールドの内容を置き換えます。



5. オプション: [Now Assist で絞り込み] ウィンドウで、[絞り込み] を選択し、[短縮] または [詳細] を選択して、生成されたテキストを改善します。
6. 計画立案アイテムのコンテンツの要約が完了したら、既存のコンテンツを生成されたコンテンツに置き換えたり、フィードバックを提供、コピー、または情報を表示したりできます。

関連情報

- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の探索
- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成
- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist のスキルの入力

SPM の Now Assistの参照

とともにインストールされるテーブル、ロール、およびプロパティに関する追加情報を提供するための参照情報 SPM の Now Assist。

関連情報

- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の探索
- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成
- での AI エージェントエージェントワークフローの使用 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist
- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の使用

Email プロジェクトサマリースキルに関する追加情報

列制限、日付基準など、プロジェクトサマリーメールスキルに関する追加情報を表示します。

列の制限

各テーブルのプロジェクトサマリーを生成するために考慮される列を次の表に示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブルの列制限

テーブル	列
プロジェクト管理	• 状況 • 簡単な説明 • ステータス • 開始予定日 • 終了予定日 • プロジェクトレベル EAC (EAC) • プロジェクト予算 • 完了率 (%)
マイルストーン	• 簡単な説明 • 状況 • ステータス • 開始予定日 • 終了予定日 • マイルストーン • 主要マイルストーン
プロジェクトタスク	• 簡単な説明 • 状況 • ステータス • 開始予定日 • 終了予定日
リソースのアサイン	• リソース • 開始日 • 終了日 • リソースステータス • グループ • ロール • スキル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

日付選択基準

- マイルストーンの開始予定日または終了予定日は、スナップショットと同じ月である必要があります。
- リソースのアサインの開始予定日または終了日は、スナップショットと同じ月である必要があります。
- プロジェクトタスクの開始予定日または終了予定日は、スナップショットと同じ月である必要があります。

メールをスケジュールするためのメール頻度基準

- メールは定期的に送信されるようにスケジュールされています。
- メールは、プロセスが一時停止されるまで一貫して送信されます。
- 一時停止を解除すると、次のスケジュールされた間隔で次のメールが送信されて、ケイデンスが再開されます。
- 新しいスナップショットは、周期の変更時または一時停止解除時に作成されます。

コラボレーションワーク管理

ServiceNow® コラボレーションワーク管理 (CWM) は、チームとの作業を計画、可視化、管理、および共同作業するための中心的なハブを提供します。作業の進捗状況と目標を管理するための複数のツールの切り替えを回避することで、時間を節約し、チームの効率性を向上させます。

https://player.vimeo.com/video/1053272151?h=a540ca0fa9&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479


CWM を使用すると、タスクを詳細に計画し、予定外の作業とそのリソースを整理し、部門横断型チームとコラボレーションを行うことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


開始

探索

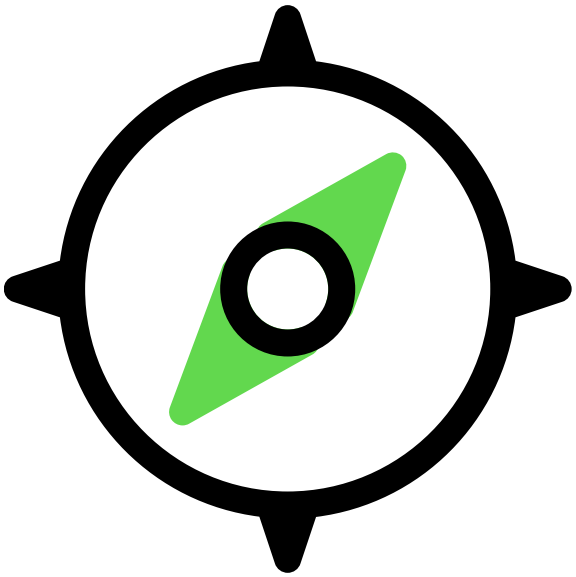

の主な機能とビジネス価値について説明します。 CWM

構成

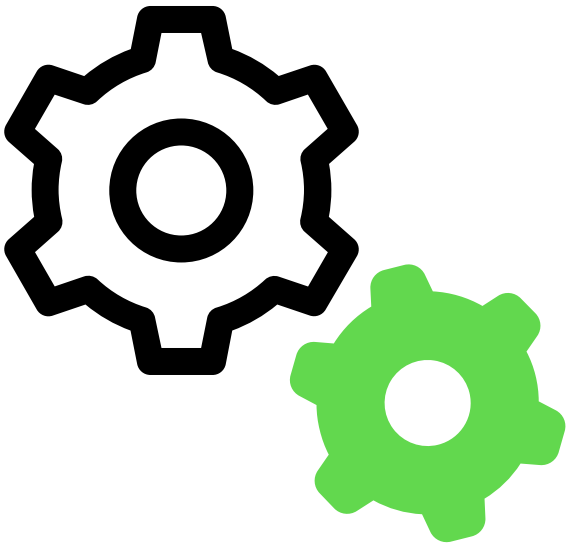


CWM の設定

使用方法



CWM との作業でのコラボレーションを開始

参照

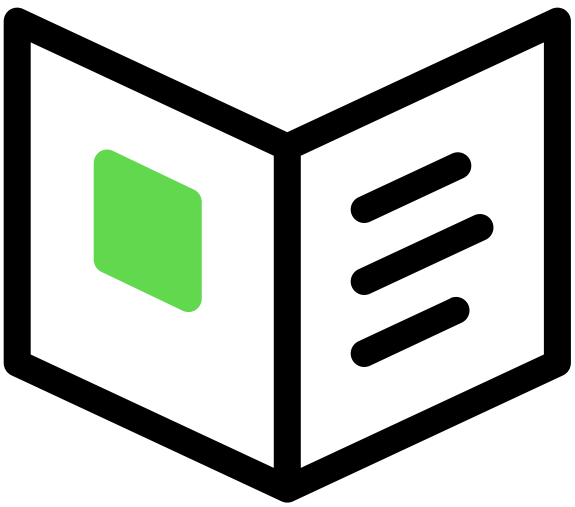

CWM のロール、テーブル、およびシステムプロパティについて説明します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トラブルシューティングとサポート

- で質問や回答をする 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) フォーラム ServiceNow コミュニティ .
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する 。
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート .

コラボレーションワーク管理 の探索

コラボレーションワーク管理 (CWM) の詳細およびそれがチームにもたらすメリットについて説明します。

コラボレーションワーク管理の概要

CWM は、共同作業スペースを使用して自分とチームにアサインされたタスクを整理および管理できる業界にとらわれない作業管理ツールです。異なるアプリケーション間で切り替えることなく、1 つの場所から作業を管理し、価値を追跡できます。

CWM では、次のことができます。

- 共有スペースを使用してリアルタイムで共同作業できます。
- カスタマイズ可能なボードを使用して、チームが柔軟な方法で作業できるようにします。
- 計画された作業をアジャイル手法で実行するか、スプリント計画を使用するか、カスタム管理で実行するかを選択します。
- 個人作業タスク、チームタスク、またはその他のアイテムのリストなど、あらゆるタイプの作業をセントラルワークスペースから調整および管理します。
- リアルタイムのコラボレーションを可能にするリッチテキストドキュメントを作成することで、必要なすべてのドキュメントをスペース内で直接管理します。
- ポートフォリオ計画でボードの優先順位付けとロードマップを作成できる戦略的計画ワークスペースに接続します。
- ボード上のすべての作業をビジネスゴールに結び付けることで、チームの仕事がもたらす価値を理解できます。
- インシデント、リスク、問題などのあらゆる作業を ServiceNow AI Platform から参照します。

コラボレーションワーク管理 のメリット

メリット	機能
スペースを作成し、チームの他のユーザーと共有して、チームの作業を調整および管理します。スペース内では、タスクを管理するための「ボード」を無制限に作成し、それらのタスクに関するドキュメントを管理するための「ドキュメント」を作成できます。 [自分のスペース **(My space)**] を個人用スペースとして使用し、自分にアサインされた作業を管理します。	スペース
admin ユーザーの関与なしに柔軟なワークスペースをビルドします。独自のワークフローを定義し、必要に合わせて作業を調整できます。	ボード

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メリット	機能
• タスクレコードのカスタムフィールドを作成します。 • リストビュー、ガントビュー、カンバンビューを切り替えます。 • カスタム作業アイテムタイプを作成します。 • タスクに他のアサイニーのリストを追加します。	
特定の条件が満たされた場合に、通知の送信、タスクの再割り当て、タスクの優先順位の更新などのプロセスを自動化することで、効率性を高め、時間を節約します。	自動化
会議メモ、技術仕様、機能要件などのさまざまな種類のドキュメントを 1 か所から管理し、複数の連結されていないツールの使用を回避します。 • リッチテキストドキュメントを作成し、チーム内外のユーザーにアクションアイテムを追加します。 • 複数の同時編集者とリアルタイムでドキュメントを共同編集します。	ドキュメント
ボードの好みのデータビューを保存するか、共有ビューを作成して、セッション全体およびチーム全体で一貫したエクスペリエンスを確保します。	ボードビュー
時間を節約し、形式の不整合を減らし、事前定義されたテンプレートを使用して繰り返し可能なボードとドキュメントを作成するを回避します。	ボードとドキュメントのテンプレート
CWMボードでスプリント計画立案を使用して、アジャイル手法でチームのストーリーやその他の作業アイテムを計画、追跡、管理します。	でのスプリント計画立案 CWM
複数の ServiceNow AI Platform アプリケーションにまたがる作業アイテムを 1 つの CWM ボードに接続することで、一元化されたビューですべての作業を計画および管理できるようにします。	でのコネクテッドワーク CWM
ボードを CSV または Microsoft Excel ファイルにエクスポートして、タスクデータをオフラインで使用してインサイトを取得し、ステークホルダーと共有し、分析やプレゼンテーションの準備をします。	ボードを CSV または Excel としてエクスポート
ドキュメントをオフラインで使用し、ドキュメントを PDF としてエクスポートして CWM 外のチームやステークホルダーと共有します。	ドキュメントを PDF としてエクスポート
戦略的計画ワークスペースのポートフォリオ計画でボードに優先順位を付けてロードマップを作成します。	戦略的計画または CWMの接続ポートフォリオ計画

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メリット	機能
組織、プロジェクトポートフォリオ、および戦略的投資の各レンズは、計画立案アイテムとして CWM ボードをサポートします。	
インシデント、リスク、問題など、他の ServiceNow AI Platform レコードへの参照を CWM ドキュメントに追加します。	他のものとの統合 ServiceNow AI Platform 可能にします


CWM の [自分の作業]

コラボレーションワーク管理ワークスペースの一元化されたビューから、CWM タスク、プロジェクトタスク、RIDAC アイテム、アジャイルストーリーなどのすべての作業を管理します。

CWM の [自分の作業] では、 CWM ワークスペースと 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) ワークスペース全体のすべてのタスクを統合し、ステータス、優先度、および未解決で期限切れのアイテムなどの主要メトリクスによるタスクのグループ化など、作業に関する可視化を提供します。

[自分の作業] のタスクには、[アサイン先] または [追加担当者] フィールドに追加されたすべての作業アイテムが含まれます。

[自分の作業] の [概要] タブ

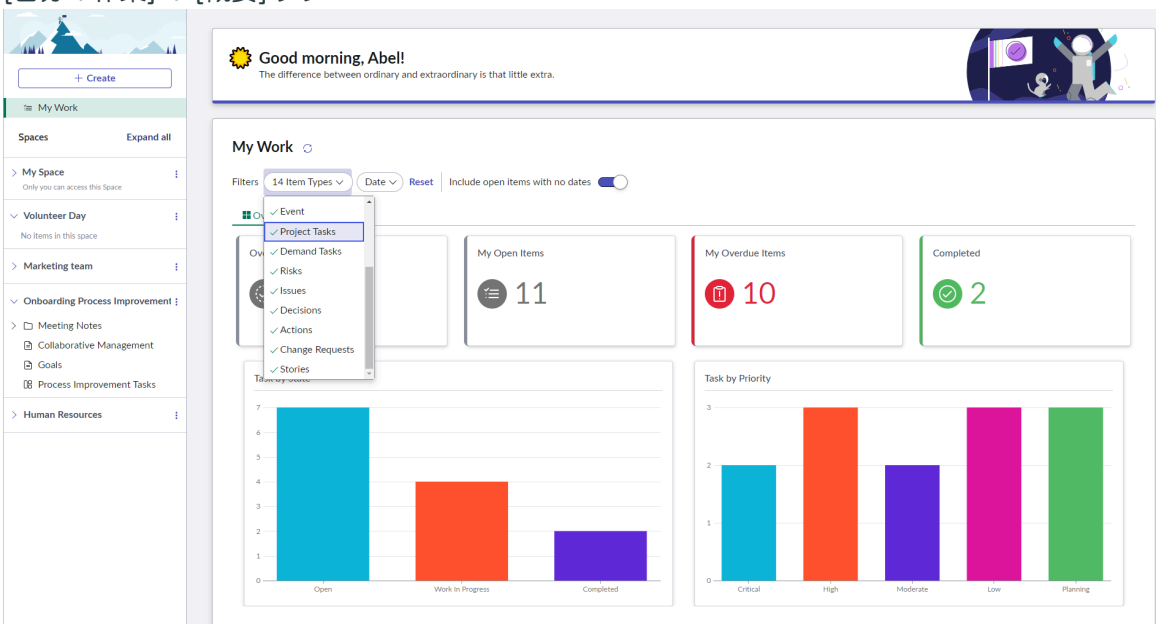

[自分の作業] ページには、[概要] と [リスト] の 2 つのビューがあります。

- [概要] タブには、作業の進捗状況に関連する情報を提供する複数のウィジェットが表示されます。また、表示するタスクのタイプにフィルターを適用することもできます。
- [リスト] タブには、自分にアサインされているすべてのオープン作業アイテムがリスト形式またはグリッド形式で表示され、列にグループ化とフィルターのオプションを適用できます。

  リストビューには、作業アイテムのソースに戻るリンクも用意されています。たとえば、作業アイテムがリスクの場合、リストビューの [ソース] 列は、プロジェクトワークスペース アプリケーションの [RIDAC] ページへのナビゲーションを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CWM の [自分の作業] ページの [概要] タブ

ウィジェットまたはオプション	説明
全体の進行状況	作業完了率
自分の開いたアイテム	処理待ちの作業アイテムの数。 数字をクリックすると、自分にアサインされていて [処理待ち] ステータスであるすべての作業アイテムのリストビューが開きます。
期限切れのアイテム	期限切れの作業アイテムの数。 数字をクリックすると、自分にアサインされていて期限切れであるすべての作業アイテムのリストビューが開きます。
完了	完了した作業アイテムの数。 数字をクリックすると、自分にアサインされていて [完了してクローズ] ステータスであるすべての作業アイテムのリストビューが開きます。
ステータス別のタスク	自分にアサインされているすべての作業アイテムを現在の状態別にグループ化した棒グラフ。バーをクリックすると、対応するバーのフィルター基準を満たすタスクのリストが開きます。 タスクをステータス別にグループ化する方法の詳細については、「CWM My Work のステータスレポートでのタスクのグループ化」を参照してください。
優先度別のタスク	自分にアサインされているすべての作業アイテムを優先度別にグループ化した棒グラフ。バーをクリックすると、対応するバーのフィルター基準を満たすタスクのリストが開きます。 タスクを優先度別にグループ化する方法の詳細については、「CWM My Work のステータスレポートでのタスクのグループ化」を参照してください。
フィルター	[自分の作業] に表示する作業アイテムのタイプを選択します。ServiceNow インスタンスにインストールされている SPM アプリケーションに基づいて、次のタイプから選択できます。 • CWM タスク • プロジェクトタスク • デマンドタスク • リスク • 問題 • 決定

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CWM の [自分の作業] ページの [概要] タブ (続く)

ウィジェットまたはオプション	説明
	• ACTIONS (アクション) • 変更要求 • ストーリー • スクラムタスク
日付	タスクを開始日と終了日でフィルタリングします。
日付のないオープンアイテムを含める (Include open items with no dates)	開始日、終了日、またはその両方がない作業アイテムの表示を有効にします。

- [追加担当者] フィールドが自分の名前に設定されている CWM タスクまたはプロジェクトタスクも表示されます。
- [担当者] または [リソースのアサイン先] フィールドから自分にアサインされたプロジェクトタスクが表示されます。

[自分の作業] の [リスト] タブ

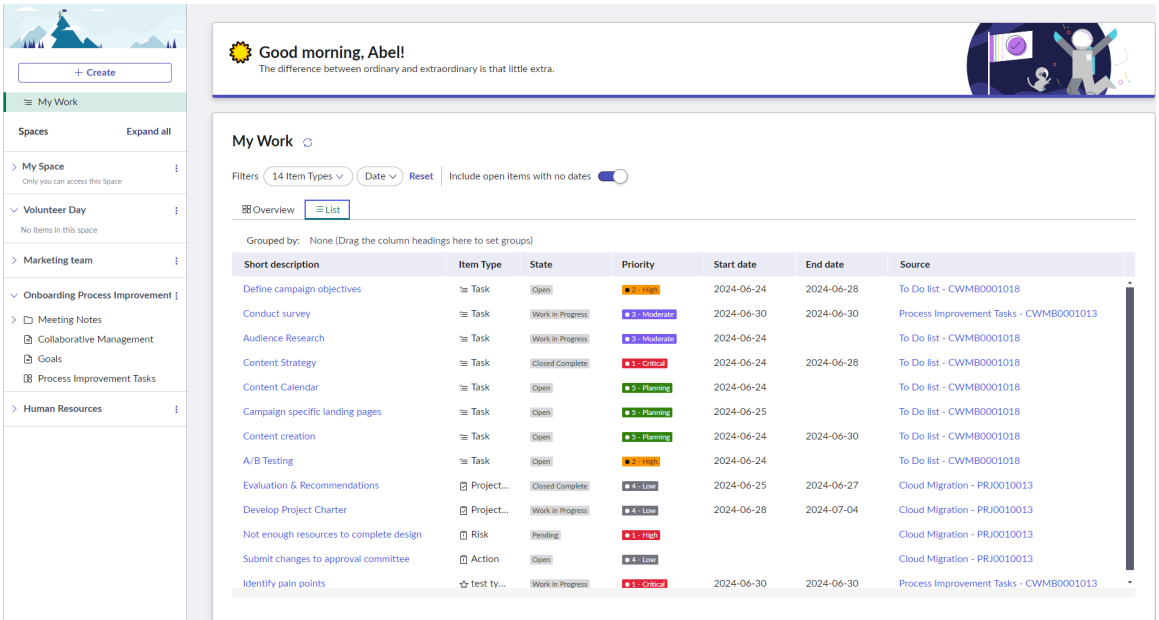

リストビューには、自分にアサインされているすべてのオープン作業アイテムが表示されます。作業アイテムの [簡単な説明] をクリックすると、その詳細がモーダルポップアップに表示されます。作業アイテムの [ソース] をクリックすると、作業アイテムが新しいタブで開きます。

注:
接続された作業アイテムは、ストーリー、プロジェクトタスク、デマンドタスク、または RIDAC レコードでない限り、[自分の作業] ページに表示されません。

コラボレーションワーク管理の構成

チームがコラボレーションワーク管理を実装する方法を計画および構成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

構成の概要

コラボレーションワーク管理 をセットアップするプロセスの指針として、次のステップを使用してください。ステップ 3 ～ 5 はオプションであり、ServiceNow AI Platform との CWM エクスペリエンスをより密接にする追加の構成オプションを提供します。

1. コラボレーションワーク管理 のインストール。
2. 関連するユーザーに CWM ロールをアサインします。「コラボレーションワーク管理 とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
3. 優先順位付け、ロードマップ、および目標の CWM ボードを含めるように戦略的計画を設定します。「戦略的計画または CWMの接続ポートフォリオ計画」を参照してください。
4. ドキュメントで参照できる他の ServiceNow AI Platform テーブルを追加します。

   「CWM ドキュメントの ServiceNow AI Platform レコードの有効化」を参照してください。
5. CWM 以外のユーザーが CWM ワークスペースへのアクセスを要求できるように、[アクセスの要求] ボタンを有効にします。

   「コラボレーションワーク管理とともにインストールされるプロパティ」を参照してください。

コラボレーションワーク管理 のインストール

admin ロールを持っている場合は、コラボレーションワーク管理 (CWM) アプリケーション (com.snc.cwm) をインストールできます。このアプリケーションには、デモデータが含まれています。まだインストールされていない場合は、関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインをインストールします。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション.
- 依存関係、ライセンスやサブスクリプションの要件、およびリリースの互換性については、ServiceNow Store の「Collaborative Work Management (コラボレーションワーク管理)」アプリケーションリストを確認してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

コラボレーションワーク管理 とともに次のアイテムがインストールされます。

- ロール
- テーブル
- システムプロパティ

詳細については、「コラボレーションワーク管理 とともにインストールされるコンポーネント」と「コラボレーションワーク管理とともにインストールされるプロパティ」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して、コラボレーションワーク管理 アプリケーション (com.snc.cwm) を検索します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前または ID (com.snc.cwm) でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることがあります。

[インストール] ボタンの横のリストに、使用可能なバージョンが表示されます。

3. リストからバージョンを選択し、[インストール] を選択します。

表示される [インストールの詳細を確認] ダイアログボックスに、アプリケーションとともにインストールされている依存関係が一覧表示されます。

4. プロンプトが表示された場合は、ServiceNow Store へのリンクに従って、依存関係のエンタイトルメントを取得します。
5. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。
デモデータは、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードです。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。
6. **[Install** (インストール)] を選択します。

戦略的計画または **CWM**の接続ポートフォリオ計画

ポートフォリオ計画で目標を計画、ロードマップ、およびボードに関連付けることができるように、CWMボードを含めるように戦略的計画またはポートフォリオ計画を構成します。

CWM ボードをレンズ構成に追加すると、ポートフォリオ計画の [優先順位付け]、[ロードマップ]、および [目標] ページで計画立案アイテムとしてボードにアクセスできます。

注:
この機能を使用するには、ServiceNow Store から 戦略的計画 または ポートフォリオ計画 アプリケーションをインストールする必要があります。

戦略的計画 または ポートフォリオ計画 で CWM ボードを使用した計画を正常に有効にするには、次のタスクを完了します。

CWMボードをレンズ構成に追加

ポートフォリオ計画のビルドに使用するレンズについて、構成を更新して、 戦略的計画 または ポートフォリオ計画に計画立案アイテムとして CWM ボードを含めます。

始める前に
必要なロール：admin

インスタンスのアプリケーションスコープが [ポートフォリオ計画コア **(Portfolio Planning Core)]** に設定されていることを確認します。


このタスクについて
すべてのデフォルトのレンズは、計画立案アイテムとして CWM ボードをサポートしています。たとえば、組織レンズを使用してポートフォリオ計画を構築している場合は、組織レンズ構成で CWM ボードを計画立案アイテムとして追加できます。

手順

1. 移動先 すべて > 戦略的計画 > レンズ.
2. レンズを選択します。
3. 計画立案アイテムの [利用可能] リストから、 **CWM** ボード を [選択済み] リストに移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



注:
[利用可能] リストに CWM ボードが表示されない場合は、システムプロパティ *sn_align_core.planning_item_types_allow_list* を更新して許可します。

4. [更新] を選択します。

次のタスク
CWMボードフォームレイアウトの設定。

CWMボードフォームレイアウトの設定

[レンズエンティティ] フィールドを [CWM ボード] フォームに追加して、ユーザーがボードをリンクし、 戦略的計画 または ポートフォリオ計画 ワークスペースの適切なポートフォリオ計画に表示できるようにします。

始める前に
必要なロール：admin

インスタンスのアプリケーションスコープが [コラボレーションワーク管理] に設定されていることを確認します。

このタスクについて
CWMボードフォームにレンズエンティティのフィールドを含めます。これにより、 CWM ユーザーは自分のボードをレンズエンティティにリンクして、対応するポートフォリオ計画にボードが表示されるようにすることができます。たとえば、プロジェクトポートフォリオレンズを使用して、テクノロジーポートフォリオのポートフォリオ計画を作成できます。CWMユーザーがボードをテクノロジーポートフォリオに関連付けると、それらのボードがテクノロジーポートフォリオのポートフォリオ計画に自動的に表示されます。


同様に、ボードを目標またはポートフォリオに関連付けることができます。CWMユーザーがこの関連付けを実行できるようにするには、これらのフィールドを含めるようにボードフォームを設定します。

手順

1. 移動先 システム定義 > テーブル.
2. テーブルのリストから、[**sn_cwm_board**] を検索して選択します。
3. [関連リンク] セクションから、[レイアウトフォーム] を選択します。
4. [利用可能] セクションのフィールドリストから、目的のフィールドを [選択済み] セクションに移動します。
   たとえば、[ポートフォリオ] フィールドを [選択済み] セクションに移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

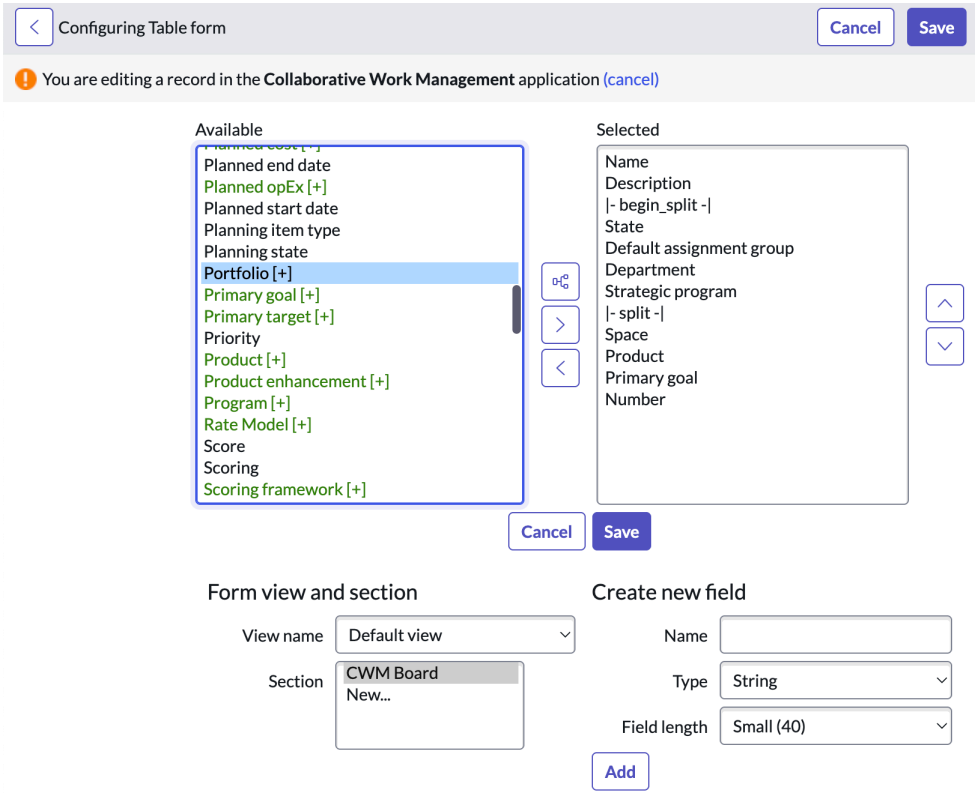

5. CWM ボードフォームに追加する他のフィールドに対して、この手順を繰り返します。

6. **[Save** (保存)] を選択します。

タスクの結果

CWM ボードフォームに、レイアウトに追加された新しいフィールドが表示されるようになりました。

CWM ユーザーは、これらのボードを表示するポートフォリオ計画に応じて、部門、ポートフォリオ、またはプライマリ目標の詳細を追加できます。

次のタスク

ボードをポートフォリオ計画エンティティに関連付ける。

ボードをポートフォリオ計画エンティティに関連付ける

CWMボードをレンズエンティティにリンクして、これらのボードが戦略的計画またはポートフォリオ計画ワークスペースの対応するポートフォリオ計画に表示されるようにします。

始める前に

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順


1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.

2. スペースからボードを選択します。

3. ボードヘッダーから、編集アイコン (

4. ボードフォームで、このボードに関連付ける部門、主要目標、戦略的プログラム、またはポートフォリオを選択します。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

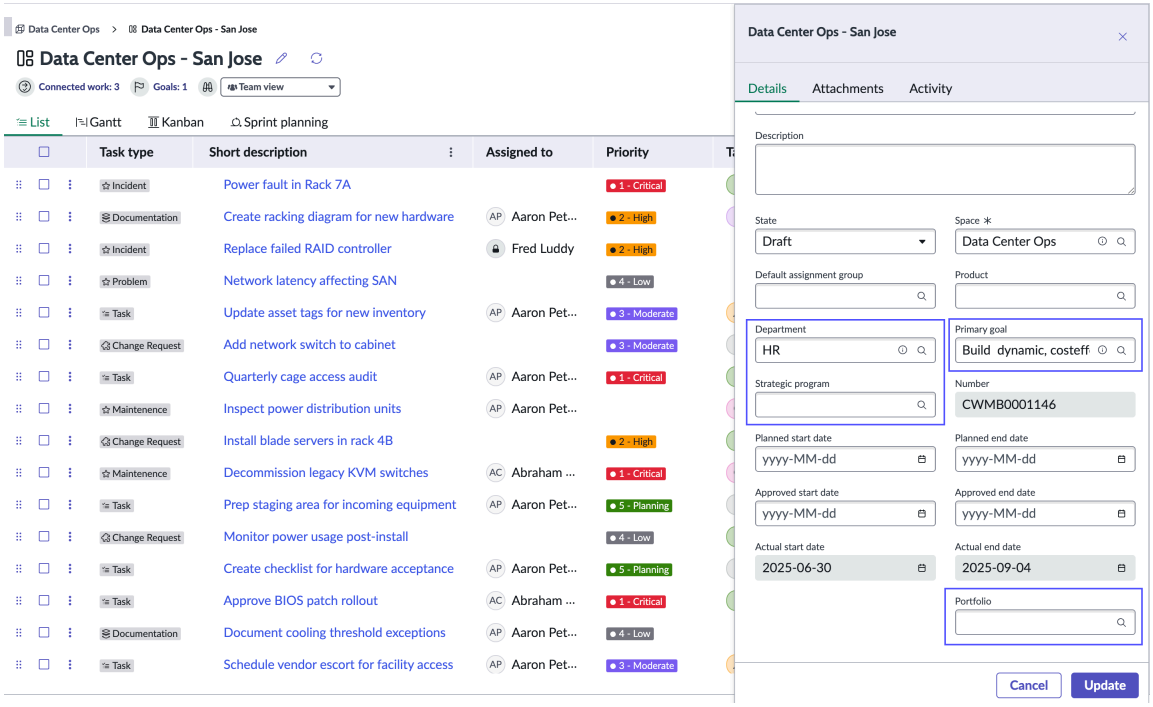

5. [Update (更新)] を選択します。


タスクの結果

- 主要目標が追加された場合、このボードは、戦略的計画ワークスペースで選択した目標の調整作業に表示されます。

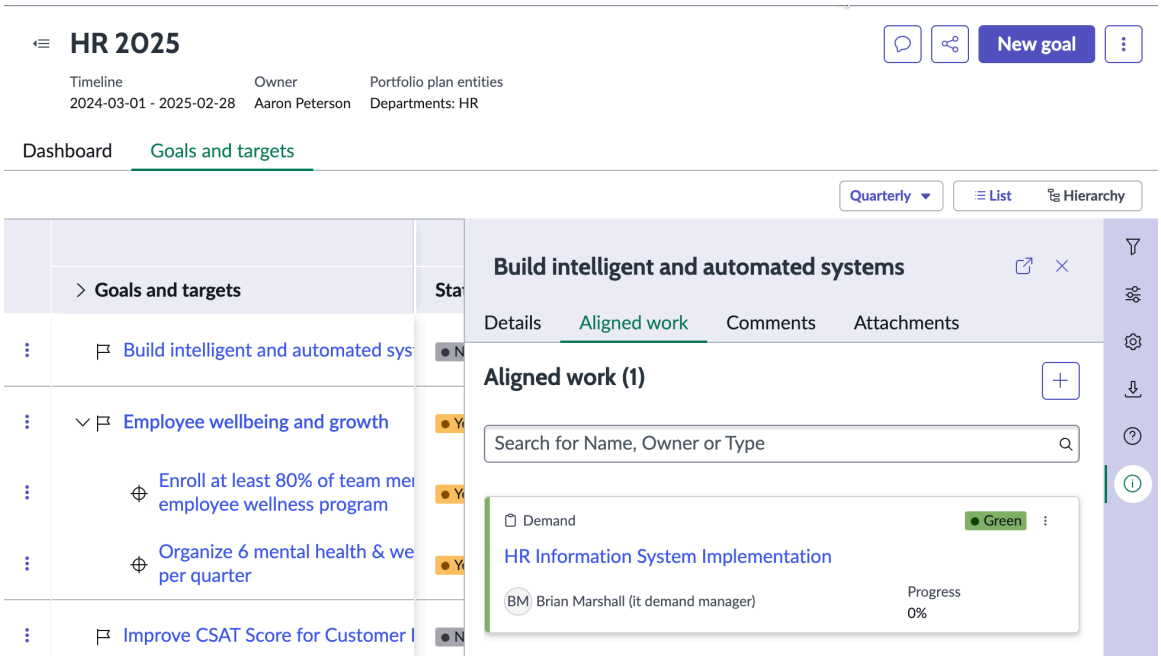


- 部門を追加し、ボードの日付がその部門のポートフォリオ計画と一致する場合、ボードはロードマップに計画立案アイテムとして自動的に表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

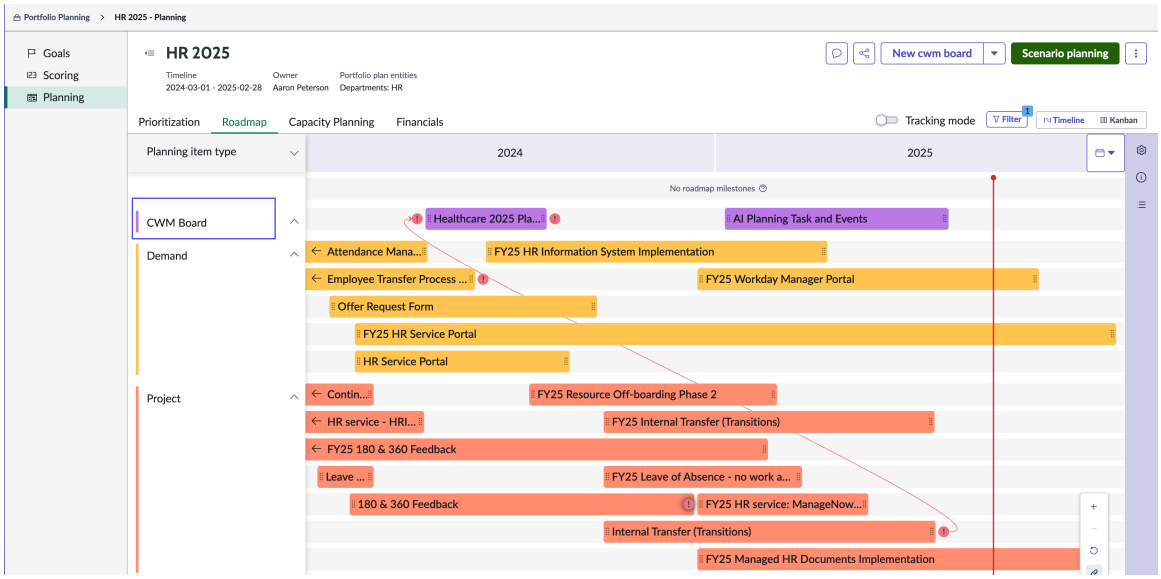

- ポートフォリオが追加され、ボードの日付がポートフォリオ計画と一致している場合、ボードはそのポートフォリオ計画のロードマップに計画立案アイテムとして表示されます。

  CWM ボードに日付が追加されていない場合は、[ロードマップ] サイドパネルで [予定外のアイテム] を確認し、ボードをロードマップに追加できます。

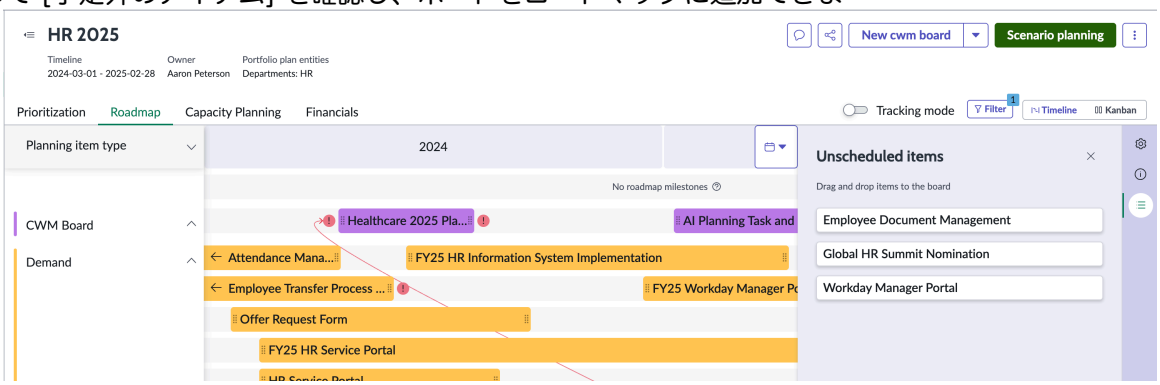

CWM ドキュメントの ServiceNow AI Platform レコードの有効化

CWM ユーザーが CWM ドキュメントで ServiceNow テーブルのレコードへの参照を追加できるようにすることで、ServiceNow AI Platform 間での作業の接続を容易にします。

始める前に
インスタンスの [アプリケーションスコープ] が [コラボレーションワーク管理] に設定されていることを検証します。

必要なロール：admin

このタスクについて
デフォルトでは、*sn_cwm.record_mention_config* プロパティは CWM タスクレコードを含むように構成されています。他の ServiceNow AI Platform レコードを含めるには、このプロパティの [値] フィールドを更新します。

ServiceNow AI Platform レコードを有効にする方法については、このビデオをご覧ください。

CWM で Now Platform レコードを有効にする方法を説明するビデオ。所要時間は約 1 分 4 秒です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. **sys_properties.list** に移動します。
2. [名前] 列で、**sn_cwm.record_mention_config** プロパティを検索して開きます。
3. プロパティの [値] フィールドを更新します。
   CWM ドキュメントのレコードに表示するテーブル名、ラベル、およびフィールドを含めます。たとえば、インシデントテーブルの詳細を含めるとします。[値] フィールドの更新された内容は次のようになります。

```
[{"sourceTable":"sn_cwm_task","label":"CWM Task","fields":["short_description","number"]},
{"sourceTable":"incident","label":"Incident","fields":["short_description","number"]}]
```

4. ステップ 3 を繰り返して、他の ServiceNow テーブルを含めます。
5. [更新] を選択して、プロパティへの変更を保存します。

タスクの結果
プロパティに含まれるテーブルを、任意のスペースの CWM ドキュメントで参照できるようになりました。

コラボレーションワーク管理の使用

コラボレーションワーク管理 (CWM) のさまざまな機能を使用して、組織全体のチームとコラボレーションし、チームが望む方法で作業を管理します。

自動翻訳

CWM での共同作業スペース

チームがプロジェクト、目標、またはアサインに共同で取り組むための共同作業スペースを作成します。

CWM には、自分だけがアクセスできる個人用スペースと、組織内の他のユーザーと共同作業するための共有スペースの 2 種類のスペースが用意されています。


CWMワークスペース内のナビゲーション

ナビゲーションパネル

CWM ナビゲーションパネルは、よりシンプルでクリーンなユーザーインターフェイスを提供します。ナビゲーションパネルには、一度に 1 つのスペースのコンテンツのみが表示されるため、作業中に気を散らすことのないエクスペリエンスが提供されます。

[スペース] メニューを使用して、別のスペースを選択します。さらに、ナビゲーションパネルのサイズを変更したり、完全に折りたたんだりして、ボードやドキュメントの作業領域を拡大することもできます。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

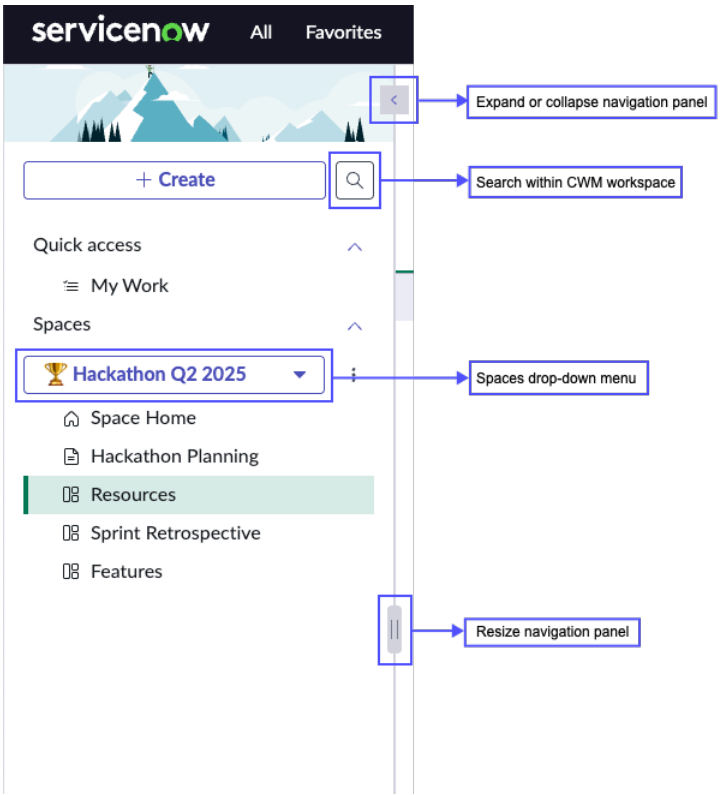

検索

[検索] オプションを使用すると、スペース、ボード、またはドキュメントをすばやく見つけて開くことができます。

また、検索バーには、 CWM ワークスペース内で移動した最近のスペース、ボード、ドキュメントがすべて表示されるため、再度検索しなくても最近のアイテムからすばやく選択できます。

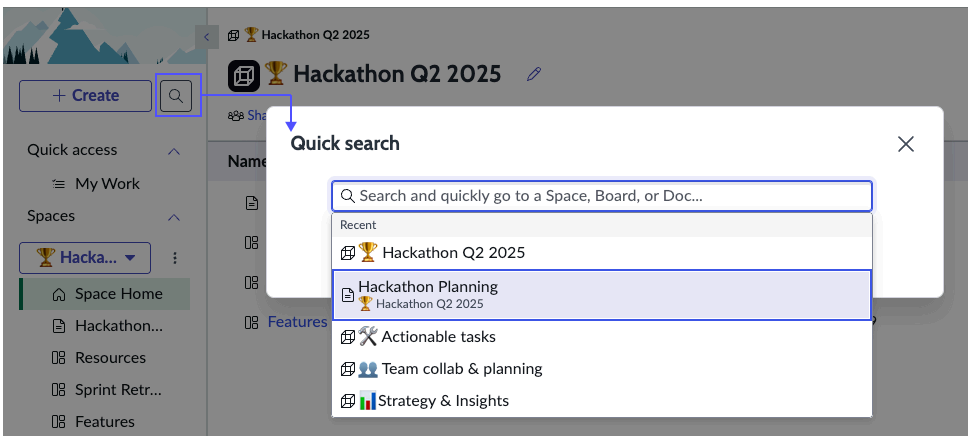

キーボードショートカット

次のキーボードショートカットを使用すると、ワークスペース内ですばやくアクションを実行できます。

のキーボードショートカット **CWM**

アクション	**macOS** ショートカット	**Windows OS** ショートカット
スペース、ボード、またはドキュメントを検索	Option + F	Alt + F

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

のキーボードショートカット **CWM** (続く)

アクション	**macOS** ショートカット	**Windows OS** ショートカット
スペースを作成	Option + S	Alt + S
ボードの作成	Option + B	Alt + B
ドキュメントを作成	Option + D	Alt + D
[自分の作業] に移動	Option + M	Alt + M

自分のスペース

デフォルトでは、スペースとサンプルボードが自動的に作成され、ワークスペースの機能やオプションについて把握できます。個人用スペースから、「**Intro to Docs** (ドキュメントの概要)」および「**Welcome to CWM (CWM** にようこそ)」ドキュメントを参照して、CWM で実行できる操作の概要を確認できます。


タスクボードやドキュメントをさらに作成し、フォルダーに整理して、自分にアサインされた作業を管理します。

共有スペース

スペースとのコラボレーション

共有スペースは、部門横断型チームが共通の目標に向かってコラボレーションするための中心的な場所として機能します。次のメジャーリリースの計画、プレゼンテーションの準備、会議の開催など、タスクボードや共同ドキュメントを使用してさらに多くのことを行います。

ServiceNow AI Platform を介して任意のレコードに接続できるため、情報が複数のアプリに分散したり、予定外のタスクが欠落したりするリスクを回避できます。

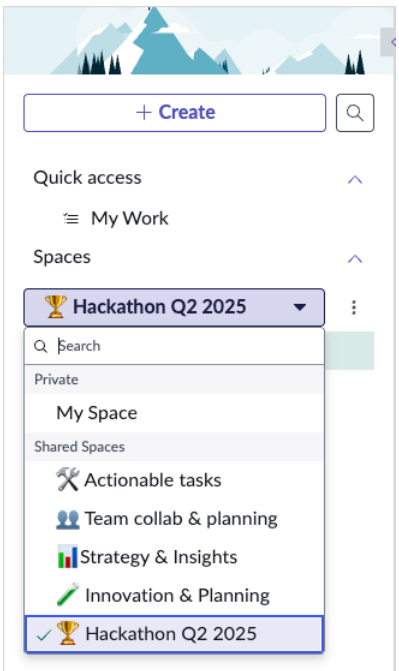


[権限の共有] モーダルでのアクセスの管理

スペースの所有者または編集者は、スペースの既存のユーザーのアクセスを管理し、[権限を共有] モーダルを使用して他のユーザーからのアクセス要求を確認できます。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [アクセス権を持つユーザー] セクション:既存の協力者の編集者、閲覧者、または所有者へのアクセスレベルを管理するか、スペースから削除します。
- [保留中のアクセス] セクション: ユーザーからのリクエストを確認し、スペースへのアクセスを許可するか拒否するかを選択します。

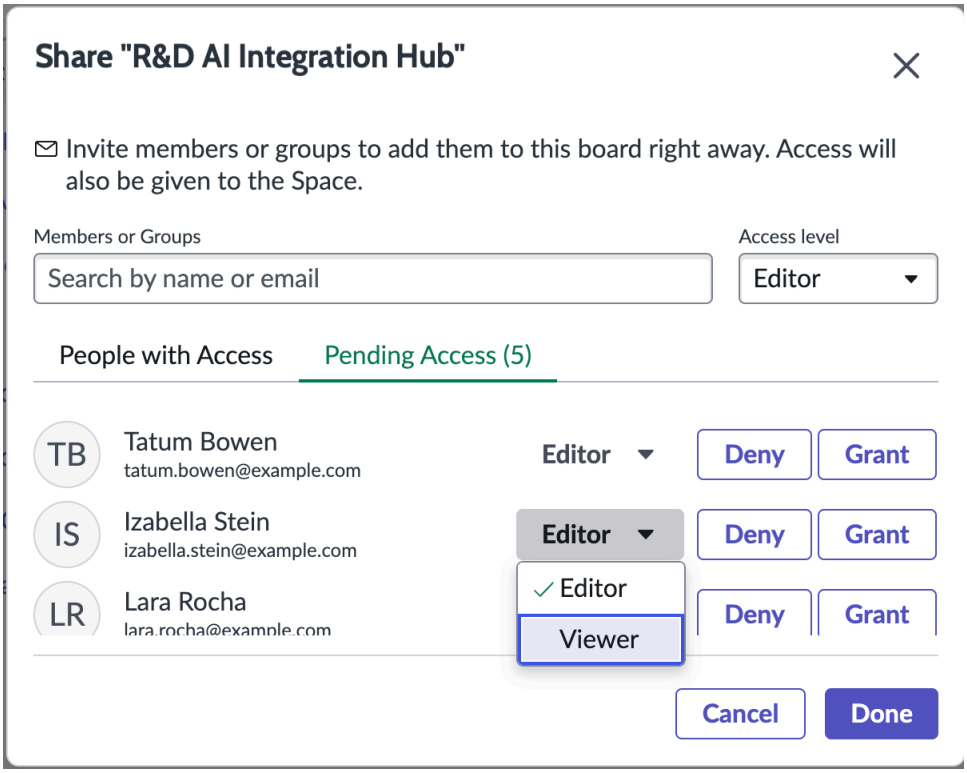

タスクのアサイニーと他のユーザーのスペース権限の管理


スペースの所有者または編集者は、チームメンバーにタスクをアサインするときに、ユーザー名の横にあるロックアイコンを使用して、ワークスペースにアクセスできないユーザーを識別できます。このアイコンは、ボードのリストビューの [アサイン先]、[追加のアサイニー]、[アサイン先グループ] などの [人] タイプの列に表示されます。

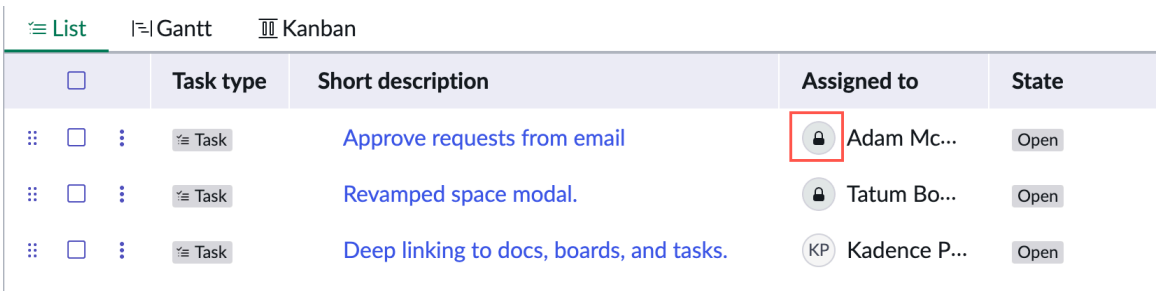

ワークスペースプロンプトを使用してアサイニーに閲覧アクセス権を付与するか、後で [権限を共有 (Share permissions)] モーダルからアクセスレベルを管理することができます。共有権限の管理の詳細については、「 CWMでのスペースの共有と共有権限の管理」を参照してください。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

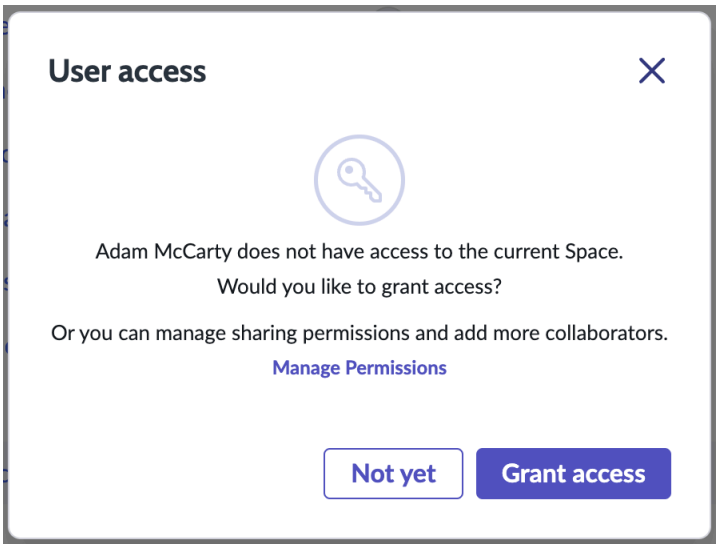

エディターへのユーザーアクセスロールの昇格を要求しています

ボードヘッダーの表示モードインジケーターは、自分がいるスペースに対するビューアーロールのみを持っていることを示します。スペースビューアーは、スペース所有者とエディターに、インジケーターを選択してロールをエディターに昇格する要求を送信できます。



スペース所有者と編集者は、ユーザーにアクセスを許可するか拒否するかを選択できるメール要求を受信します。

次のセクションを使用して、ワークスペースの共有スペースの使用を開始します。

CWM でのスペース作成

コラボレーションワーク管理でスペースを作成して、部門横断型チームが共に作業タスクとドキュメントを管理できるようにします。

始める前に


コラボレーションワーク管理 のインストール。

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. 左側のパネルで、次を選択します + 作成 > 新しいスペース.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

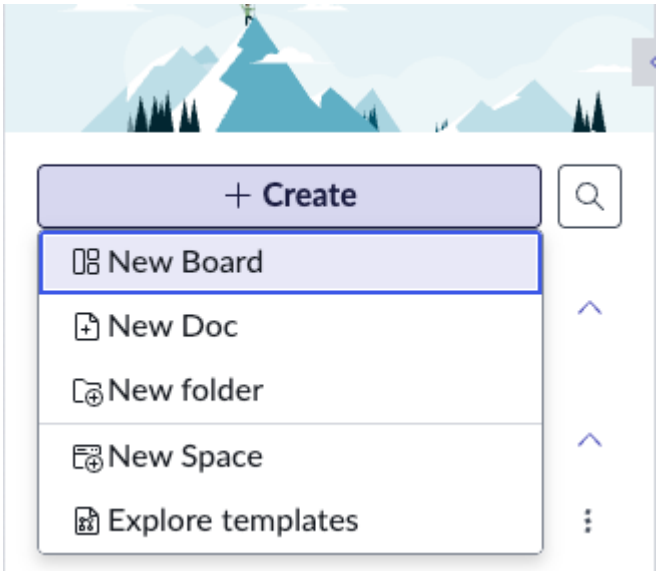

3. [スペース名] フィールドに、スペースの名前を入力します。



4. [作成] を選択します。

タスクの結果

新しいスペースが作成され、[自分のスペース] セクションのすぐ下に追加されます。各プロジェクト、チーム、またはその他のアサインに必要な数のスペースを追加できます。

次のタスク

- ボードを作成して、チームまたはプロジェクトの作業を整理および管理します。「CWM でのボード作成」を参照してください。
- チームの他のメンバーとスペースを共有します。「CWMでのスペースの共有と共有権限の管理」を参照してください。

CWMでのスペースの共有と共有権限の管理

チーム間のメンバーをスペース コラボレーションワーク管理 に招待して、タスクまたはプロジェクトで共同作業を行います。スペースへの既存のアクセス権を持つユーザーの権限を管理することもできます。

始める前に

CWM でのスペース作成。

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

このタスクについて

ユーザーとスペースを共有すると、そのスペース内のすべてのボード、ドキュメント、フォルダーにアクセスできるようになります。スペースまたはボードのヘッダーから [権限を共有 (Share


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

permissions)] モーダルを使用して、チームのスペースに対する共有権限とアクセスレベルを管理します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. 左側のパネルから [スペース] を選択します。




3. スペースのヘッダーから [共有] を選択します。
   自分のスペース はあなただけのものであり、共有することはできません。
4. スペースに新しいユーザーを追加します。

   a. [メンバーまたはグループ] フィールドに、個々のユーザーまたはグループの名前を入力します。

      ユーザーとグループをメールと名前で検索して、適切な協力者を選択できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

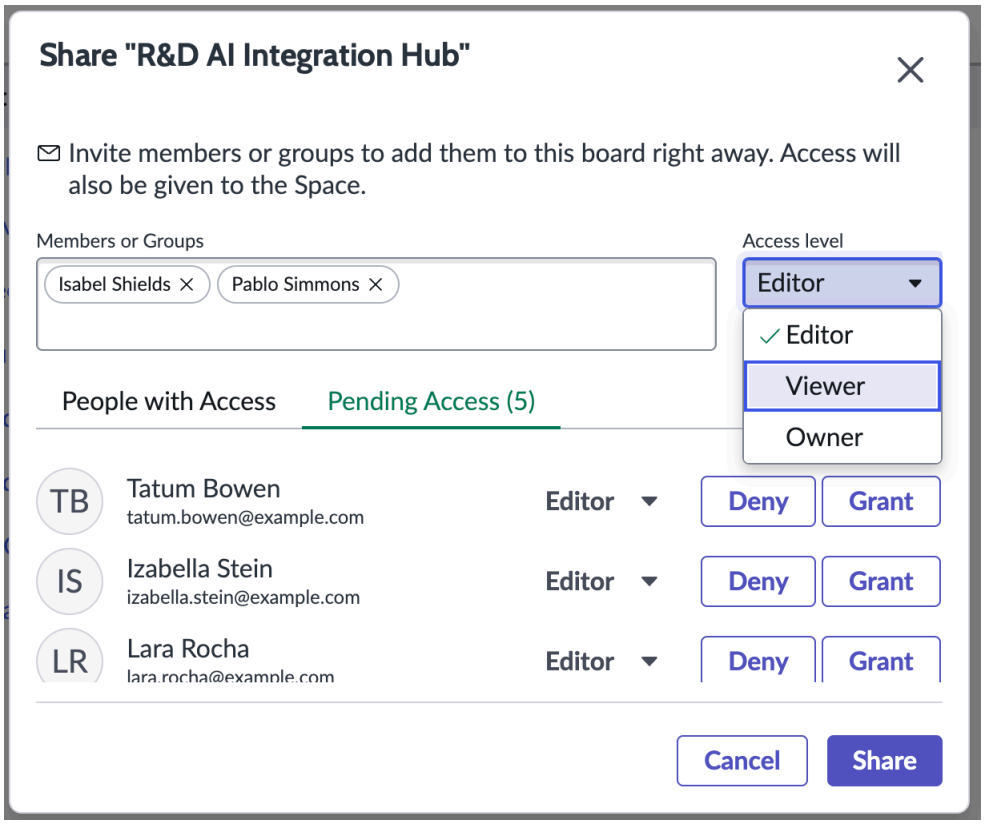

b. [アクセスレベル] フィールドで、これらのユーザーに必要なアクセス権を設定します。

CWM スペースのアクセスレベルのタイプ

アクセスレベル	説明
オーナー	このロールは通常、スペースの作成者にアサインされます。 これらのユーザーには、スペース内のボード、タスク、列、ドキュメントに対する作成、読み取り、更新、および削除アクセス権があります。
エディター	このユーザーには、ボード内のタスクおよびスペース内のドキュメントに対する作成、読み取り、更新、および削除アクセス権があります。ボードを共有できますが、削除することはできません。
ビューアー	スペース内のデータを表示できますが、更新または削除することはできません。


c. [**Share**] を選択します。

5. [アクセス権を持つユーザー] タブで、既存のユーザーのアクセスレベルを変更するか、スペースからユーザーを削除して、権限を管理します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スペースの所有者または編集者は、スペースの既存のユーザーまたは自分自身のアクセス権をいつでも削除できます。閲覧者は、自分のアクセス権のみを削除できます。

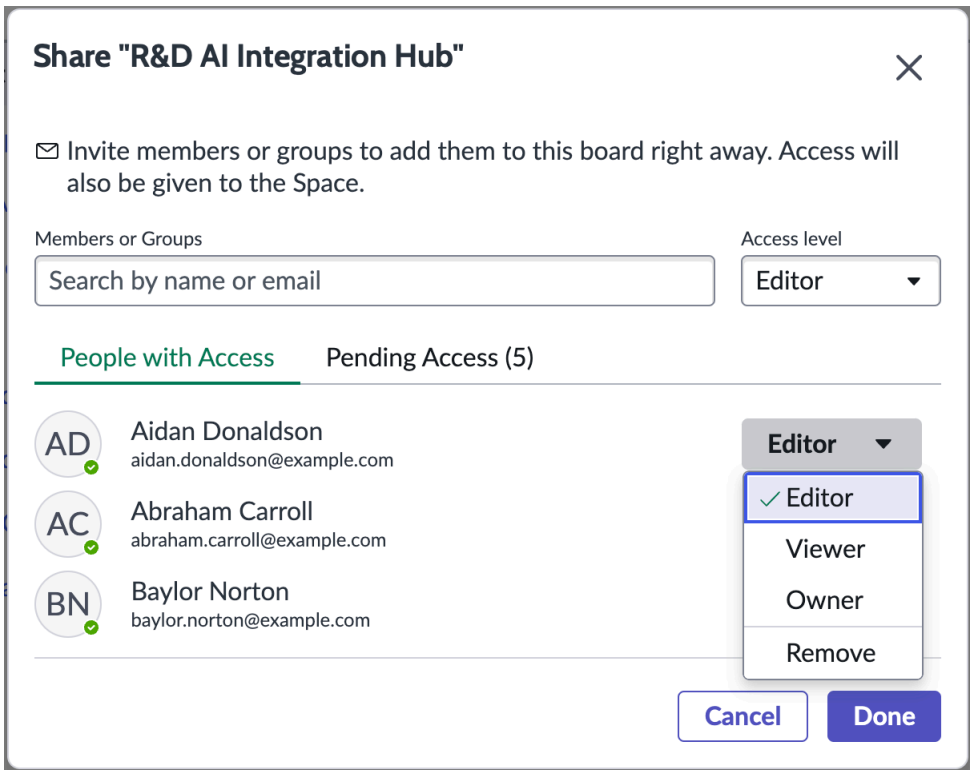

6. [保留中のアクセス] タブでは、スペースへのアクセスを要求したユーザーのリストを確認し、アクセスを許可するか拒否するかを選択できます。

   ユーザーにアクセス権を付与する前に、必要に応じてアクセスレベルを [エディター] または [表示] に変更できます。

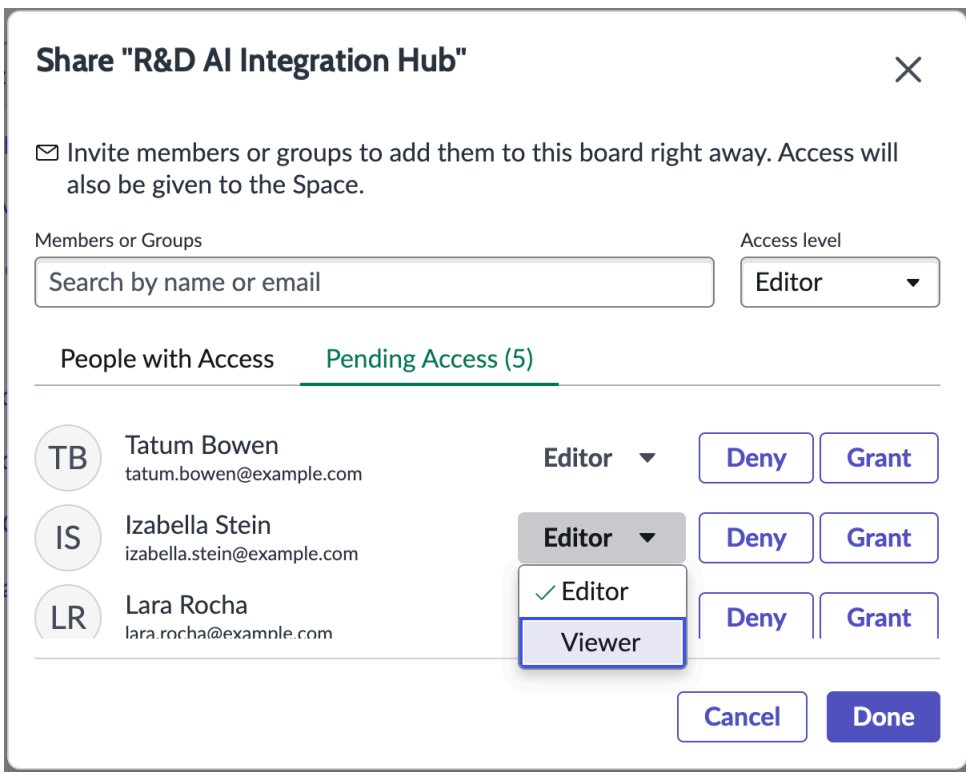

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
このスペースを共有したユーザーに招待メールが送信されます。

次のタスク
ボードを使用してチームのタスクの作業を開始します。「CWM でのボードを使用した作業の管理」を参照してください。

CWM でのフォルダー作成


コラボレーションワーク管理ワークスペースでスペースのボードとドキュメントをフォルダーに整理します。

始める前に
CWM でのスペース作成。

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. フォルダーを作成するスペースを開きます。



3. スペースの [その他のオプション] メニュー ( ) から、[新しいフォルダー] を選択します。
4. [フォルダー名] フィールドに、フォルダーの名前を入力します。
5. [作成] を選択します。


タスクの結果
選択したスペースに新しいフォルダーが作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- この新しいフォルダーにサブフォルダー、ボード、ドキュメントを作成します。
- 既存のボード、ドキュメント、フォルダーをこの新しいフォルダーに移動します。

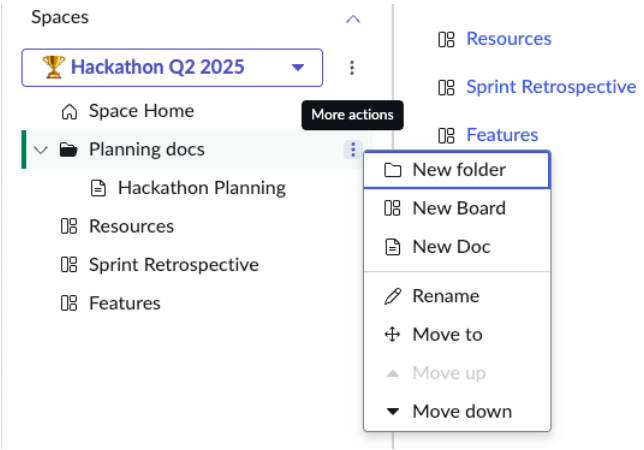

CWM でのボードを使用した作業の管理

コラボレーションワーク管理 でボードを使用してタスクを定義および整理します。リスト、カンバン、ガントなどのビューを使用して、自分とチームの作業方法に基づいてワークスペースを構成します。

https://player.vimeo.com/video/1049444492?h=672bbda3a0&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

次のセクションを使用して、 CWM ワークスペースでボードの使用を開始します。

CWM でのボード作成

チームにアサインされた作業をタスクとして管理し、コラボレーションワーク管理の共有スペースでカスタマイズ可能なボードを使用し、完了まで追跡します。

始める前に
CWM でのスペース作成。


必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順


1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. [スペース] メニューから、ボードを追加するスペースを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

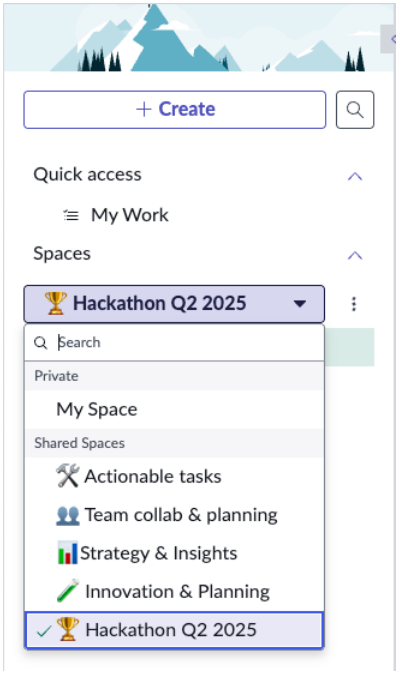

3. スペースの [その他のオプション] メニュー ( ) から、[新しいボード] を選択します。



スペース

4. [ボード名] フィールドに、ボードの名前を入力します。
5. [作成] を選択します。

タスクの結果

選択したスペース内にボードが作成され、ワークスペースに空のボードが表示されます。スペースには、ワークフローの管理方法に基づいて無制限にボードを追加できます。

次のタスク

- ボードにタスクを追加します。「CWM ボードへのタスクの追加」を参照してください。
- ボードヘッダーの編集アイコン ( ) を使用して、ボードの名前を変更または編集します。

CWM におけるボードの複製

既存のボードを複製して、コラボレーションワーク管理ワークスペースで情報を手動でコピーすることなくすべてのタスクと協力者の詳細をコピーすることで、時間を節約できます。

始める前に


CWM でのボード作成。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. ボードがあるスペースに移動します。
3. ボードの [その他のアクション] メニューから、[複製] を選択します。

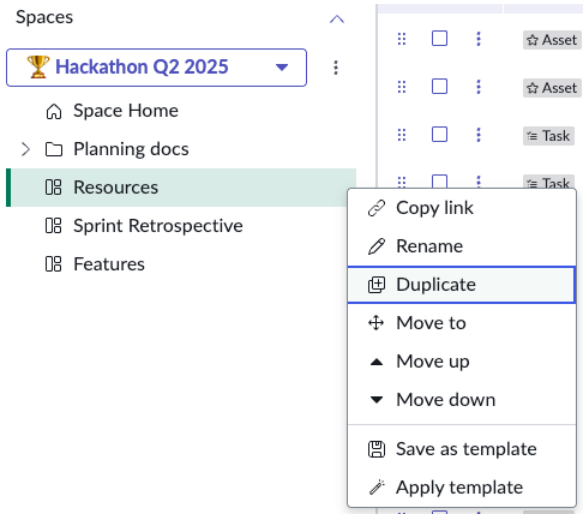

4. [ボード名] フィールドに、新しいボードの名前を入力します。
   デフォルトの名前は、「(コピー) <元のボード名>」という形式です。
5. [複製] を選択します。

タスクの結果

- 新しいボードは、元のボードと同じスペースに追加されます。
- 元のボードがフォルダー内にあった場合、新しいボードは同じフォルダーに追加されます。
- 必要に応じて、別のスペースまたは同じスペース内の別の位置に移動できます。
- コピーされたすべてのタスクの状況は、新しいボードでデフォルト (オープン) 状況にリセットされます。
- すべてのアサイン済みタスクは、未アサインにリセットされます。
- タスクの開始日は、現在の日付にシフトされます。
- 元のボードのカスタム列は、新しいボードにコピーされます。

CWM ボードへのタスクの追加

ボードで作業計画を開始するには、タスクを追加してコラボレーションワーク管理ワークスペースでチームメンバーにアサインします。

始める前に
CWM でのボード作成。


必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、タスクを追加するボードを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. ボードフッターから、**[+** アイテムを追加] を選択します。

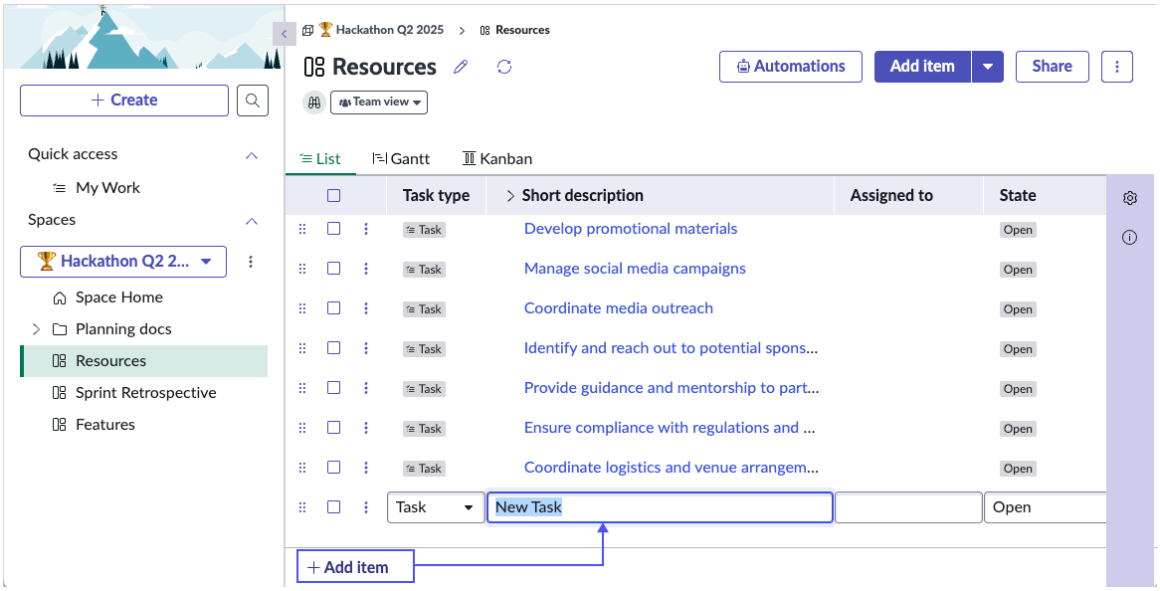


4. [タイプ]、[簡単な説明]、[アサイン先]、[日付] などの詳細を入力します。

CWM で使用できる既定の作業アイテムタイプは、タスクと欠陥です。マイルストーンやイベントなどの他の作業アイテムを作成する場合は、独自のタスクタイプを作成できます。「CWM でのカスタム作業アイテムタイプの作成と管理」を参照してください。

次のタスク

- ボードにタスクをさらに追加し、自分またはチームメンバーにアサインします。
- タスクの情報を編集するには、サイドパネルから簡単な説明をクリックして開くか、セルをダブルクリックしてインライン編集でグリッドから直接編集します。
- ドラッグアンドドロップ機能を使用して、ボード上のタスクを再配置します。
- タスクの行コンテキストメニューから [タスクのコピー] リンク オプションを使用して、URL でタスクを共有します。このようにすると、ユーザーが共有 URL をクリックすると、タスクが属するボードのコンテキストでサイドパネルで開きます。



さらに、タスクの計画と管理を強化するために、次のことができます。

- タスクに追加の列を作成して、他の詳細を追加します。「CWM ボードでのタスクへのカスタム列の追加」を参照してください。
- ボード上のタスクに表示する列を選択します。「CWMボードのリスト、ガント、カンバンの表示をカスタマイズ」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CWM でのカスタム作業アイテムタイプの作成と管理

コラボレーションワーク管理でボードのカスタムアイテムタイプを作成し、ワークフローに関係なく、複数のタイプのタスクを 1 か所から整理および管理できるようにします。

始める前に

CWM でのボード作成。

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

このタスクについて

作業アイテムタイプの作成については、このビデオをご覧ください。

CWM でカスタム作業アイテムタイプを作成するビデオ。所要時間は約 49 秒です。

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. カスタムタスクを追加するボードに移動します。
3. ボード ヘッダーから、その他のアクション アイコン (を選択し、 品目タイプの管理 を選択します。
4. [デフォルトのアイテムタイプ (Default item types)] セクションで、ボードで使用可能にするタスクまたは欠陥を有効または無効にします。
5. [カスタム作業アイテムタイム (Custom work item types)] セクションから、新しいアイテムタイプを追加します。
   a. [新しい項目タイプの追加] を選択します。
   b. [アイテムタイプ名] フィールドに、作業アイテムタイプの名前を入力します。
   c. アイテムタイプを表すアイコンを選択します。
   d. このアイテムタイプをボードで使用可能にする場合、このチェックボックスをオンにします。
   e. **[+** 新しいアイテムタイプの追加 **(Add new item type)]** を選択して、別のアイテムタイプを繰り返し追加します。
6. 必要なすべての作業アイテムタイプを追加したら、[保存] を選択します。

次のタスク

ボードヘッダーの [その他のアクション] メニュー ( ) を使用して、新しいアイテムタイプのタスクをボードに追加します。

CWM ボードでのタスクへのカスタム列の追加

ボードにカスタムフィールドを作成すると、タスクのすべての詳細を 1 か所で整理できるため、システムアドミニストレーターへの依存度が軽減され、タスク管理が改善され、時間を節約できます。

始める前に

CWM でのボード作成。

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

カスタム列を追加するには、スペースへの編集者または所有者のアクセス権が必要です。

このタスクについて

CWMボードのタスクにカスタム列を追加する方法については、このビデオをご覧ください。

CWM ボードでのタスクへの カスタム列の追加に関するビデオ。所要時間は約 1 分 12 秒です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、タスクを追加するボードを選択します。
3. ボードのリストビューで、列ヘッダーから [列の追加] を選択し、データタイプを選択します。
4. [フィールド名] フィールドに、この新しい列の名前とその他の詳細 (求められた場合) を入力します。
   - [タイプ] に [ラベル] または [ドロップダウン] を選択すると、このフィールドのオプションを入力するように求められます。
   - [人] を選択すると、このフィールドで使用できるユーザーのタイプを選択するように求められます。また、このフィールドで単一または複数のユーザーの入力が許可されるように選択します。
   - [参照] を選択すると、タスクへの参照として追加するテーブルを選択するように求められます。
5. [列の追加] を選択します。

タスクの結果
新しい列がタスクに追加され、この列の値の入力を開始できるようになります。

注:
タスクに追加されたカスタム列は、それらが作成されたボードに対してローカルであり、ワークスペース内の他のボードとスペースには適用されません。

このスペースの所有者アクセス権がある場合は、変化する要件に基づいてカスタム列を削除できます。

CWM ボードへの目標の追加

目標をボードに関連付けて、この目標に寄与するすべてのタスクとアクティビティを コラボレーションワーク管理 ワークスペースから直接計画および追跡できるようにします。

始める前に
CWM でのボード作成。

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順


1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、目標を追加するボードを選択します。
3. ボードヘッダーから [編集] アイコン ( ) を選択してボードを編集します。
4. サイドパネルの [ボード] フォームで、[主要目標] フィールドから目標を選択します。
5. **[Update** (更新)] を選択します。

タスクの結果

- CWMワークスペース内:現在のボードは、選択した目標に関連付けられ、[ボードの詳細] ページに表示されます。
- 戦略的計画ワークスペース内：選択した目標が戦略的計画ワークスペース内のポートフォリオ計画の一部である場合、この CWM ボードは計画立案アイテムとして目標に追加されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

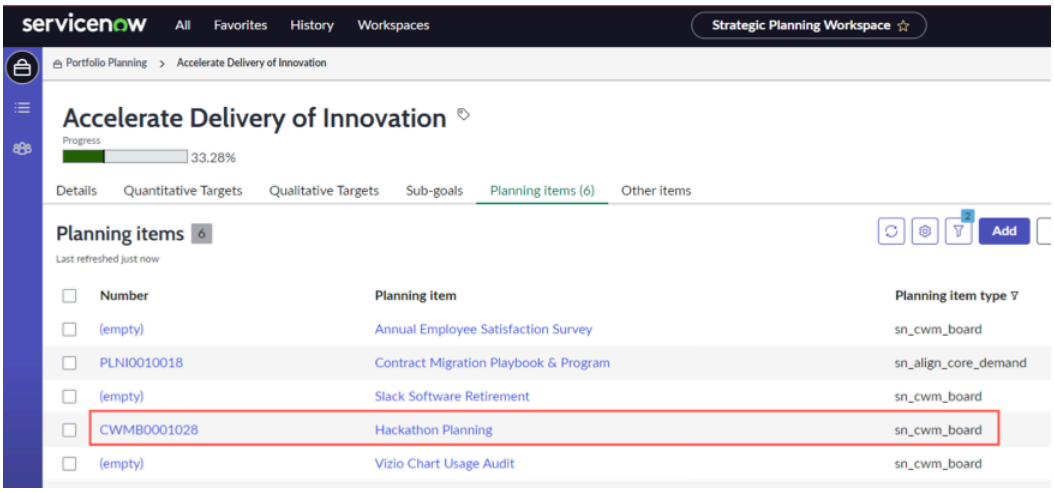

注:
CWM ボードは、ポートフォリオ計画の作成に使用されるレンズの計画立案アイテムとして構成する必要があります。詳細については、「戦略的計画または CWMの接続ポートフォリオ計画」を参照してください。

CWMボードをCSVにエクスポートするか、Microsoft Excel

コラボレーションワーク管理 (CWM) ボードのリストビューを CSV または Microsoft Excel にエクスポートして、データを使用してインサイトを取得し、ステークホルダーと共有し、分析やプレゼンテーションの準備をできるようにします。


始める前に

CWM でのボード作成

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順


1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、エクスポートするボードを選択します。
3. ボード ヘッダーから、その他のオプション アイコン ( ) を選択し、 エクスポート を選択します。



4. [エクスポート] ダイアログで、エクスポートするボードビューとファイルタイプを選択します。
5. **[Export** (エクスポート)] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

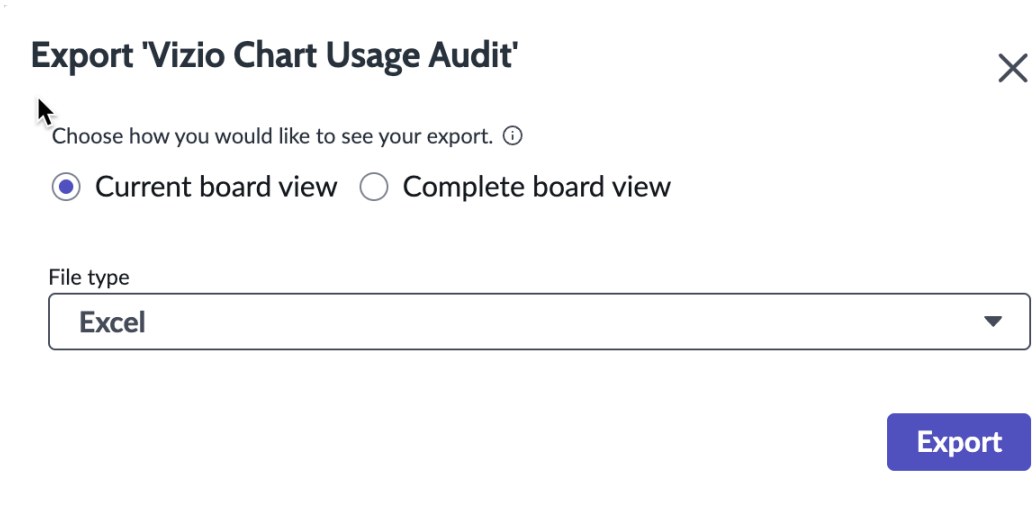

注:
エクスポートされたファイルにはボードからのタスクの階層が保持されず、URL、レコードへの参照、アサインされたユーザーを含むすべてのリンクがプレーンテキストに変換されます。

タスクの結果
ファイルがダウンロードされ、ローカルシステムに保存されます。

のボードビュー **CWM**

コラボレーションワーク管理 (CWM) の対象者と目的に基づいて、列の表示、ソート、フィルタリングなどのボード表示設定をシームレスに作成、カスタマイズ、切り替えます。

https://player.vimeo.com/video/1036476020?h=6a4e66d756&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

ボードビューを使用すると、好みのデータビューを保存したり、共有ビューを作成したりして、セッション全体およびチーム全体で一貫したエクスペリエンスを実現できます。保存された設定には、列の表示、列の順序、ソート、フィルター、表示モード表示、カンバン垂直レーンの選択が含まれます。

ボード表示のカスタマイズ用に複数のビューを作成し、毎回ボード上の列を並べ替えることなく、選択したビューに戻ることができます。ボードビューには他にも次のような利点があります。

- ボードの表示設定を個人用ビューまたは共有ビューとして保存します。
- チーム用の共有ビューを作成して、データを使用するすべてのチームメンバーが同じエクスペリエンスを持つようにします。
- 対象者に適した方法でデータを表示できるように、同じボードに複数のビューを作成します。
- ビューをすばやく切り替えて、対象者が変更されるたびに表示設定を手動で更新する必要がないようにします。
- プロセスの変化に適応するために、ビュー設定をいつでも更新できます。

CWM のボードビューは、個人用と共有に分類できます。

自分のビュー

自分専用のボード表示設定は、[マイビュー] にグループ化されています。複数の個人用ビューを作成し、ワークフローパターンに応じて切り替えることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CWM バージョン 4.0.1 にアップグレードする前にボードに既に適用したディスプレイの個人用設定はすべて、 <自分の名前> のビューという名前で個人用ビューとして保存されます。

共有ビュー

共有ビューは、ボードまたはスペースにアクセスできるすべてのメンバーが利用できます。ボードに複数の共有ビューを作成して、各タイプの対象者に合わせてカスタマイズされたビューを持つことができます。

注:
共有ビューは個人用スペースであるため、[自分のスペース] に作成できません。

共有ビューを含むボードをテンプレートとして保存すると、共有ビューもテンプレートの一部として保存されます。テンプレートの詳細については、「ボードとドキュメント用の CWM のテンプレート」を参照してください。

ボードに対して最後にアクセスしたビューはユーザー設定として保存され、次回ボードをリロードしたときに選択されます。

次のセクションでは、チームに合わせてボードビューとそのカスタマイズを最大限に活用する方法について詳しく説明します。


CWMボードのリストビュー、ガントビュー、カンバンビューモード

コラボレーションワーク管理で、ボードのリストビュー、ガントビュー、カンバンビューをシームレスに切り替え、ワークフローに基づいて柔軟な方法でタスクを管理します。

CWM ボードのデータが表示される 3 つのタイプは次のとおりです。データの表示方法をカスタマイズし、チームの作業を柔軟に整理および管理できます。詳細については、「CWMボードのリスト、ガント、カンバンの表示をカスタマイズ」を参照してください。

リストビュー

[リスト] タブには、このボードに追加されたすべてのタスクがグリッド形式で表示されます。このビューを使用して、タスクのステータスを一目で確認したり、外出先でユーザーにタスクをアサインしたりします。リストビューに表示できるデフォルトのタスク数は 1,000 です。

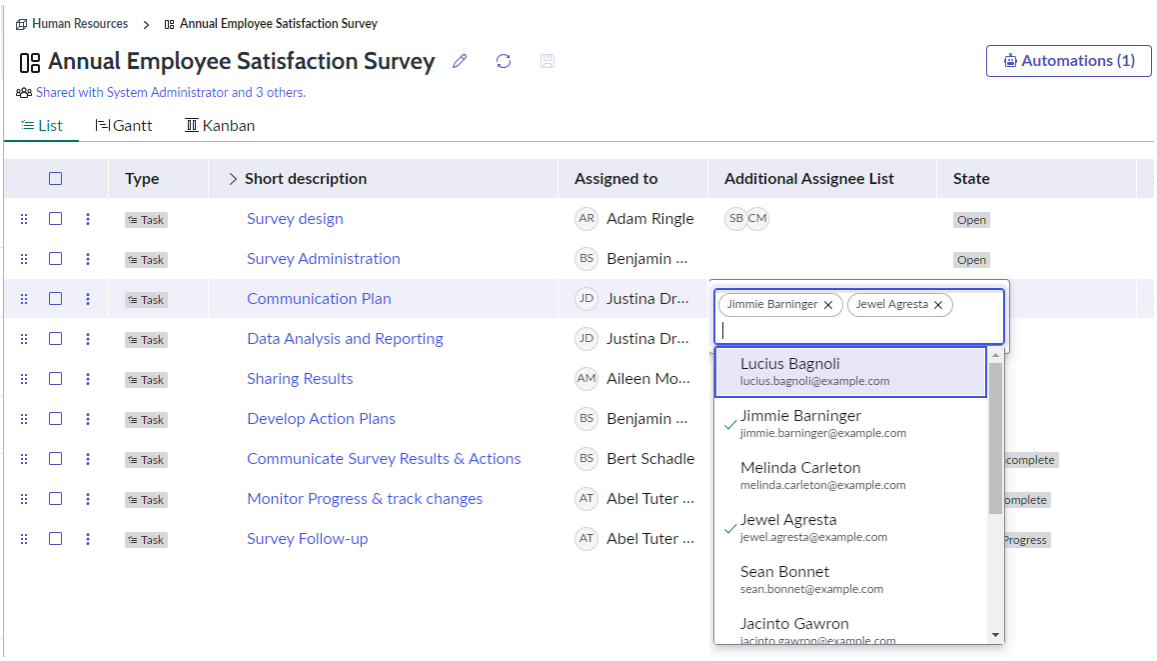


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ガントビュー

[ガント] タブでは、グリッドビューとカレンダービューが並べて表示されるため、優先度の変更に基づいてタスクを簡単に再スケジュールできます。ガントビューに表示できるデフォルトのタスク数は 1,000 です。

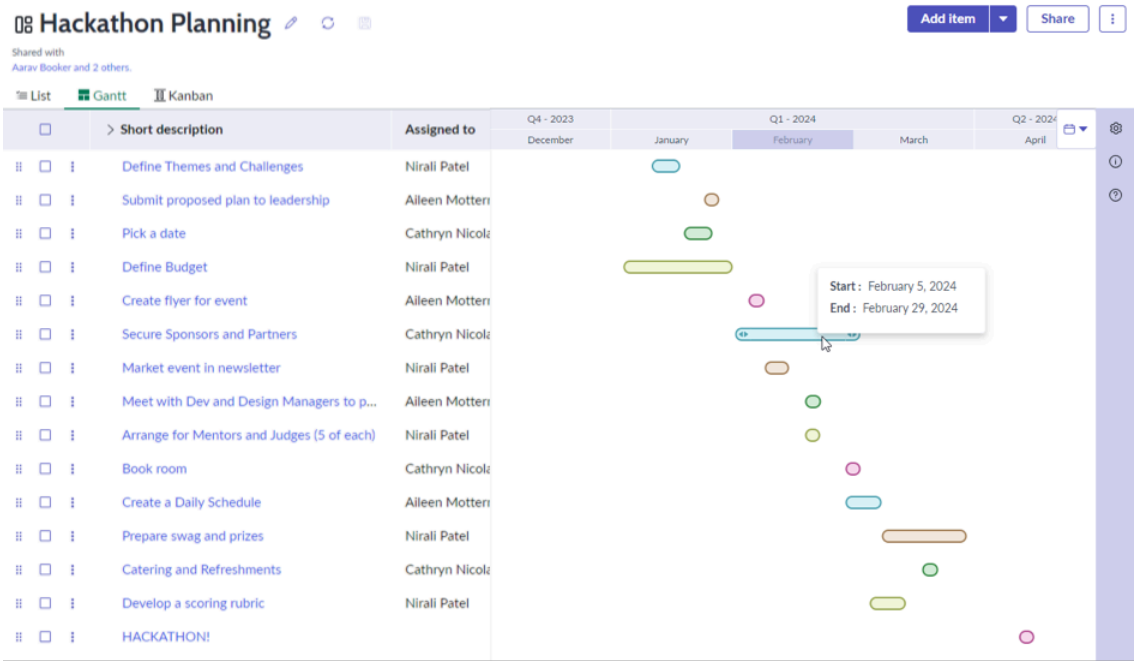

カンバンビュー

[カンバン] タブでは、選択した属性 ([アサイン先] や [タスクタイプ] など) に基づいて、タスクを垂直および水平方向に分類できます。この垂直レーンと水平スイムレーンは、他の属性に変更できます。

以下に例を示します。

- [垂直レーン] を [アサイン先] として、[水平レーン] を [ステータス] として選択して、すべての CWM タスクとその [アサイン先] の詳細のステータスを表示します。
- 垂直レーンを 優先度 として、水平レーンをア サイン先グループとして選択することで、複数のアサイン先グループのタスクを一目で確認し、優先度を変更します。

ボードに接続された作業がある場合、カンバンボードのいくつかの組み合わせは次のとおりです。

- [ステータス] として [垂直レーン] を選択し、[タスクタイプ] として [水平レーン] を選択して、ステータス別にグループ化されたすべてのエピックを表示します。

  その後、カンバンボードをフィルタリングしてエピックを表示できます。


- スプリントとして垂直レーンを選択し、タスクタイプとして水平レーンを選択して、計画されているスプリントごとにグループ化されたボード上のすべてのストーリーを表示します。

  その後、カンバンボードをフィルタリングして、接続されたストーリーを表示できます。

カンバンボードに表示できる垂直および水平のスイムレーンの最大数は、デフォルトでそれぞれ 50 です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

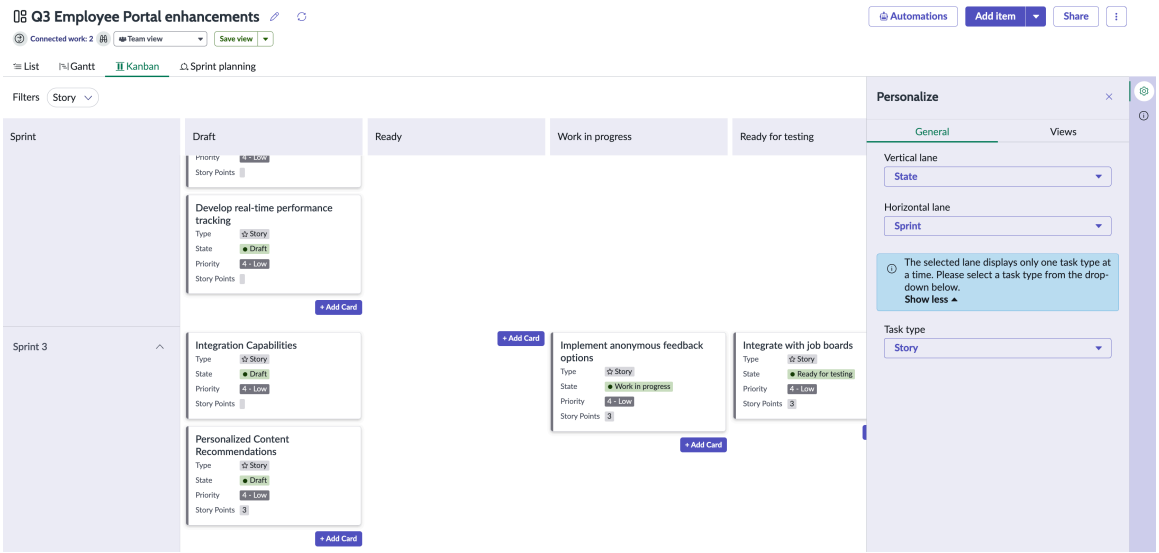

CWMボードのリスト、ガント、カンバンの表示をカスタマイズ

列を表示、非表示、または再配置し、ソートまたはフィルターを適用して、ワークフローに基づいてコラボレーションワーク管理 ボードでのデータの表示方法をカスタマイズします。

始める前に

CWM でのボード作成。

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、カスタマイズするボードを選択します。
3. ボードの [リスト]、[ガント]、または [カンバン] を選択し、[カスタマイズ] アイコン ( )
4. ボードのビューの表示を更新するか、ビューを非表示にします。
5. リストとガントでは、グリッドの左側に列を固定する、列からデータをフィルタリングする、列サイズをデフォルトにリセットするなどの列アクション ( ) を使用します。

次のタスク

ボードでのデータの表示方法を変更した後、参照用の個人用ビューとして保存するか、チームまたは利害関係者の共有ビューとして保存するかを選択できます。詳細については、「のボードビュー CWM」を参照してください。

CWMボードのカスタムビューの作成

ボード表示設定を変更し、 コラボレーションワーク管理 (CWM) での自分とチームメンバーの作業設定に適したカスタムの個人ビューまたは共有ビューとして保存します。

始める前に

CWM でのボード作成。

必要なロール：sn_cwm.cwm_user


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


このタスクについて
パーソナライズ設定を使用して、 CWM ボードでのデータの表示方法を変更し、変更を新しいビューとして保存します。リストビュー、ガントビュー、カンバンビューモードごとに異なるカスタムビューを作成することも、すべてを 1 つのビューに保存することもできます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、ビューを作成するボードを選択します。
3. カスタマイズ設定、ソート、フィルタリング、およびカスタム列の追加を使用して、ボードデータの表示設定を変更します。
   詳細については、「CWMボードのリスト、ガント、カンバンの表示をカスタマイズ」を参照してください。
4. [ビューの保存] メニューの [その他のアクション] アイコン (▼ を選択し、[新規ビューとして保存] を選択します。



5. このビューの名前を入力し、共有ビューにするか、個人用ビューのままにするかを選択します。
   共有ビューは、このボードにアクセスできるすべてのメンバーが利用できます。このオプションを選択しない場合、このビューは自分だけが使用できる新しい個人用ビューとして保存されます。

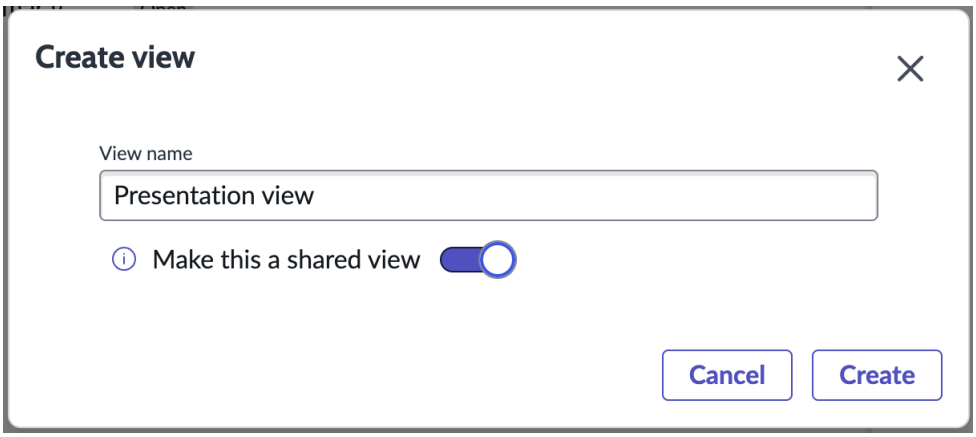


6. **[Create** (作成)] を選択します。

タスクの結果
新しいビューはビュースイッチャーで使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

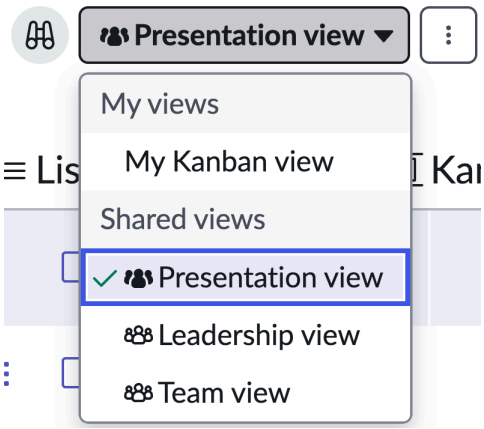

CWMボードビューの更新


コラボレーションワーク管理 (CWM) ボードの表示設定を変更し、既存の個人ビューまたは共有ビューを更新します。

始める前に

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、ビューを更新するボードを選択します。
3. ビュースイッチャーから、変更するビューを選択します。

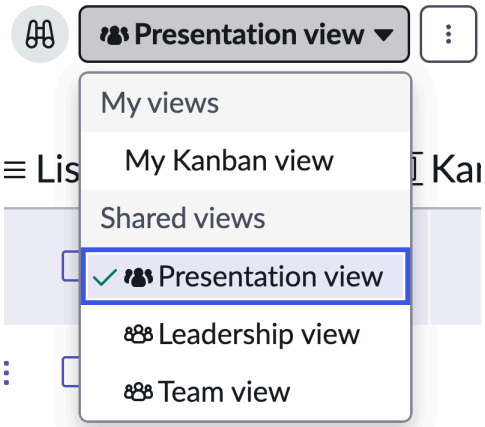


4. カスタマイズ設定、ソート、フィルタリング、およびカスタム列の追加を使用して、ボードデータの表示設定を変更します。
   詳細については、「CWMボードのリスト、ガント、カンバンの表示をカスタマイズ」を参照してください。
5. [ビューの保存] を選択します。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. [現在のビューに保存] を選択します。

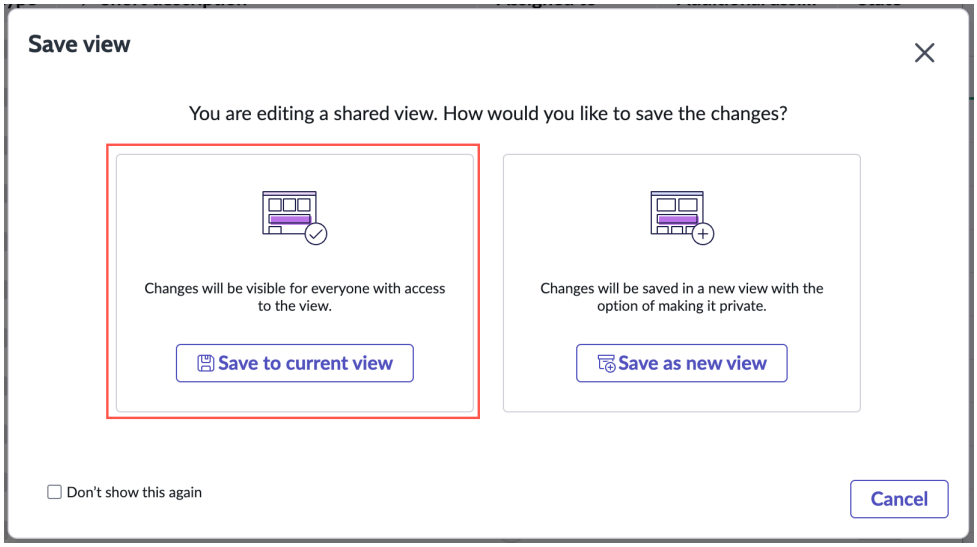

注:
[今後これを表示しない] チェックボックスをオンにすると、次回からこのダイアログボックスは表示されません。

タスクの結果
加えた変更により、現在のビューが更新されます。

カスタム **CWM** ボードビューの削除

CWM ボードのカスタムの個人ビューまたは共有ビューを削除し、ワークフローのボードビューを最新の状態に保ちます。


始める前に
必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.

2. スペースから、ビューを削除するボードを選択します。


3. ビュースイッチャーから、削除するビューを選択します。

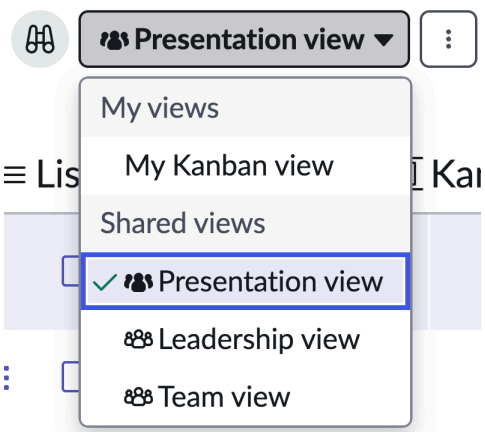

4. [その他の表示オプション] メニュー ( ) から、[ビューの削除] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳



5. [削除] を選択して確定します。

タスクの結果
ビューが削除され、このボードのビュースイッチャーで使用できなくなります。

CWM における作業アイテムの自動化

チームのワークフローに適した条件に基づいて、通知やメールの送信、重要な日付の監視、タスクの再アサインなどの単調なアクションを自動化することで、チームの効率を向上させます。

チームが一緒に作業する場合、多くの場合、ワークフローアクティビティに多くの時間と手作業が費やされます。この問題に対処し、チーム全体の効率を向上させるために、チームメンバーは CWM ボードでタスクの自動化を作成できます。


CWM における自動化は、特定の条件が満たされたときにトリガーされるアクションです。作成されたこれらの自動化は、作成されたボード内のすべての作業アイテムに適用されます。自動化されたアクションの例を次に示します。

- タスクアサインが変更されたときにメールを送信する。
- 期日が移動されたときにタスク優先度を更新する。
- 優先度が変更されたときにタスクを再アサインする。
- タスクが完了したときに通知を送信する。
- 優先度が変更されたときに動的にタスクのアサイニーに通知する。

アプリケーションには 6 つの事前定義されたテンプレートが用意されており、複数の単純な条件または複雑な条件を作成して作業アイテムのアクションを自動化するのに役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

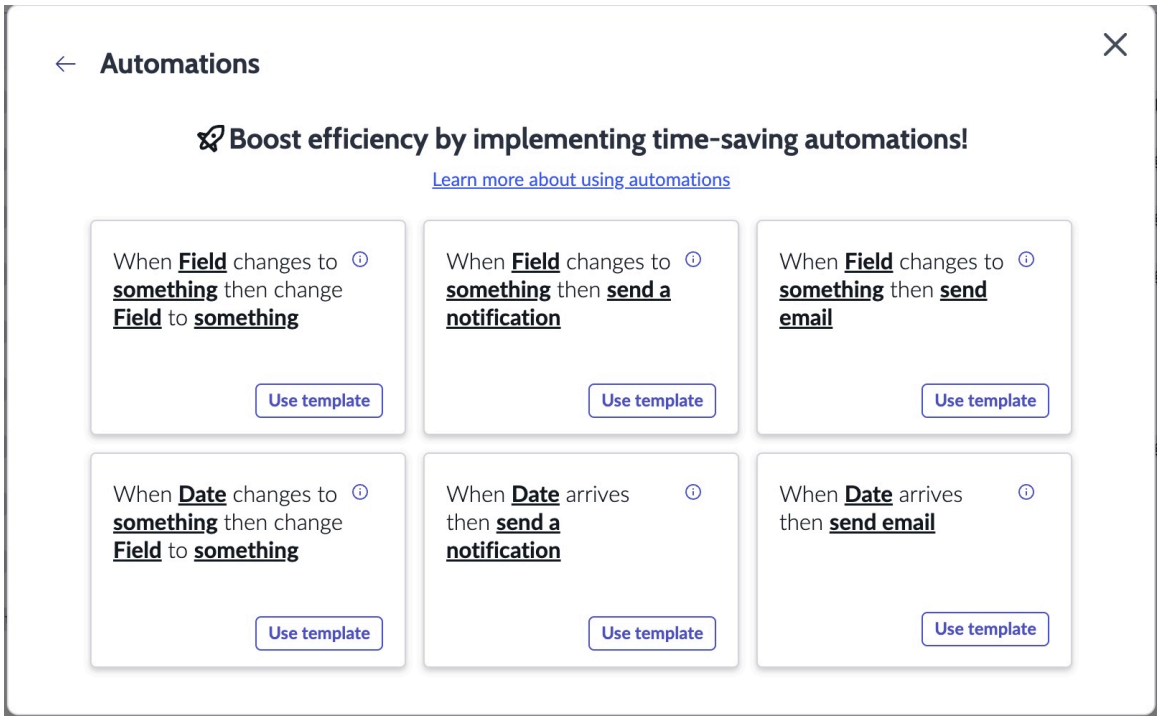


チームのワークフローにおいて変化する条件に基づいて、後でいつでも自動化を編集、無効化、または削除できます。ボードの場合、最大 10 個の自動化を作成できます。これには、すべてのアクティブな自動化と非アクティブな自動化が含まれます。

この自動化の例では、このボード上のタスクの [優先度] が [高] に変更されると、タスクの [アサイン先] 列のユーザーとこのスペースの所有者に通知されます。

今後、このボードのいずれかのアイテムの優先度が高に変更されると、そのタスクにアサインされたユーザーとスペース所有者に通知が送信されます。したがって、この自動化により、代わりにこのアクションを手動で実行するのにかかる時間が節約されます。

注:
デフォルトの [アサイン先] または [追加のアサイニー] に加えて、カスタムのユーザー列を追加した場合は、任意のユーザーに通知を送信することもできます。

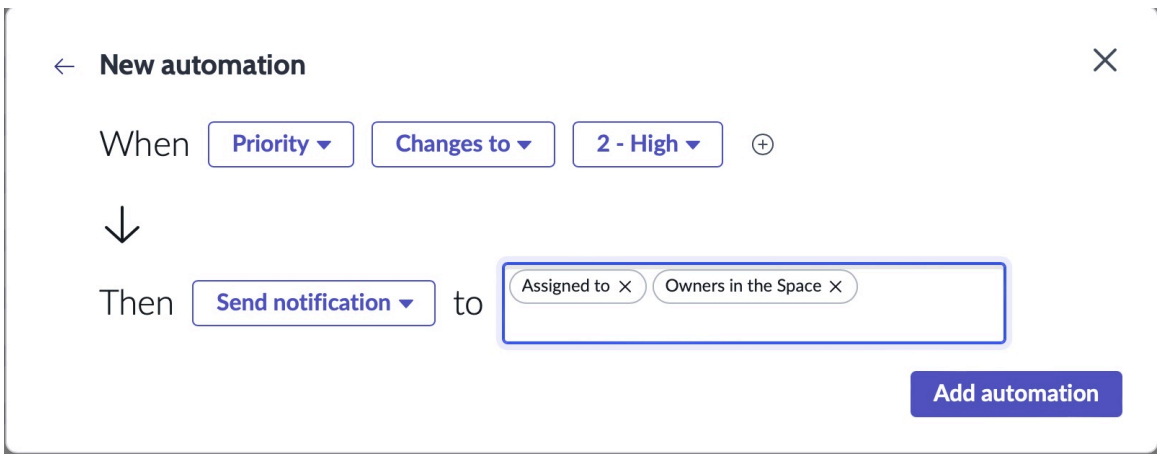

CWM の自動化を開始します。「CWM における自動化の作成」を参照してください。

CWM における自動化の作成

条件を追加して CWM ボードのタスク自動化を構築し、チームが手動でのタスク更新にかかる時間を節約するのに役立ちます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


自動翻訳

始める前に
CWM でのボード作成。


必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、自動化を作成するボードを選択します。
3. ボードヘッダーから、[自動化] を選択します。




4. 事前定義されたテンプレートを選択します。
   - 初めての自動化の場合は、テンプレートを選択して開始します。
   - 自動化が既に存在する場合は、[新しい自動化] を選択し、テンプレートを選択します。

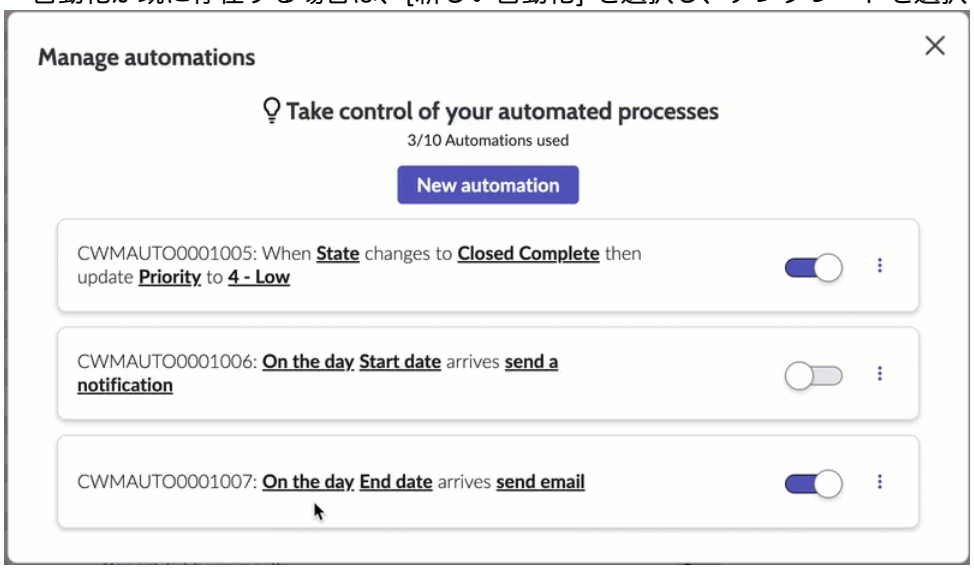

5. フィールドの更新、メールの送信、通知の送信などのアクティビティを自動化するための条件を追加します。

   自動化のトリガーとして機能する複数の条件を追加できます。たとえば、次の条件を満たしたときにスペース内の全員に通知を送信する自動化を作成できます。
   - タスクの優先度は高。
   - 開始日は 3 週間先。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

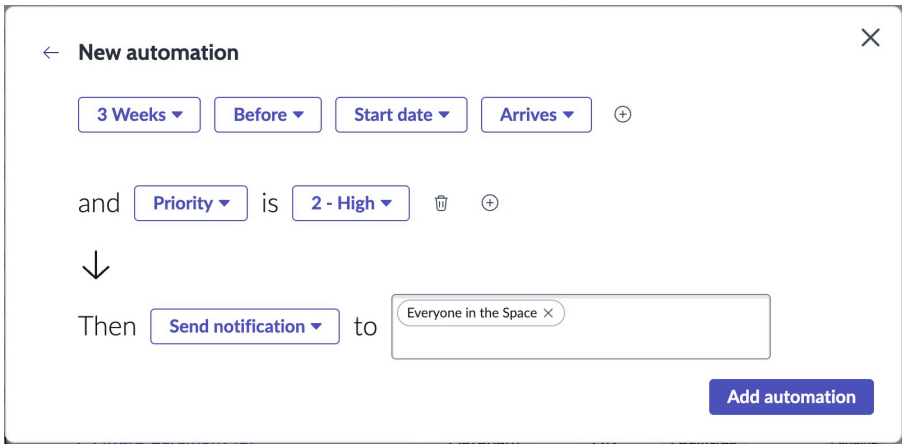

6. [自動化を追加] を選択します。
7. さらに自動化を追加するには、手順を繰り返します。

> **注:**
> ボードには最大 10 個の自動化を作成でき、自動化は CWM タスクにのみ適用され、ボード上の接続された作業アイテムには適用されません。

次のタスク
CWM での自動化の管理または削除。

CWM での自動化の管理または削除


チームのワークフローにおいて変化する条件に基づいて、コラボレーションワーク管理 でボードの自動化を編集、無効化、または削除します。

始める前に
CWM における自動化の作成。

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、自動化を編集するボードを選択します。
3. ボードヘッダーから、[自動化] を選択します。
4. 自動化の有効化、無効化、編集、または削除を選択します。
   - アクティブな自動化を無効にするには、トグルをオフに切り替えます。
   - 無効にした自動化を有効にするには、トグルをオンに切り替えます。



   - 自動化を編集するには：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

a. [その他のアクション] を選択し、[編集] を選択します。


b. 条件を更新します。

c. [自動化を保存 **(Save automation)]** を選択します。

- 自動化を削除するには：


a. [その他のアクション] を選択し、[削除] を選択します。

b. [削除] を選択して確定します。

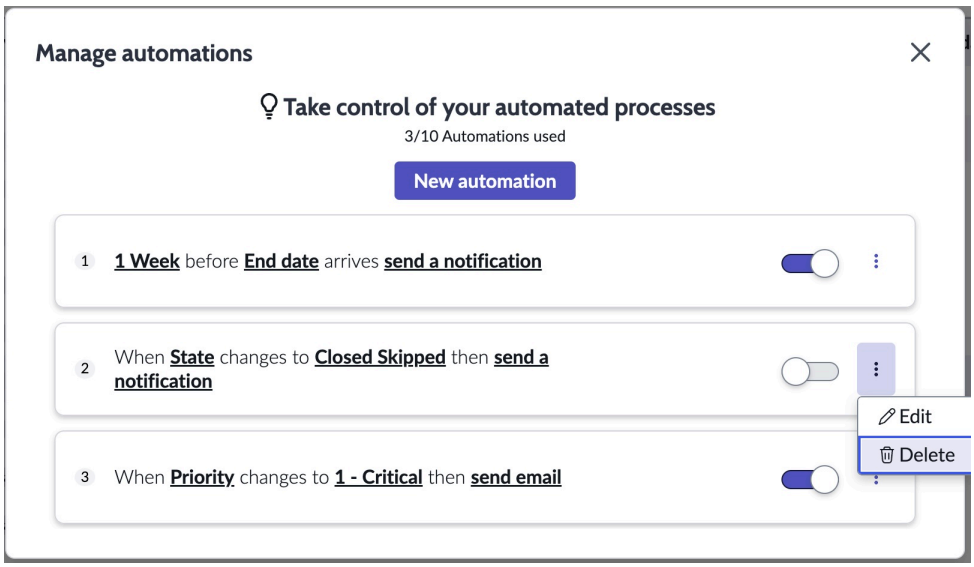

でのコネクテッドワーク **CWM**

ServiceNowアプリケーション全体から コラボレーションワーク管理 のボードにさまざまな作業アイテムを取り込むことで、チームのタスク管理を簡素化します。

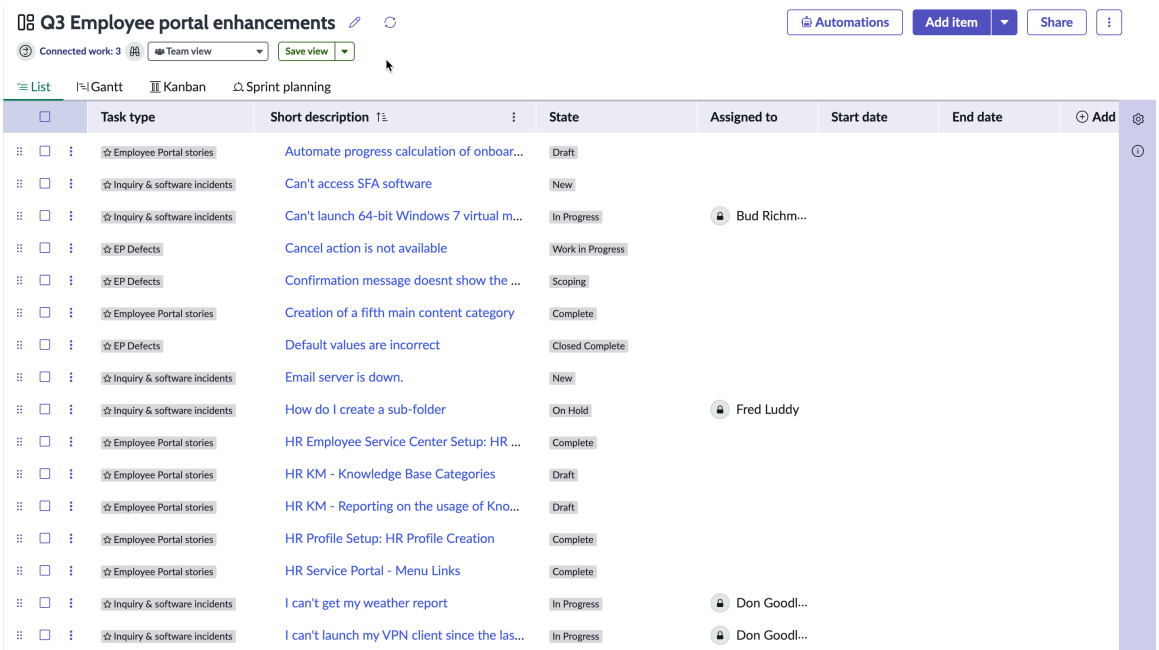

CWM の接続作業機能を使用すると、ServiceNow AI Platform全体のアプリケーションからあらゆる種類の作業アイテムを取り込めるため、すべてのチームのコラボレーション、計画、実行を簡素化できます。仕組みは次のとおりです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

一元化されたビュー

チームは、さまざまな ServiceNow アプリケーションのさまざまなタイプの作業を 1 つの CWM ボードに接続できます。作業アイテムの条件を定義することで、チームは必要な作業アイテムのみを取り込むことができます。この統合により、関連するすべての作業が 1 か所に表示されるようになり、複数のワークスペースを切り替える必要性が軽減されます。詳細については、「他の ServiceNow アプリから CWM ボードへの作業のコネクト」を参照してください。

柔軟な計画

作業が接続されると、チームは作業を効率的に計画および管理できます。アジャイル実行のためにスプリントに計画することも、フリーフロー手法に従って、チームが選択した方法でタスクに優先順位を付けて追跡することもできます。

スプリント計画の場合、接続されている作業項目は、ボードの [スプリント計画立案] ビューの [バックログ] ペインに自動的に表示されます。ここから、チームは作業をスプリントにスケジュール設定し、実行を続行できます。詳細については、「で作業アイテムをスプリントに計画する CWM」を参照してください。

リアルタイム更新

チームは、CWM ボード内のサイドパネルから直接、接続された作業アイテムの状態やその他の詳細を更新できます。このリアルタイム更新機能により、透明性が向上し、関係者全員が同じページにアクセスできます。詳細については、「CWMボードで接続されている作業アイテムの詳細を更新する」を参照してください。

接続された作業アイテムレコードを削除しても、 CWM のボードから削除されるだけで、元のレコードは削除されません。

効率の向上

作業を一元化し、統一された環境を提供することで、コネクテッドワークはチームの集中力を維持し、異なるワークスペース間の移動に費やす時間を短縮するのに役立ちます。これにより、生産性とコラボレーションが向上します。

他の **ServiceNow** アプリから **CWM** ボードへの作業のコネクト

さまざまな ServiceNow アプリケーションの作業アイテムを コラボレーションワーク管理のボードに接続することで、関連するすべての作業の統合ビューを有効にします。

始める前に

必要なロール：sn_cwm.cwm_user


手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、作業を接続するボードを選択します。
3. ボード ヘッダーから、 作業の接続 を選択します。


作業アイテムを 既に 接続している場合、このラベルは [接続された作業] と表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



4. [接続された作業の管理] モーダルで、 **[+** 新しく追加] を選択します。

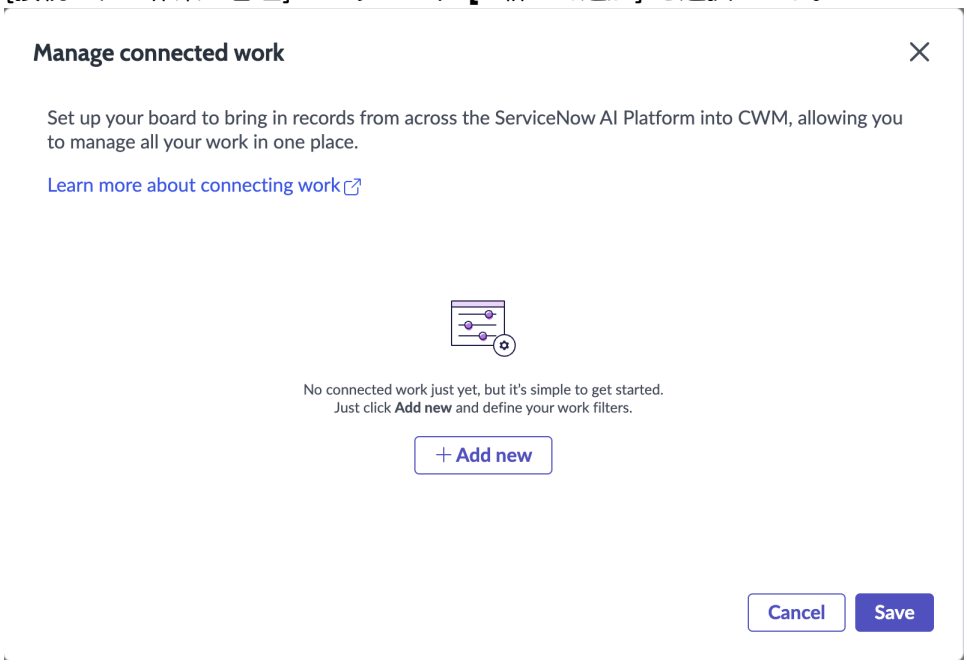

5. テーブルを選択し、選択したテーブルからレコードをフィルタリングする条件を定義します。

   a. [テーブル] フィールドからテーブルを選択します。
   たとえば、すべてのインシデントを取り込むには、インシデント [incident] テーブルを選択します。

   > **注:**
   > ServiceNow インスタンスに既にインストールされ、アクティブなアプリケーションからアクセスできるテーブルとアプリケーションからアクセスできるテーブルのみを使用できます。

   b. 要件に応じて [名前] フィールドの値を変更します。


   c. 条件ビルダーを使用して条件を追加し、選択したテーブルからレコードをフィルタリングします。
   たとえば、アクティブで特定のカテゴリに属するインシデントを取り込むとします。この場合、条件セットは次のようになります。

   [アクティブ] が **true** で、 カテゴリが [照会/ヘルプ] であるか、 カテゴリが [ソフトウェア] です。

   d. [更新数] アイコン ( ) を選択して、定義したフィルター基準に一致する存在するレコードの数を確認します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
フィルター基準で使用可能なレコードの数が 100 を超えていないことを確認してください。この数のデフォルトの 500 に変更するには、アドミンと協力してシステムプロパティ *sn_cwm.connect_work_import_limit*を更新します。

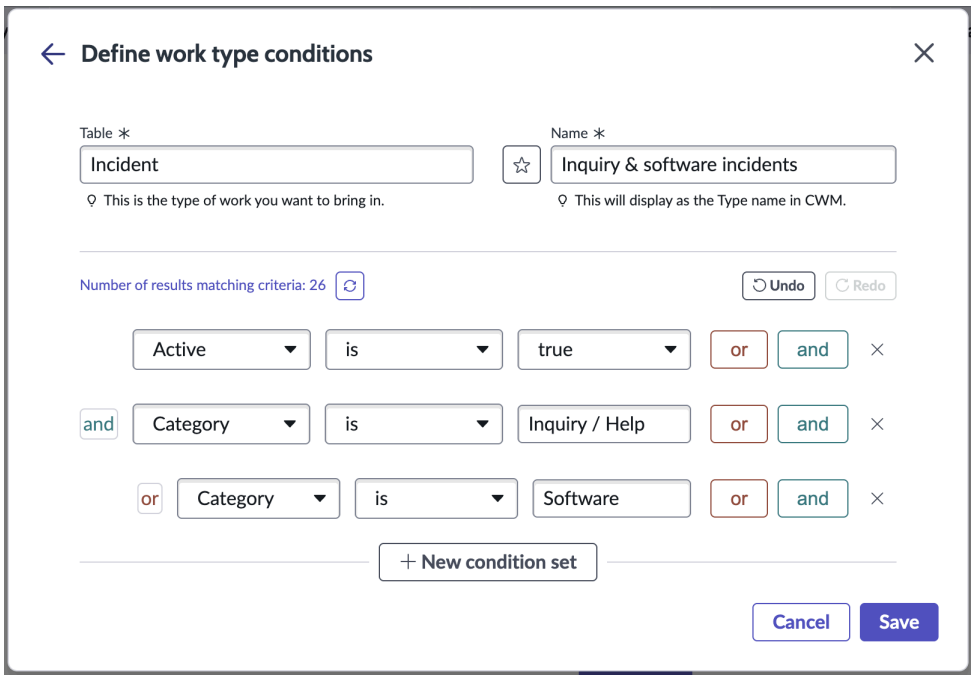


6. **[Save** (保存)] を選択します。
7. 手順 4 ～ 6 を繰り返して、他のタイプの作業アイテムを接続します。
ボードには最大 10 個の作業アイテムタイプを接続でき、テーブルごとに追加できる接続作業構成は 1 つだけです。
8. **[Save** (保存)] を選択します。

タスクの結果

- ボードが更新され、接続されているすべての作業アイテムがロードされて表示されます。
- アサイン先、ステータス、開始日と終了日などの既存の情報もボードに表示されます。
- スプリント計画立案ビューを有効にすると、これらすべての接続された作業項目をバックログの一覧で確認できます。スプリント計画の実行の詳細については、「 でのスプリント計画立案 CWM」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

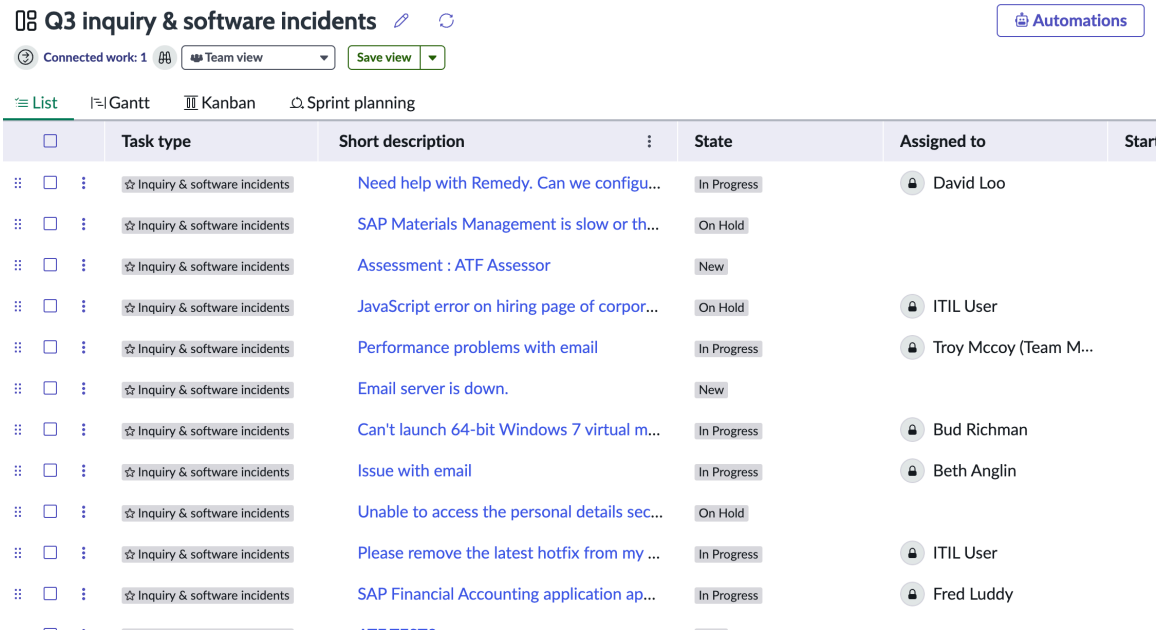

関連情報

での接続済み作業アイテムタイプの管理 CWM

で接続された作業のフィルター条件を更新する CWM


での接続済み作業アイテムタイプの管理 **CWM**

CWMボードで接続されている作業アイテムタイプを有効化、無効化、データの更新、または削除して、変化する要件に基づいて作業アイテムを最新の状態に保ちます。

始める前に
必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順


1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、接続された作業アイテムタイプを管理するボードを選択します。
3. ボードヘッダーから、 接続された作業を選択します。



4. [接続された作業の管理] モーダルから、既存の作業アイテムタイプを無効または有効にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

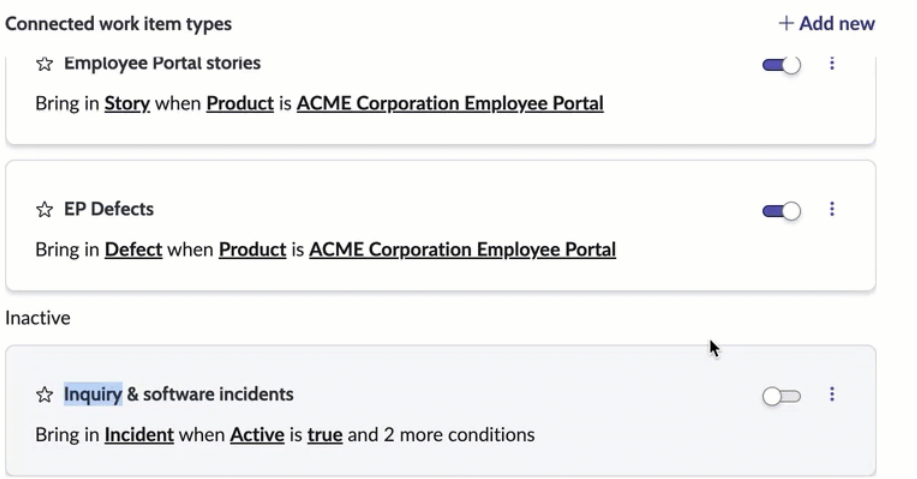

5. [その他のアクション] メニュー (⋮ から [編集] を選択して、作業アイテムタイプのフィルター条件を更新します。
詳細については、「で接続された作業のフィルター条件を更新する CWM」を参照してください。

6. [その他のアクション] メニュー (⋮ から [データの更新] を選択して、定義した作業項目の種類の最新レコードをフェッチします。



7. 作業アイテムタイプが不要になった場合は削除できます。
   a. 作業項目の種類の構成の [その他のアクション] メニュー (⋮ から、[削除] を選択します。
   b. [構成を削除] モーダルで、[確認] を選択します。
8. 必要な変更をすべて完了したら、[保存] を選択します。

タスクの結果
ボードが更新され、変更に基づいて作業アイテムがロードされます。

で接続された作業のフィルター条件を更新する **CWM**


コラボレーションワーク管理ボードで接続された作業アイテムタイプのフィルター条件を更新して、ボードに表示される作業アイテムにチームの現在の作業負荷が反映されるようにします。

始める前に
必要なロール：sn_cwm.cwm_user


手順
1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、接続された作業アイテムタイプを管理するボードを選択します。
3. ボードヘッダーから、 接続された作業を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳




4. 接続されている作業項目の種類の [その他のアクション] メニュー (⋮ から、[編集] を選択します。



5. 条件ビルダーを使用して、定義された条件を編集します。

6. [更新数] アイコン ( ) を選択して、更新したフィルター基準に一致する存在するレコードの数を確認します。

> **注:**
> フィルター基準で使用可能なレコードの数が 100 を超えていないことを確認してください。

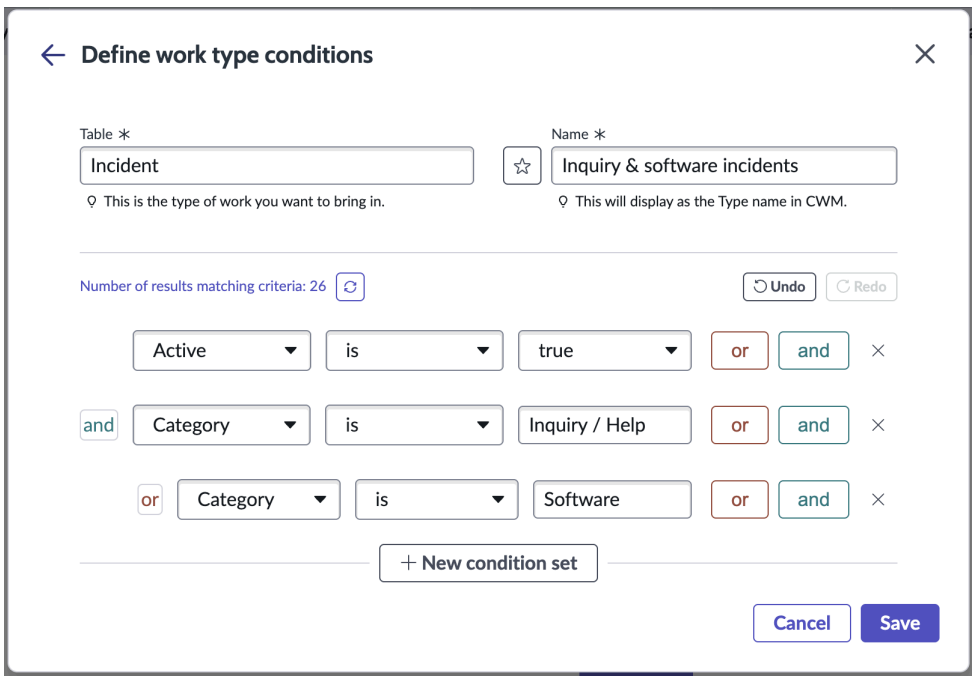

7. **[Save** (保存)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

8. 手順 4 ～ 7 を繰り返して、接続されている他の作業アイテムタイプの条件を更新します。
9. 必要な変更をすべて行ったら、[接続された作業の管理 (Manage connected work)] モーダルで [保存] を選択します。

タスクの結果
ボードが更新され、変更に基づいて作業アイテムがロードされます。


CWMボードで接続されている作業アイテムの詳細を更新する

接続された作業を通じて、 コラボレーションワーク管理 ボードに取り込まれた作業アイテムのステータス、アサイン先、およびその他の詳細を更新する方法について説明します。

始める前に
必要なロール：sn_cwm.cwm_user

このタスクについて
接続された作業アイテムの詳細は、サイドパネルからのみ更新でき、グリッドでのインライン編集では更新できません。ただし、接続されている作業項目をボードから削除すると、ボードから削除されるだけで、元のレコードは削除されません。

手順
1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、更新する作業アイテムが接続されているボードを選択します。
3. リスト、ガント、カンバン、またはスプリントの計画立案ビューから、サイドパネルでアイテムの詳細を開きます。
4. 必要な詳細を更新します。
   [詳細フォームビュー] アイコン ( ) を使用して、元のレコードフォームを開き、そこから詳細を更新することもできます。

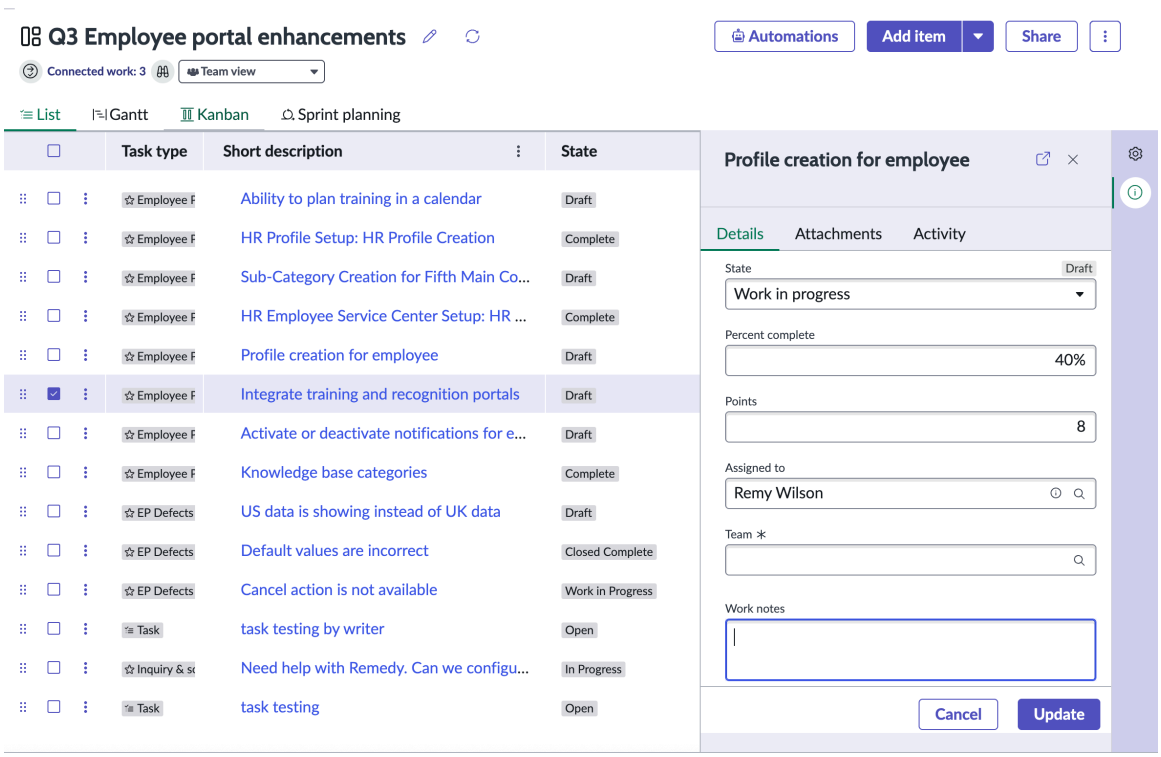

5. CWM で詳細を編集した場合は、[更新] または [保存] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

タスクの結果
更新された情報は、CWM とその親アプリケーションの両方で作業アイテムで使用できます。

でのスプリント計画立案 CWM

コラボレーションワーク管理でスプリント計画立案を使用して、アジャイル手法でチームの作業を計画、追跡、および管理します。


CWM ボードのスプリント計画ビュー内では、チームのバックログの管理、スプリントの作成、スプリントへの作業の計画、およびそれらのシームレスな実行を行うことができます。CWM ボード上のすべての既存の作業項目は、スプリント計画ビューの [バックログ] ペインに自動的に追加されます。つまり、作業アイテムが古いか新しいかに関係なく、すべてバックログに表示されます。このペインから、これらのアイテムをスプリントに簡単にスケジュールして実行することができます。

ストーリーなどのさまざまなタイプの作業項目を作成したり、CWM ボードで利用可能なその他のデフォルトおよびカスタムの作業タイプを使用したりする柔軟性があります。この柔軟性により、チームとプロジェクトの特定のニーズに合わせてスプリント計画を調整できます。

スプリント計画立案ビューの有効化

[カスタマイズ] ( ) サイドパネルの [ビュー] セクションから、[スプリント計画立案] を選択して、CWM ボードにスプリント計画立案ビューを表示できるようにします。

注:
ボードビューを保存して、スプリント計画立案ビューが常にボードに表示されるようにします。

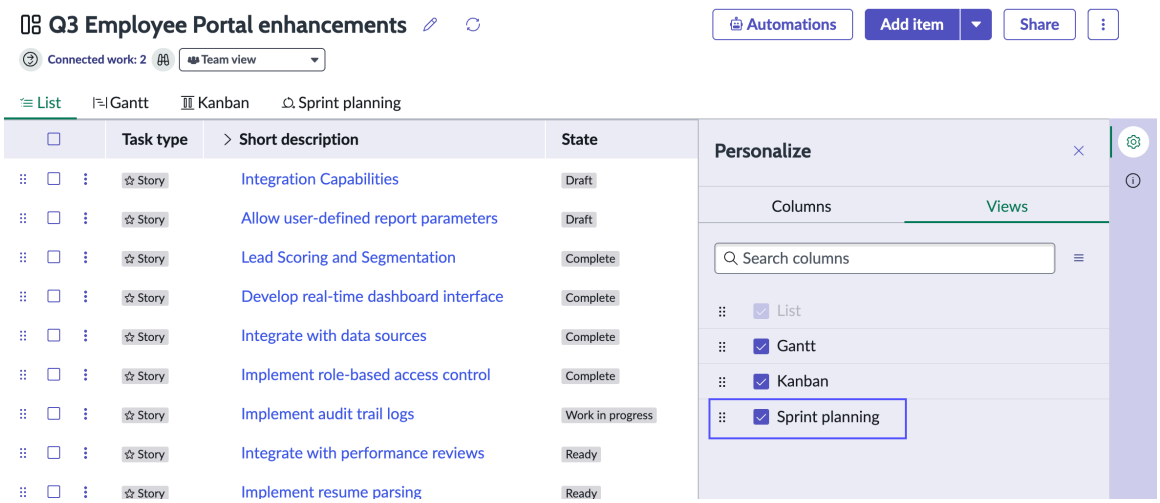

バックログ

[バックログ] ペインには、新しく追加されたタスクと古い未完了のタスクの両方を含む、すべての計画外の作業アイテムが表示されます。完了した作業アイテムは表示されないため、実行する必要があることに集中できます。このビューから作業項目をバックログに直接追加し、カスタマイズサイドパネルを使用して [バックログ] ペイン内の列を表示または非表示にし、ニーズに合わせて表示をカスタマイズできます。

[バックログ] ペインでは、次の操作を実行できます。

- 優先度に基づいて、作業アイテムをバックログの一番上または一番下に移動します。
- 現在進行中のスプリントにアイテムを移動します。
- 行を並べ替えて、リスト内の作業アイテムを移動します。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 作業アイテムを削除します。
- 任意の列にフィルターを適用します。ただし、バックログ内のカスタム列にフィルターを適用することはできません。
- 1 ページに表示するアイテムの数を変更します。
- [行をコピー] を使用して作業アイテムを複製します。

> **注:**
> 複製できるのは CWM タスクとストーリーのみで、他の接続された作業レコードは複製できません。

- 1 つまたは複数の作業項目をバックログからスプリントの 1 つにドラッグアンドドロップします。

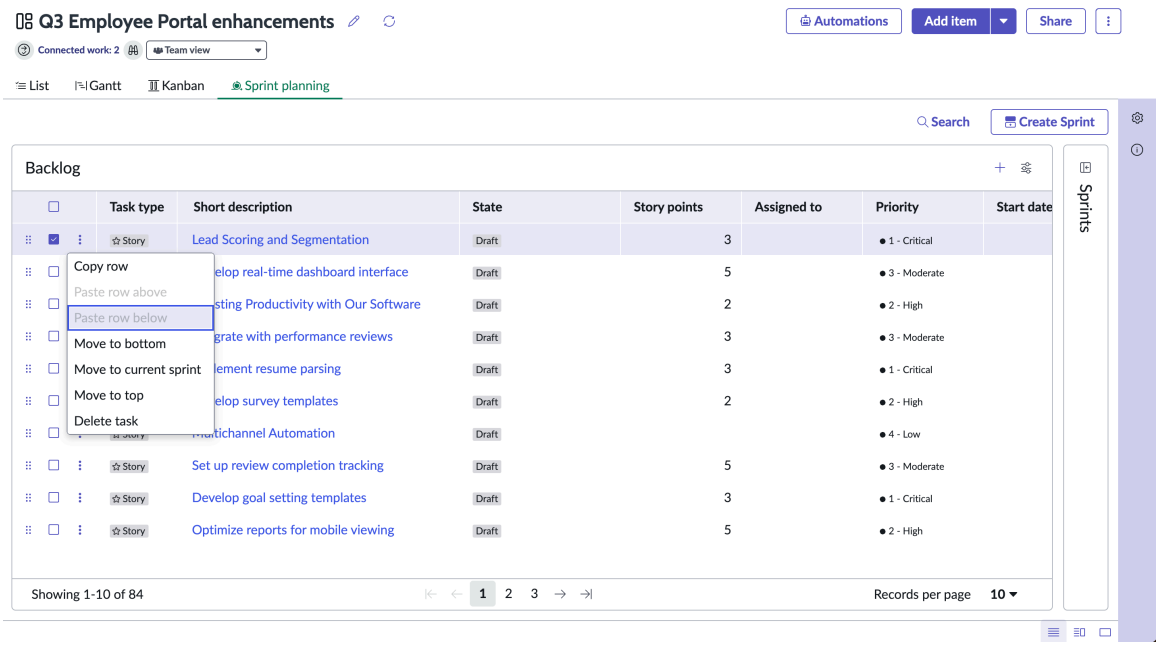


スプリント

CWM ボードの [スプリント] セクションには、アクティブなスプリントのリストが表示されます。スプリントをまだ作成していない場合は、このセクションに開始に役立つフォームが表示されます。スプリントを作成するには、スプリント期間、開始日と終了日、ストーリーポイントのキャパシティを選択します。同じ設定で追加のスプリントを作成するには、[別のスプリントを追加] オプションを使用します。期間またはキャパシティが異なるスプリントの場合は、[スプリントの作成] を選択します。詳細については、「でのスプリントの作成 CWM」を参照してください。

各スプリントは折りたたみ可能なセクションであり、作業アイテムを直接追加し、[カスタマイズ] サイドパネルを使用してビューをカスタマイズできます。各スプリントセクションには、使用済みキャパシティの割合と残りのストーリーポイントも表示されるため、チームの作業負荷を効果的に管理するのに役立ちます。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

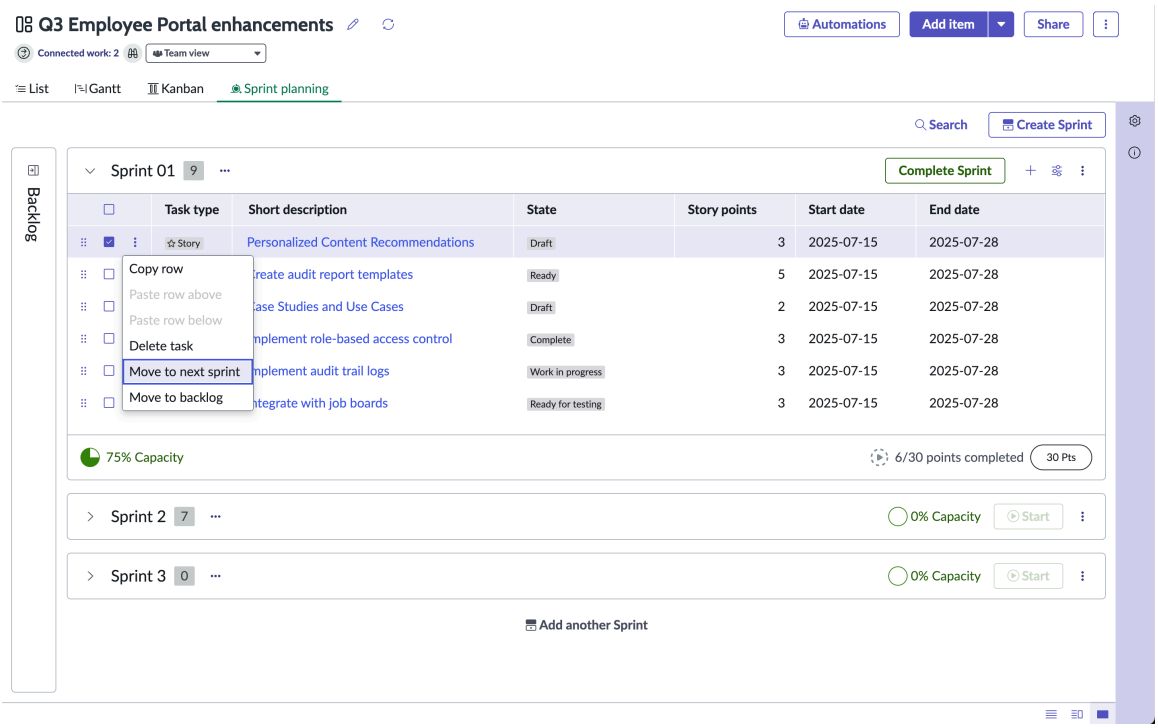

スプリント計画立案ビューのカスタマイズ

[バックログ] ペインと [スプリント] ペインに表示される列は、[カスタマイズ] ( ) サイドパネルを使用してカスタマイズできます。これにより、最も関連性の高い情報を表示できます。必要に応じて、現在のボードビューに保存することも、新しいビューとして保存することもできます。

スプリント計画立案ビュー内のバックログまたはスプリントの作業領域がさらに必要な場合は、[バックログ]、[スプリント]、および [バックログとスプリント] オプションを切り替えることができます。

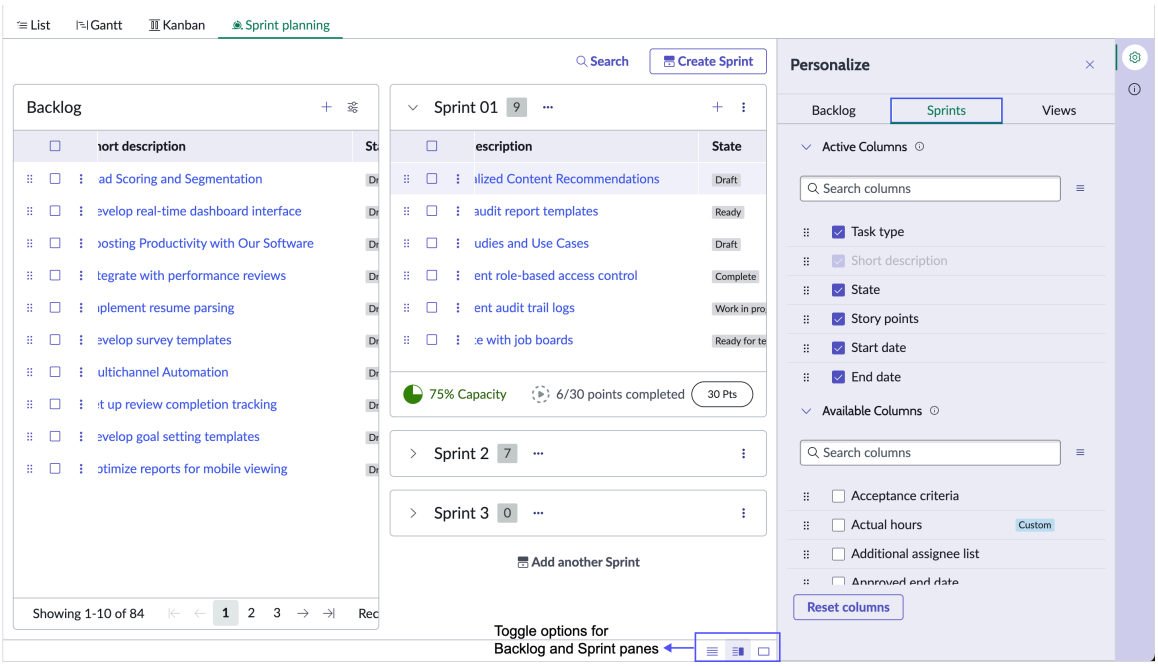

でのスプリント計画バックログに作業アイテムを追加する **CWM**


コラボレーションワーク管理のスプリント計画立案ビューから直接、新しい作業項目を作成してバックログに追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、スプリント計画立案を実行するボードを選択します。
3. [スプリント計画立案] タブを選択します。
4. [バックログ] ペインで、[項目の追加] アイコン ( ) を選択します。

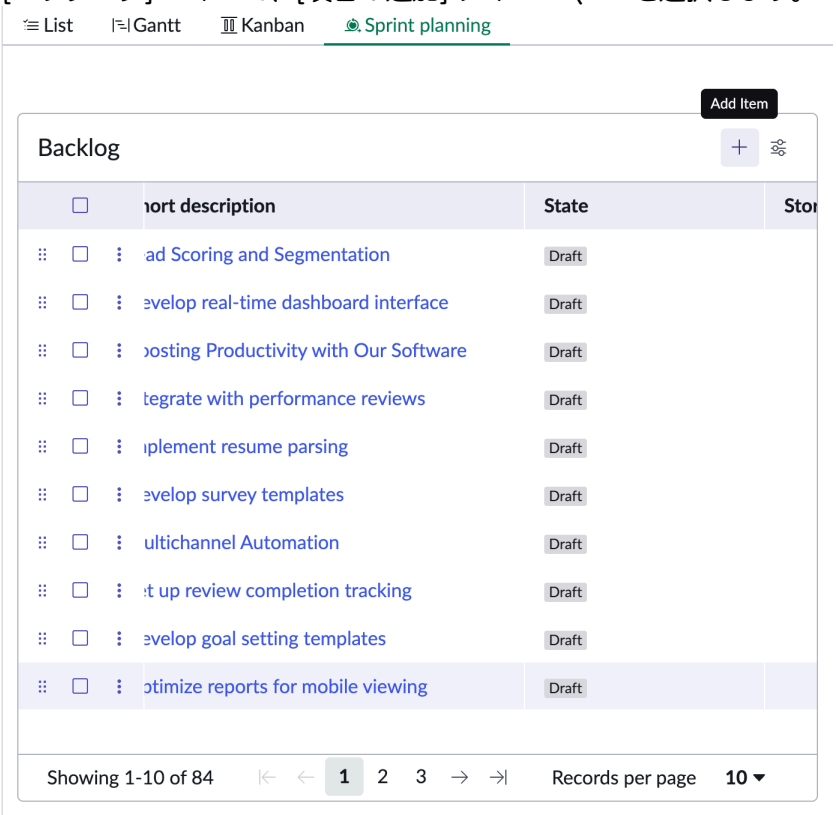

5. [アイテムタイプ] ドロップダウンリストから作業アイテムタイプを選択します。
   使用可能なデフォルトの作業アイテムタイプはタスクです。ストーリーなどの他のタイプを有効にすることも、カスタムタイプを作成することもできます。「CWM でのカスタム作業アイテムタイプの作成と管理」を参照してください。
6. フォームで、簡単な説明、開始日と終了日、ストーリーポイントなど、アイテムの詳細を入力します。
7. **[Submit** (送信)] を選択します。

タスクの結果
新しく作成された作業アイテムがバックログに追加されます。

次のタスク
このアイテムを [スプリント] セクションにドラッグアンドドロップすることで、このアイテムをアクティブなスプリントの 1 つに計画できます。「で作業アイテムをスプリントに計画する CWM」を参照してください。

でのスプリントの作成 **CWM**

チームが コラボレーションワーク管理 のアジャイル手法で作業を計画して実行できるように、カスタム期間とカスタムキャパシティでスプリントを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、スプリント計画立案を実行するボードを選択します。
3. [スプリント計画立案] タブを選択します。
4. CWM ボードにスプリントがない場合は、[スプリント] セクションの [スプリントの計画] フォームを使用できます。
5. 既存のスプリントがある場合は、新しいスプリントを作成するオプションを選択します。

次のタスク
で作業アイテムをスプリントに計画する CWM。


でのスプリントの詳細の更新 **CWM**

スプリントの期間、キャパシティ、および日付を コラボレーションワーク管理 で変更します。

始める前に
必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、スプリント計画立案を実行するボードを選択します。
3. [スプリント計画立案] タブを選択します。
4. スプリント ヘッダーから、その他のオプションアイコン (⋮)を選択し、 編集 を選択します。

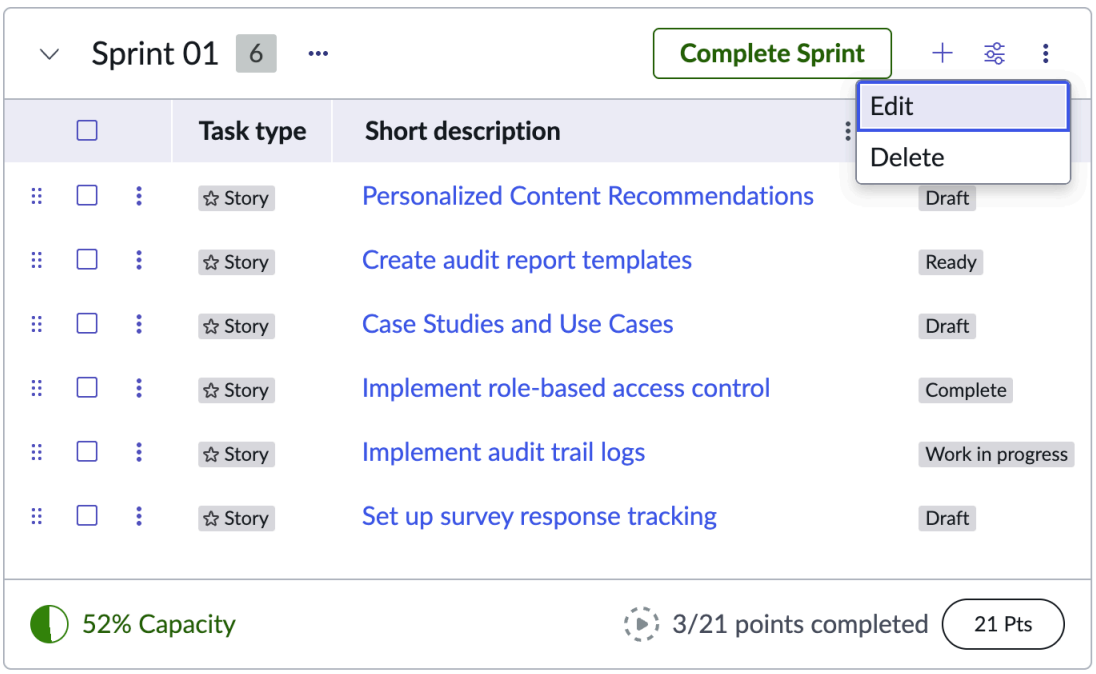

5. スプリントの詳細に必要な編集を行います。
6. **[Save** (保存)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

- で作業アイテムをスプリントに計画する CWM
- でのスプリントの作業アイテムの作成 CWM
- でのスプリントの削除 CWM

でのスプリントの削除 **CWM**


コラボレーションワーク管理 のスプリント計画立案から個々のスプリントを削除して、計画の優先順位の変更がボードに反映されるようにします。

始める前に

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、スプリント計画立案を実行するボードを選択します。
3. [スプリント計画立案] タブを選択します。
4. スプリントヘッダーから、[その他のオプション] アイコン ( ) を選択し、[削除] を選択します。

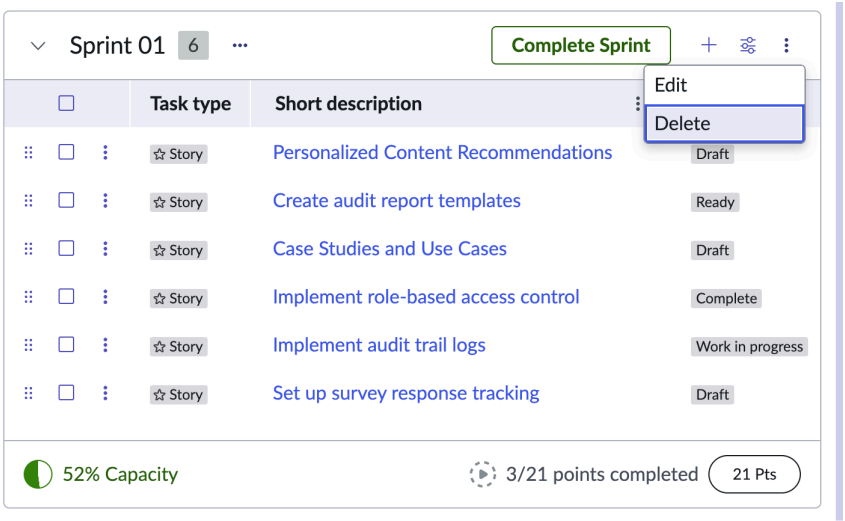

5. [スプリントを削除] 確認モーダルで、[削除] を選択します。

タスクの結果

スプリントが削除され、このスプリントにスケジュールされたアクティブな未完了の作業アイテムがバックログに移動されます。

でのスプリントの作業アイテムの作成 **CWM**

コラボレーションワーク管理のスプリント計画立案ビューから直接、新しい作業アイテムを作成してスプリントに追加します。

始める前に

必要なロール：sn_cwm.cwm_user


手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、スプリント計画立案を実行するボードを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [スプリント計画立案] タブを選択します。
4. スプリントヘッダーから、[項目を追加] アイコン (＋ を選択します。

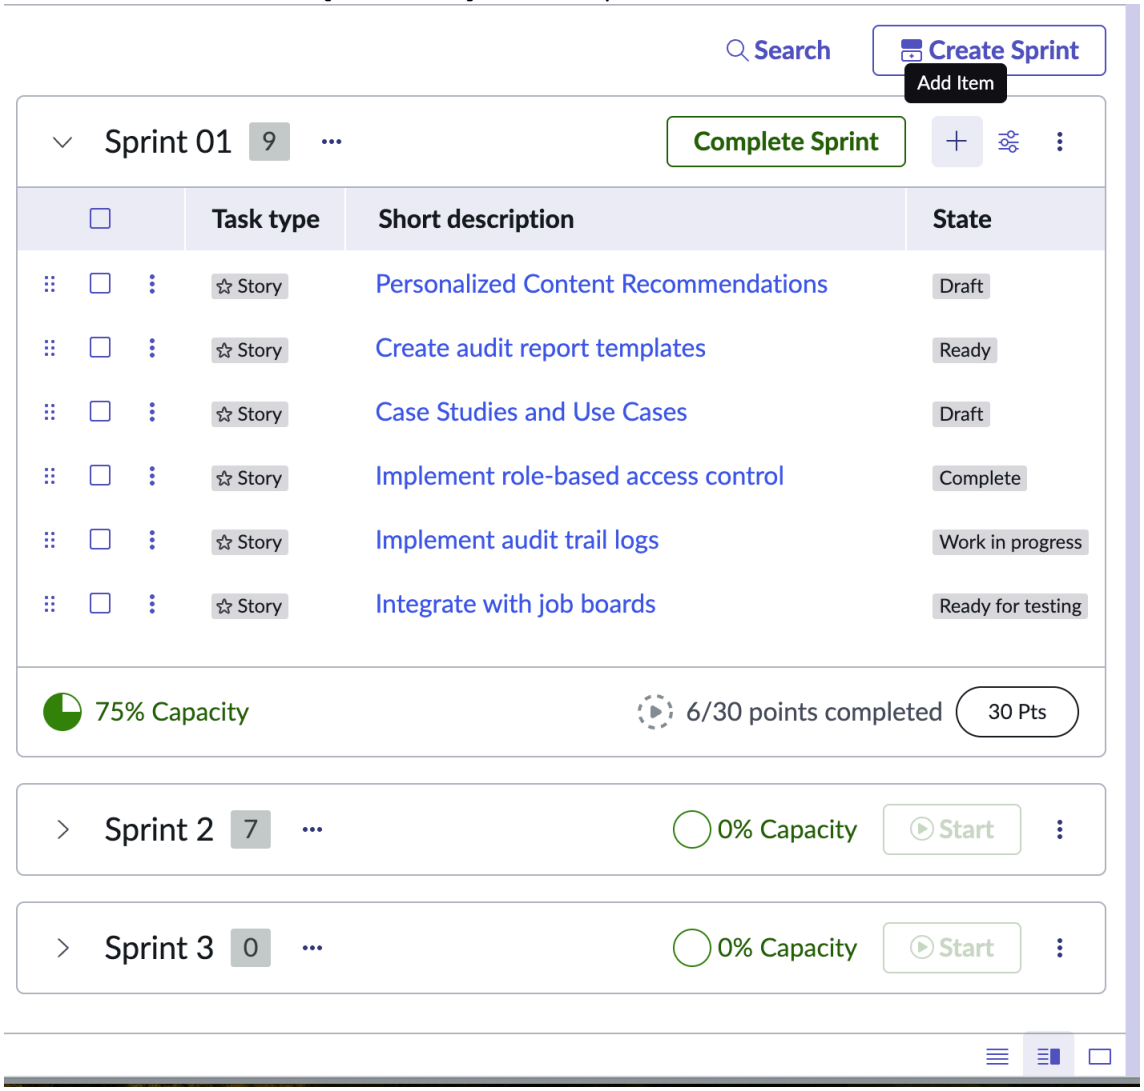

5. [アイテムタイプ] ドロップダウンリストから作業アイテムタイプを選択します。
使用可能なデフォルトの作業アイテムタイプはタスクです。ストーリーなどの他のタイプを有効にすることも、カスタムタイプを作成することもできます。「CWM でのカスタム作業アイテムタイプの作成と管理」を参照してください。
6. フォームで、簡単な説明、開始日と終了日、ストーリーポイントなど、アイテムの詳細を入力します。
7. **[Submit** (送信)] を選択します。

で作業アイテムをスプリントに計画する **CWM**

ストーリーやその他の CWM タスクをバックログからスプリントにスケジュールするか、 コラボレーションワーク管理内のスプリント間で作業を移動します。

始める前に
必要なロール：admin


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、スプリント計画立案を実行するボードを選択します。
3. [スプリント計画立案] タブを選択します。
4. [バックログ] から、スプリントにスケジュールする作業項目を選択します。
5. それらを選択したスプリントにドラッグアンドドロップします。
   スプリントセクションが折りたたまれている場合でも、作業アイテムをスプリントにドラッグアンドドロップできます。
6. スプリント間で作業アイテムを移動するには、作業アイテムを選択して、選択したスプリントにドロップします。

   以下は、バックログセクションとスプリントセクションの間、およびスプリント間でのドラッグアンドドロップアクションを示す gif です。

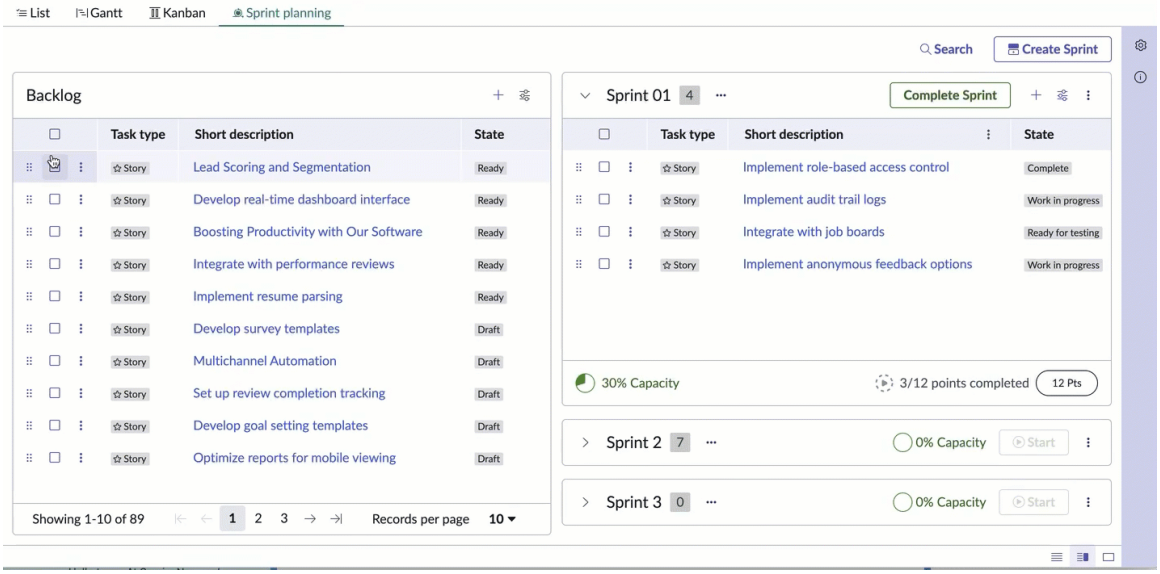

関連情報

- でのスプリントの開始または完了 CWM
- でのスプリントの作業アイテムの作成 CWM
- でのスプリントの詳細の更新 CWM

でのスプリントの開始または完了 **CWM**

チームが計画アイテムの作業を開始できるように、スプリントを開始します。チームがアサインされた作業を完了したら、 コラボレーションワーク管理 のスプリント計画立案ビューから直接、このスプリントを完了としてマークできます。


始める前に
必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、スプリント計画立案を実行するボードを選択します。
3. [スプリント計画立案] タブを選択します。
4. スプリントを開始するには、スプリントヘッダーから [開始] を選択します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

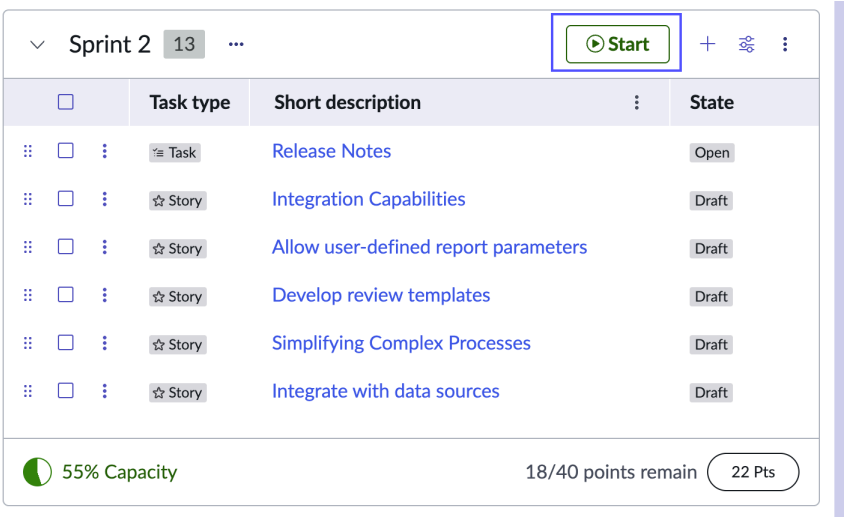

5. スプリントを完了します。

a. スプリントヘッダーから、[スプリントの完了] を選択します。

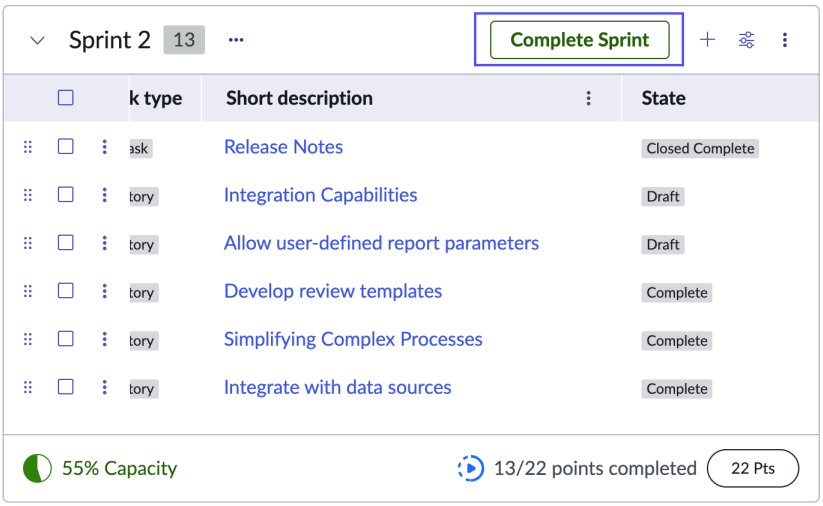

b. このスプリントの完了済みアイテムと未解決アイテムの詳細を確認します。


c. 未完了のアイテムを次のスプリントまたはバックログに移動します。

d. このスプリントの振り返りボードを作成して、チームとスプリントの振り返りを実行します。詳細については、「でのスプリントの振り返りボードの作成 CWM」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

e. [スプリントの完了] を選択します。

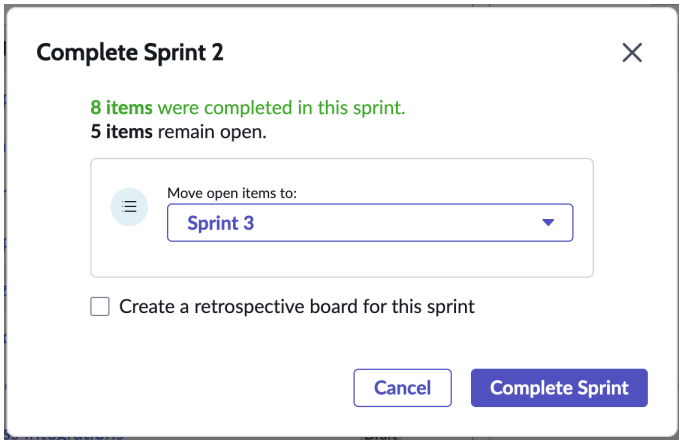

スプリントは完了としてマークされ、スプリント計画立案ビューに表示されなくなります。すべてのオープンアイテムは、選択に基づいて次のスプリントまたはバックログに移動されます。


でのスプリントの振り返りボードの作成 CWM

スプリントを完了としてマークする場合は、チームが コラボレーションワーク管理で最近のスプリントを共同作業して振り返るためのスプリント振り返りボードを作成することを選択します。

始める前に
必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、スプリント計画立案を実行するボードを選択します。
3. [スプリント計画立案] タブを選択します。
4. スプリントヘッダーから、[スプリントの完了] を選択します。

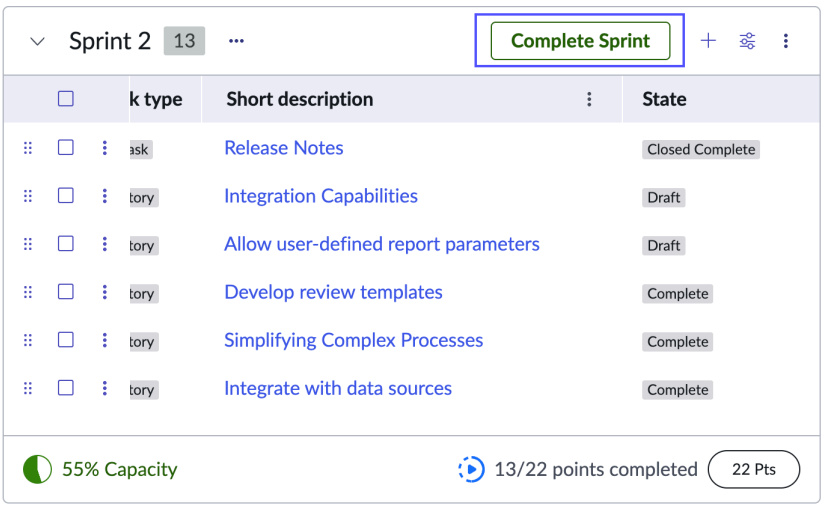


5. このスプリントの完了済みアイテムと未解決アイテムの詳細を確認します。
6. 未完了のアイテムを次のスプリントまたはバックログに移動します。
7. [このスプリントの振り返りボードを作成] オプションを選択します。
8. ボードの名前を入力します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

9. このボードに適用するテンプレートを選択します。
デフォルトでは、アジャイルのレトロスペクティブテンプレートが適用されます。要件に応じて異なるテンプレートを作成する場合は、「 ボードとドキュメント用の CWM のテンプレート」を参照してください。

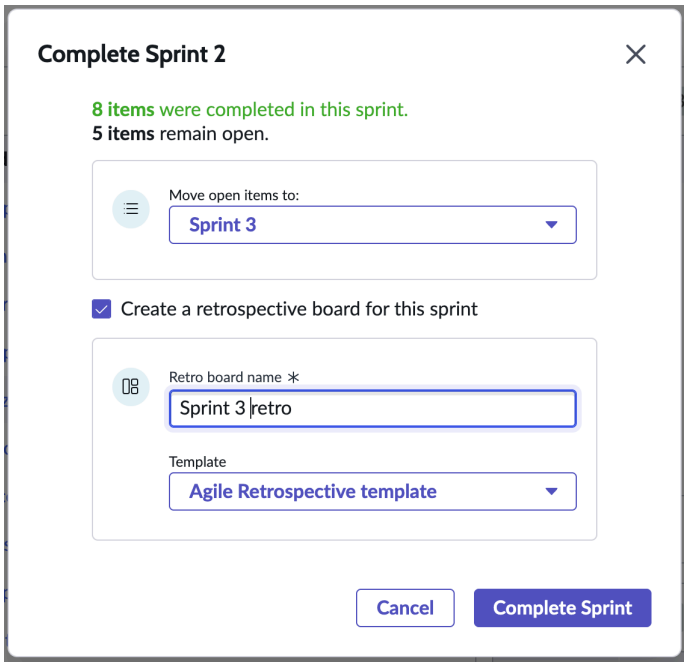

10. [スプリントの完了] を選択します。

タスクの結果
同じスペース内で完了とマークされたばかりのスプリントに対して、新しい振り返りボードが作成されます。成功メッセージまたは左側のナビゲーションパネルから新しいボードに移動できます。

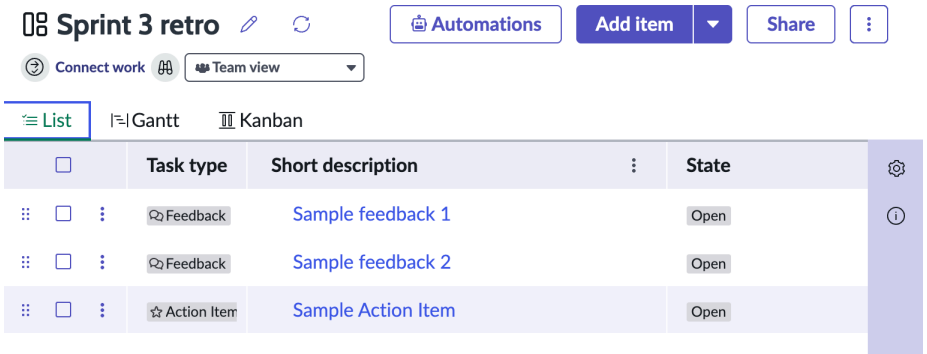

CWM のスプリント計画立案ビューをカスタマイズする

テストの説明。

始める前に
必要なロール：admin

手順

移動先 すべて > > .

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CWM を使用したコラボレーションドキュメント

リアルタイムのコラボレーションでリッチテキストドキュメントを使用して、会議メモ、プロジェクト要件、技術仕様など、作業に関するあらゆる種類のドキュメントを管理します。

Docs for CWM ワークスペース内のコラボレーションの概要。所要時間は約 2 分です。

ドキュメントはスペース内で作成し、フォルダーに整理できます。スペース内では複数のドキュメントを作成でき、各ドキュメント内にはページを無制限に作成して、情報を効果的に整理できます。

ドキュメントの機能

ドキュメントの主な機能は次のとおりです。

- コンテンツを自動保存します。
- ライブユーザープレゼンスの機能を使用して、ドキュメントを閲覧または作業しているユーザーを確認します。
- 他のユーザーがドキュメントで自分を @ でメンションしたときに通知を受け取ります。
- ドキュメントのテンプレートを作成して適用します。
- 見出し、リスト、配置などを含むリッチテキスト段落の書式設定を使用します。
- ブロックレベルの編集を使用して、テキストブロックを移動して配置を変更します。
- **/** コマンドを使用して、チームメンバーをインラインでタグ付けしたりテーブルを挿入したりします。
- 他の ServiceNow AI Platform テーブルへの参照を追加して、チーム間で作業を接続します。
- ファイルをアップロードするか Web URL を使用して、画像を挿入します。

  注:
  Google イメージリンクを挿入するエクスペリエンスが機能しない場合があります。


- テキスト、画像、リスト、テーブルなどのコンテンツをコピーして、ドキュメントページ間で貼り付けます。
- ドキュメントページのコンテンツを、CWM ワークスペース内外のチームメンバーとステークホルダーにメールで送信します。

CWMドキュメント内でのリアルタイムコラボレーション

リアルタイムコラボレーションの機能を使用して、他の複数のエディターと同時にドキュメントページを編集します。色付きのカーソルは、ページ上の各エディターの現在の位置を示します。ページのコンテンツを作業中または確認中の好みに基づいて、これらのライブプレゼンスインジケーターを表示するか非表示にするかを選択できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

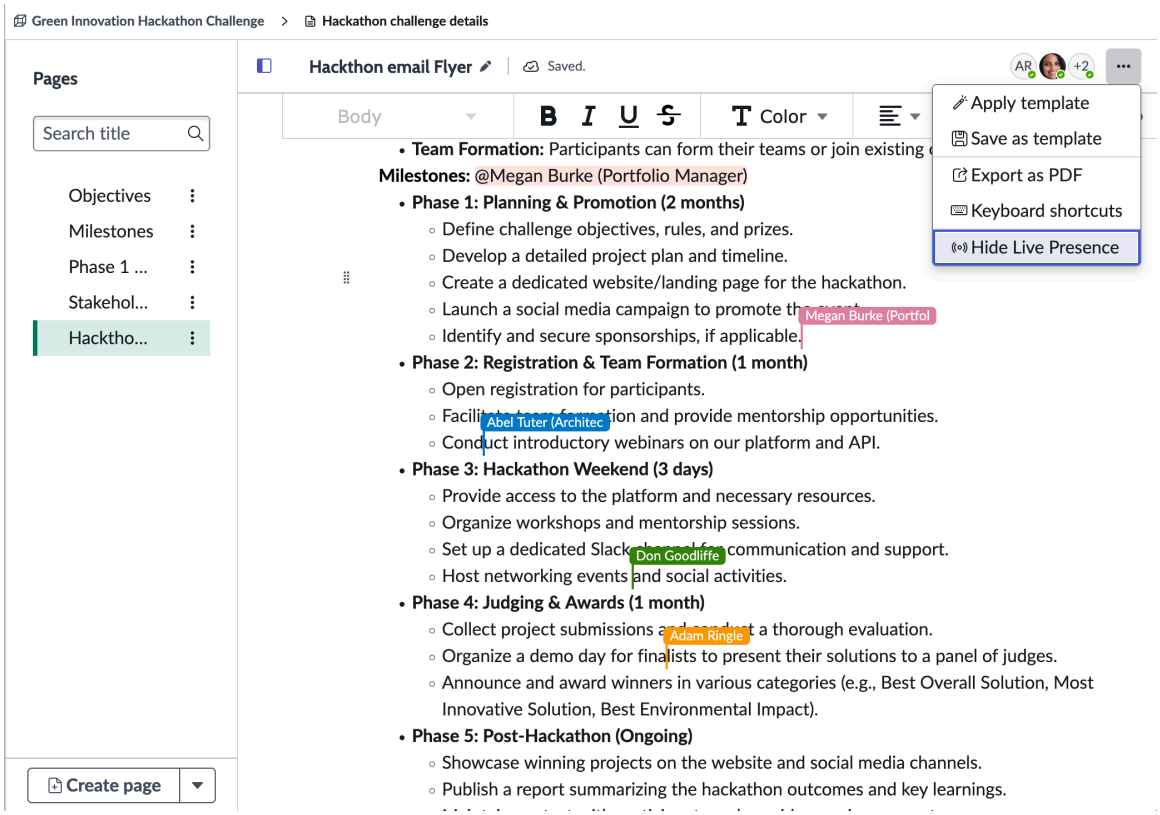

注:
多数の同時編集者を使用すると、アプリケーションのパフォーマンスが低下する可能性があります。

[store-future: BEGIN review]


メールドキュメントページ

ドキュメントページのコンテンツを、 CWM ワークスペースへのアクセス権を持たないチームメンバー、協力者、またはその他のステークホルダーにメールとして送信します。ドキュメントページヘッダーから [メール送信] オプションを選択すると、ページコンテンツの送信先の個人またはグループを選択できます。

このオプションは、 *sn_docs.send_email_enabled* システムプロパティが true に設定されている場合にのみ使用できます 。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

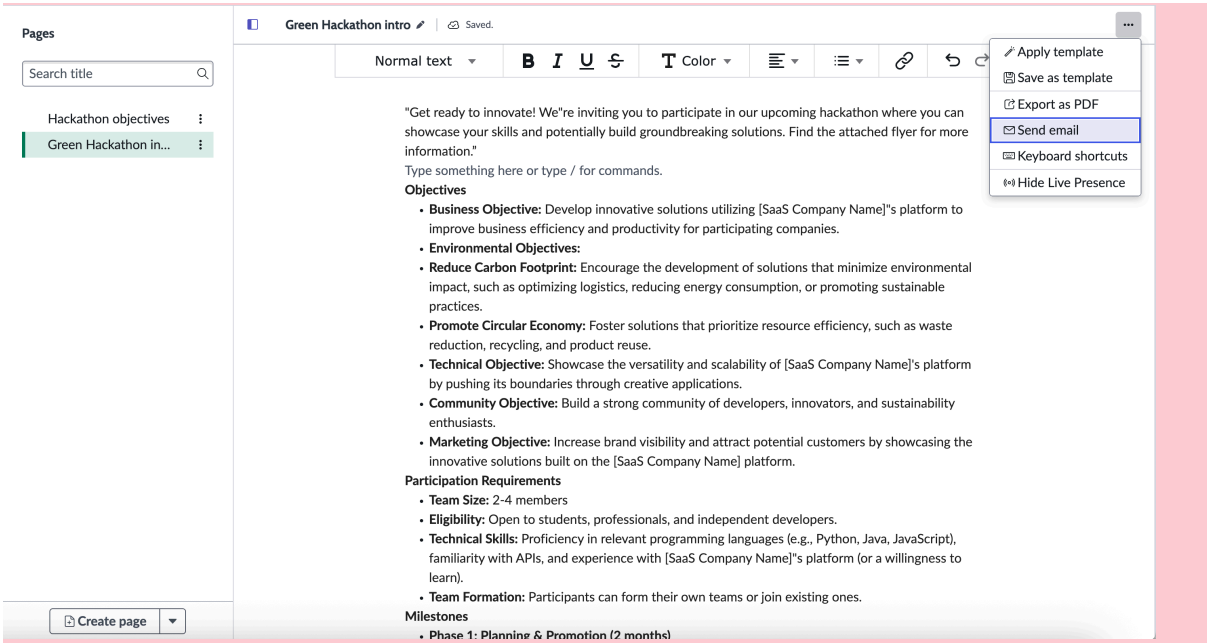


[End]

を使用したドキュメントコンテンツの要約 **CWM** の **Now Assist**

Now Assist機能を使用して、ドキュメントで選択したコンテンツを詳細化、短縮、要約したり、ドキュメント全体の概要を取得したりできます。

- 選択したテキストを要約、詳細化、または短縮します。
- ページ上のコンテンツ全体を要約します。

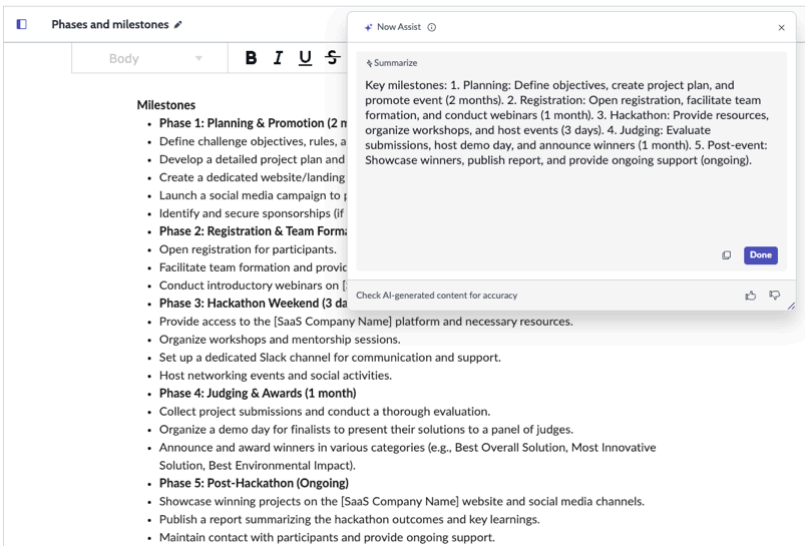

注:

- コラボレーションワーク管理におけるドキュメントの要約は、 CWM の Now Assist スキルです。詳細については、「コラボレーションワーク管理の Now Assistの構成 (CWM)」を参照してください。
- 要約するコンテンツが他にもある場合は、一部のコンテンツを除外して再試行できます。
- サマリーは AI によって生成されます。そのため、テキストを確認して正確性を確認することをお勧めします。


自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

を使用してドキュメントからタスクを生成し、ボードに追加する **CWM** の **Now Assist**

Now Assistの生成 AI 機能を使用して、ドキュメントのコンテキストからタスクを作成し、CWMワークスペースで必要なボードに追加できるようにします。

注:
タスク生成は CWM の Now Assist スキルです。詳細については、「コラボレーションワーク管理の Now Assistの構成 (CWM)」を参照してください。





CWM でのドキュメント作成

タスクに関連する情報を保存し、ユーザーとタスクレコードを参照し、コラボレーションワーク管理ワークスペースでドキュメントを使用してリアルタイムで共同作業を行います。

始める前に
CWM でのスペース作成。


必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順


1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. ドキュメントを作成するスペースを開きます。
3. [スペース] メニューから、ボードを追加するスペースを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



4. スペースの [その他のオプション] メニュー ( ) から、[新しいドキュメント] を選択します。



スペース

5. [ドキュメント名 **(Doc name)**] フィールドで、ドキュメントの名前を入力します。
たとえば、「会議メモ」などです。
6. [作成] を選択します。

タスクの結果

現在のスペースに新しいドキュメントが作成され、コンテンツの下書きを開始するための無題のページが開きます。

次のタスク

ドキュメントのリッチテキスト形式オプションを使用して、チームに関連する情報の下書きを作成するか、「**/**」と入力して他のオプションを確認します。

> **注:**
> CWM タスク以外の ServiceNow AI Platform レコードを参照するには、アドミンと協力して *sn_cwm.record_mention_config* システムプロパティを更新します。詳細については、「CWM ドキュメントの ServiceNow AI Platform レコードの有効化」を参照してください。

CWMドキュメントでページとサブページを管理する

コラボレーションワーク管理 (CWM) ワークスペースのドキュメント内でページとサブページを作成、複製、削除することで、チームと作業アイテムの情報を柔軟に整理します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


自動翻訳

始める前に
CWM でのドキュメント作成


必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. [スペース] メニューから、ドキュメントがあるスペースに移動して開きます。




3. ページを作成するには、空白のページを作成するか、事前定義されたテンプレートから開始します。
   - 空白のページの場合は、[ページの作成] を選択します。
   - テンプレートから作成するには：
     a. [テンプレートからページを作成] を選択します。



自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

b. 使用するテンプレートカードから、[使用] を選択します。

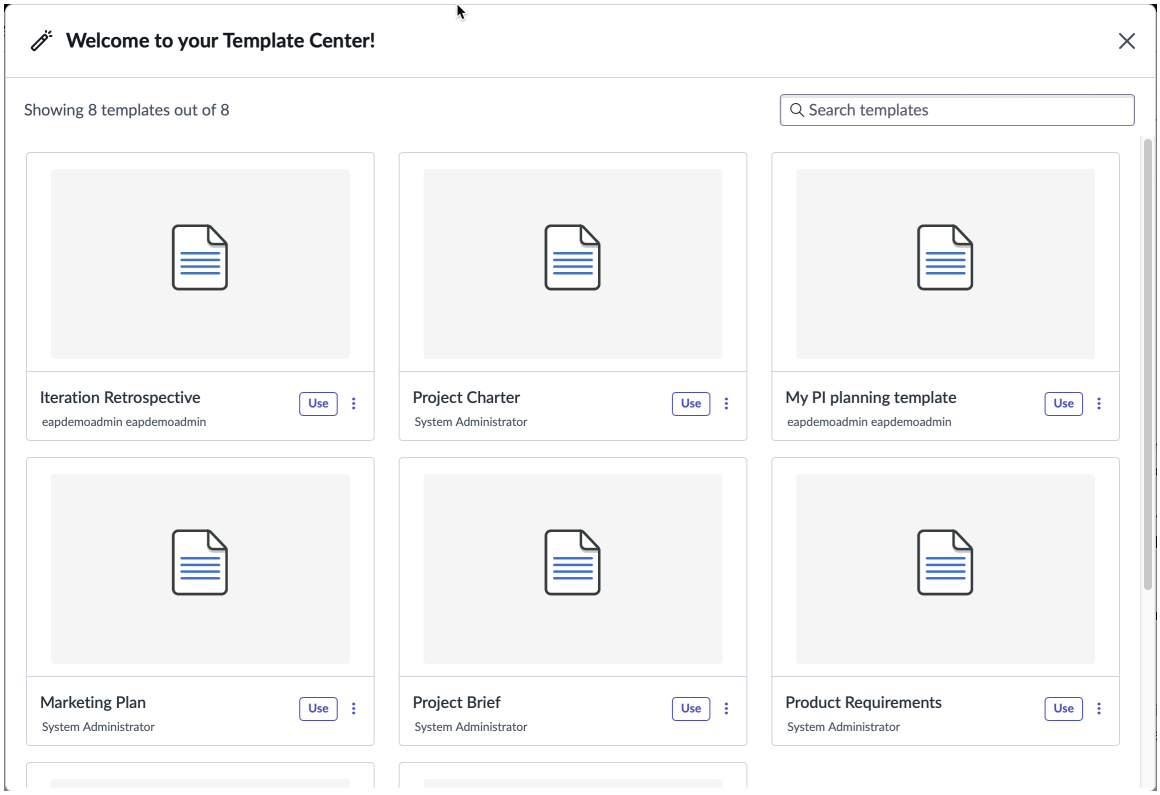

新しいページが作成され、ドキュメントに追加されます。

4. サブページを作成するには、[ページアクション] メニュー (⋮) を選択し、[サブページの作成] を選択します。



5. ページまたはサブページを削除するには、[ページアクション] メニュー (⋮) を選択し、[削除] を選択します。

スペースへの編集者または所有者のアクセス権を持つユーザーのみがドキュメントページを削除できます。ドキュメントに 1 ページしか残っていない場合、どのユーザーも削除できません。

CWM におけるドキュメントの複製

既存のドキュメントを複製して、コラボレーションワーク管理ワークスペースで情報を手動でコピーすることなくすべてのページとコンテンツをコピーすることで、時間を節約できます。

始める前に
CWM でのドキュメント作成。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. ドキュメントがあるスペースに移動します。
3. ドキュメントの [その他のアクション] メニューから、[複製] を選択します。

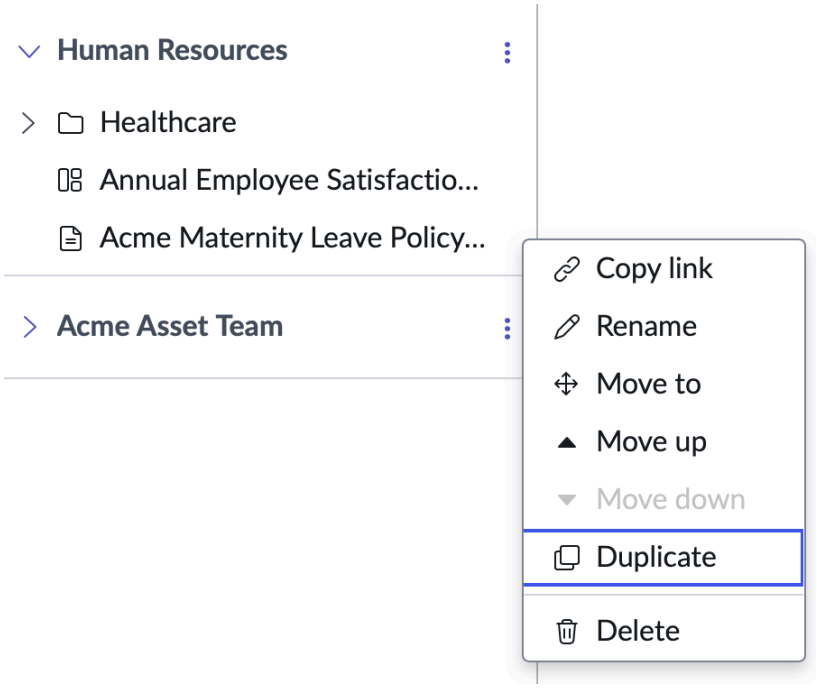

4. [ドキュメント名] フィールドに新しいドキュメントの名前を入力します。
   デフォルトの名前は、「(コピー) <元のドキュメント名>」という形式です。
5. [複製] を選択します。

タスクの結果
新しいドキュメントは、元のドキュメントと同じスペースに追加されます。必要に応じて、別のスペースまたは同じスペース内の別の位置に移動できます。

CWM のドキュメントを PDF ファイルにエクスポート

ドキュメントをオフラインで使用し、ドキュメントを PDF としてエクスポートして、 コラボレーションワーク管理 (CWM) の外部のチームやステークホルダーと共有します。

始める前に
CWM でのドキュメント作成


必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. スペースから、エクスポートするドキュメントを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. ドキュメント ヘッダーから、その他のアクション アイコン (••• を選択し、 **PDF** としてエクスポート を選択します。

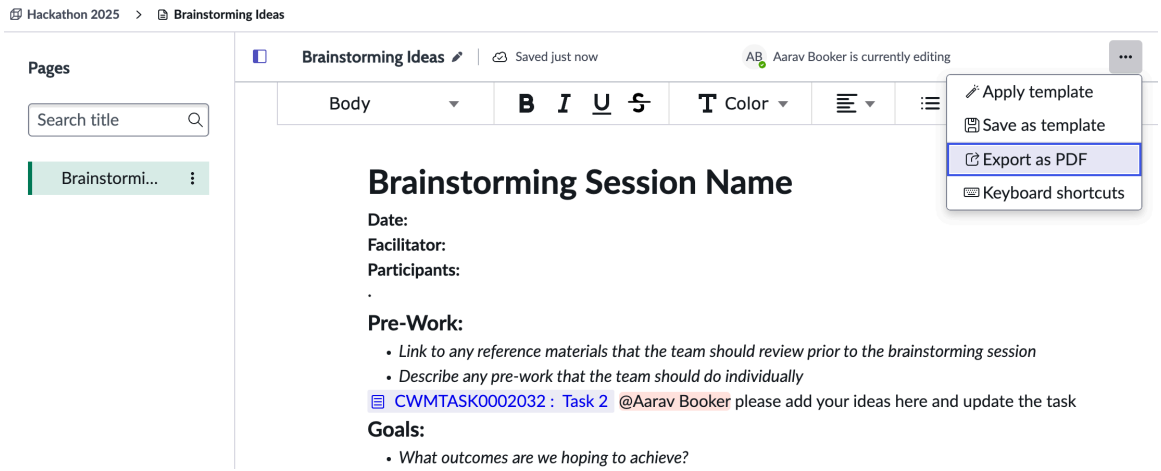

タスクの結果
ドキュメントがエクスポートされ、PDF ファイルとしてローカルシステムに保存されます。

ボードとドキュメント用の **CWM** のテンプレート

コラボレーションワーク管理 (CWM) は、事前定義されたテンプレートまたはカスタムテンプレートからボードとドキュメントを作成できるようにすることで、効率の向上、時間の節約、フォーマットの不整合の削減に役立ちます。

https://player.vimeo.com/video/1054556151?h=84dc648b21&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

同様のプロセス間でボードとドキュメントをゼロから作成すると、多くの場合、時間と労力が消費され、構造の違いが生じる可能性もあります。CWMのテンプレートを使用すると、ボードとドキュメントの事前定義された形式を取得し、そのまま使用することも、ワークフローに合わせてカスタマイズすることもできます。新しいボードとドキュメントにテンプレートを使用することも、既存のボードとドキュメントに適用することもできます。既存のボードまたはドキュメントを現在の形式でテンプレートとして保存することもできます。

テンプレートセンターは、ボードとドキュメントのすべてのテンプレートを管理できる一元化されたスペースを提供します。テンプレートセンターから、次のことができます。

- ボードとドキュメント用の事前定義されたテンプレートを確認します。
- 利用可能なテンプレートを [所有者] または [タイプ] でフィルタリングします。
- タイトルを使用してテンプレートを検索します。
- ボードまたはドキュメント形式のプレビューを表示できる利用可能なすべてのテンプレートの詳細を表示します。
- 所有しているテンプレートを削除します。

ボードのテンプレート

ボードにテンプレートを使用すると、テンプレートに含まれるテンプレートタスク、カスタム列、および共有列がボードに適用されます。ボードデータは、テンプレートの一部として利用可能なすべてのカスタム列とともに表示されます。

ドキュメント用テンプレート

ドキュメントにテンプレートを使用すると、テンプレートページとコンテンツの書式設定がドキュメントに適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テンプレートにアクセスするには、次のいずれかの方法を選択できます。

- テンプレートからボードまたはドキュメントを作成するには、次のオプションを使用します。
  - メインの [作成] メニューからテンプレートを探索します。
  - [新規ボード] または [新規ドキュメント] モーダルのテンプレートを使用します。
  - [その他のアクション] メニュー、またはボードまたはドキュメントのヘッダーからテンプレートを適用します。
- ボードまたはドキュメントをテンプレートとして保存する場合:[その他のアクション] メニュー、またはボードまたはドキュメントのヘッダーにある [テンプレートとして保存] オプションを使用します。

次のセクションは、 CWM でテンプレートの使用を開始するのに役立ちます。

でテンプレートからボードまたはドキュメントを作成する CWM


テンプレートセンターで事前定義されたテンプレートまたはカスタムテンプレートを使用して、ボードまたはドキュメントを作成します。

始める前に

必要なロール：sn_cwm.cwm_user


手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. **[+** 作成] を選択します。
3. [テンプレートの探索] を選択して、テンプレートセンターを開きます。



4. 使用するテンプレートを見つけます。
   - 利用可能なテンプレートを所有者またはタイプでフィルタリングする
   - タイトルまたはキーワードを使用してテンプレートを検索します。
5. 適用するテンプレートカードから、[使用] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

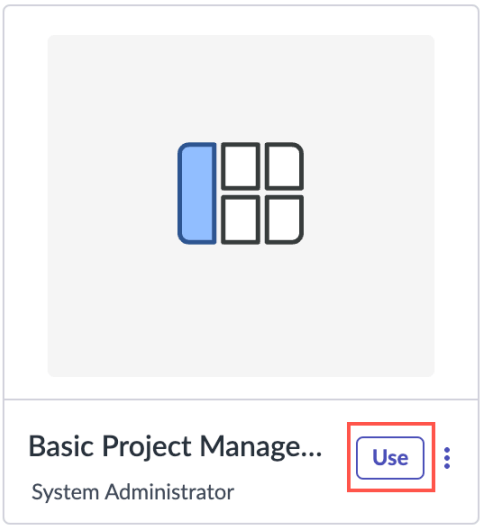

6. ボード名またはドキュメント名を入力します。
7. このボードまたはドキュメントを作成するスペースを選択します。
8. **[Save** (保存)] を選択します。

タスクの結果

選択したスペースにボードまたはドキュメントが作成されます。

- ボードの場合、テンプレートに含まれるテンプレートタスクとカスタム列がボードに適用されます。ボードビューの詳細については、「 のボードビュー CWM」を参照してください。
- ドキュメントの場合、すべてのテンプレートページとコンテンツの書式設定がドキュメントに適用されます。

で既存のボードまたはドキュメントにテンプレートを適用する **CWM**

事前定義されたテンプレートまたはカスタムテンプレートをワークスペース内の既存のボードまたはドキュメントに適用して コラボレーションワーク管理 プロセス全体の構造と形式の不整合を回避できます。

始める前に

- CWM でのボード作成
- CWM でのドキュメント作成

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. テンプレートを適用するボードまたはドキュメントを開きます。
3. ボード、ドキュメント、またはドキュメント内の単一ページにテンプレートを適用できます。

4. 使用するテンプレートを見つけます。
   - 利用可能なテンプレートをオーナーでフィルタリングします。[タイプ] フィルターは、前の手順での選択に基づいて自動的に設定されます。
   - タイトルを使用してテンプレートを検索します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. オプション: [テンプレートアクション] メニュー (⋮ から [詳細を表示] を選択して、テンプレートの詳細を確認します。
   ボードテンプレートの場合、このテンプレートを適用した場合に得られるボードビューの数とカスタムタスクタイプの詳細を表示できます。また、このテンプレートで有効になっているリスト、ガント、カンバン、およびスプリント計画立案ビューの情報を確認することもできます。

   (Optional) このテンプレートを適用すると、これらのビューの一部であるカスタム列のみが取り込まれます。

6. 適用するテンプレートカードから、[使用] を選択します。

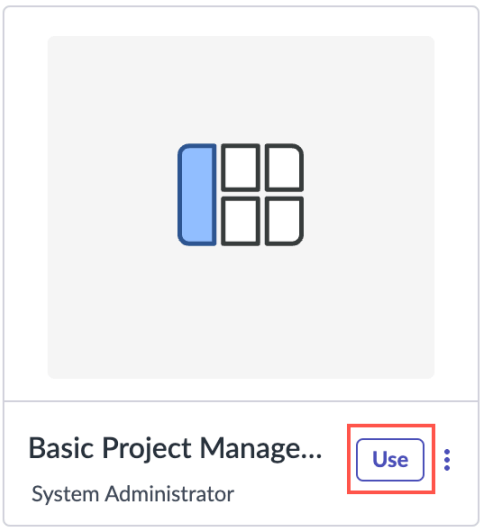

タスクの結果
選択したテンプレートがボード、ドキュメント、またはページに適用され、テンプレートに従ってデータが表示されます。

CWMボードまたはドキュメントをテンプレートとして保存する

作成またはカスタマイズしたボードやドキュメントをテンプレートとして保存すると、将来、他のボードやドキュメントで同じ構造と形式を再利用できます。

始める前に

- CWM でのボード作成
- CWM でのドキュメント作成

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. テンプレートとして保存するボードまたはドキュメントを開きます。
3. ボード、ドキュメント、または単一のドキュメントページをテンプレートとして保存できます。
4. テンプレートの名前と説明を入力します。
5. [共有先] の選択から、テンプレートのアクセスレベルを選択します。
6. [保存するボードビュー] の選択から、すべての共有ビューを含めるか、ボードの現在のビューのみを含めるかを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

7. このテンプレートに含まれるボードビューの数とカスタムタスクタイプを確認します。
8. **[Save** (保存)] を選択します。

タスクの結果

保存したテンプレートがテンプレートセンターに追加されます。

でのテンプレートの更新 **CWM**

コラボレーションワーク管理 (CWM) のテンプレートセンターを使用して、ボードテンプレートの共有権限を更新するか、ドキュメントテンプレートの形式を編集します。

始める前に

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

詳細を更新するには、テンプレートの所有者である必要があります。

このタスクについて

ボードテンプレートの更新


ボードテンプレートの共有権限、テンプレート名、および説明のみを変更できます。テンプレート内のタスク、列の順序、ソート、カスタム列、またはその他の設定は更新できません。

ドキュメントテンプレートを更新しています


ドキュメントテンプレートの形式、構造、ページとともに共有権限を変更できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. **[+** 作成] を選択します。
3. [テンプレートの探索] を選択して、テンプレートセンターを開きます。



4. 編集するテンプレートを見つけます。
   - 利用可能なテンプレートを所有者またはタイプでフィルタリングする
   - タイトルまたはキーワードを使用してテンプレートを検索します。
5. テンプレートカードから、[テンプレートアクション] メニュー (⋮ を選択し、[詳細を表示] を選択します。




6. テンプレートのタイトル、[アクセス と共有] 、または説明を変更します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ボードテンプレートの編集

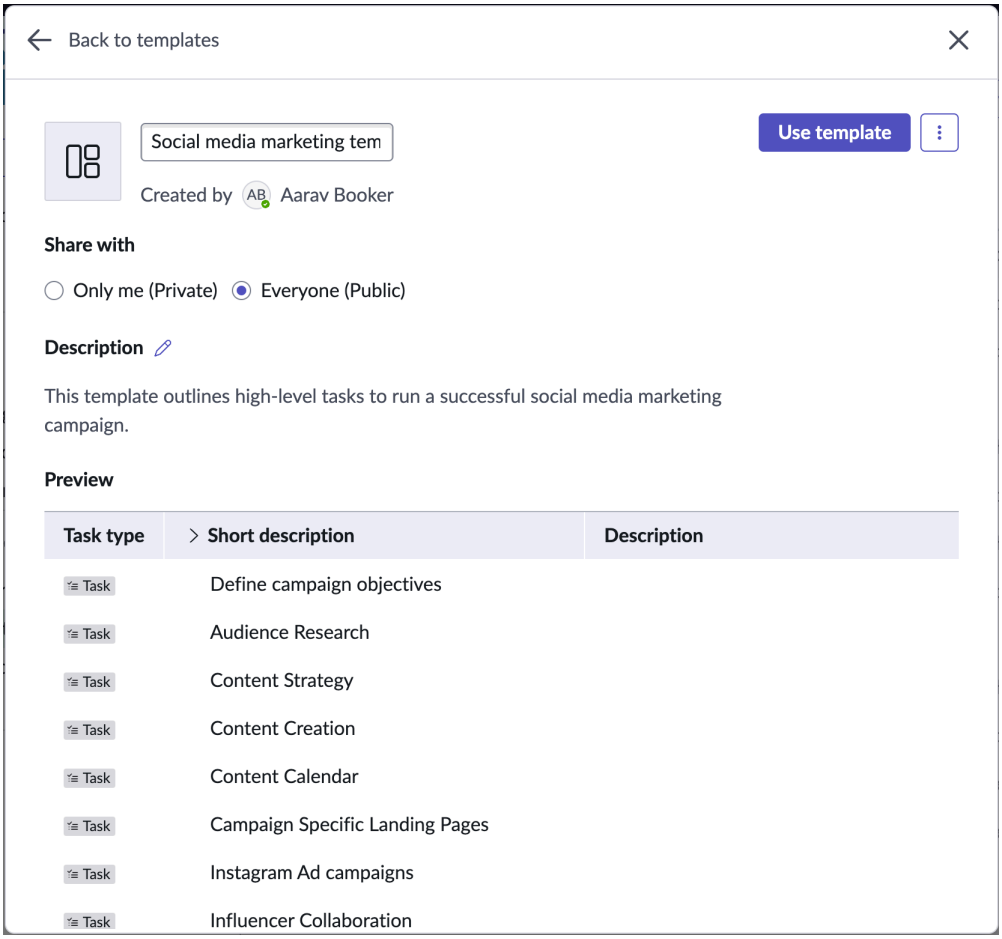

7. ドキュメントテンプレートの場合は、[編集] を選択してテンプレートのコンテンツを編集します。

ドキュメントテンプレートの編集

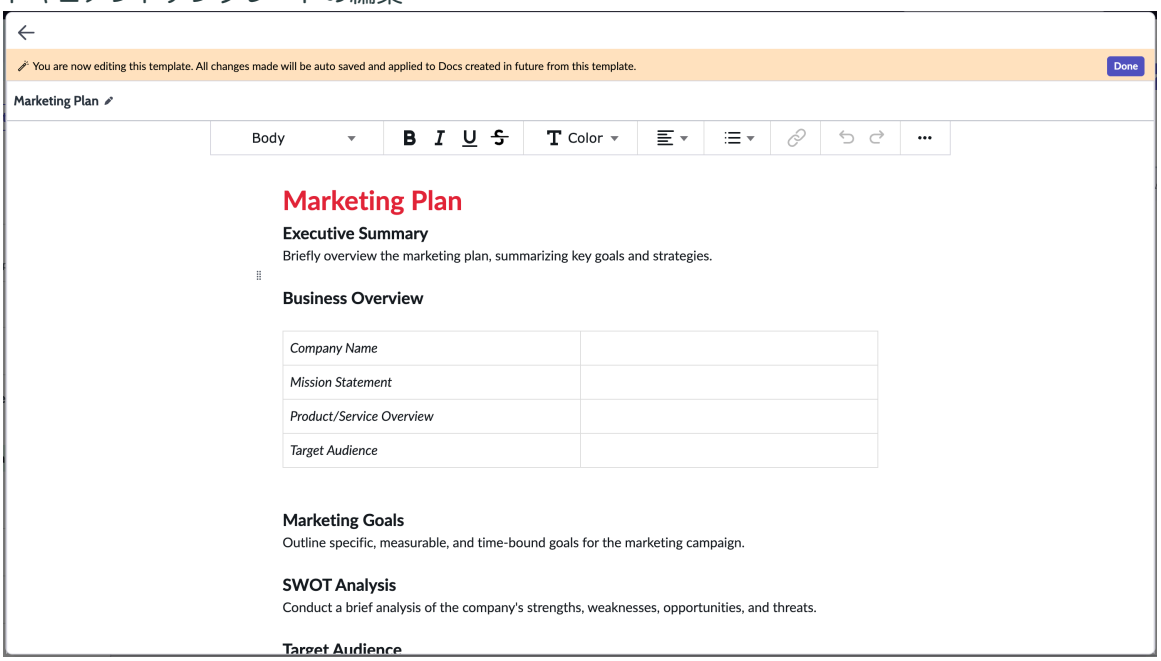

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

8. 変更を加えたら、[完了] を選択してテンプレートエディターを閉じます。
   変更は自動的にテンプレートに保存され、今後このテンプレートから作成するすべてのドキュメントに適用されます。

でのボードまたはドキュメントテンプレートの削除 CWM


コラボレーションワーク管理 (CWM) のテンプレートセンターを使用して、ワークフローで不要になったカスタムテンプレートを削除します。

始める前に
必要なロール：sn_cwm.cwm_user


削除するには、テンプレートの所有者である必要があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. [+ 作成] を選択します。
3. [テンプレートの探索] を選択して、テンプレートセンターを開きます。



4. 使用するテンプレートを見つけます。
   - 利用可能なテンプレートを所有者またはタイプでフィルタリングする
   - タイトルまたはキーワードを使用してテンプレートを検索します。
5. テンプレートカードから、[テンプレートアクション] ⋮ メニューを選択し、[削除] を選択します。



6. [削除] を選択して確定します。

タスクの結果
テンプレートは削除され、自分やチームが使用できなくなります。

コラボレーションワーク管理の参照

参照トピックでは、コラボレーションワーク管理 (CWM) とともにインストールされるロール、テーブル、およびプロパティに関する詳細を提供します。

コラボレーションワーク管理 とともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、コラボレーションワーク管理 アプリケーションのアクティブ化とともにインストールされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	含まれるロール
CWM ユーザー [sn_cwm.cwm_user]	CWM ワークスペースにアクセスするには、基本ロールが必要です。	なし

インストールされるテーブル

テーブル	説明
CWM 自動化 [sn_cwm_automation]	ボードの自動化条件のデータを格納します。
CWM ボード [sn_cwm_board]	すべてのタスク、ビュー、および列構成が含まれます。
CWM 列の選択肢 [sn_cwm_col_choice]	カスタム列用に作成された選択肢とラベルのデータを格納します。
CWM 列の使用状況 [sn_cwm_columns_usage]	カスタム列の使用状況とそのタイプを格納します。
CWM ドキュメント [sn_cwm_doc]	CWM 内で作成されたすべてのドキュメントの情報を格納します。
CWM ドキュメントページ [sn_cwm_doc_page]	CWM 内のドキュメント用に作成されたページとサブページの情報を格納します。
CWM ドキュメントリレーションシップ [sn_cwm_doc_m2m]	ドキュメントとドキュメントページ間の関係を保存します
CWM メニュー項目 [sn_cwm_menu_item]	スペース内のボード、ドキュメント、フォルダーのコンテンツ階層を格納します。
CWM 通知ダイジェスト [sn_cwm_notification_digest]	CWM ユーザーに送信された通知の情報を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
CWM 権限 [sn_cwm_permission]	スペースのユーザーおよびグループのさまざまなレベルの権限を格納します。
CWM スペース [sn_cwm_space]	すべての CWM スペースの情報を保存します。
CWM スペースアクセス要求 [sn_cwm_space_access_request]	スペースへのアクセスを要求したユーザーのリストを保存します。
CWM タスク [sn_cwm_task]	タスクデータを格納します。☒
CWM テンプレート [sn_cwm_template]	CWM ワークスペース内のボードおよびドキュメントテンプレートの情報を保存します。
CWM テンプレートボードのメタデータ [sn_cwm_template_board_metadata]	作業タイプ、自動化などの CWM ボードテンプレートのメタデータを保存します。
CWM テンプレートボードビュー [sn_cwm_template_board_view]	ボードテンプレート内のビューの情報を保存します。
CWM テンプレート列の選択肢 [sn_cwm_template_column_choice]	ボードテンプレート内の列の選択肢の情報を保存します。
CWM テンプレートカスタム列ラベル [sn_cwm_template_custom_column_label]	ボードテンプレート内のカスタム列ラベルの情報を保存します。
CWM テンプレートドキュメントページ [sn_cwm_template_doc_page]	ドキュメントテンプレート内のページの情報を格納します。
CWM テンプレートタスク [sn_cwm_template_task]	ボードテンプレート内のタスクの情報を保存します。
CWM ビュー設定 [sn_cwm_view_preference]	ボードのビュー設定の情報を保存します。
CWM ビュー	CWM 内のすべてのボードビューの情報を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
sn_cwm_view	
CWM 作業タイプ [sn_cwm_work_type]	スペース内で許可されたタスクの作業タイプを格納します。☒

コラボレーションワーク管理とともにインストールされるプロパティ

以下のシステムプロパティを構成すると、CWM のドキュメントに他の ServiceNow AI Platform レコードを含めたり、CWM 以外のユーザーがワークスペースへのアクセスを要求する方法を変更したりできます。

これらのプロパティはコラボレーションワーク管理で利用可能です。

注:
システムのプロパティ [sys_properties] テーブルを開くには、ナビゲーション フィルターに「sys_properties.list」と入力します。

コラボレーションワーク管理 のプロパティ

プロパティ	説明
sn_cwm.request_role_access	ワークスペース内の CWM 以外のユーザーに対して [アクセスの要求] ボタンを表示または非表示にするプロパティ。 デフォルトでは、このボタンは非表示になっています。このプロパティが true に設定されている場合、イベント *sn_cwm.REQUEST_ROLE_ACCESS* が発生します。アドミニストレーターは、このイベントを設定して次のいずれかのワークフローをトリガーし、CWM 以外のユーザーがワークスペースへのアクセスを要求できるようにすることができます。 • サービスカタログ要求を上げる。 • メールを送信する。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
sn_cwm.record_mention_config	CWM ワークスペースのドキュメントページ内の ServiceNow AI Platform レコードのメンションを構成するプロパティ。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：[{"sourceTable":"sn_cwm_task","label":"CWM Task","fields":["short_description","number"]}]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コラボレーションワーク管理 のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	デフォルトでは、このプロパティは CWM タスクレコードを含むように構成されています。 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル 他の ServiceNow AI Platform レコードを含めるには、プロパティを更新します。 たとえば、ドキュメントページのインシデントレコードを参照するには、このプロパティの [値] フィールドを更新してインシデントテーブルを含めます。 更新された [値] フィールドには、CWM タスクレコードとインシデントレコードの構成が含まれます。 `[{"sourceTable":"sn_cwm_task","label":"CWM Task","fields":["short_description","number"]},{"sourceTable":"incident","label":"Incident","fields":["short_description","number"]}]`
sn_cwm.connect_work_import_limit	接続された作業機能を使用するときに初めて CWM ボードにインポートできるアイテムの最大数を構成するためのプロパティ。 • タイプ：整数 • デフォルト値： 100 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
sn_cwm.agile_enabled	CWMアジャイル関連機能を制御するプロパティ。true に設定すると、ストーリーやエピックなどのアジャイルアイテムを CWM ボードで作成でき、スプリント計画立案機能が有効になります。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
sn_docs.send_email_enabled	ドキュメントページのコンテンツのメール送信を有効または無効にするプロパティ。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CWM My Work のステータスレポートでのタスクのグループ化

コラボレーションワーク管理 (CWM) の [自分の作業] レポートで、CWM タスク、アジャイルストーリー、プロジェクトタスクなどのさまざまなタスクが、ステータスと優先度に基づいてどのようにグループ化されているかについて説明します。

さまざまなタスクタイプの [自分の作業] のステータスバケット

自分の作業ステータスバケット	CWM およびプロジェクトワークスペース	スクラムタスク	アジャイル/ストーリー	デマンドタスク	デマンドワークベンチ	リスク (ステータス)	決定 (ステータス)	デマンドタスク 2
オープン	• 保留 • オープン	• ドラフト • ブロック済み • 準備完了	• ドラフト • 準備完了	• 保留中 • オープン	• ドラフト • 送信済み	保留中	保留中	保留中
対応中	対応中	対応中	• 対応中 • テスト準備完了 • テスト • 受け入れの準備ができました」	対応中	スクリーニング			対応中
クローズ済み	• 完了してクローズ • 未完了でクローズ • スキップしてクローズ	• 完了 • キャンセル	• 承認済み • 完了 • キャンセル	• 完了してクローズ • 未完了でクローズ • スキップしてクローズ	• 資格認定済み • 未完了 • 保留 • 却下	• 達成 • 未達成 • 回避 • 緩和 • 移転 • 承認	• 承認済み • 却下	• クローズ済み • 完了 • 未完了でクローズ • スキップしてクローズ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

さまざまなタスクタイプの [自分の作業] の優先度バケット

自分の作業優先度バケット	**CWM** およびプロジェクトワークスペース	スクラムタスク	アジャイルストーリー	デマンドタスク	デマンドワークベンチ	リスク	**Decision**	デマンドタスク
重要	重要	重要	重要	重要	重要	絶対	重要	重大
高	高	高	高	高	高	高	高	高
中	中	中	中	中	中	中	中	中
低	低	低	低	低	低	低	低	低
計画	計画	計画	計画	計画	計画	NA	計画	計画

関連情報


CWM の [自分の作業]

コラボレーションワーク管理の **Now Assist (CWM)**

CWM の Now Assist アプリケーションは、生成 AI スキルを使用して、CWMワークスペースで実行するタスクの価値実現までの時間を短縮します。


開始するには

探索

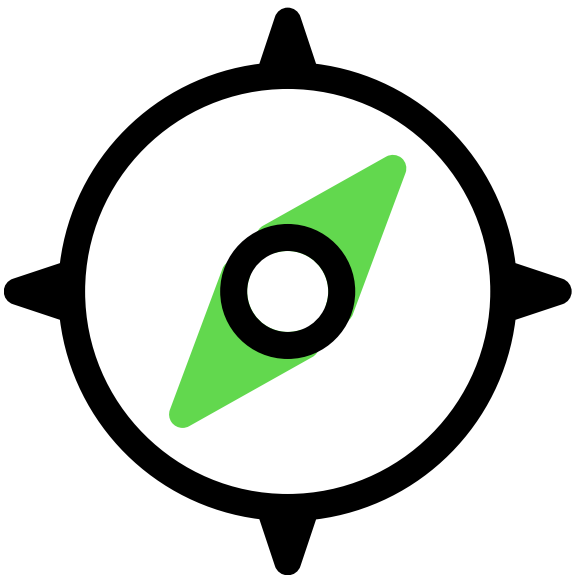

機能と主なメリットについて学ぶ


構成

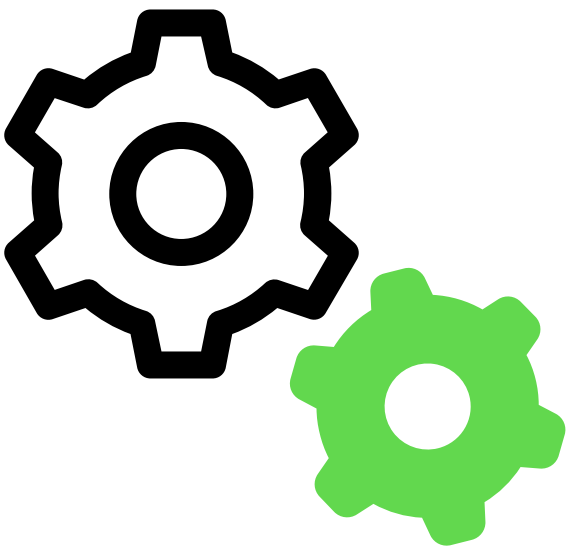

実装を設定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

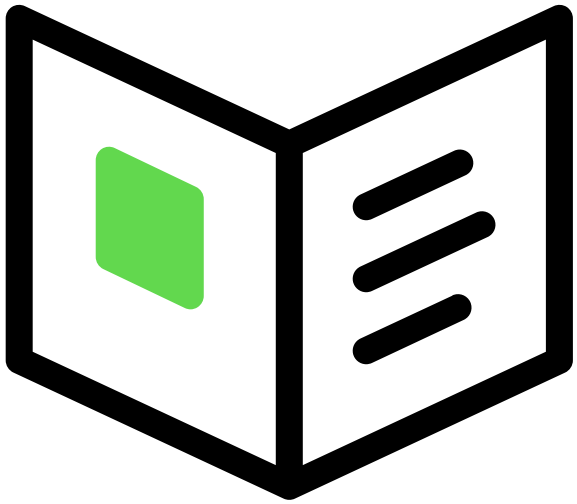使用方法	参照
	
CWM で生成 AI 機能の使用を開始する	ロール、テーブル、およびシステムプロパティについて学習する

重要:

- 国内の SKU をお持ちのお客様は、すべてのモデルプロバイダーを利用できるわけではなく、一部の Now Assist 製品/機能は現在、国内のお客様はご利用いただけません。詳細については、Now Support ナレッジベースの KB1584492 記事を参照してください。将来のリリースでモデルプロバイダーの可用性の更新を必ず確認してください。
- 現在、 Now Assist 製品/機能の一部は、FedRAMP、NSC DOD IL5、オーストラリアの IRAP で保護されたデータセンターのお客様、セルフホスト型のお客様、またはその他の制限された環境ではご利用いただけません。詳細については、Now Support ナレッジベース記事「KB0743854」を参照してください。将来のリリースで可用性の更新を必ず確認してください。
- 現在、一部の Now Assist 製品/機能は一部の地域の顧客のみが利用できます。将来のリリースで可用性の更新を必ず確認してください。

すべての Now Assist スキルと AI エージェントの AI モデルプロバイダーとして、Now LLM サービス、Azure OpenAI、Google Gemini、または Anthropic Claude on AWS を使用できます。での構成コントロールの使用 AI コントロールタワー 利用可能なオプションを定義するには、次でスキルレベルの設定を行います Now Assist アドミン 慰める. 詳細については、「Large language models on the ServiceNow AI Platform」を参照してください。

AI の制限事項

このアプリケーションは、データ内のパターンに基づいて予測を生成する急速に進化している研究分野である人工知能 (AI) と機械学習を使用しています。その結果、このアプリケーションは必ずしも正確、完全、または適切な情報を生成するとは限りません。さらに、このアプリケーションがユースケースに合わせて完全にトレーニングまたはテストされているという保証はありません。これらの問題を軽減するために、ユースケースに対する正確性、害、および適切性について、このアプリケーションの使用をテストおよび評価し、出力を人間が監視し、意思決定の目的で AI で生成された出力のみに依存しないようにするのは、ユーザーの責任です。これは、医療、ファイナンス、法務、雇用、セキュリティ、インフラストラクチャなど、結果が影響を与える分野にこのアプリケーションを

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

展開することを選択した場合に特に重要です。ServiceNow の AI 利用規定 に従うことに同意するものとします。このポリシーは ServiceNow によって更新される場合があります。

データ処理

このアプリケーションでは、ServiceNow 顧客の個々のインスタンスから一元化された ServiceNow 環境にデータを転送する必要があります。この環境は、インスタンスが存在するデータセンターとは異なるデータセンターリージョンに配置されている可能性があり、場合によっては Microsoft Azure などのサードパーティクラウドプロバイダーにも転送されます。このデータは、コアコンプライアンスポータル から利用可能なポリシーを含む、ServiceNow の内部ポリシーと手順に従って処理されます。

データコレクション

ServiceNow は、このアプリケーションの入力、出力を収集して使用し、出力を編集して、ServiceNow モデルや AI 製品などの ServiceNow テクノロジーを開発および改善します。さらに、このアプリケーションは タスクデータ (ケース支援の場合) およびチャットのトランスクリプト (チャット支援の場合)。 お客様は、「Now Assistオプトアウトに関するページ 」の説明に従って、いつでも将来のデータコレクションをオプトアウトできます。

詳細については、 Now Assist ドキュメント .


コラボレーションワーク管理の **Now Assist (CWM)** の探索

CWM の Now Assistの生成 AI 機能と、それらが CWM ワークスペース内でチームが実行するアクションの時間を節約し、効率を向上させるのにどのように役立つかについて詳しく説明します。

スキル

CWM Docs で要約することで、ページのコンテンツに関するインサイトを取得します。長いドキュメントをレビューする場合でも、会議の準備をしている場合でも、Doc 要約スキルは、常に情報を入手し、効率的に行うのに役立ちます。

ドキュメント要約スキルを使用すると、コンテンツを詳しく説明したり短縮したりすることもできるため、 CWM ドキュメントページのコンテンツ品質が向上します。長い段落をすばやく短くしたり、箇条書きを言い換えたり、重要なポイントを拡張したりして、コンテンツが特定のニーズに合わせて調整されるようにします。

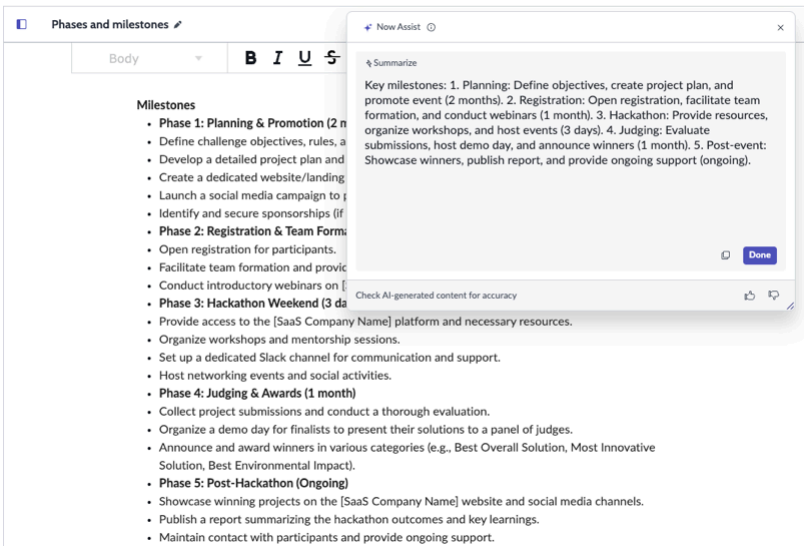


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CWMボードの詳細な説明を含むタスクを作成するには、多大な時間と手作業が必要です。タスクが十分に詳細でないと、チーム内の混乱や不整合を招き、期待される結果の理解に影響を与える可能性があります。この手作業を回避し、価値実現までの時間を短縮するために、 Now Assist ドキュメントの情報を使用してボードのタスクを生成できます。このようにして、明確で包括的なタスクの説明を確保できるため、管理作業ではなく実行に集中できます。

推奨事項に基づいて、次のいずれかを実行するように Now Assist に依頼できます。

- 元の推奨事項に従ってタスクを生成します。
- タスク推奨事項を複数のタスクに分割します。
- 複数のタスク推奨事項を 1 つのタスクにまとめます。
- タスクの推奨事項を削除します。

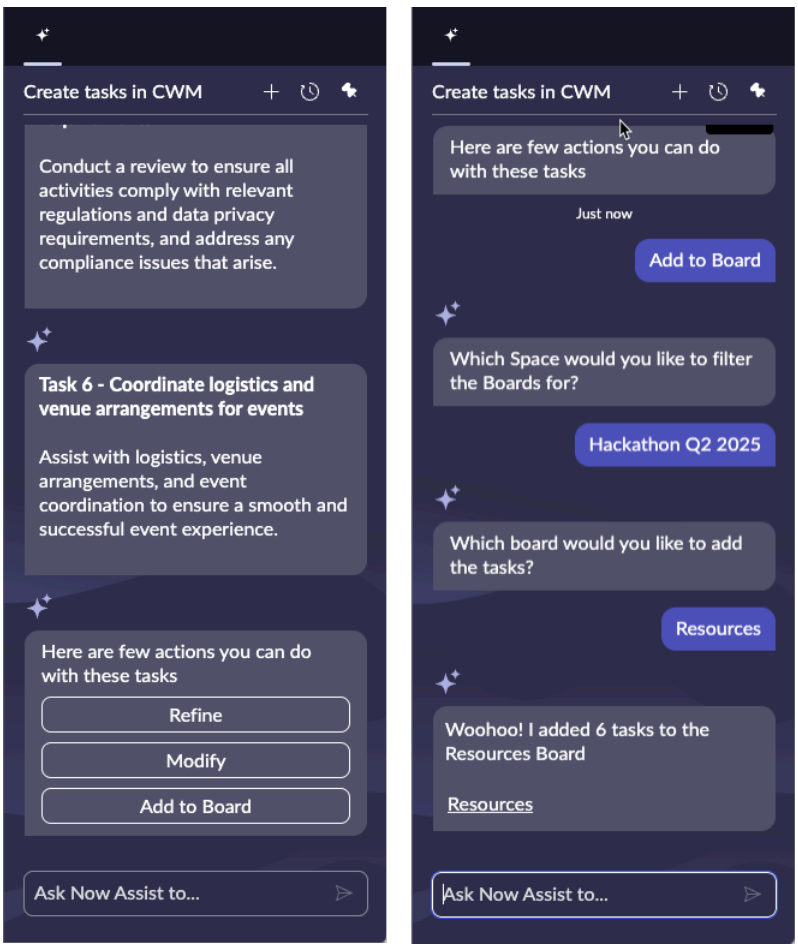

したがって、 CWM内でタスク生成スキルを使用すると、次のことができます。

- 最初の障害を取り除き、 CWM ボードのタスクを作成します。
- タスク作成プロセスを自動化することで、時間を節約し、生産性を向上させます。

すべての Now Assist スキルと AI エージェントの AI モデルプロバイダーとして、Now LLM サービス、Azure OpenAI、Google Gemini、または Anthropic Claude on AWS を使用できます。での構成コントロールの使用 AI コントロールタワー 利用可能なオプションを定義するには、次でスキルレベルの設定を行います Now Assist アドミン 慰める. 詳細については、「Large language models on the ServiceNow AI Platform 」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Now Assist アドミン コンソール

アドミニストレーターは、Now Assist アドミンコンソールを使用して、CWMワークスペースのNow Assist機能とスキルを有効にして管理できます。詳細については、「Overview tab in Now Assist Admin」を参照してください。

Now AssistCWMワークスペースのパネル

ナレッジワーカーは、CWMワークスペースのNow Assistパネルを使用できます。この対話型インターフェイスを使用すると、ユーザーはドキュメントページのコンテキストから CWM タスクを生成できます。Now Assist パネルの詳細については、「Now Assist panel」を参照してください。

次に探索する内容

CWM の Now Assistを構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。

- コラボレーションワーク管理の Now Assistの構成 (CWM)
- コラボレーションワーク管理のドキュメントからタスクを生成 (CWM)
- コラボレーションワーク管理の Now Assist (CWM) 参照

コラボレーションワーク管理の Now Assistのサポート情報 (CWM)

CWM の Now Assist のサポートされているバージョン、ユーザーインターフェイス、およびアプリケーションの依存関係について説明します。

互換バージョン

CWM の Now Assist アプリケーションはYokohamaパッチ 3 リリース以降と互換性があります。

サポート対象のユーザーインターフェイス

CWM の Now Assist アプリケーションは、コラボレーションワーク管理 バージョン 6.0.0 以降でサポートされています。

アプリケーション情報

最新の コラボレーションワーク管理の Now Assist (CWM) ストアアプリ (sn_cwm_ai) をインストールすると、Now Assist for Platform (sn_genai_platform) もインストールされます。

関連情報

コラボレーションワーク管理の Now Assistの構成 (CWM)

コラボレーションワーク管理の Now Assistの構成 (CWM)

admin ロールを持っている場合は、チームメンバーが CWM ワークスペースで生成 AI スキルを利用できるように、CWM の Now Assist アプリケーションの実装を構成できます。

始める前に

- CWM の Now Assist機能をサポートするために必要な CWM アプリケーションの最小バージョンは v6.0.0 以降です。以前のバージョンを使用している場合は、アプリケーション マネージャーを使用してアプリをアップグレードします。「Update an application or plugin」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コラボレーションワーク管理の Now Assist (CWM) プラグイン (sn_cwm_ai) をインストールします。「Install Now Assist plugins」を参照してください。
- Turn on the Now Assist panel。

必要なロール：admin

このタスクについて
Now Assist アドミン コンソールを使用して、次の CWM の Now Assist スキルをアクティブ化します。

- コラボレーションワーク管理でのドキュメントの要約
- タスク生成

> **注:**
> Now LLM サービス は、この Now Assist アプリケーションのスキルのデフォルトのプロバイダーです。

手順

1. 移動先 すべて > **Now Assist** アドミン > スキル.
   Now Assist アドミン コンソールの **[Now Assist** スキル] タブが表示されます。
2. **[Technology** grouping] から **[CWM]** を選択します。
   CWMスキルはタイルとして表示されます。
3. アクティブ化するスキルで、[スキルのアクティブ化 **(Activate skill)]** を選択します。
4. 以下のセクションのスキル構成設定を確認します。
   - 入力を選択:これらは、 CWM ドキュメントページ内で選択したコンテンツを要約して絞り込むためのスキル設定です。

     このセクションは、タスク生成スキルには使用できません。
   - **[Save and continue** (保存して続行)] を選択します。
   - ページ入力:これらは、 CWM ドキュメントページのコンテンツ全体を要約するためのスキル設定です。

     このセクションは、タスク生成スキルには使用できません。

     入力を編集するには、アプリケーションスコープを コラボレーションワーク管理 **(CWM)** の **Now Assist** に切り替えます。
   - **[Save and continue** (保存して続行)] を選択します。
   - Select display (表示を選択する) :
     - 製品内デスクトップ:このオプションを有効にすると、 CWM ワークスペース内にスキルが表示されます。
     - **Now Assist** パネル:このオプションを有効にすると、 Now Assist パネル内にスキルが表示されます。

       > **注:**
       > スキルに基づいて表示オプションを使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- **[Save and continue** (保存して続行)] を選択します。
- レビューとアクティブ化:スキルの選択内容をレビューします。

5. **[Activate** (アクティブ化)] を選択します。

タスクの結果
スキルが正常にアクティブ化されました。

次のタスク
CWMスキルグループに戻り、残りのスキルをアクティブ化するプロセスを繰り返します。

スキルへのアクセスを必要とするカスタムロールがある場合は、アクセスが必要なロールの ACL を更新します。詳細については、「Implement access control in Now Assist AI agents」を参照してください。

関連情報

コラボレーションワーク管理の Now Assistのサポート情報 (CWM)

コラボレーションワーク管理の Now Assist (CWM) のスキル入力

コラボレーションワーク管理の **Now Assist (CWM)** のスキル入力

CWM の Now Assistの各スキルの入力について説明します。スキルの入力を構成することで、CWM ワークスペース内でスキルをいつどのように使用するかを決定できます。

Doc 要約スキルの入力

CWM ドキュメントでのブロックレベルのコンテンツ要約の入力
これらの入力値は、CWM *Docs* の部分的なコンテンツの要約と改良の動作に影響します。

フィールド	説明
アクティブである	
WWNA コンポーネント ID	docs-sn-cwm-doc
テーブル	CWM ドキュメント
メニューアクション	
デフォルトのアクション	
絞り込みアクション	
行動喚起	
ボタンのプロパティ	
推奨事項ダイアログのプロパティ	
タイムアウトエラーメッセージ	
構成済み列	
詳細なフィードバックを有効にする	
肯定的なフィードバック	
否定的なフィードバック	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CWM ドキュメントでのブロックレベルのコンテンツ要約の入力
これらの入力値は、CWM *Docs* の部分的なコンテンツの要約と改良の動作に影響します。

(続く)

フィールド	説明
バリアント	
拡張テーブルを有効にする	

CWM Docs でのページレベルの要約の入力
これらの入力値は、CWM *Docs* でのページコンテンツ全体の要約の動作に影響します。

フィールド	説明
アクティブである	
WWNA コンポーネント ID	docs-page-sn-cwm-doc
テーブル	CWM ドキュメント
メニューアクション	
デフォルトのアクション	
絞り込みアクション	
行動喚起	
ボタンのプロパティ	
推奨事項ダイアログのプロパティ	
タイムアウトエラーメッセージ	
構成済み列	
詳細なフィードバックを有効にする	
肯定的なフィードバック	
否定的なフィードバック	
バリアント	
拡張テーブルを有効にする	

関連情報

コラボレーションワーク管理の Now Assistの構成 (CWM)

コラボレーションワーク管理の **Now Assist (CWM)** の使用

CWM の Now Assistの生成 AI 機能を使用して、時間を節約し、手作業を減らし、全体的な効率を向上させます。

次のタスクは、CWMワークスペース内でNow Assistスキルを使用するためのガイダンスを提供します。ユースケースに適したタスクに移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コラボレーションワーク管理 (CWM) のドキュメントページのコンテンツの要約および絞り込み。
- コラボレーションワーク管理のドキュメントからタスクを生成 (CWM)。

コラボレーションワーク管理 **(CWM)** のドキュメントページのコンテンツの要約および絞り込み

ページコンテンツを要約してインサイトを得たり、 CWM Docs で絞り込んでコンテンツの品質を向上させたりします。

始める前に


- CWM でのドキュメント作成。
- コラボレーションワーク管理のドキュメント要約スキルをアクティブ化 Now Assist 。「コラボレーションワーク管理の Now Assistの構成 (CWM)」を参照してください。

必要なロール:sn_cwm_ai.cwm_ai_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.

2. [スペース] メニューから、ドキュメントがあるスペースに移動して開きます。



3. ドキュメントから、要約または絞り込みたいページを開きます。

4. 選択したテキストをページ上で要約するか、ページ全体を要約するかを選択します。

- 選択したテキストを絞り込むには:


  a. ページ上のコンテンツの単一のブロックまたは複数のブロックを選択します。

  b. [Now Assist] を選択し、オプションを選択します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [要約を作成] を選択して、選択したテキストを要約します。
- 既存の コンテキストに基づいて選択したテキストを長くするために詳細を設定します。
- 短縮して 、選択したテキストを簡潔にします。



- ページのコンテンツ全体を要約するには、ドキュメントヘッダーから **[Now Assist**] を選択し、[要約を作成] を選択します。

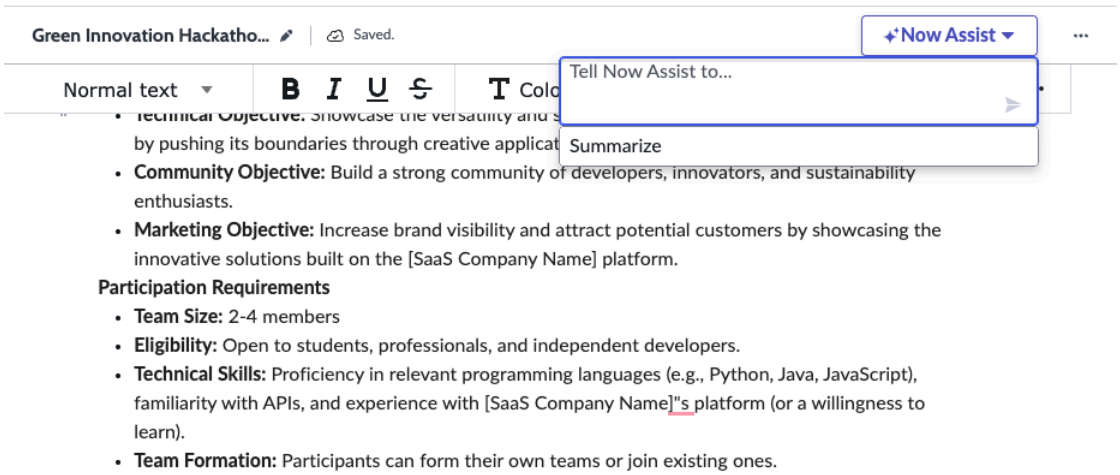

ヒント:
要約するコンテンツが他にもある場合は、一部のテキストを削除して再試行できます。

Now Assist がテキストを分析し、別のポップアップに出力を生成します。

5. オプション: 生成された出力に基づいて、結果をさらに絞り込むことができます。
6. オプション: [クリップボードにコピー] アイコン ( ) を選択して生成された出力をコピーし、メールの送信、メモへの保存などの目的に使用します。

重要:
出力は AI によって生成されたものであるため、正確であることを確認してください。

コラボレーションワーク管理の **Now Assist**を使用してドキュメントコンテンツを生成して改善する **(CWM)**

カスタムプロンプトを使用して、ドキュメントで直接 CWM の Now Assist を含むコンテンツを生成します。さらに、既存のセクションを要約し、必要に応じて詳しく説明し、ドラフトを調整して生産性を向上させます。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール:sn_cwm_ai.cwm_ai_user

このタスクについて
ドキュメントで Now Assist を直接操作して、新しいコンテンツを作成したり、コンテキストを追加したり、既存のセクションを改善したりできます。これにより、ページを離れることなく、より迅速にドラフトを作成し、アイデアを絞り込み、作業を関連性のある状態に保つことができます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. [スペース] メニューから、ドキュメントがあるスペースに移動して開きます。



3. ドキュメントから、作業するページを開き、任意のユースケースに Now Assist を使用します。Now Assist がテキストを分析し、別のポップアップに出力を生成します。
4. オプション: 生成された出力に基づいて、結果をさらに絞り込むことができます。
5. オプション: [クリップボードにコピー] アイコン ( ) を選択して生成された出力をコピーし、メールの送信、メモへの保存などの目的に使用します。

重要:
出力は AI によって生成されたものであるため、正確であることを確認してください。

コラボレーションワーク管理のドキュメントからタスクを生成 (CWM)

Now Assistの生成 AI 機能を使用して、ドキュメントのコンテンツからタスクを作成し、CWMワークスペースで必要なボードに追加できます。

始める前に
CWM でのドキュメント作成

必要なロール:sn_cwm_ai.cwm_ai_user

このタスクについて


https://player.vimeo.com/video/1079861522?h=a6bccdb612&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

手順

1. 移動先 ワークスペース > コラボレーションワーク管理.
2. [スペース] メニューから、ドキュメントがあるスペースに移動して開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

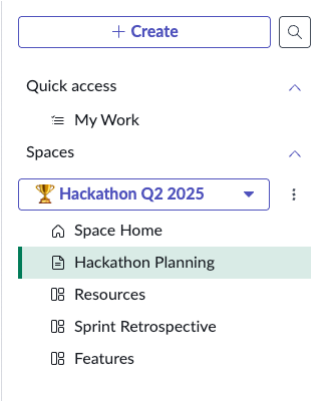


3. ServiceNow インスタンスのヘッダーから **Now Assist** ( ) を選択します。
   [Now Assist] パネルが開きます。次のステップはパネル内で実行されます。そのため、パネル内でより簡単にインタラクションを体験できるように、パネルを固定することができます。
4. オプション: [新規チャット] ( ) を選択して、Now Assistパネル内で新しい会話を開始します。
   既に開いている会話を終了する場合、またはパネル内に **[CWM** でタスクを作成] オプションが表示されない場合は、このステップを実行します。
5. **[CWM** でタスクを作成] を選択します。
   Now Assist は、ドキュメントページの情報に基づいてタスクの推奨事項を生成します。
6. オプション: タスク推奨事項を確認し、タスク推奨事項を絞り込むか変更するかを選択します。
7. タスクの調整や変更を繰り返し行うことができ、推奨事項に問題がなければ ボード に追加 を選択します。
8. これらのタスクを追加する CWM ボードのスペースを選択します。
9. これらのタスクを追加するボードを選択します。

   Now Assist は、生成されたすべてのタスク推奨事項を選択したボードに追加します。Now Assistメッセージに記載されているリンクからボードに移動して、レビューできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ステップ 8 で選択したスペースにボードが 1 つしかない場合、ボードの選択は求められません。タスクがボードに直接追加されます。

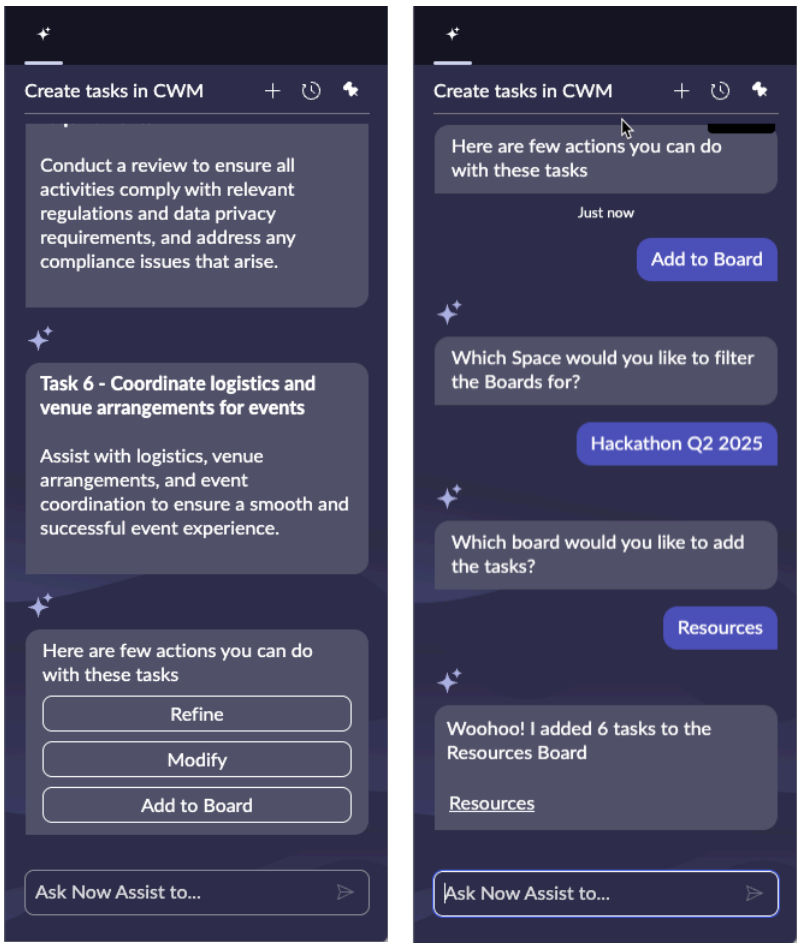

コラボレーションワーク管理の **Now Assist (CWM)** 参照

参照トピックでは、 CWM の Now Assist とともにインストールされるロールについて詳しく説明します。

コラボレーションワーク管理の **Now Assist (CWM)** とともにインストールされるロール

CWM AI ユーザーロール (sn_cwm_ai.cwm_ai_user) を使用すると、ユーザーは CWM の Now Assist アプリケーションで利用可能な生成 AI スキルを使用できます。

ロールを含む

sn_cwm_ai.cwm_ai_user ロール内に含まれるロール: *sn_cwm.cwm_user*

グループ

このロールがデフォルトでアサインされているグループ:なし。

特別な考慮事項

なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ゴールフレームワーク および SPM のゴールフレームワーク

目標を作成し、そのためのターゲットを設定して、目標とターゲットの進捗状況を評価し、ServiceNow® ゴールフレームワーク を使用して組織計画を達成してビジネスの成果を推進します。

ServiceNow® SPM のゴールフレームワーク アプリケーション (旧 高度なゴールフレームワーク) を使用すると、ターゲットの実績値を自動化できます。SPM のゴールフレームワーク アプリケーションは ゴールフレームワーク アプリケーションの拡張です。SPM のゴールフレームワーク アプリケーションをインストールすると、ゴールフレームワーク のすべての機能とターゲット自動化機能を入手できます。

ゴールフレームワーク を使用すると、組織の戦略的優先順位および関連する目標を戦略的計画の一部として定義できます。目標が作成された後、デマンド、プロジェクト、エピック、プログラム、イニシアチブなどの作業、計画アイテム、戦略アイテムを関連付けることができます。

ServiceNow® 戦略的計画 ユーザーは、組織のレンズを使用してカスタマイズされたポートフォリオ計画を定義し、それを使用して組織のポートフォリオ計画に従って目標を調整できます。レンズを使用してポートフォリオ計画を定義する方法については、「レンズとポートフォリオ計画」を参照してください。組織のビジョン、ミッション、および価値をキャプチャすることによって、戦略的計画を作成することもできます。

ゴールフレームワーク の主なメリット：

- 組織全体が同じ戦略的優先事項に確実に集中して取り組めるようになる。
- 取り組みを調整して可視化することに注力できる。
- 作業アイテムや計画アイテムを目標に関連付けることにより、目標を達成し、ターゲットを満たすために実行されている作業を簡単に可視化できる。
- 週次、月次、および四半期ごとの期間にわたる目標のリアルタイムチェックポイントを提供する。
- sn_gf.epmo_strategy_planner ロールを持つユーザーに目標パフォーマンスのエンドツーエンドのビューを提供する。





SPM のゴールフレームワーク の主なメリット：

- 利益計画、コスト計画、アセスメント/サーベイ、PA インジケーターなどのさまざまなターゲットソースから実績を収集することで、ターゲットの実績値を自動化できます。
- ServiceNow® AI Platform に存在する任意のテーブルまたはテーブルの組み合わせをターゲットソースとして設定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開始

探索	比較	構成
		
ゴールフレームワーク機能とSPM のゴールフレームワーク機能について説明します	ゴールフレームワークとSPM のゴールフレームワークの機能を比較する	ゴールフレームワーク とSPM のゴールフレームワーク
使用方法	**参照**	
		
組織の計画を達成し、ビジネスの成果を促進するための目標を定義する方法を学ぶ	フィールド、テーブル、ロール、プロパティなどのコンポーネントの詳細を取得します。	

トラブルシューティングとサポート

- で質問や回答をする 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) フォーラム ServiceNow コミュニティ.
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する詳細については、「既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する」を参照してください。
- カスタマーサービス & サポートにお問い合わせください。詳細については、次を参照してください。 連絡先 カスタマーサービス & サポート.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ゴールフレームワーク と **SPM** のゴールフレームワーク の探索

ゴールフレームワーク アプリケーションは、目標を作成し、そのためのターゲットを設定し、目標とターゲットの進捗状況を評価して、組織計画を達成してビジネスの成果を推進するのに役立ちます。

SPM のゴールフレームワーク アプリケーションを使用すると、利益計画、コスト計画、アセスメント/サーベイ、PA インジケーターなどのさまざまなターゲットソースから実績を収集することで、ターゲットの実績値を自動化できます。

ゴールフレームワーク キーコンポーネント

- 戦略的優先事項：組織の戦略計画を目標に向けるために役立つ戦略計画のアクション
- 目標：戦略計画に基づいて達成したい目標。
- ターゲット：目標の進捗状況を追跡して測定するための目標のターゲット

SPM のゴールフレームワーク の主要コンポーネント：

ターゲットソースは SPM のゴールフレームワーク の主要コンポーネントです。ターゲットソースは、ターゲットの実績値を自動更新するために使用されるターゲットの構成であり、ターゲットとその目標の進捗状況が自動的に更新されます。

戦略的優先事項

戦略的優先度は、組織の計画の目標です。戦略的優先度は、指定された期間に目標を達成するのに役立ちます。戦略的優先事項は、重点分野または長期戦略とも呼ばれます。戦略的優先事項を定義すると、組織の戦略的計画を目標に向けることができます。

目標

目標とは、組織が組織計画を達成するために設定する目標を指します。目標は通常、定性的な性質のものです。目標は意欲的なものでなければならず、チームの意欲をかきたて、やりがいを与えることが期待されます。目標の例を次に示します。

- 2022 年末までに再生可能エネルギーを使用。
- 職場の多様性を 50% 向上させる。

目標にサブ目標を設定することもできます。作業アイテムおよび計画アイテムを目標に関連付けて、目標達成の責任者を追跡することもできます。

他の製品で ゴールフレームワーク を使用する場合は、次のこともできます。

- ServiceNow® プロジェクトポートフォリオ管理 ユーザーの場合は、デマンド、プロジェクト、およびプログラムを目標に関連付けて、目標を達成するために行われている作業をキャプチャできます。
- ServiceNow® アジャイル開発 2.0 ユーザーの場合は、スクラムエピックを目標に関連付けて、目標を達成するために行われている作業をキャプチャできます。
- ServiceNow® 大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) ユーザーの場合は、SAFe エピックおよび SAFe 機能を目標に関連付けて、目標を達成するために行われている作業をキャプチャできます。
- 戦略的計画 ユーザーは、計画アイテム (デマンド、プロジェクト、およびエピック)、および戦略アイテム (プログラムとイニシアチブ) を目標と関連付けて、目標を達成するために行われている作業をキャプチャできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ターゲット

ターゲットは、目標を測定するのに役立ちます。たとえば、職場の多様性を 50 % 増やすという目標を達成するために、2022 年の第 1 四半期までに 30 % 多様な従業員を雇用することをターゲットにできます。

ターゲットの測定単位を定義することで、ターゲットを定量的または定性的なものとして設定できます。定量的ターゲットは、数値ベース、カウント可能、測定可能です。定性的ターゲットは、解釈ベース、説明的、通常は「はい」または「いいえ」のタイプです。

ターゲットは短い期間 (例：四半期) にブレークダウンできるため、ターゲットを四半期ごとに設定したり、特定のブレークダウンターゲットを絞り込むことができます。ターゲットブレークダウンは、ターゲットに設定されたブレークダウン間隔に基づいて作成されます。ターゲットブレークダウン機能の仕組みついては、「ターゲットブレークダウン」を参照してください。

定性的ターゲット

定性的ターゲットは、通常は測定できませんが、ターゲットが達成されたかどうか追跡できます。定性的ターゲットに使用できる測定単位は「はい/いいえ」です。必要に応じて、定性的ターゲットの測定単位 (使用可能な選択セット) を定義したり、目標に合わせて定性的ターゲットを設定したりすることもできます。

たとえば、2023 年第 2 四半期のハッカソン実行のターゲットを達成するには、「はい/いいえ」の測定単位を使用して、2023 年第 2 四半期のハッカソン実行としてターゲットを設定できます。ターゲットのベースまたはターゲット値は、それぞれ「いいえ」と「はい」にすることができます。ハッカソンイベントでターゲットが成功した場合は、ターゲット値を「はい」に更新できます。

ターゲットソース

ターゲットソースは、ターゲットの実績値を自動更新するために使用されるターゲットの構成であり、ターゲットとその目標の進捗状況が自動的に更新されます。ServiceNow AI Platform に存在する任意のテーブルまたはテーブルの組み合わせ (利益計画、コスト計画、サーベイ、インシデント、PA インジケーターなど) をターゲットソースとして構成できます。

ターゲットの実績値を自動化するために、次のターゲットソースタイプがサポートされています。

- PA インジケーター：PA インジケーターから必要なデータを取得して、ターゲットフォームの [実績値] フィールドを更新します。
- アセスメント/サーベイ：アセスメントメトリクスタイプとアセスメントメトリクスカテゴリレコードから必要なデータを取得して、ターゲットフォームの [実績値] フィールドを更新します。
- カスタムスクリプト：カスタムスクリプトは、設定されている任意の ServiceNow AI Platform テーブルから必要なデータをフェッチします。カスタムスクリプトオプションを使用すると、ServiceNow AI Platform に存在する任意のテーブルまたはテーブルの組み合わせをターゲットソースとして設定できます。

  利益計画の事前定義されたターゲット自動化スクリプト：事前定義されたデフォルトのスクリプトは、関連する作業アイテムの金銭的または金銭以外の利益計画の [実績利益] フィールドまたは [金銭以外の実績利益] フィールドから金銭的または金銭以外の値を取得することによって、ターゲットフォームの [実績値] フィールドを更新するターゲットソースです。

  コンテキスト変数

  コンテキスト変数は、ターゲットソースの追加構成です。コンテキスト変数は、ターゲットフォームで必要なデータをフェッチし、ターゲットフォームの [実績値] フィールドを更新するために使用できる情報を提供します。コンテキスト変数は、ターゲットソースタイプ [アセスメント/サーベイ] および [PA インジケーター] に必要です。ターゲットソースの作成中に SPM のゴールフレームワーク スコープが選択されている場

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

合、(アセスメント/サーベイおよび PA インジケータータイプの) ターゲットソースに対してコンテキスト変数が自動的に作成されます。コンテキスト変数の詳細については、「ターゲットソースのコンテキスト変数」を参照してください。

利益とワークフロー



ゴールフレームワーク または SPM のゴールフレームワーク アプリケーションを使用すると、次のアクティビティを実行できます。

- 組織の戦略計画を作成する (戦略的計画 がインストールされている場合) 詳細については、「戦略的計画の作成」を参照してください。
- 組織の戦略的計画を目標に向けるために、戦略的優先事項を作成します。詳細については、「戦略的計画の戦略的優先事項を作成」を参照してください。
- 目標を作成します。詳細については、「目標の作成」を参照してください。
- (ゴールフレームワーク ユーザーの場合) 目標の進捗状況を追跡して測定するために、目標のためのターゲットを設定します。詳細については、「目標のためのターゲットを設定する (Set targets for a goal)」を参照してください。
- (SPM のゴールフレームワーク ユーザーの場合) ターゲットを設定し、ターゲットの実績値を自動化します。詳細については、「を使用したターゲット自動化のためのターゲットソースの構成 SPM のゴールフレームワーク」を参照してください。
- 作業、計画、戦略、またはその他の任意のアイテムで目標関係を作成し、現在または将来の作業を特定して関連付け、目標を達成します。詳細については、「作業または計画アイテムを目標またはターゲットに関連付ける」を参照してください。
- 作業および計画アイテムの主要目標を関連付けます。詳細については、「作業および計画アイテムの主要目標を関連付ける」を参照してください。

ゴールフレームワーク と **SPM** のゴールフレームワーク の比較

- ゴールフレームワーク：目標を作成し、そのためのターゲットを設定し、目標とターゲットの進捗状況を評価して、組織計画を達成してビジネスの成果を推進します。
- SPM のゴールフレームワーク：利益計画、コスト計画、アセスメント/サーベイ、PA インジケーターなどのさまざまなターゲットソースから実績を収集することで、ターゲットの実績値を自動化します。









ゴールフレームワーク と **SPM** のゴールフレームワーク の機能の比較

機能	ゴールフレームワーク	**SPM** のゴールフレームワーク
戦略計画を作成		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。







ゴールフレームワーク と **SPM** のゴールフレームワーク の機能の比較 (続く)

機能	ゴールフレームワーク	**SPM** のゴールフレームワーク
戦略的優先事項を作成		
目標を作成		
ターゲットを設定		
ターゲットブレークダウンを設定		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ゴールフレームワーク と **SPM** のゴールフレームワーク の機能の比較 (続く)

機能	ゴールフレームワーク	**SPM** のゴールフレームワーク
作業を目標に関連付ける		
ターゲットの実績値を自動化		
での目標と戦略の監視 ServiceNow AI コントロールタワー		

注:
SPM のゴールフレームワーク アプリケーションは ゴールフレームワーク アプリケーションの拡張です。SPM のゴールフレームワーク アプリケーションをインストールすると、ゴールフレームワーク のすべての機能とターゲット自動化機能を入手できます。

他の **ServiceNow** アプリケーションとうまく併用する

ゴールフレームワークまたはSPM のゴールフレームワークを他のServiceNowアプリケーションと統合することで、ポートフォリオマネージャー、製品マネージャー、およびプログラムマネージャーは、製品の計画立案を最適化し、目標を追跡できます。

ゴールフレームワーク**AI** コントロールタワーワークスペースあり

ServiceNow® AI コントロールタワーワークスペースを使用すると、ゴールフレームワーク で人工知能として分類されたすべての戦略的優先事項、目標、ターゲットを追跡および監視できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

戦略的優先事項の [タイプ] フィールドと目標の [カテゴリ] フィールドに 人工知能 オプションを入力して、 AI コントロールタワー ワークスペースで進捗状況を監視します。詳細については、「 戦略的優先事項 と 目標の作成の作成」を参照してください。

AI コントロールタワー をインストールすると、AI コントロールタワーワークスペースに **[AI** 戦略] タブが表示され、AI 戦略、目標、ターゲットの詳細に関するさまざまなウィジェットが表示されます。詳細については、「」を参照してください。

ESG ワークスペース による ゴールフレームワーク

ServiceNow ESG ワークスペースとゴールフレームワークの統合により、環境、社会、ガバナンス (ESG) の目標を作成して、選択した重要なトピックに対する進捗状況を追跡できます。環境、社会、社会 (ESG) ターゲットを作成して、ESG 目標に向けた進捗状況を追跡することもできます。詳細については、「Create an ESG goal 」と「Create an ESG target 」を参照してください。

戦略的計画 による **SPM** のゴールフレームワーク

ServiceNow 戦略的計画ワークスペースを使用して、ターゲットの進捗状況をグラフィカルに視覚化し、ターゲット実績を簡単に更新します。

計画立案アイテムまたはその他の任意のアイテムで目標またはターゲット関係を作成し、現在または将来の作業を特定して関連付け、目標とターゲットを達成できます。目標またはターゲットの達成に寄与する計画立案アイテムに対して、主要目標またはターゲットを関連付けることもできます。詳細については、「戦略的計画ワークスペース での目標管理」を参照してください。

注:
戦略的計画をインストールすると、ゴールフレームワークアプリケーションとSPM のゴールフレームワークアプリケーションのすべての機能を利用できます。

ゴールフレームワークと**SPM** のゴールフレームワーク

アドミニストレーターは、このセクションを使用して ゴールフレームワーク および SPM のゴールフレームワーク アプリケーションを設定します。

ゴールフレームワーク と **SPM** のゴールフレームワーク のインストール

アドミンロールを持っている場合は、ゴールフレームワーク(sn_gf) および SPM のゴールフレームワーク (sn_gfa) アプリケーションをインストールできます。

始める前に
アプリケーションと関連するすべてのストアアプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得 ServiceNow 製品またはアプリケーション .

SPM のゴールフレームワーク アプリケーションをインストールすると、ゴールフレームワーク のすべての機能とターゲット自動化機能を入手できます。

必要なロール：admin

重要:
SPM のゴールフレームワーク アプリケーションは、戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) Pro ライセンスを所有している場合にのみインストールできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して ゴールフレームワーク または SPM のゴールフレームワーク アプリケーションを検索します。
   名前または ID (sn_gf または sn_gfa) でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow ストアからのリクエストが必要になることもあります。アクセスしてください ServiceNow Store Web サイトでは、利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアに要求を送信する方法を確認できます。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、 ServiceNow Store バージョン履歴リリースノート .
3. [インストール] をクリックします。
4. アプリケーションのインストールダイアログボックスで、アプリケーションの依存関係を確認します。

   使用中のアプリケーションが他のアプリケーションを必要とし、それがまだインストールされていない場合は、先にインストールしておいてください。

   アプリケーションをインストールする時点で、依存アプリケーションまたはプラグインがインストールされていない場合は、それらも自動的にインストールされます。
5. [インストール] をクリックします。

タスクの結果
以下のコンポーネントは、ゴールフレームワーク または SPM のゴールフレームワーク アプリケーションのインストール時にインストールされます。

- ロール
- テーブル
- スケジュール済みジョブ
- 利益計画のターゲット自動化スクリプト (SPM のゴールフレームワーク とともにインストール)

SPM のゴールフレームワーク のインストールの一部として、ゴールフレームワーク と SPM のゴールフレームワーク の両方のコンポーネントがインストールされます。詳細については、「ゴールフレームワーク および SPM のゴールフレームワーク とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

既存の目標データを ゴールフレームワーク テーブルに移行する

admin ロールを使用すると、スケジュール済みジョブを実行して、既存の目標データを ゴールフレームワーク テーブルに移行できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

注:
ゴールフレームワーク テーブルへのデータの移行は 1 回限りの作業であり、スケジュールどおりに行われることを意図したものではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [目標、戦略、および作業アイテムデータをゴールフレームワークと関連する計画アイテムテーブルに移行 **(Migrate Goal, Strategy, and Work item data to the Goal Framework and related Planning item tables)]** スケジュール済みジョブを検索してクリックします。
3. スケジュール済みスクリプト実行フォームで：
   a. [実行] フィールドで頻度が [オンデマンド] に選択されていることを確認します。
   b. [このスクリプトを実行] フィールドで、必須パラメーターの値を **[true]** に設定します。
   パラメーターの詳細については、「目標、戦略、および作業アイテムデータを Goal Framework と関連する計画立案アイテムテーブルに移行」を参照して ください。
4. [今すぐ実行する] をクリックします。

目標設定を構成する

目標設定に使用されるカレンダータイプ、目標進捗状況の加重平均計算、目標やターゲットの削除など、目標を管理するための目標設定を構成します。

始める前に
必要なロール：sn_gf.goal_admin

手順

1. 移動先 すべて > エンタープライズゴール管理 > 設定.
2. [目標設定] フォームで、プロパティを設定します。
   プロパティについては「目標設定フォーム」を参照してください。
3. [保存] をクリックします。

アサインされたエンティティのテーブルの構成

アサインされたエンティティタイプのテーブルを構成して、目標ユーザーが目標を必須のアサインされたエンティティに関連付けることができるようにします。

始める前に

- デフォルトでは、ゴールフレームワーク をインストールすると、割り当てられたエンティティである事業部門 [business_unit]、部門 [cmn_department]、および会社 [core_company] がインストールされます。
- PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理) を有効にすると、ポートフォリオ [pm_portfolio] アサイン済みエンティティがインストールされます。
- 戦略的計画 をインストールすると、アサインされたエンティティ、製品モデル [cmdb_model]、バリューストリーム [cmn_value_stream]、イニシアチブ [sn_align_core_initiative]、および戦略的プログラム [sn_align_core_program] がインストールされます。

必要なロール：sn_gf.goal_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

手順

1. 移動先 すべて > エンタープライズゴール管理 > アサインされたエンティティ.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「目標がアサインされたエンティティ構成フォーム」を参照してください。
4. [送信] をクリックします。

スプレッドシートから目標とターゲットのデータをインポート

アドミンロールを使用すると、既存の目標とターゲットのデータをスプレッドシートから ゴールフレームワーク テーブルにインポートできます。

始める前に

- ジョブが正常に実行されると、スプレッドシートの目標データが目標 [sn_gf_goal] テーブルにインポートされます。
- ジョブが正常に実行されると、スプレッドシートのターゲットデータがターゲット [sn_gf_goal_target] テーブルにインポートされます。

注:
ターゲットは目標に関連付けられているため、最初に目標をインポートしてからターゲットをインポートする必要があります。

重要:
スプレッドシートの目標とターゲットのデータは、サポートされている形式である必要があります。スプレッドシートから目標とターゲットのデータをインポートするためにサポートされているデータ形式の詳細については、「Import goals and targets data (目標とターゲットのデータのインポート) [KB1191233]」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムインポートセット > データのロード.
2. [インポートセットテーブル] ドロップダウンリストから、 [目標インポートセット] **[imp_sn_gf_goal]** または [ターゲットインポートセット] **[imp_sn_gf_goal_target]** を選択します。
3. [インポート元] フィールドで、[ファイル] を選択します。
4. [ファイル] オプションで [選択] をクリックし、データをインポートするスプレッドシートを選択します。

重要:

- スプレッドシートの目標とターゲットのデータは、特定の形式である必要があります。サポートされているデータ形式の詳細については、「Import goals and targets data (目標とターゲットのデータのインポート) [KB1191233]」を参照してください。
- データは各列のヘッダータイトルに基づいて目標テーブルとターゲットテーブルのそれぞれのフィールドにインポートされるため、スプレッドシートのヘッダー行の名前は変更しないでください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [送信] をクリックします。
6. [進捗状況] ページで、[変換の実行] をクリックします。
7. [インポートセットと変換マップを指定] フォームで、[変換] をクリックします。
8. [変換履歴] をクリックし、[インポートセット実行] 関連リストの [ステータス] 列が [完了] に設定されていることを確認します。
   [インポートセットテーブル] ドロップダウンリストから選択したオプションに応じて、目標またはターゲットデータが目標 [sn_gf_goal] またはターゲット [sn_gf_goal_target] テーブルにインポートされます。

   ジョブが失敗した場合は、[変換履歴] をクリックして詳細を参照してください。

   注:
   [インポート] 操作を使用して、テーブルで新しいデータを挿入、または既存のデータを更新できます。デフォルトでは、 [名前] と [所有者] の値は、既存のレコードを更新するために使用されるプライマリキーです。新しいデータを挿入したり、既存のデータを更新したりするためのプライマリキーとしてさらにフィールドを追加することもできます。プライマリキーとしてフィールドを追加する方法の詳細については、「Import goals and targets data (目標とターゲットのデータのインポート) [KB1191233]」を参照してください。

スケジュール済みジョブを更新してターゲットの実績値を自動化

SPM のゴールフレームワーク アプリケーションを使用して、初期設定に従ってスケジュール設定済みジョブの実行時間を変更し、ターゲットソースが構成されているターゲットの実績値を自動更新します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
デフォルトでは、スケジュール済みジョブは毎日午前 00:00:00 (システムタイムゾーン) に実行されます。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. **[SPM** のゴールフレームワークを使用してターゲットの実際の値を更新 **(Update Actual value of the targets using Goal Framework for SPM)]** スケジュール済みジョブを検索してクリックします。
3. スケジュールされた時刻にジョブを実行するには、[アクティブ] チェックボックスをオンになっていることを確認します。
4. 必要に応じて、[実行] フィールドと [時刻] フィールドの詳細を編集します。
5. [更新] をクリックします。
   スケジュール済みジョブの詳細については、「スケジュール済みジョブ」を参照してください。

を使用したターゲット自動化のためのターゲットソースの構成 **SPM** のゴールフレームワーク

目標のターゲットを設定するときに目標ユーザーがターゲットソースを定義できるように、ターゲット自動化のターゲットソースを構成します。ターゲットのターゲットソースを定義すると、ターゲットの実際の値が自動的に更新されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次の手順を指針として使用して、ターゲットを設定し、SPM のゴールフレームワーク を使用するターゲットの実績値を自動化します。これらのステップの中には、sn_gf.goal_user ロールが必要なものや sn_gf.goal_admin ロールが必要なものがあります。

1. ターゲットのターゲットソースを作成して、ターゲットの実績値を更新するためのソースとして構成します。詳細については、「ターゲットソースの作成」を参照してください。

   コンテキスト変数は、ターゲットソースタイプ [アセスメント/サーベイ] および [PA インジケーター] に必要です。ターゲットソースの作成中にアセスメント/サーベイまたは PA インジケーターとしてタイプが選択されている場合、必須コンテキスト変数が自動的に作成されます。必須のコンテキスト変数が作成されるタイミングの詳細については、「ターゲットソースのコンテキスト変数」を参照してください。

2. 必要な場合は、ターゲットソースのコンテキスト変数を作成して、コンテキスト変数から必要なデータをフェッチしてターゲットの実績値を更新します。詳細については、「ターゲットソースのコンテキスト変数を作成」を参照してください。


ターゲットソースのコンテキスト変数

コンテキスト変数は、ターゲットフォームで必要なデータをフェッチし、ターゲットフォームの [実績値] フィールドを自動更新するために使用できるターゲットソースの追加構成です。コンテキスト変数は、ターゲットソースタイプ [アセスメント/サーベイ] および [PA インジケーター] に必要です。

ターゲットソースを作成する前に SPM のゴールフレームワーク スコープが選択されている場合、(アセスメント/サーベイおよび PA インジケータータイプの) ターゲットソースに対して、コンテキスト変数が (コンテキスト変数フォームで [必須] フィールドが **true** に設定された状態で) 自動的に作成されます。自動的に作成されたコンテキスト変数は、必須コンテキスト変数とも呼ばれます。

必須のコンテキスト変数は、SPM のゴールフレームワーク スコープを選択し、次のいずれかの条件を満たしている場合に作成されます。

- (ターゲットソースタイプが [アセスメント/サーベイ] の場合) [ターゲットソース] フォームで、[タイプ] フィールドが [アセスメント/サーベイ] に設定され、**[**アセスメントメトリクスタイプ] フィールドに [評価方法 = アセスメント] のメトリクスタイプが入力されます。



- (ターゲットソースタイプが PA インジケーターの場合) [ターゲットソース] フォームで、[タイプ] フィールドが **[PA** インジケーター] に設定され、[ブレークダウン] フィールドに入力される値が選択肢リストタイプではありません。

  [ブレークダウン] フィールドが選択リストタイプであるターゲットソースタイプ、PA インジケーターのコンテキスト変数を作成するには、「ターゲットソースタイプ PA インジケーターのコンテキスト変数の作成」を参照してください。

注:
必須のコンテキスト変数は削除できません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ターゲットソースのコンテキスト変数を手動で作成し、それらを使用して、ターゲットフォームで必要なデータをフェッチして [実績値] フィールドを自動更新するように設定することもできます。手動でコンテキスト変数を作成する方法の詳細については、「ターゲットソースのコンテキスト変数の作成」を参照してください。

ターゲットの実績値を自動化するためのターゲットソースの作成

ターゲットソースを作成して、目標ユーザーがターゲットの実績値を自動化するように構成できるようにします。

始める前に
アプリケーションの SPM のゴールフレームワーク スコープを選択します。

必要なロール：sn_gf.goal_admin

このタスクについて
コンテキスト変数は、ターゲットソースタイプ [アセスメント/サーベイ] および [PA インジケーター] に必要です。ターゲットソースの作成中にアセスメント/サーベイまたは PA インジケーターとしてタイプが選択されている場合、必須コンテキスト変数が自動的に作成されます。必須のコンテキスト変数が作成されるタイミングの詳細については、「ターゲットソースのコンテキスト変数」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > エンタープライズゴール管理 > ターゲットソース.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「ターゲットソースフォーム」を参照して ください。
4. [送信] をクリックします。

ターゲットソースのコンテキスト変数の作成

ターゲットソースにさらにコンテキスト変数を設定する場合は、コンテキスト変数を手動で作成します。

始める前に
アプリケーションの SPM のゴールフレームワーク スコープを選択します。

必要なロール：sn_gf.goal_admin

このタスクについて
コンテキスト変数は、必要なデータをフェッチし、ターゲットフォームの [実績値] を自動更新するために使用できる情報を提供します。ターゲットソースのコンテキスト変数が作成された後、目標ユーザーは、実績値が自動的に更新されるように、ターゲットフォームの [実績値ソース構成] セクションを設定できます。

コンテキスト変数の作成は、テーブルでの列の作成に似ています。

ターゲットソースタイプが PA インジケーターで、ブレークダウンが選択リストタイプのコンテキスト変数を作成する方法については、「ターゲットソースタイプ PA インジケーターのコンテキスト変数の作成」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > エンタープライズゴール管理 > ターゲットソース.
2. コンテキスト変数を作成する必要なターゲットソースを開きます。
3. [コンテンツの変数] 関連リストで、[新規] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. フォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「コンテキスト変数フォーム」を参照して ください。
5. [送信] をクリックします。

ターゲットソースタイプ **PA** インジケーターのコンテキスト変数の作成

[ブレークダウン] フィールドが選択リストタイプである場合、ターゲットソースタイプ PA インジケーターのコンテキスト変数を手動で作成します。

始める前に
アプリケーションの SPM のゴールフレームワーク スコープを選択します。

必要なロール：sn_gf.goal_admin

このタスクについて
コンテキスト変数は、必要なデータをフェッチし、ターゲットフォームの [実績値] を自動更新するために使用できる情報を提供します。ターゲットソースのコンテキスト変数が作成された後、目標ユーザーは、実績値が自動的に更新されるように、ターゲットフォームの [実績値ソース構成] セクションを設定できます。

コンテキスト変数の作成は、テーブルでの列の作成に似ています。

手順
1. 移動先 すべて > エンタープライズゴール管理 > ターゲットソース.
2. コンテキスト変数を作成する必要なターゲットソースを開きます。
3. [コンテンツの変数] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. フォームで [タイプ] フィールドを選択肢として入力し、他のフィールドを必要に応じて入力します。
   フィールド値の説明については、「コンテキスト変数フォーム」を参照してください。
5. [送信] をクリックします。
   選択肢タイプのコンテキスト変数が作成されます。
6. 作成したコンテキスト変数の [選択肢] 関連リストで、[新規] をクリックします。

   注:
   [コンテキスト変数] フォームに [選択肢] 関連リストが表示されない場合は、 構成 > 関連リスト フィードバックを得ます

7. フォームで、フィールドに入力します。

選択肢フォーム

フィールド	説明
テーブル	選択肢を作成するコンテキスト変数の名前。
要素	選択肢を作成するコンテキスト変数フォームの列名。
ラベル	選択肢の名前。
値	コンテキスト変数を作成する選択肢の値の Sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	辞書エントリ [sys_dictionary] テーブルの [選択肢] 関連リストから sys_id をコピーできます。

8. [送信] をクリックします。
9. オプション: ステップ 6 ～ 8 を繰り返して、コンテキスト変数の選択肢をさらに作成します。

次のタスク
目標ユーザーは、ターゲットソースが構成されるターゲットフォームでこれらの選択肢をコンテキスト変数として構成できます。

ターゲットブレークダウンを移行

SPM のゴールフレームワーク v2.3.0 以降にアップグレードした後、[**BreakdownInterval** を **Checkinfrequency** に移行 **(Migrate BreakdownInterval To Checkinfrequency)**] スケジュール済みジョブを実行して、ターゲットレコードの [レビュー頻度] フィールドから [チェックイン頻度] フィールドに既存の値を移行します。

このタスクについて
ジョブの実行後、ターゲットの [チェックイン頻度] フィールドの値が、ターゲットの [レビュー頻度] フィールドの既存の値に基づいて入力されます。[レビュー頻度] フィールドの既存の値が [なし] 以外のオプションに設定されている場合、ターゲットの既存のチェックイン頻度の値に基づいて、そのようなターゲットのターゲットブレークダウンが作成されます。異なる値を持つターゲットに対してこれらの値を移行する方法の詳細については、「 ターゲットブレークダウンの移行」を参照してください。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. **[Migrate BreakdownInterval to Checkinfrequency]** スケジュール済みジョブを検索して選択します。
3. スケジュール済みスクリプト実行フォームで、[実行] フィールドで頻度が [オンデマンド] に選択されていることを確認します。
4. **[Execute Now** (今すぐ実行)] を選択します。

ターゲットブレークダウンの移行

アドミニストレーターが **[BreakdownInterval** を **Checkinfrequency** に移行] スケジュール済みジョブを実行すると、[レビュー頻度] フィールドと [ブレークダウン間隔] フィールドの既存の値がターゲットレコードの [チェックイン頻度] フィールドに移行されます。

ターゲットの [実績終了日] フィールドの値と、ターゲットブレークダウンの [計画ターゲット値] フィールドと [実績] フィールドの値は、ターゲットの現在の実際の値と既存のターゲットブレークダウンの値に基づいて設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ブレークダウン間隔が [なし] に設定されたターゲットのターゲットブレークダウン移行

ジョブの実行後、ターゲットの [チェックイン頻度] フィールドの値が、ターゲットの [レビュー頻度] フィールドの既存の値に基づいて入力されます。[レビュー頻度] フィールドの既存の値が [なし] 以外のオプションに設定されている場合、ターゲットの既存のレビュー頻度に基づいて、そのようなターゲットのターゲットブレークダウンが作成されます。ターゲットの [ブレークダウン間隔] が [なし] に設定されている場合でも、ターゲットの既存のレビュー頻度に基づいてターゲットのターゲットブレークダウンが作成されます。

次の表は、[レビュー頻度] フィールドと [ブレークダウン間隔] フィールドで異なる値を持つターゲットのチェックイン頻度の値を設定する方法を示しています。

ブレークダウン間隔が [なし] に設定されたターゲットブレークダウンの移行

レビュー頻度 (アップグレード前)	ブレークダウン間隔 (アップグレード前)	チェックイン頻度 (ジョブのアップグレードと実行後)
年次	なし	年次
四半期ごと	なし	四半期ごと
月次	なし	月次
隔週	なし	隔週 [隔週] オプションは保持され、[隔週] オプションはサポートされなくなったため、ターゲットブレークダウンは作成されません。 ターゲットの所有者または貢献者がターゲットのチェックイン頻度を更新すると、それに応じてターゲットブレークダウンが作成されます。
週次	なし	週次
日次	なし	日次
なし	なし	なし この場合、ターゲットブレークダウンは作成されません。

たとえば、アップグレード前のターゲットの詳細が次のようなシナリオを考えてみましょう。

- ターゲットの基準値とターゲット値は、それぞれ 0 と 100 です
- レビュー頻度は [月次] に設定され、ブレークダウン間隔は [なし] に設定されました
- ターゲットの開始日と終了日は、それぞれ 2024-01-01 と 2024-12-31 です
- ターゲットの現在の実績値は 60 で、現在の月は 8 月です

この場合、スケジュール済みジョブを実行した後、ターゲットに対して 12 個の月次ターゲットブレークダウンが作成され、8 月の月次ブレークダウンに 60 の現在の実際の値が入力されます。また、計画ターゲット値はブレークダウンごとに設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ブレークダウン間隔が [四半期ごと] または [年ごと] に設定されたターゲットのターゲットブレークダウン移行

ジョブの実行後、ターゲットの [チェックイン頻度] フィールドの値が、ターゲットの [レビュー頻度] フィールドの既存の値に基づいて入力されます。次に、ターゲットの既存のレビュー頻度に基づいて、ターゲットのターゲットブレークダウンが作成されます。

次の表は、[レビュー頻度] フィールドと [ブレークダウン間隔] フィールドで異なる値を持つターゲットのチェックイン頻度の値を設定する方法を示しています。

ブレークダウン間隔が [四半期ごと] または [年ごと] に設定されたターゲットブレークダウンの移行

レビュー頻度 (アップグレード前)	ブレークダウン間隔 (アップグレード前)	チェックイン頻度 (ジョブのアップグレードと実行後)
四半期ごと	四半期ごと	四半期ごと
四半期ごと	年次	四半期ごと

注:
ブレークダウン間隔が [年ごと] に設定されているターゲットの場合、ターゲットのタイプが累積か非累積かに関係なく、スケジュール済みジョブを四半期ごとに実行すると、ターゲットブレークダウンが作成され、[ターゲット値分布] が ターゲットの期間全体に直線的に (累積) 設定されます。

たとえば、アップグレード前のターゲットの詳細が次のようなシナリオを考えてみましょう。

- ターゲットの基準値とターゲット値は、それぞれ 0 と 80 です
- レビュー頻度は [四半期ごと] に設定され、ブレークダウン間隔は [年ごと] に設定されました
- ターゲットの開始日と終了日は、それぞれ 2023-01-01 と 2024-12-31 です
- ターゲットのタイプが非累積です
- 各四半期で達成された実績値は、2023 年第 1 四半期から 2024 年第 2 四半期までの 10 です
- ターゲットの現在の合計実績値は 60 で、現在の四半期は 2024 年第 2 四半期です

この場合、スケジュール済みジョブを実行すると、四半期ごとのブレークダウンが 8 つ作成され、ターゲット値の分布が ターゲットの期間全体に直線的に広がる (累積) に設定されます。2023 年第 1 四半期、2023 年第 2 四半期、2023 年第 3 四半期、2023 年第 4 四半期、2024 年第 1 四半期、および 2024 年第 2 四半期のターゲットブレークダウンの現在の実績値は、それぞれ 10、20、30、40、50、および 60 として入力されます。また、計画ターゲット値はブレークダウンごとに設定されます。

カスタム測定単位の定義

カスタム測定単位を定義すると、目標ユーザーが選択に従ってターゲットの測定単位を設定できます。測定単位には、定量的および定性的の 2 種類があります。

デフォルトでは、定量的ターゲットに使用可能な単位は **[#]**、**[$]**、**[%]**、および [日] です。デフォルトでは、定性的ターゲットに使用可能な単位は [はい]/[いいえ] です。

アドミニストレーターはカスタム測定単位を作成し、目標ユーザーがそれを使用してターゲットの測定単位を設定できるようにする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 定量的ターゲットの場合は、単位 [sn_gf_unit] テーブルからカスタム測定単位を定義できます。
- 定性的ターゲットの場合は、最初に選択セットを作成してから、選択セットの選択リストを作成する必要があります。

ゴールフレームワーク または **SPM** のゴールフレームワーク を使用した目標管理

ゴールフレームワーク を使用して目標を定義するのに必要なプロセスを理解します。

ゴールフレームワークまたは SPM のゴールフレームワークを使用したゴールの管理

目標を定義するには、次のステップを使用してください。これらのステップの中には、sn_gf.stategy_planner ロールが必要なものや、sn_gf.goal_user ロールが必要なものがあります。SPM のゴールフレームワーク ユーザーである場合、ターゲット自動化機能を設定するには sn_gf.goal_admin ロールが必要です。ゴールフレームワーク または SPM のゴールフレームワークのいずれかを使用して目標を定義する場合、すべての手順が同じです。

1. 組織の目的 (ビジョン、ミッション、および価値) を定義する戦略的計画を作成します。詳細については、「戦略的計画の作成」を参照してください。

   戦略的計画を作成できるのは、戦略的計画 がインストールされている場合のみです。戦略的計画の作成は、目標を定義するために必須ではありません。

2. 組織の戦略的計画を目標に向けるために、戦略的優先事項を作成します。詳細については、「戦略的優先事項の作成」を参照してください。
3. 目標を作成します。詳細については、「目標の作成」を参照してください。
4. 目標の進捗状況を追跡して測定するために、目標のためのターゲットを作成します。詳細については、次を参照してください。 を使用した目標のターゲット設定 ゴールフレームワーク.
5. (SPM のゴールフレームワーク ユーザー専用) 目標にターゲットを設定し、ターゲットのターゲットソースを構成して、ターゲットの実績値を自動更新します。ターゲットの進捗状況が更新されると、ターゲットの進捗状況がその目標にロールアップされます。詳細については、「を使用したターゲット自動化のためのターゲットソースの構成 SPM のゴールフレームワーク」を参照してください。
6. 作業アイテムまたは戦略アイテムとの目標またはターゲット関係を作成します。詳細については、「 作業または戦略を目標またはターゲットに関連付ける」を参照してください。
7. アイテムが目標の達成に寄与する作業および計画アイテムに対する、プライマリとしての目標またはターゲットを設定します。詳細については、 作業アイテムおよび計画アイテムの主要目標またはターゲットの関連付けを参照してください。

戦略計画の作成

戦略計画者は、組織の戦略計画を作成および管理できます。戦略計画を作成して、組織の目的、その戦略的優先事項、および関連する目標を定義します。

始める前に

ServiceNow インスタンスに 戦略的計画 をインストールします。

必要なロール：sn_gf.stategy_planner

手順

1. 移動先 すべて > 戦略 > 戦略的プラン.
2. [**New**] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「[戦略計画] フォーム」を参照してください。
4. [送信] をクリックします。

次のタスク
[値] 関連リストから、[整合性]、[顧客へのコミットメント]、[信頼] など、組織の値をキャプチャします。

戦略計画の戦略的優先事項を作成

戦略計画者は、組織の戦略計画の戦略的優先事項を作成して管理します。組織の戦略的計画を目標に向けるために、戦略的優先事項を作成します。

始める前に
必要なロール：sn_gf.stategy_planner

このタスクについて
戦略的優先事項は、重点分野または長期戦略とも呼ばれます。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、戦略計画の戦略的優先事項を作成します。
2. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「[戦略的優先事項] フォーム」を参照してください。
3. [送信] をクリックします。

次のタスク
戦略的優先事項を達成するための目標を定義し、そのターゲットを設定します。

目標の作成

目標を作成し、ターゲットを設定して全体的な目標の進捗状況を測定し、組織の戦略的優先事項に沿って評価します。

始める前に
必要なロール:sn_gf.goal_user または sn_gf.goal_admin

このタスクについて
目標は通常、定性的な性質のものです。目標は意欲的なものでなければならず、チームの意欲をかきたて、やりがいを与えることが期待されます。

手順

1. 移動先 すべて > エンタープライズゴール管理 > 目標.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「[目標] フォーム」を参照してください。
4. [送信] をクリックします。

次のタスク
目標のターゲットを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ゴールフレームワークまたは**SPM** のゴールフレームワーク

目標の進捗状況を追跡して測定するために、目標のための SMART ターゲットを作成します。

始める前に

必要なロール:sn_gf.goal_user または sn_gf.goal_admin

このタスクについて

SMART ターゲットは、S = 特定、M = 測定可能、A = 達成可能、R = 関連、T = 期限付きとして定義できます。

- 目標の所有者または貢献者のみが目標のターゲットを作成することができます。
- また、ESG Management アプリケーションがインストールされている場合、ターゲットフォームの [機密] フィールドを有効化することで、特定のユーザーに対してターゲットレコードへのアクセスを制限することもできます。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、目標のターゲットを作成します。

2. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「[ターゲット] フォーム」を参照してください。
3. [**Submit** (送信)] を選択します。

タスクの結果

ターゲットの投稿を保存して [実績終了日] フィールドに入力すると、ターゲット進捗状況レコードが自動的に作成されます。ターゲット進捗レコードは、目標に対する各ターゲットの進捗状況を指定します。

> **注:**
> 目標を削除すると、[ターゲットの削除を許可] プロパティが **[** いいえ] に設定されていても、関連するターゲット (存在する場合) およびその進捗レコードも削除されます。

次のタスク

ターゲットの進捗状況を更新します。

手動ターゲットの進捗状況の更新

ターゲットのステータスが変更されたときにターゲットの進捗状況を更新します。

始める前に

必要なロール:sn_gf.goal_user または sn_gf.goal_admin

このタスクについて

> **注:**
> 目標の所有者または貢献者のみが目標のターゲットを更新することができます。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、目標のターゲットレコードを開きます。

2. [ターゲット] フォームで、[実績終了日 **(Actuals to date**)] フィールドを更新し、[注釈] フィールドにビジネス上の根拠を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールドの詳細については、「[ターゲット] フォーム」を参照してください。

3. **[Update** (更新)] をクリックします。

タスクの結果

[実績累計] フィールドが更新されると、ターゲットの進捗値が自動的に更新されます。進捗値の計算方法については、「進捗値の計算」を参照してください。

関連情報

- SPM のゴールフレームワーク を使用したターゲットの進捗状況の更新
- ターゲットブレークダウンの実際の値の更新

SPM のゴールフレームワーク を使用したターゲットの進捗状況の更新

[ターゲット] フォームの [実績値を更新] 関連リンクを使用して、ターゲットの進捗状況を更新します。

始める前に

必要なロール:sn_gf.goal_user または sn_gf.goal_admin

このタスクについて

注:
目標の所有者または貢献者のみが目標のターゲットを更新することができます。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、目標のターゲットレコードを開きます。

2. [ターゲット] フォームで、[実績値を更新] 関連リンクをクリックします。
フィールド値の説明については、「[ターゲット] フォーム」を参照して ください。

タスクの結果

[現在までの実績] フィールドが更新されると、ターゲットとその目標の進捗値が自動更新されます。進捗値の計算方法については、「進捗値の計算」を参照してください。ターゲットブレークダウンを持つターゲットの進捗値の計算方法については、「ターゲットブレークダウン」を参照してください。

関連情報

- 手動ターゲットの進捗状況の更新
- ターゲットブレークダウンの実際の値の更新

ターゲットブレークダウン

ターゲットを短い期間 (月次など) にブレークダウンすると、各月のターゲット値を設定して、その特定の月次ターゲットに焦点を当てることができます。ターゲットブレークダウンは、ターゲットに設定された [チェックイン頻度] と [ターゲット値分布] に基づいて自動的に作成されます。

ターゲットのチェックイン頻度は、[日次]、[週次]、[月次]、[四半期ごと]、または [年ごと] に設定できます。ターゲットのチェックイン頻度に基づいて、対応するターゲットブレークダウンが作成されます。たとえば、1 年間にわたるターゲットで [チェックイン頻度] が [月次] に設定されている場合、12 個の月次ターゲットブレークダウンが作成されます。計画ターゲット値は、ターゲットの [ターゲット値配布] 設定に基づいて、各ターゲットブレークダウンに自動的に設定されます。

注:
ターゲットブレークダウン機能は定性的ターゲットではサポートされていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、さまざまなターゲット配布タイプを持つターゲットに対してターゲット進捗状況を計算する方法を理解するのに役立ちます。

例 1:2025 暦年に 1200 人の新規顧客を獲得する (非累積的に追跡)

この例では、2025 暦年に 1200 人の新規顧客を獲得するというターゲットを達成し、進捗状況を毎月 (非累積的に) 追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。

- 開始日と終了日をそれぞれ 2025-01-01 と 2025-12-31 に設定する
- 開始値と最終ターゲット値をそれぞれ 0 と 1200 に設定する
- ターゲットの [チェックイン頻度] を [月次] に設定します
- [ターゲット値分布] を [期間全体で均等に分割 (非累積)] に設定します

  このターゲット値分布は、最終ターゲット値が 12 の等しい値 (各ターゲットブレークダウンの計画ターゲット値) に分割され、最終的なターゲット値に集計されることを意味します。必要に応じて、後でそれぞれのターゲットブレークダウンレコードから計画ターゲット値を編集できます。

この場合、アプリケーションは 2025 暦年の 12 のターゲットブレークダウン (1 月、2 月,.....,12 月) を作成し、各ターゲットブレークダウンの計画ターゲット値を 100 に設定します (最終ターゲット値をターゲットブレークダウンの数で割った値)。

アプリケーションでは、各月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、ターゲットブレークダウンには特定の月に達成された実際の値を入力する必要があります。たとえば、1 月に 100 人の顧客を獲得した場合、1 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。2 月にさらに 100 人の顧客を獲得した場合、2 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。同様に、さらに 3 月に 100 個、4 月に 100 個取得した場合は、3 月と 4 月の両方のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。

アプリケーションでは、各月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、合計値をメインターゲットの実際の値にロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。

例 2:2025 暦年に 1200 人の新規顧客を獲得する (累積的に追跡)

この例では、2025 暦年に 1200 人の新規顧客を獲得するというターゲットを達成し、進捗状況を月次 (累積) で追跡する場合、ターゲットを次のように設定できます。

- 開始日と終了日をそれぞれ 2025-01-01 と 2025-12-31 に設定する
- 開始値と最終ターゲット値をそれぞれ 0 と 100 に設定する
- ターゲットの [チェックイン頻度] を [月次] に設定します
- [ターゲット値分布] を [期間全体に直線的に分散 (累積)] に設定します

  このターゲット値分布は、最終ターゲット値が 12 の計画ターゲット値に線形に分割されることを意味します (最後の月次ブレークダウンの値が最終ターゲット値と等しくなるようにします)。必要に応じて、後でそれぞれのターゲットブレークダウンレコードから計画ターゲット値を編集できます。

この場合、アプリケーションは 2025 暦年に対して 12 のターゲットブレークダウン (1 月、2 月,.....,および 12 月) を作成し、1 月、2 月,.....,、および 12 月のブレークダウンの計画ターゲット値をそれぞれ 100、200,.....,および 1200 に設定します。

アプリケーションでは最新の月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値のみが考慮されるため、最新の月次ターゲットブレークダウンに実際の累積値を入力する必

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要があります。たとえば、1 月に 100 人の顧客を獲得した場合、1 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 100 を入力します。2 月にさらに 100 人の顧客を獲得した場合、2 月のターゲットブレークダウンの実際の値として 200 を入力します。同様に、さらに 3 月に 100 個、4 月に 100 個取得した場合は、3 月と 4 月のターゲットブレークダウンの実際の値として、それぞれ 300 と 400 を入力します。

アプリケーションでは、最新の月次ターゲットブレークダウンに入力された実際の値を考慮し、メインターゲットの実際の値にロールアップします。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。

ターゲットブレークダウンのメリット

ターゲットブレークダウン機能は、ある期間のターゲットを設定するが、ターゲットの進捗状況を日次、週次、月次、四半期ごと、年ごとなどの短い期間で追跡する場合に役立ちます。たとえば、開始値と最終ターゲット値がそれぞれ 0 と 1200 の年のターゲットを設定したとします。また、四半期ごとに 100 の月次ターゲットを設定するとします。この場合、ターゲットを月次ターゲットにブレークダウンし、各月のターゲット値を設定することで、特定の月次ターゲットに焦点を当て、それらの月次ターゲットに対して実績を更新できます。

ターゲットブレークダウン機能には、次のようなメリットがあります。

- 長期的なターゲットを日次、週次、月次、四半期ごと、年次などの短期的な間隔に分解して、進捗状況をより適切に追跡またはレポートできるようにします
- 必要に応じて、各ターゲットブレークダウンの計画ターゲット値を設定または変更します
- 各ターゲットブレークダウンの実際の値を更新し、メインターゲットの進捗状況を追跡する
- ターゲット全体ではなく、特定の短期ターゲット(ターゲットブレークダウン)に焦点を当てる
- 短期および長期のターゲットの進捗状況を累積的または非累積的に追跡する

チェックイン頻度が [なし] に設定されている場合の実際の値の計算方法

ターゲットのチェックイン頻度が [なし] に設定されている場合は、メインターゲットレコードの [実績累計] フィールドに実際の値を入力する必要があります。入力する実際の値は、ターゲットの期間に関係なく累積する必要があります。チェックイン頻度が [なし] に設定されている場合、ターゲットブレークダウンは作成されません。

ターゲット自動化でのターゲットブレークダウン

ターゲットに対してターゲット自動化機能を有効にし、チェックイン頻度とターゲット値分布を設定した場合、ターゲット自動化機能によって、チェックイン期限に基づいてそれぞれのターゲットブレークダウンの実際の値が自動的に更新されます。ターゲットブレークダウンの実際の値が更新された後、その値はロールアップされ、メインターゲットの実際の値にロールアップされます。その後、ターゲットとその目標の進捗状況が自動更新されます。

ターゲットブレークダウンの実際の値の更新

ターゲットブレークダウンのステータスが変更されたときに、その実際の値を更新します。ターゲットブレークダウンの実際の値を更新すると、そのターゲットの実際の値が自動的に更新されます。ターゲットの [実績] フィールドが更新されると、ターゲットとその目標の進捗値が自動更新されます。

始める前に
必要なロール：sn_gf.goal_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

注:
目標の所有者または貢献者のみがターゲットブレークダウンを更新することができます。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、目標のターゲットレコードを開きます。
2. [ターゲット] フォームで、[実績] フィールドを更新し、[注釈] フィールドにビジネス上の根拠を追加します。
   フィールドの詳細については、「[ターゲットブレークダウン] フォーム」を参照してください。
3. **[Update** (更新)] を選択します。

タスクの結果

[実績] フィールドが更新されると、ターゲットとその目標の進捗値が自動更新されます。進捗値の計算方法については、「進捗値の計算」を参照してください。ターゲットブレークダウンの実際の値がそのターゲットにどのようにロールアップされるかについては、「ターゲットブレークダウン」を参照してください。

関連情報

手動ターゲットの進捗状況の更新

SPM のゴールフレームワーク を使用したターゲットの進捗状況の更新

作業または計画アイテムを目標またはターゲットに関連付ける

作業、計画、戦略、またはその他の任意のアイテムで目標またはターゲット関係を作成し、現在または将来の作業を特定して関連付け、目標およびターゲットを達成します。

始める前に

必要なロール：sn_gf.goal_user

このタスクについて

目標またはターゲットを一度に関連付けることができるのは、作業アイテム (プロジェクト、デマンド、プログラム、スクラム機能、スクラム/SAFe エピック)、または SAFe 機能、計画アイテム (プロジェクト、デマンド、またはエピック)、または戦略アイテム (プログラムまたはイニシアチブ) のうちの 1 つのみです。複数のアイテムを目標またはターゲットに関連付けるには、アイテムごとに 1 つの目標またはターゲット関係レコードを作成します。

- 目標またはターゲットをプロジェクト、デマンド、およびプログラムの作業項目に関連付けることができるのは、 PPM 標準 (プロジェクトポートフォリオ管理) がインストールされている場合のみです。
- 目標またはターゲットをスクラム機能およびスクラムエピック作業アイテムに関連付けることができるのは、 アジャイル開発 2.0 がインストールされている場合のみです。
- 大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) がインストールされている場合にのみ、目標を SAFe エピックおよび SAFe 機能作業アイテムに関連付けることができます。
- 目標またはターゲットを計画立案アイテム (プロジェクト、デマンド、エピック) および戦略アイテム (プログラムとイニシアチブ) に関連付けることができるのは、 戦略的計画 がインストールされている場合のみです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- インストールされているプラグイン (PPM または 戦略的計画) に応じて、それぞれの関連リストが目標とターゲットのフォームに表示されます。PPM がインストールされている場合、プロジェクト、デマンド、およびプログラムの作業アイテム関連リストが目標およびターゲットフォームに表示されます。戦略的計画 のみがインストールされている場合、または PPM と 戦略的計画 の両方がインストールされている場合、[計画立案アイテム] および [その他のアイテム] 関連リストが目標フォームとターゲットフォームにそれぞれ表示されます。
- 作業アイテム (プロジェクト、デマンド、プログラム、スクラム機能、スクラム/SAFe エピック、または SAFe 機能) との目標またはターゲット関係が作成されると、目標またはターゲットフォームのそれぞれの関連リストにレコードが表示されます。計画立案アイテム (プロジェクト、デマンド、またはエピック) で目標またはターゲット関係が作成されると、目標またはターゲットフォームの [計画立案アイテム] 関連リストにレコードが表示されます。戦略アイテム (プログラムまたはイニシアチブ) またはその他の任意のアイテムで目標またはターゲット関係が作成されると、目標またはターゲットフォームの [その他のアイテム] 関連リストにレコードが表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > エンタープライズゴール管理 > 目標.
2. 必要な目標またはターゲットを開きます。
3. 次のオプションを使用して、作業または計画立案アイテムと目標またはターゲットとの関係を作成します。
4. [送信] をクリックします。

作業および計画アイテムの主要目標またはターゲットを関連付ける

目標またはターゲットを、アイテムが目標またはターゲットの達成に寄与する作業および計画アイテムに対するプライマリとして関連付けることができます。作業および計画アイテムのプライマリとして目標またはターゲットを設定するには、さまざまなロールが必要です。

プロジェクト、デマンド、プログラム、機能、エピック、および計画アイテムフォームの [主要目標] および [プライマリターゲット] フィールドに入力することで、目標またはターゲットを作業および計画立案アイテムのプライマリとして関連付けることができます。

また、プロジェクト、デマンド、プログラム、機能、エピック、および計画アイテムフォームの [目標/ターゲット関係] 関連リストから、非主要目標またはターゲットを作業および計画立案アイテムに関連付けることができます。

作業および計画立案アイテムを目標またはターゲットに関連付けると、目標またはターゲットの関連リストあるいは、それぞれの作業または計画アイテムの関連リストでこれらの関係を直接確認できるようになります。

次の表に、各作業および計画立案アイテムの主要目標またはターゲットを設定する方法を示します。

作業/計画立案アイテム	必要なプラグイン	必要なロール	主要目標を関連付ける手順
プロジェクト	PPM 標準	project_manager	1. 必要なプロジェクトを開きます。 2. フォームの [主要目標] フィールドと [主要ターゲット] フィールド

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

作業/計画立案アイテム	必要なプラグイン	必要なロール	主要目標を関連付ける手順
			に、プロジェクトに関連付ける目標またはターゲットをそれぞれ入力します。
デマンド	PPM 標準	demand_manager	1. 必要なデマンドを開きます。 2. フォームの [主要目標] フィールドと [主要ターゲット] フィールドに、デマンドに関連付ける目標またはターゲットをそれぞれ入力します。
Program (プログラム)	PPM 標準	program_manager	1. 必要なプログラムを開きます。 2. フォームの [主要目標] フィールドと [主要ターゲット] フィールドに、プログラムに関連付ける目標を入力します。
機能	アジャイル開発 2.0	rm_feature_admin	1. 必要な機能を開きます。 2. フォームの [主要目標] フィールドと [主要ターゲット] フィールドに、機能に関連付ける目標またはターゲットをそれぞれ入力します。
SAFe 機能	大規模アジャイルフレームワーク (SAFe)	safe_art_user または safe_admin	1. 必要な機能を開きます。 2. フォームの [主要目標] フィールドと [主要ターゲット] フィールドに、機能に関連付ける目標またはターゲットをそれぞれ入力します。
スクラムエピック	アジャイル開発 2.0	scrum_story_creator	1. 必要なエピックを開きます。 2. フォームの [主要目標] フィールドと [プライマリターゲット] フィールドに、エピックに関連付ける目標またはターゲットをそれぞれ入力します。
SAFe エピック	大規模アジャイルフレームワーク (SAFe)	safe_art_user	1. 必要なエピックを開きます。 2. フォームの [主要目標] フィールドと [プライマリターゲット] フィールドに、エピックに関連付ける目標またはターゲットをそれぞれ入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

作業/計画立案アイテム	必要なプラグイン	必要なロール	主要目標を関連付ける手順
計画アイテム (プロジェクト、デマンド、およびスクラム/SAFe エピック)	戦略的計画	sn_align_core.apw_user	1. 必要な計画立案アイテムを開きます。 2. フォームの [主要目標] フィールドと [主要ターゲット] フィールドに、計画立案アイテムに関連付ける目標またはターゲットを入力します。

ゴールフレームワークおよび **SPM** のゴールフレームワーク の参照情報

フィールド、ユーザーロール、テーブルなど、ゴールフレームワーク と SPM のゴールフレームワーク に関する追加の詳細を提供するための参照情報。

ゴールフレームワーク および **SPM** のゴールフレームワーク とともにインストールされるコンポーネント

ゴールフレームワーク および SPM のゴールフレームワーク アプリケーションをインストールすると、いくつかのタイプのコンポーネント (ユーザーロール、スケジュール済みジョブ、テーブル、スクリプトなど) がインストールされます。

インストールされるロール

ロール	説明	ロールを含む
sn_gf.goal_user_read	目標を表示できます。このロールは、プロジェクトユーザーやデマンドユーザーなどのユーザーに付与できます。	なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロール	説明	ロールを含む
sn_gf.goal_user	• 目標、サブ目標、および関連するターゲットを作成、表示、編集、および削除できます。 注: ◦ **[sn_gf.allow_goal_deletion]** システムプロパティが [はい] に設定されている場合、目標やサブ目標を削除できるのは、目標やその直接の親目標の所有者および貢献者のみです。 ◦ **[sn_gf.allow_goal_deletion]** システムプロパティが [はい] に設定されている場合、関連ターゲットを削除できるのは、目標のターゲットの所有者および貢献者のみです。 ◦ 目標を編集できるのは、目標やその直接の親目標の所有者および貢献者のみです。 ◦ ターゲットを編集できるのは、目標やターゲットの所有者および貢献者のみです。 • 目標関係性 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルから、作業アイテムと目標の間の既存の目標関係性を削除できます。	sn_gf.goal_user_read
sn_gf.goal_admin	• 目標とターゲットを作成します。 • 他のユーザーが作成した目標とターゲットを編集します。 • 目標設定を更新できます。 • ターゲット自動化機能の有効化の一環として、ターゲットソースとコンテキスト変数を作成できます。 注: SPM のゴールフレームワークがインストールされている場合は、ターゲットソースとコンテキスト変数を作成できます。	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user
sn_gf.strategy_planner_read	すべての戦略的計画と戦略値を表示できます。	なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロール	説明	ロールを含む
sn_gf.stategy_planner	戦略的計画と戦略値を作成、表示、編集、および削除できます。 注: • 戦略的計画は、戦略的計画の所有者とスポンサーのみが編集できます。 • 戦略値は、戦略計画のスポンサーのみが編集できます。	sn_gf.strategy_planner_read
sn_gf.epmo_stategy_planner	任意の目標を作成、表示、編集、および削除できます。	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user • sn_gf.goal_admin • sn_gf.strategy_planner

インストールされるスケジュール済みジョブ

ゴールフレームワークのスケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
目標、戦略、および作業アイテムデータをゴールフレームワークと関連する計画立案アイテムテーブルに移行	既存の目標データを ゴールフレームワーク テーブルに移行します。移行するデータとそのデータの移行方法については、「目標データ移行」を参照してください。
アサインされたエンティティの目標関係を移行する	(戦略的計画 ユーザーの場合) [会社]、[事業部門]、[部門]、[ポートフォリオ] 以外のレンズエンティティとの m2m 関係を作成している場合、目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルのデータに基づく [目標] フォーム にある [アサインされたエンティティタイプ] フィールドと [アサインされたエンティティ] フィールドに値が入力されます。

SPM のゴールフレームワーク スケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
SPM のゴールフレームワーク を使用してターゲットの実績値を更新	各ターゲットソースからデータを収集してターゲットの実績値を更新し、ターゲットの進捗状況が更新され、ターゲットの進捗状況が目標にロールアップされるようにします。

インストールされるテーブル

Goal Framework テーブル

表示名 [テーブル名]	説明
目標	目標の詳細を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Goal Framework テーブル (続く)

表示名 [テーブル名]	説明
[sn_gf_goal]	
目標コア [sn_gf_core_goal]	目標のコア (基本) 詳細を保存します。目標 [sn_gf_goal] テーブルは、目標コア [sn_gf_core_goal] テーブルを拡張します。
ターゲット [sn_gf_goal_target]	目標のターゲット詳細を保存します。
ユニット [sn_gf_units]	ターゲットの進捗状況を測定するために利用可能な単位を保存します。
ターゲット進捗状況 [sn_gf_goal_target_progress]	目標のターゲット進捗状況の詳細を保存します。
目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship]	目標とアイテム (プロジェクト、デマンド、プログラム、スクラムエピック、スクラム機能、および計画立案アイテム) の間の関係を定義します。
戦略計画 [sn_gf_strategic_plan]	計画立案組織階層ごとに定義された戦略計画を保存します。 **注:** このテーブルは、アラインメントプランナーワークスペース (APW) がインストールされている場合にのみ表示されます。
戦略的優先事項 [sn_gf_strategy]	組織に対して定義された戦略的優先事項を保存します。
戦略値 [sn_gf_stategy_value]	戦略計画の戦略値を保存します。 **注:** このテーブルは、APW がインストールされている場合にのみ表示されます。

SPM のゴールフレームワーク つのテーブル

表示名 [テーブル名]	説明
コンテキスト変数 [sn_gfa_context_variable]	ターゲットソースのコンテキスト変数の詳細を保存します。
ターゲットブレークダウン [sn_gfa_target_breakdown]	ターゲットに指定されたブレークダウン間隔に基づいて作成された、ターゲットのターゲットブレークダウンの詳細を保存します。
ターゲットソース	ターゲットの実績値を自動化するためのターゲットソース構成の詳細を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SPM のゴールフレームワーク つのテーブル (続く)

表示名 [テーブル名]	説明
[sn_gfa_target_source]	

インストールされたカスタムスクリプト

SPM のゴールフレームワーク カスタムスクリプト

名前	説明
福利厚生計画 事前定義されたスクリプトがあるターゲットソース。	金銭的または金銭以外の利益計画レコードからの [実績利益] フィールドまたは [金銭以外の実績利益] フィールドから必要な値を取得することによって、ターゲットフォームの [実績値] フィールドを更新する事前定義されたスクリプト。スクリプトテンプレートについては、「利益計画のターゲット自動化スクリプト」を参照してください。 **注:** 利益計画カスタムスクリプトは、PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理) がインストールされている場合にのみ使用できます。

インストールされているシステムプロパティ

ゴールフレームワーク システムプロパティ

名前	説明
sn_gf.allow_goal_deletion	目標の削除を有効にするオプション。デフォルト値は true です。
sn_gf.allow_target_deletion	ターゲットの削除を有効にするオプション。デフォルト値は true です。
sn_gf.goal_calendar_type	目標を設定するためのカレンダータイプを設定するオプション。使用可能なカレンダータイプは、グレゴリオ暦と会計期間です。デフォルト値は [グレゴリオ暦] です。
sn_gf.weighted_average_enabled	加重平均ロジックでサブ目標とターゲットから目標の進捗状況を計算できるようにするオプション。

SPM のゴールフレームワーク システムプロパティ

名前	説明
glide.ui.sn_gf_goal_target_activity.fields	目標とターゲットのフィールドのアクティビティストリームを有効にするオプション。
sn_gfa_disable_target_breakdown	インスタンスレベルでターゲットブレークダウン機能を有効にするオプション。デフォルト値は false です。
sn_gfa.target_breakdown_decimals	ターゲットブレークダウンの生成中にターゲット値に表示する小数点以下桁数を定義するオプション。デフォルト値は 2 です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SPM のゴールフレームワーク システムプロパティ (続く)

名前	説明
sn_gfa.weeklyCheckInDayToMapMonth	月にマッピングする週次ターゲットブレークダウンの終了日を定義するオプション。デフォルト値は金曜日です。

コンテキスト変数フォーム

コンテキスト変数フォームを使用して、構成された入力値に基づいてターゲットの実績値を計算するためのターゲットソースのコンテキスト変数を作成します。

コンテキスト変数フォーム

フィールド	説明
タイプ	コンテキスト変数タイプ。 さまざまなフィールドタイプについては、「フィールドタイプ」を参照してください。
アプリケーション	アプリケーションスコープの名前。
ラベル	コンテキスト変数タイプを作成するラベルの名前。
列名	コンテキスト変数タイプを作成するコンテキスト変数の ID。
選択リストの仕様	[実績値ソース構成] セクションのターゲットフォームにコンテキスト変数を表示するオプション。
既定値	ターゲットの実績値を更新するために考慮するデフォルト値。

目標がアサインされたエンティティ構成フォーム

目標がアサインされたエンティティ構成フォームを使用して、アサインされたエンティティタイプのテーブルを構成して、目標ユーザーが目標を必須のアサインされたエンティティに関連付けることができるようにします。

目標がアサインされたエンティティ構成フォーム

フィールド	説明
アサインされたエンティティテーブル	目標をアサインするエンティティテーブル。
アプリケーション	アプリケーションスコープの名前。
アサインされたエンティティフィールド	目標フォームの参照フィールド。

[目標] フォーム

目標フォームを使用して、組織の戦略的優先事項の目標を作成します。

注:
ESG ワークスペースおよび戦略的計画ユーザーの場合、ワークスペースのフォーム上の他のフィールド (デフォルトまたはカスタムフォームビューに 追加されていない) を表示するには、デフォルト/カスタムフォームレイアウトを構成します。フォームレイアウトの構成方法については、「フォームレイアウトの構成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[目標] フォーム

フィールド	説明
名前	目標の名前。
状況	目標のステータス。ステータスには、[ドラフト]、[処理中]、[承認済み]、[完了] [処理待ち]、[達成]、[未達成] があります。
親目標	この目標が寄与する親目標の名前。
戦略的優先事項	この目標の作成対象の戦略的優先事項の名前。
開始日	目標の開始日。デフォルトでは、現在の四半期の開始日が入力されます。サブ目標の場合、その親目標の開始日が入力されます。
終了日	目標の終了日。デフォルトでは、現在の四半期の終了日が入力されます。サブ目標の場合、その親目標の終了日が入力されます。
所有者	目標の所有者。デフォルトでは、目標を作成するユーザーの名前が入力されます。
カテゴリ	目標のカテゴリ。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • アプリケーション合計 • 総コスト • 経費 • 投資 • クラウドアプリケーション • 自家製アプリケーション • サポート費 • 人件費 • 標準コンプライアンス • 戦略的 • オペレーショナル • 戦術的 • 人工知能
ステータス	目標のステータス。ステータスには、[赤]、[黄]、[緑] または [なし] があります。
貢献者	目標の達成に貢献するユーザー。
チーム	目標を達成するためのさまざまなアクティビティを担当するアサイン先グループ。
親目標への影響	親目標の下にある兄弟目標やその他の目標と比較して、この目標の重要度を表す数値。デフォルトでは、 値は (1) [どちらでもない]です。 使用可能なオプションは、次のとおりです。 • **(0)** 影響なし • **(1)** どちらでもない • **(2)** 中

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[目標] フォーム (続く)

フィールド	説明
	• **(3)** 高 • **(4)** 非常に高 • **(5)** 最大 注: このフィールドは、**[sn_gf.weighted_average_enabled]** システムプロパティが [はい] に設定されている場合にのみ使用できます。
進行状況	目標の完了率。目標にサブ目標やターゲットがある場合、進捗状況の値は自動的に計算されます。 進捗値の計算方法の詳細については、「進捗値の計算」を参照してください。
アサインされたエンティティタイプ	目標をアサインするエンティティタイプ。例：事業部門、部門、会社、ポートフォリオ。
アサインされたエンティティ	目標をアサインするエンティティ。
コメント	コラボレーションを促進するための、目標に関する詳細なコメント。
分類	目標の分類タイプ。利用可能なオプションは、[環境]、[ソーシャル]、[ガバナンス] です。このフィールドは、ESG ワークスペース ユーザーにのみ適用されます。

目標/ターゲット関係フォーム

目標/ターゲット関係フォームを使用して、目標と計画立案アイテム、戦略アイテム、またはその他の任意のアイテム間の関係を作成します。

注:
SPM のゴールフレームワークがインストールされていない場合、フォーム名は目標関係として表示されます。

目標/ターゲット関係フォーム - 計画立案および戦略的アイテムのフィールド

フィールド	説明
計画立案アイテムタイプ	計画立案アイテムのタイプ。
計画立案アイテム	目標と併せて目標関係が作成される計画立案アイテム。

目標/ターゲット関係フォーム - 計画立案アイテムのフィールド - アイテムのフィールド (エンティティタイプ、製品モデル)

フィールド	説明
テーブル	参照テーブルの名前。
ドキュメント ID	選択した参照テーブルの列のドキュメント ID。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

目標/ターゲット関係フォーム - 計画立案アイテムのフィールド - アイテムのフィールド (エンティティタイプ、製品モデル) (続く)

フィールド	説明
	このフィールドの推奨値は、[テーブル] フィールドで選択された参照テーブルによって異なります。

目標設定フォーム

目標設定に使用されるカレンダータイプ、目標進捗状況の加重平均計算、目標やターゲットの削除など、目標を管理するための目標設定フォームを使用します。

目標設定フォーム

プロパティ	説明
加重平均ロジックを有効にして、サブ目標とターゲットから目標の進捗状況を計算します。	有効にすると、[親目標への影響] および [目標への影響] のフィールドが、目標 [sn_gf_goal] とターゲット [sn_gf_goal_target] のテーブルにそれぞれ表示されます。親目標の進捗値は、加重平均ロジックを適用して計算されます。 デフォルト値は [はい] です。 親目標の進捗状況の値は、進捗値と、サブ目標とターゲットの [親目標への影響] および [目標への影響] のフィールドでそれぞれ定義された値に基づいて計算されます。 進捗値の計算方法の詳細については、「進捗値の計算」を参照してください。
目標の削除を許可します。	目標を削除できます。 デフォルト値は [はい] です。
ターゲットの削除を許可します。	ターゲットを削除できます。 デフォルト値は [はい] です。 **注:** 目標を削除すると、[ターゲットの削除を許可] プロパティが [いいえ] に設定されていても、関連するターゲット (存在する場合) も削除されます。
目標の設定に使用されるカレンダータイプ。	目標の設定に使用されるカレンダータイプ。利用可能なカレンダータイプは、グレゴリオ暦と会計期間です。 デフォルト値は [グレゴリオ暦] です。
インスタンスレベルでターゲットブレークダウンを無効にします。	ターゲットブレークダウン機能を無効にできます。この機能を有効にすると、ターゲットブレークダウンは、ターゲットに設定されたブレークダウン間隔に基づいて自動的に作成されます。 デフォルト値は false です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

進捗値の計算

目標の進捗値や完了率の値は、さまざまな式を使用して自動的に計算されます。計算式は、ターゲットのみを含む目標であるか、サブ目標とターゲットの組み合わせであるか、また加重平均計算が有効になっているかどうかによって異なります。

シナリオ	目標の進捗値の計算に使用される式
• 目標にターゲットがある。 • 目標にサブ目標がない。 • [目標への影響] フィールドはターゲットで定義されている。	目標の進捗値 = 関連するターゲットの進捗値の合計/ターゲットの数
• 目標にサブ目標とターゲットがある。 • [親目標への影響] および [目標への影響] フィールドは、サブ目標とターゲットでそれぞれ定義されている。	目標の進捗値 = サブ目標と関連するターゲットの進捗値の合計/サブ目標とターゲットの数
• 目標に 2 つのターゲット (ターゲット 1 とターゲット 2) がある。 • 目標にサブ目標がない。 • [目標への影響] フィールドは、ターゲットで定義されており、**[sn_gf.weighted_average_enabled]** システムプロパティが [はい] に設定されている。	目標の進捗値 = [(ターゲット 1 の進捗値 * ターゲット 1 の重み付けスケール) + (ターゲット 2 の進捗値 * ターゲット 2 の重み付けスケール)] / (ターゲット 1 の重み付けスケール + ターゲット 2 の重み付けスケール)
• 目標に 2 つのターゲット (ターゲット 1 とターゲット 2) がある。 • 目標に 2 つのサブ目標 (サブ目標 1 とサブ目標 2) がある。 • [親目標への影響] および [目標への影響] フィールドは、サブ目標とターゲットでそれぞれ定義されており、**[sn_gf.weighted_average_enabled]** システムプロパティが [はい] に設定されている。	目標の進捗値 = [(サブ目標 1 の進捗値 * サブ目標 1 の重み付けスケール) + (サブ目標 2 の進捗値 * サブ目標 2 の重み付けスケール) + (ターゲット 1 の進捗値 * ターゲット 1 の重み付けスケール) + (ターゲット 2 の進捗値 * ターゲット 2 の重み付けスケール)] / (サブ目標 1 の重み付けスケール + サブ目標 2 の重み付けスケール + ターゲット 1 の重み付けスケール + ターゲット 2 の重み付けスケール)

目標 (G1) に 2 つのターゲット (T1 と T2) があり、T1 と T2 の [目標への影響] フィールドがそれぞれ 2 と 3 に設定されているとします。T1 と T2 の現在の進捗値は、それぞれ 40% と 20% です。この場合、G1 の進捗値は次のように計算されます。

- G1 進捗に対する T1 の貢献度 = 2/(2+3)*40 = 16%
- G1 進捗に対する T2 の貢献度 = 3/(2+3)*20 = 12%
- したがって、G1 の進捗 = 16% + 12% = 28%

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スケジュール済みスクリプト実行フォーム

スケジュール済みジョブは、特定の時間または繰り返しスケジュールで実行できる自動化された作業です。

目標、戦略、および作業アイテムデータを **Goal Framework** と関連する計画立案アイテムテーブルに移行

[目標、戦略、および作業アイテムデータを **Goal Framework** と関連計画立案アイテムテーブルに移行 **(Migrate Goal, Strategy, and Work item data to the Goal Framework and related Planning item tables)]** ジョブを使用して、既存の目標データを ゴールフレームワーク テーブルに移行します。

スケジュール済みスクリプト実行フォーム

パラメーター	説明
目標データの移行	• 既存のすべての目標レコードを目標 [goal] テーブルから目標 [sn_gf_goal] テーブルに移行します。sys_id は同じままです。対応するターゲットレコードがターゲット [sn_gf_goal_target] テーブルに作成されます。 • 目標と作業アイテム (プロジェクト、デマンド、プログラム) 間の既存の関係を、最初の目標 (Glide リストの順) を主目標とする目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルに作成します。
戦略データの移行	企業戦略 [enterprise_strategy]、事業部門戦略 [business_unit_strategy]、および戦略的達成目標 [strategic_objective] のテーブルから、既存のすべての戦略レコードを戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルに移行します。sys_id は同じままです。
目標戦略 M2M データの移行	ゴールフレームワーク では、1 つの目標は 1 つの戦略にのみマッピングできます。既存の目標にマッピングされた 2 つの戦略がある場合、目標のクローンが作成され (1 つは汎用目標として、もう 1 つはサブ目標として)、両方に同じ戦略が設定されます。また、サブ目標については、最初の目標が親目標として設定されます。 たとえば、既存の目標 (G1) が 5 つの戦略 (S1、S2、S3、S4、および S5) にマッピングされているシナリオを考えてみましょう。この場合、G1 の 4 つのクローンがサブ目標 (G2、G3、G4、および G5) として作成され、親目標が G1 として設定されます。親目標 (G1) と サブ目標 (G2、G3、G4、および G5) については、[戦略] フィールドにそれぞれ (S1、S2、S3、S4、および S5) が入力されます。 **注:** クローンされたサブ目標の名前には、`Cloned SubGoal:` のプリフィックスが付き、その後に親の目標名が続きます。
戦略/作業アイテム関係性	• 戦略と作業アイテム (プロジェクト、デマンド、プログラム) 間の既存の関係を目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルに移行します。 • 目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルに、目標に対する、(現在の戦略としての) 戦略と作業アイテム間の関連付けがない場合、現在の戦略の戦略値でダミー目

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スケジュール済みスクリプト実行フォーム (続く)

パラメーター	説明
データの移行	標が作成されます。そして、目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルに、ダミー目標と作業アイテムとの目標関係が作成されます。 **注:** ダミー目標の名前にはプリフィックス Goal: が付き、その後に戦略名が続きます。

アサインされたエンティティの目標関係を移行する

[アサインされたエンティティの目標関係を移行] ジョブを使用して、[目標] フォーム の [アサインされたエンティティタイプ] および [アサインされたエンティティ] フィールドを、従来のフィールド ([事業部門]、[部門]、[会社]、[ポートフォリオ]、およびカスタマイズされたエンティティフィールド) に入力します。

スケジュール済みスクリプト実行フォーム

パラメーター	説明
アサインされたエンティティの目標関係を移行する	(戦略的計画 ユーザーの場合) [会社]、[事業部門]、[部門]、[ポートフォリオ] 以外のレンズエンティティとの m2m 関係を作成している場合、目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルのデータに基づく [目標] フォーム にある [アサインされたエンティティタイプ] フィールドと [アサインされたエンティティ] フィールドに値が入力されます。 ユーザーがすでに m2m 関係を作成している場合は、このスクリプトを使用して、それぞれのポートフォリオ計画のこれらの目標にアクセスして管理するために、それらの関係を m2m テーブルから目標テーブルに移動できます。 目標に、割り当てエンティティテーブルタイプとの関係が 1 つしかない場合、[エンティティタイプのアサイン **(Assign entity type)]** フィールドと [エンティティのアサイン **(Assign entity)]** フィールドが、目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルに基づいて 設定されます。 目標に割り当てエンティティテーブルタイプとの関係が複数ある場合、関係の数 (n) のクローンされたサブ目標が作成され、[エンティティタイプのアサイン **(Assign entity type)]** フィールドと [エンティティのアサイン **(Assign entity)]** フィールドが、それぞれのクローンされたサブ目標の目標関係 [sn_gf_goal_m2m_relationship] テーブルにあるデータに基づき、目標 [sn_gf_goal] テーブルに入力されます。

[戦略計画] フォーム

戦略計画フォームを使用して、組織の目的、その戦略的優先事項、および関連する目標を定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[戦略計画] フォーム

フィールド	説明
名前	戦略計画の名前。
スポンサー	戦略計画のスポンサー。
開始日	戦略計画の開始日。
終了日	戦略計画の終了日。
説明	戦略計画の詳細な説明。
視覚	戦略と関連する目標に基づいた、将来のある時点での組織のビジネスの予定についての簡単な説明。
ミッション	組織の達成目標とその目標を達成するためのアプローチについての簡単な説明。

[戦略的優先事項] フォーム

組織の戦略的計画を目標に向けるために、戦略的優先事項フォームを使用します。

[戦略的優先事項] フォーム

フィールド	説明
名前	戦略的優先事項の名前。
親	この戦略的優先事項が寄与する親の戦略的優先事項の名前。
所有者	戦略的優先事項の所有者。デフォルトでは、戦略を作成するユーザーの名前が入力されます。
開始日	戦略的優先事項の開始日。
終了日	戦略的優先事項の終了日。
タイプ	戦略的優先事項のタイプ。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 主要イニシアチブ • 共有ビジョン • 戦略的ターゲット • 運用原則 • リレーションシップ戦略 • 環境 • 社会 • ガバナンス • 人工知能
戦略的プラン	この戦略的優先事項が作成される戦略計画の名前。
説明	戦略的優先事項の詳細な説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

利益計画のターゲット自動化スクリプト

事前定義された利益計画スクリプトをターゲットソースとして使用して、関連する作業アイテムの利益計画からターゲットの実績値を自動化します。

次の事前定義された利益計画スクリプトを使用して、ターゲットにターゲットソースを設定します。スクリプトは、金銭または金銭以外の利益計画に必要なデータをフェッチし、ターゲットの実績値を更新します。このスクリプトはそのまま使用することも、要件に応じて変更することもできます。コンテキスト変数を作成して、このターゲットソースに設定することもできます (利益計画)。

```
result = '';
var benefitPlans = new GlideRecord(sn_gfa.GFAdvancedConstants.BENEFIT_PLAN_TABLE);
benefitPlans.addQuery('sys_id', 'IN', benefit_plan);
benefitPlans.query();

var nonMonetaryBenefitSum = 0;
var monetaryBenefitSum = 0;
var hasMonetary = false;
var hasNonMonetary = false;
while (benefitPlans.next() && !(hasMonetary && hasNonMonetary)) {
    if (!gs.nil(benefitPlans.getValue('currency'))) {
        monetaryBenefitSum += parseInt(benefitPlans.getValue('actual_benefit'));
        hasMonetary = true;
    } else {
        nonMonetaryBenefitSum += parseInt(benefitPlans.getValue('nm_actual_benefit'));
        hasNonMonetary = true;
    }
}

if (hasMonetary && hasNonMonetary)
    gs.addErrorMessage(gs.getMessage('The Benefit Plan list can contain either monetary or
 non-monetary benefit plans.'));
else
    result = hasMonetary ? monetaryBenefitSum : nonMonetaryBenefitSum;
```

[ターゲットブレークダウン] フォーム

[ターゲットブレークダウン] フォームを使用して、ターゲットと目標の進捗状況を追跡して測定します。

このフォームは、SPM のゴールフレームワーク アプリケーションがインストールされている場合に使用できます。

[ターゲットブレークダウン] フォーム

フィールド	説明
ブレークダウン期間	ターゲットブレークダウンの期間。
親ブレークダウン	ターゲットブレークダウンの年。
ターゲット	ターゲットブレークダウンの親ターゲット。
ステータス	ターゲットブレークダウンのステータス。ステータスには、[赤]、[黄]、[緑] があります。
ブレークダウン	親ターゲットで指定されたブレークダウン間隔。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ターゲットブレークダウン] フォーム (続く)

フィールド	説明
計画されたターゲット	ターゲットブレークダウンのターゲット値。
実績	ターゲットブレークダウンの実際の値。
注釈	実績を更新する場合のビジネス上の根拠についてユーザーが入力した注釈。

[ターゲット] フォーム

目標の進捗状況を追跡して測定するために、目標フォームを使用します。

フォームの一部のフィールドは、SPM のゴールフレームワーク アプリケーションがインストールされている場合に使用できます。

注:
ESG ワークスペースおよび 戦略的計画 のユーザーの場合、ワークスペース内のフォームに他のフィールド (デフォルトビューとカスタムフォームビューのどちらにも追加されていないもの) を表示するには、デフォルトまたはカスタムのフォームレイアウトを構成します。フォームレイアウトの構成方法については、「フォームレイアウトの構成」を参照してください。

[ターゲット] フォーム

フィールド	説明
名前	ターゲットの名前。
目標	関連付けられた目標の名前。このフィールドは、[目標] フォームの [ターゲット] 関連リストからターゲットを作成するときに自動的に入力されます。
説明	ターゲットの簡単な説明。
状況	ターゲットのステータス。ステータスには、[ドラフト]、[処理中]、[承認済み]、[完了] があります。
ステータス	ターゲットのステータス。ステータスには、[赤]、[黄]、[緑] があります。

進行状況	実行が完了したターゲットの割合。この値は自動的に計算されます。
	
	[タイプ] フィールドが [最大化] に設定されている場合、進捗状況の値は次の式を使用して計算されます。
	
	`Progress = (Actual value - Base value) / (Target value - Base value) x 100`
	
	[タイプ] フィールドが [最小化] に設定されている場合、進捗状況の値は次の式を使用して計算されます。
	
	`Progress = (Base value - Actual value) / (Base value - Target value) x 100`
	
	重み付けスケールが定義されているときの進捗値の計算方法の詳細については、「進捗値の計算」を参照してください。

目標への影響	目標の他のターゲットと比較したターゲットの重要度を表す数値。サブ目標が存在する場合は、相対的な重み付けとその後の進捗状況の計算でも考慮されます。デフォルトでは、値は (1) [どちらでもない]です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ターゲット] フォーム (続く)

フィールド	説明
	使用可能なオプションは、次のとおりです。 • **(0)** 影響なし • **(1)** どちらでもない • **(2)** 中 • **(3)** 高 • **(4)** 非常に高 • **(5)** 最大 注: このフィールドは、**[sn_gf.weighted_average_enabled]** システムプロパティが [はい] に設定されている場合にのみ使用できます。
オーナー	ターゲットの所有者。デフォルトでは、ターゲットを作成するユーザーの名前が入力されます。
貢献者	ターゲットの達成に貢献するユーザー。デフォルトでは、関連付けられた目標の貢献者が入力されます。

ターゲットフォームの [期間] セクション

フィールド	説明
開始日	ターゲットの開始日。デフォルトでは、関連付けられた目標の開始日が入力されます。
終了日	ターゲットの終了日。デフォルトでは、関連付けられた目標の終了日が入力されます。

ターゲットフォームの [メトリクス] セクション

フィールド	説明
測定単位	指定された値の測定タイプ。コスト、時間、レートなど、使用する測定項目。使用可能な測定タイプは、単位 [sn_gf_units] テーブルに格納されています。測定単位は、ターゲットのタイプを定性的または定量的として定義します。定量的ターゲットに使用可能な単位は **[#]**、**[$]**、**[%]**、および [日] です。定性的ターゲットに使用可能な単位は [はい]/[いいえ] です。
タイプ	達成の方向を示すターゲットタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ターゲットフォームの [メトリクス] セクション (続く)

フィールド	説明
	• 最大化：進行方向は基準値からターゲット値に向かっており、基準値はターゲット値よりも小さくなければなりません。 • 最小化：進行方向は基準値からターゲット値に向かっており、ターゲット値は基準値よりも小さくなければなりません。 • マイルストーン：固定タイプ。ターゲットの達成度をキャプチャするには、定性的ターゲット値 (ターゲットの [測定単位] フィールドで設定) のみが許可されます。[マイルストーン] オプションは、定性的ターゲットにのみ適用されます。 [タイプ] フィールドは、値が定性的ターゲットの [マイルストーン] として入力され ([測定単位] フィールドが定性的ターゲット値に設定されている場合)、読み取り専用になります。
開始値	ターゲットの開始値。開始値は、現在値または現在の値と見なすこともできます。 [実際の値] フィールドに値を入力すると、このフィールドは読み取り専用になります。[基準値] フィールドの値を更新するには、[実際の値] フィールドをクリアします。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが [最大化] または [最小化] に設定されている場合に使用できます。
最終ターゲット値	ターゲットの最終ターゲット値。目標値は意欲的で、チームにやりがいを起こさせるものでなければなりません。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが [最大化] または [最小化] に設定されている場合に使用できます。
ベースライン参照	将来のパフォーマンスの参考となる、ターゲットの過去の達成度。この値は参照のみを目的としており、ターゲット進捗の計算には考慮されません。
現在までの実績	特定の時点でのターゲットの実際値。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが [最大化] または [最小化] に設定されている場合に使用できます。
チェックイン頻度	ターゲットのブレークダウン間隔と、所有者または貢献者がターゲットの実際の値を更新する

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ターゲットフォームの [メトリクス] セクション (続く)

フィールド	説明
	頻度を指定するオプション。ターゲットを短い期間にブレークダウンすると、ターゲットを短い期間に設定して、特定のブレークダウンターゲットに絞り込むことができます。使用可能なオプションは、[日次]、[週次]、[月次]、[四半期ごと]、 および [年次] です。このフィールドを [なし] 以外の利用可能なオプションに設定すると、ターゲットブレークダウンが自動的に作成されます。ターゲットブレークダウンの詳細については、「戦略的計画 でのターゲットブレークダウン」を参照してください。 **注:** ターゲットブレークダウン機能は定性的ターゲットではサポートされていません。
ターゲット値配布	累積または非累積で計算されるターゲットを指定するオプション。利用可能なオプションは、[期間 全体に均等に分割 (非累積)] と [期間 全体に直線的に広がる (累積)] です。 このフィールドは、[チェックイン頻度] フィールドが [なし] 以外の利用可能なオプションに設定されている場合にのみ使用できます。
備考	実績を更新する場合のビジネス上の根拠についてユーザーが入力した注釈。
チェックイン期限	ターゲットの所有者または貢献者がターゲットの実績値を更新する必要がある期日。
機密	ターゲットレコードのアクセスを [許可されたグループ] および [許可されたユーザー] フィールドに入力された特定のユーザーに制限するオプション。 このフィールドは、ESG Management アプリケーションがインストールされていて、かつ *sn_grc.enable_record_confidentiality* プロパティが有効な場合に利用できます。このフィールドは、ターゲットの目標フォームの [分類] フィールドが [環境]、 [ソーシャル]、または [ガバナンス] として設定されている場合にのみ適用されます。このフィールドを設定するために必要なロールは sn_esg.reader です。 **注:** ターゲットレコードが機密とされているかどうかに関係なく、ターゲットの進捗状況の値は目標までロールアップされて、目標の進捗値が計算されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ターゲットフォームの [メトリクス] セクション (続く)

フィールド	説明
許可されたグループ	ターゲットレコードにアクセスできるユーザーグループ。このフィールドは、ESG ワークスペース ユーザーにのみ適用されます。 このフィールドに入力されているユーザーグループでも、sn_esg.reader ロールがなければ、機密レコードにアクセスすることはできません。 このフィールドは、[機密] フィールドが **true** に設定されている場合に使用できます。
許可されたユーザー	ターゲットレコードにアクセスできるユーザー。このフィールドは、ESG ワークスペース ユーザーにのみ適用されます。 このフィールドに入力されているユーザー名でも、sn_esg.reader ロールがなければ、機密レコードにアクセスすることはできません。 このフィールドは、[機密] フィールドが **true** に設定されている場合に使用できます。
コメント	コラボレーションを促進するための、ターゲットに関する詳細なコメント。

[ターゲット] フォームの [ターゲット自動化] セクション

フィールド	説明
実際の値の自動化	ターゲットのターゲット自動化機能を有効にするオプション。
実際の値のソース	ターゲットのレビュー期日にターゲットの実績値を自動更新するためにデータがフェッチされるターゲットソーステーブル。 このフィールドは、[実績値の自動化] フィールドが **true** に設定されている場合に使用できます。

ターゲットフォームの [変数] セクション

このセクションは、[実績値ソース] フィールドで選択されるターゲットソースで使用可能なコンテキスト変数に基づいて表示されます。

[実績値ソース] を [利益計画] (利益計画の事前定義されたターゲット自動化スクリプト) として選択すると、このセクションに [利益計画] フィールドが表示され、ターゲットの実際の価値を自動化するために必要な利益計画を選択できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
利益計画カスタムスクリプトは、PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理) がインストールされている場合にのみ使用できます。選択する福利厚生プランが見つからない場合は、Heisenberg UI から次の場所に移動して同じものを検索して選択できます エンタープライズゴール管理 > ターゲット ターゲットフォームを開きます。

ターゲットソースフォーム

ターゲットソースフォームを使用して、ターゲットのソースを構成し、ターゲットの実績値が自動更新されるようにします。

ターゲットソースフォーム

フィールド	説明
名前	ターゲットソースの名前。
有効	このターゲットソースの使用を有効にするオプション。
タイプ	ターゲットソースのタイプ。利用可能なオプションは次のとおりです。 • アセスメント/サーベイ • **PA** インジケーター • カスタムスクリプト
詳細	事前定義されたスクリプトを使用して、ターゲット ソースタイプ [アセスメント/サーベイ] の [カスタムスクリプト] オプションを有効にします。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが [アセスメント/サーベイ] に設定されている場合に使用できます。
アセスメントメトリクスタイプ	ターゲットソースのアセスメントメトリクスタイプ。 **ヒント:** フィールドに [評価方法] = [アセスメント] のメトリクスタイプが入力されている場合、ターゲットソースのコンテキスト変数が自動的に作成されます。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが [アセスメント/サーベイ] に設定されている場合に使用できます。
アセスメントメトリクスカテゴリ	アセスメントメトリクスタイプのアセスメントメトリクスカテゴリ。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが [アセスメント/サーベイ] に設定されている場合に使用できます。
説明	ターゲットソースの簡単な説明。
PA インジケーター	ターゲットソースの PA インジケーター。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが **[PA** インジケーター] に設定されている場合に使用できます。
ブレークダウン	PA インジケーターのブレークダウン このフィールドは、[タイプ] フィールドが **[PA** インジケーター] に設定されている場合に使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ターゲットソースフォーム (続く)

フィールド	説明
カスタムスクリプト	ターゲットソースの ServiceNow AI Platform テーブルから必要なデータをフェッチするカスタムスクリプト。 このフィールドは、[タイプ] フィールドが [カスタム] に設定されている場合に使用できます。または、 [タイプ] フィールドが [アセスメント/サーベイ] に設定されていて、[詳細] フィールドが **true** に設定されている場合。

ドメインセパレーションと ゴールフレームワーク

ドメインセパレーションは、 ゴールフレームワーク と SPM のゴールフレームワーク でサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

ゴールフレームワーク と **SPM** のゴールフレームワーク におけるドメインセパレーションの仕組み

ServiceNow インスタンスでドメインセパレーションを有効にした後、ゴールフレームワーク と SPM のゴールフレームワーク のデータは自動的にドメインセパレーションされます。さまざまなドメインのポートフォリオ計画の目標とターゲットデータは、これらのドメインにアクセスできるユーザーにのみ表示されます。

データ分離

ServiceNow® データ分離 アプリケーションは、組織がレンズ階層とそのリーフノードに基づいて機密データへのアクセスを制限するのに役立ちます。

注:
このアプリケーションは将来の廃止に向けて準備中です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベース の「Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184]」の記事を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳


データ分離は、レコード、関連アイテム、計画立案コンソール、ワークベンチ、およびレポートをサポートします。

注:
現在、データ分離は ServiceNow® プロジェクトポートフォリオ管理 でのみサポートされています。

または、データフィルターを他の構成とともに定義して、機密データへのアクセスを制限することもできます (データ分離を有効にします)。データフィルターと ACL を使用してさまざまなユースケースでデータ分離を有効にする方法の詳細については、Now Supportナレッジベース の「データフィルターと ACL を使用したデータ分離の管理 [KB1772519]」の記事を参照してください。


開始

探索




データ分離機能について説明します。

構成




機密データを制限するための データ分離 を構成する方法について説明します。

参照




フィールド、テーブル、ロール、プロパティなどのコンポーネントの詳細を取得します。

サポートされているテーブル



データ分離でサポートされているテーブルのリストを参照してください。

制限事項



データ分離の制限事項を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トラブルシューティングとサポート

- で質問や回答をする 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) フォーラム ServiceNow コミュニティ.
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する詳細については、「既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する」を参照してください。
- カスタマーサービス & サポートにお問い合わせください。詳細については、次を参照してください。 連絡先 カスタマーサービス & サポート.

データ分離 の探索

データ分離 が提供する機能、構成、およびメリットについて説明します。

データ分離の概要

データ分離 は、レンズ階層とそのリーフノードに基づいて ServiceNow® 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) のデータを制限するのに役立ちます。リーフノードとは、レンズ階層の最下位レベルのエンティティのことです。たとえば、組織レンズがデータ分離に使用されている場合、ベースシステムレンズのリーフノードは部門になります。必要に応じてレンズ階層を変更することもできます。レンズ構造を変更する方法の詳細については、ServiceNow コミュニティのデータ分離のためのレンズ構造の変更 に関する記事を参照してください。

必要に応じて、選択したデマンド、プロジェクト、リソース計画、およびコスト計画のエンティティで データ分離 を有効にすることができます。また、選択したコスト計画ブレークダウンおよびプロジェクトタスクの関連エンティティで データ分離 を有効にすることもできます。

データ分離 は、レコード、関連アイテム、計画立案コンソール、ワークベンチ、およびレポートをサポートします。

> **注:**
> アクセス制御リスト (ACL) およびクエリビジネスルール (BR) の制限は、データ分離 が有効になっている場合でも適用されます。たとえば、集計数が含まれるレポートはデータ分離されない場合があります。

データ分離 は、親プロジェクトまたは親タスクの データ分離 構成に基づいて、子プロジェクトおよびサブタスクにも適用されます。

データ分離 の主要コンポーネント

- 階層：レンズとそのリーフノードを使用して データ分離 を有効にするための階層を定義します。
- サポートされているエンティティ：必要に応じて、選択したエンティティおよび関連エンティティで データ分離 を有効にします。
- エンティティグループマッピング：ビジネスエリアとユーザーグループ間のエンティティグループマッピングを定義します。

特徴

データ分離 機能を使用して、次のことを実行できます。

- レンズ階層とそのリーフノードを使用してデータ分離階層を構成します。
- 必要に応じて、選択したエンティティと関連エンティティでデータ分離を有効にします。
- 指定されたユーザーグループにデータを制限するために、必要な数だけエンティティグループマッピングを作成します。
- データ分離の権限を持つユーザー (sn_ds.ds_privileged_user) ロールをアサインすることで、機密データに常にアクセスする必要があるユーザーにアクセス権を付与します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

データ分離 の仕組み

データ分離 を使用して 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) での機密データへのアクセスを制限するプロセスフローを次に示します。

- データ分離 の階層を定義するためにレンズが選択されます。データ分離 アドミニストレーターは、必要に応じてデータ分離のためにレンズの階層を変更できます。
- 必要なエンティティと関連エンティティが データ分離 に対して有効になっています。
- エンティティグループマッピングは、アクセスが制限される一連のユーザーを定義するビジネスグループ (ビジネスグループは事業部門、部門、または会社) ごとに作成されます。
- 有効なエンティティについては、ビジネスグループのデータは、エンティティグループマッピングレコードに入力されたユーザーグループの一員であるユーザーのみに制限されます。

データ分離機能とトラブルシューティングに関するその他のユースケースを理解するには、 データ分離 FAQ [KB1443046] 記事 Now Support ナレッジベース。

データ分離の例

例 1


たとえば、次のようなシナリオを考えてみましょう。

- データ分離 階層は組織レンズを使用して定義され、レンズ構造は (上から) 会社、事業部門、部門になっています。
- HR 部門 (部門：HR) のエンティティマッピングが、グループ HR リードとともに作成されます。
- データ分離 は、デマンドエンティティとプロジェクトエンティティに対して有効になっています。

この場合、HR リードグループに属するユーザー以外は、HR 部門のプロジェクトレコードとデマンドレコードにアクセスできません。ただし、すべてのユーザー (ユーザーが現在設定されている ACL に基づく) は、HR 部門の他のレコード (リソース計画やコスト計画など) にはアクセスできます。

例 2

XYZ 社は、次の画像に示すようなデータ分離対応のレンズ構造になっており、さまざまなユースケースに基づいてデータを特定のグループに制限したいと考えています。また、サポートされているすべてのエンティティが データ分離 に対して有効になっています。次のユースケースは、 データ分離 の仕組みと、さまざまなユースケースでの データ分離 の構成方法を理解するのに役立ちます。

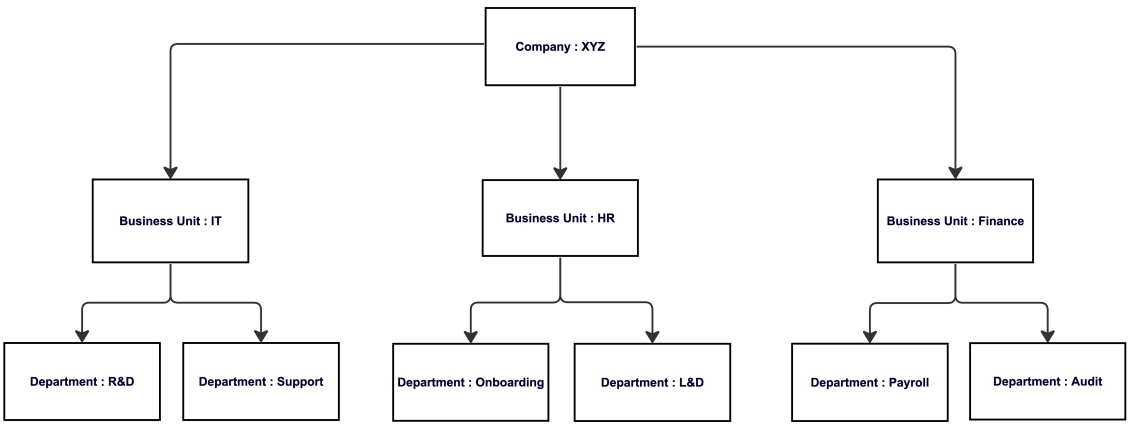

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ケース 1：給与部門のデータを給与マネージャーに制限する

  このケースのデータを制限するには、データ分離 を次のように設定します。

  - 給与マネージャーユーザーグループを作成します。
  - レンズエンティティレコード (部門：給与) と給与マネージャーユーザーグループを使用して、給与部門のエンティティグループマッピングを作成します。
- ケース 2：HR 事業部門 (オンボーディング部門と L&D 部門の両方) のデータを HR リードに制限する

  このケースのデータを制限するには、データ分離 を次のように設定します。

  - HR リードユーザーグループを作成します。
  - レンズエンティティレコード (事業部門：HR) と HR リードユーザーグループを使用して、HR 事業部門のエンティティグループマッピングを作成します。
- ケース 3：組織全体のデータを組織リードに制限する

  このケースのデータを制限するには、データ分離 を次のように設定します。

  - 組織リードユーザーグループを作成します。
  - レンズエンティティレコード (会社：XYZ) と組織リードユーザーグループを使用して、会社 XYZ のエンティティグループマッピングを作成します。

データ分離の構成

アドミニストレーターは、データ分離 をインストールし、必要なユーザーに データ分離 ロールをアサインできます。

構成ワークフロー

データ分離 アドミニストレーターは、データ分離 の階層を定義して、エンティティを有効にし、データ分離 のユーザーグループをマッピングできます。

データ分離 を構成するためのガイド付きセットアップ

ガイド付きセットアップには一連のタスクがあり、ServiceNow のインスタンスで必要な構成を行うのに役立ちます。データ分離をインストールした後、次の場所に移動します: すべて > **Data Separation** (データ分離) > ガイド付きセットアップ データ分離を構成します。

データ分離 のインストール

admin ロールがあれば、データ分離 アプリケーション (sn_ds) をインストールできます。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション.
- データ分離 には、次のプラグインとストアアプリケーションが必要です。データ分離 をインストールする前に、次のプラグインとアプリケーションがアクティブ化されていることを確認します。

  必須の ServiceNow プラグイン

  PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

データ分離 をインストールする前に、ServiceNow インスタンスの PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) をアクティブ化します。詳細については、「PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理) の有効化」を参照してください。

必須の ServiceNow Store アプリケーション

ポートフォリオ計画 (sn_align_ws)

データ分離 をインストールする前に、ServiceNow インスタンスにポートフォリオ計画 (sn_align_ws) アプリケーションをインストールします。詳細については、「ポートフォリオ計画 のインストール」を参照してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

データ分離 とともに次のアイテムがインストールされます。

- プラグイン
- ロール
- テーブル

詳細については、「Data Separation とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して、データ分離 アプリケーション (sn_ds) を検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store に要求する必要が生じる場合があります。

   ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

3. アプリケーションのインストールダイアログボックスで、アプリケーションの依存関係を確認します。

   依存するプラグインとアプリケーションは、インストールされる場合、現在インストールされている場合、またはインストールする必要がある場合、リストに表示されます。インストールする必要があるプラグインまたはアプリケーションがある場合は、データ分離 をインストールする前にインストールする必要があります。

4. **[Install** (インストール)] を選択します。

データ分離 を管理するためのロールのアサイン

ユーザーのアクティビティと責任に基づいて、ユーザーグループと個々のユーザーに データ分離 ロールをアサインします。

始める前に

必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
ロールを個々のユーザーまたはグループにアサインできます。グループにロールを適用すると、グループのすべてのメンバーにアクセス権が付与されます。データ分離 とともにインストールされるロールの詳細については、「データ分離 とともにインストールされるコンポーネント」の「インストールされるロール」の表を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > **Data Separation** (データ分離) > ガイド付きセットアップ.
2. **[Get Started** (開始する)] を選択します。
3. タスクリストから [ロールをアサイン] を選択します。
4. 必要なロール (sn_ds.ds_admin または sn_ds.ds_privileged_user) を選択し、[構成] を選択して、ユーザーまたはユーザーグループにロールをアサインします。

次のタスク
データ分離 を有効にするためのデータ分離階層を構成します。詳細については、「データ分離 を有効にするためのレンズの構成」を参照してください。

データ分離 を有効にするためのレンズの構成

レンズ階層とそのリーフノードを使用して、データ分離 を有効にするためのデータ分離階層を構成します。

始める前に
必要なロール：sn_ds.ds_admin

このタスクについて

> **注:**
> データ分離 に対して一度に有効にできるレンズは 1 つだけです。

手順

1. 移動先 すべて > **Data Separation** (データ分離) > 階層.
   [レンズ] リストビューが開き、データ分離に利用可能なレンズが表示されます。
2. データ分離 を構成するための階層として使用するレンズレコードを開きます。
3. [レンズ] フォームで、[データ分離が有効] を選択します。
   フィールド値の説明については、「レンズフォーム」を参照して ください。
4. [更新] を選択して構成を保存します。
5. 移動先 すべて > **Data Separation** (データ分離) > 階層.
6. [レンズ] リストビューから、[データ分離を同期 **(Sync data separation)]** を選択して、データ分離 のレンズ構成を同期します。

次のタスク
必要に応じて、選択したエンティティで データ分離 を有効にします。詳細については、「データ分離 のエンティティの有効化」を参照してください。

データ分離 のエンティティの有効化

必要に応じて、選択したエンティティで データ分離 を有効にします。

始める前に
必要なロール：sn_ds.ds_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
以下のエンティティおよび関連エンティティで データ分離 を有効にできます。

- エンティティ：
  - デマンド [dmn_demand]
  - プロジェクト [pm_project]
  - リソースプラン [resource_plan]
  - コスト計画 [cost_plan]
- 関連エンティティ：
  - コスト計画ブレークダウン [cost_plan_breakdown]
  - プロジェクトタスク [pm_project_task]

手順

1. 移動先 すべて > **Data Separation** (データ分離) > サポートされているエンティティ.
   データ分離 でサポートされているエンティティがリストで開きます。
2. データ分離 を有効にする各サポート対象エンティティレコードを開きます。
3. フォームのフィールドに入力します。

[サポートされているエンティティ**(Supported Entities)**] フォーム

フィールド	説明
エンティティ	エンティティテーブルの名前
データ分離を有効化	エンティティの データ分離 を有効にするオプション。

4. [更新] を選択して構成を保存します。
5. 移動先 すべて > **Data Separation** (データ分離) > サポートされているエンティティ.
6. [サポートされているエンティティ(Supported Entities)] リストビューから、[データ分離を同期 **(Sync data separation)**] を選択して、データ分離 のエンティティ構成を同期します。

> **注:**
> 関連するコスト計画ブレークダウンエンティティとプロジェクトタスクエンティティは、コスト計画とプロジェクトの親エンティティがそれぞれ有効になっている場合にのみ有効にできます。

次のタスク
データ分離 のユーザーグループをマッピングします。詳細については、「データ分離 のユーザーグループのマッピング」を参照してください。

データ分離 のユーザーグループのマッピング

データ分離 のユーザーグループをマッピングして、グループおよびサブグループの指定されたユーザーのみにデータを制限します。


始める前に
必要なロール：sn_ds.ds_admin

このタスクについて
レンズエンティティレコードごとに作成できるエンティティグループマッピングは 1 つだけです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

たとえば、次の画像は、リーフノードが部門であり、IT が部門の 1 つであることを示しています。IT 部門のデータを特定のグループに制限するとします。そのときは、必要なユーザーグループを使用して、IT 部門のエンティティグループマッピングを作成します。

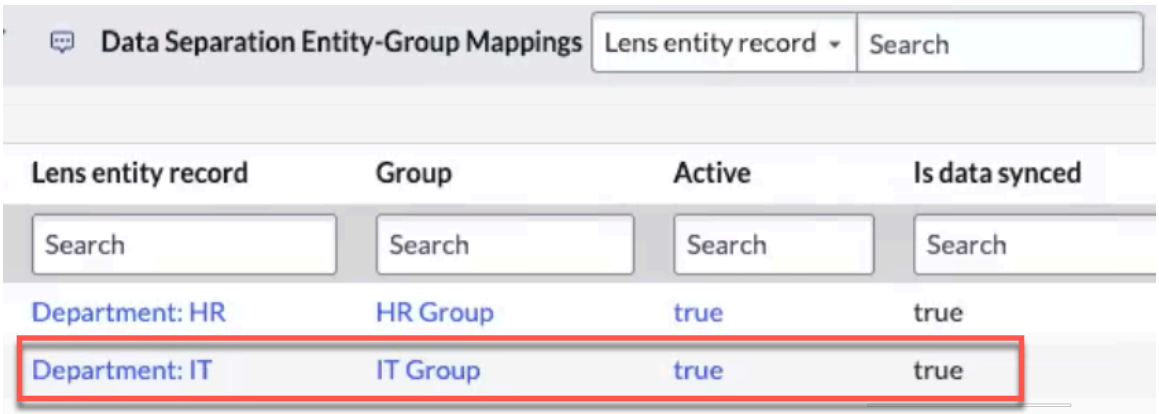

複数のグループに IT 部門のデータへのアクセス権を付与する場合は、親ユーザーグループを作成し、他のすべてのグループを親グループの下にサブグループとして追加します。これにより、IT 部門のエンティティグループマッピングレコードで親グループをマッピングできます。

注:
1 つのユーザーグループにすべての部門のデータへのアクセス権を付与する場合は、部門エンティティの親エンティティを使用してエンティティグループマッピングを作成します。または、ユーザーグループの部門ごとに 1 つのエンティティグループマッピングを作成することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > **Data Separation** (データ分離) > エンティティグループマッピング.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [エンティティグループマッピング (Entity-Group Mappings)] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「エンティティグループマッピングフォーム」を参照して ください。
4. [送信] をクリックしてレコードを保存します。
5. 移動先 すべて > **Data Separation** (データ分離) > エンティティグループマッピング.
6. [エンティティグループマッピング (Entity-Group Mappings)] リストビューから、[データ分離を同期 **(Sync data separation)]** を選択して、データ分離 のエンティティグループマッピングを同期します。

タスクの結果
データは、有効なエンティティのエンティティグループマッピングレコードに入力されたユーザーグループに制限されます。

データ分離 の同期

レンズ、サポートされているエンティティ、またはエンティティグループマッピングテーブルで構成が変更されたときに データ分離 を同期します。

始める前に
必要なロール：sn_ds.ds_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
データ分離 構成に従ってデータを制限するには、データ分離 構成のすべてのレコード (レンズ、エンティティ、エンティティグループマッピング) の [データ同期中] フィールドの値を **true** にする必要があります。設定レコードのいずれかの部分で [データ同期中] フィールドの値が **false** の場合、データ分離は同期されません。

[データ同期中] フィールドの値は、データ分離 のいずれかの構成が変更された場合にのみ **false** になります。

手順

データ分離 で行われた構成変更のタイプに応じて、次の手順を実行してデータ分離を同期します。

この構成変更の場合	次の手順を実行します
• 既存のレンズで データ分離 がオフになり、同じレンズで再度有効になる • 既存のレンズで Data Separation がオフになり、別のレンズで再度有効になる	**a.** 移動先 すべて > **Data Separation** (データ分離) > 階層. **b.** [レンズ] リストビューから、[データ分離を同期 **(Sync data separation)]** を選択して、データ分離 のレンズ構成を同期します。
エンティティで データ分離 が有効またはオフになっている	**a.** 移動先 すべて > **Data Separation** (データ分離) > サポートされているエンティティ. **b.** [サポートされているエンティティ(Supported Entities)] リストビューから、[データ分離を同期 **(Sync data separation)]** を選択して、データ分離 のエンティティ構成を同期します。
エンティティグループマッピングレコードでグループが追加、削除、または更新される	**a.** 移動先 すべて > **Data Separation** (データ分離) > エンティティグループマッピング. **b.** [エンティティグループマッピング (Entity-Group Mappings)] リストビューから、[データ分離を同期 **(Sync data separation)]** を選択して、データ分離 のエンティティグループマッピングを同期します。

データ分離の参照

フィールド、ユーザーロール、テーブル、ガイドライン、データ分離 情報など、データ分離 に関する追加の詳細を提供するための参照情報。

データ分離 とともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、データ分離 プラグインのアクティブ化とともにインストールされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

インストールされるロール

ロール	説明	含んでいるロール
sn_ds.ds_admin	データ分離 機能の構成に必要なテーブルのレコードを作成/更新/削除できます。	sn_align_core.ap_read_only
sn_ds.ds_privileged_user	データ分離 が有効になっている場合でも、戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) のビジネス機能のレコードを作成/更新/削除できます。	なし

インストールされるテーブル

表示名 [テーブル名]	説明
サポートされているエンティティ [sn_ds_data_separation_config]	データ分離 を有効にするためのエンティティの詳細 (デマンド、プロジェクト、リソース計画、コスト計画、コスト計画ブレークダウン、およびプロジェクトタスク) を保存します。
エンティティグループマッピング [sn_ds_entity_group_mapping]	データ分離 のレンズエンティティとユーザーグループの詳細を保存します。

データ分離 の制限事項

データ分離 が有効になっている場合でも、一部のデータタイプでは データ分離 が機能しません。

データ分離 の制限は次のとおりです。

- データ分離 は、プロジェクトポートフォリオ管理 と プロジェクトポートフォリオ管理 テーブルのサブセットのみをサポートしています。
- データ分離 が有効になっている場合でも、アクセス制御リスト (ACL) とクエリビジネスルール (BR) が適用されます。たとえば、アグリゲート数が含まれるレポートはデータ分離されない場合があります。
- データ分離 のパフォーマンスが、ある程度影響を受ける可能性があります。

エンティティグループマッピングフォーム

エンティティグループマッピングフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、選択したエンティティグループとユーザーグループの データ分離 を有効にするエンティティグループマッピングを定義します。

エンティティグループマッピングフォーム

フィールド	説明
レンズエンティティテーブル	レンズエンティティテーブルの名前。例：事業部門、部門、会社。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

エンティティグループマッピングフォーム (続く)

フィールド	説明
アクティブ	エンティティグループマッピングがアクティブかどうかを示します。
レンズエンティティレコード	レンズの簡潔な説明。 データ分離 が有効になっているエンティティグループ。
グループ	選択したエンティティのデータが制限されるユーザーグループ。

レンズフォーム

レンズフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、レンズ階層とそのリーフノードに基づいてデータ分離を有効にします。

レンズフォーム

フィールド	説明
名前	レンズの名前
有効	レンズがアクティブかどうかを示します。
説明	レンズの簡潔な説明。 このレンズのビジネス目的と、このレンズを使用する計画マネージャーを指定できます。
計画立案アイテム	このレンズを使用して計画できる作業のタイプ。 目的の計画立案アイテムを [利用可能] リストから [選択済み] リストに移動します。
計画立案アイテムの下部エンティティ	レンズ階層の下部エンティティ。
データ分離が有効	レンズ階層を使用してデータ分離を有効にするオプション。

データ分離 でサポートされているテーブル

データ分離 では、各エンティティの直接的および間接的な関連テーブルを含む、数種類のテーブルがサポートされています。

以下のエンティティおよび関連エンティティに対してデータ分離を有効にできます。

- エンティティ：
  - デマンド [dmn_demand]
  - プロジェクト [pm_project]
  - リソースプラン [resource_plan]
  - コスト計画 [cost_plan]
- 関連エンティティ：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コスト計画ブレークダウン [cost_plan_breakdown]
- プロジェクトタスク [pm_project_task]

ドメインセパレーションと データ分離

データ分離 ではドメインセパレーションがサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

プロジェクトポートフォリオ管理


ServiceNow® プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) は、複数の個別アプリケーションを組み合わせることで、プロジェクト、ポートフォリオ、そのリソースおよび財務を管理するための、シンプルなチーム指向アプローチを提供します。

プロジェクトポートフォリオ管理を既に所有している顧客は、PPM Standard にアップグレードできます。新規顧客は PPM Standard を購入する必要があります。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開始するには



Innovation Management
(イノベーション管理)



デマンド管理



プロジェクト管理 (PM)



リソース管理



ポートフォリオ管理




Program Management
(プログラム管理)



タイムカード管理



PPM アナリティクスとレポート



PPM 参照

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トラブルシューティングとサポート

- で質問や回答をする 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) フォーラム ServiceNow コミュニティ
- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

プロジェクトポートフォリオ管理 の探究


サンプルワークフローを使用して、プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) の詳細と、それが組織内のさまざまなユーザーにもたらすメリットについて説明します。

プロジェクトポートフォリオ管理の概要

PPM は、アイデアやデマンドの分析と承認、プロジェクトへの変換、完了までの管理に役立つ複数のアプリケーションのコレクションです。個々のプロジェクト、またはプログラムやポートフォリオにロールアップされたプロジェクトのリソースと財務を管理できます。PPM を使用すると、チームは従来のウォーターフォール手法で作業を計画して実行するか、またはアジャイルアプローチと組み合わせてハイブリッド手法を使用して実行できます。

プロジェクトポートフォリオ管理 のワークフロー

PPM を使用したウォーターフォール、アジャイル、またはハイブリッドアプローチでのプロジェクト実行

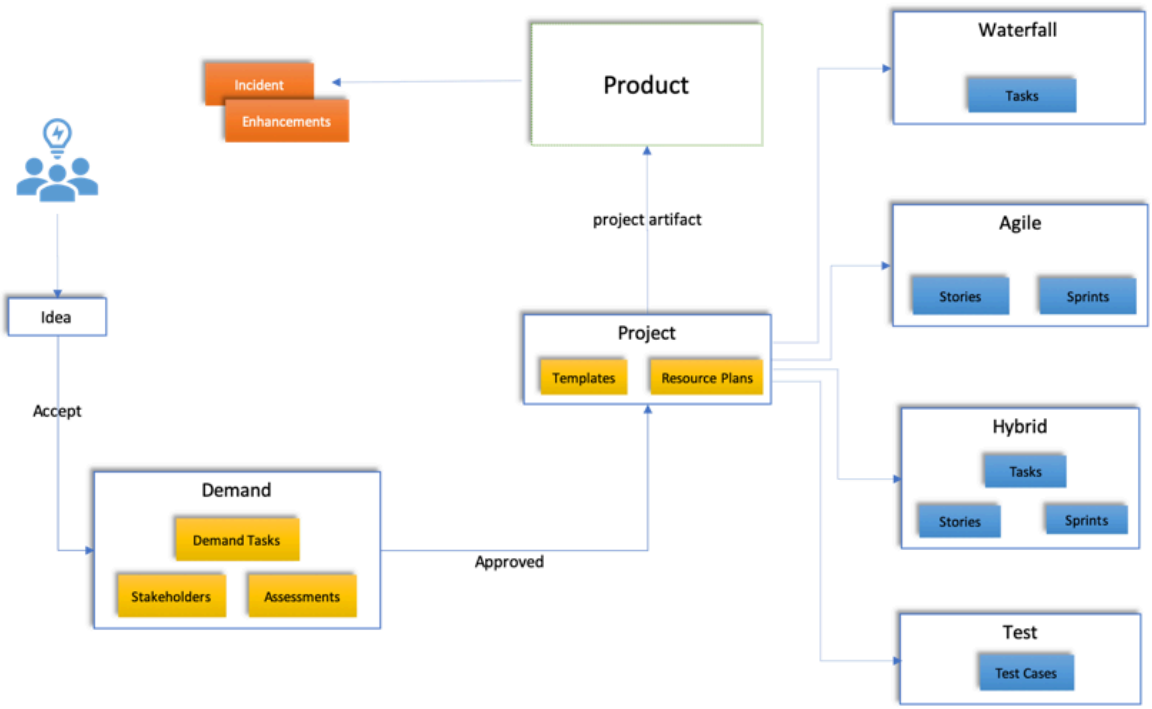

プロジェクトマネージャー (project_manager ロール) には、PPM スイートに含まれるアプリケーションに対するすべてのマネージャーロールが含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトポートフォリオ管理のメリット

メリット	機能	ユーザー
アイデアを収集して評価し、承認されたアイデアをデマンド、ストーリー、エピック、またはプロジェクトに昇格させます。	イノベーション管理	プロジェクトチーム、デマンドマネージャー
デマンドを評価、承認して、戦略的デマンドおよび運用上のデマンドに昇格させます。	デマンド管理	デマンドマネージャー
プロジェクト、タスク、およびリソースを管理します。	プロジェクト管理 (PM)	プロジェクトマネージャー、プロジェクトチーム
プログラム、プログラムのプロジェクト、およびそのタスクを管理します。	プログラム管理	プログラムマネージャー
さまざまなポートフォリオのプロジェクトとプログラムを管理します。	ポートフォリオ管理	ポートフォリオマネージャー
リソース計画を作成し、リソースを要求します。	リソース管理クラシック版	リソースマネージャー
タスクに対して日次ベースで時間を追跡します。	タイムカード管理	
プログラム、プロジェクト、およびデマンドのステータスと健全性を可視化します。	プロジェクトポートフォリオ管理 プラットフォームアナリティクスソリューション	プロジェクト、プログラム、またはポートフォリオマネージャーまたはビジネスステークホルダー

デジタルポートフォリオ管理 との統合

デジタルポートフォリオ管理 (DPM) は、オーナーに統一されたワークスペースを提供し、ライフサイクル全体を通じてサービスおよびアプリケーションを表示し、まとめて管理できるようにします。DPM および プロジェクトポートフォリオ管理 をインストールすると、プロジェクト管理 (PM) と デマンド管理 の統合が有効になります。この統合により、DPM マネージャーは、ビジネスアプリケーションに影響を与える可能性のあるプロジェクトデータを表示し、DPM でビジネスアプリケーションのデマンドを作成できます。

詳細については、「デジタルポートフォリオ管理の詳細」を参照してください。

[qa: BEGIN review]

Agile 2.0 との統合

TBD.

[End]

[qa: BEGIN review]

テスト管理 **2.0** との統合

TBD.

[End]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ドメインセパレーション

ドメインセパレーションは、ドメイン固有のユーザーに対して完全なデータ分離を提供します。プロジェクトポートフォリオ管理では、ドメインセパレーションをいくつかの制限付きでサポートしています。詳細については、「ドメインセパレーションとプロジェクトポートフォリオ管理」を参照してください。

PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理)

以前は ファイナンシャルを備えたプロジェクトポートフォリオスイート と呼ばれていた ServiceNow PPM Standard アプリケーションは、ファイナンシャルマネジメントとプロジェクトポートフォリオ管理をデータ連携します。

ファイナンシャルマネジメント がまだアクティブ化されていない場合は、PPM Standard が自動的にアクティブ化します。

このデータ連携により、プロジェクトマネージャーとポートフォリオマネージャーは次のアクティビティを実行できます。

- ポートフォリオ内のすべてのデマンドとプロジェクトの全体的なコスト要件を決定する
- リソース要件を確立し、デマンドとプロジェクトのコストを追跡する
- 承認された予算と比較して実際の支出額を追跡する

アップグレードおよび新規顧客

ファイナンシャルを備えたプロジェクトポートフォリオスイートをすでに所有している顧客は、PPM Standard にアップグレードできます。新規顧客は PPM Standard を購入する必要があります。

PPM Standard のアプリケーション

PPM Standard プラグインは、ファイナンシャルマネジメントと Project Portfolio Suite をインストールします。次の図は、利用可能なアプリケーションを示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PPM Standard とともにインストールされるアプリケーション



PPM Standard の追加機能

PPM Standard は、ファイナンシャルプランのあらゆる側面を実行するために使用できるポートフォリオワークベンチを追加します。関連リストの UI アクションを使用してファイナンシャルプランと予算業務を実行することもできますが、ワークベンチを使用することをお勧めします。詳細については、「従来のポートフォリオワークベンチ」を参照してください。実際のコストのトラッキングやファイナンシャルマネジメントアプリケーションの一部としての予算作成など、プロジェクトとポートフォリオのエンドツーエンドの財務計画を立案する方法については、「レガシー - ポートフォリオの計画立案」を参照してください。

関連情報

- ポートフォリオ管理
- ファイナンシャルマネジメント - 従来
- プロジェクトポートフォリオ管理

プロジェクトおよびデマンド向けの 投資枠管理 の有効化

admin ロールを持っている場合は、投資枠管理プラグイン (com.snc.investment_funding) を有効化します。このプラグインはデモデータを含んでおり、関連プラグインがまだ有効化されていない場合はそれらを有効化します。

始める前に

PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) プラグインがインストールされていることを確認します。

必要なロール：admin

このタスクについて

投資枠管理 (com.snc.investment_finding) プラグインを使用すると、プロジェクトおよびデマンドの資金を要求または割り当てることができるようになります。

このプラグインは、まだ有効化されていない関連プラグインを有効化します。また、sn_invst_pln_investment_user ロールを次のロールに追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- project_manager
- demand_manager
- portfolio_manager
- program_manager

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

関連情報

投資枠管理 のインストール

プラグインのリスト (Yokohama)

通貨と予算参照レート

複数通貨の使用がサポートされているため、異なる通貨での予算アイテムを変換できます。

通貨のサポート

アプリケーションでは、基準通貨を使用できます。これはレポート通貨とも呼ばれ、システムのプロパティで指定 します。予算および予算アイテムに他の通貨を指定することもできます。

通貨の使用

アイテム	使用される通貨
予算計画	予算計画フォームで指定する通貨。計画が予測に変換されると、アプリケーションは通貨をレポート通貨に変換します。
予算計画アイテム	予算アイテムフォームで指定する通貨。 予算計画アイテムの通貨が予算計画通貨と異なる場合、予算計画アイテムの金額は予算計画通貨に変換されます。
予算予測	レポート通貨。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

予算参照レート

予算参照レートは通貨間の為替レートです。各参照レートは、指定された期間有効です。予算アイテムが予算計画および予測と異なる通貨である場合に、アプリケーションは予算参照レートを使用します。アプリケーションは、予算計画で予算金額を計算するとき、および予算予測に値を表示するときに、予算アイテムの通貨値をグローバルシステム通貨値に自動的に変換します。

注:
通貨のサポートは予算のみが対象です。割り当てを複数の通貨で作成することはできません。

テスト管理 2.0 の Project Portfolio Management とのデータ連携

テスト管理 2.0 の プロジェクトポートフォリオ管理 とのデータ連携により、プロジェクトに対してテストアクティビティを実行できます。

テスト管理 2.0 および プロジェクトポートフォリオ管理 アプリケーションの両方を有効にすると、次が可能になります。

- プロジェクトにテストフェーズを追加します。
- テスト実行スイートをテストフェーズにアサインします。
- テスト実行スイートに関連付けられたテストを表示します。
- テスターにテストをアサインします。
- テストを実行し、結果を記録します。
- タイムラインの [完了率] フィールドを使用して進捗状況を追跡します。

テスターがテストを実行して結果を記録すると、その情報はテスト、テストフェーズ、その後、プロジェクトに更新されます。

注:
既存のユーザーの場合、プロジェクトポートフォリオ管理 と テスト管理 1.0 のデータ連携は継続して同様に動作します。引き続き、テストフェーズを作成したり、テストフェーズとテスト計画を関連付けたり、テストアクティビティを実行したりすることができます。

Agile Development 2.0 の Project Portfolio Management とのデータ連携

プロジェクトポートフォリオ管理 は アジャイル開発 2.0 アプリケーションを活用して、スクラム手法とプロジェクトベースの IT 開発を組み合わせます。

IT 組織は通常、より短期間のスケジュールで複数のプロジェクトに取り組みます。プロジェクトの計画とトラッキングはウォーターフォールを使用して行われますが、グループは作業の実行にはスクラム手法を用いることが好まれています。その後、アジャイル開発フェーズがある場合には、プロジェクトのステータスを追跡することが課題になります。この アジャイル開発 2.0 の プロジェクトポートフォリオ管理 とのデータ連携では、プロジェクトの管理と開発向けにウォーターフォール手法とアジャイル手法を容易に組み合わせることができます。

以下に説明するフローは、アジャイル開発 2.0 が プロジェクトポートフォリオ管理 とともに有効化されている場合に適用されます。

- スクラムチームを表すグループを作成します。
- グループにメンバーを追加します。
- スプリントを作成します。
- プロジェクトワークベンチからプロジェクトにグループをアサインします。
- グループとプロジェクトのバックログを維持します。複数のプロジェクトを並行して開発し、グループを複数のプロジェクトにアサインすることができます。各プロジェクトおよび各グループに

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

は、独自のバックログがあります。プロジェクトバックログには、プロジェクトに関連するすべてのストーリーが含まれます。グループバックログには、グループにアサインされた複数のプロジェクトのストーリーが含まれます。

- グループのスプリント計画を実行します。グループは、結合されたバックログを絞り込み、ストーリーをランク付けしてポイントをアサインし、優先度に基づいてスプリントにストーリーを追加します。
- プロジェクトに関連しないワンオフストーリーも含め、ストーリーを作成します。
- ストーリー、フェーズ、およびプロジェクトの進捗状況を追跡します。

アジャイルプロジェクトの作成と管理

アジャイルプロジェクトの作成に関連するタスクの概要。

次の表に、アジャイルプロジェクトの作成に関連するタスクを、タスクグループ別に示します。

開発グループを設定する

タスク	タスクの実行方法
アジャイルグループの定義	移動先 アジャイル開発 > アジャイルグループの作成 をクリックし、[新規] をクリックします。
グループメンバーを追加する	グループフォームの [グループメンバー] 関連リストに移動し、[編集] をクリックします。
グループのキャパシティを決定する	移動先 アジャイル開発 > グループをクリックし、目的のグループを選択して、[グループキャパシティ (ポイント)] フィールドに数値を入力します。

スプリントを作成する

タスク	タスクの実行方法
スプリントの作成	グループフォームの [スプリントの作成] 関連リンクを使用して複数のスプリントを作成するか、[スプリント] 関連リストを使用して個々のスプリントを作成します。
作成されたスプリントを表示する	グループフォームの [スプリント] 関連リストを使用します。

新しいプロジェクトを作成する

タスク	タスクの実行方法
プロジェクトを作成	• 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > 新規作成. • 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース をクリックし、「 新規プロジェクト」をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

既存のプロジェクトを開く

タスク	タスクの実行方法
既存のプロジェクトを開く	• プロジェクトフォームで [プロジェクトワークスペース] 関連リンクをクリックします。 • 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース をクリックし、ワークスペースヘッダーの [プロジェクトを選択] 選択リストからプロジェクトを選択します。

プロジェクトワークベンチからプロジェクトにフェーズを追加する

タスク	タスクの実行方法
プロジェクトのアジャイルフェーズを作成する	[フェーズを追加] アイコン (+) をクリックし、[フェーズタイプ] 選択リストから [アジャイル] を選択します。 **注:** このオプションは、プロジェクトポートフォリオ管理 および アジャイル開発 2.0 アプリケーションの両方がインストールされている場合にのみ表示されます。
プロジェクトのテストフェーズを作成する	[フェーズを追加] アイコン (+) をクリックし、[フェーズタイプ] 選択リストから [テスト] を選択します。 **注:** このオプションは、プロジェクトポートフォリオ管理 および テスト管理 2.0 アプリケーションの両方がインストールされている場合にのみ表示されます。

プロジェクトワークベンチからプロジェクトフェーズに詳細を追加する

タスク	タスクの実行方法
フェーズの詳細をリストビューまたは VTB で表示する	プロジェクトワークベンチヘッダーの [リスト] または **[VTB]** ボタンをクリックします。
アジャイルフェーズにグループをアサインする	アジャイルフェーズを編集し、[グループ] フィールドでグループを選択します。
アジャイルフェーズのスプリントを選択する	アジャイルフェーズを編集し、グループがアサインされていることを確認して、[スプリントの開始] と [スプリントの終了] を選択します。
アジャイルフェーズのストーリーを作成する	プロジェクトワークベンチでアジャイルフェーズをクリックし、詳細ビューヘッダーで [新規] をクリックします。
1 つのプロジェクトのストーリーを絞り込む	[ストーリーを管理] ボタンをクリックして、[ストーリーを管理] ダイアログボックスを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトワークベンチからプロジェクトフェーズに詳細を追加する (続く)

タスク	タスクの実行方法
	注: プロジェクトフォームの アジャイル計画および追跡 関連リンクを使用して、バックログを表示したり、プロジェクトにストーリーをアサインしたり、プロジェクトの新しいストーリーを作成したりすることもできます。
複数のプロジェクトにまたがるストーリーを絞り込む	グループフォームの [ストーリーを管理] 関連リンクをクリックします。
アジャイルフェーズにグループをアサインする	アジャイルフェーズの編集アイコンをクリックし、[グループ] 選択リストからグループを選択します。

プロジェクトワークベンチからプロジェクトにマイルストーンを追加する

タスク	タスクの実行方法
プロジェクトにマイルストーンを追加する	[フェーズを追加] アイコン (+) をクリックし、[フェーズを追加] ポップアップウィンドウの上部にある [マイルストーン] をクリックします。

スプリントを計画する

タスク	タスクの実行方法
スプリント計画立案を開始する	移動先 アジャイル開発 > グループをクリックし、目的のグループを開いて、[スプリント計画立 案] 関連リンクをクリックします。
スプリントにストーリーを追加する	移動先 アジャイル開発 > グループをクリックし、目的のグループを開き、[スプリント計画 立案] 関連リンクをクリックして、[ストーリーの作成] をクリックします。

プロセスをテストする **(**テスト管理 **1.0** が有効化されている場合のみ)

タスク	タスクの実行方法
テスト計画を作成する	移動先 テスト管理 > テスト実行 > テスト計画 > 新規.
テスト計画にテストケースを追加する	テスト計画フォームの [テストスイートからテストケースを追加] 関連リンクをクリックします。
テスターにテストケースをアサインする	テストケースフォームの [アサイン先] フィールドでユーザーを選択します。
テストを開始するようにテスターに通知する	[テスト計画] フォームの [テスターにテスト 開始通知] 関連リンクをクリックします。
テスターがテストを実行し、結果を送信する	移動先 セルフサービス > 自分のテスト または セルフサービス > 自分のアセスメント.
テストの進捗状況を監視する	テスト計画リスト、テスト計画フォーム、およびテストケースフォームのすべてに、テストケースと個々のテスト結果が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロセスをテストする (テスト管理 **1.0** が有効化されている場合のみ) (続く)

タスク	タスクの実行方法
サインオフをテストする	テスト計画フォームの [サインオフテスト計画] 関連リンクをクリックします。

プロセスをテストする (テスト管理 **2.0** が有効化されている場合のみ)

タスク	タスクの実行方法
テスト実行スイートを作成する	移動先 テスト管理 **2.0** > テスト実行スイートをクリックし、[新規] をクリックします。
テスト実行スイートにテストを追加する	テスト実行スイートを開き、[テストを追加] をクリックします。[テスト] リストから必要なテストを選択し、[実行スイートに追加] をクリックします。
テスターにテストをアサインする	テスト実行スイートを開きます。[テスト実行のアサイン] 関連リストで、テストをテスターにアサインします。 **注:** [準備完了] ステータスのテストのみアサインできます。
テスターがテストを実行し、結果を送信する	移動先 テスト管理 **2.0** > 自分にアサインされたテスト. 必要なテストを選択し、[実行] をクリックします。

アジャイルグループの定義

アジャイルプロジェクトの作業を後でアサインするためのアジャイルアサイン先グループを作成します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

アジャイル開発 2.0 のアサイン先グループ

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > グループ.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

グループフォーム

フィールド	説明
名前	グループ名を入力します。
マネージャー	このグループのマネージャを選択します。
グループキャパシティ (ポイント)	スプリントごとに、予測されたグループのキャパシティをストーリーポイント単位で入力します。
グループ メール	グループのメールアドレス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
説明	グループの簡単な説明。

グループフォームの関連リンク

フィールド	説明
スプリントの作成	[チーム用スプリントの作成] ダイアログボックスにアクセスします。フィールドに入力し、**[OK]** をクリックして、現在のグループ用に複数のスプリントを作成します。新しいスプリントが [スプリント] 関連リストに追加されます。
スプリント計画立案	アジャイルボードの [スプリント計画立案] タブにアクセスします。
グループの速度	プロジェクト内のストーリーポイントがスプリント全体にどのように割り当てられているかを示すチャートにアクセスします。

4. [送信] をクリックします。

グループメンバーを追加する

アジャイルプロジェクトのタスクを後からアサインするメンバーをグループに追加します。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > グループ.
2. 目的のグループを開きます。
3. [グループメンバー] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. [名前] フィールドにグループメンバーの名前を追加します。
5. グループメンバーの [スクラムロール] を選択します。
6. [送信] をクリックします。

グループのキャパシティを決定する

スプリントごとに、グループの速度の履歴に基づいて、グループのキャパシティを決定します。

始める前に
必要なロール：scrum_master

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > グループ.
2. 目的のグループを開きます。
3. グループキャパシティをポイント単位で決定し、[グループキャパシティ (ポイント)] フィールドに数値を入力します。
4. [更新] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リリースチームをアジャイルグループに変換する

アジャイルプロジェクトの作業を後からアサインするために、リリースチームをアジャイルグループに変換します。

始める前に
必要なロール：project_manager

このタスクについて
このセクションは、Agile Development 1.0 から Agile Development 2.0 にアップグレードした場合にのみ適用されます。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > グループ.
2. [リリースチームをグループに変換] 関連リンクをクリックします。
3. アジャイルグループに変換するチームを選択します。
4. [グループへ変換] をクリックします。

スプリントの作成

スプリントを作成して、プロジェクトのアジャイルフェーズの作業を計画します。

始める前に
必要なロール：なし。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > グループ.
2. 目的のグループを開きます。
3. [スプリント] 関連リストで [新規] をクリックします。
4. スプリントフォームで以下のフィールドに入力します。
   - 簡単な説明：スプリントの名前または簡単な説明
   - 開始予定日：このスプリントの開始日
   - 終了予定日：このスプリントの終了日
   - グループキャパシティ (ポイント)：グループの予測されたキャパシティ (ストーリーポイント単位)
5. [送信] をクリックします。

複数のスプリントを作成する

複数のスプリントを作成して、アサイン先グループの作業を計画します。

始める前に
必要なロール：なし。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > グループ.
2. 目的のチームを開きます。
3. [スプリントの作成] 関連リンクをクリックして、[チーム用スプリントの作成] ダイアログボックスを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. スプリントフォームで、フィールドに入力します。
   - 名前：スプリントの名前。
   - 開始番号：作成される最初のスプリントの番号。
   - 開始日：作成される最初のスプリントの開始日。
   - 期間：スプリントの日数。
   - スプリント数：作成されるスプリントの数。
5. [**OK**] をクリックします。
   新しいスプリントが、チームフォームの [スプリント] 関連リストに追加されます。

プロジェクトにグループをアサインする

グループにグループをアサインして、アサインされたプロジェクトのタスクを後からグループが処理できるようにします。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

手順

1. ナビゲーション移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. プロジェクトを選択してフォームを開きます。
3. [アサイン先グループ] フィールドから、このプロジェクトをアサインするグループを選択します。
   必要なグループが表示されない場合は、アドミンと協力して作成してください。「アジャイルグループの定義」を参照してください。
4. プロジェクトフォームを保存します。

プロジェクトにストーリーを追加する

ストーリーを作成してプロジェクトに関連付けるか、既存のストーリーをプロジェクトに追加します。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

- ストーリーリストには、現在アクティブなストーリーが表示されます。このリストからストーリーを作成したり、現在のストーリーのストーリーフォームを表示したりできます。ストーリーフォームからスクラムタスクを追加したり、ストーリーとタスクの進捗ボードを表示したりすることもできます。
- ストーリーはプロジェクトに関連付けることができますが、必須ではありません。ストーリーの作成時に、プロジェクトに 1 つのフェーズしかない場合には、ストーリーは自動的に唯一のフェーズにタグ付けされます。
- ワンオフストーリーは、製品またはプロジェクトへのリンクなしで作成できます。ワンオフストーリーは簡単な説明のみで作成され、グループにアサインすることができます。S
- ストーリーは、[実行タイプ] フィールドが [ハイブリッド] または [アジャイル] に設定されているプロジェクトにのみ追加できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト.
2. ストーリーを追加するプロジェクトを開きます。
3. [ストーリー] 関連リストから、次のいずれかを選択します。
   - [既存を追加] は、既存のストーリーをこのプロジェクトに追加します。
   - ストーリー を作成してこのプロジェクトに追加する新規。

     フォームフィールドの詳細については、「ストーリーフォーム」の説明を参照してください。
4. プロジェクトフォームを保存します。

次のタスク

- このストーリーのスクラムタスクを作成します。「アジャイル開発 2.0 ストーリーに対するスクラムタスクの作成」を参照してください。
- ストーリーの関連リンクと関連リストを使用して、実行できるその他のアクションを確認します。「アジャイル開発 2.0 におけるストーリーの関連リンクと関連リスト」を参照してください。
- アジャイル開発 2.0 ストーリーに関する依存関係の追加
- ストーリーの追加アクション (☰) の [挿入] または [挿入と維持] オプションを使用して、このストーリーと同じ詳細を含むストーリーを作成できます。

  [挿入と維持] を使用すると、新しく作成したストーリーのフォームは開いたままになります。ストーリーの詳細を変更したり、こうした詳細を含むストーリーをさらに作成したりできます。アジャイルボードでは、新しいストーリーは元のストーリーのすぐ下に示されます。それに応じて、新しいストーリーのグローバルランクが設定されます。

  注:
  こうしたアクションにアクセスするには、 *glide.ui.task.insert* プロパティおよび *glide.ui.advance* プロパティを **true** に設定します。これらのアクションは、トリアージボードから追加されたストーリーでは許可されません。

スプリントを計画する

[スプリント計画立案] タブを使用して、スプリント計画立案と完了アクティビティを簡素化します。

始める前に

必要なロール：scrum_admin、scrum_master、または scrum_sprint_planner

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > グループ.
2. 目的のグループを開きます。
3. [スプリントを計画] 関連リンクをクリックします。
   [アジャイルボード]、[スプリント計画立案] タブが表示されます。
4. いずれかのオプションを使用して、チームにアサインされていて、[バックログ] セクションのいずれのスプリントにもアサインされていない、すべてのアクティブなストーリーを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- バックログに 50 を超えるストーリーが含まれている場合、ページネーションコントロールがリストの下部に表示され、リスト内の前ページ、次ページ、最初のページ、または最後のページに移動できます。
- バックログ内でストーリーを並べ替えると、ストーリーのランキングが変わります。ランクは、ストーリーの [rm_story] テーブルの global_rank 列に格納されます。バックログ内でストーリーを移動すると、同じバックログ内で相対的にそのストーリーのランクが変更されます。したがって、ストーリーが他のバックログに存在する場合、そのランキングは変更される可能性がありますが、バックログ内の位置は変わりません。

5. スプリントを開始するには、最初または一番上のスプリントの右隅に表示された [開始] をクリックします。
   [スプリント追跡] タブが表示されます。
6. スプリントを完了するには、最初または一番上のスプリントの右隅に表示された [開始] をクリックします。

   a. 未完了のストーリーがある場合は、バックログまたは将来のスプリントに移動します。

   b. [完了] をクリックします。
      スプリントが [スプリント計画立案] タブから消え、[スプリント] リストに完了として表示されます。

進捗状況の追跡

プロジェクトワークベンチのタイムラインでアジャイルフェーズの進捗状況を追跡します。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
ストーリーはプロジェクトにアサインされ、プロジェクトワークベンチのアジャイル開発フェーズに関連付けられます。ストーリーが完了すると、ストーリーポイントとストーリーステータスがスプリントとプロジェクトフェーズにロールアップされます。次に、フェーズがプロジェクトにロールアップされます。

手順

1. プロジェクトワークベンチのタイムラインに移動します。
2. フェーズバーの色が付いた部分の長さで進捗状況が示され、[完了率] フィールドが更新されます。

PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理) の有効化

admin ロールを持っている場合は、PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) を有効にします。このプラグインは、プロジェクトポートフォリオ管理アプリケーションをインストールします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
PPM Standard は、PPM (プロジェクトポートフォリオ管理) アプリケーションの基本的なプラグインです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」


   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

タスクの結果
すべての PPM アプリケーションは、そのユーザーロールおよびテーブルとともに ServiceNow インスタンスにインストールされます。詳細については、「プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) Standard とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

イノベーション管理



イノベーション管理 を使用すると、アイデアを効率的に収集して評価し、実装の可能性が最も高いアイデアをすばやく特定して処理できます。

開始するには

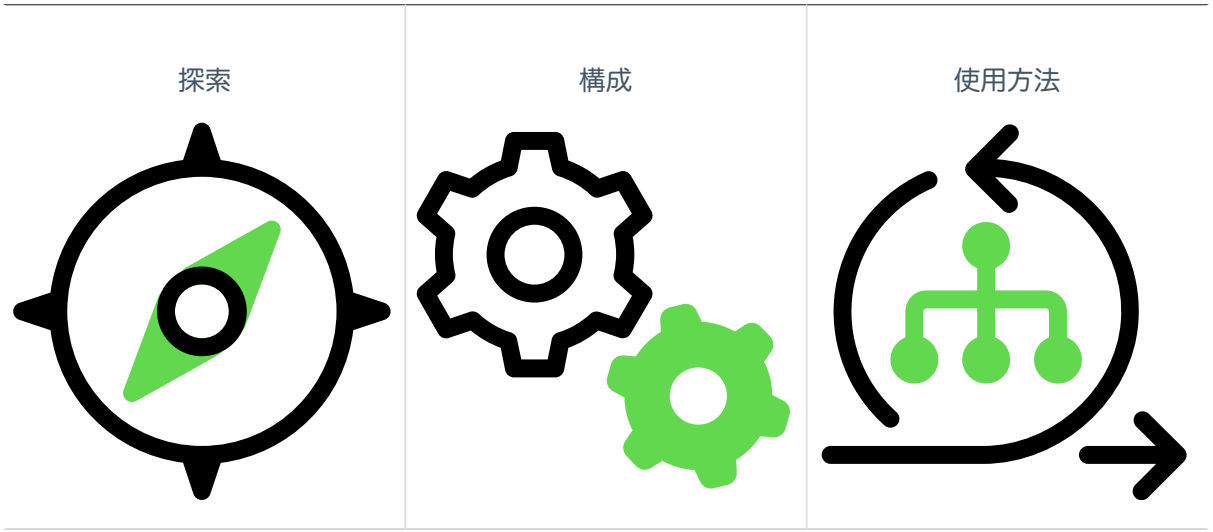

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

統合	参照	
		

アイデアポータルは、アイデアの収集、評価、選択、および実行を迅速化および体系化します。アイデアマネージャーまたはデマンドマネージャーは、送信されたアイデアを評価し、承認されたアイデアをデマンド、エピック、機能、またはストーリーに昇格させます。

役に立つリソース

役立つ情報を提供できる ServiceNow リソースは次のとおりです。

ServiceNow コミュニティ

ServiceNow コミュニティ

Customer Success Center

Customer Success Center

ディベロッパー

developer.servicenow.com

Impact

http://impact.servicenow.com

ServiceNow University

ServiceNow University

Now Create

Now Create

パートナー

https://www.servicenow.com/partners.html

ServiceNow

http://ServiceNow.com

ServiceNow Store

http://ServiceNow.com

支える

- https://support.servicenow.com/now
- 既知のエラーポータル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

イノベーション管理 の探索

イノベーション管理 アプリケーションは、アイデアを収集および評価して、実装される可能性が最も高いアイデアを判断するための集中管理リポジトリです。


イノベーション管理の概要

イノベーション管理のプロセスには、最初の構想段階から最終的な実装までの組織のイノベーションの管理が含まれます。これには、イノベーション戦略の策定と実装に関連する意思決定、アクティビティ、およびプラクティスが含まれます。イノベーション管理アプリケーションを使用すると、アイデアの送信、追跡、表示、ディスカッション、フィルタリング、および投票を行うことができます。

イノベーション管理 のワークフロー

この画像は、アイデアの送信から完了までのアイデアワークフローを説明しています。

アイデアワークフロー

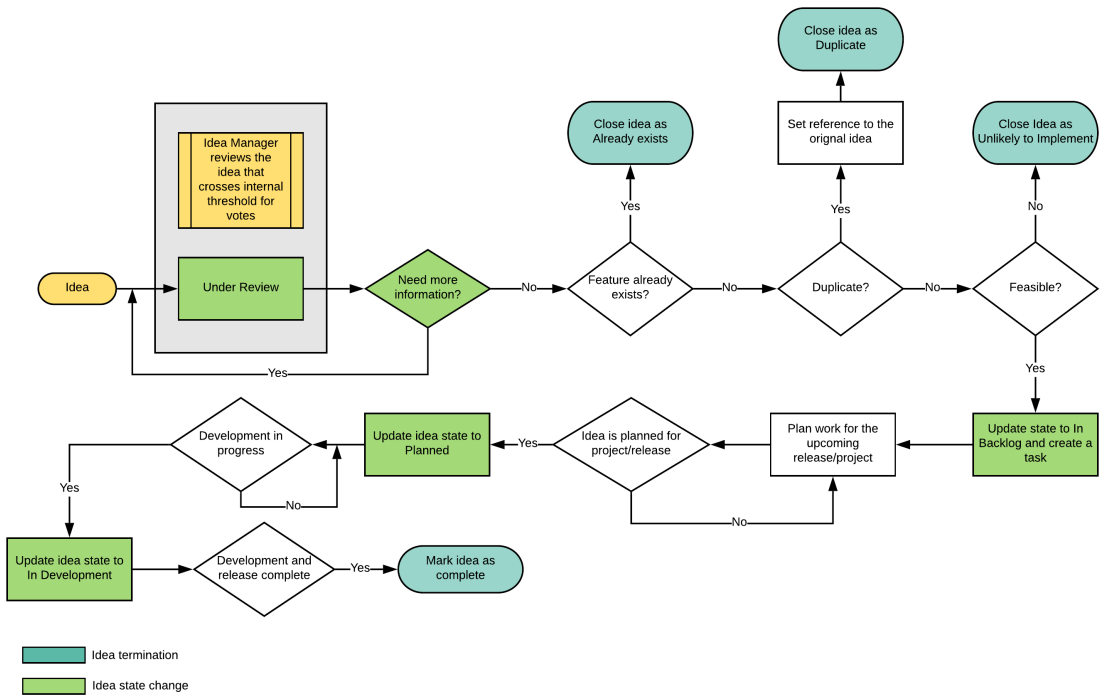

イノベーション管理 のメリット

イノベーション管理のメリット

メリット	機能	ユーザー
アイデアポータルで製品や機能に関する新しいアイデアを収集して投票します。	アイデアの送信	アプリケーションへのアクセス権を持つユーザー。
作業するアイデアを表示、フィルタリング、整理します。	アイデアの表示、フィルタリング、およびソート	アプリケーションへのアクセス権を持つユーザー。
インタラクティブなコメントボードを介して共同作業し、アイデアに関する情報を中央で交換します。	アイデアに関するコラボレーション	idea_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

イノベーション管理のメリット (続く)

メリット	機能	ユーザー
承認されたアイデアを計画および開発するためのタスクを作成します。	アイデアのタスクを作成する	idea_managerまたはidea_manager_professional
アイデアを保存およびグループ化するためのアイデアモジュールを作成します。	アイデアモジュールの作成	idea_admin
送信されたアイデアに関連付ける新しいアイデアカテゴリを作成します。	新しいアイデアカテゴリの定義	idea_admin
アイデアダッシュボードマネージャーを使用して、アイデアを分析およびレビューします。	Idea Manager Dashboard を使用したアイデアメトリクスの分析	idea_managerまたはidea_manager_professional
ユニバーサル要求からアイデアを作成し、アイデアを管理します。	ユニバーサル要求からのアイデアの作成	idea_admin
アイデアが却下された場合やアイデアを実装できない場合に、アイデアを別の部門に転送します。	アイデアを別の部門に転送する	アイデアがアサインされているエージェント、またはアサインされたワークグループに含まれているエージェント。

次に探索する内容

イノベーション管理を構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。

- イノベーション管理の構成
- を使用したアイデアの管理 イノベーション管理
- アイデアポータルの管理
- Idea Manager Dashboard を使用したアイデアメトリクスの分析
- イノベーション管理と ユニバーサル要求の統合
- イノベーション管理の参照

イノベーション管理 の 予測インテリジェンス

イノベーション管理 用 予測インテリジェンス 機能では、機械学習アルゴリズムを使用して、新しいアイデアの提示時に、類似のアイデアを検索して表示します。

PPM 予測インテリジェンスワークベンチには、新しい予測モデルの作成とトレーニング、それらの評価とテスト、およびアイデア、デマンドおよびプロジェクト管理 (PM)に価値を付加するために、ビジネスプロセスへの追加プロセスを系統的にガイドする、事前にビルドされたユースケーステンプレートが含まれています。

カスタムユースケースはトレーニング後、すぐに使用可能になります。PPM 予測インテリジェンスワークベンチの使用に際して、人工知能や機械学習に関する事前の知識や経験は不要です。

アプリケーションには、独自の予測モデルの作成、トレーニング、評価、テスト、プロデュースに役立つ事前にビルドされたガイダンスを含むテンプレートが含まれています。

イノベーション管理用の予測インテリジェンスには、次の利点があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 重複するアイデアを回避することで、データベースの品質を向上させます。
- 類似のアイデアを特定して、重複するアイデアを結合できるように、関連するアイデアを提案します。

アクティベーション情報

予測インテリジェンスワークベンチを使用する前に、次のプラグインを有効化します。

- PPM 用予測インテリジェンス (com.snc.ppm_ml) プラグイン
- 観念化用予測インテリジェンス (com.snc.innowation_management_ml) プラグイン

イノベーション管理向け 予測インテリジェンス のソリューション定義

イノベーション管理 用 予測インテリジェンス 機能のソリューション定義は、観念化の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.innovation_management_ml) で利用できます。予測インテリジェンスの詳細については、「予測インテリジェンス」を参照してください。

イノベーション管理 のソリューション定義

ソリューション定義	ソリューション タイプ	説明
類似のアイデア **注:** このソリューション定義は、次のプラグインが有効なインスタンス上で、テンプレートとして使用できます。 • 予測インテリジェンス • PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) • 観念化用 Predictive Intelligence (com.snc.innowation_management_ml)	類似性	[タイトル] および [説明] フィールドに基づいて、関連するアイデアを提案します。結果は次の場所に表示できます。 • アイデアポータルでアイデアを作成するときの [アイデアを作成] フォームの [関連するアイデア] セクション。 • アイデアポータルのアイデアページの [関連するアイデア] セクション。

関連情報

予測インテリジェンス

類似のアイデアを見つけるために イノベーション管理 の類似性ソリューションをトレーニングする

サプライヤーカタログを使用してアイデアを送信する

PPM PIWB テンプレート - 類似アイデアの検索

イノベーション管理の構成

イノベーション管理アプリケーションを構成して、アイデアを分析および追跡し、タスク、デマンド、またはプロジェクトに昇格させます。このアプリケーションは戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) で利用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Idea Manager Dashboard のインストール

admin ロールを持っている場合は、Idea Manager Dashboard アプリケーションを ServiceNow Store からインストールできます。このアプリケーションには、デモデータが含まれています。まだインストールされていない場合は、関連するプラグインがインストールされます。

始める前に

注:
バージョン 2.0.0 以降、Idea Manager Dashboard は、Analytics Idea Manager からアクセスできるネクストエクスペリエンス UI フレームワークで利用できます。

- アプリケーションとその関連するすべてのストアアプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得 ServiceNow 製品またはアプリケーション.
- アプリケーションに必要なプラグインや他のストアアプリケーションがあり、まだインストールされていない場合は、先にこれらをインストールします。Idea Manager Dashboard アプリケーションには、次のプラグインが必要です。
  - PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo)

    有効化手順の詳細については、「PPM Standard の有効化 (プロジェクトポートフォリオ管理)」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してアプリケーションを検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることもあります。

   ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。
3. リストからバージョンを選択し、[インストール] を選択します。

   表示される [インストールの詳細を確認] ダイアログボックスに、アプリケーションとともにインストールされている依存関係が一覧表示されます。
4. プロンプトが表示された場合は、ServiceNow Store へのリンクに従って、依存関係のエンタイトルメントを取得します。
5. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。
   デモデータは、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードです。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。
6. **[Install** (インストール)] を選択します。

タスクの結果

Idea Manager Dashboard にアクセスするには、 アイデア > アイデアマネージャーダッシュボード.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
Idea Manager Dashboard を使用する前に、次のパフォーマンスアナリティクスデータコレクタージョブを実行します。

- *[PA PPM IMD] Historic Data Collection*：アイデアに関連する履歴データを収集し、オンデマンドで実行してダッシュボードのデータを更新します。
- *[PA PPM IMD] Daily Data Collection*：日次インジケーターのデータを収集し、毎日実行してダッシュボードのデータを更新します。

関連情報

プラグインのリスト (Yokohama)

アイデアカテゴリの設定

アイデアカテゴリテーブルをアイデアモジュールにマッピングして、アイデアポータルおよびアイデア作成フォームにリストされているカテゴリオプションを指定します。

始める前に

- 必要なロール：idea_admin
- 使用するアイデアモジュールとアイデアカテゴリテーブルを特定します。

このタスクについて
アイデアポータルでカテゴリのリストを取得するには、アイデアモジュールにアイデアカテゴリを設定する必要があります。静的カテゴリを作成した場合は、アイデアカテゴリ [im_category] テーブルを使用して、アイデアモジュールとアイデアカテゴリテーブル間のマッピングを設定します。
既存の製品または部門テーブルを使用して、動的なアイデアカテゴリを定義します。動的カテゴリは、親テーブルの特定の列とフィールドから導出されます。

注:
アイデアモジュールとマッピングできるカテゴリテーブルは 1 つだけです。

手順

1. 移動先 すべて > アイデア > アイデアカテゴリ構成 > 新規.
2. フォームで、フィールドに入力します。
   詳細については、「アイデアカテゴリ構成フォーム」を参照してください。
3. オプション: フィルター条件を作成して、アイデアポータルに一覧表示するアイデアカテゴリを決定します。
4. **[Submit** (送信)] を選択します。

要求をアイデアとして転送するためのアイデアカテゴリを設定する

人事ケース、インシデント、またはカスタムタスクを部門からアイデアとして直接転送するときに使用する、アイデア状況を設定します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
アイデアポータルでアイデアを作成するときは、1 つ以上のカテゴリに関連付ける必要があります。サービスチケットをアイデアとして別の部門に転送するときに使用する、部門固有のプライマリチケットとアイデアカテゴリ間のマッピングを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ユニバーサル要求 > アドミニストレーション > 直接転送構成.
2. 「直接転送マッピング」で説明されている手順に従います。
3. **[Submit** (送信)] を選択します。

従来の **Ideas** アプリケーションからアイデアポータルへの移行

Yokohama リリースにアップグレードする場合は、アップグレード後に移行タスクを完了して、新しいアイデアポータルの使用を開始してください。

次の情報を確認し、構成に必要な変更を加えます。

アイデアの状況

新しいアイデアポータルでは、[完了]、[レビュー中]、[バックログ (In Backlog)] などの新しいアイデア状況が提供され、既存のアイデア状況にマッピングされます。次の表は、既存のアイデア状況および同等の新しい状況とその値との比較を示しています。

従来の **Ideas** アプリケーション

アイデアのステータス	値
ドラフト	-5
送信済み	1
NA	NA
NA	NA
承認済み	2
NA	NA
NA	NA
完了してクローズ	3
スキップしてクローズ	7
NA	NA
NA	NA

アイデアポータル

アイデアのステータス	値
ドラフト	-5
送信済み	1
レビュー中	-1
詳細情報が必要	-2
バックログ	2
計画済み	4
開発中	5

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイデアポータル (続く)

アイデアのステータス	値
完了	3
実装する可能性は低い (Unlikely to Implement)	7
複製	8
既存	9

Yokohama リリース以降、アイデア状況はアイデア [im_idea_core] テーブルに保存され、そこから取得されます。引き続き、既存のアイデア状況を新しいアイデア状況とともに使用できます。ただし、アイデアの管理に新しいステータスのみを使用する場合は、選択肢 [sys_choice] テーブルに移動し、古いアイデア状況を削除します。

アイデアカテゴリ

カテゴリを使用してアイデアを整理します。たとえば、特定の製品、部門、または事業部門に関連するアイデアをグループ化します。既存のアイデアがどのカテゴリにも関連付けられていない場合は、新しいカテゴリを作成するか、既存のテーブルを選択して、アイデアをマッピングできるカテゴリを定義します。Ideas アプリケーションでは、既存のアイデアを関連付けることができる一連のデフォルトの新しいカテゴリもインストールされます。

アイデアが既にカテゴリに関連付けられていて、新しいカテゴリを使用する場合は、既存のアイデアカテゴリをデフォルトの新しいカテゴリにマッピングできます。次に、スクリプトを記述して使用し、既存のアイデアとカテゴリ間の m2m マッピングを作成します。

注:
アイデアがアイデアポータルに表示されるようにするには、既存のアイデアを適切なカテゴリにマッピングする必要があります。

アイデアをデマンドまたはプロジェクト、ストーリー、イニシアチブ、およびエピックに変換する

アイデアをデマンド以外の作業エンティティに変換できます。[タスクを作成] ボタンを使用すると、アイデアをプロジェクト、エピック、またはストーリーに変換したり、デマンドをアイデアフォームで利用可能にしたりすることができます。

これらのオプションを表示するには、必要な Agile プラグイン アジャイル開発 2.0 および 大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) と 継続的改善管理がインストールされている必要があります。

アイデアのデマンドへの変換のみを許可する場合は、[タスクを作成] ボタンを無効にして [承認] ボタンを使用し続けるか、[承認] および [保留] ボタンを無効にして他のオプションを使用します。詳細については、「フォームデザイナーの使用」を参照してください。

ビジネスルール

アイデアテーブルにある既存のビジネスルールをレビューします。適用しないビジネスルールは False に設定します。

従来の **Ideas** アプリケーションのナビゲーション

ユーザーが新しいアイデアポータルからアイデアを送信するように促すには、アプリケーションメニューから古い Ideas アプリケーションのナビゲーションを削除し、サービスカタログの [アイデアの送信] オプションを非アクティブ化します。詳細については、「アプリケーションメニューまたはモジュールを有効または無効にする」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

を使用したアイデアの管理 イノベーション管理

イノベーション管理 の機能を使用して、アイデアをキャプチャ、分析、および管理します。アイデアマネージャーは、送信されたアイデアのレビュー、変更、古いアイデアの削除、重複の特定、ステータスの更新とトラッキングを行うことで、アイデアを管理します。

関連情報

イノベーション管理の参照

アイデアの送信

他のユーザーが投票できるように、アイデアポータルで製品、機能、拡張、または変更のためのアイデアを送信します。アイデアに関連するカテゴリを選択し、有用な場合は、ファイルを添付して詳細を追加します。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
アイデアポータルは、製品、機能、変更、または拡張のアイデアを共有する場所です。アイデアを送信したり、他のユーザーのアイデアを表示して登録したり、登録済みのアイデアの進捗状況を追跡したりできます。詳細については、「アイデアの表示、フィルタリング、およびソート」と「アイデアに関するコラボレーション」を参照してください。新しいアイデアは [送信済み] ステータスで作成されます。送信されたアイデアは、送信後、ステータスが [完了] に変更されるまで、アイデアポータルで編集できます。

手順

1. 移動先 すべて > アイデア > アイデアポータル > アイデアを作成.
2. フォームで、フィールドに入力します。
   フィールドと説明の詳細については、「アイデアを作成フォーム」を参照してください。
3. オプション: アイデアに関連する添付ファイルがある場合は、[添付ファイルの追加] を選択して添付します。
4. **[Create** (作成)] を選択します。

次のタスク

- アイデアの表示、フィルタリング、およびソート
- アイデアに関するコラボレーション
- アイデアの管理
- アイデアを評価する
- アイデアのタスクを作成する

アイデアの表示、フィルタリング、およびソート

自分が送信したアイデアや、送信されたすべてのアイデアを表示します。アイデアのステータス、カテゴリ、または日付に基づいて、アイデアをフィルタリングおよびソートします。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
アイデアに関する次の情報を表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タイトル
- 投票数
- 送信者の名前
- 経過時間
- 現在のステータス
- アイデアが属するカテゴリ。

手順

1. 移動先 すべて > アイデア > アイデアポータル.
2. [自分のアイデア] および [すべてのアイデア] タブで次のタスクを実行します。

[自分のアイデア] および [すべてのアイデア] タブ

タスク	ステップ
自分が送信したアイデアを表示します。	移動先 アイデアポータル > 自分のアイデア.
すべての送信されたアイデアを表示します。	移動先 アイデアポータル > すべてのアイデア.
アイデアの詳細を表示します。	アイデアのタイトルを選択します。
アイデアのステータスに基づいてアイデアをフィルタリングします。	[ステータス] リストからステータスを選択します。
アイデアのカテゴリに基づいてアイデアをフィルタリングします。	[カテゴリ] リストからカテゴリを選択します。
最新のアイデア、投票数、または作成日に基づいてアイデアをソートします。	[ソート基準] リストからオプションを選択します。

自動翻訳

アイデアに関するコラボレーション

コメントオプションを使用して、アイデアについて話し合い、アイデアに関する情報を交換します。アイデアに対する関心や支持のレベルを登録するために、アイデアに賛成票または反対票を投じます。アイデアを登録して進捗状況を追跡します。

始める前に

必要なロール：なし

このタスクについて

[完了]、[実装する可能性は低い **(Unlikely to Implement)**]、[重複]、または [既に存在 **(Already Exists)**] ステータスのアイデアには、コメントも投票もできません。[オープン] (Open) または [クローズ済み] (Closed) アイコンは、コメントと投票に対してアイデアがオープンかクローズかを示します。

手順

1. 移動先 すべて > アイデア > アイデアポータル.
2. アイデアのタイトルを選択して、その詳細を表示します。
3. アイデアの詳細をレビューし、アイデアに対して実行するアクションを選択します。
   アクションとステップの詳細については、「 アイデアに関するコラボレーション」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイデアの管理

アイデアマネージャーは、送信されたアイデアのレビュー、変更、古いアイデアの削除、重複の特定、ステータスの更新とトラッキングを行うことで、アイデアを管理します。

始める前に
必要なロール：idea_manager

このタスクについて
アイデアマネージャーは、送信されたアイデアをレビューし、必要に応じて詳細情報を要求して、アイデアを承認するか却下するかを選択します。アイデアに対する投票数は、アイデアの人気と需要を評価するのに役立ちます。アイデアのステータスを変更して、そのステータスを反映します。ステータスを変更すると、アイデアの進捗状況がアイデアの送信者と登録者に通知されます。

注:
アイデアのステータスが変更されるたびに、アイデアの送信者とすべての登録者に通知メールが送信されます。また、ユーザーがアイデアにコメントしたり、コメントに返信したりするたびに、通知メールが送信されます。

手順

1. 移動先 すべて > アイデア > アイデアポータル.
2. アイデアのタイトルを選択して、その詳細を表示します。
3. その他のオプションアイコン (⋯) を選択し、[プラットフォームで開く] オプションを選択して、フォームビューでアイデアを開きます。
4. アイデアの詳細をレビューし、アイデアに対して実行するアクションを選択します。
   アクションとステップの詳細については、「 アイデアの管理」を参照してください。
5. **[Update** (更新)] を選択します。

次のタスク
選択したアイデアをデマンド、プロジェクト、ストーリー、およびエピックなどのタスクに変換します。

アイデアを評価する

送信されたアイデアをレビューし、承認または却下します。

始める前に
必要なロール：idea_manager

このタスクについて
アイデアマネージャーは、アイデアを評価し、アイデアを承認するか却下するかを決定します。アイデアをすぐに実装できない場合は、アイデアをバックログに移動しておき、後で取得します。
実装に適したアイデアを承認し、それからデマンド、プロジェクト、ストーリーなどのタスクを作成します。これらのタスクを計画して作業し、アイデアを新しい機能、製品、または拡張へと発展させます。

手順

1. 移動先 すべて > アイデア > アイデアポータル.
2. アイデアのタイトルを選択して、その詳細を表示します。
3. その他のオプション (⋯) アイコンを選択し、[プラットフォームで開く] オプションを選択して、フォームビューでアイデアを開きます。
4. アイデアの詳細をレビューし、アイデアに対して実行するアクションを選択します。
   詳細については、「アイデアを評価する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. **[Update** (更新)] を選択します。
   アイデアの実行方法に基づいて、承認済みのアイデアをデマンド、エピック、ストーリー、または機能に変換します。PPM Standard、アジャイル開発 2.0、大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) などのインストールされているプラグインに基づいて、エピック、SAFe エピック、または改善イニシアチブなどの関連オプションを使用します。デマンドまたはプロジェクトを作成した後に、アイデアのステータスを変更し、開発のさまざまな段階でそのステータスを追跡します。

アイデアのタスクを作成する

承認されたアイデアを計画および開発するためのタスクを作成します。

始める前に
必要なロール：idea_manager または idea_manager_professional

このタスクについて
承認されたアイデアのデマンド、プロジェクト、ストーリー、SAFe エピック、SAFe 機能、SAFe ストーリーなどのタスクを作成します。これらのタスクを計画して作業し、アイデアを新しい機能、製品、または拡張へと発展させます。

手順

1. 移動先 すべて > アイデア > アイデアポータル.
2. タスクを作成するアイデアのタイトルを選択します。
3. その他のオプション (•••) アイコンをクリックし、[プラットフォームで開く] オプションを選択して、フォームビューでアイデアを開きます。
4. アイデアの優先度に基づいて、[ステータス] リストでアイデアの適切な状況を選択します。
   各アイデア状況の詳細については、「アイデアの管理」を参照してください。
5. **[Create Task** (タスクを作成)] を選択します。
6. [アイデアをタスクに変換 **(Convert Idea to task)]** ダイアログボックスで、[タスクタイプを選択] リストからタスクタイプを選択します。
   利用可能なタスクタイプは次のとおりです。
   - デマンド
   - プロジェクト管理
   - Epic
   - ストーリー
   - SAFe エピック
   - SAFe 機能
   - SAFe ストーリー

   これらのタスクオプションは、PPM Standard、 アジャイル開発 2.0、 大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) などのインストールされたプラグインに基づいています。

   注:
   これらのタスクタイプを作成するには、プラグインに基づいた適切なロールも必要です。

類似のアイデアを見つけるために イノベーション管理 の類似性ソリューションをトレーニングする

観念化の予測インテリジェンス機能に含まれる類似アイデアソリューション定義をトレーニングして、アイデアを提示するとき、またはアイデアポータルでアイデアを表示するときに、関連するアイデアを検索します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
予測インテリジェンスプラグイン (com.glide.platform_ml)、PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo)、および観念化の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.innovation_management_ml) が有効化されていることを確認します。予測インテリジェンスの詳細については、「予測インテリジェンス」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 予測インテリジェンス > 類似性 > ソリューション定義.
2. [類似性定義] リストで、類似アイデアソリューション定義 (ml_sn_global_similar_idea) を検索して選択します。
3. 類似性定義フォームで、アイデアのデフォルトのフィールド値を確認します。
   類似性定義フォームフィールドの詳細については、「類似ソリューションの作成とトレーニング」を参照してください。
4. [更新 **&** 再トレーニング] をクリックします。
5. 類似アイデアソリューション定義 (ml_sn_global_similar_ideas) の類似性定義フォームを開きます。
6. [ML ソリューション] 関連リストの [進捗状況] 列で、トレーニングソリューションの進行状況を表示します。

   注:
   または、[アクティブ] 列のソリューションのリンクをクリックすることもできます。[ML ソリューション] フォームで、[トレーニング進捗状況を表示する] 関連リンクをクリックして、トレーニングソリューションの進行状況を確認します。

タスクの結果
ソリューションが完了すると、類似のアイデアが [アイデアを作成] フォームの [関連するアイデア] セクションおよびアイデアポータルのアイデアページの [関連するアイデア] セクションに表示されます。

次のタスク

- 類似例を確認します。類似性定義フォームの ML ソリューション関連リストで、[進捗状況 **(Progress)]** が 100% のときに [アクティブ **(Active)]** 列で、ソリューションのリンクをクリックします。[類似例] リストを表示するには、ML ソリューションフォームの [類似例] 関連リンクをクリックします。
- 類似スコアのしきい値を更新します。ML ソリューションフォームの [ソリューション統計情報] タブで、[類似スコアのしきい値] フィールドに必要な値を入力します。ML ソリューションフォームを右クリックし、[保存] をクリックします。
- レコードの予測出力をテストします。ML ソリューションフォームの [ソリューションをテスト] タブで、[簡単な説明] フィールドにテキストを入力し、[上位 **N** 件] フィールドに予想される結果の最大数を入力して、[テストを実行] をクリックします。類似スコアしきい値を超える結果が表示されます。

関連情報

予測インテリジェンス

イノベーション管理 の 予測インテリジェンス

アイデアの送信

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PPM PIWB テンプレート - 類似アイデアの検索

類似アイデアを見つけるための類似アイデアソリューション定義のトレーニング手順を説明するガイド付きテンプレートを使用します。

始める前に
予測インテリジェンスワークベンチを使用する前に、次のプラグインを有効化します。

- PPM 用予測インテリジェンス (com.snc.ppm_ml) プラグイン
- 観念化用予測インテリジェンス (com.snc.innowation_management_ml) プラグイン

必要なロール：piwb_manager

手順

1. 移動先 すべて > 予測インテリジェンスワークベンチ > ユースケース > テンプレートから新規作成.
2. [類似アイデア] テンプレートを選択します。
3. [開始] をクリックします。
   [ユースケースセットアップ] ページが開いて、ユースケースの名前と説明が表示されます。
4. [移動 **(Take me there)**] をクリックします。
   [ServiceNow 機械学習ソリューション] ページが開き、利用可能なすべてのソリューションが表示されます。
5. 類似性ソリューションを展開して、利用可能なソリューション定義を表示します。
   類似アイデアを検索するための類似性ソリューションを構成またはトレーニングします。
   - 類似アイデアソリューション定義 (ml_sn_global_global_similar_ideas) を構成するには、[構成] をクリックします。詳細については、「類似のアイデアを見つけるために イノベーション管理 の類似性ソリューションをトレーニングする」を参照してください。
   - 類似アイデアソリューション定義 (ml_sn_global_global_similar_ideas) をトレーニングするには、[トレーニング] をクリックします。

アイデアポータルの管理

アイデアポータルは、アイデアを収集、キュレーションし、デマンド、プロジェクト、エピック、またはストーリーに昇格させる一元的な場所を提供します。重要なフィードバックや要求を、製品計画および開発プロセスにデータ連携できます。

アイデアポータルでは、次のことを実行できます。

- アイデアを表示、送信、投票、および登録します。
- コメントを使用してコラボレーションし、アイデアについて話し合い、情報を交換します。
- アイデアを送信、コメント、または登録するユーザーは、ステータスの変更、コメント、またはアイデアへの返信の通知を受け取り、そのアイデアのステータスと進捗状況について最新情報を得ることができます。
- アイデアの詳細の表示、質問または質問への回答、コメントを使用したアイデアに関する情報交換を行います。コメントに話し合いの経緯が残るので、アイデアの主要な貢献者や、その成功や失敗の理由の特定に役立ちます。

アイデアマネージャーとデマンドマネージャーは、アイデアポータルを使用して次のことを実行できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 送信されたアイデアを管理します。
- 送信されたアイデアをレビューおよび評価し、要件を満たすアイデアを選択します。
- 投票数からアイデアの人気とデマンドを評価します。

選択したアイデアは、計画立案のためのタスクに変換されてから、新しい製品、機能、または拡張へと発展します。

分離したデータストレージを維持し、アクセスを制御する

アイデアモジュールを使用すると、次のことができます。

- 異なる部門、製品、または事業部門に属するアイデアとカテゴリを分けて保存します。
- アイデアを保存して整理し、投票を有効にします。組織が大規模な場合は、人事、IT、サポートなど、独自のカテゴリセットを使用してさまざまなポータルページを構成できます。
- アクセスを制御し、カテゴリ用に使用するテーブルにアクセス制御リストを作成することで、特定の事業部門または部門のユーザーのみがアイデアポータルから特定のカテゴリに属するアイデアを送信および表示できるようにします。たとえば、給与カテゴリに関連付けられたアイデアを給与部門以外のユーザーには表示させないようにするには、給与カテゴリの派生に使用される親テーブルの給与部門の従業員に対して、少なくとも読み取りアクセス権を持つ ACL を作成します。この ACL により、給与部門外の従業員は、給与カテゴリに関連付けられたアイデアを表示できなくなります。詳細については、「アイデアモジュールの作成」を参照してください。

注:
Innovation Management は、ドメインセパレーションの基本レベルをサポートしています。ドメインセパレーションの詳細については、「アプリケーションのドメインセパレーションのサポート」および「ドメインセパレーションとプロジェクトポートフォリオ管理」を参照してください。

アイデアポータル管理

アイデアポータルを使用すると、エンドユーザーはアイデアを表示、送信、フィルター、ソート、コメント、および投票することができます。アイデアマネージャーは、アイデアポータルを使用して、アイデアのレビュー、評価、共同作業、および管理を行います。アイデアアドミンは、アイデアモジュールを設定し、アイデアカテゴリをアイデアモジュールにマッピングし、アイデアポータルページにナビゲーションを追加します。

アイデアポータルの管理 はアイデアモジュールからデータを取得するので、最初にアイデアモジュールを設定する必要があります。製品、部門、または事業部門ごとに個別のアイデアモジュールを設定することを検討してください。アイデアポータルを設定する前に、次のアイテムをレビュー、計画、および特定します。

- アイデアテーブル
- アイデアモジュール
- アイデアカテゴリ
- アイデアポータルページへのナビゲーション

製品、部門、または事業部門のアイデアポータルを設定および構成するには、次のタスクを完了します。

アイデアポータルのナビゲーション

アプリケーションナビゲーターからアイデアポータルにアクセスできるように、アイデアポータルの URL を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：idea_admin

このタスクについて
アプリケーションメニューモジュールを使用して、アイデアポータルモジュールへのアクセスを有効にします。

手順

1. ユーザー アイデア アプリケーションメニューを記録し、アイデアポータルをナビゲーションメニューに追加します。
   ナビゲーションメニューにアイデアポータルを追加する方法については、「モジュールの作成」を参照してください。
2. モジュールフォームで、[リンクタイプ] フィールドの値を **[URL** (引数から)] として設定します。

   URL 内でモジュール ID をパラメーターとして使用し、アイデアポータルに関連付けるアイデアモジュールを指定します。

   たとえば、HR 部門のアイデアモジュールを作成し、**hr** を [モジュール **ID]** として使用する場合、アイデアポータルにアクセスするための URL は次の例のようになります：/idea/?id=ideas_list&sysparm_module_id=hr。

アイデアモジュールの作成

アイデアモジュールは、アイデアポータルに表示されるアイデアとカテゴリを定義します。アイデアを保存してグループ化するためのアイデアモジュールを作成し、製品、部門、または事業部門に基づいてカテゴリを定義します。

始める前に

- アイデアを保存するアイデアテーブルを特定します。既存のテーブルを使用するか、新しいテーブルを作成してアイデア [im_idea_core] テーブルを拡張します。

  アイデアモジュールごとに異なるアイデアテーブルを使用します。アイデアテーブルが分離されているので、異なるモジュールのアイデアが分けて保存されます。

- 必要なロール：idea_admin

手順

1. 移動先 すべて > アイデア > 設定 > アイデアモジュール > 新規.
2. フォームで、フィールドに入力します。
   フィールドと説明の詳細については、「アイデアモジュールフォーム」を参照してください。
3. **[Submit** (送信)] を選択します。

次のタスク
新しいアイデアカテゴリを定義するか、既存のテーブルを使用して、指定した列からカテゴリを派生させ、アイデアモジュールにマッピングします。詳細については、「アイデアカテゴリの設定」を参照してください。

新しいアイデアカテゴリの定義

ユーザーが送信済みのアイデアに関連付けるために選択できる新しいアイデアカテゴリを作成します。カスタムアイデアカテゴリを追加することもできます。

始める前に
必要なロール：idea_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
デフォルトのアイデアカテゴリ [im_category] テーブルには、ユーザー定義のアイデアカテゴリが保存されます。
既存のテーブルを使用しない場合や、カスタムのアイデアカテゴリを使用する必要がある場合は、新しいアイデアカテゴリを定義します。アイデアカテゴリの階層を定義するには、ネストされたアイデアカテゴリを作成します。

アイデアモジュールでは複数のアイデアカテゴリを使用できますが、1 つのアイデアカテゴリにマッピングできるカテゴリテーブルは 1 つだけです。

手順

1. 移動先 すべて > アイデア > アイデアカテゴリ > 新規.
2. フォームで、フィールドに入力します。
   詳細については、「アイデアカテゴリフォーム」を参照してください。
3. **[Submit** (送信)] を選択します。
   アイデアカテゴリは、アイデアの送信を体系化するためのテーマを表します。アイデアポータルから送信されるすべてのアイデアは、少なくとも 1 つのアイデアカテゴリに関連付けられている必要があります。既存のテーブルの値を使用することも、新しいアイデアカテゴリを作成してアイデアを整理することもできます。ユーザーは、アドミンが設定した 1 つ以上のアイデアカテゴリを選択し、送信時にアイデアに関連付けます。詳細については、「アイデアモジュールの作成」および「アイデアカテゴリ構成」を参照してください。

次のタスク
アイデアカテゴリをアイデアモジュールにマッピングします。詳細については、「アイデアカテゴリの設定」を参照してください。

従業員センター へのアイデアポータルの追加

従業員センター からアイデアポータルへのナビゲーションを有効にして、従業員のエンゲージメントエクスペリエンスを向上させます。

従業員センター ポータルで、アイデアポータルに次のリンクを追加して、従業員が簡単に移動できるようにします。

従業員センター ポータルのヘッダーメニューアイテム

従業員センター ポータルヘッダーの [アイデアポータル] ページのメニューアイテムを構成します。[従業員センター] メニューの [従業員フォーラムメニューアイテムを作成] のステップ 1 ～ 5 に従います。

従業員センター ポータルのクイックリンク

従業員センター のクイックリンクモジュールを使用して、アイデアポータルページへのクイックリンクを作成します。「クイックリンクを作成 」の手順に従います。

関連情報

を使用したアイデアの管理 イノベーション管理

アイデアポータルの管理

Idea Manager Dashboard を使用したアイデアメトリクスの分析

イノベーション管理と ユニバーサル要求の統合

Idea Manager Dashboard を使用したアイデアメトリクスの分析

アイデアダッシュボードマネージャーを使用して、アイデアを効果的にレビュー、分析、管理します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


自動翻訳

Idea Manager Dashboard には、さまざまな状況のアイデア、アイデアの経過時間、カテゴリ、さまざまな作業エンティティに変換されたアイデアなど、アイデアのメトリクスと傾向のサマリーが表示されます。

> **注:**
> バージョン 2.0.0 以降、Idea Manager Dashboard は、Analytics Idea Manager からアクセスできるネクストエクスペリエンス UI フレームワークで利用できます。ネクストエクスペリエンスでは、[アナリティクス] タブの [アイデア] ペインはサポートされていません。

ネクストエクスペリエンス UI の Idea Manager Dashboard

Idea Manager Dashboard は、アイデアマネージャーと、ppm の読み取り専用ロール (sn_ppm_read) を持つユーザーに包括的なレポートを提供します。ダッシュボードはパフォーマンスアナリティクスを使用して、履歴データの傾向と定期的なレポートを提供します。アイデアの概要、作業エンティティに変換されたアイデアの数、およびカテゴリ、アイデアの送信者、投票に基づく傾向が表示されます。アイデアのレビューと分析に役立ち、アイデアを効果的に管理するために必要なアクションを実行できます。

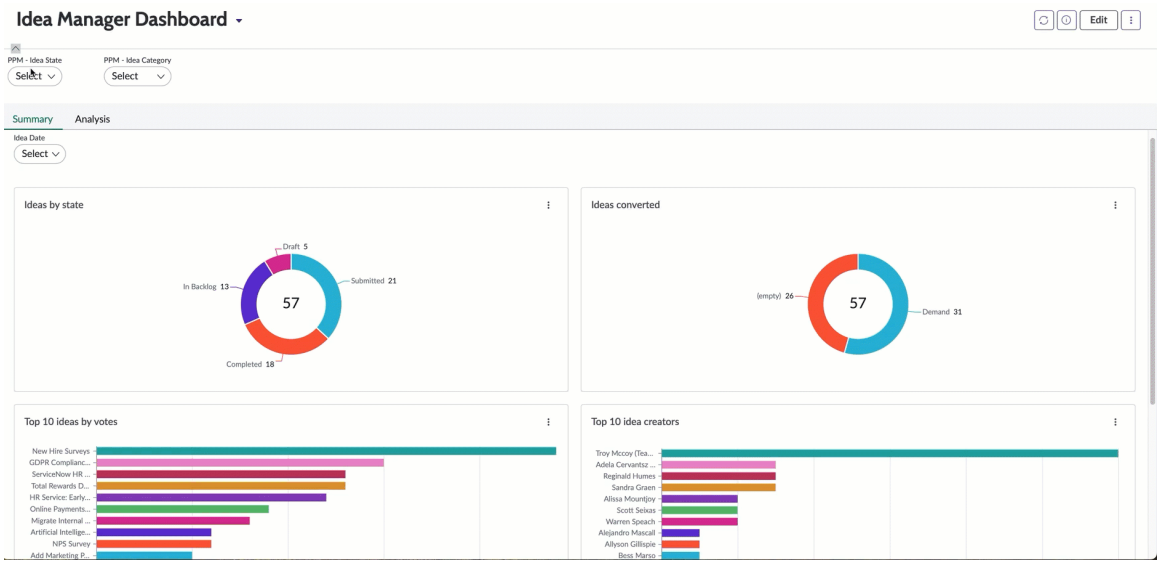

エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
アイデアマネージャー：さまざまな状況のアイデア、作成されたアイデアの数、およびアイデアの経過時間に対する可視化が必要です。	idea_manager
PPM の読み取り専用ロール：さまざまな状況のアイデア、作成されたアイデアの数、およびアイデアの経過時間に対する可視化が必要です。	sn_ppm_read

ユースケース

このダッシュボードには、プロジェクトポートフォリオ管理 に関連するアイデアが表示されます。

カテゴリに関連付けられたアイデアのみが、ダッシュボードに表示されます。削除対象としてマークされたアイデアは表示されません。デフォルトでは、ダッシュボードに 1 年間のデータが表示されます。インタラクティブな日付フィルターを使用して、月次、四半期、または年次のデータを表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ダッシュボードからアイデアポータルに移動すると、アイデアインジケーターデータ内をドリルダウンしてさらに分析することができます。たとえば、アイデアポータルでオープンなアイデアの個々のレコードを表示するには、 [オープンなアイデア] インジケーターの値をクリックして アナリティクスハブ を開きます。アナリティクスハブ で、[レコードを表示] をクリックしてオープンなアイデアのリストを表示し、フォームビューでアイデアを開き、[アイデアポータル] 関連リンクをクリックしてアイデアポータルにアイデアレコードを表示します。

インジケーター

ダッシュボードの [サマリー] タブと [分析] タブには、次のインジケーターが含まれています。アイデアのデータは [idea] テーブルから収集されます。

オープンなアイデア

現在の月の [送信済み]、[詳細情報が必要]、または [レビュー中] ステータスにあるアイデアの数。

オープンなアイデアの平均経過時間

[送信済み]、[詳細情報が必要]、または [レビュー中] ステータスにあるアイデアの作成以降の平均経過時間 (日単位)。式 [[PPM：オープンなアイデアの合計経過時間]]/[[PPM：オープンなアイデアの数]]/24 によって計算されます。

変換されたアイデア

他のプラグインに基づいて、デマンド、プロジェクト、ストーリー、エピックなどのさまざまな作業エンティティに変換されたアイデアの数。

変換されたアイデアの割合

他のプラグインに基づいて、デマンド、プロジェクト、ストーリー、エピックなどのさまざまな作業エンティティに変換されたアイデアの割合 (%)。式 [[PPM：変換されたアイデアの数]/[PPM：アクティブなアイデアの数]] * 100 によって計算されます。

アイデア

さまざまな状況のアイデアの数。週、月、四半期、および年に作成された、さまざまな状況のアイデアの数を表示できます。

アクティブなアイデア

[送信済み]、[詳細情報が必要]、[レビュー中]、[バックログ (In Backlog)]、[計画済み]、および [開発中 (In Development)] ステータスのアイデアの数。このインジケーターはダッシュボードには表示されませんが、式で使用されます。

オープンなアイデアの合計経過時間

作業エンティティに変換する前に、アイデアが [送信済み]、[詳細情報が必要]、[レビュー中] のステータスにある合計日数。このインジケーターはダッシュボードには表示されませんが、式で使用されます。

ブレークダウン



- PPM：アイデアカテゴリ
- PPM：アイデアのステータス

データの可視化

ダッシュボードには、以下の可視化が含まれています。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
ステータス別アイデア (Ideas by state)	円グラフ 	各種状況のアイデア数のブレークダウン。
変換されたアイデア	円グラフ 	デマンドやプロジェクトなどの作業エンティティに変換されたアイデアの数のブレークダウン。
投票による上位 10 件のアイデア (Top 10 ideas by votes)	水平棒グラフ 	賛成票の総数に基づく上位 10 件のアイデア。
上位 10 名のアイデア作成者 (Top 10 idea creators)	水平棒グラフ 	送信されたアイデアの数に基づく上位 10 名のユーザー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
カテゴリ別のアイデアの傾向 (Ideas trended by categories)	線グラフ 	各種カテゴリで送信されたアイデアの総数の傾向。傾向は月次ベースで表示されます。
アイデア別上位 10 のカテゴリ (Top 10 categories by ideas)	水平棒グラフ 	各カテゴリで送信されたアイデアの数に基づく上位 10 のカテゴリ。

イノベーション管理と ユニバーサル要求の統合

イノベーション管理 の ユニバーサル要求 とのデータ連携により、ユニバーサル要求 の機能が拡張され、従業員とエージェントは、ユニバーサル要求からアイデアを作成できるようになります。

イノベーション管理 を ユニバーサル要求 アプリケーションとデータ連携して、一貫性のあるチケットエクスペリエンスを提供し、部門間の要求転送を円滑化します。

ユニバーサル要求は、次のいずれかの理由で新規タスクレコードを作成する必要があるとエージェントが判断した場合に、インタラクションレコードまたは新規コールレコードから作成されます。

- 特定の部門にアサインせずにユニバーサル要求をすぐに解決します。
- ユニバーサル要求を階層 1 のアサイン先グループにアサインして、別の部門に転送します。

ユニバーサル要求は、INC、HRC、カスタムタスクタイプなど、子レコードとして作成される他のレコードの親レコードとして機能します。また、すべての部門間レポートにも使用されます。ユニバーサル要求の詳細については、「ユニバーサル要求の探索」を参照してください。

機能

データ連携により、次の機能が提供されます。

- ユニバーサル要求からアイデアを作成する：ユニバーサル要求が作成されると、エージェントが要求を分析します。要求によって新しい製品、機能、または変更が生じる可能性がある場合、エージェントはそのユニバーサル要求からアイデアを作成します。

  アイデアマネージャーは、送信されたアイデアをレビューして、必要に応じて詳細情報を要求し、アイデアを承認するか却下するかを選択します。承認されたアイデアは、デマンド、エピック、ストーリー、または機能に変換されます。

  [簡単な説明] フィールドや [説明] フィールドの詳細など、ユニバーサル要求の関連情報が、アイデアの [タイトル] フィールドと [アイデアの説明] フィールド にコピーされます。

  また、ユニバーサル要求から作成されたアイデアがユニバーサル要求のプライマリチケットになり、[プライマリチケット] フィールドにアイデア番号が入力されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 解決の有無にかかわらずアイデアを別の部門に転送する：アイデアが却下された場合や実装できない場合に、ルーティングエージェントはアイデアを別の部門に転送できます。

  アイデアが別の部門に転送されると、そのアイデアはクローズされ、新しいレコードが作成されます。たとえば、人事プロセスの改善に関連するユニバーサル要求をアイデアに変換し、そのアイデアが実現不可能と判断された場合に、HRC として HR 部門に転送することができます。

  注:
  ユニバーサル要求から作成されたアイデアが別の部門に転送されると、最終的な INC、HRC、またはカスタムタスクが親ユニバーサル要求のプライマリチケットになります。

プラグイン要件

admin ロールを持っている場合は、次のプラグインを有効化できます。これらのプラグインはデフォルトではアクティブではないため、イノベーション管理 を ユニバーサル要求 アプリケーションとデータ連携する際に、これらのプラグインをインストールする必要があります。

- PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo)。
- ユニバーサル要求プラグイン (com.snc.universal_request)。アクティベーションについては、「ユニバーサル要求の有効化」を参照してください。

ヒューマンリソース (HR) スコープ対象アプリ：コア (com.sn_hr_core) プラグインや 従業員センター (com.snc.employee_center) プラグインなどの他の関連プラグインを有効化して、部門間のアイデアの転送を容易にします。

ユニバーサル要求からのアイデアの作成

新製品、機能、拡張、または変更の初期評価後に、ユニバーサル要求からアイデアを作成します。

始める前に

必要なロール：sn_uni_req.request_write または ITIL

- ユニバーサル要求 (com.snc.universal_request) および PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) プラグインを有効にする

このタスクについて

新しいアイデアは [送信済み] ステータスで作成されます。送信されたアイデアは、送信後、ステータスが [完了] に変更されるまで、アイデアポータルで編集できます。

手順

1. 移動先 ユニバーサル要求 > すべて.
2. アイデアの作成元になるユニバーサル要求レコードを開きます。
3. [アイデアを作成] を選択します。
4. フォームで、フィールドに入力します。
   詳細については、「アイデアを作成フォーム」を参照してください。
5. オプション: アイデアに関連する添付ファイルがある場合は、[添付ファイルの追加] を選択して添付します。
6. **[Create** (作成)] を選択します。
   アイデアの作成元のユニバーサル要求番号は、アイデアフォームのヘッダーに表示されます。アイデア番号は、ユニバーサル要求フォームの [プライマリチケット] フィールドに表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次のタスク
実行するために選択されている場合は、アイデアを評価するし、アイデアからタスクを作成します。アイデアを実装できない場合は、INC、HRC、またはカスタムタスクとして関連部門にアイデアを転送します。

アイデア状況のマッピング


アイデアのステータスをユニバーサル要求状況にマッピングすることで、アイデア状況の移行中のユーザーエクスペリエンスを向上させ、アイデアの進捗状況を追跡します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
アイデアの状況をユニバーサル要求状況にマッピングすると、アイデアのステータスがユニバーサル要求状況にも反映されます。アイデアがライフサイクルの各種ステージを移動すると、ユニバーサル要求状況にも変更が反映されて更新されます。

たとえば、ユニバーサル要求にアイデアがプライマリチケットとして含まれているとします。アイデアのステータスが [送信済み] から [詳細情報が必要] に変わると、ユニバーサルチケットのステータスも [応答待ち] に更新されます。

次の図は、デフォルトのステータスマッピングの例です。アイデアの [送信済み]、[レビュー中]、[バックログ **(In Backlog)]**、[計画 済み]、および [開発中 **(In Development)]** ステータスは、ユニバーサル要求の [処理中] 状況にマッピングされます。

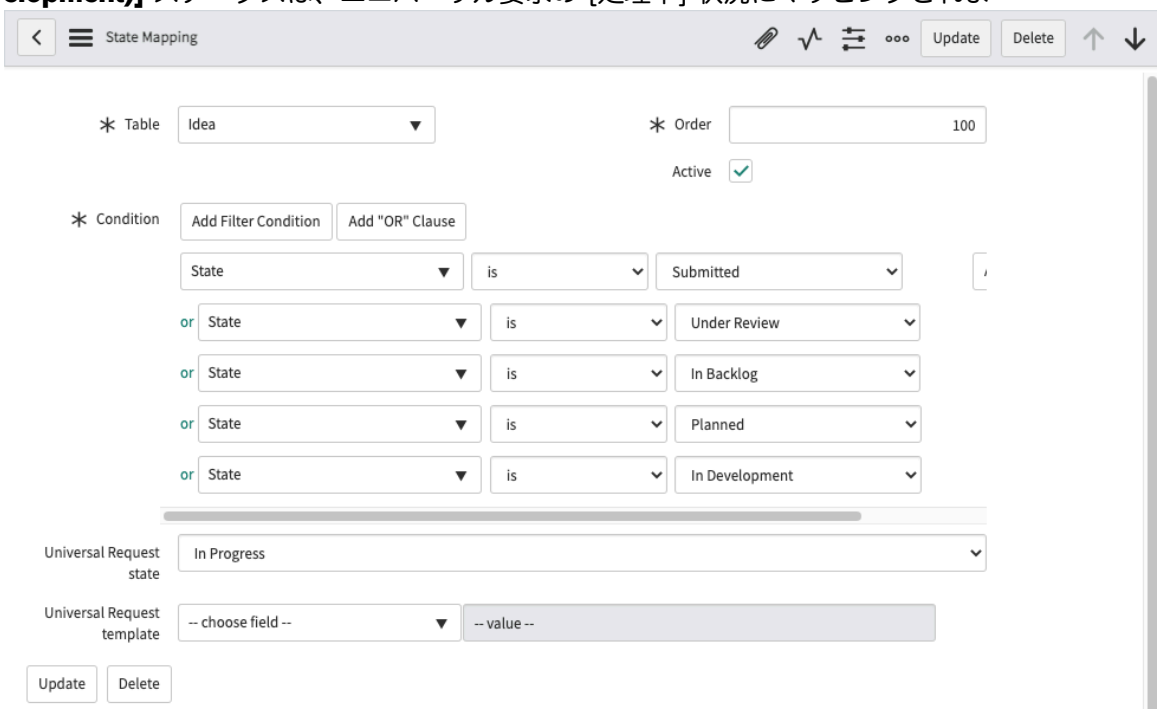

次の表に、各種アイデア状況とユニバーサル要求状況のデフォルトマッピングを一覧表示します。

アイデア状況とユニバーサル要求状況とのデフォルトマッピング

アイデアのステータス	ユニバーサル要求状況
送信済み	処理中
レビュー中	処理中
バックログ (In Backlog)	処理中

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アイデア状況とユニバーサル要求状況とのデフォルトマッピング (続く)

アイデアのステータス	ユニバーサル要求状況
計画	処理中
開発中	処理中
実装する可能性は低い (Unlikely to Implement)	クローズ済み
複製	クローズ済み
既に存在 (Already Exists)	クローズ済み
完了	クローズ済み
詳細情報が必要	応答待ち

手順

1. 移動先 すべて > ユニバーサル要求 > アドミニストレーション > ステータスマッピング.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームで、フィールドに入力します。
   詳細については、「ステータスマッピングフォーム」を参照してください。

アイデアを別の部門に転送する

アイデアが却下された場合やアイデアを実装できない場合は、解決の有無にかかわらず、アイデアを別の部門に転送します。

始める前に

次の要件が満たされていることを確認します。

- アイデアは、ユニバーサル要求から作成されている。
- アイデアはカテゴリに関連付けられている。
- アイデアを作成フォームをカスタマイズして、[アサイン先] フィールドが追加されている。
- アイデアがエージェントにアサインされている。
- 転送に必要な追加のプラグインがアクティブになっている。たとえば、アイデアが人事ケース (HRC) として転送される場合は、ヒューマンリソース (HR) スコープ対象アプリ：コア (com.sn_hr_core) および 従業員センター (com.snc.employee_center) プラグインを有効化します。

必要なロール：アイデアがアサインされたエージェント、またはアサインされたワークグループに属するエージェント。

このタスクについて

アイデアが却下された場合やアイデアを実装できない場合は、HRC、インシデント、またはカスタムタスクとして、別の部門にアイデアを転送します。
アイデアが別の部門に転送されると、そのアイデアはクローズされ、新しいレコードが作成されます。たとえば、人事プロセスの改善に関連するユニバーサル要求をアイデアに変換し、そのアイデアが実現不可能と判断された場合に、HRC として HR 部門に転送することができます。

手順

1. 移動先 すべて > アイデア > アイデアポータル.
2. アイデアのタイトルを選択して、その詳細を表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. その他のオプションアイコン (•••) を選択し、[プラットフォームで開く] オプションをクリックして、フォームビューでアイデアを開きます。
4. **[Transfer** (転送)] を選択します。
5. [チケットを転送] ダイアログボックスで、次の詳細を入力します。
   - 部門：リストから部門を選択します。
   - 転送理由：リストから理由を選択します。
   - 転送メモ：UR ルーティングエージェントに渡すアイデアを転送するための簡単な説明。
   - 追加のコメントと添付ファイルをコピー：追加のコメントや添付ファイル付きのアイデアを転送しない場合は、チェックボックスをオフにします。
6. **[Transfer** (転送)] を選択します。
   アイデアが選択した部門に転送され、アイデアのステータスが [実装する可能性は低い **(Unlikely to Implement)]** に変更されます。
7. アイデアが却下またはクローズされた理由に関する情報を、[クローズメモ] フィールドに入力します。
8. **[Update** (更新)] を選択します。

タスクの結果

選択した部門にアイデアが転送されます。親ユニバーサル要求の [プライマリチケット] フィールドは、転送の結果として作成された INC、HRC、またはカスタムタスクの番号で更新されます。

イノベーション管理の参照

フィールド、ユーザーロール、テーブル、ガイドラインなど、イノベーション管理 に関する追加の詳細を提供するための参照情報。

イノベーション管理 のフォームフィールドの情報

イノベーション管理 で使用されるフォームのフィールド情報。

アイデアを作成フォーム

アイデアフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、 イノベーション管理でアイデアの詳細を作成または編集します。

アイデアを作成フォームのフィールド

フィールド	説明
タイトル	アイデアの簡単な説明。アイデアのタイトルを入力し始めると、[関連アイデア] セクションが表示され、アイデアと一致する可能性のある既存のアイデアが表示されます。
カテゴリ	アイデアに関連付けるカテゴリ。1 つのアイデアに対して複数のカテゴリを選択できます。送信されたアイデアを表示するときに、カテゴリはアイデアポータルの他のユーザーにも表示されます。
説明	アイデアの詳細な説明。なぜそれが役立つのか、誰がそれからメリットを得るのか、どのように機能するのかなどの詳細を含めることを検討してください。書式設定ツールバーを使用

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アイデアを作成フォームのフィールド (続く)

フィールド	説明
	して、テキストを書式設定したり、画像または Web リンクを追加したりできます。

関連情報

- アイデアモジュールの作成
- アイデアの送信
- アイデアの表示、フィルタリング、およびソート

アイデアカテゴリ構成フォーム

アイデアカテゴリ構成フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、 イノベーション管理でアイデアカテゴリ構成の詳細を作成または編集します。

アイデアカテゴリ構成フォームのフィールド

フィールド	説明
カテゴリテーブル	アイデアカテゴリの派生元となる親テーブル。 静的なアイデアカテゴリを使用するには、デフォルトのアイデアカテゴリ [im_category] テーブルを選択します。 動的なアイデアカテゴリを使用するには、既存のテーブルを選択します。たとえば、部門名をアイデアカテゴリとして使用するには、すべての部門の詳細を含むテーブルを選択します。
カテゴリフィールド	アイデアカテゴリの派生元であるカテゴリテーブルのフィールド。カテゴリテーブルでこのフィールドに対応する値は、アイデアポータルの [カテゴリ] フィールドに表示されます。 たとえば、部門名をカテゴリオプションとして一覧表示するには、このフィールドの値を [名前] に設定します。システムは、親テーブルから部門名を検索して取得し、すべての部門名をカテゴリオプションとして表示します。
親フィールド	ネストされたアイデアカテゴリを使用している場合は、親カテゴリの取得に使用するカテゴリテーブルのフィールドを指定します。 **注:** ネストされたアイデアカテゴリを使用しない場合は、このフィールドを空白のままにします。 たとえば、部門 A のサブカテゴリとして部門 1 と 2 を一覧表示するには、このフィールドの値に [親] を設定します。システムは、親テーブル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイデアカテゴリ構成フォームのフィールド (続く)

フィールド	説明
	から値を検索して取得し、部門 1 と 2 を部門 A のサブカテゴリとして表示します。
モジュール	このアイデアカテゴリが属するアイデアモジュール。

関連情報

アイデアカテゴリの設定

アイデアカテゴリフォーム

アイデアカテゴリフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、 イノベーション管理でアイデアカテゴリの詳細を作成または編集します。

アイデアカテゴリフォームのフィールド

フィールド	説明
カテゴリ名	アイデアカテゴリの名前。カテゴリリストの作成対象エンティティを明確に特定できる名前を使用します。たとえば、部門用のカテゴリオプションを作成する場合は、人事、サポート、IT などの部門名を使用します。
有効	アイデアカテゴリを有効にするためのオプション。有効化すると、アイデアを作成フォームとアイデアポータルの [カテゴリ] リストに、アイデアカテゴリが表示されます。 デフォルト：オン
モジュール	このアイデアカテゴリが属するモジュール。
親	このカテゴリがサブカテゴリである親アイデアカテゴリ。 たとえば、部門 A のサブカテゴリとして部門 1 と 2 を一覧表示するには、部門 1 と 2 の [親] フィールドで [部門 A] を選択します。
ドメイン	アイデアカテゴリが属するドメイン。


アイデアに関するコラボレーション

アイデアでのコラボレーションフォームのアクションについて説明します。アイデアの詳細をレビューし、アイデアに対して実行するアクションを選択します。他の送信者やステークホルダーとアイデアについてコラボレーションします。コメントの追加、コメントへの返信、詳細情報の要求、質問への回答などを行います。開発を希望するアイデアに投票します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイデアに関するコラボレーション

アクション	ステップ
コメントを投稿	1. コメント (Comment) アイコンを選択し、コメントを入力します。 2. [コメント] を選択して、コメントを投稿します。
コメントに返信する	1. 返信 (Reply) アイコンを選択し、返信を入力します。 2. [返信] を選択して返信を投稿します。
コメントを編集または削除する	アイデアが [完了] ステータスに達するまでは、コメントの編集や削除が可能です。 1. コメントに移動します。 2. その他のオプション (•••) アイコンを選択し、 編集 または 削除 を選択します。
アイデアに投票する	投票は、アイデアの人気とデマンドの評価に役立ちます。 • 賛成票アイコン (^) を選択して、アイデアのサポートを示します。 • 反対票アイコン ( る) を選択して、そのアイデアに反対していることを示します。
アイデアに登録する	[登録] を選択します。

関連情報

アイデアに関するコラボレーション

アイデアの管理

[アイデアの管理] フォームのアクションについて説明します。アイデアの詳細をレビューし、アイデアに対して実行するアクションを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイデアの管理

アクション	ステップ
タイトルを変更する	より明確または正確にするためにアイデアのタイトル変更が必要な場合は、次のいずれかのアクションを実行します。 **1.** [タイトル] フィールドに新しいタイトルを入力します。 **2.** 提案 ( ) アイコンを選択して、事前定義されたタイトルのリストから選択します。
ステータスを変更する	アイデアがライフサイクルのさまざまなステージを移動するときに、そのアイデアのステータスを変更します。アイデアのステータスを変更することは、アイデアの送信者と登録者に常に情報を提供することにもなります。 [ステータス] リストで、アイデアのステータスと優先度に基づいて適切な状況を選択します。 次のオプションが使用可能です。 • 送信済み：アイデアが送信されたときのデフォルトのステータスです。 • レビュー中：アイデアマネージャーまたはデマンドマネージャーのレビュー待ちです。 • 詳細情報が必要：アイデアを開発のために昇格して優先順位を付ける前に、追加情報が必要です。 • バックログ **(In Backlog)**：承認済みですが、将来的に可能な開発のために保留されています。 • 計画済み：承認済みで、現在の実装のアイデアからプロジェクト、デマンド、エピック、機能、またはストーリーが作成されます。 • 開発中 **(In Development)**：アイデアから作成されたタスクで作業が開始されています。 • 実装する可能性は低い **(Unlikely to Implement)**：要件を満たしていないか、実行不可能であるか、または人気がありません。アイデアは非アクティブになり、コメントと投票に対してクローズされます。 • 重複：同様のアイデアがデータベースに存在します。重複したアイデアは元のアイデアに関連付けられ、非アクティブになり、コメントと投票に対してクローズされます。 • 既に存在 **(Already Exists)**：アイデアの送信時に既に開発されているか、開発間近です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイデアの管理 (続く)

アクション	ステップ
重複としてマークする	アイデアを重複としてマークすると、一方のアイデアが [元のアイデア **(Original idea)]** としてマークされ、もう一方が [重複するアイデア **(Duplicate idea)]** としてマークされます。コメントは、この情報とともに両方のアイデアに記録されます。重複としてマークされたアイデアは非アクティブになり、コメントと投票に対してクローズされます。 **1.** [ステータス] リストで、アイデアのステータスを [重複] に設定します。 **2.** [重複] フィールドで、元のアイデアとしてマークするアイデアを検索して選択します。 **3.** [クローズメモ] フィールドに理由を入力します。
アイデアを削除する	関連性がなくなったアイデアや古くなったアイデアをデータベースから削除します。アイデアを削除すると、コメント、添付ファイル、投票などの詳細すべてがデータベースから削除されます。 アイデアとそれに関連付けられたすべての詳細を削除するには、次の手順を実行します。 • アイデアを選択します。 • [削除] を選択します。

関連情報

アイデアの管理

アイデアを評価する

アイデアの評価フォームのアクションについて説明します。送信されたアイデアをレビューし、アイデアに対して実行するアクションを選択します。送信されたアイデアを分析し、承認または却下することができます。

アイデアを評価する

アクション	ステップ
承認	アイデアが興味深く、新しい機能、製品、または拡張へと発展する可能性があると思われる場合は、そのアイデアを承認します。その後、バックログに移動し、適切なタイミングでそこから取得できます。 アイデアを承認するには、アイデアのステータスを [ステータス] リストから [バックログ **(In Backlog)]** に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイデアを評価する (続く)

アクション	ステップ
	アイデアを早期に実装する必要がある場合は、そのアイデアのタスクを作成します。詳細については、「アイデアのタスクを作成する」を参照してください。
追加情報の要求	送信時にアイデアとともに提供された情報が不十分な場合は、[ステータス] リストから [詳細情報が必要] を設定して、アイデアに関する詳細情報を要求します。
却下	アイデアが実現不可能な場合や、すでに実装されている場合は、ステータスをそれぞれ [実装する可能性は低い **(Unlikely to Implement)**] または [既に存在 **(Already Exists)**] に設定して、そのアイデアを却下します。アイデアは非アクティブになり、コメントと投票に対してクローズされます。
実装時にアイデアをクローズする	アイデアが正常に実装されたら、アイデアを完了としてマークし、さらなるコメントと投票に対してアイデアをクローズします。 アイデアを完了としてマークするには、次の手順を実行します。 **1.** [ステータス] リストからアイデアのステータスを [完了] に設定します。 **2.** アイデアがどのように実装されたかについての情報を [クローズメモ] フィールドに入力します。

自動翻訳

関連情報

アイデアを評価する

アイデアモジュールフォーム

アイデアモジュールフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、 イノベーション管理 でアイデアの詳細を作成または編集します。

アイデアモジュールフォームのフィールド

フィールド	説明
モジュール名	モジュールの名前。モジュールの作成対象エンティティを明確に特定できる名前を使用します。たとえば、部門用のモジュールを作成する場合は、人事、サポート、IT などの部門名を使用します。
モジュール ID	ユーザーを誘導するアイデアポータル URL のパラメーターとして使用される、モジュールの一意の識別子。たとえば、**hr** をモジュール **ID** として使用した場合、アイデアポータルにアクセスするための

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイデアモジュールフォームのフィールド (続く)

フィールド	説明
	URL は次の例のようになります：/idea/?id=ideas_list&sysparm_module_id=hr
アイデアテーブル	アイデアの保存に使用するテーブル。このテーブルは、アイデア [im_idea_core] テーブルを拡張する必要があります。
反対票の有効化	アイデアに反対票を投じる機能を有効にするためのオプション。 デフォルト：オン
有効	アイデアモジュールを有効にするためのオプション。 デフォルト：オン
カテゴリ制限	ユーザーがアイデアを送信するときに選択できるカテゴリの最大数。デフォルト：5 このフィールドは、デフォルトではアイデアモジュールフォームに表示されません。フォームをカスタマイズして追加する必要があります。

関連情報


アイデアモジュールの作成

デマンド管理

デマンド管理アプリケーションは、戦略的および運用上のデマンドをキャプチャ、一元化、および評価するためのツールで構成されています。また、すべてのデマンド情報を管理する単一の場所を提供します。


デマンド管理の概要

開始するには

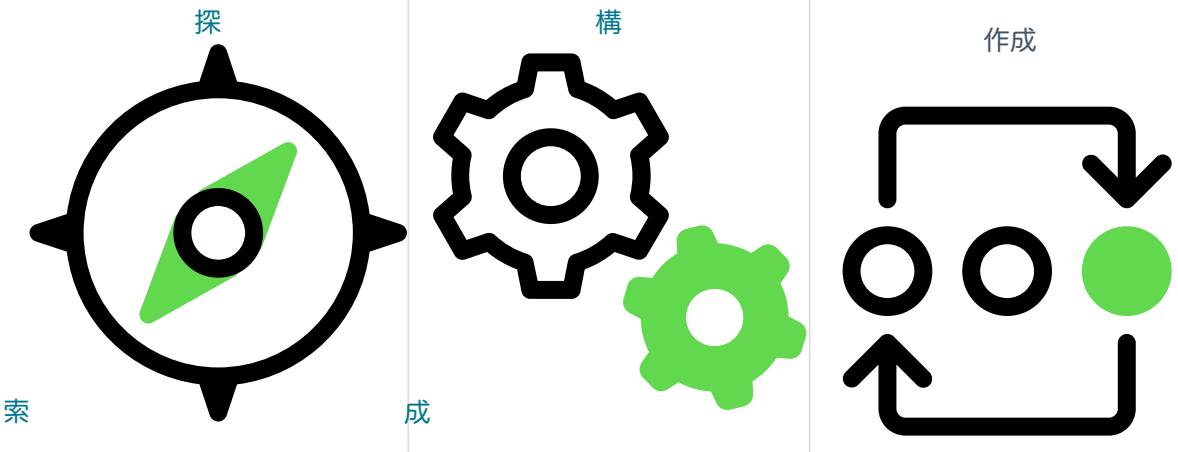

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

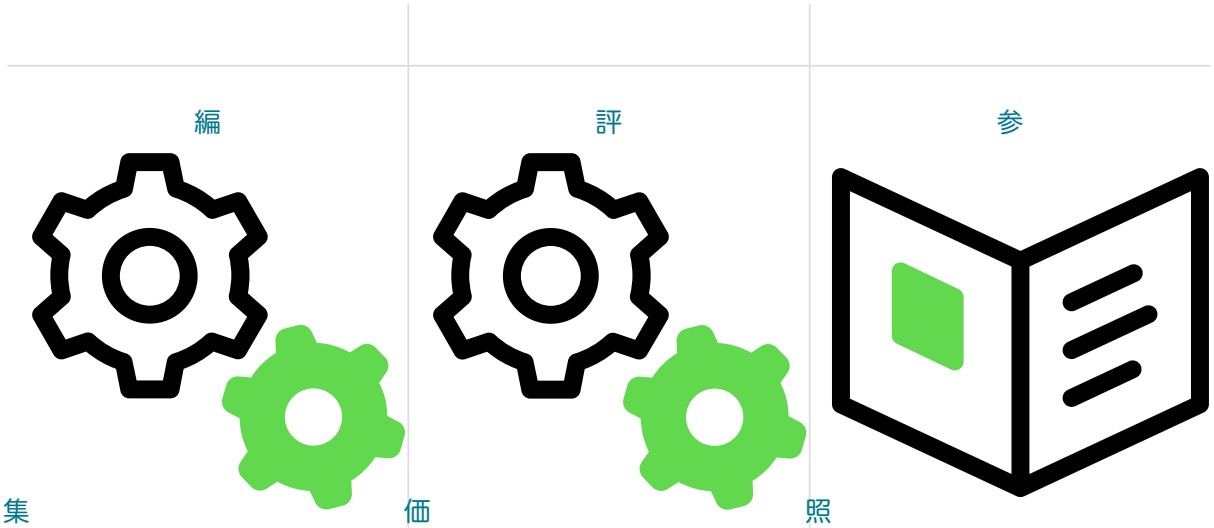

トラブルシューティングとヘルプの取得

- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

デマンドマネージャーの一般的なワークフローは次のとおりです。

- デマンドに取り組み、デマンドの実現可能性、作業量、およびコストを評価し、デマンドを承認するためのビジネスケースを作成します。
- 初期実現可能性レビュー、コスト推定、予定作業量などのデマンドタスクを作成し、専門のリソースまたはグループにアクティビティを委任します。たとえば、デマンドマネージャーは、ソフトウェアのアップグレードに関連するコストと必要なリソースを評価するデマンドタスクを作成できます。
- デマンドタスクをビジネスアナリスト、リソースユーザー、または適切なグループにアサインします。アサインされたリソースまたはグループは、コスト計画とリソースのアサインを作成して、デマンドマネージャーがデマンドを評価して認定できるようにします。詳細については、「デマンドタスク」を参照してください。

デマンド管理の基礎

- アプリケーションを設定する：計画し、ステークホルダーとアセスメントカテゴリを作成し、バブルチャートを作成します。
- アイデアを評価する：アイデアをデマンドに昇格する前に、送信されたアイデアをレビューおよび分析します。
- デマンドの詳細を作成および追加する：デマンドを作成してデマンドタスク、ステークホルダー、アセスメントを追加し、デマンドを評価して認定します。
- デマンド管理アプリケーションまたはデマンドワークベンチを使用して、デマンドを比較および評価し、プロジェクト、拡張、変更、または欠陥に対するデマンドを昇格します。

デマンド管理 の探索

デマンド管理およびそのプロセスフローの詳細と、それが組織にもたらすメリットについて説明します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド管理の概要

デマンド管理 でアイデアポータルまたは観念化モジュールを通じて送信されたアイデアを評価し、実現可能なアイデアをデマンドに昇格させます。承認されたアイデアの進捗状況を、デマンドライフサイクル (アイデアからデマンド、プロジェクト、拡張、変更、または欠陥まで) を通して追跡できます。

デマンド管理 のワークフロー

デマンド管理では、デマンドは次のいずれかのステータスになりま

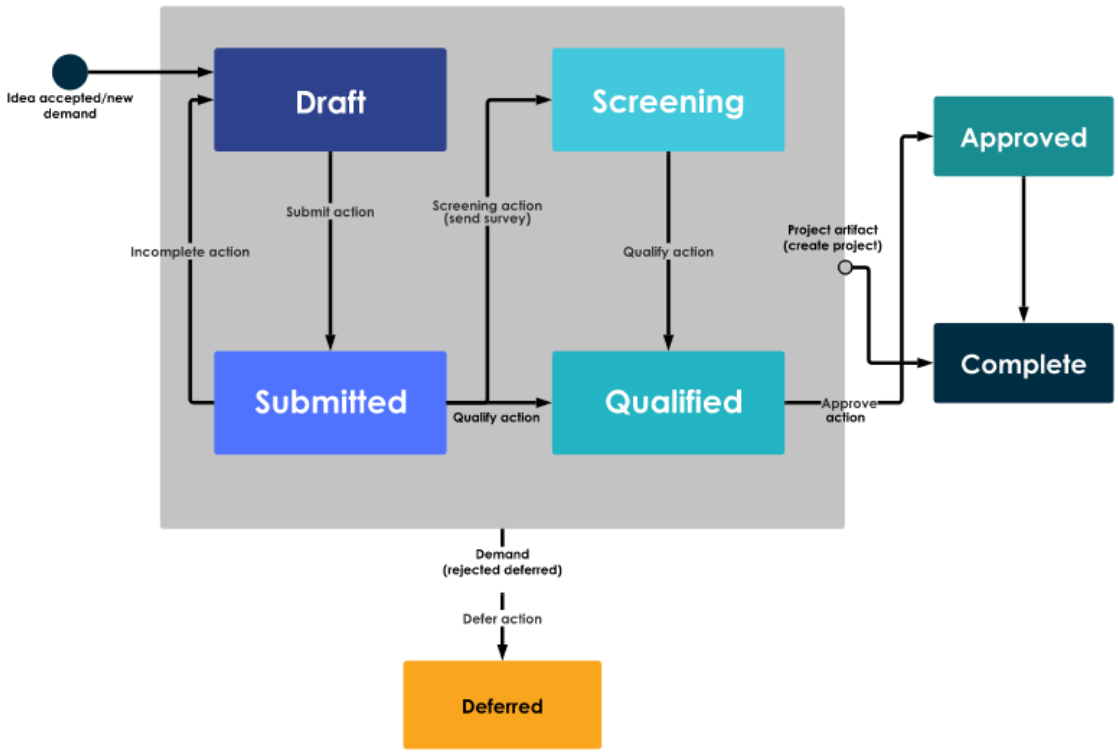

す。

デマンドの状況は、[ドラフト]、[送信済み]、[スクリーニング]、[承認済み]、および [完了] です。詳細については、「デマンド管理の使用」を参照してください。

デマンド管理 のメリット

メリット	機能	ユーザー
デマンドとして承認されたアイデアを一元的に表示および評価します。	デマンドワークベンチ	デマンドマネージャー
承認されたアイデアの進捗状況を、デマンドライフサイクル (アイデアからデマンド、プロジェクト、拡張、変更、または欠陥まで) を通して追跡できます。		
企業、地域通貨、またはプロジェクトの管理に使用する通貨と同じ通貨で、デマンドの財務面を管理および追跡します。	デマンド管理 における複数通貨	デマンドマネージャー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メリット	機能	ユーザー
ステークホルダーレジストリーにユーザーを追加して、ユーザーがデマンドまたはプロジェクトを作成したときに、デマンドおよびプロジェクト管理 (PM) が自動的にステークホルダーリストを入力できるようにします。	ステークホルダーレジストリーへの入力	デマンドマネージャー

デマンド管理のプロセスフロー

デマンド管理のプロセスフローは、次のタスクで構成されています。

デマンド管理のプロセスフロー

タスク	説明
アイデアの送信	どのユーザーも、次の場所からアイデアを送信できます。 • サービスカタログ > 何かお困りですか > アイデアの送信. • セルフサービス > アイデア > 新規作成. 注: 送信者または協力者は、アイデアが [送信済み] ステータスであれば、アイデアを編集できます。
デマンドの作成	デマンドマネージャーとデマンドユーザーは、デマンド管理アプリケーションを使用してデマンドを作成できます。 別の方法として、どのユーザーも次の場所からデマンドを作成できます。 • サービスカタログ > 何かお困りですか > 新しいデマンドを作成する. • セルフサービス > デマンド > 新規作成. 注: 要求者または協力者は、デマンドが [ドラフト] ステータスであれば、デマンドを編集できます。
デマンドへの詳細の追加	デマンドマネージャーは、デマンドタスク、ステークホルダー、要件、リスク、意思決定、およびリソースのアサインを追加することで、デマンド要求に詳細を追加できます。
デマンドの評価	意思決定者は、承認または却下するデマンドを決定する際に、アセスメント結果とデマンドバックログを使用できます。 デマンドマネージャーは、デマンドフォームの [アセスメントが必要] フィールドを使用して、デマンドに対してアセスメントをトリガーするかどうかを決定できます。
デマンドの完了	デマンドマネージャーは、デマンドの作業が完了したときにデマンドを [完了] に設定できます。

デマンドワークベンチ

デマンドワークベンチは、ビジネスデマンドを表示および評価するための一元的な場所を提供します。

デマンドワークベンチでは、1 ページにデマンド情報の複数のインタラクティブビューを表示して、デマンドを簡単に管理できます。ワークベンチは 2 つのペインに分割されています。上部ペインに

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

はデマンドを評価するためのインタラクティブなバブルチャートが表示され、下部ペインにはデマンドの詳細がリストビューで表示されます。


デマンドワークベンチでは、2 つのペイン間でリアルタイムに相互反映されます。バブルチャートでデマンドを変更すると、デマンドレコードの値が自動的に更新されます。同様に、デマンドレコードに加えられた変更は、バブルチャートに自動的に反映されます。

デフォルトでは、ワークベンチには、ステークホルダーによってスクリーニングされた、またはデマンドマネージャーによって認定されたデマンドが表示されます。デマンドマネージャーロールでは、ワークベンチを使用して次のことができます。

- デマンドを表示、評価、および更新する
- デマンドを作成する
- プロジェクト、拡張、変更、欠陥などのデマンドからアーティファクトを作成する

デマンドマネージャーロールがあれば、デマンドを表示および評価できます。

デマンドワークベンチ

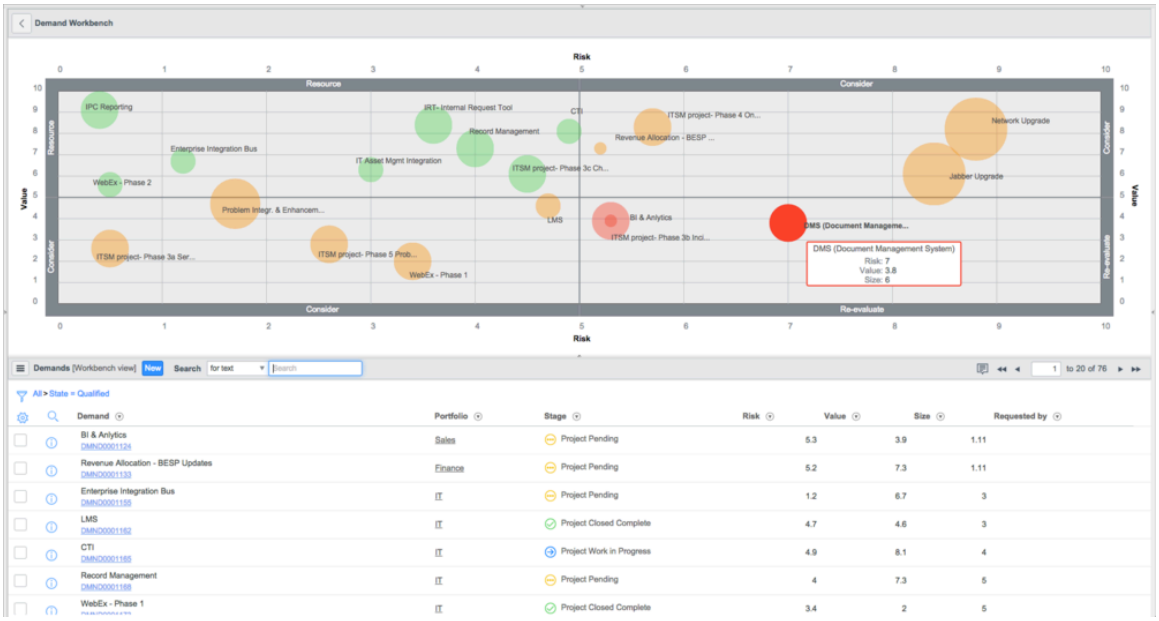

デマンドワークベンチには、次のコンポーネントが含まれています。

- 上部ペインでは、バブルチャートにデマンドが表示されます。
- 下部ペインでは、リストビューにデマンドが表示されます。
- ヘッダーには、デマンドリストを開く [戻る] ボタン ( ) が含まれています。

デマンドワークベンチのバブルチャート

デマンドワークベンチのインタラクティブなバブルチャートは、動的に更新されるグラフで、複数のデマンドレコードのメトリクスをプロットします。

デマンドマネージャーは、バブルチャートを使用して、リスク、価値、およびサイズの 3 つのカテゴリにおけるデマンドの相対的な状態を視覚化、比較、および評価できます。X 軸はデマンドのリスクを表し、Y 軸は値を表し、Z 軸はサイズを表します。デマンドは円またはバブルとしてプロットされ、そのサイズは、デマンドのサイズに応じて変化します。3 つの測定値はすべて、0 ～ 10 の値を基準としています。このスケールにより、デマンドマネージャーは、あるデマンドがチャート内の他のデマンドと比較してどのようになっているかを確認できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

バブルチャートには 4 つの象限が含まれ、各象限はデマンドに対する価値とリスクのトレードオフを表しています。象限は、バブルチャートの端に沿ってラベル付けされ、このような価値とリスクの組み合わせを表します。各象限に表示されるバブルの色は、価値とリスクのトレードオフも表しています。

- [リソース] とラベル付けされた左上の象限には、高価値で低リスクのデマンドが含まれています。緑色のバブルは、この象限のデマンドを表します。
- [検討 **(Consider)**] とラベル付けされた左下および右上の象限には、さらに評価が必要なデマンドが含まれます。左下の象限には、低リスクで低価値のデマンドが含まれ、右上の象限には高価値で高リスクのデマンドが含まれます。オレンジ色のバブルは、この象限のデマンドを表します。
- [再評価] とラベル付けされた右下の象限には、低価値で高リスクのデマンドが含まれます。赤色のバブルは、この象限のデマンドを表します。

各バブルには、デマンドの名前が付いたラベルも含まれています。

デマンドワークベンチのバブルチャートから、次のアクションを実行できます。

- バブルをポイントすると、デマンド名、リスク、価値、サイズなどを含むデマンドのサマリーが表示されます。
- バブルをクリックしてサイジングウィンドウを開き、デマンドのサイズを変更します。
- バブルをクリックしてドラッグし、デマンドのリスクまたは価値を増減させます。
- バブルを右クリックして、デマンドを表示したり、アーティファクトを作成したり、デマンドから作成されたアーティファクトを表示したりすることができます。

> **注:**
> アジャイル開発 2.0 が有効化されていない場合、拡張または欠陥を作成するオプションは表示されません。

バブルチャート内のデマンドに変更を加えると、デマンドレコードが自動的に更新されます。

デマンドワークベンチのリストビュー

デマンドワークベンチの下部ペインには、バブルチャートに表示されているデマンドのリストが表示されます。

バブルチャートのリストビューには、一度に最大 20 のデマンドが表示されます。リストで次のページや前のページに移動することで、他のデマンドを表示できます。

[デマンド] 列には、デマンドフォームへのリンクを提供するデマンド番号が表示されます。[ステージ] 列には、デマンドのステータスまたは進捗状況が表示されます。詳細については、「ステージフィールド」を参照してください。

インタラクティブなバブルチャートは、リストビューでデマンドを変更するたびに更新されます。デマンドワークベンチから新しいデマンドを作成すると、デマンドが認定済みステータスで作成され、バブルチャートに表示されます。デマンドは、プロジェクト、拡張、変更要求、または欠陥に昇格すると、バブルチャートから削除されます。

リストビューで次のタスクを実行すると、バブルチャートに表示されているデマンドに影響します。

- リストビューでレコードを検索またはフィルタリングすると、その検索基準またはフィルター基準を満たすデマンドのバブルが表示されます。
- リストビューでレコードを追加または削除すると、対応するバブルが追加または削除されます。
- いずれかのページ矢印アイコンをクリックしてリストビューのページを切り替えると、ページに表示されているデマンドのバブルが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド管理 の 予測インテリジェンス

デマンド管理 用 予測インテリジェンス 機能では、機械学習アルゴリズムを使用して類似のデマンドを検索および表示し、デマンドフォームでデマンドを作成します。

PPM 予測インテリジェンスワークベンチには、新しい予測モデルの作成とトレーニング、それらの評価とテスト、およびアイデア、デマンドおよびプロジェクト管理 (PM)に価値を付加するために、ビジネスプロセスへの追加プロセスを系統的にガイドする、事前にビルドされたユースケーステンプレートが含まれています。

カスタムユースケースはトレーニング後、すぐに使用可能になります。PPM 予測インテリジェンスワークベンチの使用に際して、人工知能や機械学習に関する事前の知識や経験は不要です。

アプリケーションには、独自の予測モデルの作成、トレーニング、評価、テスト、プロデュースに役立つ事前にビルドされたガイダンスを含むテンプレートが含まれています。

デマンド管理用の予測インテリジェンスには、次の利点があります。

- 重複するデマンドを回避することで、データベースの品質を向上させます。
- デマンドの計画に役立ちます。過去に送信および実行された類似のデマンドの詳細を表示できます。

アクティベーション情報

予測インテリジェンスワークベンチを使用する前に、次のプラグインを有効化します。

- PPM 用予測インテリジェンス (com.snc.ppm_ml) プラグイン
- 観念化用予測インテリジェンス (com.snc.innowation_management_ml) プラグイン

デマンド管理 用 予測インテリジェンス のソリューション定義

デマンド管理 用 予測インテリジェンス 機能のソリューション定義は、PPM の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.ppm_ml) で利用できます。予測インテリジェンスの詳細については、「予測インテリジェンス」および「コンテキスト検索h」を参照してください。

デマンド管理のソリューション定義

ソリューション定義	ソリューション タイプ	説明
類似デマンド	類似性	[デマンドの名前] フィールドと [説明] フィールドに基づいて類

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド管理のソリューション定義 (続く)

ソリューション定義	ソリューション タイプ	説明
注: このソリューション定義は、次のプラグインが有効なインスタンス上で、テンプレートとして使用できます。 • コンテキスト検索の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.contextual_search_ml) • PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) • PPM の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.ppm_ml)		似のデマンドを表示します。デマンドフォームの [類似デマンド] セクションで結果を確認できます。

関連情報

予測インテリジェンス

類似のデマンドを見つけるために デマンド管理 の類似性ソリューションをトレーニングする

デマンドを作成

デマンド管理の構成

プロジェクト、拡張、変更、または欠陥に対するデマンドを評価して昇格するには デマンド管理 アプリケーションを構成します。

構成の概要

デマンド管理 における複数通貨

企業通貨、地域通貨、または複数通貨機能を使用して、プロジェクトの管理に使用する通貨と同じ通貨で、デマンドの財務面を管理および追跡します。通常、この設定の選択は企業ポリシーによって決まります。

グローバルな組織や多国籍組織では、多くの場合、デマンドは 1 か所の地理的な場所で管理および追跡され、地理的に異なる場所で実行されます。拠点ごとに異なる通貨で予算を使う可能性があるため、地理的な違いがあると、このようなデマンドに対する財務面の監視や追跡が困難になります。

デマンド管理 の複数通貨機能を使用すると、地理的な場所や通貨にかかわらず、デマンドをより容易に管理および追跡できます。ある通貨でデマンドの財務面を監視および追跡し、機能通貨、地域通貨、または後からプロジェクト管理に使用する通貨など、別の通貨で予算を使うことができます。ある通貨でデマンドを管理し、将来のプロジェクト管理に別の通貨を指定することもできます。

アクティベーション情報

PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインを有効化して、デマンド管理の複数通貨機能を有効化します。このプラグインを有効化すると、デマンド、コスト計画、利益計画

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フォームで、デマンド通貨ビューが有効化されます。デマンド通貨ビューでは、単純なデマンドの財務面、コスト計画、利益計画、および予算をデマンド通貨で管理できます。

注:
このプラグインを有効化すると、PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) プラグインが自動的に有効化されるので、デフォルトビューとデマンド通貨ビューを切り替えるオプションが表示されます。

通貨設定

複数通貨プラグインを有効化した後に、デマンドの財務を管理するための通貨設定を指定します。機能通貨、地域通貨、または現地通貨を選択できます。詳細については、「デマンド通貨設定の選択」を参照してください。

デマンド通貨ビュー

デマンドフォームのデフォルトビューに加え、デマンド通貨ビューで複数通貨フィールドを表示できます。このビューは、フォームのコンテキストメニューから有効にできます。

機能通貨以外の通貨を、デマンド処理通貨として指定できます。デマンドフォームの [財務] タブには、[デマンド通貨] フィールドがあります。通貨 [fx_currency] テーブルから、有効な通貨を選択できます。

注:

デマンドのコスト計画、コスト計画ブレークダウン、利益計画、または利益計画ブレークダウンを作成すると、そのデマンドの [デマンド通貨] フィールドは読み取り専用になります。

デマンドタスクにおける複数通貨

デマンドタスクを実行している間に発生した経費を、デマンド通貨で追跡します。デマンドタスクのタイムカードが送信されて処理されると、レートモデル、デフォルトの賃金レート、またはシステムプロパティで定義されたレートに基づいて、実績コストが計算されます。この実績コストは、デマンドタスクフォームの [デマンド通貨] および [デマンド通貨での実績コスト] フィールドで表示できます。詳細については、「デマンドタスク」を参照してください。

デマンドベースラインにおける複数通貨

デマンドの財務ベースラインを比較して、経時的なデマンドのパフォーマンスを追跡します。ベースライン比較を使用すると、デマンドライフサイクルのさまざまなステージでデマンドに加えられた財務上の変更を特定してレビューできます。複数通貨機能を使用すると、ベースラインを比較するときにデマンド通貨で財務情報を表示できます。ベースラインビューを設定して、フィールドを追加し、デマンド通貨で詳細を表示することもできます。詳細については、「デマンドの財務ベースラインの比較」を参照してください。

デマンド通貨設定の選択

デマンドの財務を管理およびトラッキングするために使用する通貨設定を、機能通貨、地域通貨、または現地通貨から指定します。

始める前に
PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインを有効化します。

必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > 設定:プロジェクト.
2. [デマンド通貨設定] リストからデマンドを管理する際の通貨オプションを選択します。
3. [保存] をクリックします。

次のタスク
デマンドフォームおよびその他のデマンド関連フォームで複数通貨ビューを有効にします。詳細については、「デマンド通貨ビューの有効化」を参照してください。

デマンド通貨ビューの有効化

デマンド通貨ビューに切り替えて、選択した通貨で、デマンドの計画コストを追跡します。

始める前に
PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインを有効化します。

必要なロール：admin または it_demand_manager

このタスクについて
機能通貨とは異なる通貨でデマンドを管理するために、コスト詳細と [財務] タブが含まれている次のテーブルに、デマンド通貨フィールドが追加されています。

デマンド通貨フィールドのあるテーブル

テーブル名	説明
デマンド [dmn_demand] テーブル	別の通貨でデマンドを追跡します。デマンドを作成し、[財務] タブに移動して [デマンド通貨] フィールドで通貨を選択して、別の通貨を選択します。デマンドを作成するには、「デマンドの作成」を参照してください。
デマンドタスク [dmn_demand_task] テーブル	デマンドタスクは、コスト、作業量、リスク、および利益のアセスメントアクティビティを委任するために使用されます。デマンドタスクを作成するには、「デマンドタスクを作成」を参照してください。
コスト計画 [cost_plan] テーブル	コスト計画は、デマンドのコストをキャプチャします。コスト計画フォームに移動するには、「デマンドコスト計画を作成する」を参照してください。
コスト計画ブレークダウン [cost_plan_breakdown] テーブル	コスト計画ブレークダウンは、会計期間のコスト概算と実績コストを詳細なレベルで指定します。コスト計画ブレークダウンフォームに移動するには、「デマンドコスト計画を作成する」を参照してください。
利益計画 [benefit_plan] テーブル	デマンド通貨ビューでデマンドフォームを開くと、デフォルトで、デマンド通貨に関連するフィールドが [利益計画] 関連リストに表示されます。デマンド利益計画を作成するには、「デマンドの金銭的利益計画の作成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド通貨フィールドのあるテーブル (続く)

テーブル名	説明
利益計画ブレークダウン [benefit_plan_breakdown] テーブル	利益計画は、デマンドの実行時にデマンドによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。利益計画のブレークダウンを更新するには、「デマンドの金銭的利益計画の作成」を参照してください。
経費ライン [fm_expense_line] テーブル	経費ラインはデマンドコスト計画の一部であり、特定のリソースに関連付けられたコストを格納します。経費ラインフォームに移動するには、「デマンドの経費ラインを作成する」を参照してください。
プロジェクト資金調達 [project_ Fundding] テーブル	単一会計期間の資本経費と運用経費の両方について、デマンドターゲットと予算経費の値を保存します。デマンドに予算を割り当てるには、「デマンドに予算を割り当てる」を参照してください。

手順

1. それぞれのフォームに移動します。
2. フォームのコンテキストメニューを右クリックします。
3. [表示] をクリックします。
4. リストから [デマンド通貨] を選択します。

次のタスク

選択した [デマンド通貨] ビュー専用のフォームフィールドを参照してください。他のすべてのフォームタブとフィールドは、デフォルトビューとデマンド通貨ビューの両方で同じままです。デフォルトのビューの場合と同じように、フィールドに値を入力し続けます。

デマンド関連フォームの複数通貨フィールド

デマンド、コスト計画、コスト計画ブレークダウンフォームで [デマンド通貨] ビューを有効にすると、フォームの [財務] セクションに複数通貨フィールドが表示されます。

デマンドフォームの [財務] タブ

デマンドフォーム

フィールド	説明
デマンド通貨	デマンドの管理と追跡に使用する通貨。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォーム (続く)

フィールド	説明
	注: デマンド通貨を選択できるかどうかは、[プロジェクト管理] の [設定 - プロジェクト] で選択した通貨オプションで決まります。詳細については、「デマンド通貨設定の選択」を参照してください。 コスト計画、コスト計画ブレークダウン、利益計画、または利益計画ブレークダウンを作成すると、そのデマンドの [デマンド通貨] フィールドは読み取り専用になります。
プロジェクト通貨	このデマンドがプロジェクトに変換されたときに、プロジェクト実装に使用される通貨。 **注:** プロジェクト管理 (PM) のプロジェクトフォームにある [プロジェクト通貨] フィールドは、変換時にデマンドから引き継がれます。
デマンド通貨での資本経費 (Capital expense in demand currency)	デマンドの資本的支出 (投資)。
デマンド通貨での資本予算 (Capital budget in demand currency)	すべての会計年度にわたってデマンドに割り当てられた資本予算の合計。 この値は、デマンドの資本的支出 (投資) 予算からロールアップされます。
デマンド通貨での運用経費 (Operating expense in demand currency)	選択したデマンド通貨でのデマンドの運用支出 (経費)。
デマンド通貨での運経費予算 (Operating budget in demand currency)	選択したデマンド通貨ですべての会計年度にわたってデマンドに割り当てられた運用予算の合計。 この値は、デマンドの経費予算からロールアップされます。
デマンド通貨での計画コストの合計	デマンド通貨でのデマンドのコスト概算。
デマンド通貨での収支	[デマンド通貨での計画コストの合計] および [デマンド通貨での予定利益] フィールドに基づく推定収益。
デマンド通貨での予定利益	選択したデマンド通貨でデマンドが承認された場合の推定収益。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォーム (続く)

フィールド	説明
	この値は、デマンドの利益ブレークダウンからロールアップされます。
デマンド通貨での正味現在価値	所定の年利に基づく、デマンド通貨での将来の現金の現在価値。 これは、現在の支出額を将来予想される予定利益と比較するための指標です。投資パフォーマンス全体を評価する際に役立ちます。
デマンド通貨での実績コスト	選択したデマンド通貨での、デマンドおよびデマンドタスクの作業中に発生した合計コスト。

デマンドタスクフォームの複数通貨フィールド

デマンドタスクフォーム

フィールド	説明
デマンド通貨	デマンドフォームの [デマンド通貨] フィールドで指定した通貨。
デマンド通貨での実績コスト	選択したデマンド通貨での、デマンドタスクの作業中に発生した合計コスト。 実績コストは、デマンドタスクの受託者がタイムカードを作成して送信した後に表示されます。タイムカードが承認されると、レートカード、賃金レート、またはシステムのプロパティから導出されたリソースレートを使用して、このフィールドに値が入力されます。

コスト計画フォームの [財務] セクション

コスト計画フォーム

フィールド	説明
デマンド通貨	デマンドフォームの [デマンド通貨] フィールドで指定した通貨。
デマンド通貨でのコスト	すべてのコスト計画ブレークダウンの [入力通貨でのコスト] フィールドからロールアップされた値。

注:
コスト計画の単価、数量、または会計期間を変更すると、金額はデマンド通貨で再計算されます。「デマンド通貨でのコスト計画の更新とコストの再計算」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コスト計画ブレークダウンフォームの複数通貨フィールド

コスト計画ブレークダウンフォーム

フィールド	説明
デマンド通貨	デマンドフォームの [デマンド通貨] フィールドで指定した通貨。
デマンド通貨でのコスト	デマンド通貨での、ブレークダウンの金額。
デマンド通貨の為替レート	コスト計画ブレークダウンに対応する期間で有効なデマンド通貨でのレート。
デマンド通貨の為替レート日付	換算に通貨為替レートが適用される基準日。

[利益計画] フォームの [財務] セクション

利益計画フォーム

フィールド	説明
デマンド通貨	デマンドフォームの [デマンド通貨] フィールドで指定した通貨。
デマンド通貨での利益	デマンド通貨で、デマンドから発生する利益。
デマンド通貨での実績利益	実績利益値は、利益ブレークダウンの実績利益からロールアップされます。

利益計画ブレークダウンフォームの複数通貨フィールド

利益計画ブレークダウンフォーム

フィールド	説明
デマンド通貨	デマンドフォームの [デマンド通貨] フィールドで指定した通貨。
デマンド通貨での利益	デマンド通貨で、デマンドから発生する利益。
デマンド通貨の為替レート	デマンド通貨での利益計画ブレークダウンに対応する期間で有効なレート。
デマンド通貨の為替レート日付	換算に通貨為替レートが適用される基準日。

経費ラインフォームの複数通貨フィールド

経費ラインフォーム

フィールド	説明
デマンド通貨	デマンドフォームの [デマンド通貨] フィールドで指定した通貨。
デマンド通貨での金額	デマンド通貨での経費コスト。[金額] フィールドに入力された金額は、デマンド通貨に変換されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド予算フォームの複数通貨フィールド

デマンド予算フォーム

フィールド	説明
デマンド通貨での投資予算	選択した通貨で資本的支出に割り当てられた計画経費の金額。
デマンド通貨での経費予算	選択した通貨での運用経費の金額。
デマンド通貨での予算合計	選択した通貨での投資および経費の合計額。

デマンド予算をデマンド通貨で割り当てる

資本経費 (投資) および運用経費 (経費) の予算を、会計年度に応じてデマンド通貨または機能通貨で設定します。投資予算および経費予算の合計は、デマンド通貨で合計予算として計算されます。

始める前に

必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて

機能通貨の場合と同様の方法で予算を割り当てます。詳細については、「デマンドに予算を割り当てる」を参照してください。

デマンドフォームで [デマンド通貨] ビューを有効にして、デマンド通貨で予算を割り当てます。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 予算の割り当て先のデマンドを選択します。
3. デマンドフォームの [デマンド予算を作成] 関連リンクを選択します。

   [デマンド予算] ダイアログボックスが開きます。
4. [デマンド予算] ダイアログボックスで、フィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「デマンド予算フォーム」を参照してください。
5. **[OK]** を選択します。

タスクの結果

選択した年のデマンド予算が、[デマンド予算] 関連リストに表示されます。リスト内の金額を選択して金額を修正します。

デマンド通貨でのコスト計画の更新とコストの再計算

単位コスト、数量、または会計期間を更新すると、コスト計画とそのブレークダウンの関連するすべての金額フィールドが更新されます。また、コスト計画がロールアップされるデマンドの関連フィールドの金額が再計算され、デマンド通貨で反映されます。

コスト計画の [単位コスト]、[数量]、および [繰り返し] チェックボックスの変更

複数通貨ビューを有効にして、コスト計画フォームでこれらのいずれかのフィールドの値を変更すると、次の値が再計算されます。

- コスト計画フォームの [単位コスト] フィールド、[数量] フィールド、または [繰り返し] チェックボックスを変更すると、合計予定コストがデマンド通貨で再計算されます。
- コスト計画ブレークダウンの [デマンド通貨でのコスト] も再計算されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- デマンドの [デマンド通貨での資本経費 **(Capital expense in demand currency)]**、[デマンド通貨での運用経費 **(Operating expense in demand currency)]**、および [デマンド通貨での計画コストの合計] フィールドの値が再計算されます。

コスト計画の会計期間の変更

コスト計画フォームで会計期間の開始日または終了日のいずれかを変更すると、次の値が再計算されます。

- コスト計画の [合計計画コスト] と [デマンド通貨でのコスト] が再計算されます。したがって、コスト計画ブレークダウンレコードを追加または削除することができます。
- [繰り返し] チェックボックスが選択されていない場合、各コスト計画ブレークダウンレコードの [デマンド通貨でのコスト] が再計算されます。
- デマンドの [デマンド通貨での資本経費 **(Capital expense in demand currency)]**、[デマンド通貨での運用経費 **(Operating expense in demand currency)]**、および [デマンド通貨での計画コストの合計] フィールドの値が再計算されます。

コスト計画ブレークダウンの入力通貨でのコストの変更またはブレークダウンの手動追加

個々のコスト計画ブレークダウンレコードの入力通貨でのコストを変更するか、コスト計画ブレークダウンを手動でコスト計画に追加すると、次の値が再計算されます。

- コスト計画の [合計計画コスト] がデマンド通貨で再計算されます。
- デマンドの [デマンド通貨での資本経費 **(Capital expense in demand currency)]**、[デマンド通貨での運用経費 **(Operating expense in demand currency)]**、および [デマンド通貨での計画コストの合計] フィールドの値が再計算されます。

デマンド通貨での利益計画の更新と再計算

入力通貨、入力通貨での利益、オフセットタイプ、または利益計画の会計期間を更新すると、利益計画とそのブレークダウンの関連するすべての金額フィールドも更新されます。また、利益計画がロールアップされるデマンドの関連フィールドの金額が再計算され、デマンド通貨に反映されます。

利益計画の [入力通貨]、[入力通貨での利益]、および [繰り返し] チェックボックスの変更

複数通貨ビューを有効にして、[利益計画] フォームでこれらのいずれかのフィールドの値を変更すると、次の値が再計算されます。

- 利益計画フォームの [入力通貨] フィールド、[入力通貨での利益] フィールド、または [繰り返し] チェックボックスを変更すると、合計計画利益がデマンド通貨で再計算されます。
- 利益計画ブレークダウンの [デマンド通貨での利益] も再計算されます。
- デマンドの [デマンド通貨での予定利益] フィールドの値が再計算されます。

利益計画のオフセットタイプの変更

利益計画のオフセットタイプ (開始日または終了日のいずれか) を変更し、利益計画フォームでそのオフセット期間と該当する継続期間を指定すると、次の値が再計算されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 利益計画の [合計計画利益] と [デマンド通貨での利益] が再計算されます。そのため、利益計画ブレークダウンレコードが追加または削除される場合があります。
- [繰り返し] チェックボックスがオフの場合、各利益計画ブレークダウンレコードの [デマンド通貨での利益] が再計算されます。
- デマンドの [デマンド通貨での予定利益] フィールドの値が再計算されます。

利益計画の会計期間の変更

利益計画フォームで会計期間の開始日または終了日のいずれかを変更すると、次の値が再計算されます。

- 利益計画の [デマンド通貨での利益] と [合計計画利益 **(Total planned benefit)]** が再計算されます。そのため、利益計画ブレークダウンレコードが追加または削除される場合があります。
- [繰り返し] チェックボックスがオフの場合、各利益計画ブレークダウンレコードの [デマンド通貨での利益] が再計算されます。
- デマンドの [デマンド通貨での予定利益] フィールドの値が再計算されます。

利益計画ブレークダウンの入力通貨での利益の変更

個々の利益計画ブレークダウンレコードに入力通貨での利益を変更すると、次の値が再計算されます。

- 利益計画の [デマンド通貨での利益] が、デマンド通貨で再計算されます。
- デマンドの [デマンド通貨での予定利益] フィールドの値が再計算されます。

自動翻訳

デマンド管理 における複数通貨のクイックスタートテスト

アップグレードの適用やアプリケーションの開発などの構成変更を行った後でも、デマンド管理 の複数通貨が変わらず正常に動作するかどうかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。

危険:
デフォルトでは、自動テストを実行するためのシステムプロパティは、実稼働システムでは実行できないように無効になっています。データの破損や機能停止を避けるため、開発、テスト、および他の非本番インスタンスでのみテストを実行してください。「自動テストフレームワーク (ATF) テストの実行を有効または無効にする」を参照してください。

デマンド通貨クイックスタートでは、PPM Standard Multicurrency – ATF Tests プラグイン (com.snc.ppm_multicurrency.atf) をアクティブ化する必要があります。

デマンド通貨テストスイートのテスト

テスト	説明	リリースバージョン
コスト計画のデマンド通貨でコストを確認	予算参照レートを使用してコスト計画ブレークダウンの計算を検証し、デマンド通貨でのコスト計画へのロールアップを確認します。	Quebec
デマンド通貨で利益計画の利益を確認	予算参照レートを使用してコスト計画ブレークダウンの計算を検証し、デマンド通貨での利益	Quebec

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド通貨テストスイートのテスト (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
	計画へのロールアップを確認します。	

関連情報

クイックスタートテスト

既存のデマンドのアップグレード

PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインを有効化した後に、スケジュール済みジョブを実行して、既存のアクティブなデマンドと非アクティブなデマンドをそれぞれアップグレードします。

始める前に
PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインを有効化します。

必要なロール：admin

このタスクについて
これらのスケジュール済みジョブをオンデマンドで実行し、必要な場合にのみ、既存のアクティブおよび非アクティブなデマンドをデマンド通貨でアップグレードします。

注:
デマンドの数とコスト計画によっては、このジョブがパフォーマンスに影響を与える可能性があるため、必要な場合にのみジョブを実行します。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. スケジュール済みジョブを実行して、既存のアクティブおよび非アクティブなデマンドをアップグレードします。

デマンド管理の設定

デマンド管理をセットアップするには、次のタスクを実行します。

デマンド管理を使用する前に、PPS アドミンはいくつかのセットアップタスクを実行します。

デマンド管理の計画立案

デマンド管理を設定する前に、リストされたアイテムを計画します。

デマンド管理の計画立案

名前	説明
ロール	デマンドマネージャー [it_demand_manager] ロールとデマンドユーザー [it_demand_user] ロールを持つユーザーを決定します。
ポートフォリオ	デマンドをグループ化または分類する方法を決定し、プロジェクトマネージャー [it_project_manager] ロールを持つユーザーに、それらのグループ化に基づくポートフォリオの作成を依頼します。
ステークホルダー	各ポートフォリオに関連するデマンドを評価するための適切な分野の知識を持つ個人を特定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド管理の計画立案 (続く)

名前	説明
	次に、該当者をそのポートフォリオのステークホルダーにします。
アセスメント	情報収集プロセスを容易にするために、アセスメントの使用を検討します。 メトリクスカテゴリとアセスメントメトリクスを定義して、アセスメントを策定し、適切な対象者に配布します。
バブルチャートの定義	ステークホルダー、部門、および組織にとって重要なメトリクスを特定します。 これらのメトリクスを使用して、デマンドを視覚的に比較するバブルチャートを作成します。 たとえば、どのプロジェクトを実施するか検討する際に、多くの組織は、リスク評価、投資収益率、コストなどのメトリクスを比較します。
リソースのアサイン	組織がデマンドに関連する時間とリソースコストを理解できるように、リソースのアサインを作成することを検討します。デマンドに関連付けられているリソースのアサインは、プロジェクトに伝播されます。 リソースのアサインでは、 リソース管理ワークスペース アプリケーションがアクティブである必要があります。
拡張と欠陥の要求	必要に応じて拡張要求と欠陥要求をデマンドとして管理する機能が必要かどうかを判断します。 この機能を使用するには、Agile Development アプリケーションが有効化されている必要があります。

自動翻訳

ステークホルダーレジストリーへの入力

ステークホルダーレジストリーにユーザーを追加して、ユーザーがデマンドまたはプロジェクトを作成したときに、デマンドおよびプロジェクト管理 (PM) が自動的にステークホルダーリストを入力できるようにします。

始める前に

必要なロール：it_pps_admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > ステークホルダー.
   デマンドまたはプロジェクトフォームの [ステークホルダー] 関連リストまでスクロールし、[新規] をクリックしてレコードを作成することもできます。
2. [新規] をクリックして、新しいレコードを作成します。
3. ステークホルダー登録フォームのフィールドに記入します。

   フィールド名の説明については、「ステークホルダー登録フォーム」を参照してください。

   注:
   ステークホルダーレジストリーにユーザーを追加する場合、ユーザーとアサインされたポートフォリオの組み合わせは一意になっている必要があります。ただし、同じユーザーであっても、ポートフォリオが異なる形で、複数のレコードが存在する場合があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アセスメントメトリクスカテゴリの表示

Demand Workbench で、バブルチャートを生成する際に、アセスメントメトリクスタイプとアセスメントメトリクスとともに使用されるアセスメントメトリクスカテゴリを表示します。バブルチャートは、デマンドマネージャーが視覚的にデマンドを評価するために役立ちます。

始める前に
必要なロール：it_pps_admin

このタスクについて
デマンド管理 アプリケーションには、[デマンド] というアセスメントメトリクスタイプ、5 つのデフォルトのアセスメントメトリクスカテゴリ、およびアセスメントメトリクスが付属しています。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > アセスメントメトリクスカテゴリ.
2. 確認するアセスメントメトリクスカテゴリを開きます。
   次のデフォルトのアセスメントメトリクスカテゴリが デマンド管理 で利用可能です。

デマンドアセスメントメトリクスカテゴリ

アセスメントメトリクスカテゴリ	データソース	説明
サイズ	[デマンド] フォームの **[T** シャツサイズ] フィールド	デマンドサイズを他のデマンドのサイズと相対的に評価します。
戦略的配置	戦略的配置のメトリクスカテゴリのアセスメントカテゴリ結果の [アセスメントカテゴリ結果の表示 (View an assessment category result)] フィールド	デマンドが他のデマンドと比較して組織の戦略目標とどれほど緊密に整合しているかを評価します。
リスク	リスクのメトリクスカテゴリのアセスメントカテゴリ結果における [評価] フィールド。	デマンドリスクを他のデマンドと比較して評価します。
ROI	デマンドフォームの [影響度] および [収支] フィールド。	投資に対するデマンドリターンを他のデマンドと比較して評価します。
コスト	デマンドフォームの [人件費]、[資本経費]、および [運用経費] フィールド。	デマンドコストを他のデマンドと比較して評価します。

デマンドの財務メトリクスのウィジェットを設定する

デマンド財務ページでデマンドの財務メトリクスを表示および追跡するためのウィジェットを設定します。

始める前に
必要なロール：pps_admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > ウィジェット.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [ウィジェット] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「ウィジェットフォーム」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
ウィジェットをデマンドテーブルに関連付けます。

ウィジェットをデマンドテーブルに関連付けます。

ウィジェットを設定したら、それをデマンドテーブルに関連付けて、デマンドの財務データを表示します。

始める前に
ウィジェットをデマンド [dmn_demand] テーブルに関連付ける前に、ウィジェットを設定する必要があります。

必要なロール：pps_admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > ウィジェット.
2. ウィジェットを開いて、デマンドテーブルに関連付けます。
3. [ウィジェットの関連性] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. [ウィジェットの関連性] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「ウィジェットの関連性フォーム」を参照してください。

デマンドワークベンチの構成

デマンドワークベンチを更新して、バブルチャートなどのパラメーターを構成します。

始める前に
必要なロール：it_pps_admin

このタスクについて
ベースシステムで提供されるデマンドワークベンチのパラメーターを構成できます。
バブルチャートは、リスク評価、投資利益率、コストなどの一般的なメトリクスに基づいてデマンドを比較する際に役立ちます。意思決定者は、どのデマンドを承認または却下するかを検討する際にバブルチャートを使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > ワークベンチの設定 - デマンド.
2. [デマンドワークベンチ] レコードを開きます。
3. 必要な設定を更新し、[更新] をクリックします。

デマンド管理の使用

デマンドマネージャーロールを持つユーザーは、デマンド管理アプリケーションを使用してデマンドを作成、表示、および変更できます。

デマンドを承認し、承認したデマンドから次のアーティファクトを作成することもできます。

- プロジェクト
- 変更
- 拡張
- 欠陥

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドから作成されるアーティファクトのタイプは、デマンドフォームの [カテゴリ] フィールドと [タイプ] フィールドの選択によって決まります。システムアドミニストレーターが SDLC-SCRUM プラグインを有効化している場合は、拡張と欠陥を作成できます。

デマンド管理のライフサイクル

デマンド管理のライフサイクルは、次のように簡素化できます。

- デマンドの作成：ユーザーがアイデアを送信し、デマンドマネージャーがそのアイデアを承認すると、そのアイデアからデマンドが自動的に作成されます。
- デマンドのリストの表示：デマンドマネージャーは、デマンドワークベンチまたはリストビューからデマンドを表示します。
- デマンドの強化：デマンドマネージャーは、スクリーニングにデマンドを送信して、ステークホルダーにアセスメントを送信できます。
- デマンドの評価：
  - デマンドマネージャーは、デマンドをスクリーニングし、アセスメントを完了するためにステークホルダーにサーベイを送信できます。
  - デマンドマネージャーは、デマンドのステータスを [認定 (qualify)]、[保留]、または [未完了] に設定することができます。
  - デマンドワークベンチを使用してデマンドを分析し、承認することができます。
- アーティファクトの作成：デマンドマネージャーは、プロジェクト、拡張、変更、または欠陥を作成します。

デマンド管理アプリケーションは、次の簡素化されたデマンド状況を使用します。

デマンドの状況

状況	説明
ドラフト	デマンドマネージャーは、送信されたアイデアを受け入れます。 レコードをレビューまたは編集した後、次のいずれかのボタンをクリックします。 • 更新：デマンドレコードは更新されますが、デマンドは現在のステータスのままです。 • デマンドの送信：デマンドは [送信済み] ステータスに移行します。 • 削除：デマンドレコードが削除されます。
送信済み	受け取ったアイデアのデマンドレコードが作成され、デマンドマネージャーがデマンドを送信します。 レコードをレビューまたは編集した後、次のいずれかのボタンをクリックします。 • 更新：デマンドレコードは更新されますが、デマンドは現在のステータスのままです。 • スクリーニング：デマンドが [スクリーニング] ステータスに移行します。 • 認定 **(Qualify)**：デマンドが [認定済み] ステータスに移行します。 • 保留：デマンドが [保留] ステータスに移行します。 • 未完了：デマンドが [未完了] ステータスに移行します。 • 削除：デマンドレコードが削除されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドの状況 (続く)

状況	説明
スクリーニング	デマンドはデマンドのアセスメントを開始します。 レコードをレビューまたは編集した後、次のいずれかのボタンをクリックします。 • 更新：デマンドレコードは更新されますが、デマンドは現在のステータスのままです。 • 認定 **(Qualify)**：デマンドが [認定済み] ステータスに移行します。 • 保留：デマンドが [保留] ステータスに移行します。 • 削除：デマンドレコードが削除されます。
認定済み	デマンドは認定済みで、レビューの準備が整っています。 レコードをレビューした後、次のいずれかのボタンをクリックします。 • 更新：デマンドレコードは更新されますが、デマンドは現在のステータスのままです。 • 承認：デマンドが [承認済み] ステータスに移行します。 • 保留：デマンドが [保留] ステータスに移行します。 • 削除：デマンドレコードが削除されます。
保留	デマンドは保留されています。デマンドは将来再アクセスしてレビューすることができます。 レコードをレビューした後、次のいずれかのボタンをクリックします。 • 更新：デマンドレコードは更新されますが、デマンドは現在のステータスのままです。 • 承認：デマンドが [承認済み] ステータスに移行します。 • ドラフトにリセット：デマンドがドラフト状況に戻されます。 • 削除：デマンドレコードが削除されます。
承認済み	デマンドが承認されています レコードをレビューまたは編集した後、次のいずれかのボタンをクリックします。 • 更新：デマンドレコードは更新されますが、デマンドは現在のステータスのままです。 • クローズ：デマンドが [クローズ済み] ステータスに移行します。 • 削除：デマンドレコードが削除されます。
完了	デマンドが [完了] ステータスに移行します。

これらの状況は、デマンドフォームの上部にあるプロセスフローインジケーターに表示されます。プロセスフローインジケーター：

- デマンドの現在のステータスを強調表示します。
- デマンドが経由した状況にチェックマークを付けます。
- スキップされた状況は空白のままになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、デマンドは [承認済み] ステータスです。[ドラフト]、[送信済み]、および [認定済み] 状況を経由しましたが、[スクリーニング] ステータスはスキップされています。



デマンドの評価

デマンド管理アプリケーションには、意思決定者がデマンドを評価する際に役立つ 2 つのデマンド視覚化ツールが付属しています。


デマンドワークベンチは、デマンドを評価および承認し、プロジェクト、拡張、変更、または欠陥を作成するための単一のエンゲージメントの視点を提供します。このページでは、インタラクティブなバブルチャートや現在のデマンドのリストを表示する詳細エリアなど、デマンド情報の複数のビューが組み合わされています。デマンドロードマップは、組織の経時的なデマンドを視覚的に表現したものです。

デマンドワークベンチの使用

バブルチャートは、リスク、価値、サイズの 3 つのカテゴリに基づいて複数のデマンドをプロットするグラフです。各デマンドは、バブルチャート上で、これらのカテゴリの平均スコアに応じたサイズと色の円で表されます。デマンドワークベンチのバブルチャートには、認定済みのすべてのデマンドが表示され、デマンドが作成および評価されると動的に更新されます。このチャートは、デマンドマネージャー、ステークホルダー、意思決定者が視覚的にデマンドを評価して比較するための便利なツールになります。

デマンドワークベンチのリストビューには、バブルチャートに表示されている認定済みのデマンドのリストが表示されます。このリストからデマンドを選択すると、バブルチャートでデマンドが強調表示され、デマンドフォームが表示されます。リストビューは、ライブフィードにもデータ連携されているため、ユーザーはデマンドの現在のアクティビティを確認できます。

デマンドワークベンチにアクセスするには、次の場所に移動します: デマンド > デマンド > ワークベンチ.

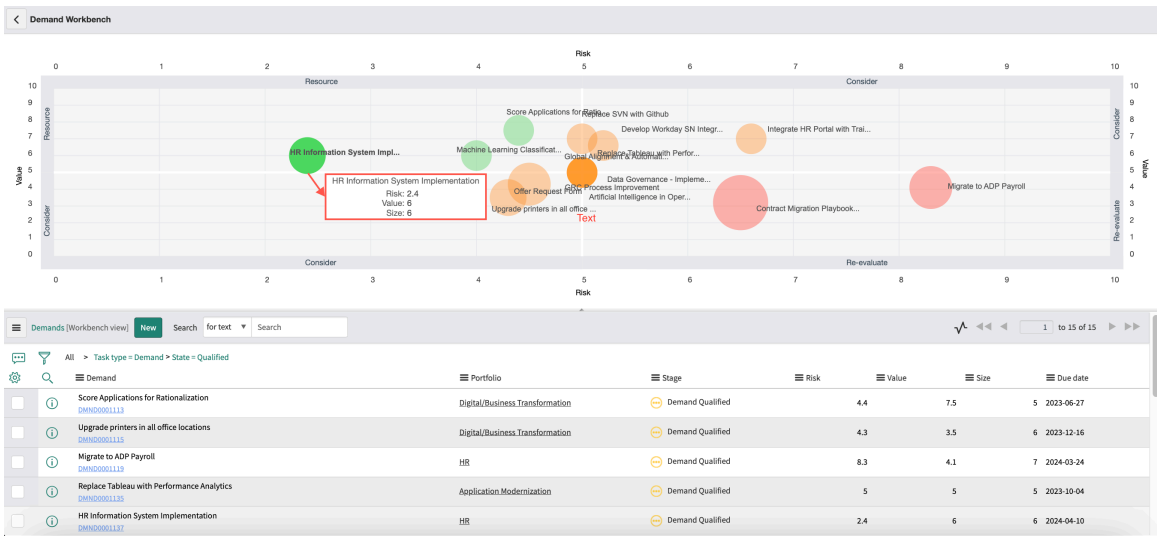

ロードマップの使用

ロードマップは、現在アクティブなステータスのすべてのデマンドを表示するインタラクティブな視覚化ツールです。バックログの外観は、[設定] ペインを使用して変更できます。[設定] ペインでは、2 次元 (2D) ビューと 3 次元 (3D) ビューを切り替えたり、ポートフォリオでデマンドをフィル

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

タリングしたり、リストビューでデマンドを開いたりすることができます。リストビューでは、パネルの色を再アサインしたり、フィルターを作成してレーンとパネルに使用するレコードを制限したり、ソートを適用したりすることができます。ロードマップを使用するには、次に移動します: デマンド > ロードマップ.

デマンドを作成

デマンドを作成して、戦略的および運用上のデマンドをキャプチャします。

始める前に
必要なロール：demand_manager、demand_user

このタスクについて
デマンドマネージャーは、デマンドワークベンチからデマンドを作成することもできます。デマンドワークベンチから作成されたデマンドは、認定済みステータスで作成されます。

PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインを有効化し、デマンド通貨ビューが有効化されている状態でデマンドを作成すると、[財務] タブのフィールドはデフォルトビューとは異なるものになります。デマンド通貨ビューでのみ利用可能なフィールドの詳細については、「デマンド管理 における複数通貨」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > 新規作成.
   または、次からデマンドを作成することもできます。 セルフサービス > デマンド > 新規作成.
2. デマンドフォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「デマンドフォーム」を参照してください。
3. [保存] をクリックします。

> **注:**
> 要求者または協力者は、デマンドが [ドラフト] ステータスであれば、デマンドを編集できます。

次のタスク
次の関連リンクとリストを使用します。

デマンドフォーム関連リンク

関連リンク	説明
資金を割り当て	デマンドが複数年にわたる大規模な投資である場合は、それを承認済みのデマンドとして使用し、そのデマンドから 1 つ以上のプロジェクト、エピック、またはプログラムに直接資金を提供します。 このリンクは、投資枠管理プラグインが有効化されていて、かつ、このデマンドに対応する既存の投資レコード、および Investment_user ロールがある場合にのみ表示されます。
デマンド予算を作成	デマンドに予算を割り当てできます。
ベースラインの作成	デマンドのベースラインを作成できます。ベースラインは、デマンドの現在の財務計画のスナップショットであり、コストおよび利益計画は含まれていますが、実績は含まれていません。
プロジェクト作成	このリンクは、[カテゴリ] フィールドが [戦略的] に設定されていて、かつ [タイプ] フィールドが [プロジェクト] に設定されている場合に表示されます。このデマンドのプロジェクトレコードを作成する

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

デマンドフォーム関連リンク (続く)

関連リンク	説明
	には、このリンクをクリックします。プロジェクトレコードの番号が [プロジェクト] フィールドに表示されます。
拡張を作成	このリンクは、[カテゴリ] フィールドが [戦略的] に設定されていて、かつ [タイプ] フィールドが [拡張] に設定されている場合に表示されます。このデマンドの拡張レコードを作成するには、このリンクをクリックします。拡張レコードの番号が [拡張] フィールドに表示されます。
ストーリーの作成	このリンクは、[カテゴリ] フィールドが [戦略的] に設定されていて、かつ [タイプ] フィールドが [ストーリー] に設定されている場合に表示されます。このデマンドのストーリーレコードを作成するには、このリンクをクリックします。アジャイル開発 2.0 ストーリーフォームに [デマンド] 参照フィールドが作成されます。
エピックの作成	このリンクは、[カテゴリ] フィールドが [戦略的] に設定されていて、かつ [タイプ] フィールドが [エピック] に設定されている場合に表示されます。このデマンドのエピックレコードを作成するには、このリンクをクリックします。アジャイル開発 2.0 エピックフォームに [デマンド] 参照フィールドが作成されます。
SAFe ストーリーの作成	このリンクは、[カテゴリ] フィールドが [戦略的] に設定されていて、かつ [タイプ] フィールドが **[SAFe** ストーリー] に設定されている場合に表示されます。このデマンドの SAFe ストーリーレコードを作成するには、このリンクをクリックします。SAFe ストーリーフォームに [デマンド] 参照フィールドが作成されます。 **注:** SAFe ストーリーを作成するには、safe_art_user ロールが必要です。
SAFe 機能の作成	このリンクは、[カテゴリ] フィールドが [戦略的] に設定されていて、かつ [タイプ] フィールドが **[SAFe** 機能] に設定されている場合に表示されます。このデマンドの SAFe 機能レコードを作成するには、このリンクをクリックします。SAFe 機能フォームに [デマンド] 参照フィールドが作成されます。 **注:** SAFe 機能を作成するには、safe_art_user ロールが必要です。
SAFe エピックを作成	このリンクは、[カテゴリ] フィールドが [戦略的] に設定されていて、かつ [タイプ] フィールドが **[SAFe** エピック] に設定されている場合に表示されます。このデマンドの SAFe エピックレコードを作成するには、このリンクをクリックします。SAFe エピックフォームに [デマンド] 参照フィールドが作成されます。 **注:** SAFe エピックを作成するには、safe_art_user ロールが必要です。
変更要求を作成	このリンクは、[カテゴリ] フィールドが [運用 **(Operational)]** に設定されていて、かつ [タイプ] フィールドが [変更] に設定されている場合に表示されます。このデマンドの変更レコードを作成するには、こ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォーム関連リンク (続く)

関連リンク	説明
	のリンクをクリックします。変更レコードの番号が [変更] フィールドに表示されます。
欠陥を作成	このリンクは、[カテゴリ] フィールドが [運用 **(Operational)]** に設定されていて、かつ [タイプ] フィールドが [欠陥] に設定されている場合に表示されます。このデマンドの欠陥レコードを作成するには、このリンクをクリックします。欠陥レコードの番号が [欠陥] フィールドに表示されます。
RIDAC を表示	デマンドのリスク (Risks)、問題 (Issues)、意思決定 (Decisions)、アクション (Actions)、および変更要求 (request Changes) (これらをまとめて RIDAC) のエントリーを表示します。詳細については、「デマンドの RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードエントリー」を参照してください。 **注:** このリンクには、変換された RIDAC エンティティのみが表示されます。たとえば、リスクは、問題、意思決定、アクション、および変更要求に変換されます。
戦略と目標の割り当てを再計算	[戦略] タブと [目標割り当て] タブでコストフィールド値を再計算して更新します。デマンドの戦略と目標の割り当てが変更されたときに、このリンクを使用して、デマンドの総コストと利益を更新します。詳細については、「PPM 向け戦略的支出トラッキング」を参照してください。 **注:** この関連リンクは、PPM 向け戦略的支出トラッキング がインストールされている場合にのみ使用できます。この関連リンクを表示するには、戦略的配置ビューに切り替える必要があります。使用しているフォームビューでこの関連リンクが利用できない場合は、アドミニストレーターに対して、デマンドフォームを構成してこの関連リンクを追加するように依頼してください。

デマンドフォーム関連リスト

関連リスト	説明
デマンドタスク	デマンドに対して作成されたタスクを一覧表示します。 新しいデマンドタスクを作成するには、[新規] をクリックします。 既存のデマンドタスクを変更するには、[編集] をクリックします。
ステークホルダー	デマンドのステークホルダーを一覧表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォーム関連リスト (続く)

関連リスト	説明
	新しいステークホルダーを作成するには、[新規] をクリックします。 既存のステークホルダーをデマンドに追加するには、[編集] をクリックします。 **注:** デマンドに関連付けられたポートフォリオにステークホルダーが存在する場合は、ポートフォリオのステークホルダーがデマンドに自動的に追加されます。
要件	デマンドの要件を一覧表示します。 新しい要件を作成するには、[新規] をクリックします。
リスク	デマンドのリスクを一覧表示します。 新しいリスクを作成するには、[新規] をクリックします。詳細については、「デマンドにリスクを追加する」を参照してください。 デマンドリスクが親プログラムとポートフォリオに追加されます。
問題	デマンドに含まれている問題を一覧表示します。 新しい問題を作成するには、[新規] をクリックします。詳細については、「デマンドに問題を追加する」を参照してください。
決定	デマンドの意思決定を一覧表示します。 新しい意思決定を作成するには、[新規] をクリックします。詳細については、「デマンドに意思決定を追加する」を参照してください。
アクション	デマンドに対して識別されたアクションアイテムを一覧表示します。 新しいアクションを作成するには、[新規] をクリックします。詳細については、「デマンドにアクションを追加する」を参照してください。
変更を要求	現在のデマンドのリソース、スコープ、コスト、およびスケジュールに関連する変更を一覧表示します。 新しいデマンド変更要求を作成するには、[新規] をクリックします。詳細については、「変更

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォーム関連リスト (続く)

関連リスト	説明
	要求をデマンドに追加する」を参照してください。
リソースのアサイン	デマンドのリソースアサインを一覧表示します。 リソースのアサインを作成するには、 新規 を選択します。
コスト計画	デマンドのコスト計画を一覧表示します。 新しいコスト計画を作成するには [新規] を、既存の計画を変更するには [管理] をクリックします。 デマンドコスト計画が親プログラムとポートフォリオに追加されます。 デマンドコスト計画の会計期間のコスト概算と実績コストを詳細なレベルで指定するコスト計画ブレークダウンは、プロジェクト通貨で再計算されます。同様に、デマンド利益計画の計画利益と実績利益の推定ブレークダウン金額がプロジェクト通貨で再計算されます。その後、プロジェクト通貨金額は、コスト計画、利益計画、およびプロジェクトレコードにロールアップされます。
利益計画	デマンドの利益計画を一覧表示します。 新しい利益計画を作成するには [新規] を、既存の計画を変更するには [管理] をクリックします。
デマンド予算	デマンド予算を会計年度別に一覧表示します。リスト内の金額をクリックして金額を修正します。
ストーリー	デマンドのストーリーを一覧表示します。 新しいストーリーを作成するには、[新規] をクリックします。 既存のストーリーを追加または変更するには、[編集] をクリックします。 **注:** 関連リストは、次の場合にのみ使用できます。 アジャイル開発 2.0 プラグインがインストール済みです。
アセスメントインスタンス	このデマンドのアセスメントインスタンス。詳細については、「アセスメントインスタンスの表示」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォーム関連リスト (続く)

関連リスト	説明
アセスメント結果	ステークホルダーがこのデマンドに対して送信したアセスメントの結果。
経費ライン	経費ラインはデマンドコスト計画の一部であり、特定のリソースに関連付けられたコストを格納します。経費ラインを作成するには、「デマンドの経費ラインを作成する」を参照してください。
戦略割り当て	デマンドに関連する戦略の達成に向けて割り当てられた、デマンドの総コストと利益の割合を一覧表示します。詳細については、「デマンドに対する戦略および目標の割合の割り当てまたは変更」を参照してください。 **注:** この関連リストは、PPM 向け戦略的支出トラッキング がインストールされている場合にのみ表示されます。このアプリケーションは ServiceNow Store で利用できます。この関連リストを表示するには、[戦略的配置] ビューに切り替える必要があります。使用しているフォームビューでこの関連リストが利用できない場合は、アドミニストレーターに、デマンドフォームを構成して関連リストを追加するように依頼してください。詳細については、「PPM 向け戦略的支出トラッキング のインストール」を参照してください。
目標割り当て	デマンドに関連する戦略の達成に向けて割り当てられた、デマンドの総コストと利益の割合を一覧表示します。詳細については、「デマンドに対する戦略および目標の割合の割り当てまたは変更」を参照してください。 **注:** この関連リストは、PPM 向け戦略的支出トラッキング がインストールされている場合にのみ表示されます。このアプリケーションは ServiceNow Store で利用できます。この関連リストを表示するには、[戦略的配置] ビューに切り替える必要があります。使用しているフォームビューでこの関連リストが利用できない場合は、アドミニストレーターに、デマンドフォームを構成して関連リストを追加するように依頼してください。詳細については、「PPM 向け戦略的支出トラッキング のインストール」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

新しい認定済みデマンドを作成

デマンドマネージャーは、デマンドワークベンチのリストビューから新しい認定済みデマンドを作成することもできます。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて
デマンドを保存すると、それが [デマンド] リストに追加され、バブルチャートにデマンドを表すバブルが追加されます。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > ワークベンチ.
2. リストビューの上部にある [新規] をクリックします。
3. デマンドフォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「デマンドを作成」を参照してください。

デマンドタスクを作成

デマンドのタスクを作成し、コスト、作業量、リスク、利益アセスメントといったアクティビティを委任します。リソースまたはグループをデマンドタスクにアサインして、指定されたアクティビティの実行に費やされた実際の時間と作業量を追跡します。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて
プロジェクト、変更、欠陥、拡張などのターゲット作業エンティティではなく、デマンドの作業を計画するためのデマンドタスクを作成します。詳細については、「デマンドタスク」を参照してください。

- 予定日、実際の日付、および元の日付は、デマンドタスクではなくプロジェクトタスクの一部です。
- 期日は、タスク完了のターゲット日付を示すもので、デマンドワークフローには影響しません。ただし、プロジェクトタスクでは、予定日および実際の日付が変更された場合、プロジェクトの完了日に影響します。
- ネストされたデマンドタスクの作成はサポートされていません。
- [すぐに開始] や [特定の日に開始] の設定などのタスク制約はサポートされていません。
- アジャイル、ウォーターフォール、ハイブリッドなどの実行タイプはサポートされていません。
- [アサイン先] フィールド、[他の受託者] リスト、および [アサイン先グループ] フィールドを使用して、デマンドタスクにリソースをアサインします。

デマンドタスクにアサインされたリソースは、タイムカードを使用してタスクに費やした時間を送信できます。

PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインを有効化し、デマンド通貨ビューが有効化されている状態でデマンドタスクを作成すると、デフォルトビューに加えて、追加のフィールドが使用可能になります。デマンド通貨ビューでのみ利用可能なフィールドの詳細については、「デマンド管理 における複数通貨」および「デマンド関連フォームの複数通貨フィールド」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. タスクの追加先のデマンドを選択します。
3. [デマンドタスク] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. デマンドタスクフォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「デマンドタスクフォーム」を参照してください。
5. **[Save** (保存)] をクリックします。
   デマンドタスクの作業が完了したら、[更新] を選択してデマンドページに戻ります。

次のタスク
ロールに応じて、コスト計画、リソース計画、利益計画、およびリスクをデマンドに追加します。これらのタスクにアクセスするには、次の関連リンクを使用します。

デマンドタスクフォームの関連リンク

関連リンク	説明
需要に原価計画を追加	デマンドのコストをキャプチャするためにコスト計画を追加します。コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。このリンクは、[カテゴリ] 値が [推定コスト] に設定されていて、かつユーザーが it_project_manager または it_demand_manager ロールを持っている場合に表示されます。リンクをクリックしてコスト計画フォームを開き、詳細を入力します。詳細については、「コスト計画の作成」を参照してください。
デマンドにリソースプランを追加	リソース計画を作成して、リソースの利用可能性を検索し、リソース計画をデマンドに追加します。このリンクは、[カテゴリ] 値が [予定作業量] に設定されていて、かつユーザーが it_resource_user ロールを持っている場合に表示されます。リンクをクリックして、リソース計画ページに移動し、リソースを要求します。詳細については、「デマンドのリソースのアサインの作成と管理」を参照してください。
デマンドに利益計画を追加	デマンドの実行時にデマンドによって発生する潜在的な利益をキャプチャするために、利益計画を作成します。このリンクは、[カテゴリ] 値が [利益概算(Benefit estimate)] に設定されていて、かつユーザーが it_project_manager または it_demand_manager ロールを持っている場合に表示されます。リンクをクリックして、[利益計画] フォームを開き、詳細を入力します。詳細については、「デマンドの金銭的利益計画の作成」を参照してください。
デマンドにリスクを追加	デマンドの実行の成功または結果に影響を与える可能性があるリスクを追加します。このリンクは、[カテゴリ] 値が [リスク推定 (Risk estimate)] に設定されていて、かつユーザーが it_project_manager または

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドタスクフォームの関連リンク (続く)

関連リンク	説明
	it_demand_manager ロールを持っている場合に表示されます。リンクをクリックして、リスクフォームを開き、詳細を入力します。詳細については、「リスクの追加」を参照してください。

デマンドタスクのタイムカードの送信

デマンドタスクにアサインされたリソースは、デマンドタスクに費やされた時間を記録するタイムカードまたはタイムシートを作成して送信します。報告された時間は、デマンドタスクの実績コストと作業量の計算に使用されます。

始める前に

必要なロール：timecard_user

このタスクについて

リソースは、デマンドタスクで実行された作業を記録および追跡するために、タイムカードまたはタイムシートを送信します。その後、適切な承認者が、送信されたタイムカードまたはタイムシートを承認する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > タイムシートポータル.
2. タイムカードを作成します。
3. デマンドタスクの作業に費やした各日の時間を入力します。
4. [送信] をクリックします。

デマンドからアーティファクトを作成する

デマンドから作業アイテムなどのアーティファクトを作成し、これらのアーティファクトに対し、選択した方法で作業を開始できるようにします。

始める前に

- デマンドを作成します。
- デマンドを拡張または欠陥に変換するには、Project Portfolio Suite プラグインを有効化します。
- デマンドを アジャイル開発 エンティティ (ストーリーまたはエピック) に変換するには、Agile Development 2.0 プラグインを有効化します。
- デマンドを SAFe エンティティ (ストーリー、機能、またはエピック) に変換するには、Essential SAFe または Portfolio SAFe プラグインを有効化します。

必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて

デマンドを作成するときは、そのデマンドのカテゴリとタイプを指定します。[カテゴリ] フィールドと [タイプ] フィールドでの選択で、デマンドから作成できるアーティファクトが決まります。使用可能なアーティファクトタイプは、プロジェクト、拡張、変更、欠陥、またはスクラムと、SAFe エンティティ (エピック、ストーリー、機能など) です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 以下のいずれかのオプションを使用して、デマンドに移動します。
   - すべて > デマンド > デマンド > すべて
   - 投資枠管理プラグインをアクティブ化した場合は、次に移動します: デマンド (投資要求) > デマンド (投資要求) > すべて
2. アーティファクトに変換するデマンドを開きます。
3. [カテゴリ] リストからカテゴリを選択します。
4. [タイプ] リストから、アーティファクトタイプを選択します。
   [タイプ] リストのオプションは、選択したカテゴリに応じて変わります。詳細については、「デマンドフォーム」を参照してください。
5. **[Update** (更新)] をクリックします。
6. 関連リンクをクリックしてアーティファクトを作成します。
   [カテゴリ] リストと [タイプ] リストから選択した値に応じて、次のいずれかの関連リンクが表示されます。

デマンドの金銭的利益計画の作成

デマンド利益計画は、デマンドの実行時にデマンドによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。金銭的利益計画を作成して、会計期間のカテゴリの推定利益を指定します。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて
利益計画を保存すると、金銭的利益計画ブレークダウンレコードが自動的に作成されます。金銭的利益計画ブレークダウンレコードは、特定の会計期間 (FY16 の 4 月および FY16 の 5 月など) の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定します。[金銭的利益計画ブレークダウン] 関連リストには、デマンドの各会計期間における推定利益と実績利益の集計利益が表示されます。

注:
デマンドをプロジェクトに変換すると、利益計画がデマンドからターゲットプロジェクトに転送されます。

PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインを有効化し、デマンド通貨ビューが有効化されている状態でデマンドの利益計画を作成している場合、[財務] セクションのフィールドはデフォルトビューとは異なります。デマンド通貨ビューでのみ利用可能なフィールドの詳細については、「デマンド関連フォームの複数通貨フィールド」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 必要なデマンドフォームを開きます。
3. [金銭的な利益計画] 関連リストをクリックします。
4. 金銭的な利益計画を作成するには、[新規] をクリックします。

   注:
   [財務概要] ページから金銭的利益計画を作成するには、[管理] をクリックします。

5. [利益計画] フォームのフィールドに入力します。

   フィールド名の説明については、「[利益計画] フォーム」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

> **注:**
> デマンドの日付を移動すると、利益計画がデマンドの開始日、または終了日に関連付けられているかどうかに応じて、関連する利益計画も変更されます。プロジェクトプロパティの [デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更に基づきリソースプラン、コスト計画、および利益計画の開始日を変更します] が、デマンドの日付変更の動作を制御します。

6. [送信] をクリックします。

次のタスク
[利益計画] フォームの [金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdowns)] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。

デマンドの金銭的利益計画ブレークダウンの更新

特定の会計期間の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定する、金銭的利益計画明細レコードを更新します。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

手順
1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 必要なデマンドを開きます。
3. [金銭的な利益計画] 関連リストをクリックします。
4. 必要な金銭的利益計画を開きます。
5. [金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdowns)] 関連リストで、金銭的利益計画ブレークダウンの情報アイコン (ⓘ) をクリックします。
6. [レコードを開く] をクリックします。
7. 金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdown) フォームで、有効なフィールドを表示して更新します。
   フィールド名の説明については、「[金銭的利益ブレークダウン (Monetary Benefit Breakdown)] フォーム」を参照してください。
8. [更新] をクリックします。

デマンドの金銭以外の利益計画の作成

金銭以外の利益計画を作成して、会計期間のカテゴリの推定利益を指定します。デマンド利益計画は、デマンドの実行時にデマンドによって発生する潜在的な金銭以外の利益をキャプチャします。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて
[ブレークダウンタイプ] フィールドで [自動] または [手動] を選択して利益計画を保存すると、金銭以外の利益計画ブレークダウンレコードが自動的に作成されます。金銭以外の利益計画ブレークダウンレコードは、特定の会計期間 (FY16 の 4 月および FY16 の 5 月など) の財務以外の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定します。[金銭以外の利益計画ブレークダウン] 関連リストには、デマンドの各会計期間における財務以外の推定利益と実績利益の集計利益が表示されます。

> **注:**
> デマンドをプロジェクトに変換すると、利益計画がデマンドからターゲットプロジェクトに転送されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 必要なデマンドフォームを開きます。
3. [金銭以外の利益計画] 関連リストをクリックします。
4. 金銭以外の利益計画を作成するには、[新規] をクリックします。
5. フォームのフィールドに入力します。

   フィールド名の説明については、「[金銭以外の利益計画] フォーム」を参照してください。

   注:
   デマンドの日付を移動すると、利益計画がデマンドの開始日、または終了日に関連付けられているかどうかに応じて、関連する利益計画も変更されます。プロジェクトプロパティの [デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更に基づきリソースプラン、コスト計画、および利益計画の開始日を変更します] が、デマンドの日付変更の動作を制御します。

6. [送信] をクリックします。

次のタスク

- 利益計画フォームの [金銭以外の利益計画ブレークダウン] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。
- 金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を関連付けて、ハイブリッド利益計画のデマンドによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。

デマンドの金銭以外の利益計画ブレークダウンの更新

特定の会計期間の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定する、金銭以外の利益計画ブレークダウンレコードを更新します。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 必要なデマンドを開きます。
3. [金銭以外の利益計画] 関連リストを選択します。
4. 必要な金銭以外の利益計画を開きます。
5. [金銭以外の利益計画明細] 関連リストで、金銭以外の利益計画明細の情報アイコン (ⓘ) を選択します。
6. [レコードを開く] を選択します。
7. 金銭以外の利益計画ブレークダウンフォームで、有効なフィールドを表示して更新します。
   フィールドの詳細な説明については、「[金銭以外の利益計画明細] フォーム」を参照してください。
8. [更新] を選択します。

金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連付け

金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を関連付けて、デマンドによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて
金銭的利益計画を金銭以外の利益計画に関連付けることも、その逆も可能です。

注:
利益計画を削除すると、関連する利益計画 (存在する場合) との関係も削除されます。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 必要なデマンドフォームを開きます。
3. [金銭的な利益計画] または [金銭以外の利益計画] 関連リストをクリックします。
4. 関連付ける利益計画の情報アイコン ( ) をクリックします。
5. [レコードを開く] をクリックします。
6. 金銭的利益計画または金銭以外の利益計画を関連付けます。
7. [保存] をクリックします。

タスクの結果
選択した利益計画は別の計画に関連付けられます。

次のタスク
[関連する利益計画を表示] 関連リンクをクリックして、関連付けられている利益計画を表示します。

デマンドコスト計画を作成する

デマンドコスト計画は、デマンドのコストをキャプチャします。コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて
コスト計画を保存すると、アプリケーションによってコスト計画ブレークダウンレコードが自動的に作成されます。コスト計画ブレークダウンは、特定の会計期間 (FY16: M04 および FY16: M05 など) の推定コストと実績コスト、および予算を詳細なレベルで指定するレコードです。

複数の通貨を使用する場合は、別の通貨の新しいコスト計画を作成します。

PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインを有効化し、デマンド通貨ビューが有効化されている状態でデマンドの利益計画を作成している場合、[財務] セクションのフィールドはデフォルトビューとは異なります。デマンド通貨ビューでのみ利用可能なフィールドの詳細については、「デマンド関連フォームの複数通貨フィールド」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて をクリックし、必要なデマンドフォームを開きます。
2. 関連リンクで、[コスト計画] をクリックします。
3. [財務概要] ページをグリッドで表示するには、[管理] をクリックします。
4. コスト計画を作成するには、[新規] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [コスト計画] フォームのフィールドに入力します。

フィールド名の説明については、「[コスト計画] フォーム」を参照してください。

> **注:**
> デマンドの開始予定日を変更すると、関連するコスト計画とリソースのアサインも変更されます。プロジェクトプロパティの [デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更でリソースプランとコスト計画の開始日を変更 **(Change Resource Plan and Cost Plan Start Date with Demand or Project Start Date Change)]** が、デマンドの開始日変更の動作を制御します。

6. [送信] をクリックします。

次のタスク

- デマンドフォームの [コストブレークダウン] 関連リストで、会計期間別のブレークダウンを表示します。
- [予測] フィールドの値を再計算するには、[予測金額を計算] 関連リンクを使用します。

コストおよび金銭的利益計画の財務概要を表示する

デマンドのコストと利益のコンポーネントのブレークダウンを表示して、デマンドの財務を追跡します。財務概要を使用すると、デマンドの進捗状況を評価し、財務的な変化と一定期間にわたるデマンドへの影響を追跡できます。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて
[財務概要] タブを使用して、デマンドのコストコンポーネントの詳細なブレークダウンを表示します。合計計画コスト、予算コスト、実績コスト、および予定リターンとそれらのブレークダウンは、読み取り専用カードの形式で表示されます。コスト計画、利益計画、およびそれらのブレークダウンは、編集可能なグリッドビューで提供されます。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.

2. デマンドを開きます。

3. デマンドフォームで、[コスト計画] または [利益計画] 関連リストを選択します。

4. [管理] を選択します。

5. オプション: フィールドの追加、計画詳細の表示、財務データの再編成が可能です。

デマンドの経費ラインを作成する

デマンド経費ラインは、ユーザー、固定資産、CI などの特定のソースに関連付けられたコストです。経費ラインはデマンドコスト計画の一部です。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager
必要なアプリケーション：プロジェクトポートフォリオ管理 with Financials

このタスクについて
デマンドに対しては、処理済みの経費ラインのみが考慮されます。プロジェクトまたはデマンドに対して複数の経費ラインを作成できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドの経費ラインは、デマンドの評価中にのみ発生した経費を記録するために使用されます。オンデマンドで経費ラインをコスト計画に関連付けることはできません。デマンドに関連付けられた経費ラインから発生した実績コストは、[デマンドの実績コスト] フィールドにロールアップされます。

デマンドがプロジェクトに変換されると、経費ラインはデマンドに残ります。一方、コスト計画と予算はプロジェクトに移動します。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて をクリックし、デマンドフォームを開きます。
2. [経費ライン] 関連リストで、[新規] をクリックします。
3. [経費ライン] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「経費ラインフォーム」を参照してください。
4. **[Submit** (送信)] を選択する

デマンドのリソースのアサインの作成と管理

リソース要求者は、リソースの可用性を確認し、デマンドのリソースのアサインを作成および管理します。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 必要なデマンドフォームを開きます。
3. [リソースのアサイン] 関連リストを選択し、[新規] を選択します。
4. [リソースのアサインの新規レコード (Resource assignment new record)] フォームで、フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[新しいリソースのアサイン (New Resource Assignment)] フォーム」を参照してください。
5. [送信] を選択します。

デマンドのリソースアサインのコストを再計算する

計画のコストを最新の状態に保つために、関連付けられたレートモデルで時間単価が変更されるたびに、デマンドのすべてのアクティブなリソースのアサインのコストを再計算します。

始める前に
次のセットアップを確認してください。

- デマンドはアクティブである必要があります。
- デマンドには、アクティブなレートモデルがアサインされている必要があります。

必要なロール：demand_manager

このタスクについて
このオプションは、デマンドのすべてのリソースアサインのコストを一度に再計算します。[リソースのアサイン] 関連リストからリソースのアサインを開いて、 個々のリソースアサインのリソースコストを再計算することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. デマンドを開きます。
3. デマンドフォームでヘッダーバーを右クリックし、[リソースコストを再計算] オプションを選択します。
4. [リソースコストを再計算] フォームの各フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[リソースコストを再計算] フォーム」を参照してください。
5. **[OK]** をクリックします。

タスクの結果

- デマンド内の適用可能なすべてのリソースアサインについて、選択されたリソースコストを最新の時間単価に基づいて再計算します。時間単価は、デマンドに関連付けられたレートモデルから導出されます。
- リソースのアサインフォームおよび [リソースのアサイン] 関連リストのそれぞれのコストフィールドで再計算されたリソースコストを更新します。
- 変更された値をデマンドのそれぞれのコストフィールドに反映します。

人件費の生成

人件費を生成し、リソースのアサインとコスト計画を使用してリソースの経費を表示します。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [デマンドおよびプロジェクトの人件費の生成 **(Generate labor costs for demands and projects)]** スケジュール済みジョブを開きます。
3. [アクティブ] を選択し、[スケジュール済みスクリプト実行] フォームでフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[スケジュール済みスクリプト実行] フォーム」を参照してください。
4. [更新] を選択します。

> **ヒント:**
> または、アドミンは、スケジュール済みジョブをアクティブ化して定義し、必要な頻度で人件費を生成することもできます。スケジュール済みジョブをアクティブ化する方法の詳細については、「 人件費を生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。

ネクストエクスペリエンスへのアクティブなデマンドの予算の移行

デマンド予算をネクストエクスペリエンスに移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 次のオプションのいずれかを使用してベースラインを移行します。

> **注:**
> 移行後は、クラシック UI で予算を表示することはできません。ネクストエクスペリエンスの財務を使用して予算を管理することをお勧めします。

デマンドの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行する

デマンドの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。


このタスクについて
ネクストエクスペリエンスでは、財務ベースラインをキャプチャするために使用される投資ベースライン (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) と投資ベースラインヘッダー (sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header) の 2 つの新しいテーブルを持つ新しいデータモデルを使用します。クラシックエクスペリエンスでデマンドに対して作成された財務ベースラインは、ネクストエクスペリエンスには表示されません。既存のベースラインは、クラシックからネクストエクスペリエンスに、必要なデマンドのオンデマンドアクティビティとして移行することも、またはスケジュール済みジョブをアクティブ化して実行することで一括で移行することもできます。

ネクストエクスペリエンスのベースラインビューは、デマンドの財務パフォーマンスを表示および分析するためのより優れたインサイトを提供します。

ネクストエクスペリエンスを使用して作成された財務ベースラインとは異なり、クラシック UI で作成された財務ベースラインは、デフォルトの動作として計画コストとともに実際の経費をキャプチャしません。ベースライン比較に関連する情報を取得するために、実績コストは、財務ベースラインのベースライン作成日時点の処理された経費ラインを使用して、ベースライン移行の一部としてキャプチャされます。

ネクストエクスペリエンスでの財務の使用に関する詳細とユースケースについては、「での計画立案アイテムの財務管理 ポートフォリオ計画」を参照してください。

> **注:**
> 財務ベースラインの移行は、複数通貨を使用するデマンドまたはプロジェクトには適用されません。

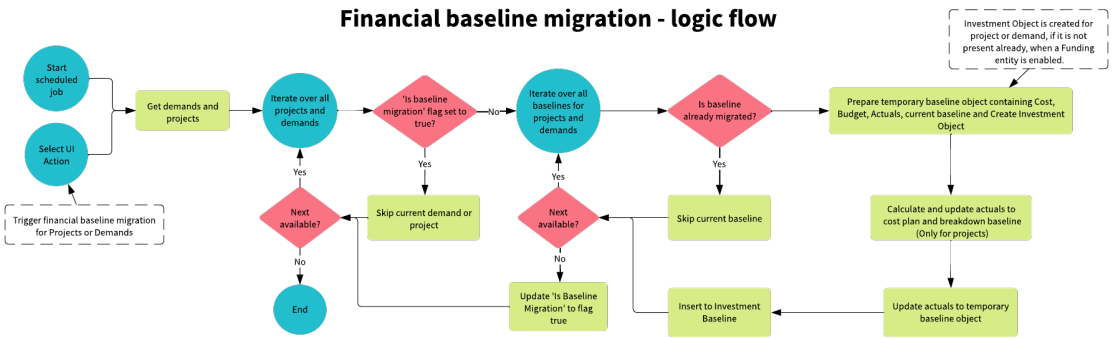

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 次のオプションのいずれかを使用してベースラインを移行します。

   ヒント:
   移行後は、ネクストエクスペリエンスの財務を使用して財務ベースラインを作成することをお勧めします。

タスクの結果
選択したデマンドの財務ベースラインはネクストエクスペリエンスに移行され、ベースラインビューで表示できるようになります。

次のタスク

移行されたベースラインを表示して、既存のベースラインまたは現在のベースライン ( ) と比較します。

デマンドに予算を割り当てる

会計年度に応じて、デマンドの予算を設定します。

始める前に
必要なロール：portfolio_manager

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて をクリックし、デマンドフォームを開きます。
2. 関連リンクで、[デマンド予算] をクリックします。
   [デマンド予算] ダイアログボックスが開きます。
3. デマンドの予算を設定する会計年度を選択します。

   ヒント:
   投資予算を使用して、会計期間レベルで無駄のない予算を割り当てることができます。詳細については、「デマンドに対して無駄のない予算業務を有効にする」を参照してください。

4. [投資予算] および [経費予算] の金額を入力します。
   [予算合計] は、投資と経費の合計金額で更新されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. **[OK]** をクリックします。

注:

- デマンドにコスト計画、開始日、期日がない場合、デマンド予算は今月からデマンド予算会計年度の終わりまで配分されます。
- デマンドにコスト計画と期日がなく、開始日はある場合、デマンド予算は次のいずれかで配分されます。
  - 開始日 (開始日が所定の予算会計年度に該当する場合) からデマンド予算会計年度の終わりまで。
  - デマンド予算会計年度の開始からデマンド予算会計年度の終わりまで。
- デマンドにコスト計画と開始日がなく、期日はある場合、デマンド予算は次のいずれかで配分されます。
  - 期日までの当月 (期日が所定の予算会計年度に該当する場合)。
  - デマンド予算会計年度の終わりまでの当月。

デマンドにコスト計画が関連付けられている場合、デマンド予算は、コスト計画の会計期間に従って配分されます。

タスクの結果

選択した年のデマンド予算が、[デマンド予算] 関連リストに表示されます。リストで金額をクリックすると修正できます。

デマンドに対して無駄のない予算業務を有効にする


会計期間でデマンドに予算業務を割り当てるには、[投資予算] オプションを有効にします。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 必要なデマンドを開きます。
3. [他のアクション] を選択し、 構成 > 関連リスト.



4. [利用可能] 列から [投資予算] を選択し、[選択済み] 列に追加します。
5. **[Save** (保存)] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドの無駄のない予算業務の管理

従来のアプローチに関連する間接費を削減するために、会計年度全体ではなく各会計期間でデマンドに予算を割り当てます。

始める前に

- デマンドに対して無駄のない予算業務を有効にする
- 必要なロール:it_demand_manger

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 必要なデマンドを開きます。
3. [投資予算] 関連リストで、[新規] を選択します。
4. [投資予算] フォームのフィールドに入力します。
   フィールドとその説明の詳細については、「 [投資予算] フォーム」を参照してください。
5. [**Submit** (送信)] を選択します。

タスクの結果

会計期間に割り当てられた予算が [投資予算] 関連リストに表示されます。

デマンドのベースラインを作成する

財務ベースラインを作成します。財務ベースラインは、特定の時点における利益および財務メトリクス情報 (コスト計画、利益計画、およびデマンドレベルの財務メトリクスのスナップショット) をキャプチャします。

始める前に

必要なロール：it_demand_manager
財務ベースラインは必要な数だけ作成できます。また、前回のベースライン以降にデマンドに加えられた財務の変更をレビューすることができます。財務ベースラインは、デマンドの実績コストコンポーネントをキャプチャしません。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 必要なデマンドを選択します。
3. デマンドの財務ベースラインを作成するには、次のいずれかのオプションを使用します。

デマンドの財務ベースラインの比較

ベースラインを比較して、デマンドの財務データの差異をレビューし、何が変更されたかを確認できます。

始める前に

必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて

デマンドのライフサイクルのさまざまなステージで複数のベースラインを作成できます。たとえば、各フェーズの終わりや、各暦月または四半期の後に作成できます。各ベースラインは、特定の時点でのデマンドの財務データをキャプチャし、デマンドに加えられた変更を特定およびレビューするための基礎を提供します。複数のベースラインを用意して比較すると、デマンドのパフォーマンス追跡に役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効化されていて、かつデマンド通貨ビューが有効化されている状態でデマンドを作成している場合は、ベースラインのデマンドの財務詳細をデマンド通貨で表示して比較できます。デマンド通貨ビューでのみ利用可能なフィールドの詳細については、「デマンド管理 における複数通貨」を参照してください。

手順

1. デマンドの財務ベースラインを比較するには、次のいずれかのオプションを使用します。

2. 財務ベースラインフォームで、比較するベースラインを 2 つの選択リストから選択します。
   デフォルトでは、現在のベースラインと最新のベースラインが選択されます。
3. [比較] をクリックします。
   ベースラインの比較データは、次の 2 つのセクションに表示されます。
   - [財務ベースラインの概要 **(Financial Baseline Summary)]** セクションには 3 つのウィジェットが表示されます。最初の 2 つのウィジェットには 2 つのベースラインの財務データが含まれ、3 つ目のウィジェットにはその差異が含まれます。
   - [財務ベースラインの詳細] セクションには、2 つの異なるグリッドに 2 つのベースラインのコスト計画と利益計画が表示されます。各計画タイプには、各基本データに対応する 2 つの行があります。

     注:
     各ベースラインを表す行のカラーコードを表示するには、ベースライン凡例アイコン ( ) をクリックします。

4. オプション: フォームの [財務ベースラインの概要 **(Financial Baseline Summary)]** セクションでフィールドを追加するか、比較データを再編成します。
   - [財務ベースラインの概要 **(Financial Baseline Summary)]** セクションの表示を切り替えるには、折りたたみアイコン ( ) または展開アイコン ( ) をクリックします。
   - [財務ベースラインの概要 **(Financial Baseline Summary)]** セクションのウィジェットで他のフィールドを表示または非表示にするには、構成アイコン ( ) をクリックして、フィールド名を選択します。

     注:
     PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効化されている場合は、[デマンド通貨での計画コストの合計]、[デマンド通貨での経費予算]、[デマンド通貨での収支] などのフィールドをベースラインに追加できます。

     (Optional) 選択したフィールドの設定が保存され、財務ベースラインフォームを再度開くと利用できるようになります。

   - デフォルトのウィジェットレイアウトにリセットするには、[デフォルト値にリセット] をクリックします。
   - ベースラインの財務情報をデマンド通貨で表示するには、[デマンド通貨でウィジェットを表示] ボタンを切り替えます。

     注:
     このボタンは、PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効化されている場合にのみ利用可能です。

5. オプション: フォームの [財務ベースラインの詳細] セクションで、コスト計画および利益計画の財務データ詳細を表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- コスト計画または利益計画の比較データを年次、四半期ごと、または月次の形式で表示するには、それぞれ [年]、[四半期] または [月] ビューをクリックします。
- 会計年度の詳細を表示するには、 展開 アイコン ( ) または 折りたたみ アイコン ( ) をクリックします。

デマンドを表示

既存のデマンドはいつでも表示できます。

始める前に

必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて

デマンドマネージャーがデマンドからプロジェクトを作成すると、[プロジェクト] フィールドにプロジェクト名が表示されます。[リスク]、[値]、および [サイズ] フィールドには、デマンドのアセスメントメトリクスが表示されます。この情報は [デマンド] リストに表示されます。

注:
[デマンド] リストの [ステージ] 列は、検索もソートもできません。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用してデマンドを表示します。
   a. すべて > デマンド > ワークベンチ バブルチャートとデマンドワークベンチのリストビューには、すべての認定済みデマンドが表示されます。
   b. すべて > デマンド > デマンド > すべてデマンドリストを表示します。
   c. デマンドユーザーは、次の場所に移動してデマンドを表示できます すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. [デマンド] リストの [番号] フィールドをクリックして、デマンドフォームを表示します。
3. [ステージ] フィールドを使用して、デマンドのステータスを表示します。


   このフィールドは、デマンドが、アイデアからデマンド、最終的なプロジェクト、拡張、変更、または欠陥に至るまでのライフサイクルを経るごとに更新されます。ユーザーはこのフィールドを使用して、一目で、デマンドの進捗状況を追跡できます。
4. [デマンド] リストの [ステージ] フィールドをポイントして、アイデアの進捗と、その進捗に含まれる各ステップの [ステータス] フィールドの値を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アイデア：アイデアが評価されている場合は、ポップアップウィンドウにアイデアの現在のステータスが表示されます。
- デマンド：アイデアがデマンドに昇格された場合、ポップアップウィンドウにデマンドの現在のステータスとアイデアが表示されます。
- プロジェクト、拡張、変更、または 欠陥：デマンドが承認された場合、ポップアップウィンドウには、デマンドとアイデアに加え、最終的なアーティファクトの現在のステータスが表示されます。

[アイデアステージの概要 **(Idea Stage Summary)]** ポップアップウィンドウ



デマンドから作成されたアーティファクトを表示する

デマンドマネージャーは、デマンドから作成されたアーティファクトを表示できます。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

手順

1. 移動先 移動先 すべて > デマンド > デマンド > ワークベンチ.
2. 関連付けられたアーティファクトがあるバブルを右クリックします。
3. **[<アーティファクト>を表示 (View <artifact>)]** をクリックします。
   このアクションにより、選択したデマンドのアーティファクトフォームが新しいタブに表示されます。

デマンドサマリーを表示する

デマンドワークベンチのバブルチャートのバブルをポイントすると、デマンド情報のサマリーが表示されます。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

手順

1. バブルチャートでデマンドをポイントすると、バブルとそのラベルが強調表示されます。

   バブルサマリーウィンドウには、デマンド名、リスク、値、サイズのデータも表示されます。バブルをポイントすると、リストビューの対応するデマンド行も強調表示されます。リストビューでデマンドをポイントすると、バブルチャートの対応するバブルが強調表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

バブルサマリーウィンドウ



注:
バブルをポイントしているときに、リストビューを下方向にスクロールすると、対応するデマンド行が強調表示されます。必要に応じて、リストビューまたはバブルチャートの高さを調整します。

2. 複数のデマンドがある場合、一部のバブルまたはラベルが重なって見えにくくなります。

   ラベルをポイントすると、対応するバブルが強調表示されます。

   次の場合に使用します。

   - 2 つ以上のバブルが同じメトリクスを持ち、直接重なっている。
   - いくつものバブルが交差して重なり合っている。
   - バブルが、バブルチャートのエッジに部分的にしか表示されていない。

デマンドへの詳細の追加

デマンドマネージャーは通常、事業関係マネージャーと協力してステークホルダーを特定し、要件、リスク、およびその他の重要な情報を導き出します。

デマンド管理アプリケーションは、ステークホルダーの識別プロセスを簡素化します。サービスカタログまたはデマンド管理アプリケーションでデマンドフォームに入力する際に、ユーザーが選択したポートフォリオからステークホルダーのリストを自動入力します。デマンド管理アプリケーションでは、アセスメントを使用して情報収集プロセスの一部を自動化することもできます。

デマンドタスクの追加

デマンドマネージャーは、ビジネスデマンドを分析し、デマンドを承認して、プロジェクトと拡張を作成します。多くの場合、デマンドを分析して、デマンドを承認するためのビジネスケースを作成するには、工数、コスト、リスク、利益の見積もりなどのアクティビティが必要になります。デマンドマネージャーは、デマンドタスクを作成し、これらのタスクを個々のリソースまたはグループにアサインして、これらのアクティビティを実行できます。

デマンドタスクにアサインされたリソースは、タイムカードを使用してデマンドまたはデマンドタスクの作業中に費やされた時間を知らせます。タイムカードデータは、デマンドタスクおよびデマンドで発生した実績工数とコストの計算に使用されます。

デマンドタスクを作成するには、デマンドフォームの [デマンドタスク] 関連リストまでスクロールし、[新規] をクリックしてレコードを作成します。

ステークホルダーの追加

デマンドが送信されると、関連するポートフォリオから、デマンドのステークホルダーリストが自動的に入力されます。ステークホルダーを追加することもできます。ステークホルダーリストにユーザーを追加するには、デマンドフォームの [ステークホルダー] 関連リストまでスクロールし、[新規] をクリックしてレコードを作成し、フォームに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォームからステークホルダーを追加する場合、[ポートフォリオ] フィールドにはデマンドフォームで選択されたポートフォリオが表示されます。

1 つのデマンドに複数のステークホルダーを含めることができます。また、1 人のステークホルダーを複数のデマンドに関連付けることができます。

新しく追加されたステークホルダーは、現在のデマンド、および同じポートフォリオを使用する他のすべてのデマンドに、自動的に関連付けられます。

要件の追加

デマンドマネージャーは必要な数の要件を作成できますが、要件は必須ではありません。通常は、デマンド要求に関連付けられたステークホルダーが、デマンド要求の完了要件を入力します。

デマンドマネージャーは、要件フォームを使用して要件を記述し、要件が満たされていることを確認する責任を担うオーナーをアサインします。要件が複雑な場合、デマンドマネージャーはプロジェクトタスクなどの計画タスクを要件に関連付けることができます。デマンドマネージャーは、タスクをアサインし、完了するまで追跡します。

デマンドに要件を追加するには、次の手順に従います。

1. デマンドフォームを開き、[新規] を選択します。
2. [要件] 関連リストのフィールドに入力します。フィールド名の説明については、「要件フォーム」を参照してください。

リソース計画の追加

リソースプランは、意思決定者がデマンドを評価するときに使用できるもう 1 つの情報源です。[リソース計画] 関連リストからデマンドのリソース計画を作成できます。これは、リソース管理アプリケーションが有効化されている場合にのみ表示されます。

リソース計画をデマンドに追加するには、デマンドフォームの [リソース計画] 関連リストまでスクロールし、[管理] をクリックしてレコードを作成します。

デマンドの **RIDAC** (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードエントリー

RIDAC は、リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求レコードの頭字語です。デマンドのリスクレコードを作成し、デマンドライフサイクル中に他のレコードに変換して問題を追跡したり、関連レコードで関連する詳細を手動でコピーしたりする必要がないようにします。

デマンドがデマンドライフサイクルを進むにつれて、リスクが問題になったり、リスクによって新しい問題が発生したりする可能性があります。リスクレコードを取得したら、そのレコードを問題、アクション、意思決定などの関連レコードに変換します。このレコードの変換と関連付けは、将来のデマンドを計画するためのパターン、傾向、および考えられる解決策の分析と特定に役立ちます。レコードを変換する機能には、次の利点があります。

- 関連情報を手動で繰り返し入力する必要なく、関連レコードを作成できる。
- 将来のデマンドを計画するためのパターン、傾向、および考えられる解決策の分析と特定に役立つ。
- デマンドフォームの **[RIDAC** を表示] 関連リンクを使用して、変換されたすべての RIDAC レコードの統合リストを表示できる。


RIDAC レコードの変換または関連付けを行う前に、次の点を考慮してください。

- あるレコードを別のレコードに変換できるのは、RIDAC シーケンスにおいてのみです。たとえば、リスクを問題、意思決定、アクション、または変更要求に変換することはできますが、問題をリスクに、または意思決定を問題に変換することはできません。次の図は、RIDAC プロセスフローを示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RIDAC フロー

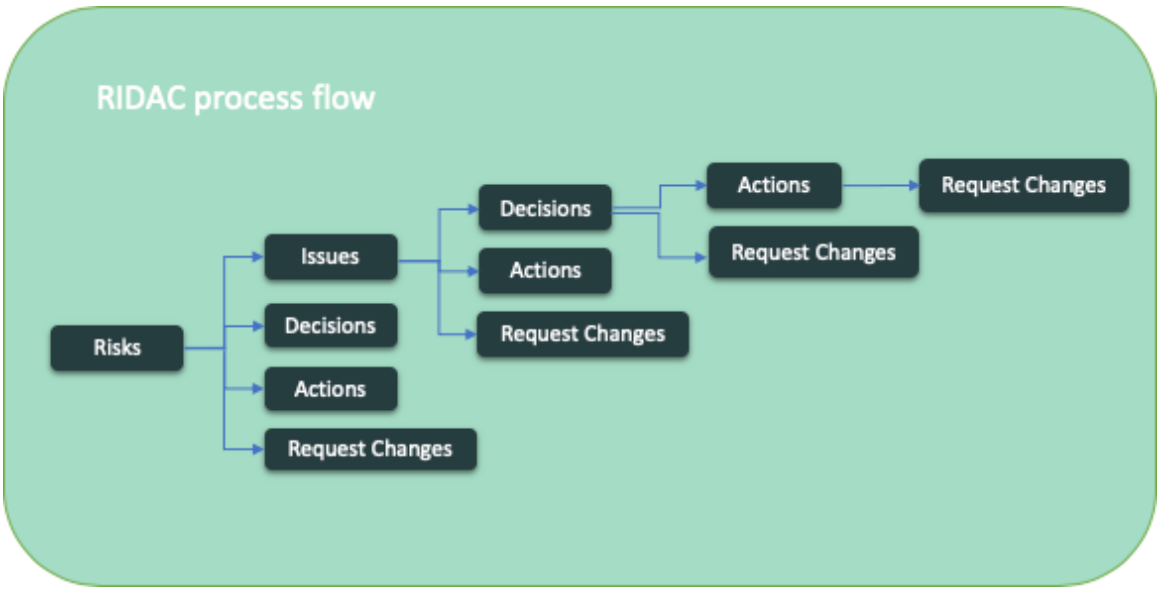

- 1 つのレコードを複数の RIDAC レコードに変換できます。たとえば、1 つのリスクレコードから複数の問題レコードを作成できます。
- 1 つのレコードを複数の異なるレコードに関連付けることができます。たとえば、1 つの問題レコードを複数の異なるリスク、意思決定、アクション、または変更要求レコードにリンクさせることができます。詳細については、「デマンドの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け」を参照してください。

デマンドにリスクを追加する

デマンドにリスクを追加して、デマンドライフサイクルの任意のフェーズでリスクを特定、分析、優先順位付け、計画、および追跡します。潜在的な問題とその影響の重大度を評価し、デマンドについて情報に基づいた意思決定を行います。

始める前に

必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて

リスクとは、デマンドの成功または結果に影響を与える可能性がある不確実なイベントのことです。たとえば、財務支出やリソースのアサインなどのファクターの見積もりが正しくないと、スケジュールにずれが生じる可能性があります。リスクのもう 1 つの例として、デマンド要件の変更があります。リスクを記録することで、意思決定者はデマンドの進捗状況を評価する際にすべての関連情報を確実に把握できます。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. リスクの追加先のデマンドを選択します。
3. [リスク] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. [リスク] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「リスクフォーム」を参照してください。
5. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- 既存のリスクを問題、意思決定、アクション、または変更要求に変換し、リスクをクローズします。詳細については、「デマンドの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換」を参照してください。
- 依存関係を追跡し、将来の傾向を認識できるように、リスクを既存の問題に関連付けます。詳細については、「デマンドの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け」を参照してください。

デマンドのカスタムリスクランクとリスク値の設定

カスタムのリスクランクとリスク値のスコア ([高 - 中]、[中 - 低]、または [絶対 - 低] など) を設定して、リスクの影響度と確率のファクターを評価します。

始める前に

必要なロール：pps_admin

このタスクについて

リスク値のルックアップモジュールを使用して、リスクの影響度と確率の特定の組み合わせに対するリスクランクとリスク値を設定します。システムではこれらの値を使用して、リスクの影響度と確率のファクターに基づいて、リスクの程度 ([絶対]、[高]、[中]、[低]) を判定します。

[確率] フィールドの値に [影響度] フィールドの値を乗算して、リスクフォームの [リスクのランク] および対応する [リスク値] の値を生成します。

デフォルトでは、リスクの次の影響度、値、および可能性スコアを使用して、リスクランクおよびリスク値のスコアを作成できます。

- 絶対
- 低
- 中または中 (Medium or Moderate)
- 高


たとえば、確率は高で、影響度は中だが、デマンド全体のリスクは低と見なしたい場合があります。その場合は、次の値を使用して リスク値マッチャーフォームを設定します。

- 影響度 = 2 - 中
- リスクランキングの色 = 緑色
- 確率 = 高
- 確率数 = 1
- リスク値 = 3 - 低

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の画像は、リスクフォームでのこの例の結果を示していま

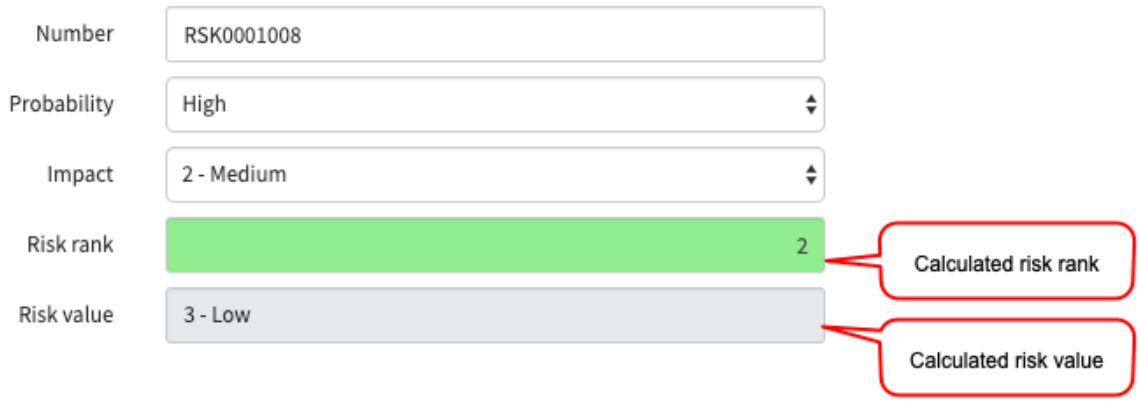

す。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > リスク値のルックアップ.
2. [**New**] をクリックします。
3. リスク値マッチャーフォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「リスク値マッチャーフォーム」を参照してください。
4. [送信] をクリックします。

デマンドに問題を追加する

デマンドに問題を追加して、リスクを昇格したり、デマンドライフサイクルの任意のフェーズで発生する技術的な誤動作やリソースの不足などの予期しない問題を追跡したりします。問題が未解決のままである場合、不要な競合、遅延、さらには障害が発生する可能性があります。

始める前に

必要なロール：it_demand_manager

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 問題を追加するデマンドを選択します。
3. [問題] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. 問題フォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「問題フォーム」を参照してください。
5. オプション: ナレッジベースで問題に関連する記事を検索します。

   a. ナレッジ検索アイコン ( ) をクリックします。

   b. 関連する記事を見つけたら、記事のタイトルをクリックしてそのコンテンツを表示します。

   c. 記事の内容を問題に含める場合は、[問題に添付 **(Attach to Issue)]** をクリックします。
   記事の内容が、問題フォームの [説明] フィールドにコピーされます。必要に応じて、テキストを変更できます。

6. [送信] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- 既存の問題を意思決定、アクション、または変更要求に変換し、問題をクローズします。詳細については、「デマンドの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換」を参照してください。
- 依存関係を追跡し、将来の傾向を認識できるように、問題を既存のリスクに関連付けます。詳細については、「デマンドの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け」を参照してください。

デマンドに意思決定を追加する

デマンドマネージャーは、ソリューションを使用してリスクと問題を積極的に管理するための計画を策定します。リスクまたは問題のためのソリューションを意思決定の形でデマンドに追加します。リスクまたは問題を意思決定に変換したり、意思決定をアクションまたは変更要求に変換したりすることもできます。

始める前に

必要なロール：it_demand_manager

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 意思決定を追加するデマンドを選択します。
3. [意思決定 (Decisions)] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. 意思決定フォームで、フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「意思決定フォーム」を参照してください。
5. オプション: ナレッジベースで意思決定に関連する記事を検索します。

   a. ナレッジ検索アイコン ( ) をクリックします。

   b. 関連する記事を見つけたら、記事のタイトルをクリックしてそのコンテンツを表示します。

   c. 記事の内容を問題に含める場合は、[意思決定に添付 **(Attach to Decision)**] をクリックします。
   記事の内容が、意思決定フォームの [説明] フィールドにコピーされます。必要に応じて、テキストを変更できます。

6. [送信] をクリックします。

次のタスク

- 意思決定をアクションまたは変更要求に変換し、意思決定をクローズします。詳細については、「デマンドの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換」を参照してください。
- 依存関係を追跡し、将来の傾向を認識できるように、意思決定を既存の問題に関連付けます。詳細については、「デマンドの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け」を参照してください。

デマンドにアクションを追加する

デマンドの問題またはリスクの解決に必要なアクションを追加します。分析に基づいてリスク、問題、または意思決定をアクションに変換し、リスクまたは問題の解決を計画することもできます。

始める前に

必要なロール：it_demand_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
リスクと問題を分析し、それらのリスクと問題を管理する方法を決定したら、リスクまたは問題を解決するためのアクションをデマンドに追加します。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. アクションを追加するデマンドを選択します。
3. [アクション] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. アクションフォームで、フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「アクションフォーム」を参照してください。
5. オプション: アクションに他のステークホルダーからの承認が必要な場合は、[承認] および [期日] フィールドを使用して期日の承認を要求します。
6. [送信] をクリックします。

次のタスク

- アクションを変更要求に変換し、アクションをクローズします。詳細については、「デマンドの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換」を参照してください。
- 依存関係を追跡し、将来の傾向を認識できるように、アクションを既存のリスク、問題、および意思決定レコードに関連付けます。詳細については、「デマンドの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け」を参照してください。

変更要求をデマンドに追加する

デマンドマネージャーは、問題の解決やリスクの軽減のために実行したアクションの結果として、変更要求を作成できます。変更要求により、デマンドのスコープ、リソース要件、コスト、またはスケジュールが変更され、リスクまたは問題の影響が最小限に抑えられる場合があります。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 変更要求を追加するデマンドを選択します。
3. [変更を要求] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. 変更要求フォームで、フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「変更要求フォーム」を参照してください。
5. [送信] をクリックします。

次のタスク
依存関係を追跡し、将来の傾向を認識できるように、変更要求を既存のリスク、問題、意思決定、およびアクションレコードに関連付けます。詳細については、「デマンドの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け」を参照してください。

デマンドの特定の **RIDAC** (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換

特定の RIDAC レコード (リスク、問題、アクション、意思決定、および変更要求) をこの順序で別のレコードに変換し、新しいレコードを手動で作成することなくレコード情報を保持して、より簡単に問題を追跡できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて
RIDAC レコードを別のレコードに変換すると、[簡単な説明]、[要求者]、および [アサイン先] フィールドの値が引き継がれます。

親レコードを手動でクローズする代わりに、新規レコードの作成時に親レコードを終結するように指定することもできます。

デマンドフォームの **[RIDAC** を表示] 関連リンク、およびデマンドモジュールのアプリケーションナビゲーターの **[RIDAC** を表示] を使用して、変換されたすべての RIDAC レコードの統合リストを表示することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. リスク、問題、意思決定、アクション、または変更要求レコードを別の RIDAC レコードに変換するデマンドを選択します。
3. [デマンドフォーム] 関連リストから、リスク、問題、意思決定、アクション、または変更要求レコードを選択してフォームビューを開きます。
4. フォームの **[RIDAC** に変換] 関連リンクをクリックします。
5. オプション: [変換] ダイアログボックスの [タスクタイプを選択] リストから、選択したレコードを変換する RIDAC レコードを選択します。
   たとえば、リスクを問題に変換する場合は、[問題] を選択します。
6. オプション: 親レコードからコピーされた [簡単な説明] フィールドのテキストを変更します。
7. オプション: [アサイン先] フィールドの親レコードからコピーされたデフォルトのアサインを変更するには、ルックアップアイコン (🔍) をクリックし、別のユーザーを選択します。
8. オプション: 新規レコードの作成時に親 RIDAC レコードをクローズする場合は、親レコードをクローズするオプションを選択します。
   親レコードをクローズするオプションのラベルは、親レコードタイプに応じて変わります。たとえば、親レコードがリスクで、それを問題レコードに変換する場合、レコードをクローズするオプションは [リスクをクローズ **(Close Risk)]** と表示されます。
9. **[OK]** をクリックします。

デマンドの既存の **RIDAC** (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け

デマンドの既存の RIDAC レコード (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) を相互にリンクさせることができます。RIDAC レコードを相互に関連付けると、デマンドのクローズ時および計画時の分析のために、リスクまたは問題とその結果のレコードを保持できます。また、デマンドのライフサイクル全体にわたってリスクと問題を追跡する際にも役立ちます。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて
1 つのレコードを複数の異なるレコードに関連付けることができます。たとえば、1 つの問題レコードを複数のリスク、意思決定、アクション、または変更要求レコードにリンクさせることができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 特定の RIDAC エントリーを別のエントリーに関連付けるデマンドを選択します。
3. [デマンドフォーム] 関連リストで、RIDAC レコードを選択します。
4. フォームで、**[RIDAC** の関連付け] 関連リンクをクリックします。
5. [関連付け] ダイアログボックスの [タイプの選択] リストから、選択したレコードを関連付ける RIDAC レコードを選択します。
   たとえば、リスクを問題に関連付ける場合は、[問題] を選択します。
6. 選択したレコードの関連付け先のレコード番号を、[関連付け先] リストから選択します。
   たとえば、選択したリスクを問題 (ISU0010003) に関連付ける場合は、**[ISU0010003]** を選択します。
7. **[OK]** を選択します。

デマンドをドラフト状況にリセットする

必要に応じて、デマンドを [ドラフト] ステータスに戻すことができます。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて
デマンドは、[完了]、[承認済み]、[スクリーニング]、または [送信済み] 状況から、またはプロジェクト、拡張、欠陥、変更などのアーティファクトが作成されるまでは、[ドラフト] にリセットできます。デマンドが [認定済み] ステータスの場合、[ドラフトにリセット] オプションは使用できません。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 必要なデマンドフォームを開きます。
3. [ドラフトにリセット] をクリックします。
   以下が存在する場合は、確認メッセージが表示されます。
   - ステークホルダーとの間で処理待ちのアクティブなアセスメント、または
   - リソースのアサインがデマンドに対して作成されます
4. 実績時間が報告されていない割り当て済みリソース計画を再計画するには、このチェックボックスをオンにします。
5. **[OK]** をクリックします。

タスクの結果

- デマンドが [ドラフト] ステータスに移行します。
- [アセスメントデータ] タブのすべてのスコア値がデフォルトにリセットされます。
- デマンドに対してアクティブなすべてのアセスメントがキャンセルされます。デマンドフォームの [アセスメントが必要] フィールドが true に設定されている場合、デマンドが [スクリーニング] ステータスに移行すると、新しいアセスメントがトリガーされます。

デマンドの削除

[処理待ち] ステータスのデマンドのみ削除できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager または it_demand_user

このタスクについて
デマンドを削除すると、リスク、デマンドタスク、要件、意思決定など、デマンドに関連するすべてのデータが削除されますが、そのステークホルダーがステークホルダー登録 [dmn_stakeholders_register] テーブルから削除されることはありません。

プロジェクトが既にデマンドから作成されている場合、その参照はデマンドに関連するデータとともにプロジェクトから削除されますが、プロジェクトがデータベースから削除されることはありません。

デマンドを削除するには、以下の手順を実行します。

手順

1. 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて.
2. 推奨：
   - デマンドをクリックしてデマンドフォームを開き、[削除] をクリックします。
   - デマンドの横にあるチェックボックスをオンにし、[アクション] 選択リストから [削除] を選択します。

デマンドの移動とサイズ変更

デマンドマネージャーは、バブルチャート内のバブルを移動したり、サイズを変更したりすることができます。

始める前に
必要なロール：it_demand_manager


このタスクについて
バブルチャートでバブルを移動してサイズを変更すると、リストビューでそのデマンドに対応する値が更新されます。

手順

1. バブルをクリックして水平軸に沿って左右にドラッグして、デマンドのリスクを増減します。
   デマンドの新しいリスクが [リスク] 列で更新されます。
2. バブルをクリックして垂直軸つまり Y 軸に沿って上下にドラッグして、デマンドの値を増減します。
   デマンドの新しい価値が [価値] 列で更新されます。
3. バブルをクリックして、バブルのサイズを拡大または縮小できるサイジングウィンドウを開きます。

   デマンドの新しいサイズが [サイズ] 列で更新されます。

バブルサイズウィンドウ



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

類似のデマンドを見つけるために デマンド管理 の類似性ソリューションをトレーニングする

PPM の予測インテリジェンス機能に含まれる類似デマンドソリューション定義をトレーニングして、デマンドの作成時に関連するデマンドを検索します。

始める前に

コンテキスト検索の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.contextual_search_ml)、PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo)、および PPM 用予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.ppm_ml) が有効化されていることを確認します。予測インテリジェンスの詳細については、「予測インテリジェンス」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 予測インテリジェンス > 類似性 > ソリューション定義.
2. [類似性定義] リストで、類似デマンドソリューション定義 (ml_sn_global_global_similar_demands) を検索して選択します。
3. 類似性定義フォームで、デマンドのデフォルトのフィールド値を確認します。
   類似性定義フォームフィールドの詳細については、「類似ソリューションの作成とトレーニング」を参照してください。
4. [更新 **&** 再トレーニング] をクリックします。
5. 類似デマンドソリューション定義 (ml_sn_global_global_similar_demands) の類似性定義フォームを開きます。
6. [ML ソリューション] 関連リストの [進捗状況] 列で、トレーニングソリューションの進行状況を表示します。

   注:
   または、[アクティブ] 列のソリューションのリンクをクリックすることもできます。[ML ソリューション] フォームで、[トレーニング進捗状況を表示する] 関連リンクをクリックして、トレーニングソリューションの進行状況を確認します。

タスクの結果

ソリューションが完了すると、類似デマンドがデマンドフォームの [類似デマンド] セクションに表示されます。

次のタスク

- 類似例を確認します。類似性定義フォームの ML ソリューション関連リストで、[進捗状況 **(Progress)]** が 100% のときに [アクティブ **(Active)]** 列で、ソリューションのリンクをクリックします。[類似例] リストを表示するには、ML ソリューションフォームの [類似例] 関連リンクをクリックします。
- 類似スコアのしきい値を更新します。ML ソリューションフォームの [ソリューション統計情報] タブで、[類似スコアのしきい値] フィールドに必要な値を入力します。ML ソリューションフォームを右クリックし、[保存] をクリックします。
- レコードの予測出力をテストします。ML ソリューションフォームの [ソリューションをテスト] タブで、[簡単な説明] フィールドにテキストを入力し、[上位 **N** 件] フィールドに予想される結果の最大数を入力して、[テストを実行] をクリックします。類似スコアしきい値を超える結果が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

予測インテリジェンス

デマンド管理 の 予測インテリジェンス

デマンドを作成

PPM PIWB テンプレート - 類似デマンドの検索

類似デマンドを見つける類似デマンドソリューション定義のトレーニング手順を説明するガイド付きテンプレートを使用します。

始める前に
必要なロール：piwb_manager

手順

1. 移動先 すべて > 予測インテリジェンスワークベンチ > ユースケース > テンプレートから新規作成.
2. [類似デマンド] テンプレートを選択します。
3. [開始] をクリックします。
   [ユースケースセットアップ] ページが開いて、ユースケースの名前と説明が表示されます。
4. [移動 **(Take me there)]** をクリックします。
   [ServiceNow 機械学習ソリューション] ページが開き、利用可能なすべてのソリューションが表示されます。
5. 類似性ソリューションを展開して、利用可能なソリューション定義を表示します。
   類似デマンドを検索するための類似性ソリューションを構成またはトレーニングします。
   - 類似デマンドソリューション定義 (ml_sn_global_global_similar_demands) を構成するには、[構成] をクリックします。詳細については、「類似のデマンドを見つけるために デマンド管理 の類似性ソリューションをトレーニングする」を参照してください。
   - 類似デマンドソリューション定義 (ml_sn_global_global_similar_demands) をトレーニングするには、[トレーニング] をクリックします。

デマンド管理の参照

フィールド、ユーザーロール、テーブル、ガイドライン、ドメインセパレーション情報など、デマンド管理 に関する追加の詳細を提供するための参照情報。

デマンドタスク

デマンドタスクは、デマンド内で作成され、デマンドをプロジェクト、変更、拡張または欠陥に変換する前に初期計画アクティビティを分割するための作業単位となります。

[デマンドタスク] 関連リストからデマンドタスクを作成して、デマンドの実現可能性の評価に役立つアクティビティを委任することができます。デマンドタスクは、次の点でプロジェクトタスクと異なります。

- 予定日、実際の日付、および元の日付は、デマンドタスクではなくプロジェクトタスクの一部です。
- 期日は、タスク完了のターゲット日付を示すもので、デマンドワークフローには影響しません。ただし、プロジェクトタスクでは、予定日および実際の日付が変更された場合、プロジェクトの完了日に影響します。
- ネストされたデマンドタスクの作成はサポートされていません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- [すぐに開始] や [特定の日に開始] の設定などのタスク制約はサポートされていません。
- アジャイル、ウォーターフォール、ハイブリッドなどの実行タイプはサポートされていません。

リソースのアサイン

[アサイン先]、[他の受託者リスト]、および [アサイン先グループ] フィールドを使用して、デマンドタスクのリソースをアサインします。リソースやグループをデマンドタスクに割り当てたり、デマンドに費やした時間を送信したりするために、リソースのアサインを作成して使用しないでください。リソースのアサインをデマンドタスクに関連付けると、関連付けられたリソース計画はそのデマンドから作成された作業エンティティに転送されません。

デフォルトでは、リソースのアサインはデマンドに関連付けられていません。デマンドから作成された将来の作業エンティティ用に作成したリソースのアサインを使用して、デマンドに費やした時間を送信しないでください。

デマンドのタイムカードを送信すると、発生した時間とコストはデマンドから作成された作業エンティティに転送されず、デマンドのコストと作業量としてデマンド内に留まります。

デマンドタスクにアサインされたリソースは、タイムカードを使用してタスクに費やした時間を送信できます。詳細については、「デマンドタスクのタイムカードの送信」を参照してください。

デマンドタスクの実績コストと作業量

デマンドタスクで実行された作業の実績工数は、タイムカードから導出されます。実績コストは、レートモデル、デフォルトの賃金レート、またはデフォルトのシステムのプロパティで定義されたリソースの時間単価から算出されます。その後、デマンドタスクの実績コストと作業量がロールアップされ、関連付けられたデマンドの実績コストと作業量が導出されます。詳細については、「デマンドおよびデマンドタスクの実績コストと作業量の計算」を参照してください。

デマンドに作業アイテムを追加する

選択したデマンドタスクカテゴリとアサインされたロールに基づいて、デマンドタスクフォームを使用して次のことができます。

- デマンドにコスト計画を追加
- リソースのアサインをデマンドに追加する
- デマンドに利益計画を追加
- デマンドにリスクを追加

デマンドおよびデマンドタスクの実績コストと作業量の計算

実績コストと作業量は、特定の期間中にデマンドおよびデマンドタスクで実行された作業で発生した実現コストと費やされた時間です。実績コストと作業量は、リソースの承認済みタイムカードと時間単価に基づいて計算され、リソースの時間単価の導出方法によって変化します。

デマンドタスクとデマンドの作業にはコストと時間がかかるので、デマンドを製品、機能、または拡張に変換するための支出全体が増加します。したがって、デマンドマネージャーは、デマンドのアクティビティを評価および計画する際に、発生する実績コストと作業量を把握する必要があります。実績コストの計算は、タイムカードで報告された時間をリソースの時間単価で乗算することによって算出されます。デマンドタスクの実績工数は、タイムカードで報告された時間に基づいて計算されます。

その後、デマンドの実績工数とコストを計算するために、デマンドタスクの実績工数とコストがロールアップされます。リソースの実績コストと時間単価の計算は、次のように導出されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- レートモデルがデマンドに関連付けられている場合、実績コストはレートモデルで定義された時間単価に基づいて計算されます。
- レートモデルがない場合、または時間単価がレートモデルで見つからない場合、時間単価はデフォルトの賃金レートから導出されます。
- 時間単価がデフォルトの賃金レートで見つからない場合、時間単価はデフォルトのシステムのプロパティから導出されます。

リソースまたはグループをデマンドタスクに割り当てるために、リソースのアサインを作成して使用しないでください。デマンドで作成したリソースのアサインは、デマンドから作成される作業エンティティのリソース見積もりに使用されます。これらのリソースのアサインは、デマンドが認定されて変換されると、結果の作業エンティティに自動的に移動されます。

デフォルトではリソースのアサインがデマンドに関連付けられていないため、デマンドのタイムカードを送信すると、実績工数とコストはリソースのアサインに反映されません。リソースのアサインを手動でデマンドに関連付けた場合でも、デマンドの実績コストと実績工数はデマンド内に留まり、デマンドから作成されたプロジェクトには転送されません。

デマンドタスクに関連付けられていないデマンドの作業に、リソースが追加の時間を費やす場合は、この時間も記録する必要があります。リソースは、タイムシートポータルを使用してデマンドに費やされた追加時間を記録するためにタイムカードを送信します。この追加コストと作業量はデマンドに追加されますが、デマンドタスクの実績コストと作業量には反映されません。

タイムカードデータから導出されたデマンドの実績コストと実績工数は、デマンドタスクの実績コストと作業量の合計に追加されます。[デマンドの実績コスト] および [デマンドの実際の労力] フィールドの値は、次のように計算されます。

- デマンドの実績コスト：すべてのデマンドタスクの実績コスト + 追加アクティビティの実績コスト
- デマンドの実際の労力：すべてのデマンドタスクの実績工数 + 追加アクティビティの実績工数

デマンドにタスクまたはアサインされたリソースがない場合は、デマンドに対してタイムカードを送信することで実績コストをキャプチャできます。タイムカードが承認されると、デマンドに経費ラインが作成されます。経費ラインが処理され、そのタイムカードの実際の作業コストがデマンドの [デマンドの実績コスト] 列にロールアップされます。

次の例は、デマンドタスクの実績コストと作業量の計算と、その結果のデマンドへのロールアップを示しています。

Example: デマンドタスクに基づく実績コストと作業量の計算

デマンド (D1) の場合、デマンドマネージャーは、初期アセスメント、コスト推定、予定作業量などのアクティビティを委任します。これらのアクティビティを委任するために、デマンドマネージャーは 3 つのデマンドタスク (DT1、DT2、DT3) を作成し、リソース R1、R2、R3 を各デマンドタスクにそれぞれアサインします。

レートモデル内でリソースに定義された時間単価、デフォルトの賃金レート、またはデフォルトのシステムのプロパティを次の表に一覧表示します。

リソースの時間単価

リソース	レートモデル内の時間単価	デフォルトの賃金レートでの時間単価	システムのプロパティ内の時間単価
R1	$200	$150	$50
R2	$250	$200	$50

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

リソースの時間単価 (続く)

リソース	レートモデル内の時間単価	デフォルトの賃金レートでの時間単価	システムのプロパティ内の時間単価
R3	$150	$100	$50

各リソースは、アサインされたデマンドタスクの作業中に合計 8 時間を費やし、タイムカードを送信します。

デマンドタスクの実績コストと作業量の計算：デマンドタスクの実績コストと作業量が計算され、デマンドタスクフォームに表示されます。この合計は、導出方法によって異なります。

シナリオ 1 は、リソースの時間単価がレートモデルから導出される場合に合計を計算する方法を示しています。

レートモデルから導出されたレート

実績	デマンドタスク **DT1**	デマンドタスク **DT2**	デマンドタスク **DT3**
実績工数	8 時間	8 時間	8 時間
実績コスト	200 * 8 = $1600	250 * 8 = $2000	150 * 8 = $1200

シナリオ 2 は、レートモデルがデマンドに関連付けられておらず、リソースの時間単価がデフォルトの賃金レートから導出される場合に合計を計算する方法を示しています。

デフォルトの賃金レートから導出されたレート

実績	デマンドタスク **DT1**	デマンドタスク **DT2**	デマンドタスク **DT3**
実績工数	8 時間	8 時間	8 時間
実績コスト	150 * 8 = $1200	200 * 8 = $1600	100 * 8 = $800

シナリオ 3 は、レートモデルがデマンドに関連付けられておらず、リソースの時間単価がデフォルトのシステムのプロパティから導出される場合に合計を計算する方法を示しています。

デフォルトのシステムのプロパティから導出されたレート

実績	デマンドタスク **DT1**	デマンドタスク **DT2**	デマンドタスク **DT3**
実績工数	8 時間	8 時間	8 時間
実績コスト	50 * 8 = $400	50 * 8 = $400	50 * 8 = $400

Example: 実績コストと作業量のデマンドへのロールアップ

デマンドフォームの [財務] タブの [デマンドの実績コスト] および [デマンドの実際の労力] フィールドには、すべてのデマンドタスクの実績コストと実績工数の合計が入力されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. デマンドタスクのリソースレートがレートモデルから導出されている場合 (シナリオ 1)、[デマンドの実績コスト] フィールドの値は「$4800」と表示されます。[デマンドの実際の労力] フィールドの値は 24 時間制として表示されます。
2. デマンドタスクのリソースレートがデフォルトの賃金レートから導出されている場合 (シナリオ 2)、[デマンドの実績コスト] フィールドの値は「$3600」と表示されます。[デマンドの実際の労力] フィールドの値は 24 時間制として表示されます。
3. デマンドタスクのリソースレートがデフォルトのシステムのプロパティから導出されている場合 (シナリオ 3)、[デマンドの実績コスト] フィールドの値は「$1200」と表示されます。[デマンドの実際の労力] フィールドの値は 24 時間制として表示されます。

デマンド管理の主要な用語

デマンド管理 の重要な用語を表に示します。

デマンド管理主要な用語

用語	説明
ポートフォリオ	戦略的および運用上の目標を達成するためにグループとして管理されるデマンドのコレクション。
アセスメント可能なレコード	メトリクスタイプのデマンドについて評価するデマンドレコード。 評価する特性と値を定義するメトリクスカテゴリとメトリクスを使用して、アセスメント可能なレコードを評価します。
メトリクス	アセスメント可能なレコードを評価するために使用する特性または価値。 メトリクスは、アセスメントアンケートで主観的な値を測定したり、スクリプトによって実行されるデータベースクエリーで目的の値を収集したりできます。 メトリクスの例としては、デマンドの知覚価値やデマンドの投資収益率などがあります。
メトリクスタイプ	評価するレコードのセットを定義する特性。 デマンド管理には、デマンド [dmn_demand] テーブルのレコードを使用するメトリクスタイプのデマンドが付属しています。
メトリクスカテゴリ	アセスメント可能なレコードを評価するためのテーマ。カテゴリには、テーマを構成する特定の特性または値を定義する 1 つ以上の個別のメトリクスが含まれます。 カテゴリの例としては、投資利益率やコストなどがあります。フィルター条件を設定することで、カテゴリ内のメトリクスに対して評価するアセスメント可能なレコードを制御します。
ステークホルダー	デマンドの影響を受ける人、またはデマンドに利害関係がある人。
スコアカード	アセスメント結果に基づいた、アセスメント可能なレコードのパフォーマンスの視覚的なブレークダウン。 スコアカードを使用して、1 つのアセスメント可能なレコードのさまざまなデータサマリーを表示し、その評価を他のアセスメント可能なレコードと比較します。
要件	存在している必要がある追加のアイテム、またはデマンド要求をクローズする前に終了する必要がある追加のアクションアイテム。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド管理主要な用語 (続く)

用語	説明
デマンドタスク	デマンドをプロジェクトに変換する前に初期計画アクティビティを分割する、デマンド内に作成される作業単位。デマンドタスクは、プロジェクトタスクのような計画タスクではありません。

ステージフィールド

アイデアがデマンドライフサイクルを移動すると、[アイデア] リストの [ステージ] フィールドに、アイデアの現在のステータスが表示されます。現在のステータスには、アイデアからデマンド、さらに最終的なプロジェクト、拡張、変更、または欠陥が含まれます。

アイデアの結果は、デマンドフォームの [カテゴリ] フィールドと [タイプ] フィールドの初期設定によって異なります。[ステージ] フィールドは [デマンド] リストにも表示されます。[ステージ] フィールドは表示専用フィールドであり、検索もソートもできません。


重要:
New York リリース以降、[ステージ] フィールドは使用できなくなります。 New York 以降でプロビジョニングされたインスタンスでは、[アイデア] テーブルから [ステージ] フィールドがなくなります。ただし、New York より前のリリースからアップグレードしている場合、[ステージ] フィールドは利用可能です。

新しいアイデアは [送信済み] ステータスで作成されます。受け入れられたアイデアは [受入済み] ステータスに更新され、保留されたアイデアは [スキップ] ステータスに更新されます。デマンドがクローズされると、関連するアイデアは [完了] としてマークされます。

[ステージ] フィールドをポイントすると、アイデアの進行と、進行の各ステップの [ステータス] フィールドの値を示すポップアップウィンドウが表示されます。

- アイデア：アイデアが評価されている場合は、ポップアップウィンドウにアイデアの現在のステータスが表示されます。
- デマンド：アイデアがデマンドに昇格された場合、ポップアップウィンドウにデマンドの現在のステータスとアイデアが表示されます。
- プロジェクト、拡張、変更、または 欠陥：デマンドが受け入れられた場合、ポップアップウィンドウには、デマンドとアイデアに加え、最終的なプロジェクト、拡張、変更、または欠陥の現在のステータスが表示されます。

[アイデアステージの概要 **(Idea Stage Summary)]** ポップアップウィンドウ

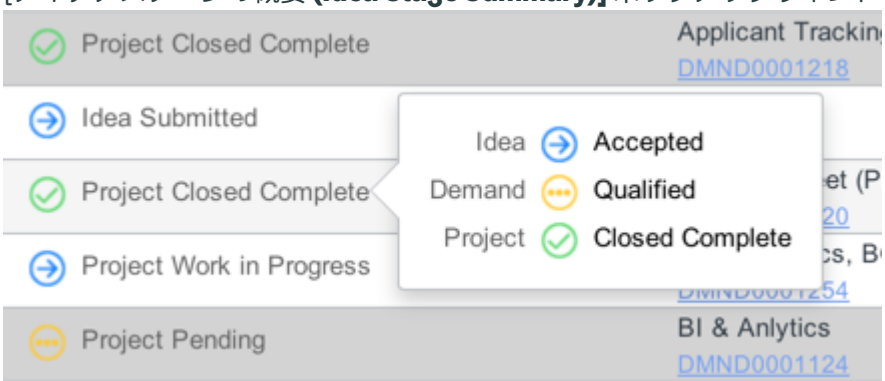

複合フィールド


複合フィールドは、テーブル内の 2 つのフィールドからの情報を組み合わせて単一のフィールドを形成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

たとえば、[プロジェクトタスク] リストの [タスク] フィールドには、簡単な説明とプロジェクトタスク番号が表示されます。簡単な説明がプロジェクトタスク番号の上に表示されます。プロジェクトタスク番号が表示され、これはプロジェクトタスクフォームへのリンクになります。

複合フィールド



複合フィールドの使用

- 複合フィールドを編集すると、簡単な説明が変更されます。簡単な説明を編集すると、複合フィールドが変更されます。
- 複合フィールドでのソートは、簡単な説明のみに基づいて行われ、番号に基づいてソートされることはありません。
- 複合フィールドでの検索は、簡単な説明と番号の両方で有効になっています。
  - リストヘッダーを使用して番号で検索するには、検索要素の前にアスタリスク (*) を入力します。例：*PRJTASK0010016。
  - フィルターを使用して番号で検索するには、[Task] [contains] [PRJTASK0010016] のような条件を作成します。

ドメインセパレーションと デマンド管理

ドメインセパレーションは デマンド管理 でサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

デマンドからプロジェクトにコピーされたデータ

プロジェクトがデマンドから作成されるときに、デマンドからプロジェクトにコピーされるデータフィールド。

デマンドからプロジェクトにコピーされたデータフィールド

フィールドタイプ	説明
デマンド	次のデマンドフィールドがプロジェクトにコピーされます。 • 説明 • ビジネスケース • 投資クラス • 投資タイプ • 実行リスク • 不実行リスク • 実現要因 • バリア • スコープ内 • スコープの範囲外 • 仮定 • 事業部門 • 部門 • 影響を受ける事業部門 • ビジネス機能 • 優先度 • 影響 • レートモデル • 承認された開始日 • 承認された終了日 • 簡単な説明 • プログラム • ドメイン • 目標 • 戦略 • 影響を受けるビジネスアプリケーション • 構成アイテム • 会社

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドからプロジェクトにコピーされたデータフィールド (続く)

フィールドタイプ	説明
	• 緊急度 • プロジェクトマネージャー • プロジェクト通貨 • プロジェクト計算
リソースのアサイン	デマンドのリソースのアサインは、デマンドからプロジェクトへのタスク参照を更新することによってプロジェクトにコピーされます。
要件	デマンド要件。
財務レコード	コスト計画とブレークダウン、利益計画とブレークダウン (金銭的および非金銭的)、およびデマンド予算は、タスク参照をデマンドからプロジェクトに更新することでプロジェクトにコピーされます。
RIDAC	RIDAC エンティティは、タスク参照をデマンドからプロジェクトに更新することでプロジェクトにコピーされます。 リスク、問題、意思決定、プロジェクトアクション、変更要求、およびRIDAC_m2mレコードがコピーされます。
アセスメント	次のアセスメントデータフィールドがプロジェクトにコピーされます。 • リスク • 値 • スコア • T シャツサイズ
ステークホルダー	ステークホルダーレコード。
プロジェクト通貨 財務	複数通貨プラグインがアクティブな場合、プロジェクト財務フィールドはプロジェクト通貨と参照レートに従って計算されます。

デマンド管理フォーム

デマンド管理アプリケーションで使用されるフォームのフィールド情報。

デマンド予算フォーム

デマンド予算フォームを使用して、デマンドに予算を割り当てます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンド予算フォーム

フィールド	説明
会計年度	デマンドの予算を設定する会計年度。
通貨	デマンドの予算を割り当てる際の通貨。 PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効化されている場合は、デマンド通貨または機能通貨で予算を割り当てることができます。
デマンド通貨での投資予算	選択した通貨で資本的支出に割り当てられた計画経費の金額。
デマンド通貨での経費予算	選択した通貨での運用経費の金額。
デマンド通貨での予算合計	投資および経費金額の合計。

ステークホルダー登録フォーム

ステークホルダー登録フォームを使用して、ステークホルダーレジストリにユーザーを追加します。

ステークホルダー登録フォームのフィールド

フィールド	説明
番号	ステークホルダーの一意の識別番号。新しいエントリが作成されると、この番号が自動的に生成されます。
ユーザー	ステークホルダーレジストリーに追加されるユーザーの名前。
ポートフォリオ	ビジネスゴールまたは運用目標に合わせて管理されたアクティビティのグループ。通常、ポートフォリオには組織の事業部門に応じた名前が付けられます。
利害関係のレベル	デマンドまたはプロジェクトを遂行する上でのステークホルダーの利害関係のレベル。
アセスメント対象者	ユーザーにデマンドのアセスメントアンケートの受け取りが許可されているかどうかを示します。
承認者	ユーザーがプロジェクトのデマンドまたは変更要求を承認する権限を持っているかどうかを示します。
影響	デマンドまたはプロジェクトを評価するグループに対してユーザーが及ぼす影響レベル。
エンゲージメント	ユーザーがデマンドまたはプロジェクトに関与する方法を示します。
関数	デマンドまたはプロジェクトプロセスにおけるユーザーの機能。

ウィジェットフォーム

ウィジェットフォームを使用して、新しいウィジェットを構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウィジェットフォーム

フィールド	説明
名前	ウィジェットの一意の名前。
スクリプト化	ウィジェットの値がコードスクリプトから取得されたことを示すオプション。 デフォルトでは、このオプションは選択され、読み取り専用です。
ラベルを表示	ラベルまたは色インジケーターを表示するためのオプション。 このチェックボックスをオフにすると、[色] フィールドが表示され、色を設定できます。
有効	ウィジェットのステータスを示すためのオプション。 デマンド財務ページには、有効化されているウィジェットのみが表示されます。
親ウィジェット	現在のウィジェットの親であるウィジェット。 現在のウィジェットが、選択したウィジェットの [子ウィジェット] 関連リストに表示されます。 最大 3 個の子ウィジェットを親ウィジェットに追加できます。
フォーマッターが必要	ウィジェットに通貨フォーマッターが必要かどうかを指定するためのオプション。

スクリプト	ウィジェットに表示される要求されたメトリクス値を返すコードスクリプト。
	
	スクリプトでは、コンテキストオブジェクトとフィルターオブジェクトを使用します。コンテキストオブジェクトには、total_costs、irr_value、capital_budget などのすべてのデマンド財務フィールドが含まれています。
	
	次のサンプルスクリプトは、ウィジェットに表示するデマンドの資本予算メトリクス値を返します。
	
	`var context = JSON.parse(context);`
	`var filter = context.filters;`
	
	`var now_GR = new GlideRecord('dmn_demand');`
	`gr.addEncodedQuery(filter['dmn_demand']);`
	`gr.query();`
	`if(gr.next())`
	`gr.getValue('capital_budget');`
	`Collapse`

簡単な説明	ウィジェットの説明。

ウィジェットの関連性フォーム

ウィジェットの関連性フォームを使用して、ウィジェットをデマンドに関連付けます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウィジェットの関連性フォーム

フィールド	説明
関連性ID	ウィジェットに関連付けるレコード。 関連するレコードにアクセスするには、[テーブル名] リストでテーブル [sys_db_objects] テーブルを選択し、[ドキュメント] リストでデマンド [dmn_demand] テーブルを選択する必要があります。
関連付けテーブル	ウィジェットに関連付けるテーブル。 リストからテーブル [sys_db_objects] を選択する必要があります。
ウィジェット	ウィジェットの一意の名前。
順番	デマンド財務ページの他のウィジェットとの関連でのウィジェットの位置。 ウィジェットは番号順に表示され、最も小さい番号を持つものが最初に表示されます。
カードに表示	デマンド財務ページにウィジェットを表示するオプション。
デフォルトで含める	デマンド財務ページにデフォルトでウィジェットを表示するオプション。

デマンドフォーム

デマンドフォームを使用して、新しいデマンドを作成します。

デマンドフォーム

フィールド	説明
名前	デマンドの名前。
カテゴリ	デマンドのカテゴリ： • 戦略 (Strategic) - デマンドがプロジェクトやストーリーなどの将来の計画立案用である場合は、このカテゴリを選択します。 • 運用 - デマンドが変更や欠陥などの運用作業用である場合は、このカテゴリを選択します。

タイプ	[カテゴリ] フィールドの選択により、このフィールドで利用可能な選択肢が決まります。
	• カテゴリが戦略的の場合は、次のデマンドタイプを使用できます。
	  ○ 継続的改善管理
	  ○ 拡張
	  ○ プロジェクト管理
	  ○ Epic

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォーム (続く)

フィールド	説明
	○ ストーリー ○ SAFe エピック ○ SAFe ストーリー ○ SAFe 機能 ○ 変換なし • カテゴリが [運用] の場合は、次のデマンドタイプを使用できます。 ○ 変更 ○ 欠陥 ○ 変換なし [ストーリー]、[エピック]、[拡張]、および [欠陥] オプションは、アドミニストレーターがアジャイル開発 2.0 プラグインを有効化している場合にのみ表示されます。 **[SAFe** ストーリー]、**[SAFe** 機能]、および **[SAFe** エピック] オプションは、アドミニストレーターが Essential SAFe または Portfolio SAFe のいずれかのプラグインを有効化している場合にのみ表示されます。 デマンドを使用して、1 つ以上のプロジェクト、エピック、またはプログラムを含む大規模なプロジェクトに資金を提供する場合は、[変換なし] を選択できます。 [カテゴリ] および [タイプ] フィールドの選択によって、[アセスメントデータ] 関連リストに表示されるフィールドも決まります。 作業エンティティがデマンドから作成されると、[カテゴリ] および [タイプ] フィールドは読み取り専用になります。作成した作業エンティティを削除すると、これらのフィールドは再び編集可能になります。
プロジェクト	このデマンドから作成されるプロジェクトの名前。 このフィールドは、デマンドをプロジェクトに変換する場合にのみ表示されます。デマンドに関連付けられているリソースのアサインは、プロジェクトに伝播されます。
拡張	このデマンドから作成される拡張の番号。
変更	このデマンドから作成される変更の番号。
欠陥	このデマンドから作成される欠陥の番号。
番号	デマンドに対して自動生成された一意な識別番号。
承認された開始日	承認されたデマンド開始日付。この日付は、デマンドマネージャーがデマンドを実行するスケジュールを調整できるように、ポートフォリオマネージャーによって入力されます。デマンドがプロジェクトに変換された場合、このフィールドはプロジェクトフォームの [承認された開始日] フィールドに引き継がれます。このフィールドの日付が [開始日] フィールドと異なる場合、このフィールドは赤色で強調表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォーム (続く)

フィールド	説明
	注: デマンドの作成時にこのフィールドを空白のままにすると、[開始日] フィールドの日付がこのフィールドに入力されます。
承認された終了日	承認されたデマンド完了日付。この日付は、デマンドマネージャーがデマンドを実行するスケジュールを調整できるように、ポートフォリオマネージャーによって入力されます。デマンドがプロジェクトに変換された場合、このフィールドはプロジェクトフォームの [承認された終了日] フィールドに引き継がれます。このフィールドの日付が [期日] フィールドと異なる場合、このフィールドは赤色で強調表示されます。 **注:** デマンドの作成時にこのフィールドを空白のままにすると、[期日] フィールドの日付がこのフィールドに入力されます。
開始日	デマンドの開始日。この日付は、デマンドがプロジェクトに変換されるときに開始予定日に変更されます。 **注:** デマンドまたはプロジェクトの開始予定日を変更すると、関連するコスト計画とリソースのアサインも変更されます。プロジェクトプロパティの [デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更でリソースプランとコスト計画の開始日を変更 **(Change Resource Plan and Cost Plan Start Date with Demand or Project Start Date Change)]** が、デマンドの開始日変更の動作を制御します。このプロパティはデフォルトで有効になってはいません。
期日	要求されたデマンド完了日。この日付は、デマンドがプロジェクトに変換されるときに開始終了日に変更されます。
類似デマンド	予測インテリジェンスと機械学習アルゴリズムにより、[簡単な説明] フィールドに類似した値を持つと判断されたデマンド。詳細については、「デマンド管理 の 予測インテリジェンス」を参照してください。
関連検索	デフォルトでは、[名前] フィールドに一致する検索結果。このフィールドに他の用語を使用して、一致するデマンドを検索することもできます。

デマンドフォームの [詳細] セクション

フィールド	説明
ポートフォリオ	デマンドのビジネス上の焦点を示すポートフォリオ。
プログラム	デマンドが属するプログラムの名前。
投資クラス	デマンドにアサインされている投資クラスカテゴリのタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォームの [詳細] セクション (続く)

フィールド	説明
	• 実行：既存のビジネスを維持するために行われた投資。 • 変更：ビジネスの変更を実装するために行われた投資。
投資タイプ	デマンドの投資タイプ: • コストの削減 • エンドユーザーエクスペリエンス • 法務と規制 • 収益化 • サービスの維持 • 戦略実現 • 人工知能
更新者	デマンドの送信ユーザー。
デマンドマネージャー	デマンドマネージャーの名前。
協力者	デマンドに対する編集や貢献が可能なユーザー。デマンド要求者は、任意のユーザーを協力者として選択できます。
部門	デマンドの送信者が属する事業部門内の部門。 **注:** 部門を選択しない場合、デフォルト値は送信者が属する部門の名前になります。
プロジェクトマネージャー	このデマンドから作成されたプロジェクトにアサインされるプロジェクトマネージャー。プロジェクトが作成されると、このフィールドは読み取り専用になります。このフィールドは、[カテゴリ] フィールドが [戦略的] に設定されていて、かつ [タイプ] フィールドが [プロジェクト] に設定されている場合に表示されます。このデマンドから作成されたプロジェクトを削除すると、このフィールドは編集可能になります。
事業部門	デマンドの送信者が属する事業部門。
影響を受ける事業部門	送信されたデマンドの影響を受ける事業部門。
アイデア	デマンドの作成元となったアイデアの一意の識別番号。
ビジネスケイパビリティ	デマンドで 1 つ以上のビジネス機能を変更、拡張、または追加する場合は、それらの機能をデマンドに関連付けることができます。ビジネスケイパビリティ は、エンタープライズアーキ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォームの [詳細] セクション (続く)

フィールド	説明
	テクチャ (以前の アプリケーションポートフォリオ管理) モジュールで定義されます。
ビジネスアプリケーション	デマンドで 1 つ以上のビジネスアプリケーションを変更、拡張、または追加する場合は、それらのアプリケーションをデマンドに関連付けることができます。ビジネスアプリケーション は、エンタープライズアーキテクチャ (以前のアプリケーションポートフォリオ管理) モジュールで定義されます。 [ビジネス機能] フィールドで選択した機能に関連しているかどうかに関係なく、企業内の任意のビジネスアプリケーションを選択できます。

デマンドフォームの [ビジネスケース] セクション

フィールド	説明
戦略	デマンドが達成する組織の戦略的目標。1 つのデマンドで複数の戦略的目標を達成することができます。 デマンドの事業部門が [詳細] タブで選択されている場合、リストには、選択した事業部門のビジネス戦略が他の企業戦略とともに表示されます。
目標	選択した戦略に関連付けられた目標。デマンドは複数の目標を達成できます。 戦略が選択されていない場合は、すべての目標がリストに表示されます。
ビジネスケース	デマンドの裏付けとなるビジネス上の論拠。
実行リスク	デマンドが承認されて実装された場合のリスク。
不実行リスク	機会を失うリスクなど、デマンドが承認されない場合のリスク。
実現要因	デマンドの主要な実現要因。
バリア	デマンドの主要なバリア。
スコープの範囲内	デマンドのスコープ。デマンドの範囲を定義する一連の境界です。
スコープの範囲外	デマンドの範囲に含まれないアクティビティまたは成果物。スコープに定義されていないものはすべてスコープの範囲外です。
仮定	デマンドのために作成された仮定。仮定は、スコープとリスクの定義や、時間とコストの予測の微調整に役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォームの [財務] セクション

フィールド	説明
レートモデル	デマンドにアサインされたレートモデル。レートモデルは、関連するリソースのアサインとタイムカードの時給を導出するために使用されます。 **注:** デマンドに割り当てられたレートモデルが変更または削除された場合、関連するリソースのアサインのコストフィールドは再計算されません。
プロジェクト通貨	このデマンドからプロジェクトが作成された後に、そのプロジェクトの実行に使用される通貨。 通貨 [fx_currency] テーブルに示されている値のリストから、任意のアクティブな通貨を選択できます。 デマンドにコスト計画、利益計画、またはプロジェクト予算が含まれている場合、選択したプロジェクト通貨でプロジェクトを作成した後は、プロジェクトフォームでプロジェクト通貨を変更することはできなくなります。デマンドに計画または予算が添付されていない場合は、プロジェクトフォームでプロジェクト通貨を変更できます。 **注:** このフィールドのデフォルト値は、プロジェクトフォームのプロジェクト通貨ビューにある [財務] タブの [プロジェクト通貨] フィールドです。このフィールドは、PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効で、かつデマンド通貨ビューが有効化されている場合にのみ利用可能です。
資本経費	デマンドの資本的支出 (投資)。
運用経費	デマンドの運用支出 (経費)。
計画コストの合計	結果は、[資本経費] および [運用経費] フィールドの値に基づいて計算されます。
収支	結果は、[総コスト] および [予定利益] フィールドの値に基づいて計算されます。
予定利益	デマンドが承認された場合の推定収益。 この値は、デマンドの利益ブレークダウンからロールアップされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォームの [財務] セクション (続く)

フィールド	説明
	また、値を手動で入力することもできます。通貨アイコンを選択して、値を入力します。
ROI %	結果は、[総コスト] および [収支] フィールドの値に基づいて計算されます。 このフィールドの値は、[認定済み] または [承認済み] ステータスのデマンドに対してコスト計画、利益計画、またはリソースのアサインが作成または更新されると更新されます。
投資予算	すべての会計年度にわたってデマンドに割り当てられた資本予算の合計。 この値は、デマンドの投資予算からロールアップされます。
経費予算	すべての会計年度にわたってデマンドに割り当てられた運用予算の合計。 この値は、デマンドの経費予算からロールアップされます。
割引率 (%)	デマンドの割引率。 割引率は、将来のキャッシュフローの現在価値を決定するための利率です。
正味現在価値	所定の年利に基づく将来のキャッシュの現在価値。 これは、現在の支出額を将来予想される予定利益と比較するための指標です。投資パフォーマンス全体を評価する際に役立ちます。 たとえば、12% の割引率では、今日の 1.00 ドルは 2 年後に 0.80 ドルの価値になります。したがって、2 年後に 1.00 ドルを受け取ることは、今日 0.80 ドルを受け取ることと同じです。 正味現在価値 (NPV) は、年間合計コスト、年間の予定利益、およびデマンドの割引率から計算されます。
内部利益率 (%)	ゼロ NPV を達成するために必要な年利。 内部利益率 (IRR) は、収益の観点からどのデマンドがより高い利益率を実現できるかを判断する際に役立ちます。
デマンドの実績コスト	デマンドおよびデマンドタスクの作業中に発生した合計コスト。デマンドの実績コストは、デマンドタスクの受託者がタイムカードを作成して送信した後に表示されます。タイムカード

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォームの [財務] セクション (続く)

フィールド	説明
	が承認されると、レートカード、賃金レート、またはシステムのプロパティから導出されたリソースレートを使用して、このフィールドに値が入力されます。 **注:** New York にアップグレードする場合、このフィールドは既存のデマンドでは空のままです。このフィールドに値を入力するには、[デマンドの実績コストと実績工数の更新 (Update Demand Actual Cost and Actual Effort)] スケジュールジョブを実行します。
デマンドの実際の労力	送信および承認されたタイムカードから導出された、デマンドまたはデマンドタスクの作業中にリソースによって発生または費やされた時間。デフォルトでは、このフィールドはデマンドフォーム上では利用できません。必要に応じて、フォームを設定してこのフィールドを追加します。 **注:** New York にアップグレードする場合、このフィールドは既存のデマンドでは空のままです。このフィールドに値を入力するには、[デマンドの実績コストと実績工数の更新 (Update Demand Actual Cost and Actual Effort)] スケジュールジョブを実行します。

デマンドフォームの [アセスメントデータ] セクション

フィールド	説明
影響	デマンドによって生み出されたビジネスインパクト。
リスク	デマンドアセスメントから計算されたリスク値。
値	[影響度] および [収支] フィールドから計算されたデマンドのビジネス価値。
T シャツサイズ	デマンドのサイズ。 デマンドサイズのインジケーターとして **[T シャツサイズ]** を使用する前に、アプリケーションの外部で各オプションの定義を作成して公開することを検討してください。このプロセスによ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォームの [アセスメントデータ] セクション (続く)

フィールド	説明
	り、組織または部門全体で値が正しく一貫して解釈されるようになります。
スコア	デマンドスコアは、ベースシステムのリスク、価値、およびサイズ属性に基づいて計算されます。 リスク、価値、およびサイズ属性の値は、アセスメントメトリクスカテゴリの結果から導出されます。詳細については、「アセスメントメトリクスカテゴリとその結果」を参照してください。 • リスクと サイズが高いと、デマンドのスコアは低くなります。 • 価値が高いと、デマンドのスコアは高くなります。
アセスメントが必要	デマンドのアセスメントを有効にするためのオプション。 このフィールドは、デフォルトで選択されています。クリアされていると、デマンドに対してアセスメントアンケートがトリガーされなくなります。 デマンドが [ドラフト] または [送信済み] ステータスの場合、デマンドマネージャーのみがフィールドを更新できます。 **注:** このフィールドをクリアし、デマンドをドラフトにリセットすると、[アセスメントが必要] の値はクリアされたものとして保持されます。

注:
[値] フィールドと [スコア] フィールドの値は、[認定済み] または [承認済み] ステータスのデマンドに対してコスト計画、利益計画、またはリソースのアサインが作成または更新されると更新されます。これらのフィールドの値は、プロジェクト、拡張、欠陥、変更などのアーティファクトがデマンドから作成されるまでの間のみ更新されます。

デマンドフォームの [メモ] セクション

フィールド	説明
ウォッチリスト	デマンドに登録され、追加コメントを表示できるグループとユーザーのリスト。
作業メモリスト	デマンドに登録され、作業メモを表示できるグループとユーザーのリスト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドフォームの [メモ] セクション (続く)

フィールド	説明
作業メモ	デマンドに関する情報。顧客には表示されません。デマンドに関連付けられている他のユーザーとやり取りするために、デマンド管理ライフサイクル全体にわたって作業メモが追加されます。

デマンドフォームの [設定] セクション

フィールド	説明
デマンドをクローズ	デマンドがプロジェクトに変換された場合に、デマンドを自動的にクローズするタイミングを指定する選択肢。 • なし：プロジェクトに変換された後もデマンドを [オープン] ステータスのまま保持します。 • プロジェクトの作成時：デマンドがプロジェクトに変換されたときにデマンドをクローズします。 • プロジェクトのクローズ時：デマンドから作成されたプロジェクトがクローズされたときにデマンドをクローズします。 注: [プロジェクトの作成時] および [プロジェクトのクローズ時] オプションは、[タイプ] フィールドの値が [プロジェクト] に設定されている場合に表示されます。[タイプ] フィールドが [拡張] に設定されている場合は、デフォルトオプションとして [なし] が表示されます。
プロジェクト計算	デマンドがプロジェクトに変換されるときに、プロジェクトのタスク依存関係に使用する計算を指定する選択肢。 • マニュアル：依存関係に加えられた変更は、タスクの日付には反映されません。 • 自動：依存タスクまたは子タスクに加えられた変更を反映して、タスクの日付が自動的に更新されます。 注: デフォルトの計算方法として、[自動] が選択されています。

デマンドタスクフォーム

デマンドタスクフォームを使用して、デマンドのタスクを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

デマンドタスクフォーム

フィールド	説明
簡単な説明	デマンドタスクの名前。
アサイン先グループ	デマンドタスクにアサインされたグループ。
担当者	リデマンドタスクにアサインされたプライマリリソース。次の条件が適用されます。 • アサイン先グループが定義されている場合、アサイン先グループ内のユーザーのみが一覧表示されます。 • スキルが定義されている場合、それらのスキルを持つユーザーのみが一覧表示されます。 • アサイン先グループもスキルも定義されていない場合は、 プロジェクト管理 (PM) アプリケーションのいずれかのユーザーロールを持つユーザーのみが一覧表示されます。 • timecard_user ロールを持つユーザーも一覧表示されます。
他の受託者リスト	[アサイン先] フィールドで定義された単一のプライマリリソースに加えてデマンドタスクにアサインされたユーザー。
カテゴリ	デマンドタスクのカテゴリ： • 初期レビュー • 予定作業量 • コスト推定 • 利益概算 (Benefit estimate) • リスクアセスメント [カテゴリ] フィールドの選択により、関連リンクで利用可能なリンクが決まります。たとえば、[カテゴリ] の値を [予定作業量] に設定すると、[デマンドにリソースプランを追加] 関連リンクが表示されます。ユーザーは、これらの関連リンクを使用するための適切なロールを保有している必要があります。
実績工数	デマンドタスクの作業に費やされた実際の時間。このデマンドタスクに対して承認されたタイムカードから導出されます。 このフィールドは、デフォルトではデマンドタスクフォームに表示されないため、フォームをカスタマイズして追加する必要があります。
説明	デマンドタスクの簡単な説明。
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成 ID 番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドタスクフォーム (続く)

フィールド	説明
優先度	影響度と緊急度に基づいた、タスクを完了すべき順序。
状況	デマンドタスクの現在のステータス。状況には、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] などがあります。
期日	タスク完了のターゲット日付。
実績コスト	レートカードで定義されたリソースの作業時間数と時間単価から導出された、デマンドタスクの実績コスト。レートカードで見つからない場合、時間単価はデフォルトの賃金レートカードまたはデフォルトのシステムのプロパティから導出されます。
作業メモ	デマンドタスクに関する情報。デマンドに関連付けられている他のユーザーとやり取りするために、デマンド管理ライフサイクル全体にわたって作業メモが追加されます。 **注:** PPM のビジネスステークホルダーロールを持つユーザーは、このフィールドを表示できます。詳細については、「PPM のビジネスステークホルダーロール」を参照してください。

[投資予算] フォーム

[投資予算] フォームを使用して、各会計期間のデマンドの予算を割り当てます。

投資予算フォームの詳細

フィールド	説明
総計	予算金額を入力します。
会計期間	予算を割り当てる会計期間を選択します。
投資	この予算を割り当てる計画立案アイテムを選択します。 デフォルトでは、既存の予算が選択されています。
経費タイプ	リストから経費タイプを選択します。 • 投資 を選択して、 予算を投資コストに割り当てます。 • 予算を運用経費に割り当てるには、[経費] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[利益計画] フォーム

[利益計画] フォームを使用して、会計期間にデマンドによって発生した推定利益を指定します。

[利益計画] フォーム

フィールド	説明
名前	利益計画の内容を表す名前。
作業	利益計画が属するデマンド番号。
スポンサー	デマンドのスポンサー。
カテゴリ	利益のタイプ： • ハード：収益の観点から測定できる利益。 • ソフト：価値の観点から測定される利益。
サブカテゴリ	ハードおよびソフトの利益のサブカテゴリ。 [カテゴリ] フィールドの選択により、このフィールドで利用可能な選択肢が決まります。
利益タイプ	利益のタイプ。[金銭的な利益] を選択します。
オフセットタイプ (Offset type)	利益がいつ実現し始めるかを示すオフセットタイプフィールド。 選択したオフセットタイプの値が変更されると、それに応じて利益計画の開始日がシフトします。たとえば、オフセットタイプが [終了日] に設定されていて、デマンドの期日が変更された場合、デマンドの新しい期日に合わせて利益計画の開始日がシフトします。
作業開始日	デマンドの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [開始日] を選択した場合に表示されます。
作業終了日	デマンドの終了日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [終了日] を選択した場合に表示されます。
オフセット (OffSet)	利益計画の開始時点のオフセットタイプの前または後の期間の数。たとえば、オフセットタイプが [終了日] に設定され、オフセットが「-2」である場合、利益計画はデマンド終了日の 2 期間前になります。デマンドの終了日がシフトされると、利益計画の開始日が新しいデマンド期日の 2 期間前にシフトされます。
期間	利益計画の長さ (期間)。
会計期間の開始	会計期間の開始。選択した [プロジェクト/デマンドの開始日] または [プロジェクト/デマンドの終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] の値に基づいて設定されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。 会計期間の開始を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[利益計画] フォーム (続く)

フィールド	説明
会計期間の終了	会計期間の終了。 会計期間の終了を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
関連利益	この金銭的利益計画に関連付けられている金銭以外の利益。

[利益計画] フォームの [財務] セクション

フィールド	説明
入力通貨での利益	潜在的利益の推定額。 利益計画の計画利益に変更があると、将来の会計期間について、関連する利益ブレークダウン値が更新されます。
入力通貨 (Entered currency)	利益計画の通貨。 選択した通貨がファイナンシャルマネジメントアプリケーションで設定されたデフォルトの通貨と異なる場合は、予算参照レートを使用して、デマンドの予定利益が計算されます。
機能通貨	ファイナンシャルマネジメントアプリケーションで構成されたデフォルト通貨。デマンドやプロジェクトの管理で使用されます。
合計計画利益	利益ブレークダウンからロールアップされた利益値の合計。
機能通貨での利益	機能通貨で、デマンドから発生する利益。[入力通貨] が機能通貨と異なる場合、このフィールドの値が変わります。
実績利益	実績利益値は、利益ブレークダウンの実績利益からロールアップされます。
繰り返し	利益ブレークダウンの各会計期間で利益が繰り返し発生するかどうかを示すチェックボックス。

[金銭的利益ブレークダウン **(Monetary Benefit Breakdown)]** フォーム

[金銭的利益ブレークダウン (Monetary Benefit Breakdown)] フォームを使用して、特定の会計年度の推定および実際の金銭的利益を更新します。

[金銭的利益ブレークダウン **(Monetary Benefit Breakdown)]** フォーム

フィールド	説明
タスク	利益計画ブレークダウンが属するタスク。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[金銭的利益ブレークダウン **(Monetary Benefit Breakdown)**] フォーム (続く)

フィールド	説明
ポートフォリオ	利益計画ブレークダウンが属するポートフォリオ。
入力通貨	利益計画で指定された通貨。
為替レート	利益計画ブレークダウンに対応する期間に対して有効なレート。利益計画ブレークダウンに対応する期間に複数のレートがある場合、その期間の最初の日付で有効なレートが使用されます。 為替レートは、入力通貨での利益を機能的利益に変換するために使用されます。これは、itfm_fx_rate [budget_reference_rates] テーブルから取得されます。
実績利益	プロジェクトまたはデマンドから発生する実績利益。
利益計画	利益計画ブレークダウンが属する利益計画。
会計期間	期間レベルで生成される会計。期間については、「会計カレンダー」を参照してください。
入力通貨での利益	入力通貨での利益。
機能的利益	為替レートと入力通貨での利益を乗算して得られる機能的利益。
為替レート日付	利益計画ブレークダウンに対応する会計期間の最初の日付。

[金銭以外の利益計画] フォーム

[金銭以外の利益計画] フォームを使用して、デマンドの実行時に発生する金銭以外の潜在的な利益を指定します。

[利益計画] フォーム

フィールド	説明
名前	利益計画の内容を表す名前。
作業	利益計画が属するデマンド番号。
スポンサー	デマンドのスポンサー。
カテゴリ	利益のタイプ： • ハード：収益の観点から測定できる利益。 • ソフト：価値の観点から測定される利益。
サブカテゴリ	ハードおよびソフトの利益のサブカテゴリ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[利益計画] フォーム (続く)

フィールド	説明
	[カテゴリ] フィールドの選択により、このフィールドで利用可能な選択肢が決まります。
利益タイプ	利益のタイプ。[金銭以外の利益] を選択します。
オフセットタイプ (Offset type)	利益がいつ実現し始めるかを示すフィールド。 選択したオフセットタイプの値が変更されると、それに応じて利益計画の開始日がシフトします。たとえば、オフセットタイプが [終了日] に設定されていて、デマンドの期日が変更された場合、デマンドの新しい期日に合わせて利益計画の開始日がシフトします。
作業開始日	デマンドの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [開始日] を選択した場合にのみ表示されます。
作業終了日	デマンドの終了日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [終了日] を選択した場合にのみ表示されます。
オフセット (OffSet)	利益計画の開始時点のオフセットタイプの前または後の期間の数。たとえば、オフセットタイプが [終了日] に設定され、オフセットが「-2」である場合、利益計画はデマンド終了日の 2 期間前になります。デマンドの終了日がシフトされると、利益計画の開始日が新しいデマンド期日の 2 期間前にシフトされます。
期間	利益計画の長さ (期間)。
会計期間の開始	会計期間の開始。選択した [プロジェクト/デマンドの開始日]、または [プロジェクト/デマンドの終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] フィールドの値に基づいて設定されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。 会計期間の開始を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
会計期間の終了	会計期間の終了。 会計期間の終了を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
関連利益	この金銭以外の利益計画に関連付けられている金銭的利益。

利益計画フォームの [金銭以外の詳細] セクション

フィールド	説明
測定	金銭以外の利益計画の測定のタイプ。測定タイプは、カウント、パーセンテージ、時間、日、スコアです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

利益計画フォームの [金銭以外の詳細] セクション (続く)

フィールド	説明
	定量化できない利益を追跡するには、[はい/いいえ] オプションを選択します。このオプションを選択した場合、利用できるフィールドは [利益の達成] のみです。チェックボックスをオンにして、利益が達成されたことを示すことができます。
金銭以外の入力通貨での利益	潜在的利益の推定値。 利益計画の計画利益に変更があると、将来の会計期間についてのみ、関連する利益ブレークダウン値が更新されます。
金銭以外の計画利益	利益ブレークダウンからロールアップされた利益値。
利益の達成	利益が達成されたかどうかを示すオプション。
ブレークダウンタイプ	利益計画を保存するときのブレークダウン作成のタイプ。 • なし：ブレークダウンは作成されません。 • 自動：金銭以外の利益計画ブレークダウンレコードがデータとともに自動的に作成されます。ブレークダウンは線形に計算されます。 • 手動: 金銭以外の利益計画ブレークダウンレコードは自動的に作成されますが、[入力通貨での利益] 列にデータは存在しません。
アグリゲーションモード	ブレークダウンから利益計画へのロールアップをどのように行うかを決定し、[金銭以外の計画利益] および [金銭以外の実績利益] フィールドの値を更新します。 • 合計：すべてのブレークダウンのデータを集計します。 • 平均：すべてのブレークダウンの平均値。 • 最新：最新のブレークダウン値。 • 最大：ブレークダウンの最大値。 • 最小:ブレークダウンの最小値
金銭以外の実績利益	金銭以外の利益計画ブレークダウンの実績利益からロールアップされる実績利益値。

[金銭以外の利益計画明細] フォーム

[金銭以外の利益計画明細] フォームを使用して、特定の会計年度の推定および実際の金銭以外の利益を更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[金銭以外の利益計画明細] フォーム

フィールド	説明
タスク	利益計画ブレークダウンが属するタスク。
ポートフォリオ	利益計画ブレークダウンが属するポートフォリオ。
測定	利益計画で指定された測定タイプ。
実績利益	プロジェクトまたはデマンドから発生する実績利益。
利益計画	利益計画ブレークダウンが属する利益計画。
会計期間	期間レベルで生成される会計。期間については、「会計カレンダー」を参照してください。
入力通貨での利益	入力した値での利益。
差異	推定利益と実績利益の差。

[コスト計画] フォーム

[コスト計画] フォームを使用して、デマンドのコストをキャプチャします。

[コスト計画] フォーム

フィールド	説明
名前	コスト計画の内容を表す名前。
プロジェクト/デマンド	コスト計画が属するデマンド番号。
会計期間の開始	会計期間の開始。 会計期間の開始を変更すると、関連付けられたコストブレークダウンの値も変更されます。
会計期間の終了	会計期間の終了。 会計期間の終了を変更すると、関連付けられたコストブレークダウンの値も変更されます。

コスト計画フォームの [財務] セクション

フィールド	説明
入力通貨	コスト計画の通貨。 選択した通貨がファイナンシャルマネジメントアプリケーションで設定されたデフォルトの通貨と異なる場合は、予算参照レートを使用して、デマンドのコストが計算されます。
単位コスト	リソース単体のコスト。
数量	必要なリソースの数量。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コスト計画フォームの [財務] セクション (続く)

フィールド	説明
繰り返し	コストが会計期間ごとに繰り返し発生するかどうかを示すオプション。 会計期間ごとに、数量 x 単位コストが発生します。
原価費目	原価費目。「原価費目定義の作成」を参照してください。
投資	プロジェクトに対して作成された投資の名前。 このフィールドは、従来の投資枠管理 (com.snc.investment_funding) プラグインが有効になっている場合、または投資枠管理 (sn_invst_pln) アプリケーションがインストールされている場合のみ表示されます。
ソースタイプ	資金調達のためのプロジェクト投資に関連付けられる資金調達エンティティ。 このフィールドは、従来の投資枠管理 (com.snc.investment_funding) プラグインが有効になっている場合、または投資枠管理 (sn_invst_pln) アプリケーションがインストールされている場合のみ表示されます。
ソース	資金を要求する元となる資金調達エンティティの値。 [ソースタイプ] フィールドで値を選択すると、このフィールドを使用できます。 このフィールドは、従来の投資枠管理 (com.snc.investment_funding) プラグインが有効になっている場合、または投資枠管理 (sn_invst_pln) アプリケーションがインストールされている場合のみ表示されます。
合計計画コスト	コスト計画の合計計画コスト。コストが繰り返し発生している場合、計算は数量 x 単位コスト x 会計期間の数となります。 コストが繰り返し発生していない場合、計算は数量 x 単位コストとなります。 この値は、コストブレークダウンからロールアップされます。
機能通貨	ファイナンシャルマネジメントアプリケーションで構成されたデフォルト通貨。デマンドやプロジェクトの管理で使用されます。
機能通貨でのコスト	機能通貨でのデマンドの合計計画コスト。[入力通貨] が機能通貨と異なる場合、このフィールドの値が変わります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コスト計画フォームの [財務] セクション (続く)

フィールド	説明
実際の合計コスト	コスト計画の実際の合計コスト。この値は、コストブレークダウンからロールアップされます。

経費ラインフォーム

経費ラインフォームを使用して、特定のコストをデマンドに関連付けます。

経費ラインフォーム

フィールド	説明
番号	自動生成された番号。
総計	通貨タイプを選択して、経費コストを入力します。
日付	経費が発生した日付。
処理日	経費ラインが処理された日付。
ソース ID	関連コストを生成したレコード。
状況	経費ラインのステータス。ステータスは [処理待ち] または [処理済み] になります。コストロールアップは、経費ラインが処理されている場合にのみ発生します。
コスト計画	経費ラインを作成するコスト計画の名前。
サマリータイプ	経費をグループ化するカテゴリを選択します。
原価費目	原価費目を選択します。
経費タイプ	資本経費の場合は [投資] を、運用経費の場合は [経費] を選択します。
簡単な説明	経費タイプの簡単な説明を入力します。
ソース	経費ラインのソースのレコードを選択します。これらのソースは次のとおりです。 • 資産 • 固定資産 • 契約 • ユーザー • 構成アイテム • タスク • コストセンター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソースコストを再計算] フォーム

[リソースコストを再計算] フォームを使用して、リソースのアサインコストが最新であることを確認します。

[リソースコストを再計算] ダイアログボックス

フィールド	説明
開始日	コストを再計算する期間の開始日。 デフォルトでは、フィールドには現在の日付が表示されます。
終了日	コストを再計算する期間の終了日。 このフィールドには、デフォルトでデマンドの期日が表示されます。デマンドに期日が指定されていない場合、フィールドは空になります。
要求されたリソース計画の計画コスト (Planned costs for Requested Resource plans)	要求されたリソース計画の計画コストを再計算するためのオプション。
確認済み/割り当て済みリソース計画の確認済み/割り当て済みコスト (Confirmed/Allocated costs for Confirmed/Allocated resource plans)	確認済みまたは割り当て済みのリソース計画の確認済みまたは割り当て済みコストを再計算するためのオプション。
確認済み/割り当て済みリソース計画の計画コスト (Planned costs for Confirmed/Allocated resource plans)	確認済みまたは割り当て済み計画の計画コストを含めるためのオプション。 このオプションは、[確認済み/割り当て済みリソース計画の確認済み/割り当て済みコスト **(Confirmed/Allocated costs for Confirmed/Allocated resource plans)]** オプションが選択されている場合に有効になります。 デフォルトでは、このオプションは選択されていません。

要件フォーム

要件フォームを使用して、新しい要件をデマンドに追加します。

要件フォーム

フィールド	説明
番号	要件の一意の識別番号。新しい要件レコードが作成されると、この番号が自動的に生成されます。
ソース	要件を要求しているユーザー。このフィールドには、フォームに入力しているユーザーの名前が自動的に入力されますが、ソースは要件を特定した別のユーザーである可能性もあります。
所有者	要件の管理または要件が満たされていることを確認する責任を担うユーザー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要件フォーム (続く)

フィールド	説明
工数概算	要件と関連タスクを完了するための概算時間。
優先度	全体的なデマンドに適用される要件の重要性。
状況	要件のステータスは、[処理待ち]、[承認済み]、または [却下] です。 **注:** 要求ステータスは、デマンド要求ステータスおよび要件に関連付けられた計画タスクの状況に依存しません。要件ステータスを [クローズ済み] にせずに、要求をクローズすることができます。同様に、要求を終結しても、要件のステータスは変更されません。
タイプ	要件のタイプは、[ビジネス]、[ソリューション (機能的)]、[ソリューション (非機能的)]、[品質]、[ステークホルダー]、または [移行] です。
簡単な説明	要件の簡単な説明。
説明	要件と関連付けられたタスクの詳細な説明。たとえば、このフィールドを使用して、期待される成果または結果を記述することができます。

リスクフォーム

リスクフォームを使用して、デマンドにリスクを追加します。

リスクフォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成 ID 番号。
状況	リスクの現在のステータス。すべての新しいリスクは、[処理待ち] ステータスで作成されます。 使用可能なステータスは、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] です。
リスクステータス	リスクのステータス。使用可能なオプションは、[処理待ち]、[達成]、[未達成]、[回避]、[軽減 (Mitigate)]、[転送]、および [承認] です。
確率 (Probability)	リスクに記載されているイベントが発生する可能性。使用可能なオプションは、[絶対]、[高]、[中]、および [低] です。
影響	デマンドの結果に対するリスクイベントの影響。
コスト概算	リスクイベントによって生成されるコスト概算。
リスクのランク	リスクにアサインされた値と色。この値は、リスクの確率と影響度を使用して計算されます。リスク値のルックアップを使用して色と値を設定できます。詳細については、「デマンドのカスタムリスクランクとリスク値の設定」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リスクフォーム (続く)

フィールド	説明
リスクオーナー (Risk owner)	リスクの監視と管理を担当するプライマリリソース。
担当者	リスクの対応をアサインされたプライマリリソース。
リスク値	リスク値のルックアップから計算された値。詳細については、「デマンドのカスタムリスクランクとリスク値の設定」を参照してください。
期日	アサインされたリソースへのリスク解決の要求日、またはリソースにアサインされていない場合にリスクをクローズまたは対処する必要がある日付。
タスク	このリスクが属するデマンド。
簡単な説明	イベント、およびイベントがデマンドの成功に与える潜在的な影響の簡単な説明。
説明	イベントとその潜在的な影響の詳細。
軽減計画 (Mitigation plan)	リスクイベントによって生成されたコスト。この情報は、イベントが発生した場合に追加されます。
作業メモ	リスクを軽減するために行う取り組みの簡単な説明。

リスク値マッチャーフォーム

リスク値マッチャーフォームを使用して、リスクの影響度と可能性を評価します。

リスク値マッチャーフォーム

フィールド	説明
影響	リスクの影響度の値。 デフォルト値は次のとおりです。 • 1 = 高 • 2 = 中 • 3 = 低
アプリケーション	これらのリスク値が属するアプリケーション。
リスクランキングの色	リスクの重大度を示す色。 ヒント: 色のバリエーションを入力して、影響度と確率の値が類似しているリスクを区別できます。たとえば、重大度の低いリスクを示すために **[lightgreen]** と入力できます。
リスク値	指定されたリスクの影響度と確率の組み合わせの値。 オプションは、[高]、[中]、および [低] です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リスク値マッチャーフォーム (続く)

フィールド	説明
	この値は、リスクフォームの [リスク値] フィールドに表示されます。
確率 (Probability)	リスクの影響度値に関連付けるリスクの確率値。オプションは、[絶対]、[高]、[中]、および [低] です。
確率数	確率を示す数値。この値に [影響度] フィールドの値を乗算して、リスクのランクが計算されます。 デフォルト値は次のとおりです。 • 1 = 絶対 • 1 = 高 • 2 = 中 • 3 = 低 計算されたリスクのランクとリスクランキングの色は、リスクフォームの [リスクのランク] フィールドに表示されます。

問題フォーム

問題フォームを使用して、問題をデマンドに追加します。

問題フォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成 ID 番号。
状況	問題の現在のステータス。すべての新しい問題レコードは、[オープン] ステータスで作成されます。 使用可能なステータスは、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] です。
優先度	考えられる影響度に基づいて問題を解決または管理する緊急性。
コスト概算	問題によって生成されるコスト概算。
影響	問題が未解決のままである場合のデマンドの結果への影響。
期日	アサインされたリソースへの問題解決の要求日、またはリソースにアサインされていない場合に問題をクローズまたは対処する必要がある日付。
担当者	問題解決の対応をアサインされたプライマリリソース。
親	この問題が属するデマンド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

問題フォーム (続く)

フィールド	説明
簡単な説明	問題、および問題がデマンドの成功に与える潜在的な影響の簡単な説明。 問題のタイトルを入力し始めると、問題と一致する可能性がある関連する問題が表示されます。 提案アイコン ( ) をクリックして、事前定義された問題の説明のリストから選択します。
説明	問題とその潜在的な影響の詳細。
作業メモ	問題解決のために完了した作業を記録および追跡するための情報。

意思決定フォーム

意思決定フォームを使用して、デマンドに意思決定を追加します。

意思決定フォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成 ID 番号。
状況	意思決定の現在のステータス。すべての新しい意思決定レコードは、[オープン] ステータスで作成されます。 使用可能な状況は、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] です。
優先度	考えられる影響度に基づいて意思決定を承認または実装する緊急性。
意思決定ステータス	意思決定のステータス。使用可能なオプションは、[処理待ち]、[承認済み]、および [却下] です。
影響	意思決定を実装しない場合のデマンドの結果への影響。
承認が必要	意思決定の承認が必要かどうかを決定するためのオプション。
コスト概算	意思決定を実装するためのコスト概算。
期日	意思決定を承認または実装する必要がある要求日。
担当者	意思決定の対応をアサインされたプライマリリソース。デフォルト値は、意思決定レコードを作成するユーザーの名前です。
親	この意思決定が属するデマンド番号。
簡単な説明	意思決定の内容、意思決定者、意思決定の影響、および意思決定の結果など、意思決定の簡単な説明。 意思決定のタイトルを入力し始めると、意思決定と一致する可能性がある関連する意思決定が表示されます。 提案アイコン ( ) をクリックして、事前定義された意思決定の説明のリストから説明を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

意思決定フォーム (続く)

フィールド	説明
説明	意思決定とその潜在的な影響の詳細。
作業メモ	意思決定の実装または承認のステータスを記録および追跡するための情報。

アクションフォーム

アクションフォームを使用して、デマンドにアクションを追加します。

アクションフォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成番号。
状況	アクションの現在のステータス。すべての新しいアクションレコードは、ステータスを [オープン] に設定して作成されます。 使用可能なステータスは、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] です。
優先度	影響度に基づいてアクションを実装または承認する緊急性。
コスト概算	アクションによって生成されるコスト概算。
影響	アクションを実装しない場合のデマンドの結果への影響。
承認	アクションのステークホルダーからの承認のステータス。使用可能なオプションは、[未要求]、[要求済み]、[承認済み] および [却下] です。
担当者	アクションを実装するためにアサインされたプライマリリソース。
期日	アクションを承認または実装する必要がある要求日。
親	このアクションが属するデマンド。
簡単な説明	アクションで必要になる内容、アクションの実装方法、影響を受けるユーザー、およびアクションの結果など、アクションの簡単な説明。 アクションのタイトルを入力し始めると、アクションのタイトルと一致する可能性がある関連アクションが表示されます。 提案アイコン ( ) をクリックして、事前定義されたアクションのリストから説明を選択します。
説明	アクションとその潜在的な影響の詳細。
作業メモ	アクションに関する情報。作業メモを追加して、アクションの承認、却下、または実装のステータスについて他のユーザーとやり取りします。

変更要求フォーム

変更要求フォームを使用して、デマンドのスコープ、リソース要件、コスト、スケジュールなどのデマンドのメトリクスを変更します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変更要求フォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成 ID 番号。
状況	変更要求の現在のステータス。すべての新しい変更要求レコードは、[オープン] ステータスで作成されます。 使用可能な状況は、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] です。
優先度	影響度に基づいて要求された変更を承認する緊急度。
コスト概算	要求された変更によって生成されるコスト概算。
影響	要求された変更を承認しない場合のデマンドの結果への影響。
承認	要求された変更のステークホルダーからの承認のステータス。
担当者	変更要求の対応をアサインされたプライマリリソース。
期日	変更要求を完了するための要求日。
カテゴリ	変更要求の作成対象のエンティティ。オプションは、[リソース]、[スコープ]、[コスト]、および [スケジュール] です。
親	この変更要求が属するデマンド。
タイトル	変更要求のタイトル。
説明	変更要求とその潜在的な影響の詳細。
ビジネス上の根拠	デマンドで提案された変更を要求する理由とそのビジネスへの影響。
作業メモ	デマンドの変更要求の進捗状況を示す追加情報。

自動翻訳

プロジェクト管理® (PM)


ServiceNow® プロジェクト管理 (PM) アプリケーションは、プロジェクト、タスク、およびリソースの管理を支援するツールスイートです。いくつかのタスクを含む小規模なプロジェクトから、さまざまな関係や依存関係を持つ複雑なタスクを含む大規模なポートフォリオまで、作成および管理できます。

プロジェクト管理 (PM) の目的、プロジェクトワークスペースとテンプレート、ベースライン、プロジェクトに関する考慮事項、およびプロジェクトの表示などの、プロジェクトとプログラム管理の概要。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


開始

探

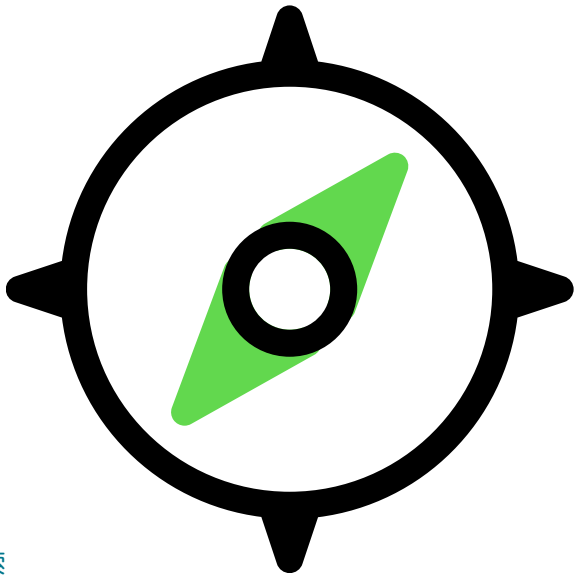

索
機能とビジネス価値を学ぶ プロジェクト管理 (PM)


構

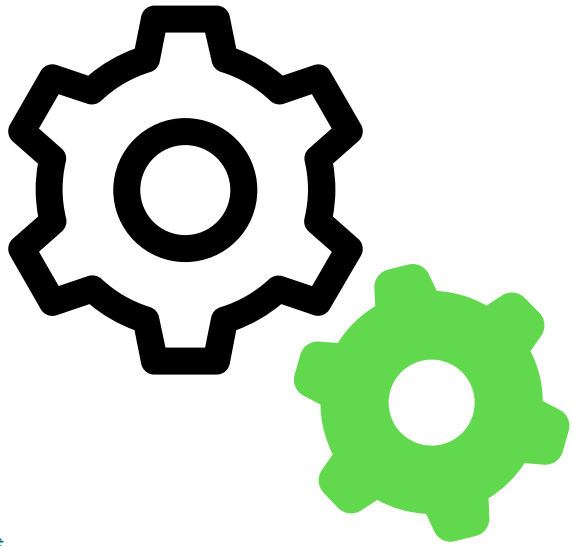

成
の構成の設定


コ

使用方

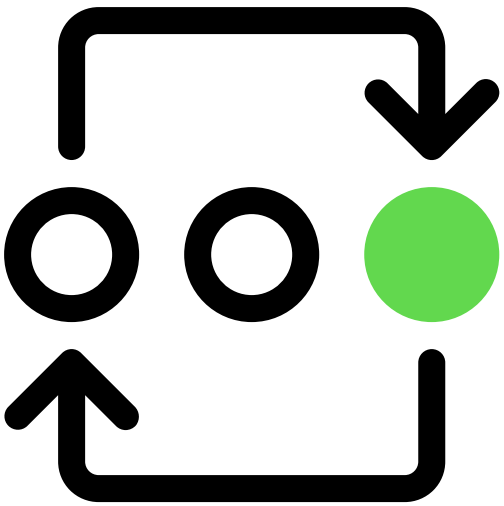

法
プロジェクトを管理する プロジェクト管理 (PM)

参

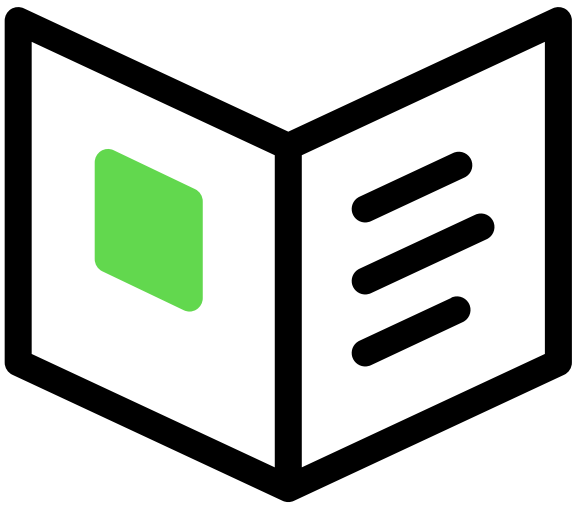

照
フォームとフィールドについて説明します。 プロジェクト管理 (PM)

の

自動翻訳

プロジェクト管理 **(PM)** の探索

プロジェクト管理 (PM) (PM) アプリケーションを使用してプロジェクトを作成、表示、および管理します。


プロジェクト管理 **(PM)**の概要

プロジェクトとは、目標の達成を目的として共同で取り組む計画された作業です。プロジェクト管理 (PM) アプリケーションは、プロジェクトの計画と追跡に役立つだけでなく、他のアプリケーションとも統合できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトを管理するための道筋は複数あります。最適な道筋は、通常、ビジネスニーズによって異なります。図のフェーズは、最小限の労力でプロジェクトを立ち上げて実行できるように設計されています。

プロジェクトフェーズ



プロジェクト管理 **(PM)** のメリット

プロジェクト管理 **(PM)**のメリット

メリット	機能	ユーザー
プロジェクトの開始	プロジェクトを設定し、タスクを追加して、リソースを割り当てた後、プロジェクトを開始します。	it_project_manager
プロジェクトからのプロジェクトタスクの作成	プロジェクトフォームからプロジェクトタスクを作成します。	it_project_manager
プロジェクトのベースラインの作成	ベースラインを使用して、プロジェクトのすべてのタスクとマイルストーンの予定日をキャプチャします。	pps_admin
マイルストーンの作成	マイルストーンを使用して、主要な意思決定ポイント、承認、および休日など、プロジェクトの重要な日付をマークします。	it_project_manager
プロジェクトの金銭的利益計画の作成	金銭的利益計画を作成して、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する利益をキャプチャします。	it_project_manager
プロジェクトの金銭以外の利益計画の作成	金銭以外の利益計画を作成して、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する予定以外の利益をキャプチャします。	it_project_manager
プロジェクトコスト計画の作成	コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。	it_project_manager
プロジェクトの RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの追加	リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求レコード (RIDAC) を作成し、プロジェクトの問題またはリスクを特定します。	it_project_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト管理 **(PM)**のメリット (続く)

メリット	機能	ユーザー
プロジェクトへのテンプレートの適用	プロジェクトテンプレートを使用して、プロジェクト構造を作成、保存、および再利用します。	it_project_manager
プロジェクトの外部依存関係の追加	外部依存関係を使用して、あるプロジェクトのタスクから別のプロジェクトのタスクへの依存関係を設定します。	it_project_manager
プロジェクトのインポートとエクスポート	Microsoftプロジェクトからプロジェクト管理 (PM)へのプロジェクトをインポートまたはエクスポートします。	it_project_manager
プロジェクト診断	プロジェクト診断を使用して、タスクの有効性、依存関係、関係などのプロジェクト内の破損データを検出します。	it_pps_admin、adt_admin
投資ポータル	投資ボードを作成し、投資ポータルを使用して他のステークホルダーと共有します。	it_project_managerまたはit_project_user
プロジェクトステータスアプリケーションを使用したプロジェクトのステータスの管理	プロジェクトステータスアプリケーションを使用して、プロジェクトのステータスを追跡し、ステークホルダーと協力して例外を解決し、場所に関係なくタイムリーなアクションを実行します。	portfolio_manager、project_managerまたはprogram_manager
プロジェクトワークベンチの使用 - 従来	プロジェクトワークベンチは、ウォーターフォール、アジャイル、およびテストの各フェーズを単一のプロジェクトフレームワークに組み合わせることで、ハイブリッドプロジェクトモデルをサポートします。	it_project_manager
プロジェクト管理 (PM) でのチームスペースの使用	チームスペースを使用して、主要な PPM モジュールを 1 か所に集約し、アクセシビリティとチームの生産性を向上させます。	it_pps_admin、admin
PPM Collaboration アプリケーションを使用したプロジェクトチームとのコラボレーション	PPM Collaboration アプリケーションを使用して、Slack または Microsoft Teams でのチームコラボレーションを強化します。	it_project_manager
PPM の仮想エージェント	PPM の仮想エージェントを使用してメッセージングプラットフォームを介して仮想エージェ	admin、virtual_agent_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト管理 **(PM)**のメリット (続く)

メリット	機能	ユーザー
	ントとやり取りすることで、ビジネス関連情報を取得します。	

プロジェクトポートフォリオ管理 との統合

プロジェクト管理 (PM)は別のアプリケーションとして使用することも、PPM の一部として有効にすることもできます。

このアプリケーションは、いくつかの個別のアプリケーションを組み合わせ、プロジェクト開発ライフサイクルのさまざまなコンポーネントを統合することで、IT 開発に対する簡素化されたチーム指向のアプローチを提供します。

次に探索する内容

プロジェクト管理 (PM)を構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。

- プロジェクト管理 (PM)の構成
- プロジェクト管理 (PM) の使用
- プロジェクト管理 (PM)の参照

プロジェクト管理 **(PM)** の基本

プロジェクト管理 (PM)で使用される基本的な用語について説明します。

ボトムアップタスク

ボトムアップ (戦術的) タスクとは、必要な小さい個々の作業単位を計画し、より大きなフェーズを含むようにプロジェクトをビルドすることを意味します。達成する必要がある個々のタスクがわかっていて、プロジェクト全体の期間とコスト概算についてより柔軟に対応できる場合は、このアプローチを採用します。このアプローチを使用すると、各タスクを含めた場合にプロジェクトのコストと所要時間がどの程度になるかを把握できます。プロジェクト管理 (PM) は、プロジェクト期間などの複数のプロジェクトフィールドでロールアップ計算を使用して戦術的なタスクをサポートし、含まれるタスクに合わせてプロジェクトが調整されるようにします。これは、プロジェクト管理 (PM)アプリケーションに推奨されるアプローチです。

トップダウンタスク

トップダウン (戦略的) タスクとは、最初に高レベルのタスクを計画し、その後で作業を小さな単位に分割することを意味します。固定された、または柔軟性のない時間と予算の制約があり、フェーズが明確に定義されたプロジェクトをビルドする場合は、このアプローチを採用します。タスク間のマイルストーンと依存関係を最初から考慮し、明確に設定します。後でプロジェクトに小さなタスクを少しずつ追加していきます。このアプローチでは、可能性のあるすべてのタスクをプロジェクトに含めることを回避し、どのタスクを含めるか柔軟に対応できます。

注:
この方法を使用する場合でも、プロジェクト管理 (PM)アプリケーションは、タスク期間などのいくつかの値をロールアップします。プロジェクトよりも期間が長いタスクを作成すると、タスクの全期間をカバーするように拡張され、このアプローチを使用する目的が損なわれます。値は親タスクからロールダウンされません。また、親の指定された期間よりも長い子タスクを作成することに制限はありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトの関係と依存関係

プロジェクト管理 (PM) アプリケーションを使用すると、タスク間の親子関係、およびタスク間の依存関係 (終了 - 開始、終了 - 終了など) を作成できます。タスクの依存関係は、1 つのタスクが先行タスクと後続タスクとの関係に基づいて開始または終了できない場合に作成されます。

プロジェクトの関係と依存関係

コンセプト	説明
終了 - 開始の依存関係	先行タスクが終了するまでタスクを開始できないことを示す依存関係。
開始 - 開始の依存関係	先行タスクが開始されるまで後続タスクを開始できないことを示す依存関係。
開始 - 終了の依存関係	先行タスクが開始されるまで後続タスクを終了できないことを示す依存関係。
終了 - 終了の依存関係	別のタスクが終了するまでタスクを終了できないことを示す依存関係。
遅延時間	先行タスクと後続タスクの間の手動で指定された中断時間。
親タスク	配下に子タスクと呼ばれるより小さなタスクを持つプロジェクトタスク。子タスクは、親タスクの作業をより管理しやすいサブセットに分割します。子タスクの特定のフィールド (終了予定日など) はロールアップされ、親タスクの同じフィールドに影響します。
子タスク	より大きなタスクのサブセットであるプロジェクトタスク。子タスクの開始日を親タスクの開始日より前にすることはできません。
ロールアップタスク	労力やリソースなどの子タスクアイテムをより大きな親タスクの計算に集計するコンテキストにおける親タスクの別の用語。ロールアップタスクフォーム内のすべてのフィールドは読み取り専用です。
ロールダウン	ステータスの変更は、プロジェクトからプロジェクトタスクへ、および親タスクから子タスクへとロールダウンされます。

注:
2 つのタスク間に存在できる関係は 1 つだけです。

プロジェクト管理 (PM)アプリケーションは、タスクの計算方法と動作を制御する複数のプロパティを提供します。詳細については、「プロジェクトプロパティ」を参照してください。

タスク時間の制約

プロジェクト管理 (PM) アプリケーションは、いくつかのタイプの依存関係をサポートしています。

プロジェクトタスクフォームには [時間の制約] フィールドがあり、次のいずれかの値に設定できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- タスクが [すぐに開始] に設定されている場合：依存関係で許される場合、タスクは開始としてガントチャートに表示されます。ただし、関係に遅延の値が設定されている場合、タスクは後の日付で開始できます。
- タスクが [特定の日に開始] に設定されている場合：タスクは制約日付に開始としてガントチャートに表示されます。このようなタスクの開始日は、タスクを別のタスクとの関係 (FS 関係など) に置いた後でも影響を受けません。
- タスクが [以下以降に開始] に設定されている場合：タスクは制約日付以降に開始としてガントチャートに表示されます。タスクに先行タスクがない場合、タスクは指定された日付に開始されます。開始日は、先行タスクの終了日に基づいて、またはタスクが別のタスクとの関係 (FS 関係など) にある場合、後の日付に変更されます。
- タスクが [以下以前に開始] に設定されている場合：タスクは制約日付以前に開始としてガントチャートに表示されます。タスクに先行タスクがある場合、先行タスクへの依存関係によって、タスクをいつ開始できるかが決まります。先行タスクが [制約日付] フィールドで指定された日付を超えてタスクを移動しようとすると、スケジューリングの競合が発生します。

  注:
  プロジェクトプロパティの [関係の追加後もタスクに対する開始日の制約を保持します] は、[開始日時 **(Start on)]** の選択の動作を制御します。このプロパティはデフォルトで True に設定されており、編集することはできません。

- 依存関係を遵守していないタスクは、計画立案コンソールに赤色のカレンダーアイコン ( ) で示されます。タスクで依存関係が遵守され、それに応じて開始が調整されるようにする場合は、タスクの制約タイプを [すぐに開始]に変更します。

親子タスク関係

タスクが比較的大きく、異なる管理スキルを持つ複数のユーザーが必要な場合は、タスクをサブタスクに分割して、親子関係を作成します。子タスクは比較的小さく、管理しやすいサイズの作業です。

子タスクを親の下でグループ化すると、[コスト概算] などの値がアグリゲートされ、親タスクにロールアップされます。そのため、親タスクは、子タスクのサマリータスクまたはロールアップタスクの形をとります。開始予定日と終了予定日のロールアップは、子タスクを作成するときに発生します。親の期間が、その子タスクをカバーするように自動的に調整されます。

親子関係は、依存関係とは異なります。依存関係では、あるタスクは別のタスクが開始する前に終了する必要があります。親子関係では、依存関係の有無にかかわらず、任意の数のタスクを親タスクの下にネストできます。親子関係を作成すると、親タスク番号が、[プロジェクトタスク] テーブルの [親] フィールドに保存されます。すべてのプロジェクト管理 (PM) タスクには親があります。別のプロジェクトタスクまたはプロジェクト自体のいずれかです。

依存関係とは異なり、親子関係は、どのテーブルにもレコードとして保存されません。親子関係が変更されたときに行われる変更は、子タスクレコードの [親] フィールドのみです。

異なる親を持つ子タスク間、2 つの異なる親タスク間、または子タスクと別の親タスク間に、先行 - 後続関係を作成できます。ただし、後続タスクの開始後に先行タスクが終了した場合、異なる親を持つ子タスク間に依存関係を作成することはできません。

注:
ガントチャートでは、親タスクをドラッグアンドドロップして、階層全体をスケジュール上の新しい場所に移動できます。

親子関係における時間の制約

親子タスク関係は、タスク時間の制約にいくつかの影響を及ぼします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

子タスクが [すぐに開始] に設定されている場合

子タスクは親タスクと同時に開始されます。プロジェクト自体が親として設定されている場合、[すぐに開始] タスクは他の子タスクとの依存関係がない限り、[制約日] フィールドで設定された日付と同じ日に開始されます。

親タスクが [すぐに開始] に設定され、子タスクが [特定の日に開始] に設定されている場合：

- 他の依存関係がないと想定して、最も早い子タスクの開始日により親の開始日が決定されます。
- この場合、親の [時間の制約] フィールドは [すぐに開始] のままですが、実開始日は最も早い子タスクの開始日に変更されます。

親タスクが [すぐに開始] に設定され、子タスクが [特定の日に開始] に設定されている場合：

子の優先順位は終了日にも適用されます。子タスクの予定終了日が親タスクの終了日より後の場合、予定終了日は子が含まれるように延長されます。実際の値の場合、親の開始日は子の最も早い開始日と同じになります。最も遅い実際の終了日は、その子の最も遅い終了日です。子タスクが [完了してクローズ] であると仮定します。子タスクが [完了してクローズ] ステータスでない場合、親の実際の終了日は空です。

親タスクの開始予定日の場合：

- 開始予定日は、実開始日を持たないすべての子の中で最も早い開始予定日です。
- すべての子タスクに実開始日がある場合、親タスクの開始予定日は実開始日に設定されます。

親タスクの終了予定日の場合：子タスクの最も遅い終了予定日または実際の終了日によって、親の終了予定日が決まります。

[以下以前に開始] または [特定の日に開始] の時間制約のあるタスクは親タスクにできません。これらの時間制約のあるタスクに新しい子タスクが追加されると、親タスクの時間制約が [すぐに開始] に変わります。

トップダウン計画とボトムアップ計画

- トップダウンの計画立案の場合は、複数の子タスクが含まれることがわかっているタスクを作成します。その後で、子タスクを作成し、作成した最初のタスクの子タスクであることを指定します。
- ボトムアップの計画立案の場合は、最小作業単位のタスクを最初に作成します。その後で、関連する子タスクのグループをカバーする中間の親タスクを作成できます。たとえば、「データベースのインストール」というプロジェクトの 1 フェーズが 5 つの順次タスクで構成される場合は、最初に 5 つのタスクを作成します。その後で、「データベースインストール」という別のタスクを作成し、それを 5 つのタスクの親タスクにします。「データベースインストール」タスクの [計画された期間] などのロールアップ計算は、子タスクに基づいて自動的に計算されます。

タスクのセットを作成するのと同時に、タスクの関係と依存関係をビルドするのが最も簡単です。

- 依存関係とは、あるタスクの実行が、他のタスクの実行に (完全にまたは部分的に) 依存していることを意味します。
- 関係とは、複数のサブタスクが親タスクまたはフェーズの下に構成され、[計画期間] や [コスト概算] などのフィールドをロールアップする親子関係を意味します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクフォームおよび関連リストとともに ガントチャート を使用して、関係をビルドします。プロジェクトの主要なイベントに基づいてマイルストーンを追加し、必要に応じて、マイルストーンとタスク間の依存関係を作成します。

また、タスクが [対応中] ステータスに移行したときにプロジェクトタスクのアサイニーにアラートを送信するように通知を設定します。タスクの作成の詳細については、「プロジェクトタスクの作成」を参照してください。

関連情報

親子ロールアップタスクの計算

プロジェクトタスクフォームでの親子関係の作成

親子ロールアップタスクの計算

日付の変更、ステージの変更、および値の計算は、子タスクから親タスクにロールアップされます。

- 日付の変更では、子タスクの値に基づいて親タスクの開始予定日または終了予定日を変更します。
- ステータスの変更では、すべての子レコードが特定の状況に設定された場合に、プロジェクトレコードまたは親タスクレコードのステータスを変更します。
- 計算では、子タスクの値を合計してから、新しい合計を反映するように親を自動的に更新します。

ロールアップタスクでは次のフィールドが変更されます。

- 開始予定日： 親タスクについては読み取り専用に設定されます。プロジェクトレコードについては編集可能なままです (トップレベルのタスクとも見なされます)。
- 終了予定日： 読み取り専用になります。
- 計画期間： 読み取り専用になります。
- 実開始日： 読み取り専用になります。
- 実終了日： 読み取り専用になります。
- ステータス： 読み取り専用になります。

期間のロールアップ

次のアイテムについてロールアップが計算されます。

- 計画期間と計画工数： すべての子タスクのすべての計画期間と計画工数の値の合計。
- 実際の期間と実際の労力： すべての実際の期間と実際の労力の値の合計。実際の期間と実際の労力の値は、すべての子タスクが [完了してクローズ] ステータスにある場合に計算されます。実際の労力の値には、タイムカードからのロールアップを含めることができます。

注:
タイムカードプロパティ **com.snc.time_card.update.effort** が有効になっていることを確認します。移動先 システムプロパティ > すべてのプロパティ このプロパティを有効にします。

コストのロールアップ

Costing アドオンがアクティブな場合、コスト計算はロールアップされます。

- コスト概算：プロジェクト開始時のすべてのコスト推定の合計。子タスクのコスト概算は、親タスクとプロジェクトにロールアップされます。
- 実際のコスト：プロジェクトのデフォルトでは、すべての経費ラインのすべてのコストの合計で、通常はタイムカードと賃金レートに関連付けられています。コストを追跡するには、次のいずれかのオプションを使用してレートを導出できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- レートモデルをプロジェクトに関連付けます。
- タスクおよび人件費のレートカードを定義します。
- リソース計画レベルでレートを関連付けます。

これらのレートにより、プロジェクトに関連付けられている実際の支出を示す経費ラインが自動的に生成されます。レートカードが定義されている場合、各プロジェクトタスクがクローズされるとタスク経費ラインが生成され、タイムカードが承認されると人件費ラインが生成されます。経費ラインは [経費ライン] 関連リストに表示されます。これには、プロジェクトフォームとプロジェクトタスクフォームの両方に詳細ビューが必要です。

子タスクの実際のコストがプロジェクトに正しくロールアップされ、プロジェクトの経費ラインに追加されるようにするには、次の条件が満たされている必要があります。

- com.snc.project.rollup.cost プロパティを **true** に設定する必要があります。このプロパティを有効にするには、次に移動します: プロジェクト管理 > 設定 > 設定 - プロジェクト をクリックし、[プロジェクトコストロールアップを有効にする] チェックボックスをオンにします。
- glide.cost_mgmt.process_task_top_task プロパティを false に設定する必要があります。コスト管理アプリケーションの原価計算プロパティに移動します。[タスク経費ラインの作成時に、タスクのトップタスクの経費ラインも作成しますか] ボックスがオンになっていることを確認します。
- glide.cost_mgmt.calc_actual_cost プロパティを true に設定する必要があります。コスト管理アプリケーションの原価計算プロパティに移動します。[予定されているタスクタイプに対して、タスクの経費ライン合計を使って実際のコストフィールドを計算します] ボックスをオンにします。

プロジェクトステータスのロールアップとロールダウン

プロジェクトタスクのステータスはロールアップされます。親タスクのステータスは読み取り専用になり、子タスクの状況を変更すると自動的に変更されます。

プロジェクトタスクの状況は、次の場合にロールアップできます。

- 子タスクのステータスが手動で変更され、親タスクに他の条件がない場合。
- 子タスクのステータスが [対応中] または [クローズ済み] に変更された場合。これらの状況は親にロールアップされます。[処理待ち] および [オープン] は、親タスクにロールアップされません。

プロジェクト状況もロールダウンできます。プロジェクトのステータスをクローズ済みに変更すると、その下にあるすべてのタスクがデフォルトのクローズ済み値 ([完了してクローズ]) に変更されます。クローズ済みプロジェクトまたはクローズ済みタスクを再度開くと、その下のすべてのタスクが次のように変更されます。

- プロジェクトまたは親がクローズ済みから [処理待ち] または [オープン] に変更された場合：子タスクが [オープン] に変更されます。
- プロジェクトまたは親がクローズ済みから [対応中] に変更された場合：
  - [開始日時 **(Start on)]** の日付を過ぎた子タスクは、[すぐに開始] するよう変更され、ステータスが [対応中] に変更されます。
  - [開始日時 **(Start on)]** の日付をまだ過ぎていない子タスクは同じ開始日を保持しますが、ステータスは [オープン] に変更されます。

関連情報

プロジェクトタスクフォームでの親子関係の作成

プロジェクトタスク

インスタンス内の他のアプリケーションからでも、いくつかの方法でプロジェクトタスクを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
次のいずれかのオプションを使用して、プロジェクトタスクを作成できます。

手順

- [プロジェクトタスク] 関連リストを使用します。
  この関連リストは、プロジェクトレコードとプロジェクトタスクレコードの両方から利用できます。[新規] UI アクション を使用するか、または関連リストに新しい行を挿入することができます。
- 計画立案コンソールを使用します。
- プロジェクトタスククリエイターを使用します。
  ダイアログボックスを使用して、複数のタスクを一度に作成します。プロジェクトタスククリエイターは、プロジェクトレコードとプロジェクトタスクレコードの両方から利用できます。
- 既存のプロジェクトまたはタスクをコピーします。
  このオプションでは、選択したタスク、またはすべての子タスクを含むプロジェクト全体でもコピーします。
- インシデント、問題、または変更要求から作成します。
  [プロジェクトタスク] 関連リストは、インシデントフォーム、問題フォーム、および変更要求フォームからも利用できます。これらのフォームから作成したタスクでは、プロジェクトタスクはプロジェクトではなく、インシデント、問題、または変更の子になります。

関連情報

プロジェクトタスクへの変更要求のリンク

プロジェクトタスク間のスケジュールの競合

スケジュールの競合は、依存関係を遵守していないプロジェクトタスクを特定するのに役立ちます。依存関係または制約タイプが原因で、あるプロジェクトタスクにより、他のタスクが指定された日付に開始するのが妨げられている場合、スケジュールの競合が発生します。

依存関係の適用、制約タイプの変更、または制約日付などのアクションによってタスク開始日がプロジェクトの制約日付に違反している場合、スケジュールの競合が発生します。

スケジュールの競合が発生すると、システムは競合について警告します。競合の原因となっているアクションをキャンセルするか、競合を続行するかを選択できます。競合を続行するよう選択した場合は、制約日の優先順位が最も高くなり、日付が再計算されます。開始日はタスク制約日で許可される日まで移動されますが、依存関係は考慮されません。

たとえば次のシナリオを考えます。

プロジェクトタスクの [制約日] が 1 月 20 日に設定されているプロジェクトの場合、次の 2 つのタスクがあります。

- T1 は、制約タイプが [できるだけ早く] に設定され、開始日は 1 月 20 日です。
- T2 は、制約タイプが [以下以前に開始] に設定され、開始日は 1 月 20 日です。

タスク T1 と T2 の間に FS 依存関係を追加すると、タスク T2 は 1 月 21 日に開始する必要がありますが、[以下以前に開始] の制約により、タスク T2 は 1 月 21 日に開始できません。指定された日付にタスク T2 を開始できないこの事例は、競合の一例です。

この例では、競合を続行することを選択した場合、タスク T2 の開始日は制約日である 1 月 20 日に移動されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[以下以前に開始] と [特定の日に開始] の時間制約があるタスクについて、タスク間のスケジュールの競合が表示されます。

タスクで依存関係が遵守され、それに応じて開始が調整されるようにする場合は、タスクの制約タイプを [すぐに開始]に変更します。

スケジュールの競合が特定されたら、そのようなタスクを計画立案コンソールで特定できます。

- クライアント側の計画立案コンソールには、競合を続行するか、アクションをキャンセルするかを選択できるポップアップメッセージが表示されます。競合を続行する場合、制約タイプが適用されるか、日付が次の実行可能日に適切に変更されます。
- クライアント側の計画立案コンソールのカレンダーアイコン ( ) が、競合を示す赤色 ( ) に変わります。
- サーバー側の計画立案コンソールのカレンダーアイコンが、競合を示す赤色 ( ) に変わります。


変更要求およびプロジェクトタスク

変更承認委員会 (CAB) によって承認された大規模な変更では、新規または既存のプロジェクトを実装する必要があります。

変更管理とプロジェクト管理の間のギャップを埋めるために、インスタンスでは 1 つ以上の変更要求をプロジェクトタスクにリンクすることができます。既存の変更要求をプロジェクトタスクにリンクすることも、新しい変更要求をプロジェクトタスクから直接作成することもできます。

プロジェクトタスクを変更要求レコードにリンクすると、新しいプロジェクトタスクリンクレコードが作成されます。これにより、プロジェクトタスクレコードと変更要求レコードの間の実際のリンクが提供されます。プロジェクトタスクリンクは、変更要求レコードのすべての属性をコピーします。その後、変更要求にリンクさせたプロジェクトタスクの子タスクになります。プロジェクトタスクとプロジェクトタスクリンクの関係を管理するルールは、すべての親タスクと子タスクのルールと同じです。

変更要求にリンクされたプロジェクトタスク

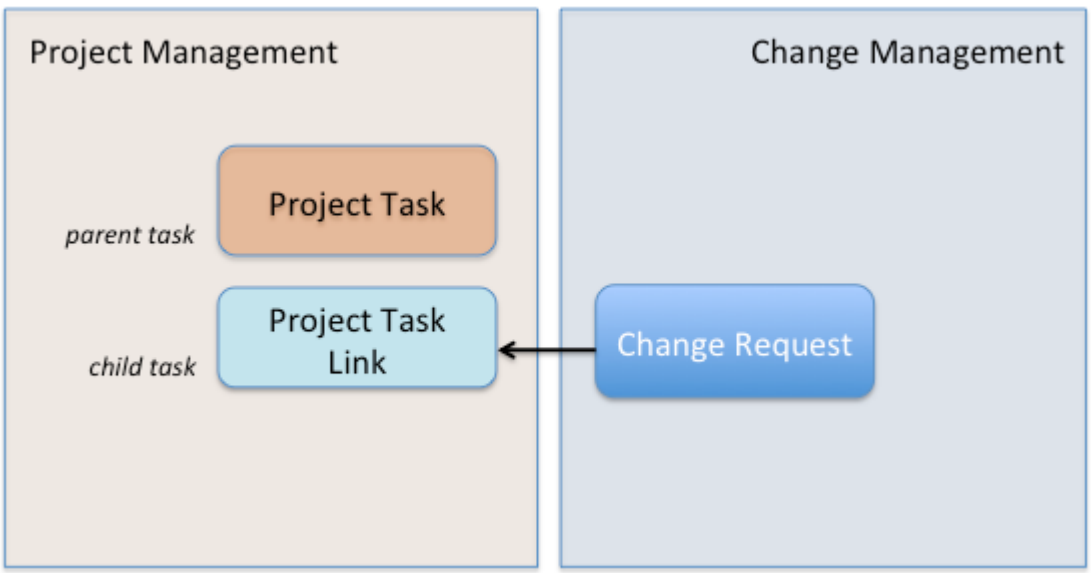


注:
プロジェクトタスクに、タスクリンクレコードと子プロジェクトタスクの両方を含めることはできません。プロジェクトタスクが変更要求にリンクされている場合、そのプロジェクトタスクの子タスクを作成することもできません。同様に、プロジェクトタスクに子タスクがある場合、親プロジェクトタスクを変更レコードにリンクすることはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


プロジェクトタスクリンクレコードは読み取り専用です。プロジェクトタスクリンクは、プロジェクトタスクフォームの関連リストから表示できます。

[プロジェクトタスクリンク] 関連リスト

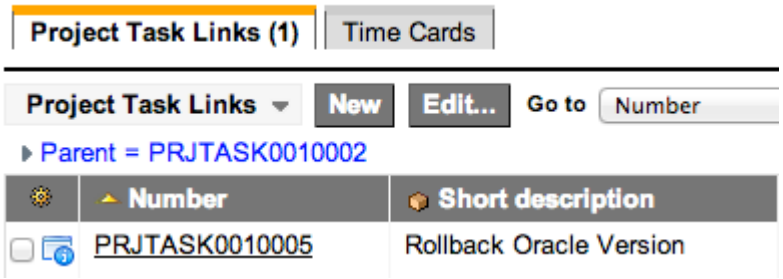

複数の変更要求を単一のプロジェクトタスクにリンクすることもできます。この場合、リンクごとにプロジェクトタスクリンクレコードが作成され、すべてのプロジェクトタスクリンクレコードが、プロジェクトタスクの子タスクになります。

プロジェクトタスクリンク

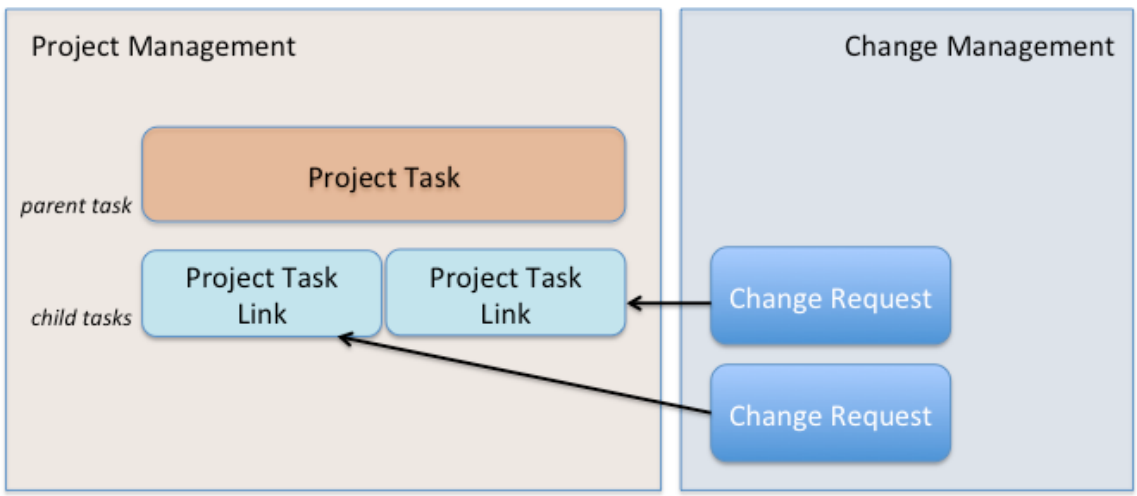

変更要求プロジェクトタスクの関係

すべての親 - 子タスクに適用されるルールが、プロジェクトタスクとプロジェクトタスクリンク間の関係も管理します。プロジェクトタスクリンクは、変更要求から開始日と終了日を継承します。ただし、 プロジェクト管理 (PM)アプリケーションは、次の状況が発生した場合に日付を調整します。

開始日と終了日:

- プロジェクトタスクと変更要求の開始予定日が異なる場合、プロジェクトタスクリンクは 2 つの日付のうち遅い方の日付を使用します。たとえば、プロジェクトタスクは 10 月 1 日に開始されるが、変更要求は 10 月 2 日に開始される場合、プロジェクトタスクリンクは 10 月 2 日に変更されます。
- 変更要求の開始日が早い場合、プロジェクトタスクリンクの [時間の制約] 値は、リンクの作成時に [すぐに開始] になります。終了日は、変更要求レコードで指定された終了日と同じままです。
- 変更要求がプロジェクト開始日より前に開始および終了する場合、プロジェクトタスクリンクの期間はゼロ (0) です。また、プロジェクトの開始時に発生するマイルストーンとしても表示されます。
- 変更要求がプロジェクトスケジュールに従って非作業時間中に開始するようにスケジュールされている場合、プロジェクトタスクリンクの開始予定日はスケジュールを無視します。それだけでなく、変更要求で指定された時間に開始されます。ただし、プロジェクトタスクリンクの期間では、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スケジュールが考慮されます。例：プロジェクトでデフォルトのスケジュールを使用しており、そのスケジュールでは、作業時間は月曜日から金曜日の 08:00 から 17:00 で、正午から 13:00 までの 1 時間の休憩が指定されています。期間が 13 時間の変更要求が午前 0 時に開始されます。プロジェクトタスクリンクは午前 0 時に開始され、スケジュールの開始時刻 08:00 まで続きます。正午に 1 時間停止し、13:00 から 14:00 まで続行されます。合計時間は 13 時間になります。

プロジェクトタスク期間

変更要求の期間によって、プロジェクトタスクリンクの期間が決まります。その期間は、すべての子タスク期間が親タスクにロールアップされるのと同じように、親プロジェクトタスクにロールアップされます。変更要求フォームの [スケジュール] セクションの [開始予定日] と [終了予定日] は、期間を決定するフィールドです。変更要求フォームに予定日がない場合、デフォルトの期間は 1 プロジェクト日です。プロジェクトにはスケジュールがあり、プロジェクトにスケジュールがない場合は 24 時間です。

複数のリンクされた変更要求

追加の変更要求をプロジェクトタスクにリンクすると、追加のプロジェクトタスクリンクが作成されます。すべてがプロジェクトタスクの子タスクになります。日付は親タスクにロールアップされます。たとえば、リンクされたプロジェクトタスクが 10 月 30 日に終了する予定であるとします。11 月 30 日に終了するようスケジュールされた新しい変更要求をリンクすると、新しいプロジェクトタスクリンクが作成されます。親タスクの終了予定日は、両方のプロジェクトタスクリンクの期間をカバーするために 11 月 30 日まで延長されます。変更要求は、1 つのプロジェクトタスクにのみリンクできます。同じプロジェクト内または複数のプロジェクトにまたがる複数のタスクにリンクすることはできません。1 つ以上の子タスクを持つプロジェクトタスクに、変更要求に接続するプロジェクトタスクリンクを含めることはできません。

プロジェクトタスクステータス

変更要求状況が [処理待ち]、[オープン]、または [対応中] に変更されると、それに応じてプロジェクトタスクリンクのステータスが変更されます。変更要求状況がいずれかのクローズ済みステータスに変更されると、プロジェクトタスクリンクのステータスが [完了してクローズ] に変更されます。

変更要求とプロジェクトタスクの間で変更がどのように伝播されるか

リンクされた変更要求に対する変更は、プロジェクトタスクリンクに伝播されます。ただし、その逆は当てはまりません。プロジェクト管理 (PM)アプリケーションから変更要求レコードを変更することはできません。

次のフィールドに対する変更は、変更要求からプロジェクトタスクリンクに伝播されます。

- 開始予定日
- 終了予定日
- 状況

これらの変更要求設定は、プロジェクトタスクリンクの親であるプロジェクトタスク、およびプロジェクトレコードにもロールアップされます。次の例を考えてみます。プロジェクトがまだ開始されておらず、そのすべてのタスクが [処理待ち] ステータスであるとします。リンクされた変更要求レコードのステータスを [オープン] から [対応中] に変更した場合、プロジェクトタスクリンク、その親タスク、およびプロジェクト自体がすべて [対応中] に変更されます。

プロジェクトを開始すると、時間の制約が [すぐに開始] で、他の開始の依存関係がないタスクがすぐに開始されます。ただし、リンクされた変更要求を持つプロジェクトタスクは自動的には開始されません。プロジェクトマネージャーは、[ステータス] フィールドを [対応中] に変更して、手動でタスクを開始する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プロジェクト管理 (PM)アプリケーションで行った変更はリンクされた変更要求レコードに伝播されないため、プロジェクトを終結してもリンクされた変更はクローズされません。変更を正常に実装し、それが属するプロジェクトをクローズしたら、変更要求レコードに移動し、ステータスを手動で[クローズ済み]に変更する必要があります。

関連情報

プロジェクトタスクへの変更要求のリンク

プロジェクトタスクチェックリスト

プロジェクトタスクチェックリストを使用すると、タスクで完了する必要があるアクティビティを追跡できます。

プロジェクトタスクを完了と見なすために、個別のサブタスクを必要としないアクティビティを追跡できます。たとえば、候補者に面談するタスクを含むヒューマンリソース (HR) 関連プロジェクトがあるとします。会議室の予約や、候補者からの面談確認の受け取りを追跡することもできます。それぞれのチェックリストアイテムを作成し、完了したらマークします。

チェックリストアイテムには開始日や終了日がなく、工数やコストも追跡されません。デフォルトでは、チェックリストアイテムレコードには名称と [完了] フィールドのみがあり、これらを true または false に設定できます。プロジェクトタスクのステータスは、チェックリストアイテムの [完了] フィールドのステータスとは無関係です。

チェックリストとタスクがプロジェクトテンプレートにコピーされます。また、任意のプロジェクトタスクフォームからすべてのチェックリストテンプレートにアクセスすることもできます。

注:
チェックリストは、タスクテーブルから拡張されたテーブルに基づくすべてのフォームで使用できます。アドミニストレーターは、必要に応じてチェックリストを追加または削除できます。

関連情報

プロジェクトタスクチェックリストの使用

テンプレートとしてのチェックリストの保存

タスクリソース

リソースは、 プロジェクト管理 (PM)でタスクとサブタスクを実行するためにアサインされた個人またはグループです。

Resource Management を使用してリソース計画を設定し、プロジェクトに関連付けることができます。プロジェクトポートフォリオ管理 を有効にして、リソース管理をプロジェクト管理 (PM)で使用します。

関連情報

リソース管理クラシック版

リソース管理ワークスペース

プロジェクトとプロジェクトタスクの状況

ベースシステムでは、プロジェクトとプロジェクトタスクのステータスはタスクテーブルのステータスを継承します。

状況は、次のような各種のカテゴリにグループ化されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

状況	ラベル	カテゴリ
-5	処理待ち	処理待ち
1	オープン	オープン
2	対応中	対応中
3	完了してクローズ	クローズ済み
4	未完了でクローズ	クローズ済み
7	スキップしてクローズ	クローズ済み

状況のカテゴリ情報は、属性 フィールドにある [予定されているタスク] (planned_task) テーブルの [ステータス] 列の辞書オーバーライド で宣言されます。計画タスクは、プロジェクトテーブルおよびプロジェクトタスクテーブルの親テーブルです。

開始日と終了日は、プロジェクトまたはタスクのステータスに基づいて表示されます。

- 保留中/未解決:開始予定日が表示されます。
- オープン/対応中:実開始日が表示されます。
- クローズ済み:実終了日が表示されます。

関連情報

デフォルトのプロジェクトおよびプロジェクトタスクステータスのカテゴリの表示


プロジェクトまたはプロジェクトタスクのステータスのカスタマイズ

複合フィールド

複合フィールドは、テーブル内の 2 つのフィールドからの情報を組み合わせて単一のフィールドを形成します。

たとえば、[プロジェクトタスク] リストの [タスク] フィールドには、簡単な説明とプロジェクトタスク番号が表示されます。簡単な説明がプロジェクトタスク番号の上に表示されます。プロジェクトタスク番号が表示され、これはプロジェクトタスクフォームへのリンクになります。

複合フィールド



複合フィールドの使用

- 複合フィールドを編集すると、簡単な説明が変更されます。簡単な説明を編集すると、複合フィールドが変更されます。
- 複合フィールドでのソートは、簡単な説明のみに基づいて行われ、番号に基づいてソートされることはありません。
- 複合フィールドでの検索は、簡単な説明と番号の両方で有効になっています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- リストヘッダーを使用して番号で検索するには、検索要素の前にアスタリスク (*) を入力します。例：*PRJTASK0010016。
- フィルターを使用して番号で検索するには、[Task] [contains] [PRJTASK0010016] のような条件を作成します。

コスト計画明細

コスト計画明細は、各会計期間のコスト概算と実績コストをキャプチャします。コスト計画、プロジェクト、デマンド、プログラム、およびポートフォリオは、利用可能な明細のタイプです。

要件

要件は単一のコスト計画に対応します。たとえば、標準カレンダーと 1 年にわたるコスト計画の 場合、12 個の明細が表示されます。

タスク

タスクはプロジェクトまたはデマンドに対応します。期間ごとのすべてのコスト計画にわたるコストは、プロジェクトまたはデマンドレベルにロールアップされます。これらのレコードの明細タイプは [タスク] に設定されています。[タスク] タイプのレコードは期間ごとに 1 つのみ存在します。作成される [タスク] タイプのレコードの数は、プロジェクトまたはデマンドの期間と、プロジェクトまたはデマンドで計画されている要件によって異なります。たとえば、標準カレンダーと 3 つのコスト計画を含むプロジェクトの 場合、12 個の明細が表示されます。

プログラム

プロジェクトまたはデマンドがプログラムの一部である場合、[プログラム] の明細タイプでは、期間ごとのプログラムレベルコストのアグリゲートが提供されます。

ポートフォリオ

プロジェクトまたはデマンドがポートフォリオの一部である場合、[ポートフォリオ] の明細タイプでは、期間ごとのポートフォリオレベルコストの集計が提供されます。

システム生成のコスト計画

[コスト計画] フィールドを入力せずに経費ラインを作成すると、システム生成のコスト計画が自動的に作成されます。

孤立経費ラインは、システム生成のコスト計画に関連付けられます。この関連付けにより、ウィジェットに表示されるプロジェクト実績または合計実績が、プロジェクトファイナンシャルページおよび投資ポータルに表示されるグリッド上のコスト計画実績の集計と同じになります。

注:
システム生成のコスト計画は、プロジェクトに最低 1 つのコスト計画がある場合にのみ作成されます。

システム生成のコスト計画は、次のいずれかの理由で作成されます。

- [コスト計画] フィールドを入力せずに経費ラインを作成する場合。
- タイムカードを作成して承認する場合。

システム生成のコスト計画には、投資と経費があります。経費ラインの作成時に選択した経費のタイプに応じて、システム生成のコスト計画のタイプが作成されます。システム生成コスト計画の名前の形式は次のとおりです。

- <project number> システム生成の投資コスト計画
- <project number> システム生成の経費コスト計画

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

タイムカードを作成して承認すると、投資タイプの経費ラインが作成され、孤立経費ラインが投資タイプのシステム生成コスト計画に関連付けられます。システム生成のコスト計画は、コスト計画に関連付けられていない経費ラインが残らないようにするために作成されます。システム生成のコスト計画は読み取り専用です。

Yokohama にアップグレードするお客様は、[孤立経費ラインをシステム生成コスト計画に関連付ける **(Associate orphan expense lines to the system generated cost plan)]** プロジェクト診断を実行して、 孤立経費ラインをシステム生成コスト計画に関連付けることができます。診断スキャンにより、コスト計画に関連付けられていない経費ラインがリストされます。修正スクリプトを実行すると、システム生成コスト計画が作成され、孤立経費ラインは、システム生成コスト計画に関連付けられます。

実際のプロジェクトコスト

実際のプロジェクトコストは、コスト計画の経費ラインを作成した後、または人事がタイムカードを使用して経費ラインを作成した後に表示されます。

システムは、経費ラインから実際のプロジェクトコストをキャプチャします。

- コスト計画からの経費ライン：コスト計画から経費ラインを作成できます。経費が発生した金額と日付を指定できます。発生した実際の金額は、経費ラインが処理された後にコスト計画に含まれます。
- タイムカードからの経費ライン：人事は、タイムカードを使用して、プロジェクト作業の時間を記録できます。タイムカードが承認されると、システムにより経費ラインが生成されます。経費ラインが処理された後、実際のコストがプロジェクトに記録されます。タイムカードの作成時にリソース計画を指定すると、コスト計画名はリソース計画から取得され、コストはリソース計画に対してキャプチャされます。リソース計画を指定しない場合、コストはプロジェクトに対してキャプチャされます。

関連情報

実際のプロジェクトコストの表示

外部依存関係のタイプ

プロジェクト管理 (PM) アプリケーションは、ハードとソフトの 2 種類の外部依存関係をサポートします。


外部依存関係のタイプは、計画立案コンソールで 2 つのプロジェクトタスク間の依存関係を追加するときに設定できます。

ハード依存関係

ハード依存関係では、先行プロジェクトで行われた変更は自動的に後続プロジェクトに伝播されます。行われた変更の通知は、後続プロジェクトでトリガーされます。次の画像は、ハード依存関係タイプのプロセスフローを示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


外部のハード依存関係

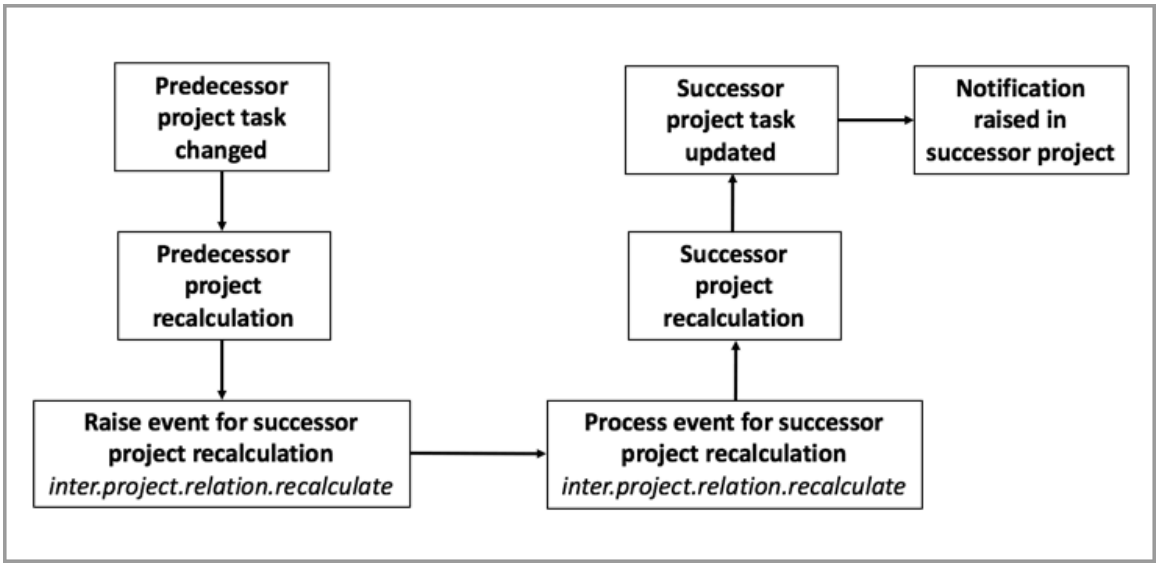

ソフト依存関係

ソフト依存関係では、先行プロジェクトで変更が行われると、後続プロジェクトで通知がトリガーされます。後続プロジェクトのプロジェクトマネージャーは、通知の変更を承認するか却下するかを選択できます。通知の変更内容を承認すると、先行プロジェクトの変更が後続プロジェクトに同期され、プロジェクトが再計算されます。通知の変更内容を却下した場合、変更が後続プロジェクトに反映されません。次の画像は、ソフト依存関係タイプのプロセスフローを示しています。

外部のソフト依存関係

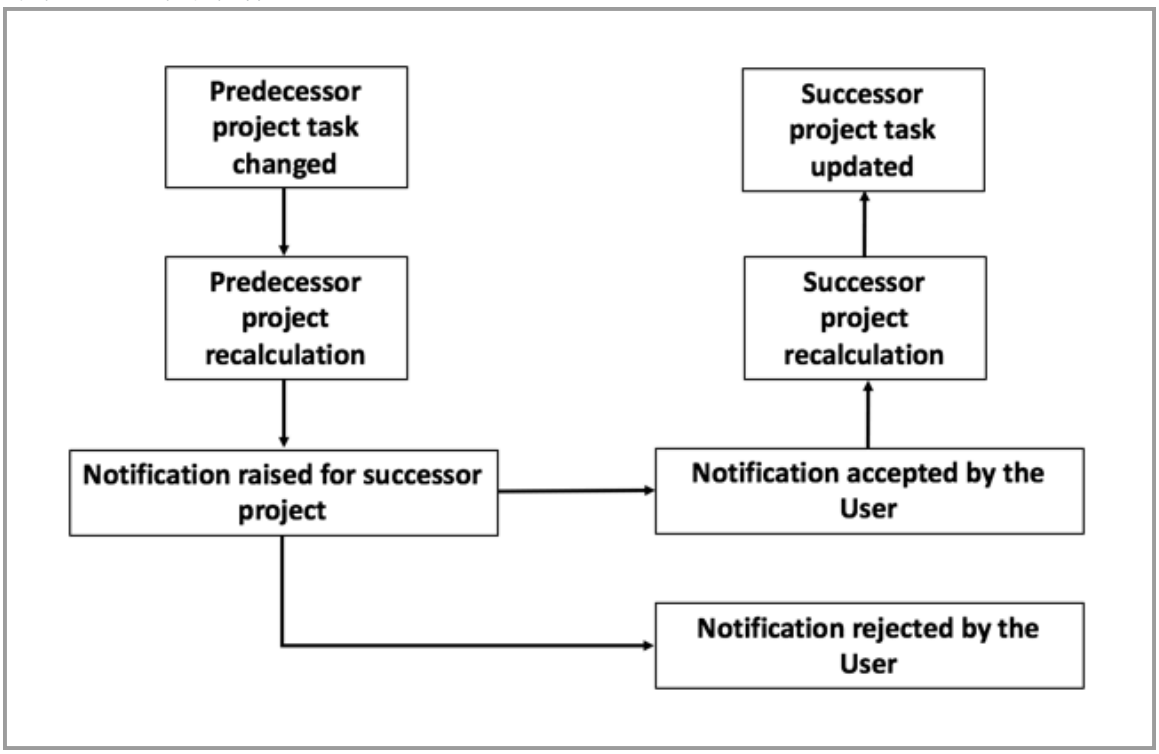

プロジェクトとポートフォリオの資金調達

プロジェクトとポートフォリオが保持できる金額を指定します。

PPM Standard with Financials を有効にすると、プロジェクトとポートフォリオの資金調達を行うことができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金調達プロセスでは、次の手順を実行します。

1. プロジェクトまたはデマンドレベルでコスト計画を作成して、会計年度などの時間のコストを特定します。これらのコストは、ポートフォリオの [コスト計画] 関連リストにロールアップされます。コスト計画には、各会計期間のコスト計画明細が自動的に含まれます。「プロジェクトコスト計画の作成」および「デマンドコスト計画を作成する」を参照してください。
2. ポートフォリオの運用経費および資本経費の目標コスト値を入力します。「ポートフォリオの作成」および「レガシー - ポートフォリオの計画立案」を参照してください。
3. ポートフォリオ内のプロジェクトの予算計画を作成し、計画を予測に昇格させます。「レガシー - 予算計画の作成および昇格」および「予算計画の昇格」を参照してください。

プロジェクト管理 **(PM)** における複数通貨

複数通貨機能を使用して、異なる現地通貨の異なる地理的な場所でプロジェクトまたはプロジェクトの一部を実行します。

この機能は、機能通貨とは異なる通貨でプロジェクトのコストの詳細を表示するのに役立ちます。プロジェクトフォームのプロジェクトのコスト計画、利益計画、および対応するコストフィールドの値も、プロジェクト通貨として指定した通貨に変換されます。したがって、機能通貨とは異なる通貨を使用する場所でプロジェクトが実行される場合、プロジェクト通貨をプロジェクトの機能通貨に変換する必要はありません。

アクティベーション情報

PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインを有効化して、プロジェクト管理 (PM) の複数通貨機能を有効化します。プラグインを有効にすると、プロジェクト、コスト計画、および利益計画フォームのプロジェクト通貨ビューが有効になります。プロジェクト通貨ビューでは、プロジェクトファイナンシャルおよびコスト計画を複数のプロジェクト通貨で管理できます。

注:
このプラグインを有効にすると、PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) プラグインが自動的に有効になるため、デフォルトビューとプロジェクト通貨ビューを切り替えるオプションが表示されます。

プロジェクト通貨ビュー

プロジェクトフォームのデフォルトビューに加えて、プロジェクト通貨ビューがあり、オプションで複数通貨フィールドの表示を有効にすることができます。このビューは、フォームのコンテキストメニューから有効にできます。このビューは、PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインを有効にした場合にのみ表示されます。

デフォルトビューとは異なり、プロジェクト通貨ビューには複数通貨関連のフィールドが含まれています。

プロジェクトの処理プロジェクト通貨として、機能通貨以外の通貨を指定することができます。[プロジェクト] フォームの [財務] タブには、[プロジェクト通貨] フィールドがあります。通貨 [fx_currency] テーブルから、有効な通貨を選択できます。

注:

プロジェクトのコスト計画、コスト計画ブレークダウン、利益計画、利益計画ブレークダウン、または経費ラインを作成すると、プロジェクトの [プロジェクト通貨] フィールドは読み取り専用フィールドになり、通貨を更新するためにロックダウンされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドにおけるプロジェクト通貨の指定

デマンドをプロジェクトに変換するときに、プロジェクトの管理に使用するプロジェクト通貨を指定できます。機能通貨、プロジェクト通貨、または現地通貨を使用して、引き続きデマンドを管理できます。詳細については、「デマンド管理 における複数通貨」を参照してください。

プロジェクトワークスペースのプロジェクト

プロジェクトワークスペースでプロジェクトをプロジェクト通貨で追跡します。プロジェクト通貨でプロジェクトのコスト計画と利益計画を作成および監視します。プロジェクトワークスペースの詳細については、「プロジェクトワークスペース」を参照してください。

グリッドレベルおよびブレークダウンレベルでプロジェクト通貨でコストコンポーネントを表示するには、「プロジェクトのコスト計画と利益計画の作成と管理 (Create and manage cost plans and benefit plans for a project)」を参照してください。

プロジェクトステータスレポート

プロジェクトの計画および実際のコストステータスをプロジェクト通貨で表示するには、プロジェクトステータスレポートの概要セクションとコストセクションを開きます。

コスト計画の更新とプロジェクト通貨でのコストの再計算

コスト計画の単価、数量、または会計期間が更新されると、コスト計画のすべての関連金額フィールド、そのブレークダウン、およびロールアップ先のプロジェクトがプロジェクト通貨で再計算されます。

コスト計画の [単位コスト]、[数量]、および [繰り返し] チェックボックスの変更

[コスト計画] フォームの [単位コスト] フィールド、[数量] フィールド、または [繰り返し] チェックボックスを変更すると、合計予定コストがプロジェクト通貨で再計算されます。同様に、コスト計画ブレークダウンの [プロジェクト通貨でのコスト] も再計算されます。したがって、[プロジェクト通貨での予定資本]、[プロジェクト通貨での計画経費]、およびプロジェクトの [プロジェクト通貨フィールドでの合計予定コスト] の値も再計算されます。

コスト計画の会計期間の変更

会計期間を変更すると、コスト計画フォームの開始日または終了日、[合計計画コスト] 、およびコスト計画の [プロジェクト通貨でのコスト] が再計算されます。したがって、コスト計画ブレークダウンレコードを追加または削除することができます。[繰り返し] チェックボックスが選択されていない場合、各コスト計画ブレークダウンレコードの [プロジェクト通貨でのコスト] が再計算されます。これに合わせて、[プロジェクト通貨での予定資本]、[プロジェクト通貨での計画経費]、およびプロジェクトの [プロジェクト通貨フィールドでの合計予定コスト] の値も再計算されます。

コスト計画の入力通貨でのコストの変更

[個別のコスト計画ブレークダウン] レコードで [入力通貨でのコスト] を変更すると、コスト計画の [合計予定コスト] がプロジェクト通貨で再計算されます。したがって、[プロジェクト通貨での予定資本]、[プロジェクト通貨での計画経費]、およびプロジェクトの [プロジェクト通貨フィールドでの合計予定コスト] の値も再計算されます。

コスト計画へのブレークダウンの追加

コスト計画ブレークダウンをコスト計画に手動で追加すると、コスト計画の[合計予定コスト] がプロジェクト通貨で再計算されます。したがって、[プロジェクト通貨での予定資本]、[プロジェクト通貨での計画経費]、およびプロジェクトの [プロジェクト通貨フィールドでの合計予定コスト] の値も再計算されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト管理 **(PM)** の 予測インテリジェンス

プロジェクト管理 (PM) 用 予測インテリジェンス 機能では、プロジェクトフォームを使用して新しいプロジェクトを定義するときに、機械学習アルゴリズムを使用して類似のプロジェクトを検索して表示します。プロジェクトを計画するために、既存のプロジェクトを検索し、類似のプロジェクトを比較することもできます。

PPM 予測インテリジェンスワークベンチには、新しい予測モデルの作成とトレーニング、それらの評価とテスト、およびアイデア、デマンドおよびプロジェクト管理 (PM)に価値を付加するために、ビジネスプロセスへの追加プロセスを系統的にガイドする、事前にビルドされたユースケーステンプレートが含まれています。

カスタムユースケースはトレーニング後、すぐに使用可能になります。PPM 予測インテリジェンスワークベンチの使用に際して、人工知能や機械学習に関する事前の知識や経験は不要です。

アプリケーションには、独自の予測モデルの作成、トレーニング、評価、テスト、プロデュースに役立つ事前にビルドされたガイダンスを含むテンプレートが含まれています。

プロジェクト管理 (PM)用の予測インテリジェンスには、次の利点があります。

- 重複するプロジェクトを回避することで、データベースの品質を向上させます。
- プロジェクトの計画に役立ちます。過去に作成および実行された類似のプロジェクトの計画の詳細を表示できます。

アクティベーション情報

予測インテリジェンスワークベンチを使用する前に、次のプラグインを有効化します。

- PPM 用予測インテリジェンス (com.snc.ppm_ml) プラグイン
- 観念化用予測インテリジェンス (com.snc.innowation_management_ml) プラグイン

プロジェクト管理 **(PM)**向け 予測インテリジェンス のソリューション定義

プロジェクト管理 (PM) 用 予測インテリジェンス 機能のソリューション定義は、PPM の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.ppm_ml) で利用できます。予測インテリジェンスの詳細については、「予測インテリジェンス」および「コンテキスト検索h」を参照してください。

プロジェクト管理 **(PM)**のソリューション定義

ソリューション定義	ソリューション タイプ	説明
類似のプロジェクト	類似性	[プロジェクト名] フィールドと [説明] フィールドに基づい

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト管理 **(PM)**のソリューション定義 (続く)

ソリューション定義	ソリューション タイプ	説明
注: このソリューション定義は、次のプラグインが有効なインスタンス上で、テンプレートとして使用できます。 • コンテキスト検索の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.contextual_search_ml) • PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) • PPM の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.ppm_ml)		て類似のプロジェクトを表示します。プロジェクトフォームの [類似のプロジェクト] セクションで結果を確認できます。

関連情報

予測インテリジェンス

類似のプロジェクトを見つけるために プロジェクト管理 (PM) の類似性ソリューションをトレーニングする

プロジェクトの開始

プロジェクト管理 **(PM)**の構成

プロジェクトマネージャーがプロジェクトを開始および計画できるようにするための プロジェクト管理 (PM) の設定と構成に必要なプロセスについて説明します。

構成の概要

プロジェクト管理アプリケーションを使用すると、プロジェクトとリソースをより効果的に計画、整理、および管理できるため、プロジェクトを簡単かつ迅速に完了できます。プロジェクト管理アプリケーションを使用するには、PPM Standard プラグインをインストールする必要があります。詳細については、「PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理)」を参照してください。

複数通貨プラグインの有効化時に既存のプロジェクトをアップグレードする

複数通貨プラグインを有効にした後、*PM upgrade project currency for active projects* および *PM upgrade project currency for inactive projects* スケジュール済みジョブを実行して、アクティブなプロジェクトと非アクティブなプロジェクトをそれぞれアップグレードします。スケジュール済みジョブを選択してオンデマンドで実行し、必要な場合にのみプロジェクト通貨でプロジェクトをアップグレードします。

始める前に
必要なロール：admin または it_project_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [*PM upgrade project currency for active projects*] をクリックします。
3. [今すぐ実行] をクリックして、既存のすべてのアクティブなプロジェクトをプロジェクト通貨にアップグレードします。

   ジョブの実行時に、プロジェクト、プロジェクトタスク、ベースライン、コスト計画、コスト計画ブレークダウン、利益計画、利益計画ブレークダウンフォームのコスト関連フィールドのすべての金額が機能通貨からプロジェクト通貨フィールドにコピーされます。機能通貨フィールドの値がプロジェクト通貨フィールドにコピーされると、財務コストが既に存在するため、プロジェクト通貨を編集することはできません。

4. 非アクティブなプロジェクトをアップグレードするには、[*PM upgrade project currency for inactive projects*] をクリックします。
5. [今すぐ実行する] をクリックします。

   スケジュール済みジョブを実行すると、既存のすべてのプロジェクトのプロジェクト通貨値が機能通貨に設定されます。[プロジェクトタスク]、[ベースライン]、[コスト計画]、[コスト計画ブレークダウン]、[利益計画]、[利益計画ブレークダウン]、[経費ライン] フォームのプロジェクト通貨は、機能通貨に設定されています。

   注:
   ジョブは、プロジェクトの数とコスト計画によってはパフォーマンスに影響を与える可能性があるため、必要な場合にのみジョブを実行します。

プロジェクト管理 **(PM)** の使用

プロジェクト管理 (PM)を使用して、プロジェクトを効果的に計画、管理、追跡します。

プロジェクトの計画立案

プロジェクトを作成する前に、次の質問と問題について検討します。

- タスクに必要なのは、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチのどちらですか？

  トップダウンタスクでは、最初にプロジェクトを作成し、次に主要なプロジェクトフェーズを特定します。後で、フェーズをタスクとサブタスクに分割できます。フェーズや親タスクなどの高レベルのアイテムの見積もりを作成し、そこからより詳細なレベルに向けてプロジェクトをビルドすることに重点が置かれています。トップダウンタスクでタスクを作成する場合は注意が必要です。立ち上げ日がプロジェクトの開始日よりも後のプロジェクトでタスクを作成すると、プロジェクトはより遅い開始日にシフトされます。プロジェクト管理 (PM) アプリケーションでは、ボトムアップタスクをより適切にサポートします。

  ボトムアップタスクでは、小さなタスクのセットを複数作成し、労力、コスト、期間などのタスクアイテムを見積もります。これらの見積もりは、高レベルの親タスク (ロールアップタスク) およびフェーズに集約されます。最初に作業のより小さなチャンクをできるだけ正確に見積もり、次にそれらの見積もりを親タスク、フェーズ、およびプロジェクト自体にロールアップすることに重点が置かれています。

- プロジェクトは、より大きなプロジェクトポートフォリオの一部ですか？

  また、 ポートフォリオ計画立案と、プロジェクトが類似のプロジェクトまたはイニシアチブとどのように関連しているかについても検討します。

- タスクには他のタスクとどのような依存関係がありますか？

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プロジェクト管理 (PM) アプリケーションは、さまざまな依存関係をサポートしています。

- マイルストーンとプロジェクトベースラインはプロジェクトの管理に役立ちますか？

  マイルストーンは、期間が 0 のプロジェクトタスクです。マイルストーンを使用して、プロジェクトの重要な日付を示します。必要に応じて、マイルストーンに到達するまでタスクが開始されないように、タスクとマイルストーンの間に依存関係を作成します。

  ベースラインは、各タスクのベースラインが作成された時点における現在の開始予定日と終了予定日のスナップショットです。ガントチャートの各タスクの下に、当初の開始予定日と終了予定日を示す線が表示されます。タスクの開始が早いか遅いかに応じて、線が左または右にシフトして表示されます。タスクが後の日付にずれこんだ場合、ベースラインインジケーターを使用して、遅延の重大度を簡単に確認できます。

- 必要なスキル、グループ、およびリソースが ServiceNow で作成されていますか？

  プロジェクトタスクが、必要なスキルを持つさまざまなグループまたは個別のリソースにアサインされている場合は、ユーザーとグループを作成し、スキル管理アプリケーションを構成します。

- 既存のインシデント、問題、または変更により、プロジェクトを作成して追跡することが正当化されますか？

  これらのレコードタイプのうち、プロジェクトとして追跡されるアクティビティにつながる可能性が最も高いのは変更です。

- プロジェクトコストを追跡することを希望しますか？

  プロジェクトを開始する前に、グループのリソースコストを見積もります。次に、タイムカードから各ユーザーリソースの実際のコストを追跡します。プロジェクト管理 (PM) アプリケーションでは、プロジェクト内の影響を受ける CI のコストも計算できます。コストを追跡するには、プロジェクト管理 (PM) Costing アドオンが必要です。

- プロジェクトで達成したいのはどのような目標ですか？

  すべてのプロジェクトには少なくとも 1 つの目標があります。プロジェクトの目標は [目標] テーブルに保存され、任意のタスクにリンクできます。一般的なシナリオでは、1 つの目標を各プロジェクトにリンクさせ、目標の [ステータス] フィールドを最新の状態に維持します。

リソースまたはアサイン先グループのタスクへのアサイン

ユーザーリソースは、プロジェクトタスクにアサインされている組織内の個人です。リソース管理アプリケーションのリソース計画を使用して、リソースを管理できます。

ポートフォリオへのプロジェクトの追加

ポートフォリオは、関連するプロジェクトのグループです。プロジェクトが他のプロジェクトに関連している場合は、ポートフォリオを作成してそのプロジェクトを追加します。プロジェクト管理 (PM) アプリケーションは、ポートフォリオ内のすべてのプロジェクトのステータスを簡単に報告できる、便利なポートフォリオビューを提供します。ポートフォリオにはデマンドも含まれます。

プロジェクトの開始

プロジェクトのステータスを [対応中] に変更して、プロジェクトを開始します。期間、コスト概算、正味価値など、アジャイル、ウォーターフォール、またはハイブリッドプロジェクトの重要な要素を組織に対して定義して、プロジェクトの進捗状況を効率的に追跡します。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
プロジェクトフォームの [ステータス] フィールドを [対応中] に変更すると、プロジェクトの実開始日が開始予定日に変更されます。

プロジェクトは、プロジェクトリストまたはプロジェクト計画立案コンソールから作成できます。アジャイルまたはハイブリッドプロジェクトを作成するための アジャイル開発 2.0 プラグインと、プロジェクトのテストフェーズを作成するための テスト管理 プラグインが必要です。

注:
デマンドワークベンチからプロジェクトを作成することもできます。

プロジェクトを開始した後、次のようになります。

- プロジェクトの読み取り専用の [開始実績日時] フィールドに予定日が入力されます。
- タスクまたは一連のタスクがプロジェクトの開始直後に開始するようにスケジュールされている場合 (つまり、時間制約が [すぐに開始] に設定され、他の開始依存関係がない場合)、それらのタスクの開始実績日時にも予定日が入力されます。
- 他のすべてのタスクの開始予定日は、プロジェクトを開始したタイミングに応じて調整されます。新しい開始予定日は、他のタスクとの依存関係や各タスクの期間など、いくつかの要因によって変わります。

  注:
  プロジェクトが [対応中] ステータスになっても、すべてのタスクのステータス更新が開始予定日に基づいて自動的に開始されるわけではありません。プロジェクトの開始時にすぐに開始するようにスケジュールしたプロジェクトタスクを除き、プロジェクトタスクは自動的には開始されません。プロジェクトの管理を継続して行い、各タスクのステータスを [対応中] に変更します。

複数通貨機能を使用して、機能通貨とは異なる現地通貨でプロジェクトを作成することもできます。PPM Standard Multicurrency プラグイン (com.snc.ppm_multicurrency) を有効にして、[プロジェクト] フォームの [財務] タブにある追加フィールドの [プロジェクト通貨] ビューに切り替える必要があります。詳細については、「プロジェクトファイナンシャルにおける複数通貨」を参照してください。

手順

1. 次のいずれかの方法でプロジェクトを作成します。

2. フォームで、フィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「プロジェクトフォーム」を参照してください。
3. [送信] を選択します。

関連情報

プロジェクトフォーム

プロジェクトポートフォリオ管理

プロジェクトからのプロジェクトタスクの作成

プロジェクトフォームからタスクを作成して、プロジェクトの目標を管理可能な作業単位に分解します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. リストからプロジェクトを選択します。
3. [プロジェクトタスク] 関連リストで、[新規] を選択します。
4. フォームで、フィールドに入力します。
   プロジェクトタスクフォームの詳細については、「 プロジェクトタスクフォーム」を参照してください。
5. **[Submit** (送信)] を選択します。

タスクの結果
新しいタスクが、プロジェクトフォームの [プロジェクトタスク] 関連リストに表示されます。タイムカードが使用されている場合、アプリケーションはリソースのタイムカードを作成します。

次のタスク
[完了率 **(%)]** フィールドの値は、v3 アプリケーションの [ステータス] フィールドに関連しています。完了率を「**0**」から他の値に変更すると、レコードの保存時または更新時にタスクのステータスが [対応中] に変更されます。同様に、タスクのステータスを [完了してクローズ]に変更すると、[完了率 **(%)]** フィールドは「**100**」に設定され、読み取り専用になります。

プロジェクトタスクのステータスを [対応中] から [スキップしてクローズ] または [未完了でクローズ] に変更すると、[完了率 **(%)]** フィールドは現在の値を保持し、読み取り専用になります。

[完了率 **(%)]** フィールドは、親タスクのガントチャートに明るい色のバー (タスクの完了した部分) として表示されます。このバーは、下にある暗いバー (タスク全体) と重なっています。たとえば、デモプロジェクトは、ポップアップウィンドウに示されているように、5.41% 完了しています。[フェーズ **1]** タスクは約 50% 完了しています (ポップアップウィンドウには表示されません)。

プロジェクトフォームの [プロジェクトタスク] リストと [プロジェクトタスク] 関連リストには、[依存関係] フィールドが含まれています。親タスクなどのタスクの依存関係は、このフィールドに表示されます。依存関係レコードをクリックします。この列に表示される内容の説明については、「計画立案コンソールでの先行タスクの依存関係」を参照してください。

インシデント、問題、または変更要求からのタスクの作成

新しいプロジェクトタスクを、インシデントフォーム、問題フォーム、および変更要求フォームの [プロジェクトタスク] 関連リストから作成できます。これらのフォームから作成したタスクでは、プロジェクトタスクはプロジェクトではなく、インシデント、問題、または変更の子になります。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. インシデントフォーム、問題フォーム、または変更要求フォームに移動します。
2. 追加するフォームの構成 プロジェクトタスク > 親 関連リストがまだ存在しない場合。
3. [プロジェクト] 関連リストで、[新規] を選択します。
4. プロジェクトフォームに入力します。

   プロジェクトタスクは、インシデント、問題、または変更レコードの子タスクになります。

プロジェクトタスククリエイターからのタスクの作成

プロジェクトタスククリエイターを使用して、一度に複数のタスクを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. プロジェクトフォームで、ヘッダーバーを右クリックして [プロジェクトタスククリエイター] を選択します。
2. 作成するタスクの数を入力します。
3. これらのタスク間に完了 - 開始の依存関係 (最初のタスクが終了すると次のタスクが開始される) を作成するには、**[FS** の依存関係を作成します] チェックボックスをオンにします。
   依存関係のないタスクを作成するには、チェックボックスをオフにします。
4. **[OK]** を選択します。
   新しいタスクが [プロジェクトタスク] 関連リストに表示されます。アプリケーションによりタスクの番号と、「自動作成されたタスク **(Auto Created Task)**」で始まり、複数のタスクを作成した場合は番号が続く簡単な説明が自動的に作成されます。

プロジェクトタスクリストへの行の挿入

新しいプロジェクトタスクを、プロジェクトフォームの [プロジェクトタスク] 関連リストから作成できます。アドミニストレーターは、このタスク作成機能を有効にする必要があります。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. プロジェクトフォームで、[プロジェクトタスク] 関連リストに移動します。
2. [**Insert a new row** (新規行を挿入)] をダブルクリックします。
3. 緑色のチェックマークを選択します
4. 新しいタスクを開き、必要に応じてレコードを編集します。

既存のタスクまたはプロジェクトのコピー

他のプロジェクトからタスクをコピーすると、プロジェクトのビルド時に時間を節約できます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
[部分プロジェクトをコピー] オプションでは、選択したタスクとその子タスクがプロジェクトにコピーされるか、またはすべてのプロジェクトタスクがサブプロジェクトにコピーされます。また、コピーされたタスクとその子タスクの間のすべての依存関係と関係も保持されます。コピーされたタスクのスコープ外のタスクを含む関係または依存関係は保持されません。

手順

1. プロジェクトまたはプロジェクトタスクフォームで、ヘッダーバーを右クリックして [部分プロジェクトをコピー] を選択します。
2. [タスク] フィールドで、コピーするプロジェクトタスクまたはプロジェクトを選択します。
   デフォルトでは、プロジェクトは PRJ で始まり、プロジェクトタスクは PRJTASK で始まります。
3. 新しいプロジェクトまたはタスクの名前を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. **[OK]** を選択します。

コピーしたタスクが現在のタスクまたはプロジェクトに追加されます。プロジェクトがコピーされた場合、すべてのタスクが新しいサブプロジェクトに挿入されます。

タスクの結果

コピーされたタスクは、現在表示しているいずれのタスクまたはプロジェクトでも子として挿入されます。実際の期間および実開始日と実終了日は、null 値にリセットされます。ステータスは [新規] に設定され、完了率は **[0]** に設定されます。

デフォルトでは、簡単な説明、予定日、および期間のフィールドのみが、ソースプロジェクトからターゲットプロジェクトにコピーされます。追加の列をコピーする必要がある場合は、プロジェクトプロパティの [元のプロジェクトタスクからコピーされる属性のリスト **(List of attributes that will be copied from the originating project task)]** で宣言する必要があります。

関連情報

コピーしたフィールドのデフォルト値の変更

コピーしたフィールドのデフォルト値の変更

新しい部分プロジェクトでデフォルト値を変更します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

実際の期間および実開始日と実終了日は、null 値にリセットされます。ステータスは [新規] に設定され、完了率は **[0]** に設定されます。アドミニストレーターは、UI ページを変更して、リセットするフィールドの決定や、デフォルト値の変更を行うことができます。

手順

1. 移動先 すべて > システム **UI** > **UI** ページ.
2. copy_partial_project レコードを開きます。
3. [処理スクリプト] フィールドにある場合は、次のスクリプトを使用します。

```
/* resetFields is the array containing the list of names of fields that need to be erased from the copied project tasks
   * defaultFields is the array containing the key, value pairs of field names and values that need to be set on the copied tasks
   */var resetFields =new Array();var defaultFields ={};
  resetFields.push("work_start","work_end","work_duration");
  defaultFields["state"]="-5";
  defaultFields["percent_complete"]="0";
```

関連情報

既存のタスクまたはプロジェクトのコピー

プロジェクトタスクテンプレートからのタスクの作成

プロジェクトタスクをテンプレートとして保存し、タスクの作成時に再利用できます。

始める前に


必要なロール：it_project_manager
必須フィールドに値を持つ既存のプロジェクトタスクを基にしたテンプレートが必要です。このプラットフォーム機能の詳細については、「テンプレート」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > タスク > すべて.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. テンプレートが下部に表示されない場合は、フォームの上部にある省略記号 (···) アイコンを選択し、[テンプレートバーの切り替え] を選択します。
4. フォームの下部にあるテンプレートバーでテンプレートリンクを選択します。



テンプレートがプロジェクトに適用されます。

デフォルトのプロジェクトおよびプロジェクトタスクステータスのカテゴリの表示

デフォルトのプロジェクトおよびプロジェクトタスクステータスのカテゴリ情報を表示します。ベースシステムでは、プロジェクトとプロジェクトタスクのステータスはタスクテーブルのステータスを継承します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > ディクショナリ.
2. 次の AND 条件でフィルターを更新します。
   a. [テーブル] [次の値に等しい **(=)]** [タスク]
   b. [列名] [次の値に等しい **(=)]** [ステータス]
3. フィルターを実行します。
4. タスクテーブルを選択し、**[**辞書オーバーライド**planned_task**関連リストでテーブルを選択します。

タスクの結果

[属性] フィールドには、次に示すように各種の状況とステータスのカテゴリが表示されます。また、各カテゴリのデフォルトの状況値も表示されます。

close_states=3;4;7,default_close_state=3,default_work_state=2,default_open_state=1,default_skipped_state=7,d

関連情報

プロジェクトとプロジェクトタスクの状況

プロジェクトまたはプロジェクトタスクのステータスのカスタマイズ

辞書オーバーライドを使用して、プロジェクトまたはプロジェクトタスクのステータスを追加または変更します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

例として、プロジェクトタスクの [対応中] 状況カテゴリにカスタム状況を追加する手順について説明します。この例では、次のようになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 既存の [対応中] ステータスが削除され、次の 3 つの新しいステータスが追加されます。

状況	ラベル	カテゴリ
10	デザイン	対応中
11	開発	対応中
12	テスト	対応中

- デフォルトの [対応中] は 10 ([デザイン]) のままです。

手順

1. [タスク - ステータス (Task - State)] 辞書の下に、pm_project_task テーブルの新しい辞書オーバーライドを定義します。
2. 次のように、辞書オーバーライドのオーバーライド属性を [属性] フィールドで指定します。
close_states=3;4;7,default_close_state=3,default_work_state=10,default_open_state=1,default_skipped_state=

タスクの結果

- ステップ 2 で指定したように、default_work_state は 10 として宣言され、work_in_progress_states は 10、11、および 12 として宣言されます。これで、プロジェクトタスクが新しい [対応中] 状況に変更されるたびに、その親も対応する [対応中] ステータスに移行します。

  プロジェクトタスクに 2 つの子レコードがあるとします。1 番目の子レコードが [開発] ステータスに移行すると、親も [開発] ステータスに移行します。ここで、2 番目の子レコードが [設計] ステータスに移行した場合、プロジェクトタスクの下の 2 つの子レコードは 2 つの異なる [対応中] ステータスになります。このような場合、親レコードはデフォルトの [対応中] ステータスに移行します。この場合、default_work_state が 10 ([デザイン]) として指定されているため、親レコードは [デザイン] に移行します。

- プロジェクトのステータスは、同じ手順を使用してカスタマイズすることもできます。

関連情報

プロジェクトとプロジェクトタスクの状況

プロジェクトタスクへの変更要求のリンク

プロジェクトタスクフォームで、変更要求をタスクにリンクします。変更要求は、子タスクを持たないプロジェクトタスクにのみリンクすることができます。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

変更要求のスケジュールやステータスに関係なく、任意の変更要求レコードをプロジェクトタスクにリンクすることができます。ただし、次の点を考慮することをお勧めします。

- 変更スケジュール：変更要求に、リンク先のプロジェクトの期間に該当するスケジュールがあります。または、変更要求フォームの [スケジュール] セクションの [開始予定日] と [終了予定日] フィールドに値がありません。
- 変更ステータス：変更要求をリンクするときは、[オープン] または [処理待ち] ステータスであることが必要です。すでに進行中またはクローズ済みの変更を停止して、新しい変更要求にコピーすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 子タスクを持たないプロジェクトタスクを開きます。
   子タスクが既に存在するタスクに変更要求をリンクすることはできません。
2. 次の関連リンクのいずれかを選択します。
   - 既存の変更要求をプロジェクトタスクにリンク **(Link an Existing Change Request to Project Task)**：

     表示されるダイアログボックスで、リンクする変更を入力または選択します。
   - 変更要求を作成し、プロジェクトタスクからリンク：

     変更要求フォームが表示されます。フォームに情報を入力します。変更要求の簡単な説明は、プロジェクトタスクから取得されます。

   注:
   これらの関連リンクは、プロジェクトタスクタイプがウォーターフォールの場合にのみ使用できます。

タスクの結果
プロジェクトタスクフォームに、タスクが 1 つ以上の変更要求にリンクされていることを示す通知が上部に表示されます。

関連リスト内の、リンクされた変更要求に指定されたタスクの例

関連情報

変更要求およびプロジェクトタスク

プロジェクトタスクの通知の承認または却下

外部ソフト依存関係の通知の変更を承認または却下します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
プロジェクトレコードの [通知] 関連リストは、後続プロジェクトで発生した外部依存関係に関連する通知を一覧表示します。通知は、先行プロジェクトで行われた変更の結果としてトリガーされ、後続プロジェクトまたはタスクに影響を与える可能性があります。

- ハード依存関係の通知の [ステータス] は、デフォルトで [処理済み] に設定されています。
- ソフト依存関係の通知の [ステータス] は、デフォルトで [新規] に設定されています。後続プロジェクトのプロジェクトマネージャーは、通知の変更を承認するか却下するかを選択できます。

手順

1. プロジェクトフォームを開きます。
2. [通知] 関連リストを選択します。
3. 参照アイコン [ⓘ] をクリックして、外部ソフト依存関係のプロジェクトタスク通知レコードを開きます。
4. [承認] または [却下] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果

- 通知レコードの [ステータス] が [承認] または [却下] に変更されます。
- 通知レコードの [ステータス] が [処理済み] に変更されます。

プロジェクトタスクチェックリストの使用

プロジェクトタスクでチェックリストを作成し、完了する必要があるタスクのアイテムを追跡できます。

始める前に

必要なロール：it_project_user、it_project_manager

手順

1. プロジェクトタスクに移動します。
2. プロジェクトタスクのチェックリストを作成するには、[チェックリスト] セクションで [新規作成] を選択し、チェックリストの名前を指定します。
3. プロジェクト タスクからチェックリストを削除するには、 [チェックリスト] の横にある下矢印を選択し、 [チェックリストの削除] を選択します。
4. **注:**
   このオプションは、[チェックリスト] セクションに少なくとも 1 つのチェックリストがある場合に表示されます。

   チェックリストをテンプレートとして保存するには、 [チェックリスト] の横にある下矢印を選択し、 [テンプレートとして保存] を選択します。

関連情報

プロジェクトタスクチェックリスト

テンプレートとしてのチェックリストの保存

テンプレートとしてのチェックリストの保存

プロジェクトタスクでチェックリストを作成したら、それをテンプレートとして保存し、他のタスクで再利用できます。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

手順

1. プロジェクトタスクに移動します。
2. [チェックリスト] の横にある下矢印を選択します。
3. [テンプレートとして保存] を選択します。
4. チェックリストの名前を入力します。
5. **[Save** (保存)] を選択します。

関連情報

プロジェクトタスクチェックリスト

プロジェクトタスクチェックリストの使用

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトタスクフォームでの親子関係の作成

任意のプロジェクトタスクフォームから子タスクを作成します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 関係内の親タスクに移動します。
2. [プロジェクトタスク] 関連リストで、[新規] を選択します。
3. タスクを作成し、[送信] を選択します。
   新しく作成されたタスクは、関係の子タスクになります。

次のタスク
タスクの親が何であるかを思い出せるように、プロジェクトタスクフォームの上部にあるブレッドクラムを表示します。[親] フィールドを含めるようにフォームレイアウトを構成することも有用です。このフィールドから親タスクを変更することもできます。

プロジェクトの金銭的利益計画の作成

金銭的利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。プロジェクトの利益計画は、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
利益計画を保存すると、金銭的利益計画明細レコードが自動的に作成されます。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 必要なプロジェクトを開きます。
3. [金銭的な利益計画] 関連リストで、[新規] を選択します。

   注:
   プロジェクトワークスペースの [財務] タブから金銭的利益計画を作成するには、[管理] を選択します。

4. フォームで、フィールドに入力します。

   フィールドの詳細については、「[利益計画] フォーム」を参照してください。

   注:
   プロジェクトまたはマイルストーンの日付を移動すると、利益計画がプロジェクトの開始日、終了日、またはプロジェクトマイルストーンの 1 つに関連付けられているかどうかに応じて、関連する利益計画も変更されます。プロジェクトプロパティの[デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更に基づきリソースプラン、コスト計画、および利益計画の開始日を変更します] が、プロジェクトの日付変更の動作を制御します。

5. **[Submit** (送信)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
[利益計画] フォームの [金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdowns)] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。

関連情報

プロジェクトの金銭的利益計画明細の更新

プロジェクトの金銭的利益計画明細の更新

特定の会計期間の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定する、金銭的利益計画明細レコードを更新します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 必要なプロジェクトを開きます。
3. [利益計画] 関連リストを選択します。
4. 必要な金銭的利益計画を開きます。
5. [金銭的利益計画ブレークダウン] 関連リストで、金銭的利益計画ブレークダウンの情報) を選択します。
6. [レコードを開く **(Open Record)]** を選択します。
7. 金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdown) フォームで、有効なフィールドを表示して更新します。
   詳細については、「[金銭的利益計画明細 (Monetary Benefit Plan Breakdown)] フォーム」を参照してください。
8. **[Update** (更新)] を選択します。

> **注:**
> 記録された実績利益が日付範囲外である場合、利益計画の開始日と終了日を変更することはできません。

関連情報

プロジェクトの金銭的利益計画の作成

プロジェクトの金銭以外の利益計画の作成

プロジェクトの金銭以外の利益計画の作成

金銭以外の利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。プロジェクトの利益計画は、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する潜在的な財務以外の利益をキャプチャします。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
[明細タイプ] フィールドで [自動] または [手動] を選択して利益計画を保存すると、金銭以外の利益計画明細レコードが自動的に作成されます。金銭以外の利益計画明細レコードは、特定の会計期間 (FY16 の 4 月および FY16 の 5 月など) の財務以外の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定します。[金銭以外の利益計画明細] 関連リストには、プロジェクトの各会計期間における財務以外の推定利益と実績利益の集計利益が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 必要なプロジェクトを開きます。
3. [金銭以外の利益計画] 関連リストを選択します。
4. 金銭以外の利益計画を作成するには、 新規 を選択します。
5. フォームで、フィールドに入力します。

   詳細については、「金銭以外の利益計画フォーム」を参照してください。

   注:
   プロジェクトまたはマイルストーンの日付を移動すると、利益計画がプロジェクトの開始日、終了日、またはプロジェクトマイルストーンの 1 つに関連付けられているかどうかに応じて、関連する利益計画も変更されます。プロジェクトプロパティの[デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更に基づきリソースプラン、コスト計画、および利益計画の開始日を変更します] が、プロジェクトの日付変更の動作を制御します。

6. **[Submit** (送信)] を選択します。

次のタスク

- 利益計画フォームの [金銭以外の利益計画ブレークダウン] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。
- 金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を関連付けて、ハイブリッド利益計画のプロジェクトによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。

関連情報

プロジェクトの金銭以外の利益計画明細の更新

プロジェクトの金銭以外の利益計画明細の更新

特定の会計期間の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定する、金銭以外の利益計画明細レコードを更新します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. [すべて] に移動プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 必要なプロジェクトを開きます。
3. [金銭以外の利益計画] 関連リストを選択します。
4. 必要な金銭以外の利益計画を開きます。
5. [金銭以外の利益計画明細] 関連リストで、金銭以外の利益計画明細の情報 ⓘを選択します。
6. [レコードを開く **(Open Record)]** を選択します。
7. 金銭以外の利益計画ブレークダウンフォームで、有効なフィールドを表示して更新します。
8. **[Update** (更新)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

プロジェクトの金銭以外の利益計画の作成

金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連付け

金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を関連付けて、ハイブリッド利益計画のプロジェクトによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
金銭的利益計画を金銭以外の利益計画に関連付けることも、その逆も可能です。

注:
利益計画を削除すると、関連する利益計画 (存在する場合) との関係も削除されます。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 必要なプロジェクトフォームを開きます。
3. [利益計画] または [金銭以外の利益計画] 関連リストを選択します。
4. 関連付ける利益計画の情報アイコン (ⓘ) を選択します。
5. [レコードを開く] を選択します。
6. 利益計画または金銭以外の利益計画を関連付けます。
7. **[Save** (保存)] を選択します。

タスクの結果
選択した利益計画は別の計画に関連付けられます。

次のタスク
[関連する利益計画を表示] 関連リンクを選択して、関連付けられている利益計画を表示します。

関連情報

プロジェクトの金銭的利益計画の作成

プロジェクトの金銭以外の利益計画の作成

プロジェクトコスト計画の作成

コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。プロジェクトコスト計画は、プロジェクトのコストをキャプチャします。

始める前に
必要なロール：it_project_manager
必要なアプリケーション： プロジェクトポートフォリオ管理 with Financials

このタスクについて
コスト計画を保存すると、アプリケーションによってコスト計画明細レコードが自動的に作成されます。コスト計画には、経費ラインを関連付けることもできます。

注:
コスト計画は、プロジェクトおよびプロジェクトタスクに関連付けられているリソース計画に対して自動的に作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

複数の通貨を使用するには、別の通貨の新しいコスト計画を作成します。

手順

1. プロジェクトフォームを開きます。
2. 関連リンクから、[コスト計画] を選択します。
3. **[New** (新規)] を選択します。

   > **注:**
   > プロジェクトワークスペースの [財務] タブからコスト計画を作成するには、[管理] を選択します。

4. フォームで、フィールドに入力します。

   フィールドの詳細については、「コスト計画フォーム」を参照してください。

   > **注:**
   > プロジェクトの開始予定日を変更すると、関連するコスト計画とリソース計画も変更されます。プロジェクトプロパティの[デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更でリソースプランとコスト計画の開始日を変更 **(Change Resource Plan and Cost Plan Start Date with Demand or Project Start Date Change)]** が、プロジェクトの開始日変更の動作を制御します。

5. **[Submit** (送信)] を選択します。

次のタスク

[完了時の推定 **(EAC)]** フィールドの値を再計算するには、[完了時の推定 **(EAC)** を計算 **(Calculate Estimate at Completion)]** 関連リンクを使用します。コスト計画ブレークダウンを表示するには、[コスト計画ブレークダウン] 関連リストを選択します。

関連情報

- コスト計画明細
- コスト計画明細の更新
- システム生成のコスト計画

コスト計画明細の更新

特定の会計期間の推定コストと実績コストを詳細なレベルで指定する、コスト計画明細レコードを更新します。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

手順

1. 必要なプロジェクトを開きます。
2. [コスト計画] 関連リストを選択します。
3. [コスト計画ブレークダウン] 関連リストを選択します。
4. コスト計画ブレークダウンに対して **[i**] アイコンを選択します。
5. [レコードを開く **(Open Record)]** を選択します。
6. [コスト計画明細フォーム] で、有効なフィールドを表示して更新します。
   詳細については、「[コスト計画ブレークダウン] フォーム」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

関連情報

- コスト計画明細
- システム生成のコスト計画

コストのロールアップ計算の有効化

プロジェクトプロパティからロールアップ計算を有効にします。

始める前に

必要なロール：it_project_manager


手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > 設定.
2. [プロジェクトコストのロールアップを有効にします] を選択します。
3. **[Save** (保存)] を選択します。

タスクの結果

フォームでは、ロールアップ値は読み取り専用です。ツールヒントメッセージのフィールドの横にあるアイコンをポイントします。

ツールヒント



関連情報

- プロジェクトコスト計画の作成
- コスト計画明細の更新

実際のプロジェクトコストの表示

プロジェクトポートフォリオ管理 with Financials を使用すると、コスト計画およびプロジェクトの実際のプロジェクトコストを表示できます。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

実績コストで考慮されるためには、経費ラインを処理する必要があります。実績コストは、処理日ではなく、経費ラインの作成日に対して記録されます。経費ラインは、承認されたタイムカードに対してのみ作成されます。
プロジェクトの実績コストも同じ方法でポートフォリオにロールアップされます。

手順

1. 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 実績コストを表示するプロジェクトを開きます。
3. [コスト計画] 関連リストを選択します。

関連情報

- 実際のプロジェクトコスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト内のすべてのリソース計画のコストの再計算

計画のコストを最新の状態で維持するために、関連付けられたレートモデルで時間レートが変更されるたびに、プロジェクト内のすべてのリソース計画のリソースコストを再計算します。

始める前に

次の設定を確認します。

- プロジェクトがアクティブである必要があります。
- プロジェクトにアクティブなレートモデルがアサインされている必要があります。
- リソース計画が [計画]、[要求済み]、[確認済み]、または [割り当て済み] ステータスである必要があります。

必要なロール：project_manager

このタスクについて

このオプションでは、プロジェクトのすべてのリソース計画のコストを同時に再計算します。[リソース計画] 関連リストからリソース計画を開いて、個々のリソース計画のリソースコストを再計算することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. プロジェクトを開きます。
3. プロジェクトフォームでヘッダーバーを右クリックし、[リソースコストを再計算] オプションを選択します。
4. [リソースコストを再計算] ダイアログボックスの各フィールドに入力します。

[リソースコストを再計算] ダイアログボックス

フィールド	説明
開始日	コストを再計算する期間の開始日。 デフォルトでは、フィールドには現在の日付が表示されます。
終了日	コストを再計算する期間の終了日。 デフォルトでは、フィールドにはプロジェクトの終了日が表示されます。
要求されたリソースプランの計画コスト (Planned costs for Requested Resource plans)	要求されたリソース計画の計画コストを再計算するためのオプション。
確認済み/割り当て済みリソース計画の確認済み/割り当て済みコスト (Confirmed/Allocated costs for Confirmed/Allocated resource plans)	要求されたリソース計画の確認済みまたは割り当て済みコストを再計算するためのオプション。
確認済み/割り当て済みリソース計画の計画コスト (Planned costs for Confirmed/Allocated resource plans)	確認済みまたは割り当て済み計画の計画コストを含めるためのオプション。 このオプションは、[確認済み/割り当て済みリソース計画の確認済み/割り当て済みコスト **(Confirmed/Allocated costs for Confirmed/**

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	Allocated resource plans)] オプションが選択されている場合に有効になります。 デフォルトでは、このオプションは選択されていません。

5. **[OK]** を選択します。

タスクの結果

- プロジェクト内の適用可能なすべてのリソース計画の選択されたリソースコストを、最新の時間レートに基づいて再計算します。時間レートは、プロジェクトに関連付けられたレートモデルから導出されます。
- リソース計画フォームおよび [リソース計画] 関連リストのそれぞれのコストフィールドで再計算されたリソースコストを更新します。
- 変更された値をプロジェクトのそれぞれのコストフィールドに反映します。

経費ラインの作成

プロジェクトの経費ラインは、ユーザー、固定資産、CI などの特定のソースに関連するコストです。経費ラインはプロジェクトコスト計画の一部です。

始める前に
必要なロール：it_project_manager
必要なアプリケーション： プロジェクトポートフォリオ管理 with Financials

このタスクについて
プロジェクト、プロジェクトタスク、およびデマンドに対しては、処理済みの経費ラインのみが考慮されます。プロジェクトまたはデマンドに対して複数の経費ラインを作成できます。

手順

1. プロジェクトフォームを開きます。
2. 関連リストで、[コスト計画] を選択します。
3. コスト計画を右クリックします。
4. [経費ラインの作成] を選択します。
5. フォームで、詳細を入力します。
   詳細については、「経費ラインフォーム」を参照してください。
6. **[Submit** (送信)] を選択します。

注:

- インポートされた処理済みの経費ラインは、[コスト計画] の [合計実績コスト] フィールドにロールアップされません。
- 処理待ちの経費ラインの [金額] を変更し、ステータスを [処理済み] に変更すると、最新の値が経費ラインにキャプチャされ、同じ値が [コスト計画] の [合計実績コスト] にロールアップされます。

タスクの結果
経費ラインが処理されると、発生した実際の金額がコスト計画の一部になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

実際に支出された金額は、適切な経費タイプ ([投資] または [経費]) の下でプロジェクトコスト計画に対して記録されます。経費ラインの作成時にコスト計画参照を指定しない場合、実績コストはプロジェクトレベルでコスト計画関連リストに記録されます。

[コスト計画] フィールドを入力せずに経費ラインを作成する場合は、システム生成のコスト計画が作成されます。

ウォーターフォールプロジェクトの作成と管理

ウォーターフォール手法を使用してプロジェクトを計画、作成、および管理します。

次の表に、ウォーターフォールプロジェクトの作成に関連するタスクをタスクグループ別に示します。

新しいプロジェクトを作成

タスク	ステップ
新しいプロジェクトを作成する	移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > 新規作成.

既存のプロジェクトを開く

タスク	ステップ
プロジェクトワークベンチでプロジェクトを開く	プロジェクトフォームで [プロジェクトワークベンチ] 関連リンクを選択します。

プロジェクトワークベンチからプロジェクトにフェーズを追加する

タスク	ステップ
プロジェクトのウォーターフォールフェーズを作成する	[フェーズを追加] アイコン (+ を選択し、[フェーズタイプ] 選択リストから [ウォーターフォール] を選択します。
プロジェクトのテストフェーズを作成する	[フェーズを追加] アイコン (+ を選択し、[フェーズタイプ] 選択リストから [テスト] を選択します。

プロジェクトワークベンチからプロジェクトフェーズを編集する

タスク	ステップ
プロジェクトのウォーターフォールフェーズを編集する	プロジェクトフェーズで [フェーズを編集] アイコン (を選択し、プロジェクトフェーズの詳細に必要な変更を加えます。
プロジェクトのテストフェーズを編集する	テストフェーズで [フェーズを編集] アイコン (を選択し、テストフェーズの詳細に必要な変更を加えます。

プロジェクトワークベンチからプロジェクトにマイルストーンを追加する

タスク	ステップ
プロジェクトにマイルストーンを追加する	[フェーズを追加] アイコン (+ を選択し、[フェーズの追加] ポップアップウィンドウの上部にある [マイルストーン] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手動テストを設定する

タスク	ステップ
テスト計画を作成する	移動先 すべて > テスト管理 > テスト実行 > テスト計画 > 新規.
テスト計画にテストケースを追加する	[テスト計画] フォームで [テストスイートからテストケースを追加] 関連リンクを選択します。
テストフェーズを作成する	プロジェクトワークベンチで [フェーズを追加] ボタンを選択します。
テストフェーズにテスト計画を追加する	テストフェーズの [フェーズを編集] アイコン (を選択し、 テスト計画の名前を入力します。
テスターにテストケースをアサインする	テストケースフォームの [アサイン先] フィールドでユーザーを選択します。
テストを開始するようにテスターに通知する	[テスト計画] フォームで [テスターにテスト 開始通知] 関連リンクを選択します。
テストの進捗状況を監視する	テスト計画リスト、テスト計画フォーム、およびテストケースフォームのすべてに、テストケースと個々のテスト結果が表示されます。
サインオフをテストする	テスト計画フォームで [サインオフテスト計画] 関連リンクを選択します。

関連情報

プロジェクトのベースラインの作成

プロジェクトの更新

プロジェクトを更新し、フィールドを調整してスコープ、コスト、およびスケジュールを処理します。プロジェクトの進行中は、実際の値を可能な限り最新の状態に維持します。実際の値の測定を継続し、潜在的なプロジェクトリスクの影響を分析します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. [対応中] ステータスのプロジェクトを開きます。
2. 次のフィールドを最新の状態に維持します。
   プロジェクトのステータスが [対応中] の間は、次のフィールドを最新の状態に維持ちます。
   - 優先度：特にポートフォリオ内の他のプロジェクトに関連する場合の、プロジェクトの優先度。
   - 正味価格：会社にとってのプロジェクトの価値で、予定収益で表されます。
   - リスクコスト：潜在的なプロジェクトリスクに関連するすべてのコストの合計。このフィールドはコスト管理とは関係ありませんが、このフィールドを使用してプロジェクト中に発生するリスクのコストを見積もることができます。
   - 構成アイテム：プロジェクトに関連する CI。
   - スケジュール：作業スケジュールのタイプ。
   - 作業メモ：プロジェクトに関連するメモとコメントの有用なレコード。
   - ライブフィード：プロジェクトのさまざまなステークホルダー間のコラボレーションの記録。
   プロジェクトタスクの場合は、次のフィールドを最新の状態に維持します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ステータス：タスクの開始時点 (開始日が指定されているタスクの場合) でプロジェクトタスクの状況を [対応中]に変更し、タスクが終了したら [クローズ済み] に変更することを忘れないでください。タスクの時間制約が [すぐに開始] に設定され、先行タスクのステータスがいずれかのクローズ済みステータスに変更された場合を除き、タスクのステータスは自動的に変更されません。
- アサイン先グループ：タスクで現在作業しているリソースのグループ。
- アサイン先：タスクにアサインされた個人。
- タイムカード：リソースがプロジェクトで作業する時間。[実績工数] にロールアップされます。タイムカードに賃金レートが設定されている場合、タイムカードの変更はプロジェクトの実績コストに影響します。

3. [更新] をクリックしてレコードを保存します。

関連情報

プロジェクトのコメントの追跡とステークホルダーとのコラボレーション

プロジェクトのコメントの追跡とステークホルダーとのコラボレーション

プロジェクトが進行中の場合は、プロジェクト参加者のやり取りと共同作業に役立つ、ジャーナルフィールドとライブフィードという 2 つのプラットフォーム機能を利用できます。役立つ 2 つのジャーナルフィールドは、[コメント] と [作業メモ] です。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

手順

- ジャーナルフィールドをプロジェクトフォームに追加するには：
  1. [コメント] と [作業メモ] を表示するようにプロジェクトフォームを構成 します。
- ライブフィード をプロジェクトフォームに追加するには：
  1. 移動先 すべて > システム定義 > ディクショナリ.
  2. 対応する列名がない**pm_project**テーブル名を選択します。
  3. [属性] フィールドに「live_feed=true」と入力します。
  4. **[Update** (更新)] を選択します。
  5. 移動先 すべて > システム定義 > **UI** アクション.
  6. [ライブフィードをフォロー] リストアクションを開きます。
  7. [テーブル] フィールドで、[pm_project] テーブルを選択します。
  8. ヘッダーを右クリックして [挿入] を選択し、[pm_project] テーブルを対象とした UI アクションのコピーを作成します。
  9. [ライブフィードを表示] フォームアクションの UI アクションについて手順を繰り返します。
  10. プロジェクトフォームをカスタマイズし、アクティビティフォーマッターであるアクティビティ (フィルター付き) をプロジェクトフォームの目的の場所に追加します。

関連情報

プロジェクトの更新

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトをコピー

プロジェクトを作成するもう 1 つのオプションは、既存のプロジェクトおよびそのすべてのタスクと関係をコピーすることです。コピーの開始日を指定すると、すべてのタスクの開始日と終了日が自動的に調整されます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. プロジェクトフォームで、追加アクションアイコン (☰ を選択し、[プロジェクトをコピー] を選択します。
2. [選択したプロジェクトをコピー] モーダルで、 新しいプロジェクト名を入力します。
3. [開始日] を選択し、[**OK]** を選択します。
   プロジェクトタスク (Project Task) フォームから利用できる [部分プロジェクトをコピー] も同様の機能を提供します。選択したプロジェクトからすべてのタスクまたはプロジェクトの関係と子をコピーし、現在のプロジェクトに挿入します。この場合、新しいプロジェクトレコードは作成されません。

タスクの結果
実際の期間および実開始日と実終了日は、null 値にリセットされます。ステータスは [新規] に設定され、完了率は **[0]** に設定されます。

デフォルトでは、簡単な説明、予定日、および期間のフィールドのみが、ソースプロジェクトからターゲットプロジェクトにコピーされます。追加の列をコピーする必要がある場合は、プロジェクトプロパティの [元のプロジェクトタスクからコピーされる属性のリスト **(List of attributes that will be copied from the originating project task)]** で宣言する必要があります。

関連情報
コピーしたプロジェクトのデフォルト値の変更

コピーしたプロジェクトのデフォルト値の変更

新しくコピーされた部分プロジェクトまたはプロジェクト全体の、コピーされたフィールドのデフォルト値をリセットまたは変更します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
子タスクは同じ関係で定義され、それぞれが元のタスクと同じ期間持続します。すべてのプロジェクトタスクが [処理待ち]に設定されます。実際の期間および実開始日と実終了日は、null 値にリセットされます。ステータスは [新規] に設定され、完了率は「0」に設定されます。アドミニストレーターは、スクリプトインクルードの CopyProjectFieldOverride を上書きして、リセットするフィールドを決定したり、デフォルト値を変更したりできます。

手順

1. 移動先 すべて > システム **UI** > スクリプトインクルード.
2. CopyProjectFieldOverride レコードを開きます。
3. 値をリセットまたはデフォルト設定するために、CopyProjectFieldOverrideSNC スクリプトで定義されたメソッドを上書きするメソッドを追加します。

   たとえば、部分プロジェクトをコピーするには次のようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
   /* getResetFieldsForCopyPartialProject method returns the array containing the list of
names of fields that need to be erased from the copied project tasks
                * getDefaultObjectForCopyPartialProject method returns the object containing
the key, value pairs of field names and values that need to be set on the copied tasks
                */var CopyProjectFieldOverride = Class.create();
                CopyProjectFieldOverride.prototype =
Object.extendsObject(CopyProjectFieldOverrideSNC, {
                getResetFieldsForCopyPartialProject: function() {
                return ['work_start', 'work_end', 'work_duration'];
                },
                getDefaultObjForCopyPartialProject: function() {
                return {'state': -5,'percent_complete: 0'};
            },
            type: 'CopyProjectFieldOverride'
            });
```

プロジェクト全体をコピーするには次のようにします。

```
/* getResetFieldsForCopyProject method returns the array containing the list of names of
fields that need to be erased from the copied project tasks
        * getDefaultObjectForCopyProject method returns the object containing the key,
value pairs of field names and values that need to be set on the copied tasks
        */var CopyProjectFieldOverride = Class.create();
        CopyProjectFieldOverride.prototype =
Object.extendsObject(CopyProjectFieldOverrideSNC, {
        getResetFieldsForCopyProject: function() {
                return ['work_start' ,"work_end","work_duration"];},
                getDefaultObjForCopyProject: function()
                {
                   return {'state': -5, 'percent_complete: 0'};
                },
                type: 'CopyProjectFieldOverride'
             });
```

4. **[Update** (更新)] を選択します。

関連情報

プロジェクトをコピー

プロジェクトスケジュールのアサイン

スケジュールがアサインされていない場合、プロジェクトは 1 日を 24 作業時間として計算します。より現実的な作業日でタスクをスケジュールするには、プロジェクトにスケジュールをアサインします。ベースシステムで指定されているスケジュールがニーズに合わない場合は、新しいスケジュールを定義します。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

手順

1. プロジェクトを開きます。
2. [デフォルト] ビューがアクティブな場合は、ヘッダー バーを右クリックして 表示 > 詳細.
3. [スケジュール] フィールドでスケジュールを選択し、[保存] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトのベースラインの作成

プロジェクトのスケジュールベースラインと財務ベースラインを作成します。スケジュールベースラインは、特定の時点におけるすべてのタスクとマイルストーンの予定日をキャプチャします。財務ベースラインは、特定の時点における利益および財務メトリクス情報 (コスト計画、利益計画、およびプロジェクトレベルの財務メトリクスのスナップショット) をキャプチャします。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
スケジュールベースライン

スケジュールベースラインを必要なだけ作成し、前回のベースライン以降にプロジェクトに加えられた変更をレビューすることができます。プロジェクトがスケジュールどおりに進んでいない場合は、スケジュールベースラインを作成して、スケジュールにどの程度のずれが生じているかを把握できます。また、実際の値と計画値の間のリアルタイムの偏差を表示するのにも役立ちます。

ベースラインは、ガントチャートの実際のタスクを表す棒の下に、一連の灰色の線として表示されます。これらのベースラインは予定日を表し、タスクバーは実際の日付を表します。プロジェクトタスクがベースラインの右側にシフトされている場合、プロジェクトはスケジュールより遅れて実行されています。

財務ベースライン

財務ベースラインを必要なだけ作成し、それらを比較して、前回のベースライン以降にプロジェクトに加えられた財務の変更をレビューすることができます。財務ベースラインは、プロジェクトの実績コストコンポーネントをキャプチャしません。

> **注:**
> ネストされたプロジェクトにベースラインを設定することはできません。ベースラインは、トップレベルのプロジェクトでのみ使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 必要なプロジェクトを選択します。
3. プロジェクトのスケジュールベースラインと財務ベースラインを作成するには、次のいずれかのオプションを使用します。

   > **注:**
   > [ベースラインの作成] ポップアップでは、[スケジュールベースラインを作成] および [財務ベースラインを作成] チェックボックスがデフォルトでオンになっています。特定のベースラインを作成しない場合は、チェックボックスをオフにします。

関連情報

- プロジェクトの財務ベースラインの比較
- プロジェクトのスケジュールベースラインの比較

プロジェクトの財務ベースラインの比較

ベースラインを比較して、プロジェクトの財務データの差異を確認し、何が変更されたかを確認します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
プロジェクトのさまざまなステージで複数のベースラインを作成できます。たとえば、各フェーズの終わりや、各暦月または各暦四半期の後に作成できます。各ベースラインは、特定の時点でのプロジェクトの財務データをキャプチャし、プロジェクトに加えられた変更を識別およびレビューするための基礎を提供します。複数のベースラインを用意して比較すると、プロジェクトのパフォーマンスを追跡するのに役立ちます。

手順

1. プロジェクトの財務ベースラインを比較するには、次のいずれかのオプションを使用します。

2. 財務ベースラインフォームで、比較するベースラインを 2 つの選択リストから選択します。
   デフォルトでは、現在のベースラインと最新のベースラインが選択されます。
3. [比較] を選択します。
   ベースラインの比較データは、次の 2 つのセクションに表示されます。
   - [財務ベースラインの概要 **(Financial Baseline Summary)]** セクションには 4 つのウィジェットが表示されます。最初の 2 つのウィジェットには 2 つのベースラインの財務データが含まれ、3 つ目のウィジェットにはその差異が含まれ、4 つ目のウィジェットにはプロジェクトの現在までの実績コストが含まれます。
   - [財務ベースラインの詳細] セクションには、2 つの異なるグリッドの 2 つのベースラインのコスト計画と利益計画が表示されます。各計画タイプには、各ベースラインデータに対応する 2 つの行があります。

     注:
     ベースライン凡例アイコン (ⓘ) を選択すると、各ベースラインを表す行のカラーコードが表示されます。

4. オプション: フォームで他のフィールドを確認したり、比較データを再編成したりできます。
   - [財務ベースラインの概要 **(Financial Baseline Summary)**] セクションのウィジェットの追加フィールドを表示または非表示にするには、構成アイコン (⋯) を選択し、フィールド名を選択します。

     選択したフィールドの設定が保存され、財務ベースラインフォームを再度開くと利用できるようになります。デフォルトのウィジェットレイアウトにリセットするには、[デフォルト値にリセット] を選択します。
   - コスト計画または利益計画の比較データを年次、四半期、または月次の形式で表示するには、それぞれ [年]、[四半期]、または [月] ビューを選択します。
   - [財務ベースラインの概要] セクションの表示を切り替えるには、折りたたみアイコン (^) または展開アイコン (›) を選択します。

プロジェクトのスケジュールベースラインの比較

ベースラインを比較してタスク間の差異を確認し、現在の終了予定日とベースライン終了日との差異があるタスクを特定します。ベースラインの差異列には、2 つの日付比較間の差異の総計が表示されます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

プロジェクトのさまざまなステージ (各フェーズの終わりや、各暦月または各暦四半期の後など) で、スケジュールベースラインを作成します。各ベースラインは、特定の時点でのプロジェクトタスクのスケジュール情報をキャプチャします。このスナップショットは、比較の基礎となり、プロジェクトに加えられた変更を特定して確認するのに役立ちます。複数のベースラインを用意して比較すると、プロジェクトのパフォーマンスを追跡するのに役立ちます。

手順

1. プロジェクトのスケジュールベースラインを比較するには、次のいずれかのオプションを使用します。
   計画立案コンソールに、選択したスケジュールベースラインが表示されます。
2. 計画立案コンソールでさまざまなベースラインを選択して、プロジェクトタスクのスケジュール差異情報を表示します。
   次の各列に、ベースライン情報が表示されます。
   - ベースライン開始日付：タスクの開始予定日。
   - ベースライン終了日付：タスクの終了予定日。
   - ベースラインの差異：ベースライン終了日と終了予定日の差異。このフィールド列の値は、プロジェクトタスクまたはプロジェクトに変更が行われているかどうかを示します。タスクの終了予定日がベースライン日付より前の場合、差異は負の値として表示されます。たとえば、終了予定日が 4 月 24 日で、ベースラインが 4 月 17 日に作成されているタスクの場合、タスクが期限を過ぎているか遅れていることを意味します。この場合、[ベースラインの差異] 列には、-5 日間の値が表示されます。

   注:
   ガントで列を表示または非表示アイコン ( ) を使用して、これらの列を計画立案コンソールに追加します。

関連情報

プロジェクトのベースラインの作成

マイルストーンの作成

マイルストーンは、期間がゼロ (0) のプロジェクトタスクです。マイルストーンを使用して、主要な意思決定ポイント、承認、および休日など、プロジェクトの重要な日付をマークします。マイルストーンは他のプロジェクトタスクと同様に扱われ、タスクとマイルストーンの間に依存関係を作成できます。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

注:
あるプロジェクトが別のプロジェクトの下にネストされていない限り、マイルストーンをプロジェクト間で共有することはできません。

手順


1. プロジェクトタスクを作成し、[期間] フィールドの値を「**0**」にします。
2. 計画立案コンソールのガントチャートを開き、ダイヤモンド形で表示されていることを確認します。
   計画立案コンソールのタスクを使用してタスクをマイルストーンに変換することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果

マイルストーン



プロジェクトタスクのメール通知の有効化

プロジェクト管理 (PM)アプリケーションの次のメール通知はデフォルトで利用可能ですが、無効になっています。それらを手動で有効化する必要があります。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム通知 > メール > 通知.
2. 次の通知を有効化します。

メール通知

通知	テーブル	フィールド	条件	説明
プロジェクトタスクのアサイン	pm_project_task	担当者	挿入時または更新時	タスクがリソースにアサインされたとき、またはアサインされたリソースが変更されたときに、メール通知を送信します。
プロジェクトタスクの開始	pm_project_task	状況	[対応中] への変更	プロジェクトタスクが開始されたときにメール通知を送信します。
プロジェクトタスクのコメント追加	pm_project_task	追加コメント	変更の発生時	コメントフィールドが更新されたときにメール通知を送信します。

ワークフローツールを使用したプロジェクト通知の設定

ワークフローツールを使用して、たとえば、プロジェクトタスクのステータスが [対応中] になったときにメール通知を送信するワークフローを設定します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 次の属性を持つワークフローを作成します。
   - 名前：通知先アサイニー
   - テーブル：プロジェクトタスク [pm_project_task]
   - 条件に一致した場合：他のワークフローと一致しない場合に実行

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


- 条件：ステータスが [対応中] で、[アサイン先] が空でない

  注:
  この例では、他の属性を変更しないでください。

2. 開始アクティビティと終了アクティビティの間に 1 つの通知アクティビティを追加します。

   色が変わるまでアクティビティをコネクター行にドラッグします。アクティビティの属性は、次の例のようになります。

   - 名前：通知先アサイニー
   - 宛先 (To)：${assigned_to}
   - 件名： プロジェクトタスク ${number} が有効化され、あなたにアサインされました
   - メッセージ：プロジェクトタスク ${number} が有効化され、あなたにアサインされました
     - 番号 (Number)：${number}
     - 簡単な説明：${short_description}
     - 開始予定日：${start_date}
     - 終了予定日：${end_date}
     - 計画期間 (Planned duration)：${duration}

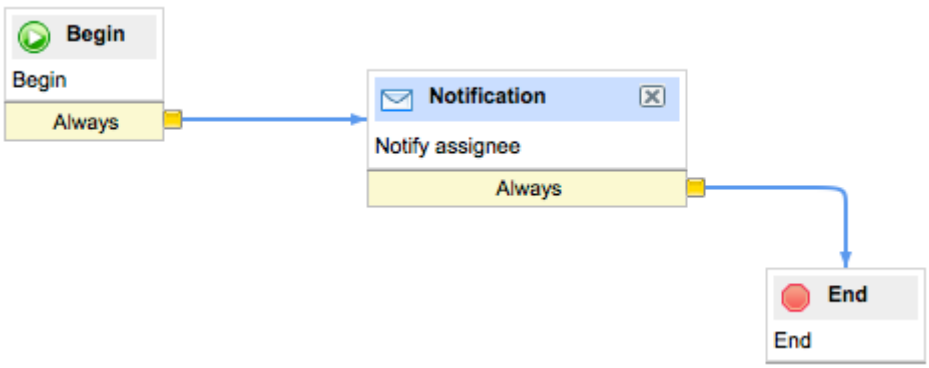

自動翻訳

関連情報

プロジェクトタスクのメール通知の有効化

プロジェクトの開始予定日の変更

プロジェクトの開始予定日を変更し、現在の計画済みスケジュールよりも後または前にシフトして、プロジェクトのスケジュールを調整します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
プロジェクトの開始予定日を新しい日付に変更すると、プロジェクトの更新された開始日に関連する、そのすべてのタスクとサブプロジェクトも移動されます。次の条件が満たされている場合、プロジェクトの開始予定日を変更できます。

- プロジェクトの [ステータス] が [処理待ち] または [オープン] です。
- WIP ステータスのプロジェクトの開始日を移動するには、**[WIP** プロジェクトのプロジェクトの移動を有効にする] プロパティ (*com.snc.project.move_project.wip*) を true に設定します。このプロパティのデフォルト値は false です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 実行対象として project_funding レコードが選択されていません。
- プロジェクトの実際の日付は入力されません。

注:

- [プロジェクト移動] オプションは、タスクまたはサブプロジェクトがあるプロジェクトでのみ使用できます。
- スプリントを使用するアジャイルフェーズがプロジェクトに関連付けられている場合、プロジェクトの開始予定日を変更すると、スプリントの開始日と終了日もクリアされます。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、プロジェクトの開始予定日を変更します。

2. ダイアログボックスで日付を選択します。
3. [制約タイプに関係なくすべてのタスクを移動] チェックボックスをオンまたはオフにします。
   - チェックボックスをオフにすると、[すぐに開始] 制約のあるタスクのみが新しいプロジェクト日付に移動されます。
   - チェックボックスをオンにすると、[すぐに開始] 制約のあるタスクを除き、すべてのプロジェクトタスクが制約に関係なく、同じオフセットで新しいプロジェクト日付に移動されます。

   このチェックボックスはデフォルトでオンになっています。

   注:
   WIP 状況とクローズ状況のタスクは移動されません。

4. **[OK]** を選択します。

タスクの結果

- プロジェクトの開始予定日が新しい日付に更新されます。
- プログラムの日付は、プロジェクトの開始日を基準にして更新されます。
- [制約タイプに関係なくすべてのタスクを移動] チェックボックスがオンになっている場合、[特定の日に開始] および [以下以降に開始] 制約のあるすべてのプロジェクトタスクは、前のプロジェクト開始日からの同じオフセットで新しい開始日に移動されます。制約日付も同じオフセットで移動されます。

  たとえば、プロジェクトが 11 月 10 日に開始され、タスクの開始日時が 11 月 15 日である場合、オフセットは 5 日間になります。プロジェクト開始日を 11 月 20 日に移動すると、タスク開始日は 11 月 25 日に移動され、プロジェクト開始日から 5 日間のオフセットが維持されます。

- [すぐに開始] 制約のあるすべてのプロジェクトタスクは、プロジェクトフォームの [制約日付] フィールドに基づいて新しい開始日に移動されます。タスクのステータスは、[オープン] または [処理待ち] である必要があります。
- [デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更でリソース計画とコスト計画の開始日を変更 **(Change Resource Plan and Cost Plan Start Date with Demand or Project Start Date Change)]** プロパティが選択されている場合、コスト計画、リソース計画、利益計画などのすべての関連エンティティが、プロジェクト開始日を基準にして移動されます。このプロパティの設定方法の詳細については、「プロジェクト管理 (PM) とともにインストールされるプロパティ」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

プロジェクトタスクの日付を前の日付に移動

プロジェクトの開始

プロジェクトタスクの日付を前の日付に移動

タスクの開始予定日をプロジェクトの開始予定日より前に移動します。前の日付に移動されたタスクを追加すると、プロジェクトの開始予定日より前に開始する必要があるタスクに対応できます。

始める前に
プロジェクトタスクを作成しておくか、プロジェクトに追加しておく必要があります。

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
プロジェクトタスクの日付を前に移動する前に、次の条件に注意してください。

- プロパティ project.rollup_project_start_date を true に設定する必要があります。
- タスクの開始予定日より前の日付にすると、プロジェクトの開始予定日も移動されます。
- 子タスクの開始日を親タスクの開始日より前に移動することはできません。たとえば、[以下以降に開始] 制約のある親タスクが 20 日に開始され、子タスクが 30 日に開始される場合、子タスクの開始日は 20 日までしか移動できません。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. リストからプロジェクトを選択します。
3. プロジェクトフォームで次のいずれかのオプションを使用して、プロジェクトタスクの開始予定日を更新します。
4. 移動日付 ダイアログ ボックスで、 **OK** を選択します。

関連情報

プロジェクトの開始予定日の変更

原価費目定義の作成

原価費目定義を作成して、原価費目、経費、または投資を、ファイナンシャルマネジメント アプリケーションから総勘定元帳のアカウントに関連付けます。プロジェクトポートフォリオ管理 with Financials を使用している場合は、原価費目定義を作成します。

始める前に
必要なロール：it_pps_admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > コストタイプ定義.
2. [新規] を選択し、名前を入力します。
3. 総勘定元帳アカウント [itfm_gl_accounts] テーブルからアカウントを選択します。
4. 投資コストの場合は [投資] を、経費の場合は [経費] を選択します。
5. **[Submit** (送信)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

の原価計算アドオン プロジェクト管理 **(PM)**


プロジェクト管理 (PM)原価計算アドオンは、 プロジェクト管理 (PM)アプリケーションをコスト管理アプリケーションに接続して、プロジェクトに関連するコストを見積もり、追跡できるようにします。

このプラグインにより、次のプロジェクト原価計算機能が有効になります。

- プロジェクトの計画立案時にグループのリソースコストを見積もります。
- プロジェクトの各ユーザーリソースの実際のコストを追跡します。
- タイムカードやその他のプロジェクト経費から実際のプロジェクトタスクコストを追跡します。
- プロジェクトコストをビジネスに割り当てます。
- プロジェクトが影響を与える CI のプロジェクトコストを表します。
- 実際のタスク経費を親タスクおよびプロジェクトレコードにロールアップします。

次の図に示すように、プロジェクトとコストアプリケーションは連携して動作します。

プロジェクトとコストアプリケーション

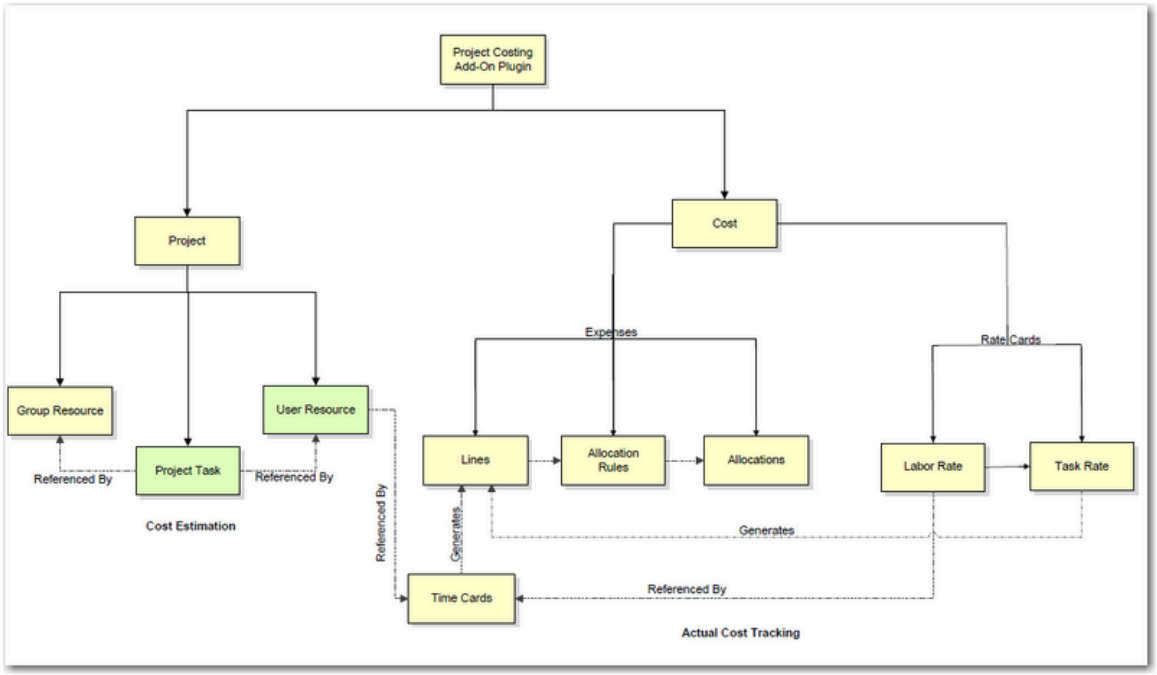

このプラグインでは、次のプロパティを使用できます。

原価計算アドオンのプロパティ

説明	プロパティ名	メモ
予定されているタスクタイプに対して、タスクの経費ライン合計を使って実績コストフィールドを計算します。	glide.cost_mgmt.calc_actual_cost	デフォルト：**true**。これはコスト管理からのプロパティです。**planned_tasktype** のいずれかのタスクに対して経費ラインが作成され、このプロパティが true の場合、システムはすべての経費ラインのコストの合計を取得し、 **work_cost**

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

原価計算アドオンのプロパティ (続く)

説明	プロパティ名	メモ
		フィールドに総コストを設定します。
タスク経費ラインの作成時に、トップタスクの経費ラインも作成しますか? (When creating a task expense line should the system also create expense lines for the top task?)	glide.cost_mgmt.process_task_top_task	デフォルト値：**true**
プロジェクトコストのロールアップを有効にします (推定および実際) - プロジェクトタスクのコストを更新すると、その親のコストが更新されます。	com.snc.project.rollup.cost	デフォルト値：**true**

このプラグインでは、次のビジネスルールが追加または変更されます。

原価計算アドオンのビジネスルール

名前	テーブル	説明
プロジェクトコストのロールアップ (Project Cost Rollup)	計画タスク [planned_task]	デフォルト：**true**。これはコスト管理からのプロパティです。**planned_tasktype** のいずれかのタスクに対して経費ラインが作成され、このプロパティが true の場合、システムはすべての経費ラインのコストの合計を取得し、 **work_cost** フィールドに総コストを設定します。
トップタスクの親を処理 (Process Top Task Parent)	[fm_expense_line]	デフォルト値：**true**

人件費の生成

プロジェクトのリソースのアサインに対する計画立案属性ページで財務用に構成された計画立案属性に基づいて人件費を生成します。

始める前に

- 財務に対して有効になっている計画立案属性を確認します。詳細については、「Planning 属性の使用」を参照してください。
- 必要なロール：it_project_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて をクリックし、必要なプロジェクトを選択します。
   コスト計画を生成するために、リソースのアサインが確定していることを確認します。プロジェクトに対するリソースのアサインがない場合は、リソース計画をリソースのアサインに移行します。詳細については、「プロジェクトとデマンドのリソース計画とコスト計画の移行」を参照してください。
2. 次のいずれかのオプションを使用して人件費を生成します。

3. ブラウザーページを更新して、[コスト計画] 関連リストに属性ベースの人件費を表示します。

タスクの結果
属性ベースの人件費は、コスト計画の名前として反映される属性の一意の組み合わせに対して作成されます。

関連情報

人件費を生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化

[スケジュール済みスクリプト実行] フォーム

人件費を生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化

スケジュール済みジョブをアクティブ化してトリガーし、必要な頻度ですべてのプロジェクトとデマンドに対する属性ベースの人件費を生成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [デマンドおよびプロジェクトの人件費の生成 **(Generate labor costs for demands and projects)]** スケジュール済みジョブを開きます。
3. [アクティブ] を選択し、[スケジュール済みスクリプト実行] フォームでフィールドに入力します。フィールド名の説明については、「[スケジュール済みスクリプト実行] フォーム」を参照してください。
4. [更新] を選択します。

関連情報

[スケジュール済みスクリプト実行] フォーム

人件費の生成

プロジェクトステータスレポートを作成する

プロジェクトフォームの関連リストからプロジェクトステータスレポートを作成します。最新のステータス日付で作成されたプロジェクトステータスレポートにより、ポートフォリオ内のプロジェクトのステータスが更新されます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
プロジェクトステータスレポートには、RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードのスナップショットステータス、主要なマイルストーン、およびチャートのみが表示されます。

ステータスレポートに RIDAC レコードを含めるには、個々の RIDAC フォームで [プロジェクトステータスレポートに表示] オプションを選択します。

プロジェクトワークスペースからプロジェクトステータスレポートを印刷することもできます。レポートを印刷するには、ステータスレポートタブのヘッダーにある印刷アイコン( )を選択します。

手順

1. プロジェクトステータスレポートの作成

2. ステータスレポートフォームで、詳細を入力します。
   詳細については、「ステータスレポートフォーム」を参照してください。
3. [送信] を選択します。

関連情報

- プロジェクトステータスレポートの表示
- ステータスレポートフォーム

プロジェクトステータスレポートの表示

プロジェクトステータスレポートでは、いくつかのカテゴリに表示されたプロジェクトの最新の進捗状況を一目で確認できます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
プロジェクトステータスレポートはスナップショットとして機能します。つまり、レポートは、ステータスレポートが生成された日時のさまざまなパラメーターのステータスを保持し、さまざまなパラメーターのステータスを動的には表示しません。たとえば、前週に作成されたプロジェクトステータスレポートは、その週と同じステータスを保持し、ステータスを動的に更新しません。
プロジェクトステータスレポートを使用して、プロジェクトの進捗状況を比較できます。最近の変更がレポートに反映されるように、新しいプロジェクトステータスレポートを生成します。

プロジェクトステータスレポートには、RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードのスナップショットステータス、主要なマイルストーン、およびチャートのみが表示されます。

手順

1. プロジェクトステータスレポートを開きます。

   注:
   ポートフォリオワークベンチからプロジェクトステータスレポートを開くこともできます。ポートフォリオワークベンチでポートフォリオを開き、[ポートフォリオを追跡] を選択します。[タイムライン表示] でプロジェクトを右クリックし、コンテキストメニューから [ステータスレポート] を選択します。

2. 次のセクションでプロジェクトのステータスを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトステータスレポートのセクション

セクション	説明
概要	プロジェクトに関する次のような概要を示します。 ○ プロジェクト名：プロジェクトの名前。 ○ プロジェクトマネージャー：プロジェクトにアサインされたプロジェクトマネージャー。 ○ ポートフォリオ：プロジェクトが属するプライマリポートフォリオ。 ○ ステータス：プロジェクトの現在のステータス。 ○ フェーズ：プロジェクトの現在のフェーズ ([開始中]、[計画中]、および [実行中] など)。 ○ 完了率 **(%)**：プロジェクトが完了したパーセンテージ。 ○ 開始予定日：プロジェクトの開始予定日。 ○ 終了予定日：プロジェクトの終了予定日。 ○ 計画コスト：プロジェクトのコスト概算。 ○ 実開始日：プロジェクトが開始された日付。 ○ 実終了日：プロジェクトの実終了日。 ○ 実績コスト：プロジェクトの実績コスト。 この情報はプロジェクトフォームからロールアップされます。 プロジェクトフォームの [ステータスレポート通貨] フィールドのユーザー設定をプロジェクト通貨として設定した場合は、[概要] タブに次のプロジェクト通貨フィールドが表示されます。 ○ プロジェクト通貨での計画コスト：プロジェクト通貨でのプロジェクトのコスト概算。 ○ プロジェクト通貨での実績コスト：プロジェクト通貨でのプロジェクトのコスト。 **注:** 上記のフィールドは、PPM Standard Multicurrency プラグイン (com.snc.ppm_multicurrency) を有効にして、プロジェクト通貨ビューに切り替えると表示されます。詳細については、「プロジェクトファイナンシャルにおける複数通貨」を参照してください。
サマリ	プロジェクトの総合健全性に関する情報を提供します。 ○ エグゼクティブ サマリー：プロジェクトの簡単な要約と分析。 ○ 先週の達成度：プロジェクトの前週の進捗状況。 ○ 予定されている主要アクティビティ：プロジェクトで次に予定されているアクティビティ。
コスト (計画 対実績) チャート	プロジェクト通貨ビューを有効にしている場合は、[プロジェクト通貨でのコスト（予定 対 実績)] セクションに、プロジェクト通貨での実績コストと計画コストの比較に関する情報が表示されます。 この情報は、プロジェクトのコスト計画からロールアップされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セクション	説明
	○ 計画：プロジェクトの承認済みコスト。 ○ 実績：プロジェクトの実績コストは、プロジェクトコスト計画に対して作成された経費ラインと、プロジェクトに対して作成されたタイムカードから導出されます。
リソース (配分 対 実績) チャート	使用された実績リソース時間と割り当て済みリソース時間の比較に関する情報を提供します。この情報は、プロジェクトのリソース計画からロールアップされます。 ○ 割り当て済み：プロジェクトを実行するために割り当てられたリソース時間。 ○ 実績：実際に費やされた時間は、プロジェクトに対して作成された処理済みのタイムカードから取得されます。
現在のステータス	プロジェクトの総合健全性、スケジュール、コスト、リソース、およびスコープに関連するステータスを提供します。この情報は、プロジェクトのプロジェクトマネージャーが入力した最新のステータスから入力されます。 ○ ステータス：ステータスを示す色インジケーター。 ○ コメント：ステータスに関するコメント。
ステータス履歴	プロジェクトの総合健全性、スケジュール、コスト、リソース、およびスコープの傾向を提供します。ステータスレポートの [ステータス履歴] タブには、最大 9 つのエントリを含めることができます。この情報は、プロジェクトに対して作成された最新の 9 つの ステータスレポート から入力されます。 日付：ステータスレポートのステータス日付。色インジケーターは、これらの日付におけるプロジェクトのステータスを示します。
主要マイルストーン	プロジェクトの主要なマイルストーンに関する情報を提供します。この情報は、主要なマイルストーンとして識別されたプロジェクトタスクから入力されます。 ○ 処理待ち：[処理待ち]、[オープン]、および [対応中] ステータスの主要なマイルストーンタスクのリスト。 ○ 完了：[クローズ済み] ステータスの主要なマイルストーンタスクのリスト。
リスク	プロジェクト関連のリスクに関する情報を提供します。この情報は、プロジェクトの一部であるリスクからロールアップされます。 ○ 処理待ち：[処理待ち] ステータスのリスクのリスト。 ○ 完了：[達成] および [未達成] ステータスのリスクのリスト。 リスクレコードの次の情報が表示されます。 ○ 簡単な説明 ○ 確率 (Probability) ○ リスクステータス ○ 状況 ○ 担当者 ○ 期日 詳細については、「プロジェクトのリスクの追加」を参照してください。
問題	プロジェクトに含まれている問題に関する情報を提供します。この情報は、プロジェクトについてレポートされた問題からロールアップされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セクション	説明
	○ 処理待ち：[オープン] および [対応中] ステータスの問題のリスト。 ○ 完了：[クローズ済み] ステータスの問題のリスト。 問題レコードの次の情報が表示されます。 ○ 簡単な説明 ○ 優先度 ○ 状況 ○ 担当者 ○ 期日 詳細については、「プロジェクトの問題の追加」を参照してください。
意思決定 (Decisions)	プロジェクトに含まれている意思決定に関する情報を提供します。この情報は、プロジェクトについてレポートされた意思決定からロールアップされます。 ○ 処理待ち：[オープン] および [対応中] ステータスの問題のリスト。 ○ 完了：[クローズ済み] ステータスの問題のリスト。 意思決定レコードの次の情報が表示されます。 ○ 簡単な説明 ○ 優先度 ○ 意思決定ステータス ○ 状況 ○ 担当者 ○ 期日 詳細については、「プロジェクトの意思決定の追加」を参照してください。
アクション	プロジェクトのアクションアイテムに関する情報を提供します。この情報は、プロジェクトについてレポートされたアクションからロールアップされます。 ○ 処理待ち：[オープン] および [対応中] ステータスのアクションのリスト。 ○ 完了：[クローズ済み] ステータスのアクションのリスト。 アクションレコードの次の情報が表示されます。 ○ 簡単な説明 ○ 優先度 ○ 状況 ○ 承認 ○ 担当者 ○ 期日 詳細については、「プロジェクトのアクションの追加」を参照してください。
変更を要求	プロジェクトの変更要求に関する情報を提供します。この情報は、プロジェクトに対して作成された変更要求からロールアップされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セクション	説明
	○ 処理待ち：[処理待ち]、[オープン]、および [対応中] ステータスのプロジェクトの変更要求のリスト。 ○ 完了：[クローズ済み] ステータスのプロジェクトの変更要求のリスト。 変更要求レコードの次の情報が表示されます。 ○ タイトル ○ 優先度 ○ 状況 ○ カテゴリ ○ 承認 ○ 担当者 ○ 期日 詳細については、「変更要求の作成」を参照してください。

関連情報

プロジェクトステータスレポートを作成する

プロジェクトへの予算の割り当て

会計年度に応じて、プロジェクトの予算を設定します。

始める前に

必要なロール：it_portfolio_manager

手順

1. プロジェクトフォームを開きます。
2. 関連リンクで、[プロジェクト予算] を選択します。
   [プロジェクト予算] ダイアログボックスが開きます。
3. プロジェクトの予算を設定する会計年度を選択します。
4. [投資予算] および [経費予算] の金額を入力します。
   [予算合計] は、投資と経費の合計金額で更新されます。
5. **[OK]** を選択します。
   - プロジェクトにコスト計画が関連付けられていない場合、プロジェクト予算は、プロジェクトの開始予定日と終了予定日に従って配分されます。
   - プロジェクトにコスト計画が関連付けられている場合、プロジェクト予算は、コスト計画の会計期間に従って配分されます。

タスクの結果

選択した年のプロジェクト予算が、[プロジェクト予算] 関連リストに表示されます。リストで金額をクリックすると修正できます。

ネクストエクスペリエンスへのアクティブなプロジェクトの予算の移行

プロジェクト予算をネクストエクスペリエンスに移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 次のオプションのいずれかを使用してベースラインを移行します。

> **注:**
> 移行後は、クラシック UI で予算を表示することはできません。ネクストエクスペリエンスの財務を使用して予算を管理することをお勧めします。

関連情報

プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行する

プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行する

プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。

このタスクについて

ネクストエクスペリエンスでは、財務ベースラインをキャプチャするために使用される投資ベースライン (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) と投資ベースラインヘッダー (sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header) の 2 つの新しいテーブルを持つ新しいデータモデルを使用します。クラシックエクスペリエンスでデマンドに対して作成された財務ベースラインは、ネクストエクスペリエンスには表示されません。既存のベースラインは、クラシックからネクストエクスペリエンスに、必要なプロジェクトのオンデマンドアクティビティとして移行することも、またはスケジュール済みジョブをアクティブ化して実行することで一括で移行することもできます。

ネクストエクスペリエンスのベースラインビューは、プロジェクトの財務パフォーマンスを表示および分析するためのより優れたインサイトを提供します。


ネクストエクスペリエンスを使用して作成された財務ベースラインとは異なり、クラシック UI で作成された財務ベースラインは、デフォルトの動作として計画コストとともに実際の経費をキャプチャしません。ベースライン比較に関連する情報を取得するために、実績コストは、財務ベースラインのベースライン作成日時点の処理された経費ラインを使用して、ベースライン移行の一部としてキャプチャされます。

ネクストエクスペリエンスでの財務の使用に関する詳細とユースケースについては、「での計画立案アイテムの財務管理 ポートフォリオ計画」を参照してください。

> **注:**
> 財務ベースラインの移行は、複数通貨を使用するデマンドまたはプロジェクトには適用されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

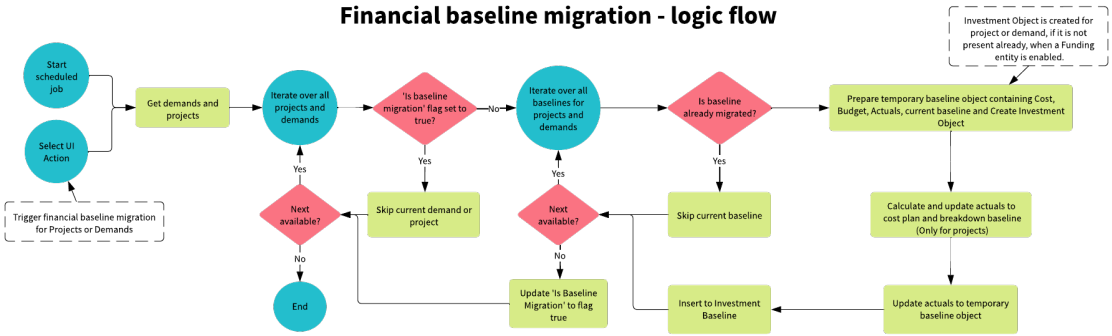

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 次のオプションのいずれかを使用してベースラインを移行します。

> ヒント:
> 移行後は、ネクストエクスペリエンスの財務を使用して財務ベースラインを作成することをお勧めします。

タスクの結果
選択したプロジェクトの財務ベースラインはネクストエクスペリエンスに移行され、ベースラインビューで表示できるようになります。

次のタスク

移行されたベースラインを表示して、既存のベースラインまたは現在のベースライン (⚑) と比較します。

関連情報

ネクストエクスペリエンスへのアクティブなプロジェクトの予算の移行

プロジェクトの外部依存関係の追加

プロジェクトマネージャーは、外部依存関係を使用して、あるプロジェクトのタスクから別のプロジェクトのタスクへの依存関係を設定できます。

外部依存関係は、先行プロジェクトが変更されたときに、プロジェクトスケジュールの変更による影響を確認するのに役立ちます。

外部依存関係の仕組み

外部依存関係を定義するには、後続プロジェクトのタスクにリンクする先行プロジェクトからプロジェクトタスクを選択します。外部依存関係が追加されると、システムは後続プロジェクトと先行プロジェクトの両方にシャドウタスクを追加します。

シャドウタスクは、それぞれのプロジェクトの読み取り専用タスクです。true に設定されたデータベース属性 **shadow** と、元のタスクの **sys_id** を指す **orig_sys_id** があります。シャドウタスクは、関係が処理されるたびに元のタスクとの同期が行われます。

シャドウタスクに加えて、2 つのシャドウ関係も planned_task_rel_planned_task テーブルに追加されます。これらの関係は、元の関係のシャドウです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

たとえば、2 つのプロジェクトがあり、プロジェクト P1 が先行プロジェクトで、P2 が後続プロジェクトだとします。プロジェクト P1 にはタスク T1 があり、プロジェクト P2 にはタスク T2 があります。

T1 から T2 に外部依存関係が作成された場合、次のタスクが 2 つのプロジェクトに追加されます。

プロジェクト	タスク
P1	T2 のシャドウ
P2	T1 のシャドウ

外部依存関係を追加した後、planned_task_rel_planned_task テーブル内に次のシャドウ関係レコードが作成されます。

親	子	プロジェクト	外部
T1	T2		true
T1 のシャドウ	T2	P2	False
T1	T2 のシャドウ	P1	False

各項目の意味は次のとおりです。

- 親は先行プロジェクトです。
- 子は後続プロジェクトです。
- プロジェクトは、関係性のあるプロジェクトです。
- 外部は外部依存関係です。

プロジェクトの **RIDAC** (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの追加

プロジェクトのリスクレコードを作成し、プロジェクトのライフサイクル中に他のレコードに変換できるようにします。問題を追跡し、関連する詳細を関連レコードにコピーしないようにします。

プロジェクトがプロジェクトライフサイクルの各段階を進むにつれて、リスクによって問題が発生したり、新しい問題が発生したりする可能性があります。リスクレコードを取得した後は、そのレコードを問題、アクション、意思決定などの関連レコードに変換できます。レコードの変換と関連付けは、将来のプロジェクトを計画するためのパターン、傾向、および考えられる解決策の分析と特定に役立ちます。

プロジェクトワークスペースの単一の RIDAC ページですべての RIDAC レコードを計画および管理します。このページでは、一元的な場所で RIDAC レコードを作成、編集、変換、および関連付けることができます。プロジェクトワークスペースインターフェイスから RIDAC ページまたはクラシック版プロジェクトワークスペースに移動します。


プロジェクトワークスペースで RIDAC レコードの変換または関連付けを行う前に、次の点を考慮してください。

- あるレコードを別のレコードに変換できるのは、RIDAC シーケンスにおいてのみです。たとえば、リスクを問題、意思決定、アクション、または変更要求に変換することはできますが、問題をリスクに、または意思決定を問題に

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変換することはできません。次の図は、RIDAC プロセスフローを示していま

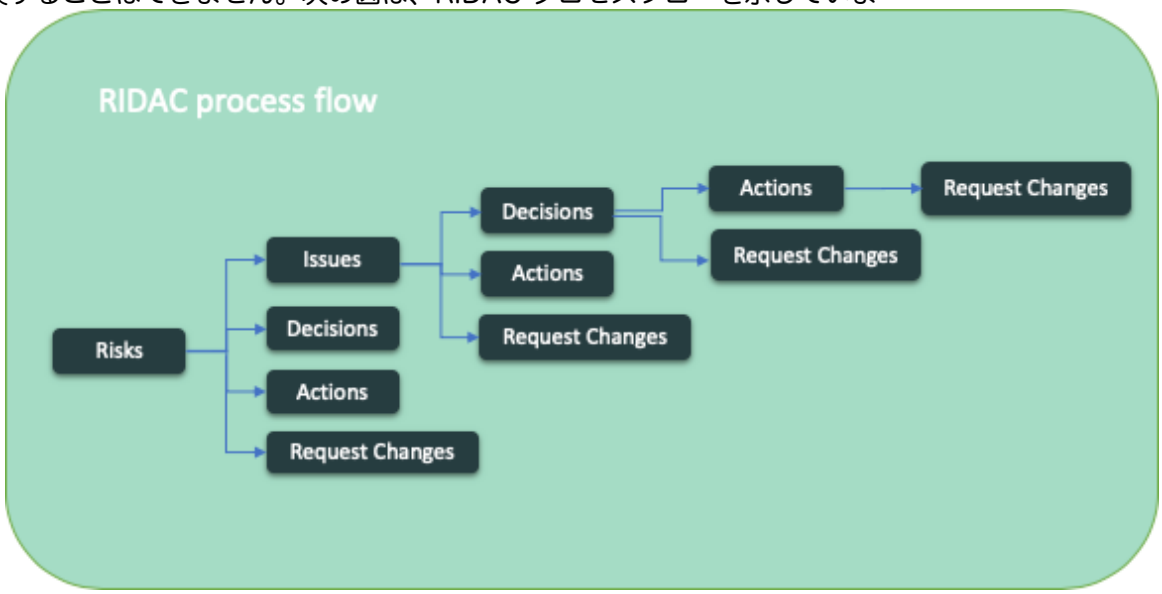

す。

- 1 つのレコードを複数の RIDAC レコードに変換できます。たとえば、1 つのリスクレコードから複数の問題レコードを作成できます。

  クラシック版プロジェクトワークスペースでの RIDAC レコードの変換については、「プロジェクトの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換」を参照してください。プロジェクトワークスペースでの RIDAC レコードの変換については、「プロジェクトワークスペース でプロジェクトの特定の RIDAC レコードを別のレコードに変換する」を参照してください。

- 1 つのレコードを複数の異なるレコードに関連付けることができます。たとえば、1 つの問題レコードを複数の異なるリスク、意思決定、アクション、または変更要求レコードにリンクさせることができます。

  クラシック版プロジェクトワークスペースでの RIDAC レコードの関連付けについては、「プロジェクトの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け」を参照してください。プロジェクトワークスペースでの RIDAC レコードの関連付けについては、「プロジェクトワークスペース でプロジェクトの既存の RIDAC レコードを関連付け」を参照してください。

関連情報

プロジェクトの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換

プロジェクトの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け

プロジェクトのリスクの追加

プロジェクトにリスクを追加して、プロジェクトライフサイクルの任意のフェーズでリスクを特定、分析、優先順位付け、計画、および追跡します。潜在的な問題とその影響の重大度を評価し、プロジェクトについて情報に基づいた意思決定を行います。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

リスクとは、プロジェクトの成功または結果に影響を与える可能性がある不確実なイベントのことです。たとえば、財務支出やリソースのアサインなどのファクターの見積もりが正しくないと、スケジュールにずれが生じる可能性があります。リスクのもう 1 つの例として、プロジェクト要件の変

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

更があります。リスクを記録することで、意思決定者はプロジェクトの進捗状況を評価する際にすべての関連情報を確実に把握できます。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトにリスクを追加して評価することができます。プロジェクトマネージャーは、リスクを追加する際に、固有のプロジェクトに適用可能なプロジェクトリスクの既存のライブラリーからリスクを追加できます。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. リスクを追加するプロジェクトを選択します。
3. [リスク] 関連リストで、[新規] を選択します。
4. または、高度なリスクプラグインをアクティブ化している場合は、[ライブラリーから作成] を選択します。
   a. 必要に応じてリスクステートメントを選択します。
   b. [リスクを作成] を選択します。
   プロジェクトカテゴリに属するリスクステートメントのみがユーザーに表示されます。
5. [リスク] フォームのフィールドに入力します。

   詳細については、「リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求 (RIDAC) フォーム」を参照してください。

   > **注:**
   > [リスクアセスメントのサマリー] セクションは、[*Enable Advanced Risk PPM Integration*] プロパティが有効になっている場合にのみ表示されます。

6. **[Submit** (送信)] を選択します。

次のタスク

- 追加されたリスクを評価します。詳細については、「アセスメントのためにプロジェクトリスクをステークホルダーにアサインする」を参照してください
- 既存のリスクを問題、意思決定、アクション、または変更要求に変換し、リスクをクローズします。詳細については、「プロジェクトの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換」を参照してください。
- 依存関係を追跡し、将来の傾向を認識できるように、リスクを既存の問題に関連付けます。詳細については、「プロジェクトの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け」を参照してください。

関連情報

プロジェクトの RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの追加

プロジェクトのカスタムのリスクランクとリスク値の設定

プロジェクトの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換

プロジェクトの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け

プロジェクトのカスタムのリスクランクとリスク値の設定

カスタムのリスクランクとリスク値のスコア ([高 - 中]、[中 - 低]、または [絶対 - 低] など) を設定して、リスクの影響度と確率のファクターを評価します。

始める前に

必要なロール：pps_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
リスク値のルックアップモジュールを使用して、リスクの影響度と確率の特定の組み合わせに対するリスクランクとリスク値を設定します。システムではこれらの値を使用して、リスクの影響度と確率のファクターに基づいて、リスクの程度 ([絶対]、[高]、[中]、[低]) を判定します。

[確率] フィールドの値に [影響度] フィールドの値を乗算して、リスクフォームの [リスクのランク] および対応する [リスク値] の値を生成します。

デフォルトでは、リスクの次の影響度、値、および可能性スコアを使用して、リスクランクおよびリスク値のスコアを作成できます。

- 絶対
- 低
- 中または中 (Medium or Moderate)
- 高

たとえば、確率は高で、影響度は中だが、プロジェクト全体のリスクは低と見なしたい場合があります。その場合は、次の値を使用して リスク値マッチャーフォームを設定します。

- 影響度 = 2 - 中
- リスクランキングの色 = 緑色
- 確率 = 高
- 確率数 = 1
- リスク値 = 3 - 低

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > リスク値のルックアップ.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。
   詳細については、「リスク値マッチャーフォーム」を参照してください。
4. [送信] を選択します。

関連情報

プロジェクトの RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの追加

プロジェクトの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換

プロジェクトの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け

プロジェクトの問題の追加

プロジェクトに問題を追加して、リスクを昇格したり、プロジェクトライフサイクルの任意のフェーズで発生する技術的な誤動作やリソースの不足などの予期しない問題を追跡したりします。問題が未解決のままである場合、不要な競合、遅延、さらには障害が発生する可能性があります。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 問題を追加するプロジェクトを選択します。
3. [問題] 関連リストで、[新規] を選択します。
4. 問題フォームのフィールドに入力します。

   詳細については、「リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求 (RIDAC) フォーム」を参照してください。
5. オプション: ナレッジベースで問題に関連する記事を検索します。

   a. [ナレッジの検索] アイコン ( ) を選択します。

   b. 関連する記事を見つけたら、記事のタイトルを選択してそのコンテンツを表示します。

   c. 記事の内容を問題に含める場合は、[問題に添付 **(Attach to Issue)]** を選択します。
   記事の内容が、問題フォームの [説明] フィールドにコピーされます。必要に応じて、テキストを変更できます。
6. **[Submit** (送信)] を選択します。

次のタスク

- 既存の問題を意思決定、アクション、または変更要求に変換し、問題をクローズします。詳細については、「プロジェクトの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換」を参照してください。
- 依存関係を追跡し、将来の傾向を認識できるように、問題を既存のリスクに関連付けます。詳細については、「プロジェクトの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け」を参照してください。

関連情報

プロジェクトの RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの追加

プロジェクトの意思決定の追加

プロジェクトマネージャーは、ソリューションを使用してリスクと問題を積極的に管理するための計画を策定します。リスクまたは問題のためのソリューションを意思決定の形でプロジェクトに追加します。リスクまたは問題を意思決定に、または意思決定をアクションや要求の変更に変換することもできます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 意思決定を追加するプロジェクトを選択します。
3. [意思決定] 関連リストで [新規] をクリックします。
4. 意思決定フォームで、フィールドに入力します。

   詳細については、「リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求 (RIDAC) フォーム」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. オプション: ナレッジベースで意思決定に関連する記事を検索します。

   a. [ナレッジの検索] アイコン ( ) を選択します。

   b. 関連する記事を見つけたら、記事のタイトルを選択してそのコンテンツを表示します。

   c. 記事の内容を問題に含める場合は、[意思決定に添付 **(Attach to Decision)**] を選択します。
   記事の内容が、意思決定フォームの [説明] フィールドにコピーされます。必要に応じて、テキストを変更できます。

6. [送信] を選択します。

次のタスク

- 意思決定をアクションまたは変更要求に変換し、意思決定をクローズします。詳細については、「プロジェクトの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換」を参照してください。
- 依存関係を追跡し、将来の傾向を認識できるように、意思決定を既存の問題に関連付けます。詳細については、「プロジェクトの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け」を参照してください。

関連情報

プロジェクトの RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの追加

プロジェクトのアクションの追加

プロジェクトの問題またはリスクを解決するために必要なアクションを追加します。分析に基づいてリスク、問題、または意思決定をアクションに変換し、リスクまたは問題の解決を計画することもできます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
リスクと問題を分析し、それらのリスクと問題を管理する方法を決定したら、リスクまたは問題を解決するためのアクションをプロジェクトに追加します。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. アクションを追加するプロジェクトを選択します。
3. [アクション] 関連リストで [新規] を選択します。
4. アクションフォームで、フィールドに入力します。

   詳細については、「リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求 (RIDAC) フォーム」を参照してください。

5. オプション: アクションに他のステークホルダーからの承認が必要な場合は、[承認] および [期日] フィールドを使用して期日の承認を要求します。
6. [送信] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- アクションを変更要求に変換し、アクションをクローズします。詳細については、「プロジェクトの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換」を参照してください。
- 依存関係を追跡し、将来の傾向を認識できるように、アクションを既存のリスク、問題、および意思決定レコードに関連付けます。詳細については、「プロジェクトの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け」を参照してください。

関連情報

プロジェクトの RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの追加

変更要求の作成

プロジェクトマネージャーは、問題の解決やリスクの軽減のために実行したアクションの結果として、変更要求を作成できます。要求変更により、プロジェクトのスコープ、リソース要件、コスト、またはスケジュールが変更され、リスクまたは問題の影響が最小限に抑えられる場合があります。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 変更要求を追加するプロジェクトを選択します。
3. [変更を要求] 関連リストで、[新規] を選択します。
4. フォームで、フィールドに入力します。

   詳細については、「リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求 (RIDAC) フォーム」を参照してください。

5. **[Submit** (送信)] を選択します。

次のタスク

- 依存関係を追跡し、将来の傾向を認識できるように、変更要求を既存のリスク、問題、意思決定、およびアクションレコードに関連付けます。詳細については、「プロジェクトの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け」を参照してください。
- 変更要求を処理するタスクを作成します。詳細については、「インシデント、問題、または変更要求からのタスクの作成」を参照してください。

関連情報

プロジェクトの RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの追加

プロジェクトの特定の **RIDAC** (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換

特定の RIDAC レコード (リスク、問題、アクション、意思決定、および変更要求) をこの順序で別のレコードに変換し、新しいレコードを手動で作成することなくレコード情報を保持して、より簡単に問題を追跡できます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
RIDAC レコードを別のレコードに変換すると、[簡単な説明]、[要求者]、および [アサイン先] フィールドの値が引き継がれます。

親レコードを手動でクローズする代わりに、新規レコードの作成時に親レコードを終結するように指定することもできます。

プロジェクトフォームの **[RIDAC** を表示] 関連リンク、およびプロジェクトモジュールのアプリケーションナビゲーターの **[RIDAC** を表示] を使用して、変換されたすべての RIDAC レコードの統合リストを表示することもできます。

手順

1. 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. リスク、問題、意思決定、アクション、または変更要求レコードを別の RIDAC レコードに変換するプロジェクトを選択します。
3. [プロジェクトフォーム] 関連リストから、リスク、問題、意思決定、アクション、または変更要求のレコードを選択して、フォームビューを開きます。
4. フォームの **[RIDAC** に変換] 関連リンクを選択します。
5. オプション: [変換] ダイアログボックスの [タスクタイプを選択] リストから、選択したレコードを変換する RIDAC レコードを選択します。
   たとえば、リスクを問題に変換する場合は、[問題] を選択します。
6. オプション: 親レコードからコピーされた [簡単な説明] フィールドのテキストを変更します。
7. オプション: [アサイン先] フィールドの親レコードからコピーされたデフォルトのアサインを変更するには、ルックアップアイコン (🔍) を選択し、別のユーザーを選択します。
8. オプション: 新規レコードの作成時に親 RIDAC レコードをクローズする場合は、親レコードをクローズするオプションを選択します。
   親レコードをクローズするオプションのラベルは、親レコードタイプに応じて変わります。たとえば、親レコードがリスクで、それを問題レコードに変換する場合、レコードをクローズするオプションは [リスクをクローズ **(Close Risk)]** と表示されます。
9. **[OK]** を選択します。

関連情報

プロジェクトの RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの追加

プロジェクトの既存の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け

プロジェクトの既存の **RIDAC** (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの関連付け

プロジェクトの既存の RIDAC レコード (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) を相互にリンクさせることができます。RIDAC レコードを相互に関連付けると、プロジェクトの終了時および計画時の分析のために、リスクまたは問題とその結果のレコードを保持できます。また、プロジェクトのライフサイクル全体にわたってリスクと問題を追跡するのにも役立ちます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
1 つのレコードを複数の異なるレコードに関連付けることができます。たとえば、1 つの問題レコードを複数のリスク、意思決定、アクション、または変更要求レコードにリンクさせることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 特定の RIDAC エントリーを別のエントリーに関連付けるプロジェクトを選択します。
3. [プロジェクトフォーム] 関連リストで、RIDAC レコードを選択します。
4. フォームで、**[RIDAC** の関連付け] 関連リンクを選択します。
5. [関連付け] ダイアログボックスの [タイプの選択] リストから、選択したレコードを関連付ける RIDAC レコードを選択します。
   たとえば、リスクを問題に関連付ける場合は、[問題] を選択します。
6. 選択したレコードの関連付け先のレコード番号を、[関連付け先] リストから選択します。
   たとえば、選択したリスクを問題 (ISU0010003) に関連付ける場合は、**[ISU0010003]** を選択します。
7. **[OK]** を選択します。

関連情報

プロジェクトの RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの追加

プロジェクトの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの、別のレコードへの変換

プロジェクトへのテンプレートの適用

プロジェクトテンプレートは、プロジェクトの基本構造を定義します。

プロジェクトテンプレートには、プロジェクトタスクとサブタスク、添付ファイル、チェックリスト、その他のプロジェクト情報を含めることができます。プロジェクトは繰り返されることが多いため、テンプレートを使用すると、プロジェクト構造を作成、保存、および再利用できます。また、既存のテンプレートを変更したり、テンプレートからプロジェクトを作成したり、空のプロジェクトにテンプレートを適用したりすることもできます。サブタスクが含まれていないプロジェクトは空であると見なされます。

プロジェクトマネージャーロールでは、次の操作が可能です。

- プロジェクトテンプレートの作成
- テンプレートを使用したプロジェクトの作成

PPS アドミンロールでは、プロジェクトテンプレート構成を変更できます。

プロジェクトテンプレートの作成

既存のテンプレートまたはプロジェクトからテンプレートを作成します。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

プロジェクトからテンプレートを作成すると、プロジェクトのすべての添付ファイルとチェックリストがテンプレートにコピーされます。プロジェクトテンプレートフォームを使用して、テンプレートの添付ファイルを追加または削除できます。スケジュール外のプロジェクトから作成されたプロジェクトテンプレートでは、スケジュール外のタスクを優先します。

手順

1. テンプレートを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

2. 次のフィールドに入力します。
   - テンプレート名：新しいテンプレートに一意の名前を入力します。
   - 説明：新しいテンプレートの簡単な説明を入力します。
3. **[OK]** を選択します。
   新しく作成されたテンプレートのプロジェクトテンプレートフォームが開きます。
4. プロジェクトテンプレートフォームのフィールドで必要な変更を行います。
   プロジェクトテンプレートフォームの上部セクションには、テンプレート名や説明などの基本的なテンプレート情報が含まれます。プロジェクトテンプレートフォームの中央セクションでは、テンプレートに含まれる特定のデータを定義します。このセクションの情報は、ユーザーが選択したプロジェクト [pm_project] テーブルのフィールドと、ユーザーが定義したフィールドの値から作成されます。
5. **[Update** (更新)] を選択します。

関連情報

プロジェクトへのテンプレートの適用

プロジェクトテンプレートへの添付ファイルの追加

プロジェクトまたはタスクにファイルを添付するのと同じ方法で、プロジェクトテンプレートにファイルを添付します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > テンプレート.
2. 目的のテンプレートを開きます。
3. [添付ファイル] タブを選択して関連リストを開きます。
4. **[New** (新規)] を選択します。
5. [添付ファイル] ダイアログ ボックスで [参照] を選択し、ファイルを選択します。
6. 必要に応じて、[別の添付ファイルを追加] を選択して別のファイルを選択します。
7. [添付] を選択します。
   選択したファイルが [添付ファイル] 関連リストに表示されます。

プロジェクトフォームでのテンプレートの適用

プロジェクトフォームを使用してプロジェクトを作成する際、プロジェクトテンプレートを適用して、プロジェクトタスクとサブタスク、添付ファイル、チェックリスト、およびその他のプロジェクト情報を含めることができます。プロジェクトテンプレートは、新しいプロジェクトにも既存のプロジェクトにも適用できます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
スケジュール外のプロジェクトテンプレートから作成されたプロジェクトは、スケジュール外のタスクを優先し、指定された開始日に合わせて日付を調整します。
テンプレートをプロジェクトに適用すると、プロジェクトのステータスはデフォルトステータスに設定されます。デフォルトのプロジェクトステータス (pm_project.state = -5) を有効にし、すぐに使えるデフォルト値として使用します。[処理待ち] が適切でない場合は、要件に合わせて [ステータス] フィールドのラベルを更新できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

- 空白のプロジェクトフォームでテンプレートを適用するには：

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > 新規作成.
2. [テンプレートからプロジェクトを作成するには] の横にあるリンクを選択します。
   [テンプレートを適用] ウィンドウが表示されます。
3. プロジェクト名を入力し、開始日を選択して、プロジェクトテンプレートを選択します。

- プロジェクトタスクまたはサブプロジェクトのない既存のプロジェクトにテンプレートを適用するには：

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて をクリックし、プロジェクトを選択します。
2. [テンプレートを適用するにはここをクリック] リンクを選択します。
   [テンプレートを適用] ウィンドウが表示されます。
3. 開始日を選択して、プロジェクトテンプレートを選択します。

既存のプロジェクトへのテンプレートの適用

プロジェクトフォームまたは計画立案コンソールから、1 つまたは複数のプロジェクトテンプレートを既存のプロジェクトに適用します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
スケジュール外のプロジェクトテンプレートから作成されたプロジェクトは、スケジュール外のタスクを優先し、指定された開始日に合わせて日付を調整します。
テンプレートをプロジェクトに適用すると、プロジェクトのステータスはデフォルトステータスに設定されます。デフォルトのプロジェクトステータス (pm_project.state = -5) を有効にし、すぐに使えるデフォルト値として使用します。[処理待ち] が適切でない場合は、要件に合わせて [ステータス] フィールドのラベルを更新できます。

重要:
プロジェクトタスクを持つプロジェクトにテンプレートを適用すると、ヘッダー情報は適用されず、プロジェクトの最後のプロジェクトタスクの後にのみプロジェクトタスクが追加されます。

手順

1. 次のいずれかの場所から既存のプロジェクトにプロジェクトテンプレートを適用します。
2. [テンプレートを適用] ダイアログボックスの [プロジェクトテンプレート] リストから、プロジェクトテンプレートを選択します。
3. **[Save** (保存)] を選択します。
4. オプション: 複数のプロジェクトテンプレートを適用するには、ステップ 1 ～ 3 を繰り返します。
   テンプレートのタスクは、最後のタスクの後に追加されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトワークスペースでの空のプロジェクトへのテンプレートの適用

プロジェクトワークスペースで新しいプロジェクトを作成するときに、テンプレートを適用できます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
スケジュール外のプロジェクトテンプレートから作成されたプロジェクトは、スケジュール外のタスクを優先し、指定された開始日に合わせて日付を調整します。
テンプレートをプロジェクトに適用すると、プロジェクトのステータスはデフォルトステータスに設定されます。デフォルトのプロジェクトステータス (pm_project.state = -5) を有効にし、すぐに使えるデフォルト値として使用します。[処理待ち] が適切でない場合は、要件に合わせて [ステータス] フィールドのラベルを更新できます。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース.
2. プロジェクトワークスペースのヘッダーで、 新規 を選択します。
3. [プロジェクト作成] ダイアログボックスで、プロジェクト名を入力し、開始日を選択して、テンプレートを選択します。
4. **[OK]** を選択します。

関連情報

プロジェクトの開始

プロジェクトテンプレート構成

[プロジェクトテンプレート構成] リストは、テンプレートに含まれるアイテムを定義します。

移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > **Template Config** (テンプレート構成) をクリックして、[プロジェクトテンプレート構成] リストを表示します。このリストの各アイテムには次のものがあります。

- 定義された親テーブル。例外は pm_project で、これはテンプレートのルートまたはトップレベルのオブジェクトです。
- リンク要素。親テーブルと子テーブルをリンクするフィールド。
- テンプレートに含めるフィールドのリスト。この列で定義されているフィールドは、プロジェクトテンプレートにコピーされるフィールドです。

[プロジェクトテンプレート構成] リストには、プロジェクト、プロジェクトタスク、およびプロジェクトサブタスクの 3 つのデフォルトテンプレート構成アイテムが含まれています。このリストからこれらのデフォルトアイテムを変更することも、追加アイテムを作成することもできます。

デフォルトのプロジェクトテンプレート構成アイテム

アイテム	定義	親	リンク要素
pm_project	プロジェクトオブジェクト	なし。このオブジェクトはルートレベルであるため、親はありません。	なし。このオブジェクトはルートレベルにあるため、リンク要素はありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトのプロジェクトテンプレート構成アイテム (続く)

アイテム	定義	親	リンク要素
pm_project_task	プロジェクトタスクオブジェクト	pm_project	親。このタスクオブジェクトはルートレベルの 1 レベル下にあるため、親テーブルをリンク要素として使用します。
pm_project_task	プロジェクトサブタスクオブジェクト	pm_project_task	親。このサブタスクオブジェクトはルートレベルの 2 レベル下にあるため、親テーブルをリンク要素として使用します。

[プロジェクトテンプレート構成] リストでアイテムを選択して、プロジェクトテンプレート構成フォームを開きます。詳細については、「 プロジェクトテンプレート構成フォーム」を参照してください。

プロジェクトテンプレート構成フォーム



プロジェクトテンプレート構成アイテムの追加

テンプレートに含めるプロジェクトテンプレート構成アイテムを追加します。

始める前に

必要なロール：it_pps_admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > **Template Config** (テンプレート構成).
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. プロジェクトテンプレート構成フォームのフィールドに入力します。
   詳細については、「 プロジェクトテンプレート構成フォーム」を参照してください。
4. **[Submit** (送信)] を選択します。
   たとえば、プロジェクトテンプレート構成に要件オブジェクトを追加するには、次のようにフィールドに入力します。
   - テーブル：要件 [dmn_requirement]
   - 親テーブル：プロジェクト [pm_project]
   - リンク要素：親
   - アクティブ：このチェックボックスをオンにする
   - 要素：short_description、description、priority、type、state

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

プロジェクトへのテンプレートの適用

プロジェクトテンプレート構成

プロジェクトテンプレート構成アイテムの変更

テンプレートに含まれたプロジェクトテンプレート構成アイテムを変更します。

始める前に
必要なロール：it_pps_admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > **Template Config** (テンプレート構成).
2. リストから構成アイテムを選択します。
3. プロジェクトテンプレート構成フォームのフィールドに必要な変更を行います。
4. **[Update** (更新)] を選択します。
   プロジェクトテンプレートを削除するには、リストから構成アイテムを選択し、[削除] を選択します。デフォルトのテンプレート構成アイテム (プロジェクト、プロジェクトタスク、またはプロジェクトサブタスク) は削除しないでください。これを行うと、プロジェクトテンプレートを作成する機能に影響します。

関連情報

プロジェクトへのテンプレートの適用

プロジェクトテンプレート構成

プロジェクトテンプレート構成アイテムの追加

プロジェクトのインポートとエクスポート

プロジェクトは、Microsoft Project と ServiceNow プロジェクト管理 (PM)アプリケーションの両方を使用して管理できます。

プロジェクトのインポート

it_project_manager ロールを持つユーザーは、プロジェクトおよびプロジェクトタスクを Microsoft Project から ServiceNow プロジェクト管理 (PM)にインポートできます。

Microsoft Project から ServiceNow インスタンスにプロジェクトデータをインポートして、プロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを更新します。詳細については、「Microsoft Project からのプロジェクトのインポート」を参照してください。

プロジェクトを ServiceNow インスタンスにインポートする際に、プロジェクトの日付を計算するための計算方法を指定することもできます。[手動] または [自動] 計算を使用して、さまざまな制約タイプのプロジェクトタスクをインポートできます。サポートされている制約とその変換の詳細については、「Microsoft Project からのプロジェクトのインポート」を参照してください。

ServiceNow インスタンスにカスタムフィールドを作成し、プロジェクトのインポート中にこれらのフィールドを Microsoft Project にマップすることができます。詳細については、「Microsoft Project ファイルのインポート用のカスタムフィールドマッピングの作成」を参照してください。

データファイルと変換マップを使用して、複数のプロジェクトのプロジェクトタスクを一度にインポートできます。詳細については、「複数のプロジェクトのプロジェクトタスクのインポート」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

一部のカレンダー要素は、Microsoft Project からプロジェクト管理 (PM)にインポートされません。カレンダー要素とスケジュールの詳細については、「カレンダーとスケジュール - 制限事項」を参照してください。

プロジェクトのエクスポート

it_project_manager ロールを持つユーザーは、プロジェクトデータをエクスポートできます。プロジェクトタスクやタスク制約などのプロジェクトデータは、エクスポートファイルとしてエクスポートできます。このエクスポートファイルを使用して、プロジェクトを他の ServiceNow インスタンスにインポートします。

Microsoft Project を使用してプロジェクトを管理している場合は、エクスポート機能を使用して ServiceNow プロジェクトをエクスポートできます。

プロジェクトデータを MPP、XML、または CSV ファイル形式でエクスポートすることを選択できます。詳細については、「Microsoft Project へのプロジェクトのエクスポート」を参照してください。

ServiceNow インスタンスのプロジェクトに、サポートされている制約タイプのいずれかを持つ日付が含まれている場合、プロジェクトおよびプロジェクトタスクをエクスポートするときに、これらの制約もエクスポートされます。詳細については、「Microsoft Project へのプロジェクトのエクスポート」を参照してください。

サポートされているバージョン

次のバージョンの Microsoft Project で作成されたプロジェクトは、ServiceNow プロジェクト管理 (PM)アプリケーションにインポートできます。

- Microsoft Project 2003
- Microsoft Project 2007
- Microsoft Project 2010
- Microsoft Project 2013
- Microsoft Project 2016

プロジェクトのフィールドマッピング

インポート中に、Microsoft Project の値がプロジェクトレコードのフィールドを上書きします。

プロジェクトのフィールドマッピング

Microsoft Project のフィールド	プロジェクト管理 (PM) フィールド
タスク名 (Task Name)	簡単な説明。このフィールドは、初回インポート時にのみ上書きされます。
注意	説明
開始	開始予定日
フィンランド語	終了予定日
期間	計画された期間
実績開始日	開始実績日時
実績終了日	終了実績日時
実際の期間	実際の期間

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトのフィールドマッピング (続く)

Microsoft Project のフィールド	プロジェクト管理 (PM) フィールド
達成率	完了率 (%) (このフィールドを追加するには、フォームをカスタマイズします)
先行タスクの遅れ (Predecessor Lag)	先行タスクと後続タスクの間の遅延時間 (Lag time between predecessor and successor)
WBS	WBS
重大	クリティカルパス
ロールアップ	ロールアップ
テキスト 10 (同期の目的で使用されるフィールド)	タスク Sys_Id
プロジェクト ヘッダー タイトル (Project Header Title)	プロジェクト名
プロジェクト ヘッダー件名 (Project Header Subject) (同期の目的で使用されるフィールド)	トップタスク Sys_Id
リソース	担当者 [assigned_to] **注:** インポート時に、Microsoft Project のタスクに複数のリソースがアサインされている場合： • 最初のリソースが [アサイン先] フィールドに追加されます。 • 残りのリソースは [他のアサイニーリスト] フィールドに追加されます。
リソースグループ	アサイン先グループ

関連情報

プロジェクトのインポートとエクスポート

Microsoft Project ファイルのインポート用のカスタムフィールドマッピングの作成

プロジェクトをインポートする前に、カスタムフィールドを Microsoft Project から ServiceNow のフィールドにマップします。

始める前に

Microsoft Project とマッピングする前に、ServiceNow インスタンスでカスタムフィールドを作成します。詳細については、「テーブルのフィールドを追加およびカスタマイズする」を参照してください。

必要なロール：it_pps_admin

このタスクについて

ServiceNow インスタンスで作成したカスタムフィールドを、インポートする予定の Microsoft Project ファイルのカスタムフィールドにマップします。

Microsoft Project と ServiceNow インスタンス間のフィールドマッピングでサポートされているデータタイプは次のとおりです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- True/False
- カレンダー
- 日付/時刻
- 選択肢
- 色
- 通貨
- 10 進数
- 期日
- 浮動小数点数
- 日付
- 日付/時刻
- 期間
- リスト
- 時刻
- HTML
- 整数
- 長
- 完了率 (%)
- 電話番号 (E164)
- 参照
- 名前/値ペア
- 文字列
- 翻訳された HTML
- 翻訳されたテキスト
- URL
- Wiki

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト - **MSP**インポートのフィールドマッピング.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [テーブル] リストから、カスタムフィールドを作成したテーブルを選択します。
4. **[Microsoft Project** 列] フィールドに、マップする Microsoft Project ファイルのカスタムフィールドの名前を入力します。
5. [宛先列] リストで、プロジェクトのインポート時に Microsoft Project フィールドにマップするカスタム ServiceNow フィールドを選択します。
6. **[Submit** (送信)] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- Microsoft Project ファイルをインポートします。詳細については、「インポートモジュールを使用した Microsoft Project ファイルのインポート」を参照してください。
- 表示するカスタムフィールドを追加するようにプロジェクトフォームを設定します。詳細については、「フォームの構成」を参照してください。

関連情報

プロジェクトのインポートとエクスポート

Microsoft Project からのプロジェクトのインポート

Microsoft Project ファイルを ServiceNow プロジェクト管理 (PM)アプリケーションにインポートします。

プロジェクトマネージャーロールを持つユーザーは、以下を使用してプロジェクトをインポートできます。

- インポートモジュール
- プロジェクトフォーム
- 計画立案コンソール

プロジェクトを新しいプロジェクトとしてインポートするか、または既存のプロジェクトにインポートすると、プロジェクトは次のように更新されます。

- 新規プロジェクト：新規レコードがプロジェクト [pm_project] テーブルに作成されます。プロジェクトに関連付けられたタスクがプロジェクトタスク [pm_project_task] テーブルに追加されます。

  共通フィールドまたはマップされたフィールドのみがインポートされます。インポートされたプロジェクトは、[優先度] と [リスク] の両方が [低] に設定された状態でインスタンスに取り込まれます。

- 既存のプロジェクト：インスタンスは、最上位の Microsoft Project タスクの [テキスト 10] フィールドを確認します。[テキスト 10] フィールドに認識可能な sys_id が含まれている場合は、プロジェクトが以前に ServiceNow インスタンスからエクスポートされていることを意味します。この場合、プロジェクトの値は既存のプロジェクトの値を上書きします。

インポートされたタスクのスケジュール計算タイプを [自動] または [手動] に指定することもできます。プロジェクトをインスタンスにインポートすると、プロジェクトの制約は次のように変換されます。

- [計算タイプ]を [手動] として選択した場合、インポートされたすべてのタスクの時間の制約は、Microsoft Project の制約タイプに関係なく、[特定の日に開始] に設定されます。
- 計算タイプを [自動] として選択すると、次の制約タイプがサポートされます。
  - 特定の日に開始
  - できるだけ早く
  - 以下以前に開始
  - 以下以降に開始

  他の制約タイプのタスクは、[特定の日に開始] に変換されます。

注:
Microsoft Project のリソース名は、インスタンス内のユーザーの名前にマップする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

プロジェクトのインポートとエクスポート

インポートモジュールを使用した **Microsoft Project** ファイルのインポート

インポートモジュールを使用して、Microsoft Project ファイルを新しいプロジェクトとして プロジェクト管理 (PM)アプリケーションにインポートします。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

Microsoft Project ファイルを ServiceNow インスタンスにインポートする前に、次の情報を考慮してください。

- チームスペースにインポートされた Microsoft Project プロジェクトは、チームスペースにアクセスできるユーザーのみが使用できます。
- カスタムフィールドを Microsoft Project にインポートするには、まず ServiceNow インスタンスにそれらのカスタムフィールドを作成し、プロジェクトをインポートする前にこれらのフィールド間のマッピングを作成します。詳細については、「Microsoft Project ファイルのインポート用のカスタムフィールドマッピングの作成」を参照してください。

  注:
  また、カスタムフィールドを手動で作成してマッピングすることなく、スクリプト拡張ポイントを使用してカスタムフィールドをインポートすることもできます。`MSProjectImportTaskFormatter` 拡張ポイントを使用して、スクリプトインクルードを作成し、 Microsoft Project および ServiceNow のカスタムフィールドをマップします。この拡張ポイントを使用して、プロジェクトのインポート中にデータを変更することもできます。

- 計算タイプが [手動] に設定されている場合、 Microsoft Project ファイルからインポートされたプロジェクトタスクでは再計算は行われません。プロジェクトが ServiceNow システムに入ると、手動プロジェクトとして扱われます。
- プロジェクト間の依存関係がある Microsoft Project プロジェクトをインポートしても、シャドウタスクはインポートされません。
- サブプロジェクト (ヘッダーと親タスク) のみが ServiceNow インスタンスにインポートされ、子タスクはインポートされません。
- ServiceNow への Microsoft Project ファイルのインポート中、次の場合はインポートが失敗します。
  - タスクを含むプロジェクトがインポート前に ServiceNow インスタンスで作成された場合。
  - 以前に Microsoft Project ファイルからインポートしたプロジェクトを再インポートし、ServiceNow インスタンスでタスクを作成して追加した場合。

    注:
    ServiceNow インスタンスで作成されたプロジェクトタスクを保持するには、まずそのプロジェクトを Microsoft Project ファイルにエクスポートする必要があります。その後、ファイルを ServiceNow インスタンスに再インポートします。

  - インポートにより削除されるタスクに、コスト計画、利益計画、リソースプラン、タイムカード、または経費ラインのいずれかの関連エンティティがある場合。
  - 遅延またはリードタイムの依存関係の値がサポートされている形式でない場合。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 日、時間、および分については、遅延時間の依存関係に正の値が許可されます。遅延時間の依存関係に負の値が許可されるのは、日についてのみです。
- Microsoft Project の他のすべての経過期間タイプ (emin、eday、eweek、emon、eyr、% など) はインポートできません。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > インポート.
2. [ファイルを選択] を選択して、 Microsoft プロジェクト (mpp) ファイルを選択します。
3. Microsoft プロジェクトを新しいプロジェクトとしてインポートするには、[新規プロジェクトを作成] オプションを選択します。
4. オプション: [プロジェクト名] フィールドで、新規プロジェクトの名前を指定します。
5. Microsoft プロジェクトをアクティブな既存のプロジェクトのサブセットとしてインポートするには、次の手順を実行します。
   a. [既存のプロジェクトを更新] を選択します。
   b. 参照ルックアップアイコン ( ) を選択し、プロジェクトまたはタスクを選択します。アクティブなプロジェクトのみがリストに表示されます。
6. スケジュールの計算方法を指定するには、次のいずれかのオプションを選択します。
   - 自動：プロジェクトタスクのインポート中にスケジューリングエンジンを適用するには、このオプションを選択します。サポートされている制約タイプは、同じ制約が適用された状態でインポートされますが、他の制約タイプは [特定の日に開始] に変換されます。
   - [手動]：このオプションを選択すると、Microsoft Project での制約タイプに関係なく、すべてのプロジェクトタスクは [特定の日に開始] 制約タイプでインポートされます。

   サポートされている制約タイプの詳細については、「Microsoft Project からのプロジェクトのインポート」を参照してください。
7. [インポート] を選択します。

タスクの結果

- 以前に ServiceNow インスタンスにインポートされ、タイムカード、リソース計画、コスト計画、利益計画、または経費ラインが関連付けられているプロジェクトタスクは、 Microsoft Project から削除された場合でも再インポート時に保持されます。
- ServiceNow プロジェクトの日付は、Microsoft Project ファイルの日付と同じままです。
- サブプロジェクトを含む ServiceNow プロジェクトでは、次の詳細が変更されます。
  - インポートされたタスクの WBS 順序は、インポート後に再生成されます。
  - 親プロジェクトの [開始予定日] と [終了予定日] がロールアップされます。
  - 親プロジェクトとタスクの [ステータス] がロールアップされます。
  - トップタスクの [完了率 (%)] がロールアップされます。

関連情報

プロジェクトのインポートとエクスポート

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Project ファイルを使用したプロジェクトの更新

プロジェクトフォームまたは計画立案コンソールを使用して、Microsoft Project ファイルから ServiceNow インスタンスの既存のプロジェクトにプロジェクトデータをインポートします。

始める前に

プロジェクトを作成します。

必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 更新するプロジェクトを開きます。
3. 次のいずれかの画面から、Microsoft Project ファイルをインポートして選択したプロジェクトを更新します。
   - プロジェクトフォームで、コンテキストメニューから **[MS Project** からインポート] を選択します。
   - 計画立案コンソールで、その他のアクションアイコン ( ) を選択し、[**MS Project** からインポート] オプションを選択します。
4. [Microsoft Project インポート] ダイアログボックスで、Microsoft Project ファイルと計算タイプを選択します。

   a. [ファイルを選択] を選択して、 Microsoft プロジェクト (mpp) ファイルを選択します。

   b. スケジュールの計算方法を指定するには、次のいずれかのオプションを選択します。
      - 自動：プロジェクトタスクのインポート中にスケジューリングエンジンを適用するには、このオプションを選択します。サポートされている制約タイプは、同じ制約が適用された状態でインポートされますが、他の制約タイプは [特定の日に開始] に変換されます。
      - [手動]：このオプションを選択すると、Microsoft Project での制約タイプに関係なく、すべてのプロジェクトタスクは [特定の日に開始] 制約タイプでインポートされます。

      サポートされている制約タイプの詳細については、「Microsoft Project からのプロジェクトのインポート」を参照してください。

5. [インポート] を選択します。

タスクの結果

- 以前に ServiceNow インスタンスにインポートされ、タイムカード、リソース計画、コスト計画、利益計画、または経費ラインが関連付けられているプロジェクトタスクは、 Microsoft Project から削除された場合でも再インポート時に保持されます。
- ServiceNow プロジェクトの日付は、Microsoft Project ファイルの日付と同じままです。
- サブプロジェクトを含む ServiceNow プロジェクトでは、次の詳細が変更されます。
  - インポートされたタスクの WBS 順序は、インポート後に再生成されます。
  - 親プロジェクトの [開始予定日] と [終了予定日] がロールアップされます。
  - 親プロジェクトとタスクの [ステータス] がロールアップされます。
  - トップタスクの [完了率 (%)] がロールアップされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

プロジェクトのインポートとエクスポート

複数のプロジェクトのプロジェクトタスクのインポート

インポートセットと変換マップを使用して、外部のファイルシステムまたはデータソースから複数のプロジェクトのプロジェクトタスクをインポートします。

始める前に
必要なロール：import_transformer、import_admin、または admin

手順

1. 移動先 すべて > システムインポートセット > データのロード.
2. [既存のテーブル] オプションを選択します。
3. [インポートセットテーブル] リストから、[計画タスク **[imp_planned_task]** のインポート **(Import planned task [imp_planned_task])]** オプションを選択します。
4. インポートのソース フィールドで、ファイル を選択し、ファイルの選択 を選択して、ソース Excel スプレッドシートを選択します。
5. オプション: 必要に応じて、ワークシートとヘッダー行番号を指定します。
6. **[Submit** (送信)] を選択する
インポートされたデータが、選択したインポートセットテーブルで利用できるようになります。
7. オプション: カスタム列のフィールドマッピングを作成します。
詳細については、「フィールドマッピングの作成」を参照してください。
8. データをインポートセットテーブルからターゲットテーブルに変換します。
詳細については、「インポートを実行」を参照してください。

関連情報

プロジェクトのインポートとエクスポート

Microsoft Project へのプロジェクトのエクスポート

Microsoft Project を使用してプロジェクトアクティビティを管理している場合は、プロジェクトを Microsoft Project (mpp) ファイル、XML ファイル、または CSV ファイルにエクスポートできます。

プロジェクトマネージャーロールを持つユーザーは、以下を使用してプロジェクトをエクスポートできます。

- エクスポートモジュール
- プロジェクトフォーム
- 計画立案コンソール

プロジェクトデータをエクスポートする形式を指定することもできます。使用可能なオプションは次のとおりです。

- **XML**：プロジェクトデータを他の ServiceNow インスタンスにインポートする場合に適しています。
- **CSV**：プロジェクトデータを計画立案コンソールからそのままエクスポートし、他のアプリケーションを使用してプロジェクトデータを表示するのに適しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- **Microsoft Project**：プロジェクトデータを Microsoft Project にインポートする場合に適しています。

> **注:**
> プロジェクトデータを CSV および Microsoft Project 形式でエクスポートするオプションは、計画立案コンソールからプロジェクトをエクスポートする場合に使用できます。

プロジェクトのタスクに、サポートされているいずれかの制約が含まれている場合、プロジェクトをエクスポートするときに制約もエクスポートされます。この制約のエクスポートは、プロジェクトを別の ServiceNow インスタンスにインポートするときにプロジェクトの日付を維持するのに役立ちます。次の制約がサポートされています。

- 特定の日に開始：Microsoft Project へのエクスポート時に、[開始日時] 制約にマップされます。
- できるだけ早く
- 以下以前に開始
- 以下以降に開始

> **注:**
> プロジェクトデータのエクスポート時に、シャドウタスクと外部依存関係はエクスポートされません。

関連情報

プロジェクトのインポートとエクスポート

プロジェクトデータのエクスポート

エクスポートモジュール、プロジェクトフォーム、または計画立案コンソールを使用して、プロジェクトデータをエクスポートします。エクスポートファイルを Microsoft Project (MPP)、XML、または CSV 形式で、システム上のフォルダーに保存します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
プロジェクトをエクスポートするには、プロジェクトが プロジェクト管理 (PM)スケジュールまたはデフォルトの MS Project スケジュールのいずれかを使用している必要があります。

プロジェクトデータを MPP および CSV 形式でエクスポートするオプションは、計画立案コンソールからプロジェクトをエクスポートする場合に使用できます。計画立案コンソールに表示されている列のみがエクスポートされます。

手順

1. 次のいずれかのオプションからプロジェクトデータをエクスポートします。

2. オプション: エクスポートファイルを保存するよう求めるダイアログボックスが表示される場合があります。
   ファイルを XML ファイルとして保存します。計画立案コンソールからプロジェクトをエクスポートし、[CSV] オプションを選択した場合は、ファイルを CSV 形式で保存できます。

   > **注:**
   > ブラウザの設定によっては、ブラウザによってファイルがダウンロードフォルダーに自動的に保存される場合があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- MPP ファイルを使用して、プロジェクトデータを Microsoft Project にインポートします。
- XML ファイルを使用して、プロジェクトデータを他の ServiceNow インスタンスまたは Microsoft Project にインポートします。
- CSV ファイルを使用して、他のアプリケーションでプロジェクトデータを表示します。

関連情報

プロジェクトのインポートとエクスポート

プロジェクトタスクのエクスポート

エクスポートするタスクは、 プロジェクト管理 (PM) スケジュールまたはデフォルトの MS Project スケジュールのいずれかを使用しているプロジェクトに関連付けられている必要があります。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. プロジェクトを開きます。
3. [プロジェクトタスク] 関連リストまでスクロールし、タスク番号を選択して [プロジェクトタスク] フォームを開きます。
4. フォームヘッダーを右クリックし、コンテキストメニューから [タスクを **MS Project** にエクスポート] を選択します。

   タスクがシステム上のフォルダーにエクスポートされます。
5. Microsoft Project を開き、エクスポートされたプロジェクトタスクファイルをインポートします。
   手順については、Microsoft の製品ドキュメントを参照してください。

カレンダーとスケジュール - 制限事項

Microsoft Project の一部のカレンダー要素は、プロジェクト管理 (PM)アプリケーションにインポートされません。

- プロジェクトカレンダー
- ユーザーカレンダー
- スケジュール

インポートされたプロジェクトは、v3 アプリケーション以降、月曜日から金曜日の営業日の午前 8 時から午後 5 時まで (1 時間の昼休みを含む) のデフォルトスケジュールを使用します。

関連情報

プロジェクトのインポートとエクスポート

プロジェクトステータスアプリケーションを使用したプロジェクトのステータスの管理

プロジェクトステータス モバイルアプリを使用すると、プロジェクトのステータスを追跡し、ステークホルダーと協力して例外を解決し、場所に関係なくタイムリーにアクションを実行できます。

プロジェクトステータス 機能を使用して、次のことを実行できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- プロジェクトの最新ステータスを表示する
- プロジェクトの最新のステータスレポートを表示する
- リスクと意思決定をレビューする
- プロジェクトで他のステークホルダーとコラボレーションを行う
- プロジェクトのステータスが変更されたとき、または他のユーザーがコメントやメモを追加したときにモバイル通知を受信する

アクティベーション情報

プロジェクトステータス モバイルアプリケーションは、ServiceNow® モバイルプラットフォーム上で実行されます。プロジェクトステータス アプリを有効にするには、admin ロールを持つユーザーが PPM Mobile プラグイン (com.sn_ppm_mobile) を有効にします。

関連情報

Mobile Project Status の有効化

プロジェクトステータス アプリの開始

モバイルアプリでのプロジェクトの詳細の表示

プロジェクトステータスレポートの表示

RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの作成

プロジェクトステークホルダーとのコラボレーション

Mobile Project Status の有効化

admin ロールがある場合は、 ServiceNow Store から MobilenProject Status アプリケーション (以前の PPM Mobile (com.sn_ppm_mobile)) をアクティブ化します。このアプリケーションをインストールすると、関連プラグインも有効になります (まだ有効になっていない場合)。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
Mobile：Project Status ステータスは、次の関連プラグインを有効にします (まだ有効になっていない場合)。

PPM Mobile のプラグイン

プラグイン	説明
ファイナンシャルを備えたプロジェクトポートフォリオスイート [com.snc.financial_planning_pmo]	デマンド、リソース、ポートフォリオ、およびプロジェクトを管理できます。また、投資とリターンのバランスを取るために、ポートフォリオ内のプロジェクトとデマンドのコストと予算を計画、追跡、および管理するのにも役立ちます。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

関連情報

プラグインのリスト (Yokohama)

プロジェクトステータス アプリの開始

プロジェクトステータス モバイルアプリでプロジェクトステータスレポートとステータスレポートにアクセスして、プロジェクトのステータスを確認し、場所に関係なくステークホルダーとコラボレーションを行います。

始める前に

- モバイルエージェント モバイルアプリケーションをダウンロードします (iOS プラットフォームには Apple App Store から、Android プラットフォームには Google Play Store から)。
- PPM Mobile プラグインを有効にします。

必要なロール：admin

手順

1. モバイルアプリを開き、プラスアイコン ( ) をタップします。
2. ServiceNow インスタンスを追加し、ログインするための認証情報を入力します。
   インスタンス名の末尾に service-now.com を含める必要はありません。
3. オプション: 簡単に特定できるように、インスタンスに [ニックネーム] を付けることができます。
4. [プロジェクトステータス] ( ) をタップして、プロジェクトの追跡を開始します。

関連情報

エージェントモバイルアプリ

モバイルアプリでのプロジェクトの詳細の表示

モバイルアプリを使用して、プロジェクトのステータス、およびプロジェクトの他の詳細 (財務データ、ステータスレポート、リスク、および意思決定など) を表示できます。

始める前に

必要なロール：portfolio_manager または project_manager または program_manager


手順

1. モバイルアプリの [プロジェクトステータス] アプリケーションに移動します。
2. 次のいずれかのオプションを使用して、詳細を表示するプロジェクトを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タップしてアプレットを開き、プロジェクトをタップします。
- [プロジェクトを検索] アプレットをタップして、特定のプロジェクトを検索します。
- [最重要プロジェクト] または [赤字のプロジェクト] リストで、プロジェクトをタップします。

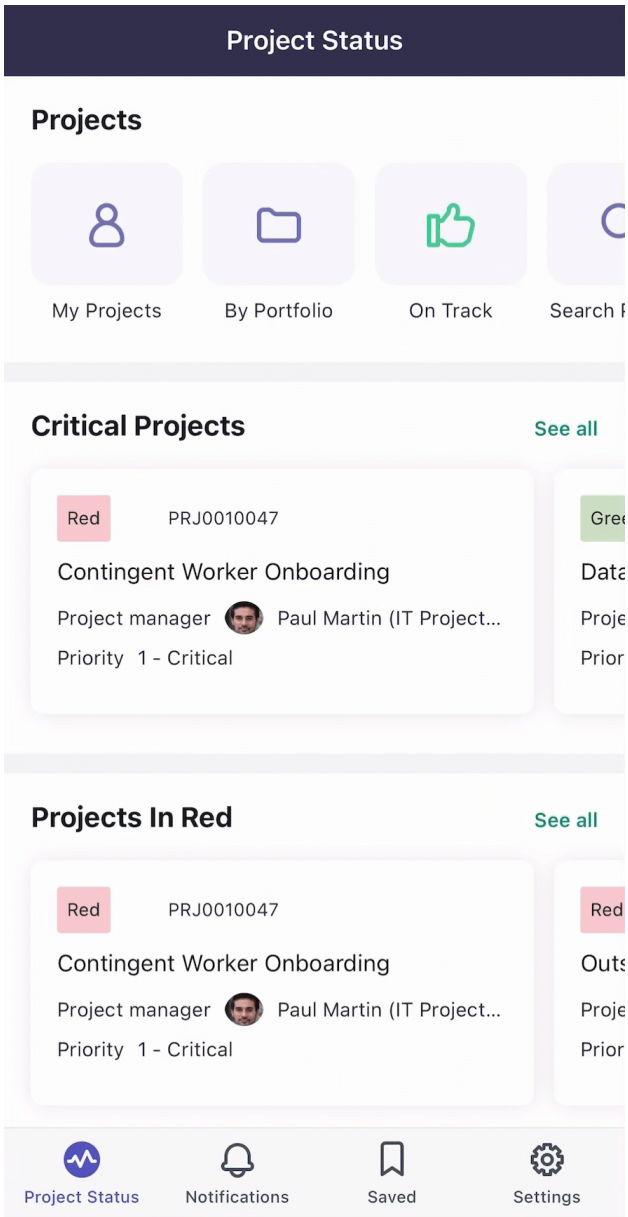

関連情報

プロジェクトステータスアプリケーションを使用したプロジェクトのステータスの管理

プロジェクトステータスレポートの表示

モバイルアプリを使用して、全体的な進捗状況、エグゼクティブサマリー、財務データ、および RIDAC レコードなどのプロジェクトのステータスを表示できます。


始める前に
必要なロール：portfolio_manager または project_manager または program_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. モバイルアプリの [プロジェクトステータス] アプリケーションに移動します。
2. 次のいずれかのオプションを使用して、プロジェクトステータスレポートを表示するプロジェクトを開きます。
   - [自分のプロジェクト] ( ) アプレットをタップして、自分のプロジェクトを表示します。
   - [プロジェクトを検索] ( ) アプレットをタップして、特定のプロジェクトを検索します。
   - [最重要プロジェクト] または [赤字のプロジェクト] リストで、プロジェクトをタップします。
3. プロジェクトカードをタップして、そのステータスレポートを表示します。
   - [ステータス] タブには、プロジェクトの総合健全性、エグゼクティブサマリー、達成度、プロジェクトで計画されている主要なアクティビティなど、プロジェクトのサマリーが表示されます。
   - [詳細] タブには、プロジェクトのスケジュール、スコープ、コスト、およびリソースに関連する情報のステータスと詳細が表示されます。

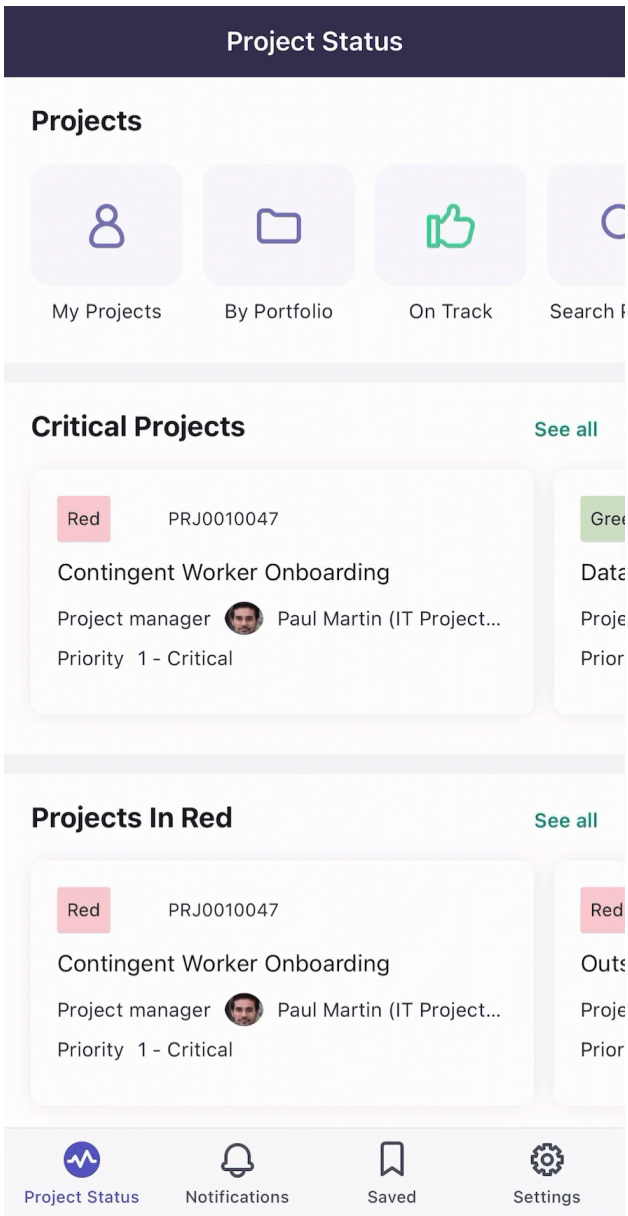

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

プロジェクトステータスアプリケーションを使用したプロジェクトのステータスの管理

RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの作成

モバイルアプリを使用して、プロジェクトのリスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求のレコードを作成できます。

始める前に

必要なロール：portfolio_manager または project_manager または project_user

このタスクについて


プロジェクトに対するリスクの影響を分析し、RIDAC レコードを作成して、将来のプロジェクトを計画するためのリスク、問題、およびそれらの考えられる解決策を追跡します。詳細については、「プロジェクトの RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの追加」を参照してください。

手順

1. モバイルアプリの [プロジェクトステータス] アプリケーションに移動します。
2. 次のいずれかのオプションを使用して、RIDAC レコードを作成するプロジェクトを開きます。
   - タップしてアプレットを開き、プロジェクトをタップします。
   - [自分のプロジェクト] アプレットをタップして、自分のプロジェクトを表示します。
   - [プロジェクトを検索] アプレットをタップして、特定のプロジェクトを検索します。
   - [最重要プロジェクト] または [赤字のプロジェクト] リストで、プロジェクトをタップします。
3. 次のいずれかのオプションを使用して、RIDAC レコードを作成します。
   - その他のアクションアイコン () をタップし、次のいずれかのオプションを選択します。
     - 新しいリスク (New Risk)
     - 新しい問題
     - 新しい意思決定 (New Decision)
     - 新しいアクション
     - 新しい変更要求 (New Request Changes)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

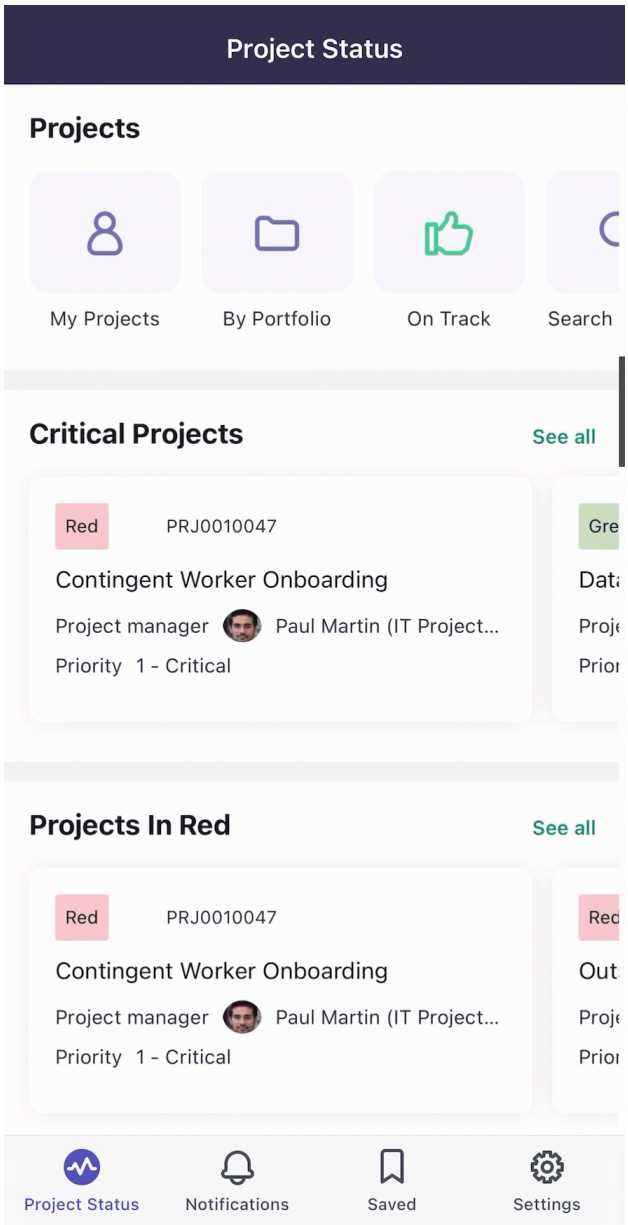

4. 選択したオプションに基づいて、フォームのフィールドに入力します。

5. または、RIDAC レコードを開き、新しい RIDAC レコードを作成します。

- **a. [RIDAC]** タブをタップします。
- **b.** RIDAC レコードの右矢印をタップして詳細を表示し、その他のアクションアイコン (...) をタップしてから、選択したレコードに基づいて [新しいリスク **(New Risk)]**、[新しい問題]、[新しい意思決定 **(New Decision)]**、[新しいアクション]、または [新しい変更要求 **(New Request Changes)]** オプションをタップします。
- **c.** フォームのフィールドに入力します。

関連情報

プロジェクトステータスアプリケーションを使用したプロジェクトのステータスの管理

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトステークホルダーとのコラボレーション

プロジェクトでプロジェクトマネージャーや他のステークホルダーとコラボレーションして、モバイルアプリからプロジェクトの更新、ドキュメントの共有、またはメールの送信を実行できます。

始める前に
必要なロール：portfolio_manager または project_manager または project_user

手順

1. モバイルアプリの [プロジェクトステータス] アプリケーションに移動します。
2. 次のいずれかのオプションを使用して、詳細を表示するプロジェクトを開きます。
   - [プロジェクトを検索] アプレットをタップして、特定のプロジェクトを検索します。
   - [最重要プロジェクト] または [赤字のプロジェクト] リストで、プロジェクトをタップします。
3. 次のいずれかの方法で、プロジェクトステータスレポートでプロジェクトマネージャーや他のステークホルダーとコラボレーションを行います。
   - 作業メモやコメントを追加する機能、画像を選択およびアップロードする機能、写真とファイルを添付する機能などのアクティビティをプロジェクトステータスレポートに追加します。
     a. [アクティビティ] タブをタップします。
     b. アクティビティを追加アイコン (⊕) をタップし、次のいずれかのオプションを選択します。
        - 作業メモを追加
        - その他のコメントを追加 (Add Additional Comments)
        - カメラを開く (Open Camera)
        - ライブラリーを開く (Open Library)
        - ファイルの添付 (Attach File)
   - プロジェクトの詳細については、プロジェクトマネージャーにメールを送信してください。
     a. [詳細] タブをタップします。
     b. メール送信アイコン (✉) をタップします。
     c. メールアプリケーションでメールを作成し、アドレスを追加して、送信します。

        デフォルトでは、[宛先 **(To)]** フィールドにプロジェクトマネージャーのメール ID が入力されます。その他のステークホルダーを追加できます。

タスクの結果
プロジェクトでアクティビティの追加やステータスの変更を行うと、プロジェクトマネージャーはモバイル通知を受け取ります。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトステータス アプリをインストールし、モバイルデバイスで通知を受信できるように通知を有効にしておく必要があります。

関連情報

プロジェクトステータスアプリケーションを使用したプロジェクトのステータスの管理

Planning 属性の使用

計画立案属性は、リソース管理で属性ベースのリソースマッピングを定義して作成し、財務でこれらのリソースの人件費を生成するように設計されています。

属性は、リソースまたはタスクタイプとして定義されたプロパティまたは特性であり、属性ベースの計画で考慮されます。これらの属性は、リソース管理とファイナンシャルプランに使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



計画立案属性が特定された後、アドミニストレーターは、プロジェクト要件とリソーステーブルから利用可能なメタデータに基づいて、計画立案属性を作成または編集できます。計画立案属性の作成作業には、プロジェクト計画プロセスで使用する属性の特定と定義が含まれます。

計画立案属性を使用するロールベースのメリット

ロール	長所
リソースマネージャー (リソース管理)	• 計画立案レベルにリソースを追加します。 • リソースグリッドを使用して、属性を計画したり、必要な詳細な変更を行ったりします。 • ヒートマップを割り当てて、週次または月次の割り当ての競合を表示および管理します。
プロジェクトマネージャー (プロジェクトファイナンシャル)	• 新しい リソース管理 に基づく属性ベースの人件費の作成。 • 外部リソースの人件費を自動的に生成します。 • リソースにアサインされたタスクに基づいて、経費タイプ別に人件費を表示します。 • 分割された人件費の財務予測を表示します。

属性ベースのリソースマッピングでは、次の属性がデフォルトで有効になっており、財務を使用して人件費を生成します。









計画立案属性

属性名	リソース管理	財務管理
従業員タイプ		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

計画立案属性 (続く)

属性名	リソース管理	財務管理
経費タイプ		
グループ		
ロール		
スキル		

自動翻訳

関連情報

計画立案属性の作成または編集

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

計画立案属性の作成または編集

計画立案属性を作成または編集して、プロジェクトのリソースと財務を計画および予測します。

始める前に

必要なロール：pps_admin、sn_align_core.apw_admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 計画立案属性.
2. 計画立案属性を作成または編集するには、次のオプションを使用します。

3. [計画立案属性列構成 **(Planning attribute column configurations)]** テーブルにルックアップテーブル値のフィールド名を入力します。
4. オプション: 財務属性またはリソース管理属性を含む任意のテーブルのデフォルトの列構成リストに新しい構成を追加するには、次のようにします。

   a. [新規] を選択します。

   b. リストからルックアップテーブルを選択します。

   c. リストからフィールド名を選択し、**[Submit** (送信)] を選択します。
   たとえば、場所フィールドの属性を作成する場合は、選択したルックアップテーブルに場所関連の列を追加します。
   選択したアイテムは、自動生成されたフィールドの説明とともに列構成リストに追加されます。

5. [更新] を選択します。

> **重要:**
> リソース管理の属性を作成する場合は、属性フィールドを `resource_allocation`、`resource_plan`、および `sn_plng_att_core_resource_assignment` ルックアップテーブルに追加してください。同様に、財務の属性を作成する場合は、属性フィールドをリソース管理ルックアップテーブルとともに `cost_plan` ルックアップテーブルに追加します。

関連情報

Planning 属性の使用

プロジェクト管理 **(PM)** でのチームスペースの使用


チームスペースは、インスタンスアプリケーションナビゲーターにアプリケーションとして表示されます。チームスペースには、プロジェクト、アイデア、デマンド、プログラム、およびポートフォリオアプリケーションなどの プロジェクトポートフォリオ管理 アプリケーションからのモジュールリンクが含まれています。

チームスペースを使用して、組織内の異なるチーム間でこれらのアプリケーションの機能とデータの分離を実現します。マーケティングチームのチームスペースの例を次に示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

チームスペースの例



チームスペースの有効化

チームスペース機能を使用するには、チームスペースプラグインを有効化する必要があります。次のチームスペースプラグインを利用できます。

- **Project Management TeamSpace 1** (com.snc.ppm_teamspace_1)
- **Project Management TeamSpace 2** (com.snc.ppm_teamspace_2)
- **Project Management TeamSpace 3** (com.snc.ppm_teamspace_3)
- プロジェクト管理 **TeamSpace 4** (com.snc.ppm_teamspace_4)
- **Project Management TeamSpace 5** (com.snc.ppm_teamspace_5)

これらのプラグインとともにロードされたチームスペースには同じコンポーネントが含まれていますが、コンポーネントのプリフィックスは異なります。たとえば、チームスペース 1 には **[Teamspace_1** プロジェクト **[tsp1_project]]** という名前のプロジェクトテーブルが含まれ、チームスペース 5 には **[Teamspace_5** プロジェクト **[tsp5_project]]** という名前のプロジェクトテーブルが含まれます。

これらのチームスペースのいずれかまたはすべてを有効にし、チームスペースを使用する必要があるグループ内の関連ユーザーにチームスペース固有のロールをアサインすることができます。プラグインを使用して最大 5 つのチームスペースを作成できます。

チームスペースのカスタマイズ

他のチームスペースに影響を与えることなく、チームスペースのプロジェクト部分とデマンド部分をカスタマイズできます。次の表に、カスタマイズが可能なものを要約しています。

チームスペースのカスタマイズ

チームスペース内のプロジェクトまたはデマンドのカスタマイズ	サポートの可否
データモデルの変更 (プロジェクトフォームまたはデマンドフォームへのフィールドの追加など)。	はい
ビジネスルール、UI アクション、UI ポリシー、セキュリティルール、データポリシー、およびワークフローの変更。	はい
共有ロール (project_manager、demand_manager など) の変更。	はい
フォームとリストのレイアウト、リストコントロール、および関連リスト	はい
辞書オーバーライド	あり

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

関連情報

チームスペースの有効化

チームスペースの有効化

チームスペース機能を使用するには、チームスペースプラグインの 1 つまたはすべてを有効化する必要があります。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

チームスペース機能を使用するには、チームスペースプラグインを有効化する必要があります。次のチームスペースプラグインを利用できます。

- **Project Management TeamSpace 1** (com.snc.ppm_teamspace_1)
- **Project Management TeamSpace 2** (com.snc.ppm_teamspace_2)
- **Project Management TeamSpace 3** (com.snc.ppm_teamspace_3)
- プロジェクト管理 **TeamSpace 4** (com.snc.ppm_teamspace_4)
- **Project Management TeamSpace 5** (com.snc.ppm_teamspace_5)

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

チームスペースと一緒のインストール

プロジェクトチームスペースとともにインストールされるテーブルとロールには、チームスペースの名前に基づく省略形がプリフィックスとして追加されます。

テーブル

テーブルは、プロジェクト、アイデア、およびデマンドベースアプリケーションテーブルから拡張されます。

チームスペースと一緒にインストールされるテーブル

テーブル	説明
アイデア [prefix_idea]	アイデアを格納します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

チームスペースと一緒にインストールされるテーブル (続く)

テーブル	説明
デマンド [prefix_demand]	デマンドを格納します。
プロジェクト [prefix_project]	プロジェクトを格納します。
ポートフォリオ [prefix_portfolio]	ポートフォリオを格納します。
プロジェクトタスク [prefix_project_task]	プロジェクトタスクを格納します。
ポートフォリオ目標 [prefix_portfolio_goal]	ポートフォリオ目標を格納します。
ポートフォリオ問題 [prefix_portfolio_issue]	ポートフォリオ問題を格納します。
ポートフォリオリスク [prefix_portfolio_risk]	ポートフォリオリスクを格納します。
ポートフォリオプロジェクト [prefix_portfolio_project]	ポートフォリオプロジェクトを格納します。
プロジェクトテンプレート [prefix_project_template]	プロジェクトテンプレートを格納します。 注: チームスペースエリアで作成されたプロジェクトテンプレートは、メインのプロジェクト管理 (PM)アプリケーションでは使用できなくなりました。これらのテンプレートは、作成されたチームスペースでのみ使用できます。
プロジェクトテンプレートタスク [prefix_project_template_task]	プロジェクトテンプレートタスクを格納します。
ステークホルダー登録 [prefix_stakeholder_register]	ステークホルダーを格納します。
プログラム [prefix_pm_program]	プログラムを格納します。
プログラムタスク [prefix_pm_program_task]	プログラムタスクを格納します。
プログラムタスク [prefixpm_program_task project_status]	プログラムタスクのプロジェクトステータスを格納します。

ロール

チームスペースと一緒にインストールされるロール

ロール	説明
プリフィックス_demand_manager	チームスペースのデマンド機能のマネージャー。
プリフィックス_demand_user	チームスペースのデマンド機能のユーザー。
プリフィックス_project_manager	チームスペースのプロジェクト機能のマネージャー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

チームスペースと一緒にインストールされるロール (続く)

ロール	説明
プリフィックス_project_portfolio_user	チームスペースのプロジェクトポートフォリオのユーザー。
プリフィックス_project_user	チームスペースのプロジェクト機能のユーザー。
プリフィックス_program_manager	チームスペースのプログラム機能のマネージャー。
プリフィックス_portfolio_manager	チームスペースのポートフォリオ機能のマネージャー。

チームスペースアプリケーションでは、プロジェクト、アイデア、およびデマンドベースアプリケーションで提供されるものと同じビューを使用します。

注:
これらのベースアプリケーションが使用するデフォルトのクライアントスクリプトは、チームスペースアプリケーションの拡張テーブルに継承されます。いずれかのベースアプリケーション用にカスタムクライアントスクリプトを作成した場合は、チームスペースを作成する前に、各クライアントスクリプトフォームで [継承済み] オプションを選択します。

関連情報

プロジェクト管理 (PM) でのチームスペースの使用

チームスペース設定の構成

チームスペースプラグインを有効にした後、チームスペース設定を構成します。

始める前に
必要なロール：it_pps_admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > チームスペース.
2. チームスペース名を選択します。
3. 必要に応じてチームスペース名を変更します。
   名前を変更すると、アプリケーションメニューに表示されるタイトルのみが変更されます。テーブル名やロール名など、他のコンポーネントの名前は変更されません。
4. [テーブル]、[ロール]、および [アプリケーションメニュー] 関連リストで、チームスペースのテーブル、ロール、およびアプリケーションモジュールを追加または変更できます。

タスクの結果
チームスペースがメニューで利用可能になります。チームスペースにアサインされたレコード (プロジェクト、ポートフォリオ、デマンドなど) は、自動的にチームスペースに追加されます。

次のタスク
チームスペースロールを、そのチームスペースのユーザーにアサインします。プロジェクトポートフォリオスイートのアプリケーションに付属する一般的なロールをアサインしないでください。

関連情報

プロジェクト管理 (PM) でのチームスペースの使用

プロジェクトレポート

レポート、ポートフォリオダッシュボード、およびプロジェクトビューを使用して、プロジェクトを一目で把握できます。マイルストーンがずれこんでいるプロジェクト、プロジェクト別のリソースのグラフ、完了率順のプロジェクトのリストなどの情報を表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
レポート、ダッシュボード、およびビューで利用できる情報の多くはカスタマイズ可能です。以下の例は、デフォルト設定に基づいています。

アプリケーションでは、リストとチャートの両方を含むグローバルレポートを複数提供しており、プロジェクトのステータスを一目で把握できます。また、カスタムレポートを作成したり、特定のグループが表示できるレポートを作成したりすることもできます。ベースシステムでは、次のプロジェクト管理 (PM)レポートを利用できます。

- アクティブなプロジェクトの未アサインタスク (30 日間)：リストレポート：リストレポート
- プロジェクト (優先度別)：棒グラフ
- プロジェクト (優先度別)：リストレポート
- プロジェクト (リスク別)：リストレポート
- プロジェクト (リスク別)：棒グラフ
- プロジェクト (ステータス別)：リストレポート
- プロジェクト (ステータス別)：棒グラフ
- アクティブなプロジェクト：リストレポート
- 処理待ちのプロジェクト：リストレポート
- マネージャー別のアクティブなプロジェクト：棒グラフ

関連情報

Reporting

プロジェクト関連フォームでプロジェクト通貨ビューを有効にする

プロジェクト通貨ビューに切り替えて、選択したプロジェクト通貨でプロジェクトの予定コストを追跡します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
現地通貨でプロジェクトを管理し、デマンドからプロジェクトを作成するために、コストの詳細と財務タブがある次のテーブルにプロジェクト通貨フィールドが追加されます。

プロジェクト通貨フィールドのあるテーブル

テーブル名	説明
デマンド [dmn_demand] テーブル	プロジェクト通貨でデマンドからプロジェクトを作成します。プロジェクトの管理に使用する通貨を指定するには、[デマンド] フォームの [財務] タブに移動し、[プロジェクト通貨] フィールドで通貨を選択します。 注: プロジェクト通貨を指定できるのは、[デマンド通貨] ビューに切り替えた場合のみです。詳細については、「デマンド管理 における複数通貨」を参照してください。 デマンドを作成するには、「デマンドの作成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト通貨フィールドのあるテーブル (続く)

テーブル名	説明
プロジェクト [pm_project] テーブル	プロジェクトフォームに移動するには、「 プロジェクトフォーム」を参照してください。
コスト計画 [cost_plan] テーブル	[コスト計画] フォームに移動するには、「プロジェクトのコスト計画の作成」を参照してください。
コスト計画ブレークダウン [cost_plan_breakdown] テーブル	[コスト計画ブレークダウン] フォームに移動するには、「コスト計画ブレークダウンの後進」を参照してください。
利益計画 [benefit_plan] テーブル	プロジェクト通貨ビューでプロジェクトフォームを開くと、デフォルトでは、プロジェクト通貨関連のフィールドが利益計画関連リストに表示されます。プロジェクト利益計画を作成するには、「プロジェクト利益計画の作成」を参照してください。
利益計画ブレークダウン [benefit_plan_breakdown] テーブル	利益計画ブレークダウンを更新するには、「利益計画ブレークダウンの更新」を参照してください。
経費ライン [fm_expense_line] テーブル	経費ラインはプロジェクトコスト計画の一部であり、特定のリソースに関連付けられたコストを格納します。[経費ライン] フォームに移動するには、「経費ラインの作成」を参照してください。
プロジェクト資金調達 [project_ Fundding] テーブル	単一会計期間の資本コストと運用コストの両方について、プロジェクトターゲットと予算経費の値を保存します。

自動翻訳

手順

1. それぞれのフォームに移動します。
2. フォームのコンテキストメニューを右クリックします。
3. [表示] をクリックします。
4. リストから [プロジェクト通貨] を選択します。

次のタスク

選択した [プロジェクト通貨] ビュー専用のフォームフィールドを参照してください。他のすべてのフォームタブとフィールドは、デフォルトビューとプロジェクト通貨ビューの両方で同じままです。デフォルトのビューの場合と同じように、フィールドに値を入力し続けます。

プロジェクトの通貨でのプロジェクト予算の追跡

プロジェクトに予算を割り当て、投資予算 (投資) および経費予算 (経費) の金額をプロジェクト通貨で入力します。投資と経費の合計は、プロジェクト通貨での合計予算として計算されます。

始める前に

必要なロール：it_portfolio_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
機能通貨の場合と同様の方法で予算を割り当てます。詳細については、「プロジェクトへの予算の割り当て」を参照してください。

プロジェクトフォームのプロジェクト通貨ビューを有効にして、プロジェクトに予算を割り当てます。

手順

1. プロジェクトフォームの [プロジェクト予算] 関連リンクをクリックします。

[プロジェクト予算] フォーム

フィールド	説明
通貨	プロジェクトに予算を割り当てる際の通貨。 複数通貨プラグインを有効にすると、プロジェクト通貨または機能通貨で予算を組むことができます。
プロジェクト通貨での投資予算	選択した通貨での資本的支出に割り当てられる予定経費額。
プロジェクト通貨での経費予算	選択した通貨での営業費用の金額。
プロジェクト通貨での合計予算	投資および経費の合計額。 プロジェクト資金調達予算の合計額は、[プロジェクト通貨での予算コスト] フィールドにロールアップされます。

2. [**OK**] をクリックします。
3. [プロジェクト予算] 関連リストをクリックして、レコードを更新または表示します。

次のタスク
単一会計期間の資本経費と運用経費の両方のプロジェクトターゲットおよび予算経費の値は、 プロジェクト資金調達 [project_funding] テーブルに保存されます。プロジェクト資金調達レコードを更新すると、金額はプロジェクト通貨に変換されます。

プロジェクトのクローズ

プロジェクトのクローズには、プロジェクトのステータスを終結に変更するだけでなく、さまざまな作業が含まれます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
プロジェクト後のアクティビティには、ベースラインと実際の値を表示して、プロジェクトが元の推定値からどの程度ずれ込んでいるかを評価することが含まれます。また、インスタンスを介してプロジェクトにリンクされている関連インシデント、問題、または変更をフォローアップすることも含まれます。

プロジェクトをクローズすると、プロジェクトに関連付けられているすべてのプロジェクトタスクとサブプロジェクトが自動的にクローズされます。通常、プロジェクトをクローズした後に再オープンすることはできません。プロジェクトステータスを [クローズ済み] から [対応中]、[処理待ち]、または [オープン] に更新することはできません。クローズしたプロジェクトをそれでも再オープンす

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

る必要がある場合は、既存のプロジェクトタスクを再オープンするか、またはプロジェクトに新しいタスクを追加します。タスクに対するこのアクションにより、他のクローズ済みタスクに影響を与えることなく、プロジェクトが [クローズ済み] から [対応中] ステータスに移行します。

プロジェクトがクローズ済みステータスの場合、プロジェクト管理 (PM) アプリケーションでは [実績期間] などの実績値を計算します。関連する将来のリソース計画をキャンセルし、クローズ済みプロジェクトに割り当てられたリソース計画を完了することができます。

手順

1. プロジェクト内のすべてのタスクの作業が完了したことを確認します。
2. プロジェクトフォームで、[ステータス] フィールドを次のいずれかのクローズ済み状況に変更します。
   - 完了してクローズ：プロジェクトが完了し、すべてのタスクが完了しました。
   - 未完了でクローズ：プロジェクトは完了しましたが、タスクは未完了のままです。
   - スキップしてクローズ：プロジェクトは放棄されました。

   または、最低レベルの子タスクから始めて、すべてのプロジェクトタスクを最初にクローズします。クローズ済み状況は親タスクにロールアップされ、最上位レベルの親タスクがすべてクローズされると、プロジェクトのステータスがクローズ済みに変更されます。ただし、親タスクおよびプロジェクトのデフォルトのクローズ済みステータスは、[完了してクローズ] です。したがって、プロジェクトタスクの一部またはすべてを [未完了でクローズ] または [スキップしてクローズ] に変更しても、プロジェクトのステータスは [完了してクローズ] に変更されます。

   また、[フェーズ] の値を [終結]に変更します。プロジェクトフェーズは参照専用であり、[ステータス] フィールドにリンクされたり依存したりすることはありません。

   プロジェクトにサブプロジェクトが含まれている場合は、親プロジェクトに影響を与えずにサブプロジェクトをクローズできます。サブプロジェクトをクローズするには、サブプロジェクトの [ステータス] を任意のクローズ済みステータスに変更します。サブプロジェクトを終結すると、そのサブプロジェクトに関連付けられているすべてのタスクのステータスがクローズまたは変更されます。また、サブプロジェクトのステータスを [対応中] に変更すると、関連付けられたすべてのタスクが [対応中] ステータスに移行します。

   クローズされていない親プロジェクトに関連付けられたプロジェクトタスクがある場合、親プロジェクトは [オープン]、[対応中]、または [処理待ち] ステータスのままになります。親プロジェクトに関連付けられたタスクがクローズされると、親プロジェクトのステータスも [完了してクローズ]に変更されます。
3. プロジェクトが完了したら、最終的なベースラインを作成して、プロジェクトの実際の値が推定値にどれだけ近づいたかを確認します。

   注:
   ベースラインでは、開始予定日と終了予定日の値のみを実開始日と実終了日の値と比較します。レポートを使用して、工数とコストを比較します。

タスクの結果

インシデント、問題、または変更から作成されたプロジェクトの場合、プロジェクトステータスを更新しても、関連するインシデント、問題、または変更要求レコードは自動的に更新されません。関連レコードは手動で更新する必要があります。たとえば、プロジェクトの完了によって関連する変更もクローズできる場合は、[変更レコード] に移動して、その [ステータス] フィールドを変更します。また、プロジェクトに関連する情報を含むように、関連レコードの作業メモフィールドを更新することもお勧めします。プロジェクトが成功し、将来のプロジェクトのテンプレートとして使用できる場合は、そのコピーを作成します。プロジェクトが変更、インシデント、または問題レコードから作成された場合、ServiceNow で実行する他のアクティビティがいくつかあります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次のタスク

- 次のいずれかの条件に該当するプロジェクトに関連付けられているリソース計画をキャンセルします。
  - [確認済み]、[計画]、または [要求済み] ステータスの対応するリソース計画がある場合。
  - プロジェクトの終了日より後の開始日を持つ、[割り当て済み] ステータスのリソース計画がある場合。
- 次の条件に該当するプロジェクトに関連付けられているリソース計画を完了します。
  - [割り当て済み] ステータスの対応するリソース計画がある場合。
  - リソース計画の開始日が、プロジェクトまたはタスクの実終了日以前である場合。

プロジェクト診断

プロジェクト診断を使用すると、診断スクリプトを実行する診断スキャンを使用して、タスクの有効性、依存関係、関係などの、プロジェクト内の破損データを検出できます。修正スクリプトを使用して、破損したデータを修正することもできます。

データは、次のようなさまざまな理由で破損したり、無効になったりする可能性があります。

- プロジェクトのインポート中のフィールドマッピングが正しくない
- タスクのスケジュールが正しくない
- 依存関係と関係の定義が正しくない

プロジェクト診断では、診断スキャンと修正スクリプトを使用して、プロジェクト内の破損したデータを検出して修正します。次のアクションを実行できます。

- 診断機能の作成および追加
- 診断スクリプトおよび修正スクリプトの追加破損または無効なプロジェクトデータを修正します。
- 診断スキャンの作成および関連スクリプトのマップ
- ユーザーが特定のフィルター条件を作成するためのフィールドを定義します。診断スクリプトはこれらのフィルター条件の結果を、破損または無効なデータを検出するための入力として使用します。

[プロジェクト診断] ページには、次の表で説明しているデフォルトのスキャンが表示されます。

プロジェクト診断のデフォルトスキャン

診断スキャン名	説明
トップタスクが無効なタスク	無効なトップタスクを持つタスクをリストします。トップタスクの値が **Null** に設定されているか、または階層内の別のタスクにマップされている場合、タスクは無効なトップタスクを持つと見なされます。
トップポートフォリオが無効なタスク	無効なトップポートフォリオを持つタスクをリストします。タスクが別のポートフォリオに属しているか、またはどのポートフォリオにも関連付けられていない場合、タスクは無効なトップポートフォリオを持つと見なされます。
トッププログラムが無効なタスク	無効なトッププログラムを持つタスクをリストします。タスクが同じポートフォリオ内の別のプログラムに属しているか、またはどのプログラムにも関連付けられていない場合、タスクは無効なトッププログラムを持つと見なされます。
無効な関係	プロジェクト内の無効な関係をリストします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト診断のデフォルトスキャン (続く)

診断スキャン名	説明
	先行タスクまたは後続タスクがプロジェクトの一部でない場合 (外部関係である場合を除く)、または先行タスクまたは後続タスクのレコードがシステムに存在しない場合、関係は無効と見なされます。
親タスクの検証	親が空または無効なタスクをリストします。
循環依存関係を持つタスクの確認	プロジェクト内で許可されていない循環関係を確認します。たとえば、タスク A がタスク B に関連しているプロジェクトがあるとします。タスク B からタスク A への逆の関係は、循環依存関係と見なされます。
プロジェクトの再計算	プロジェクトのタスク日付を再計算します。 ⚠ 警告: このアクションを実行すると、プロジェクトの日付が変更される可能性があります。
重複/冗長関係の確認	選択したプロジェクトで重複または冗長な関係を持つタスクをリストします。
会計期間の開始と終了がないコスト計画	選択したプロジェクト内で会計期間の開始と終了がないコスト計画を確認してリストします。
プロジェクトのプロジェクトタスク制約の検証	無効な制約タイプを持つすべてのタスクをリストします。たとえば、[以下以前に開始] が親として設定されているタスクや、[以下以降に開始] および [以下以前に開始] 制約があるタスクの [制約日] フィールドが空である場合などです。
無効なステータスのタスクの検証	実際の日付に基づいて、無効な WIP またはクローズ済みステータスのすべてのタスクをリストします。
対応する会計期間に予算が割り当てられていない年の計画コストがマイナスのプロジェクトを特定する	会計年度のプロジェクト予算がマイナスのプロジェクトをチェックして一覧表示します。
プロジェクト予算の不一致を特定する	プロジェクト資金がタスクタイプのブレークダウンコストまたは会計年度のプロジェクト予算の合計と一致しないプロジェクトをチェックして一覧表示します。
無効な会計期間があるコスト計画のブレークダウンを特定する	無効会計期間があるコスト計画ブレークダウンをチェックして一覧表示します。
経費タイプと会計期間の重複するタスクタイプブレークダウンを特定する	重複するタスクタイプブレークダウンをチェックして一覧表示します。
孤立経費ラインをシステム生成コスト計画に関連付ける	コスト計画に関連付けられていない経費ラインを一覧表示します。修正スクリプトを実行すると、これらの孤立経費ラインがシステム生成コスト計画に関連付けられ、次にシステム生成コスト計画のそれぞれのブレークダウンに関連付けられます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト診断を使用した破損したプロジェクトデータの検出

プロジェクト診断では、アプリケーション診断ツールを使用して、無効な親を持つタスク、トップタスクのないタスク、プロジェクト内の無効な関係や循環関係などの、プロジェクト内の破損データを検出します。

始める前に
必要なロール：it_pps_admin

このタスクについて
プロジェクト診断では、プロジェクトの日付計算が正しくない可能性がないか、プロジェクトの計画立案コンソールが開かないことがないか、または計画立案コンソールにいくつかのタスクまたは関係が表示されないことがないかを検出することもできます。

手順

1. 診断スキャンを単一のプロジェクトで実行するか、複数のプロジェクトで実行するかを決定します。
2. [アプリケーション診断ツール] ページで、診断機能を選択します。
3. [機能入力] の各フィールドを使用してフィルター条件を指定します。
4. [診断] セクションから、フィルター基準に一致するプロジェクトに対して単一の診断スキャンまたは複数のスキャンを実行します。
5. スキャンの結果を表示します。

次のタスク
独自の診断スキャンを追加し、スクリプトを修正します。

診断機能の作成および追加

マップされたスクリプトを実行してデータの破損や無効なデータを検出する単一または複数の診断スキャンで構成される診断機能を作成して追加します。

始める前に
必要なロール：adt_admin

手順

1. 移動先 すべて > アプリケーション診断ツール > 機能.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。
   詳細については、「診断機能フォーム」を参照してください。
4. [診断入力] セクションで、フィルター条件を指定するためにユーザーが利用できるフィールドを定義します。

   [診断入力] セクションで構成したフィールドは、[アプリケーション診断ツール] ページの [機能の入力] セクションに表示されます。
5. **[Submit** (送信)] を選択します。

次のタスク
診断スクリプトを作成し、診断機能で使用する修正スクリプトを追加します。詳細については、「診断スクリプトおよび修正スクリプトの追加」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

診断スクリプトおよび修正スクリプトの追加

診断スクリプトを追加して、アプリケーションのデータに破損がないかどうかをスキャンします。修復スクリプトを添付して、診断スクリプトによって特定された破損または無効なデータを修正することもできます。

始める前に
必要なロール：adt_admin

このタスクについて
診断機能で指定したフィルター条件の結果は、実行時に診断スクリプトの入力として使用されます。1 つのスクリプトの結果を後続のスクリプトで使用することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > アプリケーション診断ツール > スクリプト.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。
   詳細については、「診断スクリプトフォーム」を参照してください。
4. オプション: 診断スクリプトによって特定された破損または無効なデータを修正するためのスクリプトを含めます。
   a. [修正スクリプトあり] チェックボックスをオンにします。
   b. ユーザーロールの編集アイコン ( ) を選択し、診断スクリプトにアクセスできるロールを選択します。
   c. [修正スクリプト] セクションで、修正スクリプトのコードを追加します。
5. **[Submit** (送信)] を選択します。

関連情報
プロジェクト診断

診断スキャンの作成および関連スクリプトのマップ

診断機能と診断スクリプトを作成したら、それらのスクリプトを診断スキャンにマップして、アプリケーションのデータの健全性を確認します。修正スクリプトを使用して、診断スキャンで特定された破損または無効なデータを修正します。

始める前に
診断スキャンを作成するには、診断機能と診断スクリプトを作成しておく必要があります。詳細については、「診断機能の作成および追加」および「診断スクリプトおよび修正スクリプトの追加」を参照してください。

必要なロール：adt_admin

このタスクについて
診断スキャンごとに複数のスクリプトをマッピングし、実行順序を定義できます。

手順

1. 移動先 すべて > アプリケーション診断ツール > 診断.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。
   詳細については、「[診断] フォーム」を参照してください。
4. ロールアイコン ( ) を選択し、目的のロールを [選択済み] リストに移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

選択したロールを持つユーザーは、診断スクリプトにアクセスできます。

5. [診断とスクリプトのマッピング] セクションで、診断スキャンにマッピングする診断スクリプトを検索して選択します。
6. **[Submit** (送信)] を選択します。

次のタスク

- アプリケーションの診断機能と診断スキャンに移動するための関連リンクを作成します。詳細については、「UI アクションの作成」を参照してください。
- 診断スキャンを実行し、結果を表示します。診断スキャンの仕組みの例については、「プロジェクト診断を使用した破損したプロジェクトデータの検出」を参照してください。

関連情報

[診断] フォーム

作業ブレークダウン構成 **(WBS)** の使用 - 従来

作業ブレークダウン構成 (WBS) は、プロジェクト内のすべてのタスクを階層的に表したものです。

重要:

作業ブレークダウン構成 (WBS) は、将来の廃止に向けて準備中です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

WBS を使用すると、プロジェクトにネストされたタスクやサブタスクを含む、プロジェクト全体の簡単な概要を把握できます。ガントビューは、タスクの依存関係や長さを示すラインやバーなどのグラフィカル要素を使用して、同様の概要を提供します。WBS はよりデータ駆動型であり、広範なタスク情報を展開可能な行に表示します。

WBS は、計画立案コンソールで表示するか、プロジェクトフォームまたはプロジェクトタスクフォームの関連リストとして表示できます。「プロジェクト計画立案コンソールを開く」または「関連リストとしての WBS へのアクセス」を参照してください。

WBS をプロジェクトフォームまたはプロジェクトタスクフォームの関連リストとして表示すると、テーブルのいくつかの重要な列がデフォルトで表示されます。

重要な列

列名	説明
WBS	WBS 階層内のタスクの番号。階層の最初のタスクには番号 1 が割り当てられます。サブタスクは、1.1 や 1.2 のように、小数第 1 位の番号がインクリメントされます。番号は読み取り専用です。
WBS 順序	親との関連でタスクを表す番号。タスクの下にある最初のサブタスクの WBS 順序は 1 で、次のタスクは 2 です。番号を編集すると、リストを更新した後に、それに応じてすべてのタスクが移動されます。
番号	タスク ID 番号。変更できません。

説明や完了率など、その他の有用な情報もデフォルトで表示されます。リストを他のリストと同じようにカスタマイズするには、[リストをカスタマイズ] アイコン ( ) を選択し、表示する列を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

関連リストとしての WBS へのアクセス

関連リストとしての **WBS** へのアクセス

WBS は、プロジェクトフォームとプロジェクトタスクフォームのいずれの関連リストとしても表示できます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager


このタスクについて
WBS の完全なリストを表示するには、プロジェクトフォームに移動し、[計画立案コンソール] 関連リンクを選択します。計画立案コンソールで WBS を使用して実行できる操作のリストについては、「計画立案コンソールのタスク」を参照してください。

WBS は、プロジェクトフォームまたはプロジェクトタスクフォームの関連リストとして表示することもできます。

手順

1. プロジェクトフォームまたはプロジェクトタスクフォームに移動します。
2. ヘッダーを右クリックし、[表示] > **[WBS]** を選択します。
   WBS リストが関連リストとして表示されます。
3. WBS で、矢印アイコン ( ) を選択してタスクを展開し、子タスクを表示します。

デモプロジェクト **WBS**



関連情報

作業ブレークダウン構成 (WBS) の使用 - 従来

プロジェクトワークベンチの使用 - 従来

プロジェクトワークベンチは、プロジェクトを作成および管理するための一元的な場所を提供します。

> **重要:**
>
> プロジェクトワークベンチは将来の廃止に向けて準備中です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

ワークベンチは、プロジェクト管理 (PM)およびアプリケーションのライフサイクル管理アプリケーションをサポートしているため、ハイブリッドアプローチによるプロジェクト管理が可能です。プロジェクトマネージャーは、ウォーターフォールとアジャイルの両方の手法を組み合わせたプロジェクトを作成し、これらのプロジェクトにウォーターフォール、アジャイル、およびテストのフェーズを追加できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトワークベンチでは、プロジェクト情報が 2 つのペインに表示されるため、プロジェクトを簡単に管理できます。上部ペインには、プロジェクトフェーズとマイルストーンを含むタイムラインが表示されます。下部ペインには、タイムラインで選択されたフェーズの詳細が表示されます。プロジェクトワークベンチは、タイムライン、リストビュー、およびビジュアルタスクボード間のリアルタイムインタラクションを実現します。

プロジェクトワークベンチは、次の機能もサポートしています。

- プロジェクトテンプレート：プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの基本構造を定義するテンプレートに基づいて、プロジェクトを迅速かつ簡単に作成できます。
- 手動によるプロジェクト計算：ワークベンチでは、手動計算を使用するプロジェクトを作成する機能が追加されます。プロジェクトマネージャーは、プロジェクト管理 (PM)アプリケーションから自動計算されるプロジェクトを作成することもできます。
- 複合フィールド：このフィールドタイプは、テーブル内の 2 つのフィールドからの情報を組み合わせて単一のフィールドを形成します。

プロジェクトマネージャーロールでは、プロジェクトワークベンチを使用して次のことができます。


- プロジェクトを管理します。
- プロジェクトフェーズとマイルストーンを作成および更新します。
- プロジェクトタスク、ストーリー、およびテストケースを作成および更新します。
- テスト計画をテストフェーズに添付します。
- リストビューまたはビジュアルタスクボードからプロジェクトの詳細を表示および管理します。

プロジェクトワークベンチでは、プロジェクト情報が 2 つの異なる領域に表示されます。上部ペインにはプロジェクトがビジュアル化して表示され、下部ペインにはフェーズの詳細がリストビューまたはビジュアルタスクボードに表示されます。ワークベンチの上には、いくつかのボタンとコントロールを含むヘッダーもあります。

プロジェクトワークベンチは、使用可能なブラウザの高さに合わせて拡大縮小されます。必要に応じて、ワークベンチの詳細を表示するスクロールバーが追加されます。

自動翻訳

プロジェクトワークベンチ

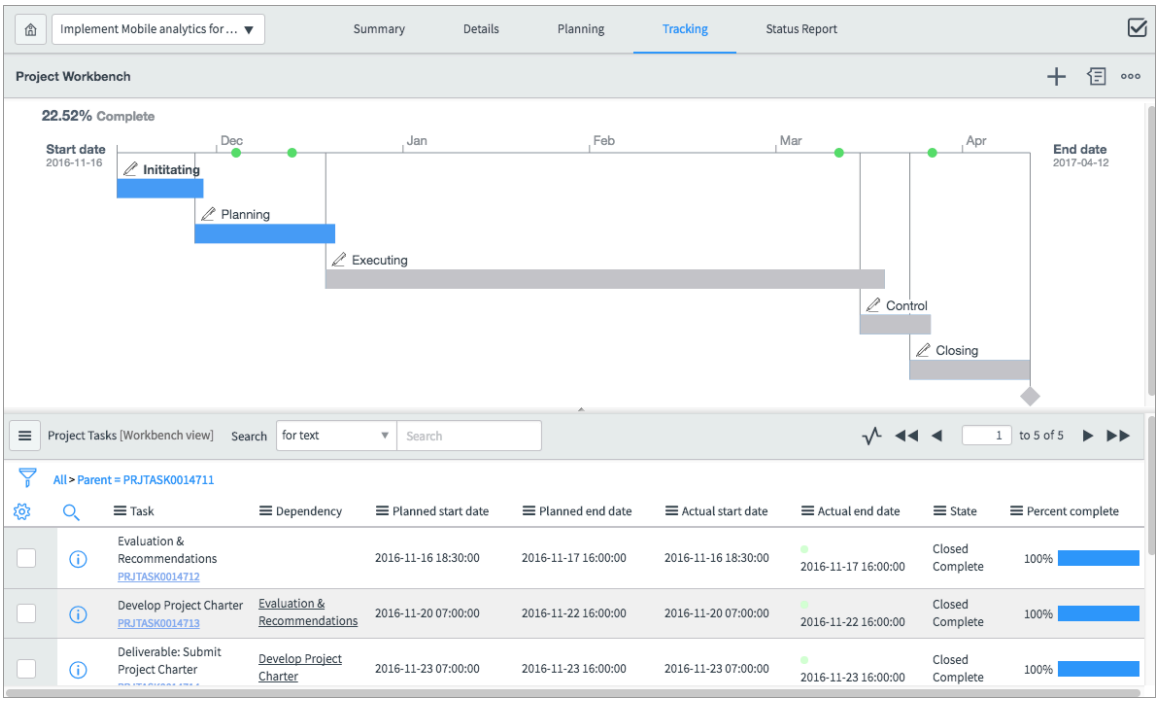

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトワークベンチへのアクセス

プロジェクトワークベンチには、プロジェクトフォームまたはアプリケーションナビゲーターからアクセスします。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

手順

プロジェクトワークベンチには、次のいずれかの方法でアクセスします。

注:
sys_id が関連付けられていないか、または不正な sys_id でプロジェクトワークベンチが開くと、エラーメッセージが表示されます。プロジェクトワークスペースバナーのプロジェクト選択リストからプロジェクトを選択します。

関連情報

プロジェクトワークベンチの使用 - 従来

プロジェクトワークベンチのコンポーネント

プロジェクトワークベンチでは、プロジェクト情報が 2 つの異なる領域に表示されます。上部ペインにはプロジェクトがビジュアル化して表示され、下部ペインにはフェーズの詳細がリストビューまたはビジュアルタスクボードに表示されます。ワークベンチの上には、いくつかのボタンとコントロールを含むヘッダーもあります。

プロジェクトワークベンチは、使用可能なブラウザの高さに合わせて拡大縮小されます。必要に応じて、ワークベンチの詳細を表示するスクロールバーが追加されます。

ヘッダー

ヘッダーは、プロジェクトワークベンチの上部を横断する灰色のバーです。

ユーザーが [プロジェクト] メニューからプロジェクトワークベンチに初めてアクセスすると、ヘッダーに次のコンポーネントが表示されます。

プロジェクトを開くと、選択したプロジェクトのタイプに応じて、ヘッダーに追加のコンポーネントが表示されます。

- 戻る ( ) : プロジェクトフォームに移動して、プロジェクトの詳細を表示します。
- プロジェクトを選択：現在のプロジェクト名が表示されます。下向き矢印をクリックして、新しいプロジェクトを選択します。
- フェーズを追加アイコン ( ) : フェーズまたはマイルストーンをタイムラインに追加します。
- テンプレートを適用：開始日の設定およびプロジェクトへのテンプレートの追加を行うためのダイアログボックスが開きます。このボタンは、新規またはフェーズのない空のプロジェクトに表示されます。
- ストーリーを管理：オプションアイコン ( ) の下に、このプロジェクトのストーリーバックログが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- リスト：オプションアイコン (⁰⁰⁰) の下に、現在選択されているフェーズに関する追加の詳細がリストビューに表示されます。このボタンは、プロジェクトに 1 つ以上のフェーズがある場合に表示されます。
- **VTB**：オプションアイコン (⁰⁰⁰) の下に、現在選択されているフェーズに関する追加の詳細がビジュアルタスクボードに表示されます。このボタンは、プロジェクトに 1 つ以上のフェーズがある場合に表示されます。

タイムライン

プロジェクトワークベンチの上部ペインには、プロジェクトのタイムラインが表示されます。タイムラインは、月次または四半期ごとのマーカーを使用して時間を表します。プロジェクトの期間が 500 日未満の場合、これらのマーカーは月を表し、期間が 500 日を超える場合、これらのマーカーは四半期を表します。

プロジェクトタイムラインには、次のプロジェクト情報が表示されます。

- プロジェクト名：プロジェクトにアサインされた名前。プロジェクト名をポイントすると、このプロジェクトで使用されるプロジェクト日付の計算方法に関するメッセージが表示されます。
- 完了率：完了したプロジェクトの割合。このパーセンテージは、個々のフェーズの期間と完了率に基づいています。
- プロジェクトの開始日と終了日：このプロジェクトの [開始予定日] フィールドと [終了予定日] フィールドで指定された日付。
- プロジェクトフェーズ：プロジェクトの各種フェーズを表す色付きのバー。
- マイルストーン：プロジェクトライフサイクルの重要な日付を表す、タイムライン上の色付きの動的な円。

タイムラインのフェーズ

プロジェクトフェーズは、タイムラインに水平バーで表されます。バーは、フェーズの開始日を示す細い縦線でタイムラインにつながっています。フェーズの名前が水平バーのすぐ上に表示されます。プロジェクトフェーズは、開始日、フェーズ、および一番上に表示される最も早い開始日でタイムラインに積み重ねられます。タイムラインに収まらないフェーズがある場合は、右側にスクロールバーが表示されます。

水平バーの色は、フェーズの完了率を反映して段階的に変化します。完了率は、次のフェーズタイプに基づいて計算されます。

- ウォーターフォール：プロジェクトタスクが含まれます。完了率は、完了したプロジェクトタスクの数に基づきます。
- アジャイル：ストーリーが含まれます。完了率は、完了したストーリーポイントの数に基づきます。
- テスト：テストケースが含まれます。完了率は、完了したテストケースの数に基づきます。

利用可能なフェーズは、プロジェクト管理 (PM)のインストール方法によって異なります。プロジェクト管理 (PM)がスタンドアロンアプリとしてインストールされている場合、プロジェクトマネージャーは、ウォーターフォールフェーズタイプの作成と編集のみを行うことができます。プロジェクト管理 (PM)が プロジェクトポートフォリオ管理 (PPS) の一部としてインストールされている場合、プロジェクトマネージャーは、すべてのフェーズタイプ (ウォーターフォール、アジャイル、およびテスト) を作成および編集できます。

フェーズをポイントすると、カーソルが矢印から手に変わり、ポップアップウィンドウにフェーズ名および開始日と終了日が表示されます。タイムラインのフェーズをクリックすると、対応するタスク情報がプロジェクトワークベンチの下部ペインに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムラインのマイルストーン

マイルストーンはプロジェクトの重要な日付を示し、タイムラインに沿って色付きの円で表されます。マイルストーンに使用できる色は、緑色、黄色、および赤色の 3 つです。プロジェクトマネージャーが、色の使用方法を決定します。

マイルストーンをポイントすると、カーソルが矢印から手に変わり、簡単な説明と開始予定日を示すポップアップウィンドウが表示されます。

マイルストーンを選択して、マイルストーン情報を更新します。タイムラインに沿ってマイルストーンをドラッグして日付を変更することもできます。マイルストーンは、タイムライン上のプロジェクトの開始日と終了日の境界内の、任意のポイントにドラッグできます。

詳細ビュー

プロジェクトワークベンチの下部ペインには、タイムラインで現在選択されているフェーズの詳細情報が表示されます。表示される情報は、選択されているフェーズタイプによって異なります。

- ウォーターフォール：フェーズに関連付けられたプロジェクトタスクを表示します。
- アジャイル：フェーズにアサインされたストーリーを表示します。
- テスト：テストフェーズのテストケースを表示します。

下部ペインの情報は、リストビューまたはビジュアルタスクボードに表示できます。プロジェクトワークベンチのヘッダーの [リスト] ボタンと **[VTB]** ボタンは、この情報の表示方法を制御します。

プロジェクト計算

プロジェクトの作成時、プロジェクトマネージャーは使用する計算のタイプとして、手動または自動 (デフォルト) を選択できます。

プロジェクトワークベンチには、現在のプロジェクトが自動で計算されるか手動で計算されるかを説明するヘルプテキストが表示されます。ヘルプテキストは、プロジェクトワークベンチページがロードされたとき、またユーザーが左上隅のプロジェクト名をポイントしたときにも表示されます。

手動計算の場合：

- タスクの日付には、依存タスクの変更が自動的に反映されません。
- プロジェクトワークベンチから作成された新規プロジェクトおよびデマンドから作成されたプロジェクトは、デフォルトで手動計算に設定されています。手動として作成されたプロジェクトは、自動に変更できます。
- プロジェクトのタイムラインには、プロジェクトタスクに基づく最も早い開始予定日と最も遅い終了予定日が反映されます。
- 制約タイプは変更できません。
- プロジェクトタスクでは、[特定の日に開始] 制約タイプのみが許可されます。

自動計算の場合：

- 依存タスクおよび子タスクの変更がタスクに自動的に反映されます。
- プロジェクト管理 (PM)アプリケーションから作成された新規プロジェクトは、デフォルトで自動計算に設定されています。

注:

- 1 つ以上のタスクが自動として作成されているプロジェクトは、手動に変換できません。
- フェーズの完了率とステータスは、手動計算と自動計算の両方で自動的に更新されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

プロジェクトワークベンチの使用 - 従来

プロジェクトワークベンチの管理

プロジェクトワークベンチを使用すると、プロジェクトマネージャーはプロジェクトのあらゆる要素を管理できます。

プロジェクトワークベンチでプロジェクトを開く

プロジェクトマネージャーは、既存のプロジェクトをプロジェクトワークベンチで開くことができます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. プロジェクトワークベンチのヘッダーの上にあるプロジェクトワークスペースバナーで、プロジェクトセレクターボックスの下矢印を選択します。
2. 選択リストからプロジェクトを選択します。
   選択したプロジェクトが、プロジェクトワークスペースの [計画] タブの下のプロジェクトワークベンチで開きます。

関連情報

プロジェクトワークベンチでのプロジェクトタスクの作成

プロジェクトワークベンチでのプロジェクトタスクの作成

ウォーターフォールフェーズのプロジェクトタスクを作成します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
プロジェクトワークベンチでプロジェクトタスクを作成する際、時間制約タイプはプロジェクトタイプに基づいてデフォルト設定されます。

- 手動プロジェクトの場合、デフォルトの制約は [開始日時 (Start On)] であり、変更することはできません。
- 自動プロジェクトの場合、デフォルトの制約は [すぐに開始] で、必要に応じて [開始日時 (Start On)] に変更できます。
- 制約が [すぐに開始] の場合、 [開始予定日] は無効になります。
- アジャイルフェーズを作成してスプリントを関連付けると、タスクの開始日がスプリントの開始日から設定され、制約が自動的に [開始日時 (Start On)] になります。

手順

1. プロジェクトワークベンチのタイムラインでウォーターフォールフェーズを選択します。
2. 詳細ビューで 新規 を選択します。
3. プロジェクトタスクフォームに入力します。
4. **[Submit** (送信)] を選択します。

関連情報

プロジェクトワークベンチの管理

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトワークベンチでのプロジェクトストーリーの管理

プロジェクトポートフォリオ管理 と アジャイル開発 2.0 が有効になっている場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトワークベンチから、プロジェクトのストーリーを管理できます。

始める前に
プロジェクトポートフォリオ管理 プラグインと アジャイル開発 2.0 プラグインを有効にします。

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
プロジェクトワークベンチの [ストーリーを管理] オプションを使用して、プロジェクトのストーリーを管理します。

手順

1. プロジェクトワークベンチのヘッダーで、オプションアイコン ( ) を選択し、「 ストーリーを管理」を選択します。
   アジャイルボードの [バックログ] セクションが新しいタブで開きます。
2. ストーリーを選択してポップアップウィンドウでストーリーフォームを開くか、[新規] を選択して新しいストーリーを作成します。
3. ストーリーフォームのフィールドに入力します。
4. [更新] または [送信] を選択します。

関連情報
プロジェクトワークベンチの管理

プロジェクトワークベンチでのストーリーの作成

アジャイルフェーズのストーリーを作成します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. プロジェクトワークベンチのタイムラインでアジャイルフェーズを選択します。
2. 詳細ビューで 新規 を選択します。
3. ストーリーフォームに記入します。
4. **[Submit** (送信)] を選択します。

関連情報
プロジェクトワークベンチの管理

プロジェクトワークベンチでのテストケースの作成

テスト計画を指定することは、テストフェーズの作成時には任意です。ただし、テストケースをテストフェーズに追加する前に、テスト計画を指定する必要があります。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. プロジェクトワークベンチのタイムラインでテストフェーズを選択します。
2. 詳細ビューで 新規 を選択します。
3. テストケースフォームに入力します。
4. **[Submit** (送信)] を選択します。

関連情報

プロジェクトワークベンチの管理

計画立案コンソールの使用 - 従来

計画立案コンソールは、 プロジェクト管理 (PM)アプリケーションのための一元的なインターフェイスです。

> **重要:**
>
> 計画立案コンソールは将来の廃止に向けて準備中です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。


計画立案コンソールを使用すると、プロジェクトマネージャーはプロジェクトのすべての要素を包括的に把握できます。これには、サブプロジェクトの階層リスト (存在する場合)、作業ブレークダウン構成 (WBS) リストに表示されるプロジェクトタスク、およびプロジェクトガントチャートが含まれます。またコンソールはライブフィードと統合されているため、ユーザーはプロジェクトで共同作業を行うことができます。

計画立案コンソールのセクション

計画立案コンソールは、次のセクションに分かれています。

- プロジェクトの計画立案コンソールを開いた場合のプロジェクトタスクのリスト。
- ガントチャート。
- コンソールでタスクを実行するためのバナーアイコンとリスト。

計画立案コンソールの例

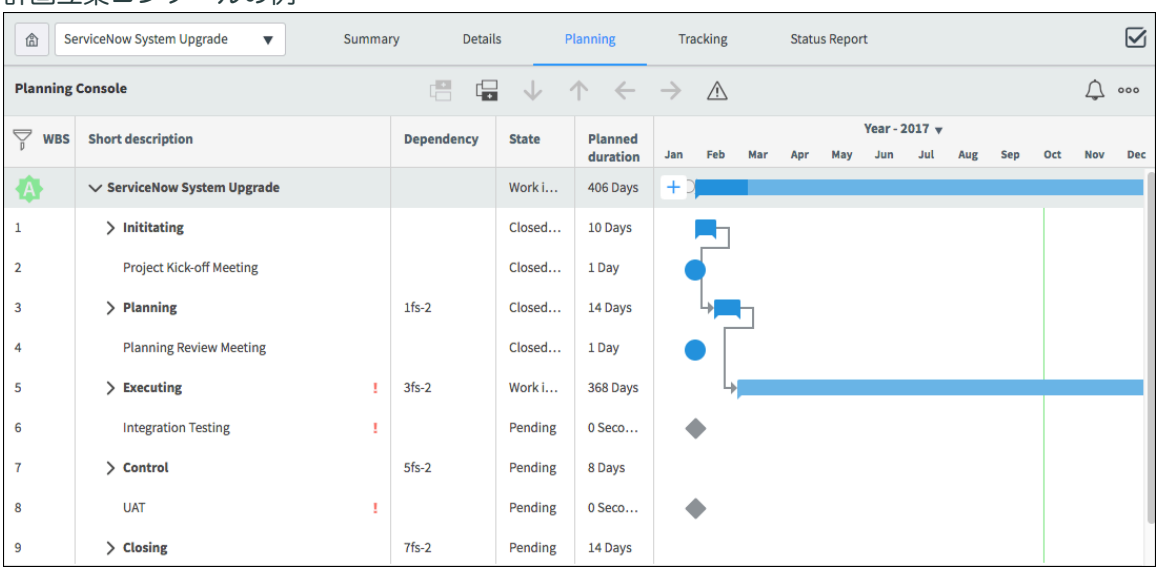

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ガントチャート、およびビルドできるタスクの関係と依存関係の詳細については、「ガントチャート」および「親子ロールアップタスクの計算」を参照してください。

> **注:**
> 計画立案コンソールの [アサイン先] 列のリソースは、プロジェクトまたはそのタスクに関連付けられた割り当て済みのリソース計画からのみ導出されるように制限できます。

ビジネスルール

デフォルトでは、ビジネスルールは計画立案コンソールでの操作中にトリガーされません。ビジネスルールは、[*Enable firing of Business Rules*] プロパティを使用して有効にできます。

> **注:**
> このプロパティを有効にするには、[クライアント側での計画立案を有効化] チェックボックスをオフにする必要があります。

[保存時に **BR** を開始] フィールドを使用して計画立案コンソールの列を定義するときに、ビジネスルールを有効にすることもできます。

クライアント側の計画立案コンソール

計画立案コンソールでの各インタラクションの詳細をサーバーに保存することなく、クライアント側でプロジェクト構造を迅速にビルドします。クライアント側の計画立案コンソールを有効にすると、計画立案コンソールでアクションを実行した後に発生するタイムラグが防止され、スケジューリングのパフォーマンスが向上します。

自動プロジェクトと手動プロジェクト

自動プロジェクトでは、プロジェクトタスクの日付、期間、または関係を変更すると、必要に応じて、プロジェクトレコードを含むプロジェクト全体のすべてのタスクが自動的に更新されます。自動プロジェクトアイコン ( ) がプロジェクト名の横に表示されます。

手動プロジェクトでは、プロジェクトタスクの日付、期間、または関係を変更しても、すべてのタスクが自動的に更新されるわけではありません。したがって、親タスクの日付には、依存タスクまたは子タスクに加えられた変更は反映されません。自動的に行われる唯一の変更は、タスクの日付または期間の変更によりプロジェクトレコードの日付と期間が更新される場合です。手動プロジェクトでは、実開始日が更新されても、プロジェクトまたはプロジェクトタスクの終了予定日は更新されません。ただし、プロジェクトプロパティの [予定日の手動プロジェクトの実績での変更を有効にする **(Enable alter of planned date with Actual for Manual Project)]** を有効にすると、実開始日および計画期間から終了予定日が更新されます。手動プロジェクトアイコン ( ) がプロジェクト名の横に表示されます。

プロジェクトが自動か手動かは、プロジェクトフォームの [計算] フィールドで指定できます。このフィールドは、プロジェクトの開始時に読み取り専用になります。

チュートリアル

チュートリアルウォークスルーをコンソールで利用できます。コンソールのすべての機能とその使用方法が示されます。ヘルプアイコン ( ) 内のウォークスルーにアクセスします。

プロジェクト計画立案コンソールを開く

計画立案コンソールにアクセスして、プロジェクトの計画立案を行います。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳


手順

次のいずれかの方法を使用して、計画立案コンソールを開きます。

計画立案コンソールのタスク

プロジェクトタスクの作成やプロジェクトのコピーなど、リストやフォームで実行できる複数のタスクを計画立案コンソールで実行できます。コンソールに固有のいくつかのタスクも実行できます。

コンソールの全般設定タスク

タスク	ステップ
計画立案コンソールでプロジェクトを表示	プロジェクトワークスペースバナーのリストからプロジェクトを選択します。 プロジェクトリスト 

WBS 階層タスク

タスク	ステップ
プロジェクトタスクを作成する	行の [タスクを以下に追加] アイコン ([ ) を選択して、新しいタスクを作成します。 また、既存のタスクを選択して新しいタスクの挿入ポイントを決定し、タスクを上に追加アイコン (タスク) またはタスクを以下に追加アイコン ( ) を選択することもできます。
階層内でタスクを上下に移動	既存のタスクを選択し、上に移動アイコン または下に移動アイコン (下) を選択します。
階層内のタスクをインデントまたはインデント解除	既存のタスクを選択し、インデント解除 (イン またはインデント (アイコンを選択します。
タスクレコードを編集	タスクを右クリックして、[編集] を選択します。プロジェクトタスクフォームがオーバーレイに表示されます。計画立案コンソールのいずれかの列のフィールドを直接編集することもできます。プロジェクトワークベンチのフェーズを表すプロジェクトタスクを編集することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WBS 階層タスク (続く)

タスク	ステップ
[ステータス] フィールドを編集	[ステータス] 列の値をダブルクリックして、新しいステータスを選択します。タスクの完了率 (%) が変更されると、[ステータス] フィールドの値も自動的に変更されます。
タスクステータスを表示および変更	タスクの終了予定日と現在の日付の差に基づいて、プロジェクトタスクのステータスを表示します。終了予定日が近づくと、タスクのステータスが緑色から黄色、赤色に自動的に更新されます。 [ステータス] 列をダブルクリックして別のタスクステータスを選択すると、タスクのステータスを手動で更新できます。詳細については、「プロジェクトからのプロジェクトタスクの作成」トピックの [ステータス] フィールドの説明を参照してください。
アジャイルフェーズまたはテストフェーズを追加	プロジェクトを右クリックし、[アジャイルフェーズの追加] または [テストフェーズの追加] を選択します。アジャイルフェーズアイコンまたはテストフェーズアイコンは、[名前] 列のタスクの横に表示されます。「フェーズアイコン」を参照してください。 **注:** • [アジャイルフェーズの追加] オプションは、アジャイルおよびハイブリッドプロジェクトでのみ使用できます。アジャイル開発 2.0 プラグインもインストールしておく必要があります。 • 複数のアジャイルフェーズと複数のテストフェーズをプロジェクトに追加できます。 • プロジェクトのテスト計画に追加できるテストフェーズは 1 つだけです。[テストフェーズの追加] オプションを表示するには、テスト管理 プラグインがインストールされている必要があります。 • アジャイルフェーズは、プロジェクト内のアサイン先グループの別のアジャイルフェーズと重複することはできません。 • ストーリーの作成中に、プロジェクトにフェーズが 1 つしかない場合、ストーリーはフェーズにタグ付けされます。
テスト計画またはストーリーを開く	タスク (ワークベンチのフェーズを表すタスク) を右クリックし、 [テスト計画の管理] を選択します。[ストーリーを表示] を

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WBS 階層タスク (続く)

タスク	ステップ
	選択して、ストーリーリストを表示します。scrum_product_owner ロールを持っている場合は、[ストーリーを表示] を選択して、[アジャイルボード] の [バックログ] タブに移動します。 **注:** [ストーリーを表示] オプションは、アジャイルおよびハイブリッドプロジェクトでのみ使用できます。アジャイル開発 2.0 プラグインもインストールしておく必要があります。
クローズ済みプロジェクトのリソース計画をキャンセル	プロジェクトを右クリックし、[リソース計画をキャンセル] を選択します。選択したリソース計画に対する過去および将来のすべての割り当てがキャンセルされます。 このオプションは、いずれかのクローズ済み状況のプロジェクトでのみ使用できます。
クローズ済みプロジェクトのリソース計画を完了	プロジェクトを右クリックし、[リソース計画を完了] を選択します。完了日以降のリソース計画のすべての要求された割り当てとリソース割り当てが削除されます。 リソース計画を完了するオプションは、いずれかのクローズ済み状況のプロジェクトでのみ使用できます。
異なるプロジェクトのタスク間に外部依存関係を追加	タスクを右クリックし、[外部依存関係を追加] を選択します。依存関係を追加するプロジェクトとタスクを選択します。
外部依存関係のプロジェクト名を表示	外部依存関係タスクの横にあるリンクアイコン (🔗) をポイントすると、外部依存関係が追加されるプロジェクトの名前を示すツールヒントが表示されます。
タスクの時間の制約を変更する	[制約タイプ] 列の下のタスクをダブルクリックし、[すぐに開始]、[特定の日に開始]、[以下以降に開始]、または [以下以前に開始] のオプションを選択します。 • 自動プロジェクトについてのみ [制約タイプ] を変更できます。 • タスクの時間制約を [特定の日に開始] から [すぐに開始] に、またはその逆に変更すると、タスクの開始予定日と終了予定日がそれに応じて再計算されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WBS 階層タスク (続く)

タスク	ステップ
	• [制約日] 列には、 [すぐに開始] タスク以外のすべての制約タイプの開始日が表示されます。この列はデフォルトでは使用できません。[構成] メニューからこの列を計画立案コンソールに追加する必要があります。 • このオプションは、親タスクでは使用できません。タスクに子タスクがある場合、このオプションは子タスクでのみ使用できます。 • [以下以前に開始] または [特定の日に開始] の時間制約で親タスクを作成することはできません。これらの時間制約のあるタスクに新しい子タスクが追加されると、親タスクの時間制約が [すぐに開始]に変換されます。 • [計算] タイプが [手動] に設定されているプロジェクトの制約タイプは変更できません。
スケジュール外のタスク日付を許可	プロジェクトタスクを右クリックし、 [スケジュール外を許可]を選択します。選択したタスクは、週末などのスケジュール外の日 (通常のプロジェクトスケジュール外) に開始および終了することができます。[簡単な説明] 列のタスクの横に、スケジュール外のタスクアイコン ( ) が表示されます。 たとえば、「月曜日から金曜日の 8:00 ～ 17:00」のプロジェクトスケジュールを使用し、期間 2 日間のプロジェクトタスクを土曜日に開始する必要がある場合、オフスケジュールタスクを土曜日にスケジュールし、日曜日に終了することができます。同様に、期間 3 日間のタスクを金曜日に開始した場合、オフスケジュールは火曜日ではなく、日曜日に終了します。 • このオプションは、親タスクでは使用できません。タスクをスケジュール外にすると、その親もスケジュール外になります。プロジェクトは、いずれかの子がスケジュール外に設定されている場合も、スケジュール外として動作します。 • タスクでスケジュール外が許可されると、そのタスクに対して [スケジュールに従う] オプションが使用可能になります。タスクを右クリックし、[スケジュールに従う] を選択して、タスクのスケジュールに従います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


WBS 階層タスク (続く)

タスク	ステップ
	注: • プロジェクトレベルで定義されているスケジュールがない場合、オフスケジュールタスクとオンスケジュールタスクの間に違いはありません。 • 通常スケジュールのタスクでは 1 日は 8 時間で、スケジュール外タスクでは 24 時間です。
タスクをマイルストーンに変換	タスクを右クリックし、[マイルストーンに変換] を選択します。 • タスクをマイルストーンに変換できるのは、[対応中] ステータスになっていない間のみです。対応中になると、タスクでこのオプションはグレー表示されます。 • このオプションは、親タスクでは使用できません。タスクに子タスクがある場合、このオプションは子タスクでのみ使用できます。
外部依存関係を表示または非表示	その他のオプションアイコン (···) を選択し、外部依存関係の非表示 スイッチを選択します。 このオプションを有効にすると、2 つのプロジェクト間に外部依存関係を追加しても、外部依存関係は表示されません。ただし、後続プロジェクトの [WBS] セクションの [依存関係] 列には、外部依存関係の値がそのまま表示されます。
外部依存関係の通知を表示	通知ベルアイコン 後続プロジェクトで発生した通知を表示します。通知は、先行プロジェクトで行われた変更の結果としてトリガーされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


WBS 階層タスク (続く)

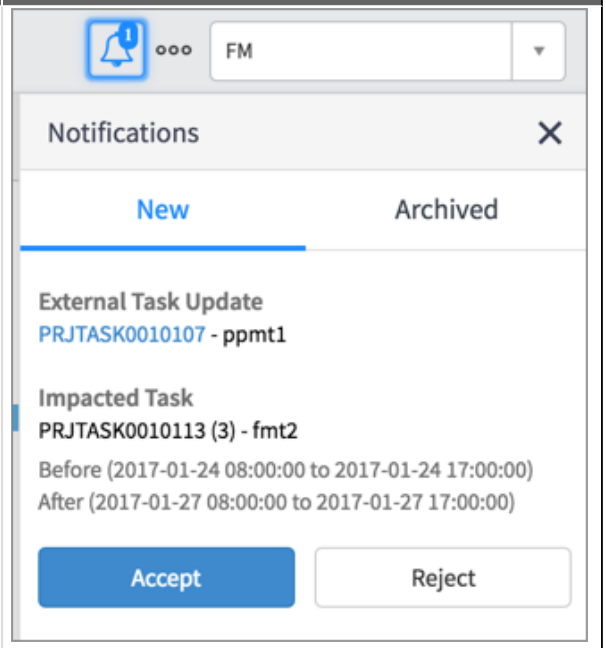タスク	ステップ
	 • ソフト依存関係の場合は、[承認] または [却下] を選択して、通知の変更を承認または却下します。 • ハード依存関係の場合は、表示された通知を確認して、通知の変更をレビューします。
変更をサーバーに保存	保存アイコン 計画立案コンソールで行った変更をコミットします。このオプションは、クライアント側の計画立案コンソールが有効になっている場合にのみ使用できます。
列幅を拡大または縮小	列の側面を選択し、右または左にドラッグします。
計画立案コンソールで列を表示または非表示にする	ガントで列を表示または非表示アイコン (ガン を選択し、使用可能な列のチェックボックスをオンまたはオフにします。アドミニストレーターは、このリストに表示する列をカスタマイズできます。選択内容はユーザー設定に保存されます。次回計画立案コンソールを開くと、選択した同じ列が表示されます。
表示する WBS レベルを選択	ガントで列を表示または非表示アイコン (ガン を選択し、[WBS 深度] リストからレベルを選択します。
任意のレベルのサブレベルを展開/折りたたむ	矢印を選択して、1 つ以上のサブタスクを持つタスクを展開または折りたたみます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



ガントチャートタスク

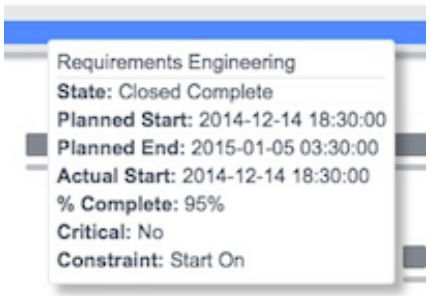タスク	タスクの実行方法
タスクの概要を表示	タスクをポイントします。 ツールヒントには、タスクの概要が表示されます。 
タスクの開始予定日または終了予定日を変更	タスクを選択し、タスクバーの左端または右端をドラッグします。
タスクを新しい日付に移動	タスクを選択し、タスクバー全体を新しい場所にドラッグします。
タスク間の依存関係を作成	関係内で後続タスクを探し、[先行タスク **(Predecessor)]** 列の値をダブルクリックして、関係を指定する値を入力します。例については、計画立案コンソールでの先行タスクの依存関係 を参照してください。 または、タイムラインビューで対応するタスクバーの端を接続して、2 つのタスク間に関係を作成することもできます。
ベースラインを選択	その他のオプションアイコン (··· を選択し、ベースラインリストからベースラインを選択します。
ベースラインを作成する	その他のオプションアイコン (··· を選択し、新しいベースラインの作成 を選択します。詳細については、「プロジェクトのベースラインの作成」を参照してください。
スケジュールベースラインを比較	その他のオプションアイコン (··· を選択し、ベースラインリストからスケジュールベースラインを選択します。ガントで列を表示または非表示アイコン (⚙ を選択し、次の列を選択してスケジュールベースラインを比較します。 • ベースライン開始日付 • ベースライン終了日付 • ベースラインの差異

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


ガントチャートタスク (続く)

タスク	タスクの実行方法
クリティカルパスを表示	クリティカルパスアイコン (⚠) を選択します。クリティカルパスの詳細については、「ガントチャート」を参照してください。
日付の変化を表示	その他のオプションアイコン (··· を選択し、[日付の変化の表示] スイッチを選択します。このオプションを有効にすると、タスクバーをドラッグしたときにタスクの開始日と終了日が表示されます。 タスクバーの開始日と終了日 
期間の変化を表示	その他のオプションアイコン (··· を選択し、[期間の変更を表示] スイッチを選択します。このオプションを有効にすると、タスクバーのいずれかの端をドラッグしたときにタスクの期間が表示されます。 タスク期間 
カレンダーに週末を表示	その他のオプションアイコン (··· を選択し、[週末の表示] スイッチを選択します。週末がライトブルーの垂直バーでガントチャートに表示されます。 タスクバーの週末 
カレンダーをズームインまたはズームアウト	カレンダーの上部で、月や日など、いずれかの期間を選択します。次に、カレンダーから [ズームレベル] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ガントチャートタスク (続く)

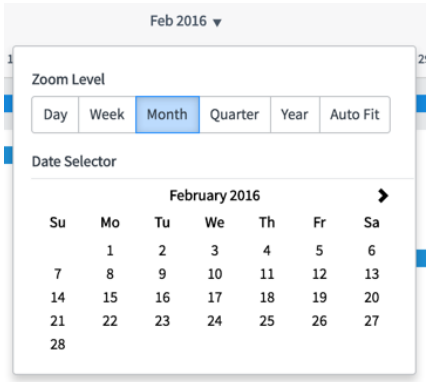タスク	タスクの実行方法
	カレンダーズーム  カレンダーのズームレベルが [自動調整] として選択されている場合、ガントビューは 1 ページに収まり、スクロールバーを使用せずにプロジェクトのタイムライン全体を一度に表示できます。
チュートリアルを開く	その他のオプションアイコン (··· を選択し、チュートリアル を選択します。
キーボードショートカットのリストを開く	[その他のオプション] アイコン (··· を選択し、[キーボードショートカット] を選択します。

その他の機能またはアプリケーションのタスク

タスク	タスクの実行方法
プロジェクトワークベンチを開く	バナーの 計画立案コンソール の選択矢印を選択し、[プロジェクトワークベンチ] を選択します。詳細については、「プロジェクトワークベンチの使用 - 従来」を参照してください。
ライブフィードを開く	その他のオプションアイコン (··· を選択し、[ライブフィードを表示] を選択します。
プロジェクトデータを MPP、CSV、または XML 形式でエクスポート	その他のオプションアイコン (··· を選択し、計画立案コンソールのエクスポート を選択します。詳細については、「プロジェクトデータのエクスポート」を参照してください。
ガントタイムラインを印刷	[その他のオプション] アイコン (··· を選択し、[印刷] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

その他の機能またはアプリケーションのタスク (続く)

タスク	タスクの実行方法
	注: • 小さいサイズの用紙に印刷すると、ガントチャートの画像が切り取られる場合があります。ガントチャートカレンダーを使用してズームアウトするか、用紙サイズを大きくして、プロジェクトとタスクのガントタイムラインを印刷できます。 • ガントチャート領域の色付きのバーが印刷プレビューに表示されない場合は、[印刷] ダイアログで背景グラフィックのオプションを選択します。

関連情報

計画立案コンソールの使用 - 従来

クライアント側の計画立案コンソール

計画立案コンソールでのプロジェクトスケジュールの計算時に、各インタラクションの詳細をサーバーに保存することなく、クライアント側 (ブラウザ) でプロジェクト構造を迅速にビルドできます。これにより、計画立案コンソールでアクションを実行した後に発生するタイムラグが防止され、スケジューリングのパフォーマンスが向上します。

たとえば、プロジェクトマネージャーが計画立案コンソールでプロジェクトタスクの日付を変更したときに、依存タスクとプロジェクトの日付を再計算すると、各インタラクションがサーバーに保存される場合はタイムラグが発生する可能性があります。同様に、新しいタスクまたは依存関係が作成されたときに、毎回サーバー側に保存されると、新しい日付が表示されるまでにタイムラグが生じる可能性があります。

クライアント側の計画立案が有効になっている場合、日付の再計算などの変更は、サーバーにすぐにはポストされません。計画立案コンソールで行ったすべての変更は、コミットする変更をユーザーが明示的にサーバーに保存するまで、クライアント側で保持されます。

例外

続行する前に変更をすぐにサーバー側に保存する必要があるアクションがいくつかあります。

- ベースラインの作成
- プロジェクトのコピー
- 部分プロジェクトのコピー
- 子タスクの追加
- 外部依存関係を追加
- アサイン先の編集
- 他のアサイニーの編集

さらに、いずれかの列でカスタムビジネスルールを有効にすると、それらの列も例外の一部になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

計画立案コンソールの使用 - 従来

クライアント側での計画立案の有効化

計画立案コンソールでクライアント側での計画立案を有効にして、クライアント側でプロジェクトのスケジューリングを有効にします。

始める前に
必要なロール：pps_admin

このタスクについて
計画立案コンソールでの各インタラクションの詳細をサーバーに保存することなく、クライアント側でプロジェクト構造を迅速にビルドします。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > 計画立案コンソール.
2. [計画立案コンソール] リストで [コンテキスト：デフォルト (Context：**default)]** を展開し、[プロジェクト [pm_project]] を選択します。
3. [クライアント側での計画立案を有効化] チェックボックスをオンにして、クライアント側でプロジェクトのスケジューリングを有効にします。

   注:
   このチェックボックスをオンにするには、プロジェクトプロパティの [計画立案コンソールからの保存時にビジネスルールの適用を有効にします] を false に設定する必要があります。

関連情報

計画立案コンソールの使用 - 従来

ガントチャート

計画立案コンソールのガントチャートは、タスクの開始日と終了日、およびタスク間の依存関係を示すプロジェクトタイムラインを視覚的に表したものです。


ガントチャートを使用して、タスクの追加と削除、タスクの日付と依存関係の変更、プロジェクト全体の進捗状況の評価を行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ガントチャート

ガントチャート

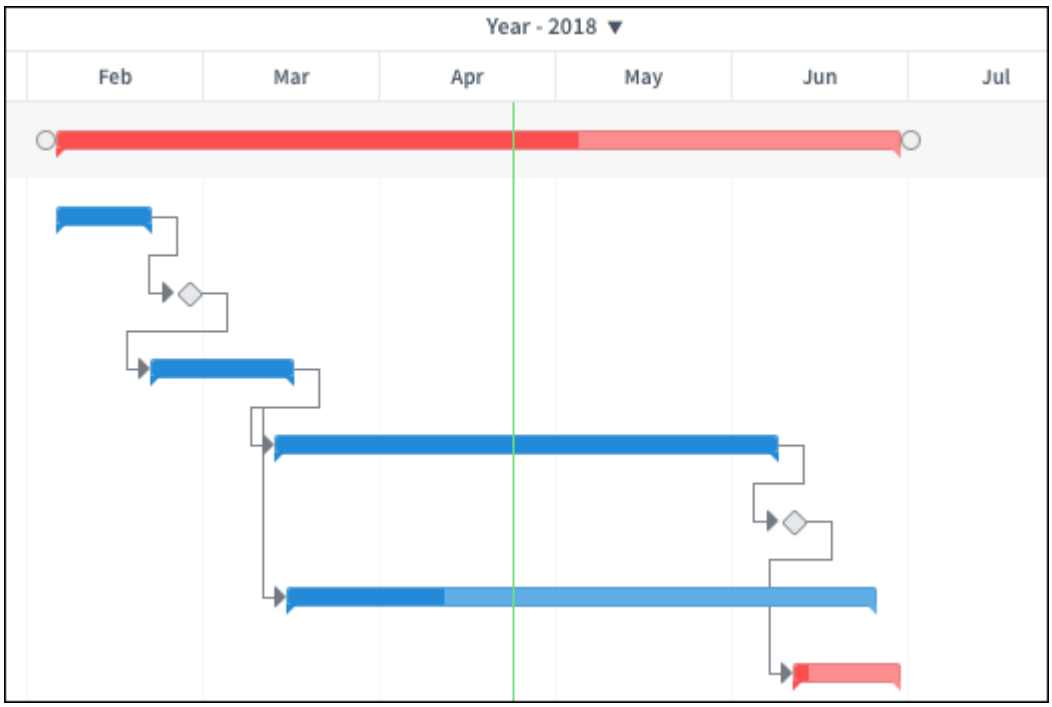

クリティカルパス


ガントチャートでは、クリティカルパスが赤色でハイライト表示され、クリティカルパスタスクが青色の標準タスクと区別されます。すべてのタスクがクリティカルパスに含まれるわけではなく、該当するのは終了日に直接影響するタスクのみです。クリティカルパスを使用して、終了日を左右するタスクを特定します。スケジュールの調整が必要な場合は、クリティカルパス上のタスクにリソースまたはその他の変更を加えることを検討します。

クリティカルパスの一部ではないために遅延する可能性があるタスクは、一般にスラックタスクまたはフロートタスクと呼ばれます。ガントチャートにはデフォルトでスラック/フロートタスクが表示されますが、プロジェクトに影響を与えずにタスクが遅延できる時間など、これらのタスクを扱う計算は利用できません。

マイルストーン

マイルストーンは、期間が **0** のプロジェクトタスクです。マイルストーンを使用して、プロジェクトの重要な日付を示します。必要に応じて、マイルストーンに到達するまでタスクが開始されないように、タスクとマイルストーンの間に依存関係を作成します。

マイルストーン



色分け

ガントチャートのタスクバーの色は、完了率とタスクのステータスに基づいています。プロジェクトとタスクで利用できるデフォルトの色分けが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトタスクの色分け

色	説明
ライトブルーのバー ライトブルーのバー 	タスクは処理待ちまたはオープンです。
ダークブルーのバー (全体または一部) ダークブルーのバー 	完了率は 1% から 100% の間です。ダークブルーのセクションは、完了率を示します。タスクは、[対応中] ステータスまたは [完了] ステータスになります。

注:
ガントチャートのタスクバーの色は、ポートフォリオまたはプログラムワークベンチから設定できます。

SDLC フェーズ

タスクの横にアイコンが表示され、タスクが属するフェーズを示します。

フェーズアイコン

アイコン	フェーズ
	アジャイルフェーズ。
	テストフェーズ。

注:
ウォーターフォールフェーズのタスクにはアイコンは表示されません。

ガントチャートのオプション

ガントチャートを使用すると、各タスクフォームを開いてフィールド値を 1 つずつ変更することなく、開始時間や終了時間などのタスク属性をすばやく変更できます。

ガントチャートから、次のタスク属性を変更できます。

タスクの変更

属性	説明
プロジェクトタスクの開始予定日	タイムラインに沿ってタスクを移動して、開始時間を変更したり、[特定の日に開始] の時間制約を課したりできます。タスクの [時間の制約] が ([すぐに開始] ではなく) [特定の日に開始] に設定されていて、タスクがまだ開始されていない場合は、タスクをドラッグして開始日を変更することもできます。タスクがすでに開始されている (実開始日がある)、タスクが既に終了している (実終了日がある)、またはタスクの時間の制約が [すぐに開始] に設定されている場合、タスクの開始日を変更することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの変更 (続く)

属性	説明
	コンソールの [開始予定日] 列で日付を変更することもできます。
プロジェクトの開始予定日	コンソールの [開始予定日] 列で日付を変更できます。 プロジェクトの開始予定日より前に開始するタスクを追加できます。デフォルトでは、最も早いタスク開始日に合わせてタスクを追加すると、開始予定日が前後にシフトします。ただし、 プロジェクトプロパティの [タスクに基づくプロジェクト開始日のロールアップ] を有効にすると、開始予定日が前または後のタスクを追加した場合でも、プロジェクトの開始予定日を保持することができます。
終了予定日	タスクバーの右端をドラッグして、終了予定日を延長します。親タスクではなく、まだ終了していないタスクについてのみ、予定日を延長できます。
依存関係	依存関係を編集または削除するには、2 つのタスク間の既存の依存関係コネクター行をダブルクリックし、[計画タスク関係 (Planned Task Relationship)] ポップアップで設定を更新します。計画タスクの関係の [タイプ] は *[Predecessor of::Successor of]* であり、変更できません。
遅延時間とリードタイム	遅延時間は、先行タスクの終了から後続タスクの開始までの時間間隔です。遅延時間は、指定した時間だけ先行タスクを遅延させます。 リードタイム は、先行タスクが通常の開始よりも前に開始できる時間間隔です。これは実質的に、負の遅延時間です。[遅れ] フィールドの値は、遅延時間とリードタイムの両方を指定します。 [遅れ] の値を編集するには、コネクターをダブルクリックし、 計画タスク関係 (Planned Task Relationship) フォームの設定を更新します。リードタイムを指定するには、負の値を入力します。
リソース	既存のタスクのユーザーリソースを変更したり、新しいタスクにリソースを追加したりするには、タスクバーをダブルクリックし、プロジェクトタスクフォームの [アサイン先] フィールドを編集します。 **注:** [アサイン先] 列のリソースは、プロジェクトまたはそのタスクに関連付けられた割り当て済みのリソース計画からのみ導出されるように制限できます。

プロジェクト管理 (PM)アプリケーションは、タスクの計算方法と動作を制御する複数のプロパティを提供します。詳細については、「プロジェクトプロパティ」を参照してください。

計画立案コンソールでの親子関係の作成

計画立案コンソールの [WBS] セクションでは、新しいタスクの親子関係を作成したり、新しい親子関係で既存のタスクを移動したりすることができます。階層内のタスクの位置とインデントのレベルによって、タスクとその上下のタスクとの親子関係が決まります。


始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
この例では、「システム準備アセスメント (System Readiness Assessment)」タスクは、計画タスクの 1 レベル下にあり、インデントされているため、計画タスクの子です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの親子関係



手順

1. 計画立案コンソールの [WBS] セクションでタスクを選択してハイライト表示します。
2. 次のいずれかのアイコンの組み合わせを選択してタスクを作成して移動するか、他のタスクを移動して必要な階層を作成します。

親子関係の作成

アイコン	アクション
上にタスクを追加アイコン ( )	ハイライト表示されたタスクの上にタスクを作成します。
タスクを以下に追加アイコン ( )	ハイライト表示されたタスクの下にタスクを作成します。
インデントアイコン ( )	ハイライト表示されたタスクをその上のタスクの子にします。

関連情報

計画立案コンソールの使用 - 従来

計画立案コンソールでの先行タスクの依存関係

計画コンソールの [WBS] セクションでは、一連の値を指定してタスク間の依存関係を作成できます。

計画立案コンソールの [先行タスク **(Predecessor)]** 列で、タスク間の依存関係を指定できます。この列に入力する値は、次の形式である必要があります。

`{WBS_number}{dependency_type}+{lag_time}`

ここで

- `WBS_number` は、関係内の先行タスクの番号です。
- `dependency_type` は、アプリケーションでサポートされる依存関係のタイプのいずれかです。
- `lag_time` は、依存タスクの開始を遅らせる時間 (日数) です。この値は、正または負の整数にすることができます。

値は中括弧 {} を付けずに入力します。表に示した例を参照してください。

注:
関係線をクリックして、ガントチャートからタスクを編集することもできます。詳細については、「ガントチャートのオプション」および「プロジェクトタスクの依存関係の変更」を参照してください。

プロジェクトタスクの依存関係の値

依存関係タイプ	例	追加情報
終了 - 開始	**1.1fs+0**	タスク 1.1 が終了すると、編集中のタスクが開始されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトタスクの依存関係の値 (続く)

依存関係タイプ	例	追加情報
開始 - 開始	**1.1ss+0**	タスク 1.1 は、編集中のタスクが終了するまで終了できません。
開始 - 終了	**1.1sf + 0**	タスク 1.1 は、編集中のタスクが終了するまで開始できません。
終了 - 終了	**1.1ff+0**	編集中のタスクは、タスク 1.1 が終了するまで終了できません。

関連情報

計画立案コンソールの使用 - 従来

計画立案コンソールのカスタム列

ベースシステムで提供される通常の列に加えて、PPS アドミニストレーターは、計画立案コンソールに表示する列を構成できます。

プロジェクト計画立案コンソール、 プログラムワークベンチ、ポートフォリオワークベンチの計画ビューと追跡ビュー、およびリリース管理ガントチャートで利用できる列を定義できます。この定義済み列のリストから、これらの計画立案コンソールの UI に表示する列をいつでも選択できます。

次のテーブルは、カスタム列の構成に使用されます。

- 計画立案コンソール **[pm_console]**：プロジェクトやポートフォリオなどの計画立案コンソールの定義を格納します。
- 計画立案コンソール表示列 **[pm_console_display_column]**：簡単な説明、WBS、優先度などの計画立案コンソール表示列を格納します。

  [pm_console] に格納されているコンソールには、 [pm_console_display_column] に格納されている複数の表示列があります。

  > **注:**
  > 列が [sys_user] テーブル以外のテーブルを参照している場合は、列のリストを編集できません。

- 計画立案コンソールテーブル **[pm_console_table]**：コンソールにデータを提供するテーブルのリストが含まれます。

  コンソールのデータは、複数のテーブルから供給されます。たとえば、プロジェクトコンソール [pm_project] は pm_project および pm_project_task テーブルからデータをプルします。このテーブルのリストは [pm_console_table]で維持されます。

- 計画立案コンソール列 **[pm_console_columnn]**：各テーブルからプルする必要がある列と pm_console_display_column の列のマッピングが維持されます。

関連情報

計画立案コンソールの使用 - 従来

計画立案コンソールへのカスタム列の追加

プロジェクト計画立案コンソール、 ポートフォリオワークベンチ、プログラムワークベンチ、およびリリース管理ガントチャートで利用できるようにする列を定義します。

始める前に
必要なロール：it_pps_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > 計画立案コンソール.
2. 計画立案コンソールのカスタム表示列を追加します。

   a. [計画立案コンソール] リストで、カスタム列を追加するコンソールを選択します。
   たとえば、プロジェクト計画立案コンソールに列を追加するには、［プロジェクト [pm_project]］を選択します。

   b. 選択したコンソールの表示列を作成するには、[計画立案コンソール表示列] 関連リストで [新規] を選択します。

   c. 計画立案コンソール表示列フォームで、フィールドに入力します。

   計画立案コンソール表示列フォーム

フィールド	説明
ラベル	計画立案コンソールに表示される列のラベル。
タイプ	列のデータタイプ。
JSON 列	データの送信時にガントチャートで内部的に使用される JSON 列名。 **注:** 空白のままにします。このフィールドは、ステップ 3 で表示列に列を追加すると自動入力されます。
順番	計画立案コンソールで列が表示される位置。
ツールヒントに含める	計画立案コンソールのタイムラインのツールヒントに表示する列のボックスをオンにします。
幅	計画立案コンソールの列のデフォルト幅。
保存時に BR を開始	計画立案コンソールで列が変更されたときにビジネスルールをトリガーする必要がある場合のオプション。 **注:** デフォルトでは、このフィールドはフォームに表示されません。このフィールドを追加するには、フォームを設定します。
再計算をトリガー	計画立案コンソールで列が変更されたときに日付と期間の再計算をトリガーする必要がある場合のオプション。 **注:** デフォルトでは、このフィールドはフォームに表示されません。このフィールドを追加するには、フォームを設定します。

   d. **[Submit** (送信)] を選択します。

   列は、計画立案コンソール表示列 [pm_console_display_column] テーブルに追加されます。
3. ステップ 2 で作成した計画立案コンソール表示列を、計画立案コンソールテーブル [pm_console_table] で定義されたテーブルの列にマップします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [計画立案コンソール表示列] 関連リストで、表示列レコードを開きます。

b. 計画立案コンソール列 [pm_console_column] テーブルで実際の列のレコードを作成するには、[計画立案コンソール列] 関連リストで [新規] を選択します。

c. 計画立案コンソール列フォームで、フィールドに入力します。

計画立案コンソール列フォーム

フィールド	説明
表示列	計画立案コンソール表示列 [pm_console_display_column] テーブルに作成された表示列。
コンソールテーブル	表示列にマップするコンソールテーブル。
テーブル	表示列でデータがプルされる実際のテーブル。コンソールテーブルを選択すると、このフィールドは自動入力されます。 たとえば、プロジェクト計画立案コンソールのプロジェクト [pm_project] に追加された表示列に対して、[pm_project] または [pm_project_task] からテーブルを選択します。
列	表示列のデータが取得されるテーブルの実際の列。
編集可能	計画立案コンソールで列を編集可能にするためのチェックボックス。

d. **[Submit** (送信)] を選択します。

タスクの結果

計画立案コンソールの列フィルターリスト ( ) に表示列が表示されます。

関連情報

計画立案コンソールの使用 - 従来

計画立案コンソールからの依存関係の作成

計画立案コンソールで 2 つのタスク間に依存関係を作成します。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

任意のタイプの依存関係を作成できます。各タイプの説明については、「親子ロールアップタスクの計算」を参照してください。

計画立案コンソールの [先行タスク (Predecessor)] 列を使用して依存関係を作成することもできます。詳細については、「計画立案コンソールでの先行タスクの依存関係」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 計画立案コンソールのガントチャート部分でタスクを選択します。
   タスクの両端に白色の円が表示されます。一方はタスクの開始時点に、もう一方はタスクの終了時点に表示されます。
2. 依存関係を作成するには、いずれかの白色の円を選択し、別のタスクの開始または終了にドラッグします。
3. 依存関係の行をダブルクリックして、計画タスク関係 (Planned Task Relationship) フォームに依存関係を表示します。
4. 依存関係が正しいことを確認します。
   必要に応じて、依存関係を変更できます。

関連情報

プロジェクトタスクの依存関係の変更

計画立案コンソールでの外部依存関係の追加

計画立案コンソールで 2 つのプロジェクト間の外部依存関係を追加します。計画立案コンソールの作業ブレークダウン構成 (WBS) 列を使用して、異なるプロジェクトタスクの間に依存関係を作成します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 計画立案コンソールの [WBS] 列でタスクを右クリックします。
2. [外部依存関係を追加] を選択します。
3. [依存関係を追加] フォームで、次のフィールドに入力します。
   - プロジェクト:依存関係の追加元の先行プロジェクト。
   - タスク:依存関係の追加元の先行プロジェクトのタスク。
   - 依存関係タイプ:外部依存関係 のタイプ : ハード または ソフト。
4. **[OK]** を選択します。

タスクの結果

- 先行タスクに対応するシャドウタスクが、後続プロジェクトの計画立案コンソールの [WBS] セクションに表示されます。後続タスクに対応する類似のシャドウタスクが、先行プロジェクトの計画立案コンソールの [WBS] セクションに表示されます。

  シャドウタスクは、グレー表示されたタスクとして [WBS] 列に表示されます。

- 先行タスクに対応するシャドウタスクが、後続プロジェクトフォームの [プロジェクトタスク] 関連リストに表示されます。後続タスクの類似のシャドウタスクが、先行プロジェクトのフォームの [プロジェクトタスク] 関連リストに表示されます。
- 後続プロジェクトの計画立案コンソールの [WBS] 列の [依存関係] 列に、プロジェクトとタスクの間の外部依存関係の値が表示されます。外部依存関係の値の形式は次のとおりです。

  {project_number}\{WBS_number}{dependency_type}+{lag_time}

  ここで

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- project_number は、先行プロジェクトの番号です。
- WBS_number は、関係内の先行タスクの番号です。
- dependency_type は、アプリケーションがサポートする終了 - 開始の依存関係タイプです。
- lag_time は、依存タスクの開始を遅らせる時間 (日数) です。この値は、正または負の整数にすることができます。

注:
外部依存関係は、計画立案コンソールの [外部依存関係を非表示] スイッチがオフの場合にのみ表示されます。ただし、後続プロジェクトの [WBS] セクションの [依存関係] 列には、外部依存関係の値がそのまま表示されます。

Example:
以下の例では、2 つのプロジェクト P1 と P2 の間に外部依存関係が作成されます。P1T1 は先行プロジェクト P1 のシャドウタスクであり、PRJ0010127\1fs+0 は後続プロジェクト P2 の計画立案コンソールの [依存関係] 列の外部依存関係値です。



次のタスク
プロジェクトまたはそのタスクに影響を与える可能性がある外部依存関係に関連する通知がないかを確認します。

プロジェクトタスクの依存関係の変更

依存関係、依存関係タイプ、または遅延時間でリンクされているタスクを編集するときに、依存関係を変更します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
プロジェクトタスクの依存関係は、計画タスク関係 (Planned Task Relationship) [planned_task_rel_planned_task] テーブルに保存されます。依存関係には、計画立案コンソールからアクセスできます。


手順
1. 計画立案コンソールのガントチャートで依存関係をダブルクリックします。
2. フォームで、詳細を入力します。

   詳細については、「計画タスク関係 (Planned Task Relationship) フォーム」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

計画タスク関係 **(Planned Task Relationship)** フォーム

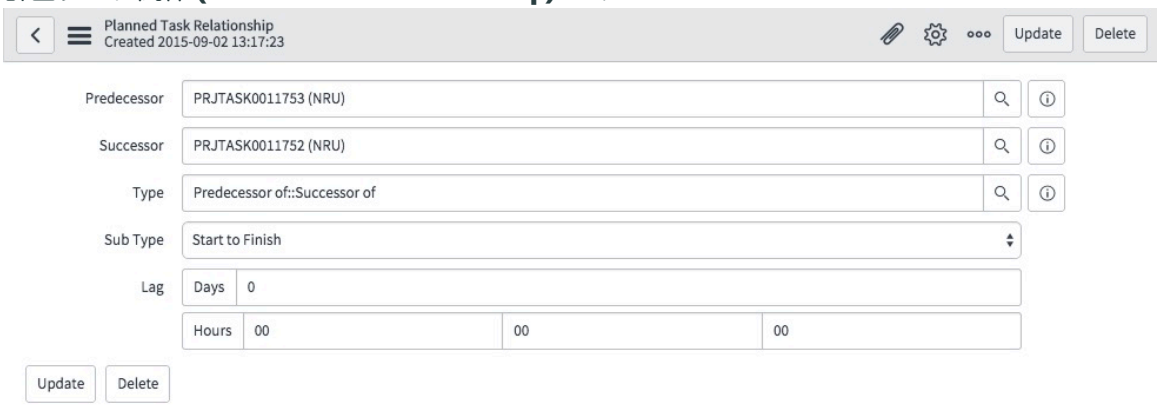

3. **[Update** (更新)] を選択します。

   依存関係は、プロジェクトフォームまたはプロジェクトタスクフォームの [プロジェクトタスク] 関連リストで、またはワークベンチの [プロジェクトタスク] リストから表示できます。次の列に依存関係が表示されます。

   - [依存関係 **(Dependency)]** 列には、関係の後続タスクが表示されます。
   - [依存関係 **(Dependencies)]** 列には、依存関係の値が表示されます。この列に表示される内容の説明については、「計画立案コンソールでの先行タスクの依存関係」を参照してください。

関連情報

計画立案コンソールからの依存関係の作成

依存関係の削除

依存関係の削除

計画立案コンソールを使用して、不要になった依存関係を削除します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
依存関係を削除すると、[計画タスク関係 (Planned Task Relationship)] テーブルの依存関係レコードも削除されます。

手順

1. 計画立案コンソールでプロジェクトを開きます。
2. 次のいずれかを実行します。

オプション	説明
ガントチャート上	○ 関係を右クリックし、[リンクの削除] を選択します。 ○ 関係をダブルクリックし、表示される [計画タスク関係 **(Planned Task Relationship)**] フォームで [削除] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
WBS リスト上	○ [先行タスク **(Predecessor)**] 列の値を削除します。 ○ [先行タスク] 列の値を選択し、表示される [計画タスク関係 **(Planned Task Relationship)**] フォームで [削除] を選択します。

関連情報

プロジェクトタスクの依存関係の変更

計画立案コンソールからの依存関係の作成

類似のプロジェクトを見つけるために プロジェクト管理 **(PM)** の類似性ソリューションをトレーニングする

PPM の予測インテリジェンス機能に含まれる類似のプロジェクトソリューション定義をトレーニングして、プロジェクトの定義時に、関連するプロジェクトを検索します。

始める前に

コンテキスト検索の予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.contextual_search_ml)、PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo)、および PPM 用予測インテリジェンスプラグイン (com.snc.ppm_ml) が有効化されていることを確認します。予測インテリジェンスの詳細については、「予測インテリジェンス」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > 予測インテリジェンス > 類似性 > ソリューション定義.
2. [類似性定義] リストで、類似のプロジェクトソリューション定義 (ml_sn_global_global_similar_projects) を検索して選択します。
3. 類似性定義フォームで、プロジェクトのデフォルトのフィールド値を確認します。
   類似性定義フォームフィールドの詳細については、「類似ソリューションの作成とトレーニング」を参照してください。
4. [更新 **&** 再トレーニング] をクリックします。
5. 類似のプロジェクトソリューション定義 (ml_sn_global_global_similar_projects) の類似性定義フォームを開きます。
6. [ML ソリューション] 関連リストの [進捗状況] 列で、トレーニングソリューションの進行状況を表示します。

   注:
   または、[アクティブ] 列のソリューションのリンクをクリックすることもできます。[ML ソリューション] フォームで、[トレーニング進捗状況を表示する] 関連リンクをクリックして、トレーニングソリューションの進行状況を確認します。

タスクの結果

ソリューションが完了すると、類似のプロジェクトがプロジェクトフォームの [類似のプロジェクト] セクションに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- 類似例を確認します。類似性定義フォームの ML ソリューション関連リストで、[進捗状況 **(Progress)]** が 100% のときに [アクティブ **(Active)]** 列で、ソリューションのリンクをクリックします。[類似例] リストを表示するには、ML ソリューションフォームの [類似例] 関連リンクをクリックします。
- 類似スコアのしきい値を更新します。ML ソリューションフォームの [ソリューション統計情報] タブで、[類似スコアのしきい値] フィールドに必要な値を入力します。ML ソリューションフォームを右クリックし、[保存] をクリックします。
- レコードの予測出力をテストします。ML ソリューションフォームの [ソリューションをテスト] タブで、[簡単な説明] フィールドにテキストを入力し、[上位 **N** 件] フィールドに予想される結果の最大数を入力して、[テストを実行] をクリックします。類似スコアしきい値を超える結果が表示されます。

関連情報

予測インテリジェンス

プロジェクト管理 (PM) の 予測インテリジェンス

プロジェクトの開始

PPM PIWB テンプレート - 類似プロジェクトの検索

類似プロジェクトを見つけるための類似プロジェクトソリューション定義のトレーニング手順を説明するガイド付きテンプレートを使用します。

始める前に
必要なロール：piwb_manager

手順

1. 移動先 すべて > 予測インテリジェンスワークベンチ > ユースケース > テンプレートから新規作成.
2. [類似プロジェクト] テンプレートを選択します。
3. [開始] をクリックします。
   [ユースケースセットアップ] ページが開いて、ユースケースの名前と説明が表示されます。
4. [移動 **(Take me there)]** をクリックします。
   [ServiceNow 機械学習ソリューション] ページが開き、利用可能なすべてのソリューションが表示されます。
5. 類似性ソリューションを展開して、利用可能なソリューション定義を表示します。
   類似プロジェクトを検索するための類似性ソリューションを構成またはトレーニングします。
   - 類似プロジェクトソリューション定義 (ml_sn_global_global_similar_projects) を構成するには、[構成] をクリックします。詳細については、「類似のプロジェクトを見つけるために プロジェクト管理 (PM) の類似性ソリューションをトレーニングする」を参照してください。
   - 類似プロジェクトソリューション定義 (ml_sn_global_global_similar_projects) をトレーニングするには、[トレーニング] をクリックします。

PPM Collaboration アプリケーションを使用したプロジェクトチームとのコラボレーション

PPM Collaboration アプリケーションを使用して、Slack や Microsoft Teams などの一般的なエンタープライズメッセージングプラットフォームでプロジェクトチームとコラボレーションします。プロジェクトのチームメンバー間でのプロジェクトに関するアクティブでタイムリーなコミュニケーションを促進し、プロジェクトに関する重要なディスカッションに参加し、プロジェクトのステータスに関する最新情報をリアルタイムで受け取ります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Slack のプロジェクト固有チャネルや Microsoft Teams のチームを使用することで、プロジェクトに関して行われる決定や更新が、すべてのチームメンバーに効果的に届けられます。チームは、すべて 1 つの場所で参照できるチャット履歴や共有プロジェクトドキュメントを通じて、過去のコミュニケーションに簡単にアクセスできます。そうすることで、プロジェクトマネージャーとチームメンバーは、メールやその他のオフラインコミュニケーションに費やす時間を節約できます。

PPM Collaboration の長所

プロジェクトマネージャーとチームメンバーは、プロジェクトコラボレーションチャネルやチームを利用することで次のような利点が得られます。

プロジェクトマネージャーとチームメンバーにとっての **PPM** コラボレーションの利点

プロジェクトマネージャー	チームメンバー
• 1 日の始めに、管理しているプロジェクトの詳細なステータスを確認する • ステータスの詳細を活用して、希望するコミュニケーションモードで関連するチームメンバーによってフォローアップすることを選択する • コラボレーションチャネルまたはチームから直接プロジェクトを開いて、詳細にドリルダウンする	• 直面している問題解決のためにチームメンバーとコミュニケーションを取る • チームメンバーからステータスの最新情報を受け取る • プロジェクトに関するディスカッションに寄与する

- マイルストーン、リスク、問題、意思決定、アクション、変更要求 (RIDAC) に関する変更、およびプロジェクトファイナンシャルをリアルタイムで更新します。
- プロジェクトタスクのアサイン先に基づいて、コラボレーションチャネルまたはチームのメンバーを自動的に追加および削除します。

注:
PPM Collaboration は、チームスペースではサポートされていません。

関連情報

PPM Collaboration のインストール

PPM Collaboration のインストール

PPM Collaboration (sn_ppm_collab) アプリケーションを ServiceNow Store からインストールします。

始める前に

- インストールと設定をスムーズに行うには、次のセットアップチェックリストを完了してください。

注:
Slack とのコラボレーションを有効にする場合は、Slack スポーク v2 プラグインを有効にする必要があります。Microsoft Teams とのコラボレーションを有効にする場合は、Microsoft Teams Graph スポークと Microsoft Azure AD スポークを有効にする必要があります。同じプロジェクトについて Slack と Microsoft Teams の両方で Collaboration を有効にすることはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

設定チェックリスト

セットアップタスク	説明
PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) プラグインが有効になっていることを確認します。	移動先 すべて > サブスクリプション管理 > サブスクリプション インスタンス内にありますリストには、組織で購入したサブスクリプションが表示されます。
Slack とのコラボレーションのために、Slack スポーク v2 (sn_slack_ah_v2) プラグインが有効になっていることを確認します。	移動先 すべて > サブスクリプション管理 > サブスクリプション インスタンス内にありますリストには、組織で購入したサブスクリプションが表示されます。
Microsoft Teams とのコラボレーションのために、Microsoft Teams Graph スポーク (sn_msteams_ahv2) プラグインが有効になっていることを確認します。	移動先 すべて > サブスクリプション管理 > サブスクリプション インスタンス内にありますリストには、組織で購入したサブスクリプションが表示されます。
Microsoft Teams とのコラボレーションのために、Microsoft Azure AD スポーク (com.sn.azure_ad.spoke) プラグインが有効になっていることを確認します。	移動先 すべて > サブスクリプション管理 > サブスクリプション インスタンス内にありますリストには、組織で購入したサブスクリプションが表示されます。

注:
本番インスタンスで PPM Standard、Microsoft Teams、および Slack スポークプラグインを有効化するには、個別のライセンスが必要な場合があります。詳細については、ServiceNow のカスタマーサポートにお問い合わせください。

- PPM Collaboration アプリケーションとそれに関連するすべてのストアアプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得 ServiceNow 製品またはアプリケーション.

必要なロール：admin

手順

1. に移動します ServiceNow Store.
2. ServiceNow Storeで、「PPM Collaboration」を検索します。
3. アプリケーションタイルを選択します。
   アプリケーションに関する詳細情報を表示できます。該当する場合は、[他の要件] および [依存関係] セクションを読むことを検討してください。
4. [取得] を選択し、Now Supportログイン資格情報を入力します。
5. [インストールを要求] を選択します。
6. [インスタンス名] フィールドに詳細を入力し、[インスタンスを検証] を選択します。
7. [インスタンスの理由] フィールドに詳細を入力し、[要求] を選択します。
   詳細なインストール手順が記載されたメールが届きます。
8. PPM Collaboration アプリケーションをインストールするインスタンスにログインします。
9. 選択 システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
10. フィルター基準と検索バーを使用してアプリケーションを見つけて選択し、[インストール] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
以下のコンポーネントは、アプリケーションのインストール時にインストールされます 。

- ロール
- テーブル

詳細については、「PPM Collaboration と一緒にインストールされるコンポーネント」を参照してください。

次のタスク
Slack 用の PPM コラボレーションの設定。

PPM Collaboration と一緒にインストールされるコンポーネント

ロールとテーブルは、PPM Collaboration アプリケーションのアクティブ化とともにインストールされます。

> **注:**
> アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

インストールされるロール

ロール	説明
コラボレーションユーザー [SN_collab_common.collab_user]	このロールを持つユーザーには、エンティティチャネルテーブルへの読み取り専用アクセス権があります。 このロールは、プロジェクトマネージャーとタスクアサイニーに自動的にアサインされます。
コラボレーション所有者 [SN_collab_common.collab_owner]	このロールを持つユーザーには、エンティティチャネルテーブルへの完全な作成、読み取り、更新、および削除アクセス権があります。 このロールは、プロジェクトマネージャーに自動的にアサインされます。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
エンティティチャネル [sn_collab_common_entity_channel]	プロジェクト用に作成された Slack チャネルの ID と名前のリストを格納します。

関連情報

- PPM Collaboration のインストール
- PPM Collaboration アプリケーションを使用したプロジェクトチームとのコラボレーション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Teams 用の PPM コラボレーションの設定

ServiceNow インスタンスを組織の Microsoft Teams とデータ連携して、Microsoft Teams でプロジェクトのコラボレーションを可能にします。

PPM Collaboration では、Microsoft Teams Graph および Microsoft Azure AD スポークアクション (プロジェクトのチームの作成、プロジェクトチームメンバーの追加または削除、プロジェクトのクローズ時のチームのアーカイブ、およびレコードの更新時のメッセージの投稿など) を使用します。これらのスポークアクションを有効にするには、ServiceNow インスタンスを Microsoft Teams Graph および Microsoft Azure AD とデータ連携して、ServiceNow 要求を認証する必要があります。詳細については、「Microsoft Teams Graph スポークの設定」および「Microsoft Azure AD スポークの設定」トピックを参照してください。

重要:
Microsoft Teams Graph と Microsoft Azure AD スポークを有効にすると、Microsoft Teams Graph と Microsoft Azure AD の接続および資格情報エイリアスが、それぞれ ID `sn_msteams_ahv2.Microsoft_Teams_Spoke` および `sn_azure_ad_spoke.AzureAD` でデフォルトで作成されます。このエイリアスの [接続] 関連リストでアクティブな ([アクティブ] フィールドが `true`に設定されている) 接続は、このデフォルト ID を使用して、ServiceNow インスタンスを Microsoft Teams Graph および Microsoft Azure AD に接続します。そのため、このエイリアスに複数の接続を関連付けることができますが、常に 1 つの接続のみがアクティブになるようにしてください。

Slack 用の PPM コラボレーションの設定

ServiceNow インスタンスを組織の Slack とデータ連携して、Slack でプロジェクトのコラボレーションを可能にします。

PPM Collaboration では、Slack スポークアクション (プロジェクトのチャネルの作成、プロジェクトチームメンバーの追加または削除、プロジェクトのクローズ時のチャネルのアーカイブ、およびレコードの更新時のメッセージの投稿など) を使用します。これらのスポークアクションを有効にするには、ServiceNow インスタンスを Slack とデータ連携して、ServiceNow 要求を認証する必要があります。詳細については、「Slack スポークの設定」を参照してください。

重要:
Slack スポークを有効にすると、Slack の接続および資格情報エイリアスが、ID `sn_slack_ah_v2.Slack` でデフォルトで作成されます。このエイリアスの [接続] 関連リストでアクティブな ([アクティブ] フィールドが `true`に設定されている) 接続は、このデフォルト ID を使用して、ServiceNow インスタンスを Slack に接続します。そのため、このエイリアスに複数の接続を関連付けることができますが、常に 1 つの接続のみがアクティブになるようにしてください。

関連情報

- Slack スポーク v2
- Microsoft Teams 用の PPM コラボレーションの設定

プロジェクトをコラボレーションツールと同期する目的で設計されたフロー

必要に応じて構成を編集できるように、PPM Collaboration アプリケーション用に設計されたフローを理解しておきます。

PPM Collaboration のフロー

Slack フロー [名前]	Microsoft Teams フロー [名前]	説明
アクションスラック	アクションチーム	アクションが優先度 **[1-**重大] または **[2 -** 高] で作成された場合、または既存のアクションの優先

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

PPM Collaboration のフロー (続く)

Slack フロー [名前]	**Microsoft Teams** フロー [名前]	説明
[action_slack]	[action_teams]	度が **[1-**重大] または **[2 -** 高]に更新された場合は常に、プロジェクトチャネルまたはチームにメッセージを投稿します。
チャネルへのアサイン済みユーザーの追加 [add_assigned_users_to_channel]	MS グループへのアサイン済みユーザーの追加 [add_assigned_users_to_ms_group]	プロジェクトタスクの [アサイン先] または [他のアサイニーリスト] フィールドでの、プロジェクトチャネルまたはチームへのユーザーの追加を処理します。
プロジェクトチャネルのアーカイブ [archive_project_channel]	MS グループのアーカイブ [archive_group]	プロジェクトがクローズ済みステータスに移行された日数に基づいて、プロジェクトチャネルまたはチームのアーカイブを処理します。このフローは、毎日午前 8 時に実行されるように設定されています。
変更要求 Slack [cr_updated_slack]	変更要求 Teams [change_request_teams]	変更要求が優先度 **[1-**重大] または **[2 -** 高] で作成された場合、または既存の変更要求レコードの優先度が **[1-**重大] または **[2 -** 高] に更新された場合は常に、プロジェクトチャネルまたはチームにメッセージを投稿します。
日次プロジェクトステータス Slack [daily_project_status]	日次プロジェクトステータス Teams [daily_project_status_teams]	毎日午前 8 時に、プロジェクトの全体的なステータスに関するメッセージをプロジェクトチャネルまたはチームにトリガーします。
意思決定 Slack [decision_updated_slack]	意思決定 Teams [decision_teams]	意思決定が優先度 **[1-**重大] または **[2 -** 高] で作成された場合、または既存の意思決定の優先度が **[1-**重大] または **[2 -** 高]に更新された場合は常に、プロジェクトチャネルまたはチームにメッセージを投稿します。
問題 Slack [issue_updated_slack]	問題 Teams [issue_teams]	問題が優先度 **[1-**重大] または **[2 -** 高] で作成された場合、または既存の問題の優先度が **[1-**重大] または **[2 -** 高]に更新された場合は常に、プロジェクトチャネルまたはチームにメッセージを投稿します。
マイルストーン/主要マイルストーン Slack [milestonekeymilestone]	マイルストーン/主要マイルストーン Teams [milestonekeymilestone_teams]	マイルストーンまたは主要マイルストーンタスクがクローズ済みステータスに移行するたびに、プロジェクトチャネルまたはチームにメッセージを投稿します。
プロジェクトマネージャーの変更 Slack [project_manager_changes]	プロジェクトマネージャーの変更 MS Teams [project_manager_changes_ms_teams]	新しいプロジェクトマネージャーをメンバーとしてプロジェクトチャネルまたはチームに追加する処理を行います。このフローでは、以前のプロジェクトマネージャーであったユーザーがいずれかのプロジェクトタスクにアサインされているかどうかも確認し、いずれのタスクにもアサインされていない場合はチャネルからユーザーを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PPM Collaboration のフロー (続く)

Slack フロー [名前]	**Microsoft Teams** フロー [名前]	説明
プロジェクトステータス Slack [project_status_slack]	プロジェクトステータス Teams [project_status_teams]	次の 3 つのシナリオで、プロジェクトチャネルまたはチームにメッセージを投稿します。 • [ステータス] フィールドが、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、または [スキップしてクローズ (Close Skipped)] 状況に更新される • [ステータス] フィールドが更新される • このプロジェクトのプロジェクトマネージャーが変更される
リスクフロー Slack [risk_created_slack]	リスクフロー Teams [risk_created_teams]	リスクが確率 [高] または [絶対] で作成された場合、または既存のリスクの確率が [高] または [絶対] に更新された場合は常に、プロジェクトチャネルまたはチームにメッセージを投稿します。

サブフローを除くすべてのフローは、デフォルトでは非アクティブです。特定のアクションに対して PPM と Slack または Microsoft Teams 間のコラボレーションを有効にするには、これらのフローをアクティブにします。これらのフローをすべて表示するには、 フローデザイナー > デザイナー PPM コラボレーションアプリケーションでフローをフィルタリングします。詳細については、「フローを有効化する」を参照してください。

これらのフローのいずれかの構成を更新する場合は、フローを編集できます。たとえば、毎日のステータス更新の時間を午前 8 時から午前 9 時に更新する場合は、日次プロジェクトステータス Slack [daily_project_status] または日次プロジェクトステータス Teams [daily_project_status_teams] フローを編集できます。詳細については、「フローを編集する」を参照してください。

関連情報

Flow Designer

フロー

プロジェクトの **Microsoft** チームの作成

プロジェクトの Microsoft チームを作成して、チームとのコラボレーションを開始し、プロジェクトの適時の更新を受信します。

始める前に

チームを作成するプロジェクトがアクティブで、クローズ済みステータスになっていないことを確認します。

必要なロール：it_project_manager

> **重要:**
> it_project_manager ロールに加えて、このプロジェクトの指定プロジェクトマネージャーである必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. チームを作成するプロジェクトを開きます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

開いているプロジェクトのプロジェクトマネージャーであることを確認します。

3. [**MS Teams** コラボレーションを有効化] 関連リンクを選択して、プロジェクトのコラボレーションを有効にします。

タスクの結果

- プロジェクトの Microsoft チームが作成されます。チームの名前は、プロジェクトフォームの成功メッセージに表示されます。プロジェクトフォームにリンクを表示して MS チームグループにアクセスすることもできます。リンクを選択すると、プロジェクトの MS チームグループに移動します。
- 自分とアドミニストレーターがチームのオーナーとして追加されます。
- このプロジェクトのアクティブなプロジェクトタスクのすべてのアサイニーと追加のアサイニーが、メンバーとしてこのチームに追加されます。

  [MS グループへのアサイン済みユーザーの追加 (Add Assigned Users To MS Group)] フローを有効にすると、後で作成するプロジェクトタスクのアサイニーと追加のアサイニーが、メンバーとしてこのチームに自動的に追加されます。ただし、プロジェクトに追加された新規または既存のステークホルダーは、メンバーとしてこのチャネルに追加されません。

  注:
  計画立案コンソールからタスクにアサインされたユーザー (アサイニーと追加のアサイニー) は、Microsoft チームに自動的に追加されません。

- プロジェクトのチームが正常に作成されると、**[MS Teams** コラボレーションを有効化] 関連リンクがそのプロジェクトから削除されます。同じプロジェクトについて Slack と Microsoft Teams の両方で Collaboration を有効にすることはできません。プロジェクトの **[MS Teams** コラボレーションを有効にする] 関連リンクを選択し、MS チームが作成される前に [**Slack** コラボレーションを有効にする] 関連リンクを選択すると、MS Teams の作成が進行中であることを示すメッセージが表示されます。

チームを作成できない場合は、しばらくしてから手順を再試行してください。問題が解決しない場合は、システムアドミニストレーターにお問い合わせください。

関連情報

PPM Collaboration アプリケーションを使用したプロジェクトチームとのコラボレーション

プロジェクトの **Slack** チャネルの作成

プロジェクトの Slack チャネルを作成して、チームとのコラボレーションを開始し、プロジェクトの適時の更新を受信します。

始める前に
Slack チャネルを作成するプロジェクトがアクティブで、クローズ済みステータスになっていないことを確認します。

必要なロール：it_project_manager

重要:
it_project_manager ロールに加えて、このプロジェクトの指定プロジェクトマネージャーである必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. Slack チャネルを作成するプロジェクトを開きます。

   開いているプロジェクトのプロジェクトマネージャーであることを確認します。
3. [**Slack** コラボレーションを有効にする] 関連リンクを選択して、プロジェクトのコラボレーションを有効にします。

タスクの結果

- このプロジェクトの Slack チャネルが作成されます。チャネルの名前は、プロジェクトフォームの成功メッセージに表示されます。プロジェクトフォームに Slack チャネルにアクセスするためのリンクを表示することもできます。リンクを選択すると、プロジェクトの Slack チャネルに移動します。
- 自分、およびこのプロジェクトのアクティブなプロジェクトタスクの既存のすべてのアサイニーと追加のアサイニーが、メンバーとしてこのチャネルに追加されます。

  [チャネルへのアサイン済みユーザーの追加 (Add Assigned Users To Channel)] フローを有効にすると、後で作成するプロジェクトタスクのアサイニーと追加のアサイニーが、メンバーとしてこのチャネルに自動的に追加されます。ただし、プロジェクトに追加された新規または既存のステークホルダーは、メンバーとしてこのチャネルに追加されません。

  注:
  計画立案コンソールからタスクにアサインされたユーザー (アサイニーと追加のアサイニー) は、Slack チャネルに自動的に追加されません。

- プロジェクトのチャネルが正常に作成されると、**[Slack** コラボレーションを有効にする] 関連リンクがそのプロジェクトから削除されます。同じプロジェクトについて Slack と Microsoft Teams の両方で Collaboration を有効にすることはできません。プロジェクトの **[Slack** コラボレーションを有効にする] 関連リンクを選択し、Slack チャネルが作成される前に **[MS Teams** コラボレーションを有効にする] 関連リンクを選択すると、Slack チャネルの作成が進行中であることを示すメッセージが表示されます。

チャネルを作成できない場合は、しばらくしてから手順を再試行してください。問題が解決しない場合は、システムアドミニストレーターにお問い合わせください。

関連情報

PPM Collaboration アプリケーションを使用したプロジェクトチームとのコラボレーション

コラボレーションツールでのプロジェクト更新の通知

Slack チャネルまたは Microsoft チームでプロジェクトに関連する更新を受信します。遅延および期限切れのタスクを分析し、マイルストーンのクローズをフォローし、プロジェクトのリスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求 (RIDAC) アイテムの変更を監視します。

プロジェクトコラボレーションチャネルまたはチームでプロジェクトステータスの自動更新を使用すると、プロジェクトマネージャーは、プロジェクト計画、リソース管理、ファイナンス配分について情報に基づいた意思決定を行うことができます。チームメンバーは、プロジェクトに加えられた更新を理解し、遅延または期限切れのタスクについてアクティブにコラボレーションを行うことができます。

注:
プロジェクトマネージャーは、システムアドミニストレーターに連絡して、ニーズに応じてこれらの通知のアプリケーション設定を構成することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトステータスに関する日次通知

統合プロジェクトステータスの通知は、毎日午前 8 時にプロジェクトのチャネルに送信されます。この通知は次の情報で構成されます。

プロジェクト概要

- プロジェクトの直接 URL。この URL を選択すると、 ServiceNow インスタンスでプロジェクトが開きます。
- プロジェクトの名前。
- プロジェクトの開始予定日と終了予定日。
- プロジェクトのステータス ([対応中] など)。
- プロジェクトのステータス (緑など)。
- プロジェクトの完了率。

今日が期限のプロジェクトタスク

終了予定日が本日とマークされており、[対応中] ステータスになっているプロジェクトタスクのリスト。リストには、簡単な説明でアルファベット順にソートされた 5 つのプロジェクトタスクのみが表示されます。

期限切れのタスク

開始予定日が本日より前であるが、[対応中] ステータスまたは [クローズ済み] ステータスのいずれでもないプロジェクトタスクのリスト。リストには、開始予定日の昇順でソートされた 5 つのプロジェクトタスクのみが表示されるため、長期間期限切れになっているタスクを容易に視認できます。

遅延タスク

開始予定日が本日より前で、[対応中] ステータスになっているプロジェクトタスクのリスト。リストには、終了予定日の昇順でソートされた 5 つのプロジェクトタスクのみが表示されるため、長期間期限切れになっているタスクを容易に視認できます。

期限が 7 日以内のプロジェクトタスク

終了予定日が本日から 7 日以内である後続の 5 つのプロジェクトタスクのリスト。これらのタスクはすべて、期日の昇順で可視化されるため、まもなく期日が来るタスクを容易に視認できます。

> **注:**
> [クローズ済み] ステータスにあるタスクは、このリストに表示されません。

- 優先度の高いリスク、問題、およびアクションアイテム
- マイルストーンまたは主要マイルストーンタスク

その他の更新

次のシナリオでは、プロジェクトチャネルに通知が送信されます。

- 完了時のコスト推定 (EAC) がプロジェクトの計画コストを超えている
- 終了予定日が承認終了日より後になっている
- プロジェクトが開始予定日に開始されていない
- プロジェクトが終了予定日までに完了していない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトマネージャーの変更に関する通知

プロジェクトのマネージャーが変更されると、プロジェクトレコードの [プロジェクトマネージャー] フィールドが更新されます。

- この更新時に、プロジェクト URL を含む通知がプロジェクトチャネルに送信されます。
- 新しいプロジェクトマネージャーがチャネルのメンバーとして追加されます。
- 古いプロジェクトマネージャーにプロジェクトタスクがアサインされていない場合、このユーザーはチャネルのメンバーとして削除されます。

プロジェクトに対するその他の更新の通知

プロジェクトのステータス

プロジェクトの [ステータス] フィールドが更新されると、プロジェクト URL を含む通知がプロジェクトチャネルに送信されます。

RIDAC レコード

次のシナリオでは、プロジェクトで新しい RIDAC レコードが追加されたとき、または既存の RIDAC レコードが更新されたときに、プロジェクトチャネルで通知を受け取ります。すべての通知で、対応するレコードへの直接 URL を受け取ります。

- リスク
  - 優先度フィールドを [高] または [絶対]に設定して新しいリスクが作成される
  - 既存のリスクの [ステータス] または [リスクステータス] フィールドが更新される
- 問題、意思決定、アクション、および変更要求
  - 優先度フィールドを **[1 -** 重大] または **[2 -** 高] に設定して新しいレコードが作成される
  - 既存のレコードの優先度が [1：重大] または **[2-**高] に更新される

マイルストーン

主要マイルストーンがクローズされるたびに、クローズとそれをクローズしたユーザーが、マイルストーンタスクへの直接 URL とともに通知されます。

関連情報

PPM Collaboration アプリケーションを使用したプロジェクトチームとのコラボレーション

プロジェクトコラボレーションチャネルまたはチームのアーカイブ

プロジェクトがクローズ済みステータスに移行したときに、プロジェクトの Slack チャネルまたは Microsoft チームがどのようにアーカイブされるかについて確認します。

プロジェクトのクローズ済みステータスへの移行

プロジェクトマネージャーがプロジェクトを [完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、または [スキップしてクローズ] ステータスに移行すると、次のアクションがトリガーされます。

- プロジェクトのクローズに関する通知が、チャネルまたはチームにすぐに送信されます。
- チャネルまたはチームは、プロジェクトがクローズ済みステータスに移行した日から 15 日以内にアーカイブされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この 15 日間の期間により、プロジェクトメンバーは処理待ちのコミュニケーションをクローズしたり、処理待ちのプロジェクトドキュメントを共有したりできます。

プロジェクトマネージャーは、アドミニストレーターに連絡して、この 15 日間の期間を選択した値に更新することができます。

プロジェクトタスクの削除

プロジェクトタスクが削除されても、対応する Slack チャネルまたは Microsoft チームのメンバーは自動的に削除されません。プロジェクトタスクの削除時にメンバーを削除するには、**[Slack/Teams チャネルからユーザーを削除 (Remove Users From Slack/Teams Channel)]** ビジネスルールを有効にする必要があります。このビジネスルールはプロジェクトタスクテーブルで作成され、デフォルトでは有効になっていません。詳細については、「ビジネスルール」を参照してください。

プロジェクトチャネルまたはチームの削除

Slack アプリケーションでチャネルが削除された場合、または Microsoft Teams アプリケーションでチームが削除された場合、PPM Collaboration アプリケーションは、エンティティチャネル [sn_collab_common_entity_channel] テーブル内のプロジェクトの参照の削除を自動的に処理しません。そのため、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトフォームの **[Slack** コラボレーションを有効にする] または **[MS Teams** コラボレーションを有効化] 関連リンクを再度表示することはできません。

プロジェクトマネージャーがこのプロジェクトのチャネルまたはチームを再度作成する場合、アドミニストレーターはエンティティチャネルテーブルからプロジェクトの参照を手動で削除する必要があります。これにより、コラボレーションを有効にするための関連リンクがプロジェクトフォームに表示されます。

関連情報

PPM Collaboration アプリケーションを使用したプロジェクトチームとのコラボレーション

PPM の仮想エージェント®

ServiceNow PPM の仮想エージェントを使用すると、プロジェクトマネージャーは、さまざまなメッセージングサービスを介して仮想エージェントとやり取りすることで、ビジネス関連のクエリーに対する迅速な回答を得ることができます。

PPM の仮想エージェントを使用すると、プロジェクトマネージャーは、さまざまなリスト間を移動することなく、ビジネス関連の情報を 1 つのステップですばやく表示できます。たとえば、期限切れのすべてのプロジェクトタスクのリストを取得できます。

ベースシステムでは、事前定義された次のような仮想エージェントトピック (チャットボット会話) を提供します。

- プロジェクトおよびタスクステータス
  - すべてのアクティブなプロジェクト
  - 赤いステータスのプロジェクト
  - 来週終了する、完了率が 60% 未満のプロジェクト
  - 期限切れのマイルストーン/主要マイルストーン
  - 期限切れのタスク
  - 遅延タスク
- リソース

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 実際の時間が割り当てられた時間を超えるリソースプラン
- 来週から始まる未割り当てリソース計画
- 要求された拡張を含む未割り当てリソース計画

- 財務管理
  - 自分のアクティブなプロジェクト
  - 計画コストより大きい EAC のあるプロジェクト
  - 予算より大きい EAC のあるプロジェクト
- RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求)
  - 今週が期限の絶対リスクと高確率リスク
  - 今週が期限の重要かつ高優先度の問題
  - 今週が期限の重要かつ高優先度のアクションアイテム
- データ品質
  - ビジネスケースのないプロジェクト
  - 戦略のないプロジェクト
  - プログラムまたはポートフォリオのないプロジェクト

トピックは、仮想エージェント (チャットサポートボット) とユーザーの間のダイアログを定義します。これにより、特定のビジネスニーズに関する情報を収集できます。詳細については、次を参照してください。 仮想エージェント .

メッセージ アプリケーションとのデータ連携

Slack や Microsoft Teams などのサードパーティのメッセージングアプリケーションを使用して、PPM の仮想エージェントボットの会話を実行できます。

仮想エージェント Integrations アプリを使用して、インスタンスのメッセージングアプリを構成します。

詳細については、「仮想エージェントのメッセージングアプリとの統合」を参照してください。

Slack または Microsoft Teams との統合の詳細については、「仮想エージェント通知の設定」を参照してください。

関連情報

PPM の仮想エージェントのインストール

PPM の仮想エージェントの有効化

PPM 仮想エージェントの会話フロー

PPM 仮想エージェントの再利用可能なトピックブロック

PPM の仮想エージェントのインストール

PPM の仮想エージェントを ServiceNow ストアからインストールします。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

PPM の仮想エージェントをインストールするには、次のプラグインを有効にします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo)	PPM (プロジェクトポートフォリオ管理) アプリケーションの PPM Standard 基本プラグインを有効にします。
Glide 仮想エージェント (com.glide.cs.chatbot)	仮想エージェントフレームワークとその他の必要なプラグインを有効にします。
PPM の仮想エージェント (com.sn_ppm_va)	PPM 向けメッセージングインターフェイス内の会話を通じてユーザーサポートを提供するための会話型ボットプラットフォームを有効にします。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してアプリケーションを検索します。
   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow へのリクエストが必要になることもあります。

   ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースメモ情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。
3. [インストール] を選択します。
4. アプリケーションのインストールダイアログボックスで、アプリケーションの依存関係を確認します。

   依存するプラグインとアプリケーションがインストールされている場合、現在インストールされている場合、またはインストールする必要がある場合は、リストに表示されます。インストールする必要があるプラグインまたはアプリケーションがある場合は、PPM の仮想エージェントをインストールする前にインストールする必要があります。
5. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、 [デモデータのロード] を選択します。

   (Optional) デモデータには、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードが含まれています。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。

   > **重要:**
   > インストール時にデモデータを読み込んでおかないと、後から読み込むことはできません。
6. [インストール] を選択します。

関連情報

PPM の仮想エージェント

PPM の仮想エージェントの有効化

PPM 仮想エージェントの会話フロー

PPM 仮想エージェントの再利用可能なトピックブロック

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PPM の仮想エージェントの有効化

PPM の仮想エージェントを有効にして、仮想エージェントとのチャットを開始します。

始める前に

必要なロール：admin、virtual_agent_admin
ベースシステムでは、事前定義された仮想エージェントトピック (チャットボット会話) を提供します。トピックをカスタマイズするには、複製してから編集します。「仮想エージェントデザイナー」を参照

手順

1. 移動先 すべて > 仮想エージェント>デザイナー>トピック>コラボレーション.
2. PPM 仮想エージェントカードを選択して開きます。
   - 提供されたトピックを変更せずに使用するには、[公開] を選択します。
   - トピックを複製してカスタマイズできるようにするには、[複製] を選択します。重複するトピックの名前を入力し、[保存] を選択します。

関連情報

PPM 仮想エージェントの会話フロー

PPM 仮想エージェントの再利用可能なトピックブロック

PPM 仮想エージェントの会話フロー

PPM の仮想エージェントには、プロジェクトマネージャーがビジネス関連タスクに関する情報を収集できるように、事前定義されたトピックの会話がいくつか用意されています。

it_project_manager ロールを持っている場合は、次のような事前定義されたトピックの会話を表示できます。

プロジェクトおよびタスクステータス

プロジェクトおよびタスクに関連する情報。たとえば、アクティブなプロジェクト、赤のステータスのプロジェクト、近い将来に終了する予定のプロジェクト、および期限切れのタスクとマイルストーンのあるプロジェクトなどです。この情報は、設定されたマイルストーンごとにプロジェクトを追跡および計画するのに役立ちます。

リソース

リソース関連情報。たとえば、割り当てられた時間を超える実績時間を含むリソース計画、翌週に開始予定の未割り当てのリソース計画、または延長が要求されているリソース計画などです。その後、リソースを管理し、計画どおりに進んでいないリソース計画に対処できます。

財務管理

ファイナンス関連情報。たとえば、完了時の推定金額が計画コストを上回っているプロジェクトや、完了時の推定額が予算金額を上回っているプロジェクトなどです。この情報は、プロジェクトの財務実績を理解するのに役立ちます。

RIDAC

RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) 関連情報。たとえば、期限が翌週で絶対または高確率のリスクのあるプロジェクトや、期限が今週で重大または高確率の問題およびアクションのあるプロジェクトなどです。この情報は、将来のプロジェクトを計画するためのパターン、傾向、および考えられる解決策を分析および特定するのに役立ちます。

データ品質

品質関連情報。たとえば、ビジネスケース、戦略、プログラム、またはポートフォリオがアサインされていないプロジェクトなどです。この情報は、戦略、ビジネスケース、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プログラム、またはポートフォリオに沿っていないプロジェクトを評価するのに役立ちます。

関連情報

PPM の仮想エージェントのインストール

PPM の仮想エージェントの有効化

PPM 仮想エージェントの再利用可能なトピックブロック

PPM 仮想エージェントの再利用可能なトピックブロック

トピックブロックを作成して再利用し、トピックの作成とメンテナンスのプロセスを簡素化します。トピックブロックを使用すると、会話トピック全体で標準的な手順を再利用できます。

次のような、事前定義された再利用可能なトピックブロックを利用できます。

- PPM VA のプロジェクトのトピック
- 特定プロジェクトのオプション
- PPM VA のプロジェクトデータ品質のトピック
- PPM VA のプロジェクトファイナンシャルのトピック
- PPM VA のリソースのトピック
- PPM VA の RIDAC トピック

再利用可能なトピック関数のみを表示するには、仮想エージェントデザイナーの [トピック] ページにアクセスし、[トピックブロック] タブを選択します。詳細については、「再利用可能なトピックブロック」を参照してください。

関連情報

PPM の仮想エージェントのインストール

PPM の仮想エージェントの有効化

プロジェクト管理 (PM)の参照

フィールド、ユーザーロール、テーブル、プロパティなど、 プロジェクト管理 (PM) に関する追加の詳細を提供するための参照情報。

Project Management とともにインストールされるプロパティ

構成できるプロジェクトプロパティがいくつかあります。

プロジェクトプロパティにアクセスするには、PPS admin ロールが必要です。

移動先 プロジェクト管理 > 設定 > 設定 - プロジェクト をクリックして、次のプロパティを構成します。

プロパティ	説明
計画立案コンソールからの保存時にビジネスルールの適用を有効にします。このプロパティは、タスクと関係の挿入および削除中にのみ適用されます。 com.snc.project.fire_brs_from_planning_console	true に設定すると、プロジェクト計画立案コンソールでビジネスルールがトリガーされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	注: このプロパティを変更した場合は、コンソールを再ロードしてください。 デフォルト値：false
WIP プロジェクトのプロジェクトの移動を有効にする com.snc.project.move_project.wip	true に設定すると、このプロパティを使用して、WIP ステータスのプロジェクトを移動できます。 注: プロジェクトを移動すると、オープンおよび処理待ちステータスのタスクのみが移動され、プロジェクトはすべてのプロジェクトタスクからロールアップされた日付を取得します。 デフォルト値：false
プロジェクトのコスト概算と正味価格に基づいた ROI パーセントを計算 com.snc.project.calculate_roi	true に設定すると、このプロパティは (正味価格 / 概算コスト) x 100 の計算式を使用して投資利益率を計算します。このフィールドは、プロジェクトフォームの詳細ビューからのみ使用できます。 デフォルト値：true
予定日の手動プロジェクトの実績での変更を有効にする (Enable alter of planned date with Actual for Manual Project) com.snc.project.change_planned_date_from_actual_for_manual	true に設定すると、このプロパティは、手動プロジェクトの終了予定日を実開始日と計画期間から再計算します。 デフォルト値：false
プロジェクトコストのロールアップを有効にします (推定および実際) - プロジェクトタスクのコストを更新すると、その親のコストが更新されます com.snc.project.rollup.cost	true に設定すると、このプロパティは、子タスクのコストが更新されると親プロジェクトタスクのコストを更新します。 デフォルト値：false
タスクに基づくプロジェクト開始日のロールアップ	true に設定すると、プロジェクトの開始予定日が、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
com.snc.project.rollup_project_start_date	最も早いタスクの開始予定日からロールアップされます。最も早いタスクの開始日にかかわらずプロジェクトの開始予定日を同じままにする場合は、このプロパティを無効にします。 デフォルト値：true
作業ステータスに移行したら、プロジェクトマイルストーンタスクを自動的に閉じる com.snc.project.auto_close_milestones	true に設定すると、このプロパティはマイルストーンを自動的にクローズするため、マイルストーンを手動でクローズする必要がありません。 デフォルト値：false
WIP/クローズ済みのタスクに対して予定日付の変更を有効にする com.snc.project.enable_alter_of_planned_dates	true に設定すると、このプロパティを使用して、タスクが対応中ステータスまたはいずれかのクローズ済み状況であっても、タスクの開始予定日を変更できます。 デフォルト値：false
デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更に基づきリソースプラン、コスト計画、および利益計画の開始日を変更します。利益計画の開始日は、計画のオフセットタイプが [なし] でない場合にのみ変更されます (Benefit Plan Start Date will change only if the offset type for the plan is not None) com.snc.project.date_change_cascade	true に設定すると、このプロパティは、プロジェクトまたはデマンドの開始日に変更がある場合に、リソース計画、コスト計画、および利益計画の開始日を変更します。 **注:** オフセットタイプが [なし] の利益計画の開始日は、プロジェクトまたはデマンドの日付変更によって変更されません。 デフォルト値：true
プロジェクトが移動した場合、ユーザーおよびリソース計画の状況は、「確認済み」/「割り当て済み」のままになります com.snc.project.date_change_cascade_persist_resource	true に設定すると、このプロパティは、プロパティが移動されたときにリソース計画、予約済みリソース、および計画された日次配分の確認済みまたは割り当て済みステータスを保持します。プロジェクトを移動すると、プロジェクトが移動

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	される将来の期間のリソースの可用性に基づいて、リソース計画が再割り当てまたは再確認されます。 **注:** このプロパティは、[デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更に基づきリソースプラン、コスト計画、および利益計画の開始日を変更します] が true に設定されている場合にのみ有効になります。 デフォルト値：true
ポートフォリオワークベンチからのデマンドの確認後にプロジェクトを作成します com.snc.project.portfolio_workbench.confirm_to_create_project	true に設定されている場合、このプロパティは、ポートフォリオ内の選択されたすべてのデマンドをプロジェクトに変換します。 デフォルト値：false
元のプロジェクトタスクからコピーされる属性のリスト (カンマ区切り) (List of attributes (comma-separated) that will be copied from the originating project task) com.snc.project.copy.additional_attributes	デフォルトでは、[プロジェクトをコピー **(Copy Project)]** および [部分プロジェクトをコピー] オプションでは、簡単な説明、予定日、および期間のフィールドのみが、ソースプロジェクトからターゲットプロジェクトにコピーされます。追加の列をコピーする必要がある場合は、このプロパティで宣言する必要があります。 デフォルト値：空欄
新しいプロジェクトの経費タイプをデフォルトに設定します。 sn_plng_att_core.default.expense_type	プロジェクトワークスペースで新しいプロジェクトが作成されると、プロジェクトの経費タイプは [経費] としてマークされます。

次のプロジェクトプロパティは、システムプロパティ [sys_properties] テーブルで使用できます。これらのプロパティを編集できるのはシステムアドミニストレーターのみです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
関係の追加後もタスクに対する開始日の制約を保持します com.snc.project.allow_start_on_relations	このプロパティは、タスクを別のタスク (FS 関係など) との関係に置いた後でも、タスクの [開始日] の選択を保持します。 デフォルト値：true
プロジェクトまたはプロジェクトタスクに許される最大期間 (日数) (Max duration (in days) allowed for a project/project task) com.snc.project.task.max_task_duration	このプロパティは、プロジェクトタスクまたはプロジェクト全体の最大期間を管理します。 **注:** プロジェクトにマイルストーンが含まれている場合、期間は休日と週末を考慮に入れて計算されます。 デフォルト値：2600 **警告:** このプロパティの値を 2600 より大きい値にすると、プラットフォームのメモリー使用率に影響します。非常に大きい値、たとえば期間 15000 日でプロジェクトまたはプロジェクトタスクを作成しようとすると、メモリー不足エラーが発生します。
プロジェクトまたはプロジェクトタスクの現在の日付を基準とした将来または過去の最大日数スパン (Max date span into future or past from the current date for the project/project task) com.snc.project.task.check_date_span_years	このプロパティは、プロジェクトまたはプロジェクトタスクの予定日を入力するときの将来の最大日付を管理します。 デフォルト値：10 **警告:** このプロパティの値を 10 より大きい値にすると、プラットフォームのメモリー使用率に影響します。値が非常に大きいと、メモリー不足エラーが発生します。
プロジェクトまたはタスクの作成または更新時に予定日と元の日付を同期する com.snc.project.sync_original_dates_with_planned_dates	true に設定すると、このプロパティは予定日と元の日付を同期します。 デフォルト値：true
ステータスレポートの生成時に事前定義されたテンプレートを使用する sn_pw.project_status_report_default_templateId	このプロパティは、プロジェクトステータスレポートの生成に使用されるデフォルトのテンプレートを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
ステータスレポートを読み取り専用として生成する sn_pw.doc_status_report_read_only	このプロパティは、ステータスレポートの編集を制限します。このプロパティは、ステータスレポートを読み取り専用に設定します。 デフォルト値：true

PPM Standard 複数通貨のクイックスタートテスト

アプリケーションの開発やアップグレードの適用などの構成変更を行った後も、PPM Standard Multicurrency が変わらず正常に動作するかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。

プロジェクト通貨クイックスタートでは、PPM Standard Multicurrency – ATF Tests プラグイン (com.snc.ppm_multicurrency.atf) をアクティブ化する必要があります。

プロジェクト通貨テストスイートのテスト

テスト	説明	リリースバージョン
コスト計画のプロジェクト通貨でコストを確認	予算参照レートを使用してコスト行ブレークダウンの計算を検証し、コスト計画へのロールアップを確認します。プロジェクト通貨でプロジェクトについても確認します。	Orlando
プロジェクト通貨で利益計画の利益を確認	予算参照レートを使用して利益行ブレークダウンの計算を検証し、利益計画へのロールアップを確認します。プロジェクト通貨でプロジェクトについても確認します。	Orlando

関連情報

クイックスタートテスト

プロジェクト管理 (PM) のフォームフィールドの情報

プロジェクト管理 (PM) で使用されるフォームのフィールド情報。

[利益計画] フォーム

利益計画フォームのフィールドについて説明します。

[利益計画] フォーム

フィールド	説明
名前	利益計画の内容を表す名前。
作業	利益計画が属するプロジェクトまたはデマンド。
スポンサー	プロジェクトのスポンサー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[利益計画] フォーム (続く)

フィールド	説明
カテゴリ	利益のタイプ： • ハード：収益の観点から測定できる利益。 • ソフト：価値の観点から測定される利益。
サブカテゴリ	ハードおよびソフトの利益のサブカテゴリ。 [カテゴリ] フィールドの選択により、このフィールドで利用可能な選択肢が決まります。
利益タイプ	利益のタイプ。[金銭的な利益] を選択します。
オフセットタイプ (Offset type)	利益がいつ実現し始めるかを示すフィールド。次のオプションのいずれかを選択します。 • なし：デフォルト値は [なし] です。[なし] を選択した場合は、利益計画の会計期間の開始および終了を手動で入力する必要があります。 • マイルストーン：マイルストーンの完了後。 • 開始日：プロジェクトの開始時。 • 終了日：プロジェクトの終了後。 選択したオフセットタイプの値が変更されると、それに応じて利益計画の開始日がシフトします。たとえば、オフセットタイプが [終了日] に設定されていて、プロジェクトの終了日が変更された場合、利益計画の開始日はプロジェクトの新しい終了日に合わせてシフトされます。
マイルストーン	注: このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)**] フィールドで [マイルストーン] を選択した場合に表示されます。 利益計画が属するプロジェクトのマイルストーン。
マイルストーンの開始日	注: このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)**] フィールドで [マイルストーン] を選択した場合に表示されます。 選択したマイルストーンの開始日。
作業開始日	注: このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)**] フィールドで [開始日] を選択した場合に表示されます。 プロジェクトまたはデマンドの開始日。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[利益計画] フォーム (続く)

フィールド	説明
作業終了日	**注:** このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)**] フィールドで [終了日] を選択した場合に表示されます。 プロジェクトまたはデマンドの終了日。
オフセット (OffSet)	利益計画の開始時点のオフセットタイプの前または後の期間の数。たとえば、オフセットタイプが [終了日] として選択され、オフセットが「-2」である場合、利益計画はプロジェクト終了日の 2 期間前になります。プロジェクトの終了日がシフトされると、利益計画の開始日が新しいプロジェクト期日の 2 期間前にシフトされます。
期間	利益計画の長さ (期間)。
会計期間の開始	会計期間の開始。選択した [マイルストーン]、[プロジェクト/デマンドの開始日]、または [プロジェクト/デマンドの終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] の値に基づいて設定されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)**] フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。 会計期間の開始を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
会計期間の終了	会計期間の終了。選択した [マイルストーン]、[プロジェクト/デマンドの開始日]、または [プロジェクト/デマンドの終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] の値に基づいて設定されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)**] フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。 会計期間の終了を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
関連利益	この金銭的利益計画に関連付けられている金銭以外の利益。

財務詳細

フィールド	説明
入力通貨での利益	入力通貨で表される、指定のプロジェクトまたはデマンドから発生する利益。 選択した通貨が機能通貨と異なる場合は、対応する予算参照レートを使用して、プロジェクトの合計計画利益が計算されます。
入力通貨	利益計画の作成に使用する通貨。
機能通貨	**glide.system.locale** プロパティ から取得される通貨。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

財務詳細 (続く)

フィールド	説明
	アップグレードされた顧客で、選択した通貨がファイナンシャルマネジメントアプリケーションで設定された機能通貨と異なる場合は、対応する予算参照レートを使用して、プロジェクトの合計計画利益が計算されます。
合計計画利益	プロジェクトまたはデマンドの潜在的な利益の推定額。
機能通貨での利益	機能通貨で表される、プロジェクトまたはデマンドから発生する利益。
実績利益	プロジェクトまたはデマンドから発生する実績利益。この値は、すべての利益計画ブレークダウンの [実績利益] フィールドからロールアップされます。
繰り返し	利益計画のすべての会計期間で利益が繰り返し発生することを示すチェックボックス。

関連情報

プロジェクトの金銭的利益計画の作成

コスト計画フォーム

コスト計画フォームのフィールドについて説明します。

コスト計画フォーム

フィールド	説明
名前	コスト計画の内容を表す名前。
プロジェクト/デマンド	コスト計画が属するプロジェクトまたはデマンド。
会計期間の開始	会計期間の開始を示します。 会計期間の開始を変更すると、関連付けられたコスト計画明細も変更されます。会計期間の開始よりも前にコスト計画明細を作成すると、会計期間の開始も変更されます。
会計期間の終了	会計期間の終了を示します。 会計期間の終了を変更すると、関連付けられたコスト計画明細も変更されます。会計期間の終了よりも後にコスト計画明細を作成すると、会計期間の終了も変更されます。

コスト計画フォームの [財務] セクション

フィールド	説明
入力通貨	コスト計画の作成に使用する通貨。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コスト計画フォームの [財務] セクション (続く)

フィールド	説明
	選択した通貨が機能通貨と異なる場合は、対応する予算参照レートを使用して、プロジェクトの合計計画コスト、計画投資、計画経費が計算されます。
単位コスト	単一の単位によるリソースのコストで、入力通貨で表されます。
数量	必要なリソースの数量。
繰り返し	コストが会計期間ごとに繰り返し発生することを示すオプション。 会計期間ごとに発生した数量 x 単位コスト。
原価費目	原価費目の定義。
Investment (投資)	プロジェクトに対して作成された投資の名前。 このフィールドは、従来の投資枠管理 (com.snc.investment_funding) プラグインが有効になっている場合、または投資枠管理 (sn_invst_pln) アプリケーションがインストールされている場合のみ表示されます。
ソースタイプ	資金調達のためのプロジェクト投資に関連付けられる資金調達エンティティ。 このフィールドは、従来の投資枠管理 (com.snc.investment_funding) プラグインが有効になっている場合、または投資枠管理 (sn_invst_pln) アプリケーションがインストールされている場合のみ表示されます。
ソース	資金を要求する元となる資金調達エンティティの値。 [ソースタイプ] フィールドで値を選択すると、このフィールドを使用できます。 このフィールドは、従来の投資枠管理 (com.snc.investment_funding) プラグインが有効になっている場合、または投資枠管理 (sn_invst_pln) アプリケーションがインストールされている場合のみ表示されます。
合計計画コスト	コスト計画の合計コスト概算。 コストが繰り返し発生している場合、計算は数量 x 単位コスト x 会計期間の数となります。コ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コスト計画フォームの [財務] セクション (続く)

フィールド	説明
	ストが繰り返し発生していない場合、計算は数量 x 単位コストとなります。
機能通貨	**glide.system.locale** プロパティ から取得される通貨。 アップグレードされた顧客で、選択した通貨がファイナンシャルマネジメントアプリケーションで設定された機能通貨と異なる場合は、対応する予算参照レートを使用して、プロジェクトの合計計画コスト、計画投資、計画経費が計算されます。 **注:** 予算参照レートが定義されていない場合、為替レートは 1 とみなされます。たとえば、機能通貨が USD で、入力通貨でのコストが EUR であり、為替レートが定義されていない場合、1000 USD は 1000 EUR に等しくなります。
機能通貨でのコスト	すべてのコスト計画明細の [機能コスト] フィールドからロールアップされる値。
合計実績コスト (Total actual cost)	すべてのコスト計画明細の [実績コスト] フィールドからロールアップされる値。
完了時の推定 (EAC)	過去の会計期間のすべての実績の合計と将来の会計期間の機能コストを加算した値。 たとえば、プロジェクトの期間が 1 月 1 日から 12 月 31 日で、5 月の完了時の推定 (EAC) を確認する場合、1 月から 4 月までの実績の合計 + 5 月から 12 月までの機能コストの合計として計算されます。

関連情報

プロジェクトコスト計画の作成

[コスト計画ブレークダウン] フォーム

コスト計画ブレークダウンフォームの有効なフィールドを確認して更新します。

[コスト計画ブレークダウン] フォーム

フィールド	説明
タスク	コスト計画明細が属するタスク。
ポートフォリオ	コスト計画明細が属するポートフォリオ。
入力通貨	コスト計画で指定された通貨。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[コスト計画ブレークダウン] フォーム (続く)

フィールド	説明
為替レート	コスト計画明細に対応する期間に対して有効なレート。コスト計画明細に対応する期間に複数のレートがある場合、その期間の最初の日付で有効なレートが使用されます。 為替レートは、入力通貨でのコストを機能コストに変換するために使用されます。これは、itfm_fx_rate [budget_reference_rates] テーブルから取得されます。
実際	処理済みの経費ラインから生成される実績コスト。
コスト計画	コスト計画明細が属するコスト計画。
会計期間	期間レベルで生成される会計。期間については、「会計カレンダー」を参照してください。
入力通貨でのコスト	入力通貨による明細の金額。
機能コスト	為替レートと入力通貨でのコストを乗算して得られる機能コスト。
為替レート日付	コスト計画明細に対応する会計期間の最初の日付。

関連情報

コスト計画明細の更新

診断フォーム

診断フォームのフィールドについて説明します。


診断フォーム

フィールド	説明
名前	診断スキャンの名前。この名前は、この診断スキャンが属するアプリケーションに表示されます。 
有効	診断スキャンを有効にするためのオプション。
順番	この診断スキャンがアプリケーションに表示される順序。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

診断フォーム (続く)

フィールド	説明
機能	この診断スキャンを関連付ける診断機能。
ロール	診断スキャンにアクセスできるユーザーロールを追加または削除するためのオプション。
説明	診断スキャンの詳細。説明は、診断スキャンが属するアプリケーションに表示されます。 



関連情報

診断スキャンの作成および関連スクリプトのマップ

診断機能フォーム

診断機能フォームのフィールドについて説明します。

診断機能フォーム

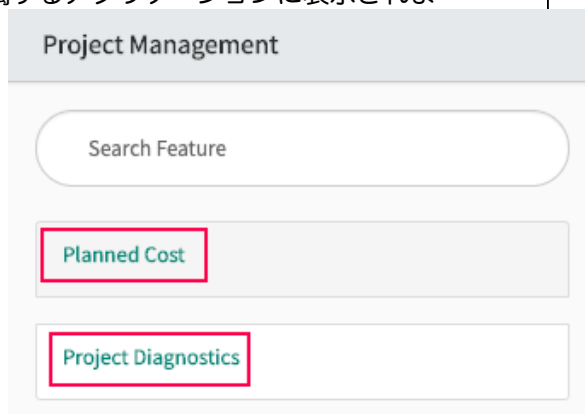フィールド	説明
名前	診断機能の名前。この名前は、診断機能が属するアプリケーションに表示されます。 
有効	診断機能を有効にするためのオプション。
アプリケーション	この診断機能を関連付けるアプリケーションを検索して選択します。
ロール	診断機能へのアクセスを許可するユーザーロール。
説明	診断機能のスキャンの詳細。説明は、診断機能が属するアプリケーションに表示されます。 

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[診断入力] の各フィールド

フィールド	説明
ラベル	入力フィールドのラベルの名前。
フィールド タイプ	[参照] フィールドタイプ。
テーブル	条件で指定されたクエリを実行するテーブルの名前。
キー	ユーザー入力条件の識別子。ユーザーが複数の条件を指定した場合、このキーは各条件の一意の識別子として機能します。このキーは、診断スクリプトの *scanContext* セクションの入力として使用できます。 たとえば、**projectFilter** をキーとして指定した場合、診断スクリプトの *scanContext* セクションは、「var encodedQuery = scanContext.input.projectFilter;」のように表示されます。

関連情報

診断機能の作成および追加

診断スクリプトフォーム

診断スクリプトフォームのフィールドについて説明します。

診断スクリプトフォーム

フィールド	説明
名前	診断スクリプトの名前。スクリプトの目的を明確に説明する名前を使用してください。スクリプト名を使用すると、診断スキャンの作成時にスクリプトを機能にマッピングするときに、正しいスクリプトを識別できます。
説明	診断スクリプトのアクションを説明する詳細。

診断スクリプト	診断スクリプトのコード。次の例は、無効なトップポートフォリオを持つタスクを特定する診断スクリプトを示しています。
	
	`/*`
	`- Inputs can be accessed from scanContext.input as per, the key specified in feature input table.`
	`eg. scanContext.input.projectSysID`
	`- To pass variables from the one script to another script use varSpace in scanContext.`
	`eg. scanContext.varSpace.variable1 = '...';`
	`*/`
	`(function(scanContext) {`
	`try {`
	`var errorTasks = [];`
	`var encodedQuery = scanContext.input.projectFilter;`
	`var now_GR = new GlideRecord("pm_project");`
	`gr.addEncodedQuery(encodedQuery);`
	`gr.query();`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

診断スクリプトフォーム (続く)

フィールド	説明

	while (gr.next()) {
	var entitySysID = gr.getValue("sys_id");
	var projectData = new ProjectData(entitySysID);
	var projectTopTaskValidator = new ProjectTopTaskValidator(projectData);
	
	if (projectTopTaskValidator.tasksWithInvalidTopPortfolioPresent()) {
	var failedTasks = projectTopTaskValidator.getTasksWithInvalidTopPortfolio();
	if (failedTasks && failedTasks.length) {
	for (var i = 0; i < failedTasks.length; i++) {
	errorTasks.push(failedTasks[i].sys_id);
	}
	}
	}

関連情報

診断スクリプトおよび修正スクリプトの追加

経費ラインフォーム

経費ラインフォームのフィールドについて説明します。

経費ラインフォームのフィールド

フィールド	説明
番号	自動生成された番号。
総計	通貨タイプを選択して、経費コストを入力します。
日付	経費が発生した日付。
処理日	経費ラインが処理された日付。
ソース ID	関連コストを生成したレコード。
状況	経費ラインのステータス。ステータスは [処理待ち] または [処理済み] になります。コストロールアップは、経費ラインが処理されている場合にのみ発生します。
コスト計画	経費ラインを作成するコスト計画の名前。
サマリータイプ	経費をグループ化するカテゴリを選択します。
原価費目	原価費目を選択します。
経費タイプ	資本経費の場合は [投資] を、運用経費の場合は [経費] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

経費ラインフォームのフィールド (続く)

フィールド	説明
簡単な説明	経費タイプの簡単な説明を入力します。
ソース	経費ラインのソースのレコードを選択します。これらのソースは次のとおりです。 • 資産 • 固定資産 • 契約 • ユーザー • 構成アイテム • タスク • コストセンター

関連情報

経費ラインの作成

投資ボードフォーム

投資ボードフォームのフィールドについて説明します。

投資ボードフォーム

フィールド	説明
名前	投資ボードの名前。
タイプ	プロジェクトとデマンドをフィルターするレベル。 • ポートフォリオ：選択すると、そのタイプに一致するプロジェクトとデマンドが表示されます。 • プログラム：選択すると、そのタイプに一致するプロジェクトとデマンドが表示されます。 • デマンド/プロジェクト：選択すると、そのタイプに一致するデマンドとプロジェクトが表示され、特定のポートフォリオまたはプログラムにバインドされません。
ポートフォリオ	プロジェクトとデマンドがフィルターされるポートフォリオの名前。 このオプションは、[タイプ] が [ポートフォリオ] の場合にのみ使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

投資ボードフォーム (続く)

フィールド	説明
プログラム	プロジェクトとデマンドがフィルターされるプログラムの名前。 このオプションは、[タイプ] が [プログラム] の場合にのみ使用できます。
デマンド/プロジェクト	プロジェクトとデマンドのフィルター基準を指定するためのオプション。 注: • デマンドのフィルター基準が指定されていない場合、デマンドは取得されません。同様に、プロジェクトのフィルター基準が指定されていない場合、プロジェクトは取得されません。 • 投資ポータルボードで CSM 列を表示することはできますが、ボードでそのような列にフィルターを追加することはできません。
アクティブなプロジェクトおよびデマンド	アクティブなプロジェクトとデマンドのみをフィルターするためのチェックボックス。 このオプションは、[タイプ] が [ポートフォリオ] または [プログラム] の場合にのみ使用できます。

関連情報

投資ボードの作成

[金銭的利益計画明細 **(Monetary Benefit Plan Breakdown)]** フォーム

金銭的利益計画フォームのフィールドについて説明します。

[金銭的利益計画明細 **(Monetary Benefit Plan Breakdown)]** フォーム

フィールド	説明
タスク	利益計画ブレークダウンが属するタスク。
ポートフォリオ	利益計画ブレークダウンが属するポートフォリオ。
入力通貨	利益計画で指定された通貨。
為替レート	利益計画明細に対応する期間に対して有効なレート。利益計画明細に対応する期間に複数のレートがある場合、その期間の最初の日付で有効なレートが使用されます。 為替レートは、入力通貨での利益を機能的利益に変換するために使用されます。これ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[金銭的利益計画明細 **(Monetary Benefit Plan Breakdown)**] フォーム (続く)

フィールド	説明
	は、itfm_fx_rate [budget_reference_rates] テーブルから取得されます。
実績利益	プロジェクトまたはデマンドから発生する実績利益。
利益計画	利益計画ブレークダウンが属する利益計画。
会計期間	期間レベルで生成される会計。期間については、「会計カレンダー」を参照してください。
入力通貨での利益	入力通貨での利益。
機能的利益	為替レートと入力通貨での利益を乗算して得られる機能的利益。
為替レート日付	利益計画ブレークダウンに対応する会計期間の最初の日付。

関連情報

- プロジェクトの金銭的利益計画の作成
- プロジェクトの金銭的利益計画明細の更新

金銭以外の利益計画フォーム

金銭以外の利益計画フォームのフィールドについて説明します。

[利益計画] フォーム

フィールド	説明
名前	利益計画の内容を表す名前。
作業	利益計画が属するプロジェクトまたはデマンド。
スポンサー	プロジェクトのスポンサー。
カテゴリ	利益のタイプ： • ハード：収益の観点から測定できる利益。 • ソフト：価値の観点から測定される利益。
サブカテゴリ	ハードおよびソフトの利益のサブカテゴリ。 [カテゴリ] フィールドの選択により、このフィールドで利用可能な選択肢が決まります。
利益タイプ	利益のタイプ。[金銭以外の利益] を選択します。
オフセットタイプ	利益がいつ実現し始めるかを示すフィールド。次のオプションのいずれかを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[利益計画] フォーム (続く)

フィールド	説明
(Offset type)	• なし：デフォルト値は [なし] です。[なし] を選択した場合は、利益計画の会計期間の開始および終了を手動で入力する必要があります。 • マイルストーン：マイルストーンの完了後。 • 開始日：プロジェクトの開始時。 • 終了日：プロジェクトの終了後。 選択した [オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドの値が変更されると、それに応じて利益計画の開始日がシフトします。たとえば、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドが [終了日] に設定されていて、プロジェクトの終了日が変更された場合、利益計画の開始日はプロジェクトの新しい終了日に合わせてシフトされます。
マイルストーン	利益計画が属するプロジェクトのマイルストーン。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [マイルストーン] を選択した場合にのみ表示されます。
マイルストーンの開始日	選択したマイルストーンの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [マイルストーン] を選択した場合にのみ表示されます。
作業開始日	プロジェクトまたはデマンドの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [開始日] を選択した場合にのみ表示されます。
作業終了日	プロジェクトまたはデマンドの終了日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [終了日] を選択した場合にのみ表示されます。
オフセット (OffSet)	利益計画の開始時点のオフセットタイプの前または後の期間の数。たとえば、オフセットタイプが [終了日] として選択され、オフセットが「-2」である場合、利益計画はプロジェクト終了日の 2 期間前になります。プロジェクトの終了日がシフトされると、利益計画の開始日が新しいプロジェクト期日の 2 期間前にシフトされます。
期間	利益計画の長さ (期間)。
会計期間の開始	会計期間の開始。選択した [マイルストーン]、[プロジェクト/デマンドの開始日]、または [プロジェクト/デマンドの終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] フィールドの値に基づいて設定されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。 会計期間の開始を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
会計期間の終了	会計期間の終了。選択した [マイルストーン]、[プロジェクト/デマンドの開始日]、または [プロジェクト/デマンドの終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] の値に基づいて設定されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[利益計画] フォーム (続く)

フィールド	説明
	会計期間の終了を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
関連利益	この金銭以外の利益計画に関連付けられている金銭的利益。

金銭以外の詳細

測定	金銭以外の利益計画の測定のタイプ。測定タイプは、カウント、パーセンテージ、時間、日、スコアです。 定量化できない利益を追跡するには、[はい/いいえ] オプションを選択します。このオプションを選択した場合、利用できるフィールドは [利益の達成] のみです。チェックボックスをオンにして、利益が達成されたことを示すことができます。
金銭以外の入力通貨での利益	潜在的利益の推定値。 利益計画の計画利益に変更があると、将来の会計期間についてのみ、関連する利益ブレークダウン値が更新されます。
金銭以外の計画利益	利益ブレークダウンからロールアップされた利益値。
利益の達成	利益が達成されたかどうかを示すオプション。
ブレークダウンタイプ	利益計画を保存するときのブレークダウン作成のタイプ。 • なし：明細は作成されません。 • 自動：金銭以外の利益計画明細レコードがデータとともに自動的に作成されます。明細は線形的に計算されます。 • 手動：金銭以外の利益計画明細レコードが自動的に作成されますが、[入力通貨での利益] 列にはデータがありません。
アグリゲーションモード	ブレークダウンから利益計画へのロールアップをどのように行うかを決定し、[金銭以外の計画利益] および [金銭以外の実績利益] フィールドの値を更新します。 • 合計：すべてのブレークダウンのデータを集計します。 • 平均：すべてのブレークダウンの平均値。 • 最新：最新のブレークダウン値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

金銭以外の詳細 (続く)

	• 最大：ブレークダウンの最大値。 • 最小：ブレークダウンの最小値。
金銭以外の実績利益	金銭以外の利益計画ブレークダウンの実績利益からロールアップされる実績利益値。

関連情報

プロジェクトの金銭以外の利益計画の作成

プロジェクトの金銭以外の利益計画明細の更新

[store-future: BEGIN review]

プロジェクトフォーム

プロジェクトフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、プロジェクトを作成します。

プロジェクトフォーム

フィールド	説明
プロジェクト名	プロジェクトの名前。
プロジェクトマネージャー	プロジェクトにアサインされたプロジェクトマネージャー。
ステータス	プロジェクトの現在のステータス。この情報は、プロジェクトの最新のプロジェクトステータスレポートの [総合健全性] フィールドから取得されます。
番号	設定可能なプリフィックス付きのシステム生成番号。
完了率 (%)	完了済みのプロジェクトの割合。
状況	プロジェクトの現在のステータス。すべての新規プロジェクトは、 [処理待ち] として開始されます。プロジェクトのステータスは、プロジェクトフォームで設定することも、タスクステータスから取得することもできます。 使用可能なデフォルトの状況は、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] です。 ステータスディクショナリ属性を上書きして、各ステータスタイプのカスタム状況を作成することもできます。 たとえば、プロジェクトタスクに対して、[対応中] ステータスタイプの [テスト中] というカスタム状況を作成したとします。プロジェクトタスクのステータスを [テスト中] に更新すると、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォーム (続く)

フィールド	説明
	プロジェクトのステータスも [テスト中] に更新されます。ただし、[対応中] ステータスタイプに対して [テスト中] ステータスを作成していない場合、プロジェクトのステータスはデフォルトの [対応中] ステータスに更新されます。
説明	プロジェクトの詳細な説明。 **注:** プロジェクトの説明では特殊文字はサポートされていません。また、テキストプロセッサーからテキストをコピーしないでください。プロジェクト情報を計画コンソールに表示する際に問題が発生する可能性があります。
類似のプロジェクト	予測インテリジェンスと機械学習アルゴリズムを使用して、[説明] フィールドと [簡単な説明] フィールドに類似した値を持つプロジェクトを表示します。詳細については、「プロジェクト管理 (PM) の 予測インテリジェンス」を参照してください。
関連検索	デフォルトで [名前] フィールドに一致する検索結果を表示します。このフィールドを使用して、他の用語を使用して一致するプロジェクトを検索することもできます。

プロジェクトフォームの [日付] セクション

フィールド	説明
スケジュール	このプロジェクトで使用する作業スケジュール。デフォルトのスケジュールは、1 作業日あたり 8 時間 (午前 8 時から午後 12 時および午後 1 時から午後 5 時) です。1 日 24 時間ではなく、1 作業日が 1 日と見なされます。
承認された開始日	プロジェクトを開始する日付。プロジェクトがデマンドから変換された場合、このフィールドはデマンドの承認開始日を保持します。プロジェクトスケジュールはこの日付には適用されず、プロジェクトタスクをプロジェクトに追加しても日付は変更されません。このフィールドの日付が [開始予定日] フィールドより後の日付に設定されている場合、このフィールドは赤色で強調表示されます。 **注:** プロジェクトの承認開始日も、そのプロジェクトに関連付けられたすべてのサブプロジェクトに引き継がれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォームの [日付] セクション (続く)

フィールド	説明
承認された終了日	このプロジェクトが終了する日付。プロジェクトがデマンドから変換された場合、このフィールドはデマンドの承認期日を保持します。プロジェクトスケジュールはこの日付には適用されず、プロジェクトタスクをプロジェクトに追加しても日付は変更されません。このフィールドの日付が [終了予定日] フィールドより前の日付に設定されている場合、フィールドが赤色で強調表示されます。 **注:** プロジェクトの承認終了日も、そのプロジェクトに関連付けられたすべてのサブプロジェクトに引き継がれます。
開始予定日	プロジェクト内のプロジェクトタスクの開始日。この日付は、プロジェクトタスクからロールアップされます。この日付は、[承認された開始日] からコピーされます。計画タスクが追加されると、この値はプロジェクトスケジュールで許可される最も早い時間に設定されます。 たとえば、プロジェクトタスクが午前 3 時に作成され、デフォルトのスケジュール (開始日の午前 8 時) を使用している場合、デフォルトのタスク開始は翌日の午前 8 時になります。 **注:** 開始予定日は、現在の日付から 10 年以内である必要があります。プロジェクトプロパティの[現在の日付を基準とした将来または過去の最大日数スパン **(Max date span into future or past from the current date)]** が、プロジェクトの開始予定日の動作を制御します。 デマンドをプロジェクトに変換すると、デマンドの開始日がプロジェクトの開始予定日として引き継がれます。デマンドの開始日が週末で、プロジェクトがプロジェクトスケジュールに従っている場合、開始予定日は週の最初の作業日に調整されます。 [自分のプロジェクトスペース] ページからプロジェクトを作成すると、[開始予定日] フィールドが自動的に入力されます。カレンダーアイコンを選択し、プロジェクトを開始する日付を選択する必要があります。プロジェクトは、開始予定日に自動的には開始されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォームの [日付] セクション (続く)

フィールド	説明
	注: • プロジェクトの開始予定日を変更すると、関連するコスト計画とリソース計画も変更されます。プロジェクトプロパティの[デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更でリソースプランとコスト計画の開始日を変更 **(Change Resource Plan and Cost Plan Start Date with Demand or Project Start Date Change)]** が、プロジェクトの開始日変更の動作を制御します。 • プロジェクトの作成時、デフォルトではこのフィールドが使用できません。[承認された開始日] フィールドを使用して、プロジェクトの開始日を指定します。このフィールドを表示するには、このフォームを設定します。ただし、このフィールドは、既存のプロジェクトおよびデマンドから変換されたプロジェクトで使用できます。
終了予定日	プロジェクト内のプロジェクトタスクの終了日。タスクを追加すると、フィールドの値がタスクから計算されます。 手動プロジェクトの場合、プロジェクトの実開始日を更新しても、終了予定日は更新されません。プロジェクトプロパティの [予定日の手動プロジェクトの実績での変更を有効にする **(Enable alter of planned date with Actual for Manual Project)]** を有効にすると、実開始日および計画期間から終了予定日を更新できます。 注: このフィールドは、デフォルトではプロジェクトの作成時には使用できません。[承認された終了日] フィールドを使用してプロジェクトの終了日を指定します。このフィールドを表示するには、このフォームを設定します。 デマンドをプロジェクトに変換すると、デマンドの期日がプロジェクトの終了予定日として引き継がれます。デマンドの期日が週末で、プロジェクトがプロジェクトスケジュールに従っている場合、終了予定日は週の最初の作業日に調整されます。
計画された期間	プロジェクト内のタスクの予定期間。タスクを追加すると、フィールドの値がタスクの期間から計算されます。期間はプロジェクトスケ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォームの [日付] セクション (続く)

フィールド	説明
	ジュールも考慮し、スケジュール内の非作業時間を考慮します。 **注:** プロジェクトプロパティの[プロジェクト/プロジェクトタスクに許可された最大期間 (日数) **(Max duration (in days) allowed for a project/project task)]** は、プロジェクトの計画期間の動作を制御します。 たとえば、標準的な 8 時間の作業日でデフォルトのスケジュールが使用されている場合、7 月 1 日の午前 8 時に開始して 7 月 2 日の正午に終了するプロジェクトは、28 時間ではなく、1 日と 4 時間として計算されます。
計画工数	プロジェクトの完了までにかかる推定時間。この計算では、このプロジェクトのすべてのタスクとストーリー (アジャイルおよびハイブリッドプロジェクトの場合) の計画工数の値が合計されます。タスクを追加すると、このフィールドは読み取り専用になってロールアップ計算が適用され、以前に行った入力が上書きされます。
開始実績日時	計画タスクが開始される日付。 実開始日と実終了日の時間コンポーネントは、実際の日付を手動で入力するときの [初期設定] タブの [予定日から時間コンポーネントを取得 **(Derive time component from planned dates)]** フィールドの値によって異なります。 ただし、プロジェクトの [ステータス] または [完了率] を変更すると、予定日からコピーされた時間コンポーネントが実際の日付に自動的に入力されます。この場合、[予定日から時間コンポーネントを取得 **(Derive time component from planned dates)]** フィールドの値は、実際の日付の時間コンポーネントには影響しません。
終了実績日時	計画タスクが終了する日付。
実際の期間	プロジェクト開始からプロジェクト終了までのプロジェクトタスクの期間。計画期間と同様に、実際の期間には合計プロジェクト時間が表示され、プロジェクトスケジュールが考慮されます。
実績工数	このプロジェクトでリソースに課される実際の時間数。タイムカードアプリケーションを使用している場合は、このフィールドの値が自動的

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォームの [日付] セクション (続く)

フィールド	説明
	に計算されます。プロジェクトとそのすべてのタスクで作業したすべてのリソースの承認済みタイムカードからの作業時間の合計を使用します。 **注:** アジャイルおよびハイブリッドプロジェクトのストーリーからの実績工数も、プロジェクトの実績工数にロールアップされます。 [初期設定] タブで [タイムカードから実績工数を更新する] フィールドが [はい] に設定されている場合、このフィールドは編集できません。

プロジェクトフォームの [詳細] セクション

フィールド	説明
ポートフォリオ	プロジェクトが属するプライマリポートフォリオ。1 つのプロジェクトが複数のポートフォリオに属することができます。 **注:** • [ポートフォリオ] フィールドが設定されていないプロジェクトが、ポートフォリオフォームを使用してポートフォリオに関連付けられている場合、ポートフォリオ名が [ポートフォリオ] フィールドに入力されます。 • ポートフォリオが削除されると、ポートフォリオ名は、プロジェクトフォームの [ポートフォリオ] フィールドから削除されます。
プログラム	プロジェクトが属するプログラム。 **注:** [ポートフォリオ] フィールドが設定されていない場合は、システム内のすべてのプログラムのリストから選択できます。[ポートフォリオ] フィールドが設定されている場合、他のポートフォリオに属するプログラムを選択することはできません。
投資クラス	プロジェクトにアサインされている投資クラスカテゴリのタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォームの [詳細] セクション (続く)

フィールド	説明
	• 実行：既存のビジネスを維持するために行われる投資。 • 変更：ビジネスに変更を実施するために行われる投資。
投資タイプ	プロジェクトの投資タイプ。 • コストの削減 • エンドユーザーエクスペリエンス • 法務と規制 • 収益化 • サービスの維持 • 戦略実現 • 人工知能
実行タイプ	プロジェクトの実施に使用される実行方法：[ウォーターフォール]、 [アジャイル]、および [ハイブリッド]。 デフォルト値は [ウォーターフォール]です。 [実行タイプ] フィールドの選択によって、使用可能な関連リンクと関連リストが決まります。たとえば、[実行タイプ] の値を [アジャイル] に設定すると、[アジャイル計画および追跡] 関連リンクが表示されます。これらの関連リンクと関連リストを表示するには、アジャイル開発 2.0 や テスト管理 などの適切なプラグインが必要です。また、これらの関連リンクと関連リストを使用するための適切なロールも必要です。
デマンド	プロジェクトの作成元のデマンド。このフィールドは、プロジェクトにデマンドが関連付けられている場合にのみ表示されます。 **注:** デマンドがプロジェクトに変換されると、[ビジネスケース] タブのデータが、デマンドからプロジェクトに引き継がれます。
フェーズ	プロジェクトの現在のフェーズ。 [フェーズ] フィールドに加えて、さまざまなプロジェクトフェーズも各プロジェクトレコードの上部に表示されます。選択したフェーズが強調表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォームの [詳細] セクション (続く)

フィールド	説明
	デフォルトのフェーズは、 [開始中]、[計画中]、[実行中]、[展開中 **(Delivering)]**、および [終結] です。
部門	プロジェクトが属する事業部門の部門。
事業部門	プロジェクトが属する事業部門。
影響を受ける事業部門	プロジェクトの影響を受ける事業部門。
ビジネスケイパビリティ	プロジェクトで 1 つ以上のビジネス機能を変更、拡張、または追加する場合は、それらの機能をプロジェクトに関連付けることができます。ビジネス機能 は、アプリケーションポートフォリオ管理 モジュールで定義されます。
ビジネスアプリケーション	プロジェクトで 1 つ以上のビジネスアプリケーションを変更、拡張、または追加する場合は、それらのアプリケーションをプロジェクトに関連付けることができます。ビジネスアプリケーション は、アプリケーションポートフォリオ管理 モジュールで定義されます。 [ビジネス機能] フィールドで選択した機能に関連しているかどうかに関係なく、企業内の任意のビジネスアプリケーションを選択できます。

プロジェクトフォームの [ビジネスケース] セクション

フィールド	説明
戦略	プロジェクトが達成する組織の戦略的目標。1 つのプロジェクトで複数の戦略的目標を達成することができます。 プロジェクトの事業部門が [詳細] タブで選択されている場合、選択した事業部門のビジネス戦略が他の企業戦略とともにリストに表示されます。
目標	選択した戦略に関連付けられた目標。1 つのプロジェクトで複数の目標を達成することができます。 戦略が選択されていない場合は、すべての目標がリストに表示されます。
ビジネスケース	プロジェクトを支えるビジネス上のテーマ。
実行リスク	プロジェクトが実施された場合に伴うリスク。
不実行リスク	機会を失うリスクなど、プロジェクトが実施されない場合に伴うリスク。
実現要因	プロジェクトの主要な実現要因。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォームの [ビジネスケース] セクション (続く)

フィールド	説明
バリア	プロジェクトの主要なバリア。
スコープの範囲内	プロジェクトの範囲。スコープは、プロジェクトの範囲を定義する一連の境界です。
スコープの範囲外	プロジェクトの範囲に含まれないアクティビティまたは成果物。スコープに定義されていないものはすべてスコープの範囲外です。
仮定	プロジェクトのために作成された仮定。仮定は、スコープとリスクを定義したり、時間とコストの予測を微調整したりするのに役立ちます。

プロジェクトフォームの [財務] セクション

フィールド	説明
レートモデル	プロジェクトにアサインされたレートモデル。レートモデルは、関連付けられたリソース計画とタイムカードの時間単価を算出するのに使用します。 デマンドからプロジェクトを作成すると、レートモデルがデマンドからプロジェクトにコピーされます。 プロジェクト内のサブプロジェクトは、トップタスクに関連付けられたレートモデルからリソース計画の計算を導き出します。 割り当てられたレートモデルが削除または置換された場合、またはレートモデルの時給が変更された場合、関連するリソース計画のコストフィールドは自動的に再計算されません。[リソースコストを再計算] メニューオプションを使用してプロジェクト内のすべてのリソース計画のコストを更新し、レートモデルの新しいレートを反映させる必要があります。 また、一度に 1 つのリソース計画のコストを更新することもできます。
合計計画コスト	プロジェクトのコスト概算。 運用支出、資本的支出、またはその両方がプロジェクトに関連付けられている場合、計画コストは、プロジェクトに対して選択した通貨による運用支出と資本的支出の合計です。 アジャイルおよびハイブリッドプロジェクトでは、アジャイルアサイン先グループのリソース計画が作成されるときに、ストーリーの計画コストが考慮されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォームの [財務] セクション (続く)

フィールド	説明
	注: アジャイルアサイン先グループのリソース計画を作成するには、グループに pps_resource ロールをアサインする必要があります。
計画投資	プロジェクトの資本的支出 (投資)。プロジェクトに関連付けられているコスト計画がない場合、[計画投資] フィールドが編集可能です。通貨タイプを選択して、値を入力します。
計画経費	プロジェクトの運用支出 (経費)。プロジェクトに関連付けられているコスト計画がない場合、[計画経費] フィールドが編集可能です。通貨タイプを選択して、値を入力します。
予算コスト	このプロジェクトの予算コスト。このフィールドは、コスト計画明細テーブルのプロジェクト予算明細から自動的に入力されます。プロジェクト資金が会計年度に割り当てられると、コスト計画明細には各会計期間の予算割り当てが保存されます。これらの金額はロールアップされ、予算コストに保存されます。 手動で値を入力するには、通貨アイコンを選択して値を入力します。
実績コスト	このプロジェクトの実績コスト。通貨アイコンを選択して、値を入力します。
完了時の推定 (EAC)	過去の会計期間のすべての実績の合計と将来の会計期間の計画コストを加算した値。 **注:** EAC の計算上では、現在の月は将来の月と見なされます。 たとえば、プロジェクトの期間が 1 月 1 日から 12 月 31 日で、5 月の完了時の推定 (EAC) を確認する場合、1 月から 4 月までの実績の合計 + 5 月から 12 月までの計画コストの合計として計算されます。
計画利益	プロジェクトの計画利益。 この値は、プロジェクトの利益明細からロールアップされます。 また、値を手動で入力することもできます。通貨アイコンを選択して、値を入力します。
予定リターン	予定リターンの値は、計画利益と計画コスト値の差から導出されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォームの [財務] セクション (続く)

フィールド	説明
	([計画利益] フィールドの値 – [計画コスト] フィールドの値。)
計画 ROI (%)	ROI (投資利益率) のパーセンテージ結果は、[予定リターン] フィールドと [コスト概算] フィールドの値に基づいて計算されます。 (予定リターン / コスト概算 x 100)
割引率 (%)	プロジェクトの割引率。 割引率は、将来のキャッシュフローの現在価値を決定するための利率です。
正味現在価値	所定の年利に基づく将来のキャッシュの現在価値。 この値は、現在の支出額を将来予想される予定利益と比較するための指標です。この情報は、投資成果全体を評価する際に役立ちます。 たとえば、12% の割引率では、今日の 1.00 ドルは、2 年後の 0.80 ドルに相当します。したがって、2 年後に 1.00 ドルを受け取ることは、今日 0.80 ドルを受け取ることと同じです。 正味現在価値 (NPV) は、年間コスト概算、年間計画利益、およびプロジェクトの割引率から計算されます。
内部利益率 (%)	ゼロ NPV を達成するために必要な年利。 内部利益率 (IRR) は、どのプロジェクトが収益の観点からより高い利益率を実現できるかを判断するのに役立ちます。
ETC	将来の会計期間のすべての計画コストの合計。 EAC や ETC の値を計算する頻度を定義して、経費ラインと一致させることができます。移動先 システム定義 > スケジュール済みジョブをクリックし、[プロジェクト完了見積を計算] ジョブを選択し、[実行] リストを使用して頻度を設定します。 **注:** ETC の計算上では、現在の月は将来の月と見なされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォームの [スコア] セクション

フィールド	説明
リスクスコア	プロジェクトリスクに基づいて計算されます。
ビジネス価値スコア	プロジェクトの ROI (%) に基づいて計算されます。
サイズスコア	[計画コスト] フィールドの値に基づいて計算されます。
スコア	属性 [リスクスコア]、[ビジネス価値スコア]、および [サイズスコア] の個々のスコアに基づいて計算されます。また、これらの属性はそれぞれ、プロジェクトのリスク属性、計画 ROI (%) 属性、およびコスト概算属性に基づいて計算されます。 **注:** • スコアの計算式を設定できます。 • デマンドがプロジェクトに変換されると、デマンドに基づいて計算されたスコアがプロジェクトに引き継がれます。

プロジェクトフォームの [メモ] セクション

フィールド	説明
ウォッチリスト	プロジェクトの通知に登録しているユーザー。
作業メモリスト	プロジェクトの作業メモが更新されたときにメール通知を受け取ることを選択したユーザー。
アクティビティ / 作業メモ	プロジェクトの進捗に伴うマイルストーン、障害、または変更に関する情報。[アクティビティ] フィールドにメモを入力し、[作業メモ] を選択します。テキストがフィードに表示されます。

プロジェクトフォームの [設定] セクション

フィールド	説明
タイムカードレポートを有効にする	プロジェクトタスクのタイムカードを作成できるレベル： • プロジェクトのみ：プロジェクトのすべてのタイムカードは、プロジェクトレベルでのみ作成されます。たとえば、ユーザーがプロジェクト内の複数のタスクにアサインされている場合、すべてのタスクに費やされた時間は、プロジェクトの 1 つのタイムカードにのみ記録されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォームの [設定] セクション (続く)

フィールド	説明
	注: タイムシートポータル では、タスクとプロジェクトが [タスク] タブに一覧表示されます。これらのタスクでは、[タイムシートに追加] および [選択項目をタイムシートに追加] オプションは使用できません。[クイック追加] オプションのみを使用できます。[クイック追加] を選択すると、タイムカードがタスクではなくトッププロジェクトに対して作成されます。 • プロジェクトタスクのみ：計画された各タスクに対応する個別のタイムカードが作成されます。 注: タイムシートポータルでは、[タイムシートに追加]、[クイック追加]、および [選択項目をタイムシートに追加] オプションをプロジェクトに使用できません。 • プロジェクトおよびプロジェクトタスク：タイムカードは、プロジェクトレベルおよびプロジェクトタスクレベルで作成できます。デフォルト値は **true** です。 • 時間レポートなし：プロジェクトのタイムカードは作成されません。ユーザーがタイムカードを手動で送信すると、ビジネスルールにより、ユーザーはタイムカードを送信できません。 注: タイムシートポータルでは、[タイムシートに追加]、[クイック追加]、および [選択項目をタイムシートに追加] オプションを、プロジェクトにもプロジェクトタスクにも使用できません。
タイムカードから実績工数を更新する	[日付] タブの [実績工数] フィールドを、プロジェクトのタイムカードに入力された時間に基づいて更新するかどうかを決定します。 フィールドが [はい] に設定されている場合、[実績工数] フィールドは編集できません。[いいえ] に設定されている場合、タイムカードの実際の時間はプロジェクトとタスクにロールアップさ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォームの [設定] セクション (続く)

フィールド	説明
	れません。デフォルトでは、このフィールドは [いいえ] に設定されています。
計算	タスクの依存関係に使用する計算のタイプ： • マニュアル：依存関係に加えられた変更は、タスクの日付には反映されません。 • 自動：依存タスクまたは子タスクに加えられた変更を反映して、タスクの日付が自動的に更新されます。
プログラムステータスレポートに表示	プロジェクトとその主要な要素 (コスト、リソース、スコープ、スケジュールなど) をプロジェクトが属するプログラムのステータスレポートに含めるかどうかを指定するオプション。 デフォルト：オン
制約日付	プロジェクトの開始予定日を表示する読み取り専用フィールド。このフィールドの日付は、 [すぐに開始] 制約のあるタスクの開始日を計算するために使用されます。 [プロジェクト移動] 関連リンクを使用して、制約日を変更します。この日付を変更すると、 [すぐに開始] 制約のあるすべてのタスクの開始日も変更されます。詳細については、「プロジェクトの開始予定日の変更」を参照してください。
リソース計画から担当者リストを作成	プロジェクトフォームおよびプロジェクトタスクフォームの [アサイン先] および [他のアサイニーリスト] フィールドのリソースを、関連する割り当て済みリソース計画からのみ作成するように制約するオプション。
プロジェクト変更時にスコアを再計算する	プロジェクトスコアを再計算して更新するかどうかを決定します。 • このフィールドの値が [はい] に設定されている場合、プロジェクトの計画 ROI (%)、コスト概算、またはリスクが変更されると、プロジェクトスコアが再計算されます。 • このフィールドの値が [いいえ] に設定されている場合、プロジェクトの計画 ROI (%)、コスト概算、またはリスクが変更されても、プロジェクトスコアは同じままです。ユーザーがプロジェクトをデマンドに変換する際にスコア値を保持したい場合は、このフィールドの値を [いいえ] に設定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォームの [設定] セクション (続く)

フィールド	説明
プロジェクトのスケジュール日付形式	計画コンソールの日付を時間コンポーネントとともに表示するかどうかを決定します。デフォルト値は [日付] です。
計画期間から時間コンポーネントを派生	実開始日と実終了日の時間コンポーネントを、開始予定日と終了予定日の時間コンポーネントからコピーする必要があるかどうかを決定します。デフォルトでは **true** に設定されています。 [プロジェクトのスケジュール日付形式] フィールドが [日付] に設定されている場合、このオプションが選択され、無効になります。 **注:** プロジェクトの [ステータス] または [完了率] の値を変更すると、予定日からコピーされた時間コンポーネントが実際の日付に自動的に入力されます。この場合、[予定日から時間コンポーネントを取得 **(Derive time component from planned dates)**] フィールドの値は、実際の日付の時間コンポーネントには影響しません。このフィールドの値は、実際の日付を手動で入力した場合にのみ時間コンポーネントに影響します。

プロジェクトフォームの [リスクの概要] セクション

フィールド	説明
固有リスク	リスクアセスメントから自動的に計算された固有リスクのスコア。
残存リスク	リスクアセスメントから自動的に計算された残存リスクのスコア。
固有ヒートマップ	固有リスクのヒートマップ。
残存ヒートマップ	残存リスクのヒートマップ。

関連情報

プロジェクトの開始

[End]

プロジェクトタスクフォーム

プロジェクトタスクフォームのフィールドについて説明します。プロジェクトポートフォリオ管理 がアクティブで、プロジェクトフォームが [基本 **(Basic)**] ビューの場合、フィールドが表示されます。フィールドを表示するようにフォームを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトタスクフォーム

フィールド	説明
簡単な説明	プロジェクトタスクの簡単な説明。
番号	設定可能なプリフィックス付きのシステム生成番号。
ステータス	プロジェクトタスクのステータス。 ステータスは、タスクの終了予定日の現在の日付からの差異に基づいて自動的に更新されます。終了予定日が近づくと、ステータスの色が変わります。 • 緑色：プロジェクトタスクの終了予定日が、定義したオフセット作業日より長くなっています。 • 黄色：プロジェクトタスクの終了予定日が、定義したオフセット作業日より短くなっています。 • 赤色：プロジェクトタスクの終了予定日が、定義したオフセット作業日を過ぎています。 ステータス計算のデフォルトのオフセットは 3 営業日です。*com.snc.ppm.yellow_status_duration* プロパティを更新して、オフセット期間を変更できます。プロジェクトスケジュールによって作業日が決まります。 **重要:** プロジェクトタスクのステータスはプロジェクトの全体的なステータスには影響しません。つまり、プロジェクトタスクのステータスはプロジェクトにロールアップされません。また、子タスクのステータスは親タスクのステータスには影響しません。 [*Update Active Project Task Status*] スケジュール済みジョブを実行して、既存のタスクのステータスを更新します。このスケジュール済みジョブは、デフォルトでは毎日実行されますが、このジョブをオンデマンドで実行することもできます。 タスクのステータスを自動的に更新しない場合は、タスクのステータスを手動で変更できます。ステータスを手動で変更すると、自動更新が上書きされます。スケジュール済みジョブの実行によってプロジェクトタスクのステータスが変更されることはありません。 **注:** ステータスの自動更新のタスクタイプを含めるか除外するには、プロパティ *com.snc.status_process_planned_task_entities* を設定します。
上書きステータス	プロジェクトタスクのステータスが手動で更新されるかどうかを示します。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。[ステータス] フィールドを手動で変更すると、このチェックボックスがオンになります。
状況	プロジェクトの現在のステータス。ステータスには、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] などがあります。 ステータスは、プロジェクトタスクから自動的にロールアップされます。詳細については、「プロジェクト計算」と「親子ロールアップタスクの計算」を参照。
説明	プロジェクトタスクの詳細な説明。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトタスクフォーム (続く)

フィールド	説明
担当者	プロジェクトタスクにアサインされたユーザー。次の条件が適用されます。 • アサイン先グループが定義されている場合、アサイン先グループ内のユーザーのみがルックアップリストに表示されます。 • スキルが定義されている場合、それらのスキルを持つユーザーのみがルックアップリストに表示されます。 • アサイン先グループまたはスキルが定義されていない場合は、プロジェクト管理 (PM)アプリケーションのユーザーロールのいずれかを持つユーザーのみがルックアップリストに表示されます。 • timecard_user ロールを持つユーザーもルックアップリストに表示されます。
アサイン先グループ	プロジェクトタスクにアサインされたユーザーグループ。
他の受託者リスト	プロジェクトタスクにアサインされた追加ユーザー。
完了率 (%)	プロジェクトタスクの完了済みの作業の割合。

[詳細] タブ

フィールド	説明
マイルストーン	タスクをマイルストーンに変換するためのオプション。
主要マイルストーン	タスクを主要マイルストーンに変換するためのオプション。
スケジュール外の日付を許可	プロジェクトタスクが、週末などのスケジュール外の日 (通常のプロジェクトスケジュール外) に開始および終了するように設定されているかどうかを示します。オフスケジュールタスクは、1 日中いつでも任意の曜日に開始できます。 たとえば、「月曜日から金曜日の 8:00 ～ 17:00」のプロジェクトスケジュールを使用し、期間 2 日間のプロジェクトタスクを土曜日に開始する必要がある場合、オフスケジュールタスクを土曜日にスケジュールし、日曜日に終了することができます。同様に、期間 3 日間のタスクを金曜日に開始した場合、オフスケジュールは火曜日ではなく、日曜日に終了します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[詳細] タブ (続く)

フィールド	説明
	このオプションは、親タスクに対しては有効ではありません。親タスクのこのフィールドの値は、子タスクから派生します。 **注:** • プロジェクトで定義されているスケジュールがない場合、オフスケジュールタスクとオンスケジュールタスクの間に違いはありません。 • 通常スケジュールのタスクでは 1 日は 8 時間で、スケジュール外タスクでは 24 時間です。

[日付] タブ

フィールド	説明
開始予定日時	プロジェクトタスクの推定開始日時。この日付は、[時間の制約] が [特定の日に開始]、[以下以降に開始]、または [以下以前に開始] の場合に編集できます。 制約タイプが [すぐに開始] または [以下以前に開始] である場合、タスクの開始予定日を変更すると、制約タイプが [以下以降に開始] に変更されます。
終了予定日	プロジェクトタスクの推定終了日時。 手動プロジェクトの場合、プロジェクトタスクの実開始日を更新しても、終了予定日は更新されません。プロジェクトプロパティの [予定日の手動プロジェクトの実績での変更を有効にする **(Enable alter of planned date with Actual for Manual Project)]** を有効にすると、実開始日および計画期間から終了予定日が更新されます。
計画された期間	プロジェクトタスクの推定所要時間 (開始時間から終了時間まで)。
計画工数	このタスクの完了までにかかる推定時間。子タスクを追加すると、このフィールドは読み取り専用になって計算がロールアップされ、以前に行った入力が上書きされます。
制約日付	[以下以降に開始]、[以下以前に開始]、および [特定の日に開始] 制約のあるタスクの開始日を決定する読み取り専用フィールド。[プロジェクト移動] 関連リンクを使用して、この日付を変更します。詳細については、「プロジェクトの開始予定日の変更」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[日付] タブ (続く)

フィールド	説明
元の開始日	タスクの元の開始予定日時。
開始実績日時	プロジェクトタスクが開始された日付。実開始日が入力されると、タスクは [対応中] に設定されます。 タスクの [ステータス] または [完了率 **(%)**] を変更すると、予定日からコピーされた日付コンポーネントが実際の日付に自動入力されます。 プロジェクトフォームの [予定日から時間コンポーネントを取得] フィールドが True に設定されている場合、実開始日と実終了日を入力すると、実際の日付の時間コンポーネントはデフォルトで予定日の日付コンポーネントに設定されます。
実終了日	プロジェクトタスクが終了した日付。実終了日が入力されると、タスクは [完了してクローズ] に設定されます。
実際の期間	タスクの開始からクローズまでのタスクの期間。計画期間と同様に、実際の期間には合計タスク時間が表示されます。
実績工数	このプロジェクトタスクでリソースから課される実際の時間数。タイムカード Management アプリケーションを使用している場合、このフィールドの値はアプリケーションから自動的に取得されます。アプリケーションは、タスクで作業したすべてのリソースのすべての承認済みタイムカードから合計作業時間を取得することで、タスクの実績工数を計算します。
時間の制約	プロジェクトタスクが開始されると、次のようになります。 • すぐに開始：関係と依存関係によって決められたとおりに、タスクはできるだけ早く開始されます。これらのタスクの日付は、プロジェクトの制約日付から導出されます。 • 特定の日に開始：タスクは指定した日付に開始されます。タスクの依存関係は、日付の計算では考慮されません。 • 以下以降に開始：タスクは制約日付以降に開始されます。 • 以下以前に開始：タスクは制約日付以前に開始されます。開始日は、関係と依存関係によって決まります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[日付] タブ (続く)

フィールド	説明
	注: プロジェクトフォームの [計算] フィールドが [手動] に設定されている場合、そのようなプロジェクトの制約タイプを変更することはできません。制約タイプを変更するには、プロジェクトを [自動] に変更します。
元の終了日	タスクの元の終了予定日時。

[メモ] タブ

フィールド	説明
アクティビティ / 作業メモ / 追加コメント	プロジェクトの進捗に伴うマイルストーン、障害、または変更に関する情報。[アクティビティ] フィールドにメモまたはコメントを入力し、[追加コメント] または [作業メモ] をクリックします。テキストがフィードに表示されます。

[チェックリスト] タブ

フィールド	説明
Checklist (チェックリスト)	完了する必要があるタスクのアイテムを追跡するためのチェックリスト 。

関連情報

プロジェクトからのプロジェクトタスクの作成

プロジェクトテンプレートフォーム

プロジェクトテンプレートフォームのフィールドについて説明します。

プロジェクトテンプレートフォームのフィールド

フィールド	説明
名前	プロジェクトテンプレートの名前。
テーブル	表示専用。テンプレートはプロジェクトテーブルに基づいています。
説明	プロジェクトテンプレートの簡単な説明。
テンプレート	テンプレートに含めるフィールドの列とフィールド値が含まれます。左側の列でフィールドを選択し、目的のフィールド名を選択してから、右側の列のフィールドを選択してフィールド値を入力します。フィールドの追加情報が必要な場合は、3 列目にフィールドが表示されます。たとえば、金銭フィールドで通貨を識別する場合などです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトテンプレートフォームのフィールド (続く)

フィールド	説明
	• フィールドの右側にある **[X]** を選択して、そのフィールドをテンプレートから削除します。 • 新しいフィールドを追加するには、リストの下部にある空白のフィールドを使用します。

関連リンク

フィールド	説明
プロジェクト作成	このプロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成します。
テンプレートをコピー	このプロジェクトテンプレートのコピーを作成します。

関連リスト

フィールド	説明
プロジェクトテンプレートタスク	プロジェクトテンプレートタスクのリスト。
添付ファイル	テンプレートに添付されているファイル。

プロジェクトテンプレート構成フォームのフィールド

フィールド	定義
テーブル	テンプレートのパラメーター化されるエンティティ。
親テーブル	このアイテムの親テーブル。
リンク要素	テーブルを親テーブルとリンクするフィールド。
有効	このアイテムがテンプレートに含まれていることを示すチェックボックス。
要素	テンプレートに含まれる [テーブル] フィールドで選択されたテーブルのフィールドのカンマ区切りリスト。

[計画立案属性] フォーム

計画立案属性を変更するには、[計画立案属性] フォームのフィールドを使用します。

[計画立案属性] フォーム

フィールド	説明
属性タイプ	属性タイプのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[計画立案属性] フォーム (続く)

フィールド	説明
	• リソース：プロジェクトのリソースまたは財務の属性を使用する場合。 • タスク：属性を使用して人件費のみを生成する場合。
属性名	属性の名前。
リソース管理で有効にする(Enable for resource management)	リソース計画立案の属性を有効にするオプション。 このオプションはデフォルトで選択されています。
財務で有効にする (Enable for financials)	ファイナンシャルプランの属性を有効/無効にするオプション。 注: • 財務の属性を有効にするには、リソース管理に対して有効にする必要があります。 • 進行中のプロジェクトの財務属性を無効にするには、既存の人件費計画をすべて削除し、財務の属性を無効にして、人件費計画を再生成します。
属性テーブル	デフォルトの属性テーブルは、属性の情報のソースとなる従業員プロファイルです。
属性フィールド	属性を定義する [従業員プロファイル] テーブルの要素名。 フォームを保存した後、選択したフィールド値に関連するルックアップテーブルが [計画立案属性列構成] テーブルに表示されます。 列のそれぞれのフィールド名を入力して、属性をアクティブ化します。
有効	計画立案のために属性を有効化して使用するオプション。
タスク属性テーブルとフィールド	タスク属性のテーブル名とフィールド値。 このフィールドは、タスクタイプ属性の作成時にのみ表示されます。

関連情報

計画立案属性の作成または編集

計画タスク関係 **(Planned Task Relationship)** フォーム

計画タスク関係 (Planned Task Relationship) フォームのフィールドについて説明します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

計画タスク関係 **(Planned Task Relationship)** フォームのフィールド

フィールド	説明
前任者	関係における先行タスク、つまり決定要因。新しいタスクを選択できます。ただし、関係を削除し、正しいタスク間に新しい関係を作成することをお勧めします。
後任	関係における後続タスク。後続タスクは先行タスクに依存します。新しいタスクを選択できます。ただし、関係を削除し、正しいタスク間に新しい関係を作成することをお勧めします。
タイプ	関係のタイプ。常に **[Predecessor of::Successor of]** です。この値は変更しないでください。
サブタイプ	依存関係のタイプ。
遅れ	タスク間の遅延時間。遅延の日、時、分、秒を入力します。遅延時間は正または負にできます。

関連情報

プロジェクトタスクの依存関係の変更

ポータルボードウィジェットフォーム

ポータルボードウィジェットフォームのフィールドについて説明します。

ポータルボードウィジェットフォーム

フィールド	説明
名前	構成するウィジェットの一意の名前。
順番	ウィジェットが投資ボードと [投資ポータル] ページの両方に表示される順序。小さい数値は大きな数値より前に配置されます。 たとえば、順序が 100 に設定されたウィジェットは、順序が 200 に設定されたウィジェットの前に表示されます。
アグリゲートタイプ	投資ウィジェットの計算に適用されるアグリゲーションのタイプ： 合計、平均、最小、最大、および カウント。 たとえば、A、B、C の 3 つのプロジェクトの実績コストを集計し、フィルターで表示するとします。実績コストは、プロジェクト A が 1000、プロジェクト B が 2000、プロジェクト C が 3000 です。 アグリゲートタイプとして合計が選択されている場合、実績コストのメトリクス値は 6000 になります。アグリゲートタイプとして平均が選択されている場合、実績コストのメトリクス値は 2000 になります。アグリゲートタイプとして最小が選択されている場合、実績コストのメトリクス値は 1000 になります。アグリゲートタイプとして最大が選択されている場合、実績コストのメトリクス値は 3000 になります。アグリゲートタイプとしてカウントが選択されている場合、実績コストのメトリクス値は 3 になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポータルボードウィジェットフォーム (続く)

フィールド	説明
スクリプト化	投資ウィジェット計算のスクリプトを指定するためのチェックボックス。
ラベルを表示	ラベルまたはカラーインジケーターを表示するためのチェックボックス。 このチェックボックスをオフにすると、[色] フィールドが表示され、色を設定できます。
有効	投資ウィジェットがアクティブであることを示すためのチェックボックス。
ボードに表示	投資ボードに投資ウィジェットを表示するためのチェックボックス。
親ウィジェット	この投資メトリクスウィジェットの親ウィジェット。親ウィジェットは、最大 3 つの子ウィジェットを持つことができます。
デフォルトで含める	アクティブな投資ウィジェットの表示をデフォルトでオンにするためのチェックボックス。 • 新しいボード • ウィジェット選択が構成されていない既存のボード チェックボックスはデフォルトでオンになっています。 投資ボードでウィジェットを構成する方法の詳細については、「ウィジェット構成」を参照してください。
簡単な説明	投資ウィジェットに関する簡単な説明。
スクリプト	投資ウィジェットの動的計算用に作成されたスクリプト。このフィールドは、[スクリプト化] チェックボックスがオンになっている場合にのみ表示されます。 次のスクリプトは、ウィジェットに表示する目的の出力を含む文字列を返します。次の 5 つの変数 (プログラムによりスクリプトに組み込まれる) が利用可能です。 • projectFilter：投資ポータルボードのプロジェクトフィルター。 • demandFilter：投資ポータルボードのデマンドフィルター。 • projectClass：チームスペース値の評価時に使用される投資ポータルボードのプロジェクトクラス。Teamspace1 ポータルボードの tsp1_project を返します。 • demandClass：チームスペース値の評価時に使用される投資ポータルボードのデマンドクラス。Teamspace1 ポータルボードの tsp1_demand を返します。 • boardSysId：投資ポータルボードの SysId。必要に応じて、投資ポータルボードの詳細情報へのアクセスを提供します。 プロジェクトコストのスクリプト化されたウィジェットのサンプル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポータルボードウィジェットフォーム (続く)

フィールド	説明

	totalProjectCost();
	
	function totalProjectCost()
	{
	var totalCost = 0;
	
	if(!JSUtil.nil(projectClass) && !JSUtil.nil(projectFilter))
	{
	var projectGa = new GlideAggregate(projectClass);
	projectGa.addEncodedQuery(projectFilter);
	projectGa.setGroup(false);
	projectGa.addAggregate('SUM', 'cost');
	
	projectGa.query();
	
	if(projectGa.next())
	{
	if(projectGa.getAggregate('SUM', 'cost'))
	totalCost += parseFloat(projectGa.getAggregate('SUM', 'cost'));
	}
	}
	return PPMCurrencyHelper.defaultCurrencySymbol() +
	PPMCurrencyHelper.getFormattedAmount(totalCost);
	}

ポータルボードウィジェットフォームの [プロジェクト] セクション

フィールド	説明
プロジェクトアグリゲート列	集計は、プロジェクト [pm_project] テーブルの選択した列に適用されます。
プロジェクトテーブル	プロジェクトがフィルターされるテーブル。
プロジェクトフィルター	プロジェクトテーブルからプロジェクトをフィルターするために適用される基準。

ポータルボードウィジェットフォームの [デマンド] セクション

フィールド	説明
デマンドアグリゲート列	集計は、デマンド [dmn_demand] テーブルの選択した列に適用されます。
デマンドテーブル	デマンドがフィルターされるテーブル。
デマンドフィルター	デマンドテーブルからデマンドをフィルターするために適用される基準。

関連情報

ウィジェットとしての投資メトリクスの設定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求 (RIDAC) フォーム

RIDAC フォームのフィールドについて説明します。

リスクフォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成 ID 番号。
状況	リスクの現在のステータス。すべての新しいリスクは、[処理待ち] ステータスで作成されます。 使用可能な状況は、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] です。
リスクステータス	リスクのステータス。リスクが達成されているか、緩和されているか、受け入れられているかなど、リスクの現在のステータスに関する情報を提供します。 使用可能なオプションは、[処理待ち]、[達成]、[未達成]、[回避]、[軽減 (Mitigate)]、[転送]、および [承認] です。
確率 (Probability)	リスクに記載されているイベントが発生する可能性。使用可能なオプションは、[絶対]、[高]、[中]、および [低] です。
影響	プロジェクトの結果に対するリスクイベントの影響。
コスト概算	リスクイベントによって生成されるコスト概算。
リスクのランク	リスクにアサインされた値と色。この値は、リスクの確率と影響度を使用して計算されます。リスク値のルックアップを使用して色と値を設定できます。詳細については、「プロジェクトのカスタムのリスクランクとリスク値の設定」を参照してください。
リスクオーナー (Risk owner)	リスクの監視と管理を担当するプライマリリソース。
担当者	リスクの対応をアサインされたプライマリリソース。
リスク値	リスク値のルックアップから計算された値。詳細については、「プロジェクトのカスタムのリスクランクとリスク値の設定」を参照してください。
期日	アサインされたリソースへのリスク解決の要求日、またはリソースにアサインされていない場合にリスクをクローズまたは対処する必要がある日付。
プロジェクトステータスレポートに表示	リスク情報をプロジェクトステータスレポートに含めるかどうかを指定するオプション。
タスク	このリスクが属するプロジェクト。
簡単な説明	イベント、およびイベントがプロジェクトの成功に与える潜在的な影響の簡単な説明。リスクがリスクライブラリーから作成されている場合、このフィールドにはリスクステートメント名が表示されます。
説明	イベントとその潜在的な影響の詳細。リスクがリスクライブラリーから作成されている場合、このフィールドにはリスクステートメントの簡単な説明が表示されます。
実績コスト	リスクイベントによって生成されたコスト。この情報は、イベントが発生した場合に追加されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リスクフォーム (続く)

フィールド	説明
軽減計画 (Mitigation plan)	リスクを軽減するために行う取り組みの簡単な説明。

リスクフォームの [リスクアセスメントのサマリー] セクション

フィールド	説明
固有リスク	このフィールドには、リスク査定人が固有リスクを評価する場合のリスクスコアが自動的に入力されます。
エンタープライズリスクに昇格	このオプションは、プロジェクトマネージャーによってリスクがエンタープライズリスクに昇格されたときに自動的に選択されます。
残存リスク	このフィールドには、リスク査定人が残存リスクを評価する場合のリスクスコアが自動的に入力されます。
企業固有リスク (Enterprise inherent risk)	このフィールドには、リスク査定人が企業固有リスクを評価する場合のリスクスコアが自動的に入力されます。
企業残存リスク (Enterprise residual risk)	このフィールドには、リスク査定人が企業残存リスクを評価する場合のリスクスコアが自動的に入力されます。

問題フォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成 ID 番号。
状況	問題の現在のステータス。すべての新しい問題レコードは、[オープン] ステータスで作成されます。 使用可能なステータスは、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] です。
優先度	考えられる影響度に基づいて問題を解決または管理する緊急性。
コスト概算	問題によって生成されるコスト概算。
影響	問題が未解決のままである場合のプロジェクトの結果への影響。
期日	アサインされたリソースへの問題解決の要求日、またはリソースにアサインされていない場合に問題をクローズまたは対処する必要がある日付。
担当者	問題解決の対応をアサインされたプライマリリソース。
親	この問題が属するプロジェクト。
プロジェクトステータスレポートに表示	問題情報をプロジェクトステータスレポートに含めるかどうかを指定するオプション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

問題フォーム (続く)

フィールド	説明
簡単な説明	問題、および問題がプロジェクトの成功に与える潜在的な影響の簡単な説明。 問題のタイトルを入力し始めると、問題と一致する可能性がある関連する問題が表示されます。 提案アイコン ( ) を選択して、事前定義された問題の説明のリストから選択します。
説明	問題とその潜在的な影響の詳細。
作業メモ	問題解決のために完了した作業を記録および追跡するための情報。

意思決定フォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成 ID 番号。
状況	意思決定の現在のステータス。すべての新しい意思決定レコードは、[オープン] ステータスで作成されます。 使用可能な状況は、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] です。
優先度	考えられる影響度に基づいて意思決定を承認または実装する緊急性。
意思決定ステータス	意思決定のステータス。使用可能なオプションは、[処理待ち]、[承認済み]、および [却下] です。
影響	意思決定を実装しない場合のプロジェクトの結果への影響。
承認が必要	意思決定の承認が必要かどうかを決定するためのオプション。
コスト概算	意思決定を実装するためのコスト概算。
期日	意思決定を承認または実装する必要がある要求日。
担当者	意思決定の対応をアサインされたプライマリリソース。デフォルト値は、意思決定レコードを作成するユーザーの名前です。
親	この意思決定が属するプロジェクト番号。
プロジェクトステータスレポートに表示	意思決定情報をプロジェクトステータスレポートに含めるかどうかを指定するオプション。
簡単な説明	意思決定の内容、意思決定者、意思決定の影響、および意思決定の結果など、意思決定の簡単な説明。 意思決定のタイトルを入力し始めると、意思決定と一致する可能性がある関連する意思決定が表示されます。 提案アイコン ( ) を選択して、事前定義された意思決定の説明のリストから説明を選択します。
説明	意思決定とその潜在的な影響の詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

意思決定フォーム (続く)

フィールド	説明
作業メモ	意思決定の実装または承認のステータスを記録および追跡するための情報。

アクションフォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成番号。
状況	アクションの現在のステータス。すべての新しいアクションレコードは、ステータスを [オープン] に設定して作成されます。 使用可能なステータスは、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] です。
優先度	影響度に基づいてアクションを実装または承認する緊急性。
コスト概算	アクションによって生成されるコスト概算。
影響	アクションを実装しない場合のプロジェクトの結果への影響。
承認	アクションのステークホルダーからの承認のステータス。承認アドミンロールを持つユーザーは、承認のステータスのみを変更できます。
担当者	アクションを実装するためにアサインされたプライマリリソース。
期日	アクションを承認または実装する必要がある要求日。
親	このアクションが属するプロジェクト。
プロジェクトステータスレポートに表示	アクション情報をプロジェクトステータスレポートに含めるかどうかを指定するオプション。
簡単な説明	アクションで必要になる内容、アクションの実装方法、影響を受けるユーザー、およびアクションの結果など、アクションの簡単な説明。 アクションのタイトルを入力し始めると、アクションのタイトルと一致する可能性がある関連アクションが表示されます。 提案アイコン () を選択して、事前定義されたアクションのリストから説明を選択します。
説明	アクションとその潜在的な影響の詳細。
作業メモ	アクションに関する情報。作業メモを追加して、アクションの承認、却下、または実装のステータスについて他のユーザーとやり取りします。

変更要求フォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成 ID 番号。
状況	変更要求の現在のステータス。すべての新しい変更要求レコードは、[オープン] ステータスで作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変更要求フォーム (続く)

フィールド	説明
	使用可能な状況は、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] です。
優先度	影響度に基づいて要求された変更を承認する緊急度。
コスト概算	要求された変更によって生成されるコスト概算。
影響	要求された変更を承認しない場合のプロジェクトの結果への影響。
承認	要求された変更のステークホルダーからの承認のステータス。
担当者	変更要求の対応をアサインされたプライマリリソース。
期日	変更要求を完了するための要求日。
カテゴリ	変更要求の作成対象のエンティティ。オプションは、[リソース]、[スコープ]、[コスト]、および [スケジュール] です。
親	この変更要求が属するプロジェクト番号。
プロジェクトステータスレポートに表示	変更要求情報をプロジェクトステータスレポートに含めるかどうかを指定するオプション。
タイトル	変更要求のタイトル。
説明	変更要求とその潜在的な影響の詳細。
ビジネス上の根拠	プロジェクトで提案された変更を要求する理由とそのビジネスへの影響。
作業メモ	プロジェクトの変更要求の進捗状況を示す追加情報。

リスク値マッチャーフォーム

リスク値マッチャーフォームのフィールドについて説明します。

リスク値マッチャーフォーム

フィールド	説明
影響	リスクの影響度の値。 デフォルト値は次のとおりです。 • 1 = 高 • 2 = 中 • 3 = 低
アプリケーション	これらのリスク値が属するアプリケーション。
リスクランキングの色	リスクの重大度を示す色。 ヒント: 色のバリエーションを入力して、影響度と確率の値が類似しているリスクを区別できます。たとえば、重大度の低いリスクを示すために **[lightgreen]** と入力できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リスク値マッチャーフォーム (続く)

フィールド	説明
リスク値	指定されたリスクの影響度と確率の組み合わせの値。 オプションは、[高]、[中]、および [低] です。 この値は、リスクフォームの [リスク値] フィールドに表示されます。
確率 (Probability)	リスクの影響度値に関連付けるリスクの確率値。オプションは、[絶対]、[高]、[中]、および [低] です。
確率数	確率を示す数値。この値に [影響度] フィールドの値を乗算して、リスクのランクが計算されます。 デフォルト値は次のとおりです。 • 1 = 絶対 • 1 = 高 • 2 = 中 • 3 = 低 計算されたリスクのランクとリスクランキングの色は、リスクフォームの [リスクのランク] フィールドに表示されます。

[スケジュール済みスクリプト実行] フォーム

[スケジュール済みスクリプト実行] フォームを使用して、スケジュール済みジョブを定義します。

[アイテムのスケジュール] フォーム

フィールド	説明
名前	このスケジュール済みジョブを識別する名前
アクティブ	スケジュール済みジョブがアクティブであり、指定された日時に実行する必要があることを示すオプション
実行	スケジュール済みジョブの実行に使用する時間間隔： • 日次：指定された時刻に毎日実行されます。 • 週次：指定された時刻と曜日に、毎週実行されます。 • 月次：指定された日の時刻に、毎月実行されます。 • 定期的：指定した繰り返し間隔で実行されます。 • **1**回：1 回のみ実行されます。 • オンデマンド：オンデマンドですぐに実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アイテムのスケジュール] フォーム (続く)

フィールド	説明
	• ビジネスカレンダー：エントリ開始：[ビジネスカレンダー] フィールドで選択したビジネスカレンダーのエントリ開始日に実行されます。ビジネスカレンダーに定義した各ビジネスエントリの開始日にスケジュール済みジョブが実行されます。 たとえば、ビジネスカレンダーが会計年度を表し、各エントリの開始日が会計月である場合、スケジュール済みジョブは毎月最初の日に実行されます。 • ビジネスカレンダー：エントリ終了：[ビジネスカレンダー] フィールドで選択したビジネスカレンダーの終了日に対して実行されます。この選択は、[ビジネスカレンダー：エントリ開始] と同じ方法で実行されますが、関連するビジネスカレンダーエントリの終了日に対して実行されます。 **注:** [ビジネスカレンダー：エントリ開始 **(Business Calendar: Entry Start)]** または [ビジネスカレンダー：エントリ終了 **(Business Calendar: Entry End)]** を選択すると、オフセット係数を適用して、選択したビジネスカレンダーの時間スパンの前または後にジョブを実行するようにスケジュールを設定できます。詳細については、[オフセットタイプ **(Offset Type)]** フィールドと [オフセット **(Offset)]** フィールドを参照してください。 ビジネスカレンダーの作成と使用、およびビジネスカレンダーエントリの定義の詳細については、「Creating business calendars」および「Define business calendar entries」を参照してください。
タイムゾーン	スケジュール済みジョブの実行時間を指定するときに [時間] フィールドエントリで使用するタイムゾーン。タイムゾーンエントリを次のように選択します。 • なし：スケジュール済みジョブを作成しているログインユーザーのデフォルトのタイムゾーンを使用します。 たとえば、ユーザーのアサインされたタイムゾーンが米国太平洋標準時であり、[時間] フィールドに 16:45 と入力した場合、スケジュール済みジョブは米国太平洋標準時の午後 4 時 45 分に実行されます。 • システムのタイムゾーンを使用：実行するインスタンスに指定されたデフォルトのシステムタイムゾーンを使用します。 たとえば、インスタンスのデフォルトのシステムタイムゾーンがヨーロッパ/ロンドンであり、[時間] フィールドに 22:15 と入力した場合、スケジュール済みジョブはロンドン時間の午後 10 時 15 分に実行されます。 • 実際のタイムゾーン。 たとえば、[米国/東部] を選択し、[時間] フィールドに 13:30 と入力した場合、スケジュール済みジョブは米国東部標準時の午後 1 時 30 分に実行されます。
日	スケジュール済みジョブを実行する日。 • [実行] が [週次] の場合は、曜日を選択します。たとえば、水曜日を選択します。 • [実行] が [月次] に設定されている場合は、月の日を選択します。たとえば、毎月 25 日の場合、25 を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アイテムのスケジュール] フォーム (続く)

フィールド	説明
	このフィールドは、[実行] フィールドで [月次] または [週次] を選択した場合にのみ表示されます。
繰り返し間隔	スケジュール設定された各ジョブ実行の繰り返し間隔の期間。期間を日数、時間数、または分数で入力します。例： • 4 日ごとにスケジュール済みジョブを実行するには、[日数] フィールドに「04」と入力します。 • 26 時間ごとに実行するには、[時間] フィールドに「26」と入力します。 • 13:30:25 の間隔で繰り返す必要がある場合は、[時間] フィールドに「13」と入力し、その後のラベルのない 2 つのフィールドに「30」と「25」を入力します。 これらのフィールドは、[実行] フィールドで [定期的] を選択した場合にのみ表示されます。 **注:** この設定では、夏時間の変更は考慮されません。たとえば、期間に 1 日を選択した場合、計算によりジョブの開始時間が 24 時間追加されます。開始時間が夏時間 (DST) の期間であり、そのタイムゾーンが DST でない場合、ジョブは 1 時間オフセットされて実行されます。
ビジネスカレンダー	スケジュール済みジョブに対するビジネスカレンダーの開始日または終了日を決定するために使用しているビジネスカレンダーエントリ。このフィールドは、[時間] フィールドで [ビジネスエントリ：開始日 **(Business Entry: Start Date)]** または [ビジネスエントリ：終了日 **(Business Entry: End Date)]** を選択した場合にのみ表示されます。
オフセットタイプ (Offset Type)	このジョブをスケジュール設定するために選択したビジネスカレンダーに適用する時間オフセットのタイプ (存在する場合)。 • 過去 **(Past)**：オフセット係数を適用して、選択したビジネスカレンダーの時間スパンの開始前に実行するジョブをスケジュール設定します。 • 将来 **(Future)**：オフセット係数を適用して、選択したビジネスカレンダーの時間スパンの終了後に実行するジョブをスケジュール設定します。 • なし：このジョブのスケジュール設定に時間オフセットを適用しません。 オフセット係数を追加すると、次のユースケースに対するビジネスカレンダーで定義された正式な時間スパンの前または後にジョブの実行をスケジュール設定できます。 • 選択したビジネスカレンダーの時間スパン外である特定の時間にジョブをスケジュール設定します。 • 選択したビジネスカレンダーの時間スパンに沿って複数のジョブを順番に実行するように調整します。 [オフセットタイプ] フィールドと [オフセット] フィールドは、[実行] フィールドで [ビジネスカレンダー：エントリ開始] または [ビジネスカレンダー：エントリ終了] を選択した場合にのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[アイテムのスケジュール] フォーム (続く)

フィールド	説明
オフセット (OffSet)	このジョブをスケジュール設定するために選択したビジネスカレンダーに適用する時間オフセットの量 (日、時間、分、秒)。たとえば、ビジネスカレンダーの開始日よりも 3 日、14 時間、10 分、45 秒前にジョブを開始するようにスケジュール設定する場合は、次のようにします。 • [オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [過去 **(Past)]** を選択します。 • [日数] フィールドに「**3**」と入力します。 • [時間] フィールドに「**14**」、「**10**」、「**45**」と入力します。 [オフセット日数 **(Offset days)]** フィールドと [時間] フィールドは、[実行] フィールドで [ビジネスカレンダー：エントリ開始] または [ビジネスカレンダー：エントリ終了] を選択し、[オフセットタイプ] フィールドで [過去] または [予定] を選択した場合にのみ表示されます。
時刻	スケジュール済みジョブを実行する時刻。時間、分、秒を 24 時間形式で表します。[タイムゾーン] フィールドで選択した内容によって、このエントリのタイムゾーンが決まります。 **注:** 時間値は常に、ServiceNow AI Platform® に UTC 時間で保存されてから、適切な時間に変換されます。この変換は、選択した [タイムゾーン] と [時間] フィールドのエントリによって異なります。 このフィールドは、[実行] フィールドで [日次]、[週次]、または [月次] を選択した場合にのみ表示されます。
開始中	最初にスケジュール設定されたジョブ生成の日時。カレンダー日時を選択します。このフィールドは、[実行] フィールドで [定期的] を選択した場合にのみ表示されます。
優先度	スケジュール済みジョブの数値の優先度： • 必須ジョブの優先度値を 100 未満に設定します。 • 必須でないジョブの優先度値を 100 より高く設定します。 • すべてのスケジュール済みジョブの 70 パーセント以上が [期限切れ] の場合、100 を超える値でマークされたジョブは実行されません。
実行方法	スケジュール済みジョブを作成して実行するユーザーの名前。スケジュール済みジョブを作成するユーザーの代わりにスケジュール済みジョブをシステムにアサインするには、システムまたはダミーユーザーを作成し、このフィールドに追加します。
条件付き	関連するスクリプトで特定の条件が満たされた場合にスケジュール済みジョブの実行を有効にするオプション。
条件	スケジュール済みジョブを実行するかどうかを決定する条件付きスクリプト。スクリプトの最後の式はブール値 (true/false) で評価されます。このテキストボックスは、[条件を使用 **(Use conditions)]** を選択した場合にのみ表示されます。
開始中	最初にスケジュール設定されたジョブ生成の日時。カレンダー日時を選択します。このフィールドは、[実行] フィールドで [定期的] を選択した場合にのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

人件費の生成

人件費を生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化

ステータスレポートフォーム

ステータスレポートフォームのフィールドについて説明します。

ステータスレポートフォームのフィールド

フィールド	説明
プロジェクト管理	プロジェクトの名前。
ステータス報告日	ステータスレポートを生成する期限の日付。
番号	設定可能なプリフィックス付きの、ステータスレポートのシステム生成番号。
状況	プロジェクトの現在のステータス。
完了率 (%)	完了済みのプロジェクトの割合。
開始予定日	プロジェクトの開始予定日。
終了予定日	プロジェクトの終了予定日。
開始実績日時	プロジェクトの実開始日。
終了実績日時	プロジェクトの実終了日。
コスト概算	プロジェクトのコスト概算。
実績コスト	プロジェクトの実績コスト。

[全体的なステータス] タブの詳細

フィールド	説明
総合健全性	レポートでプロジェクトの総合健全性のステータスを示す色。
エグゼクティブ サマリー	プロジェクトの簡単な要約と分析。
コメント	全体的なステータスに関するコメント。
先週の達成度	先週のプロジェクトの進捗状況。
予定されている主要アクティビティ	プロジェクトで次に予定されているアクティビティ。

[スケジュール] タブの詳細

フィールド	説明
スケジュール	レポートでプロジェクトのスケジュール関連情報のステータスを示す色。
スケジュールについてのコメント	プロジェクトスケジュールに関連するコメント。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[コスト] タブの詳細

フィールド	説明
コスト	レポートでプロジェクトのコスト関連情報のステータスを示す色。
コストについてのコメント	プロジェクトコストに関連するコメント。

[リソース] タブの詳細

フィールド	説明
リソース	レポートでプロジェクトのリソース関連情報のステータスを示す色。
リソースについてのコメント	プロジェクトリソースに関連するコメント。

[スコープ] タブの詳細

フィールド	説明
スコープ	レポートでプロジェクトのスコープ関連情報のステータスを示す色。
スコープについてのコメント	プロジェクトスコープに関連するコメント。

関連情報

プロジェクトステータスレポートを作成する

プロジェクト関連フォームの複数通貨フィールド

プロジェクト、コスト計画、およびコスト計画のブレークダウンフォームで [プロジェクト通貨] ビューを有効にすると、フォームの [財務] セクションで複数通貨フィールドを確認できます。

プロジェクトフォームの [財務] タブ

プロジェクトフォーム

フィールド	説明
プロジェクト通貨	プロジェクトが実施される通貨。 **注:** 通貨を選択せずに通貨フィールドを変更してプロジェクトフォームを保存すると、[プロジェクト通貨] フィールドのデフォルトは [機能通貨] になります。 プロジェクトのコスト計画、コスト計画ブレークダウン、利益計画、利益計画ブレークダウン、または経費ラインを作成すると、プロジェクトの [プロジェクト通貨] フィールドは読み取り専用フィールドになり、変更できなくなります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォーム (続く)

フィールド	説明
プロジェクト通貨での合計予定コスト	プロジェクト通貨でのプロジェクトのコスト概算。
プロジェクト通貨での計画投資	プロジェクトの資本的支出 (投資)。
プロジェクト通貨での計画経費	プロジェクト通貨でのプロジェクトの運用支出 (経費)。
プロジェクト通貨での合計予算	プロジェクトの現地通貨での予算コスト。
プロジェクト通貨での実績コスト	プロジェクトの実績コスト (現地通貨)。
プロジェクト通貨での EAC	プロジェクト通貨で将来の会計期間の機能コストに追加された過去の会計期間のすべての実績の合計。
プロジェクト通貨での予定給付	プロジェクト通貨でのプロジェクトの予定給付
プロジェクト通貨での予定リターン	予定給付と予定コストの値の差。
計画 ROI (%)	[予定リターン] フィールドと [コスト概算] フィールドの値に基づいて計算されたパーセンテージ。
プロジェクト通貨での正味現在価値	指定された年利に基づいたプロジェクト通貨での将来の現金の現在価値。
内部リターン率 (%)	正味現在価値 (NPV) をゼロにするために必要な年利。
プロジェクト通貨での ETC	すべての会計期間の機能コストの合計 (プロジェクト通貨)。

プロジェクトフォームの [設定] セクション

フィールド	説明
ステータスレポート通貨	プロジェクトステータスレポートが生成される通貨。 プロジェクトフォームでプロジェクト通貨ビューを有効にしている場合は、次の通貨オプションのいずれかを使用してプロジェクトステータスレポートを生成することができます。 • 機能通貨：プロジェクトステータスレポートが作成される glide.system.locale プロパティから取得される通貨。 • プロジェクト通貨：プロジェクトステータスレポートは、選択した現地通貨で作成されます。[プロジェクト通貨] を選択すると、選択したプロジェクト通貨で予定コストと実績コストを表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォームの [設定] セクション (続く)

フィールド	説明
	プロジェクトのステータスレポートを表示するには、「プロジェクトステータスレポートの表示」を参照してください。

コスト計画フォームの [財務] セクション

コスト計画フォーム

フィールド	説明
プロジェクト通貨	コスト計画を作成できる通貨。
プロジェクト通貨でのコスト	すべてのコスト計画ブレークダウンの [入力通貨でのコスト] フィールドからロールアップされた値。
プロジェクト通貨での合計実績コスト	プロジェクト通貨ですべてのコスト計画ブレークダウンの [実績コスト] フィールドからロールアップされる値。
プロジェクト通貨での EAC	プロジェクト通貨で将来の会計期間の機能コストに追加された過去の会計期間のすべての実績の合計。
プロジェクト通貨での ETC	すべての会計期間の機能コストの合計 (プロジェクト通貨)。

注:
コスト計画の単価、数量、または会計期間を変更すると、金額はプロジェクト通貨で再計算されます。「コスト計画の更新とプロジェクト通貨でのコストの再計算」を参照してください。

コスト計画ブレークダウンフォームの複数通貨フィールド

コスト計画ブレークダウンフォーム

フィールド	説明
プロジェクト通貨の為替レート	プロジェクト通貨でのコスト計画ブレークダウンに対応する期間に有効なレート。
プロジェクト通貨	コスト計画ブレークダウンに選択された現地通貨。
プロジェクト通貨でのコスト	プロジェクト通貨でのブレークダウン金額。
プロジェクト通貨での実績コスト	処理済み経費ラインからプロジェクト通貨で生成された実績コスト。
プロジェクト通貨の差異	プロジェクト通貨でのコストとプロジェクト通貨での実績コストの差。
予算	会計年度に入力されたプロジェクト予算額は、機能通貨で月次ブレークダウンに均等に配分されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コスト計画ブレークダウンフォーム (続く)

フィールド	説明
プロジェクト通貨での合計予算	会計年度に入力されたプロジェクト予算額は、プロジェクト通貨で月次ブレークダウンに均等に配分されます。

利益計画フォームの [財務] セクション

利益計画フォーム

フィールド	説明
プロジェクト通貨	プロジェクトで選択されたプロジェクト通貨が入力されます。 プロジェクトに添付された利益計画は、プロジェクトと同じ通貨を継承します。
プロジェクト通貨での利益	プロジェクト通貨でのプロジェクトまたはデマンドから発生する利益。

利益計画ブレークダウンフォームの複数通貨フィールド

利益計画ブレークダウンフォーム

フィールド	説明
プロジェクト通貨	プロジェクトフォームで選択されている通貨。
プロジェクト通貨での利益	プロジェクト通貨でのプロジェクトまたはデマンドから発生する利益。
プロジェクト通貨為替レート	プロジェクト通貨での利益計画ブレークダウンに対応する期間に有効なレート。
プロジェクト通貨参照レート	入力通貨がプロジェクト通貨に交換されるレート。

経費ラインフォームの複数通貨フィールド

経費ラインフォーム

フィールド	説明
プロジェクト通貨	プロジェクトに関連する経費ラインがある場合、プロジェクトから継承された通貨。
プロジェクト通貨での金額	プロジェクト通貨での経費[金額] フィールドに入力された金額は、プロジェクト通貨に変換されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[プロジェクト資金調達] フォームの [複数通貨] フィールド

[プロジェクト資金調達] フォーム

フィールド	説明
プロジェクト通貨での資本予算	選択した通貨での資本的支出に割り当てられる予定経費額。
プロジェクト通貨での経費予算	選択した通貨での営業費用の金額。
プロジェクト通貨での予算	投資および経費の合計額。 プロジェクト資金調達予算の合計額は、[プロジェクト通貨での予算コスト] フィールドにロールアップされます。
プロジェクト通貨	プロジェクトに資金が提供される通貨。
為替レート	通貨間の為替レートに基づく通貨換算。
為替レート日付	為替レートが適用される日付。
為替参照日付	為替レートの取得元である予算参照レート。

プロジェクト通貨でのコストロールアップ

通貨が異なるプロジェクトおよびサブプロジェクトのコストロールアップ計算は、予算参照レートによって異なります。金額が換算されるレートは、換算レートによって異なります。

機能通貨フィールドに入力された金額のプロジェクト通貨への変換

デフォルトビューの機能通貨でプロジェクトを作成する場合、[予定資本]、[計画経費]、[実績コスト]、および [予定給付] フィールドに金額を手動で入力または更新できます。これらのフィールドに値を入力すると、金額がプロジェクト通貨に変換され、対応するプロジェクト通貨フィールド ([プロジェクト通貨での予定コスト]、[プロジェクト通貨での計画経費]、[プロジェクト通貨での実績コスト]、[プロジェクト通貨での予定給付] など) に保存されます。

注:
これを行うことができるのは、プロジェクトにコスト計画、利益計画、または経費ラインが添付されていない場合のみです。

プロジェクトファイナンシャルをサブプロジェクトから親プロジェクトにロールアップする

サブプロジェクトと親プロジェクトのプロジェクト通貨が異なる場合は、財務ロールアップに *`com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different`* プロパティを使用します。

複数通貨コストロールアッププロパティの動作

プロパティフラグ	動作
true	プロパティが [True] に設定されている場合、次のことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

複数通貨コストロールアッププロパティの動作 (続く)

プロパティフラグ	動作
	1. 両方のプロジェクトのプロジェクト通貨が異なる親プロジェクトにサブプロジェクトを関連付けます。 2. サブプロジェクトの金額を親プロジェクトの金額にロールアップします。ただし、通貨の変動により、親プロジェクトのロールアップ金額の精度は異なります。 ○ 親プロジェクトとサブプロジェクトのプロジェクト通貨が同じ場合、サブプロジェクトからその親および最上位プロジェクトへのプロジェクト通貨金額は、サブプロジェクトの金額を合計することによってロールアップされ、ロールアップ金額は正確です。 ○ 親プロジェクトとサブプロジェクトのプロジェクト通貨が異なる場合、予算参照レートを参照して、サブプロジェクトのすべてのコストが親プロジェクトまたは最上位プロジェクトのプロジェクト通貨に変換されます。金額が換算されるレートは、プロジェクト通貨間の為替レートと、指定された換算期間によって異なります。したがって、ロールアップされた金額は推定値または概算値にすぎません。
False	プロパティが [False] に設定されている場合、次のことができます。 1. プロジェクトの通貨が同じまたは異なる親プロジェクトに、任意の数のサブプロジェクトを関連付けます。 2. サブプロジェクトと親プロジェクトのプロジェクト通貨が一致する場合にのみロールアップします。

ただし、*com.snc.project.rollup.cost* プロパティとともにフラグを設定すると、*com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different* プロパティの動作は異なります。

機能通貨プロパティと組み合わせた複数通貨コストロールアッププロパティ

プロパティフラグ	動作
com.snc.project.rollup.cost プロパティが [false]	同じまたは異なるプロジェクト通貨を持つ任意のサブプロジェクトを親プロジェクトに関連付けることができますが、サブプロジェクトのコストは親プロジェクトにロールアップされません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能通貨プロパティと組み合わせた複数通貨コストロールアッププロパティ (続く)

プロパティフラグ	動作
com.snc.project.rollup.cost プロパティが [true] で、*com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different* プロパティが [false]	同じプロジェクト通貨を持つ親プロジェクトにサブプロジェクトを関連付けることができます。
com.snc.project.rollup.cost プロパティが [true] で、*com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different* が [true]	プロジェクトの通貨が同じまたは異なるサブプロジェクトは、親プロジェクトに関連付けることができます。

プロパティの不適切な関連付けと考えられるエラー

不適切な関連付けの実行中に発生する可能性があるエラーは次のとおりです。

サブプロジェクトと親プロジェクトの関連付けのプロパティの組み合わせ

com.snc.project.rollup.cost	com.snc.project.multicurrency.rol	動作
False	true または false のいずれか	サブプロジェクトと親プロジェクトのプロジェクト通貨が異なる場合でも、サブプロジェクトを親プロジェクトに関連付けることができますが、サブプロジェクトから親プロジェクトへのコストをロールアップすることはできません。
true	False	サブプロジェクトと親プロジェクトのプロジェクト通貨が異なる場合、サブプロジェクトを親プロジェクトに関連付けることはできません。 このような関連付けの場合、[システムポリシーにより、親プロジェクトと子プロジェクトに異なるプロジェクト通貨を使用することはできません] というエラーメッセージが表示されます。

コストおよび利益計画におけるプロジェクト通貨

コストおよび利益計画の通貨フィールドは、プロジェクトのプロジェクト通貨にデフォルト設定されます。

コストおよび利益計画における入力通貨フィールド

複数通貨プラグインがインストールされている場合、コスト計画の [入力通貨] フィールドは、デフォルトまたは機能通貨のビューに関係なく、プロジェクトのプロジェクト通貨にデフォルト設定されます。ただし、複数通貨プラグインがインストールされていない場合、コスト計画の [入力通貨] フィールドはプロジェクトの機能通貨にデフォルト設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

同様に、複数通貨プラグインがインストールされている場合、利益計画の [入力通貨] フィールドは、デフォルトまたは機能通貨のビューに関係なく、プロジェクトのプロジェクト通貨にデフォルト設定されます。ただし、複数通貨プラグインがインストールされていない場合、利益計画の [入力通貨] フィールドはプロジェクトの機能通貨にデフォルト設定されます。

プロジェクトワークスペース

ServiceNow® プロジェクトワークスペースを使用すると、プロジェクトマネージャーは一元化された場所でプロジェクトを計画および管理できます。

新しい プロジェクトワークスペース には、[計画]、[詳細]、[財務]、[RIDAC]、[アナリティクス]、[ドキュメント]、[ステータスレポート]、および [リソース] ページが付属しています。

新しいプロジェクトワークスペース UI の概要

プロジェクトワークスペース概要

プロジェクトワークスペースを使用すると、単一のワークスペースでタスクのコラボレーション、計画、整理、および実行を行うことができます。このアプリケーションは、プロジェクト、タスク、サブプロジェクト、依存関係、およびタイムラインを作成および監視する機能を提供します。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトワークスペース内のリソースを割り当てて最適化し、適切な個人を適切なタスクにアサインできます。プロジェクトワークスペースを使用すると、プロジェクトの財務、予算、コストを計画および追跡できます。このプロジェクト管理アプリケーションは、関連するプロジェクト情報を 1 か所で提供することで、情報に基づいたタイムリーな意思決定を支援します。

プロジェクトのステータスレポートを作成し、プロジェクトのアナリティクスを実行します。プロジェクトワークスペースで生成 AI 機能を体験してください。プロジェクト Gen AI Docs スキルを使用して、ドキュメントの重要な情報をすばやく理解するために、ドキュメントで選択したコンテンツを要約、詳細化、または短縮します。


アイテム書き込みスキルを使用して計画立案アイテムの説明を絞り込み、作業アイテムの明確さと完全性を向上させ、計画立案アイテム情報の欠落や不明瞭さによるやり直しを減らします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


開始

探索

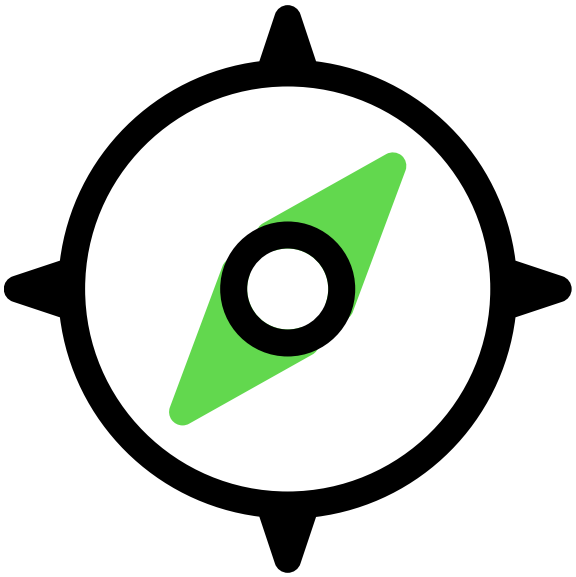


の機能とビジネス価値を学ぶ
プロジェクトワークスペース

構成

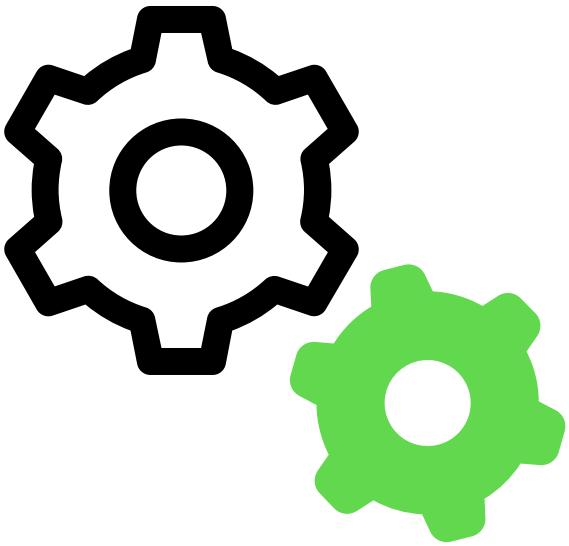


コア構成の設定

使用方法



でプロジェクトを管理する プロジェクトワークスペース

参照

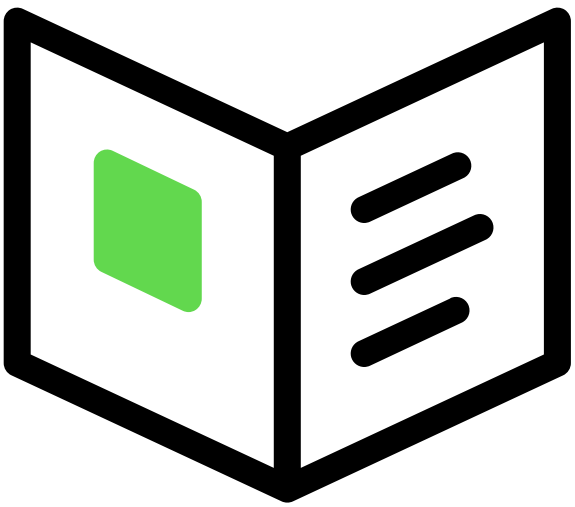

のフォームとフィールドについて説明します。 プロジェクトワークスペース

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トラブルシューティングとサポート

- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

プロジェクトワークスペース の探索

このServiceNow® プロジェクトワークスペースアプリケーションは、プロジェクト、リソース、および財務を単一のワークスペースで管理するのに役立ちます。

プロジェクトワークスペースの概要

プロジェクトワークスペースは、さまざまなワークフローを最適化し、プロジェクトまたはタスク、リソース、および財務の計画と管理を 1 か所で行えるようにするプロジェクト管理アプリケーションです。このアプリケーションでは、プロジェクト、サブプロジェクト、プロジェクトタスク、リソース、および財務へのアクセスが一元化されるため、さまざまなアプリケーション間を移動する必要性が軽減されます。

プロジェクトワークスペースは、すべてのプロジェクトとプロジェクト関連情報の包括的な概要をプロジェクトマネージャーに提供します。このプロジェクト管理 (PM) アプリケーションは、プロジェクトのスコープ、依存関係、およびタイムラインの定義方法を提供することで、プロジェクト計画を効率化します。

プロジェクトワークスペース のメリット

メリット	機能
プロジェクトを作成し、プロジェクトタスクの計画を開始します。	プロジェクトを作成し、プロジェクト計画を開始する
プロジェクトタスクをプロジェクトに追加し、タスクをチームに直接アサインして、プロジェクトの実装を成功に導きます。	プロジェクトタスクを作成してプロジェクトに追加する
プロジェクトタスクの依存関係を追加して、プロジェクト内で構造化されたワークフローを確立します。	プロジェクトの内部依存関係を作成する
さまざまなプロジェクトのタスク間に依存関係を追加して、相互に関連するプロジェクト間のタイムラインを調整します。	外部依存関係を介してさまざまなプロジェクトのタスクを結び付ける
プロジェクトのベースラインを作成して比較し、プロジェクトの進捗状況を経時的にキャプチャします。	プロジェクトのベースラインを設定する
ステータスレポートを作成して、プロジェクトの健全性、メトリクス、リスク、問題、およびマイルストーンを監視します。	でのステータスレポートの作成 プロジェクトワークスペース
フィードバックまたはメモのステークホルダーにタグ付けし、コメントを追加して、プロジェクトでコラボレーションします。	プロジェクトのステークホルダーとコラボレーションする
Now Assist を使用して、ドキュメントで選択したテキストのサマリーを生成します。	プロジェクトワークスペースのプロジェクトドキュメントの要約スキルを使用して、選択したコンテンツまたは完了したコンテンツのサマリーを生成します

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メリット	機能
プロジェクトのプロジェクトサマリーメールを生成してスケジュールします。	Email project summary スキルを使用してプロジェクトサマリーメールをスケジュールする
リスク、問題、意思決定、アクション、または変更要求をプロジェクトに追加して、プロジェクト開発全体で RIDAC レコードを追跡および管理します。	プロジェクトに RIDAC レコードを追加する
プロジェクト情報をスライドにコピーせずに、プロジェクトをワークスペースから直接 PowerPoint ファイルとしてエクスポートします。	プロジェクトを Microsoft PowerPoint にエクスポートする
プロジェクトまたはタスクレベルでリソースのアサインを作成および追跡して、プロジェクト全体のリソース割り当てを最適化します。	リソースのアサインを作成し、リソース計画を開始する
必要な期間のコスト計画を作成して、予定の経費と実際の経費を監視します。	プロジェクトのコスト計画を作成する
プロジェクトコスト計画に経費ラインを追加して、プロジェクトの包括的で詳細な財務フレームワークを確立します。	コスト計画の経費ラインを追加する
属性ベースのリソースのアサインに対して人件費を生成し、プロジェクトの経費を追跡します。	プロジェクトの人件費を生成する
ドキュメントを使用して、チームメンバーとの共同作業、メモの保存、プロジェクト憲章の生成、プロジェクト概要の作成を行うことができます。	ドキュメントを使用したプロジェクトの共同作業
プロジェクトを保護して、許可されたユーザーのみがプロジェクトにアクセスできるようにします。	プロジェクトワークスペースでプロジェクトのセキュリティを有効にする

関連情報

- プロジェクトワークスペースでのプロジェクトの管理
- プロジェクトの財務管理
- プロジェクトワークスペースでのリソース計画
- でのステータスレポート プロジェクトワークスペース
- プロジェクトワークスペースクラシック版 - レガシー

プロジェクトワークスペースでのプロジェクト計画

直感的なプロジェクトワークスペースアプリケーションでプロジェクトを計画し、プロジェクトを成功に導きます。

プロジェクトマネージャーは、このプロジェクトワークスペースアプリケーションを使用して、単一のワークスペース内でプロジェクト、サブプロジェクト、プロジェクトタスクを定義、計画、および優先順位付けできます。

プロジェクトワークスペースは、プロジェクトの日付とマイルストーンの定義からリソースの割り当て、タスクのスケジュール設定、依存関係の確立まで、プロジェクト計画フェーズを構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

新しいプロジェクトワークスペースは、[計画]、[詳細]、[財務]、[RIDAC]、[アナリティクス]、[ドキュメント]、および [ステータスレポート] の各ページで構成されています。[計画] ページは、プロジェクト、プロジェクトタスク、およびリソースの作成と計画に役立ちます。[詳細] ページには、プロジェクトの包括的な概要が表示されます。[財務] ページは、プロジェクトの財務面の管理に役立ちます。[RIDAC] ページは、プロジェクトのライフサイクル全体にわたって、リスク、問題、意思決定、アクション、または変更を特定、追跡、および管理するのに役立ちます。

主な特長

[計画立案] ページを使用して、プロジェクトタスクの整理、リソースの割り当て、およびプロジェクトタイムラインの設定を行います。プロジェクトマネージャーは、次のことができます。

- 新しいプロジェクトを開始し、プロジェクトの詳細、目的、および初期計画を定義して、プロジェクトチームに明確な方向性を提供します。
- プロジェクト、サブプロジェクト、タスク、マイルストーン、依存関係の作成など、ワークスペース内でのプロジェクトの構造を確立します。
- プロジェクトの開始予定日と終了予定日を定義します。
- リソースを割り当て、プロジェクトのリソース可用性と使用率を分析します。
- プロジェクト、サブプロジェクト、タスク、およびマイルストーンの進捗状況を監視します。プロジェクトの全体的な進捗状況を追跡します。
- プロジェクトのドキュメントを整理および管理し、関連するすべてのファイル、レポート、およびデータに簡単にアクセスできるようにします。
- ファイナンシャルプランに関与し、予算の割り当て、経費、および財務メトリクスを追跡します。

プロジェクトタスクのチェックリストアイテム

プロジェクトタスクチェックリストアイテムを使用して、タスクで完了する必要があるアクティビティを追跡します。

プロジェクトタスクを完了と見なすために、個別のサブタスクを必要としないアクティビティを追跡できます。たとえば、候補者に面談するタスクを含むヒューマンリソース (HR) 関連プロジェクトがあるとします。会議室の予約や、候補者からの面談確認の受け取りを追跡することもできます。それぞれのチェックリストアイテムを作成し、完了したらマークします。

チェックリストアイテムには開始日や終了日がなく、工数やコストも追跡されません。デフォルトでは、チェックリストアイテムレコードには、オンまたはオフにできるチェックボックス付きの名前のみが表示されます。プロジェクトタスクのステータスは、チェックリストアイテムのステータスとは無関係です。

チェックリストとタスクがプロジェクトテンプレートにコピーされます。また、任意のプロジェクトタスクフォームからすべてのチェックリストテンプレートにアクセスすることもできます。

関連情報

プロジェクトタスクのチェックリストアイテムの作成

プロジェクトワークスペースでのリソース計画

プロジェクトワークスペースアプリケーションを使用してリソースを計画および割り当て、リソース使用率と実行を最適化できるようにします。

リソース管理 アプリケーションを使用すると、プロジェクトマネージャーはプロジェクトワークスペースでリソースのアサインを作成して、リソースを割り当て、リソースの可用性を分析できます。リソース管理 アプリケーションは、任意のプロジェクトまたはプロジェクトタスクでプロジェクトワークスペースとともに使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

主な特長

リソース管理アプリケーションでは、プロジェクトの任意のフェーズでプロジェクトワークスペースにおけるリソースのアサインと割り当てを可視化します。

プロジェクトワークスペースでリソース管理を使用すると、次のことができます。

- プロジェクト開発の任意のステージでリソースをアサインします。リソースは詳細なレベルで計画できます。
- プロジェクトの任意のフェーズで、リソースのアサイン日、リソース、およびリソースの可用性への取り組みを変更します。
- プロジェクトワークスペースで属性ベースのリソースのアサインを作成します。
- ヒートマップで可用性を表示し、リソースの可用性に基づいて割り当てます。割り当ては、タスクのリソースの可用性を表示するために色分けされます。
- プロジェクトワークスペースの 1 か所でリソースを要求して割り当て、リソースの可用性を確認します。

プロジェクトワークスペースでの リソース管理 ワークフロー

プロジェクトマネージャーは、プロジェクトワークスペースで属性ベースのリソースのアサインを作成できます。任意のタイプのプロジェクトタスクをリソースのアサインに追加できます。

リソースのアサインが作成された後、プロジェクトマネージャーはリソースの可用性を確認し、リソースのアサインにリソースをアサインします。リソースが利用できない場合、プロジェクトマネージャーはリソースマネージャーと協力してリソースの可用性を調整します。すべての関係者が同意すると、リソースの作業が開始されます。プロジェクトマネージャーは、ヒートマップでリソースの割り当てを表示できます。

注:
リソースのアサインが作成され、割り当てが要求されると、リソース計画がバックエンドで自動的に作成され、割り当て済みステータスになります。新しいリソース計画とリソースの割り当てが作成されるか、属性に基づいて既存のリソース計画が取得されます。その結果、計画コストと割り当て済みコストが照合され、予定時間と割り当て済み時間も照合されます。こうしたリソース計画は、リソース割り当てワークベンチに表示されません。

プロジェクトワークスペースの財務

財務を計画、再予測、追跡し、プロジェクトとデマンドのベースラインを作成します。

財務ビューでは、会計期間全体の実際の経費と予定経費が簡素化されて表示されます。過去の会計期間の実績コスト、現在および将来の会計期間の計画コスト、四半期や年の合計、および総作業期間の合計を表示することで、最新のコスト概算を把握できます。

インターフェイスでは、コスト計画、経費ライン、ベースラインを作成できます。プロジェクトマネージャーまたは財務ユーザーは、次のことができます。


- [詳細] タブのシンプルな財務セクションを使用して、計画立案アイテムの大まかな財務予測を入力する。
- 計画経費および計画投資の大まかな見積もりを作成する。
- 財務を使用して、計画コストの詳細なブレークダウンを作成する。
- サイドパネルから、コスト計画の追加、編集、または削除。
- インライン編集機能を使用して、予定経費を再予測する。
- 計画立案アイテムの時間スコープ全体について、過去の実績コストと将来の計画経費を示す簡素化されたビューを表示する。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 合計時間スコープと年次ブレークダウンについて、予測 (以前の EAC - 完了時の推定)、残りの見積もり (以前の ETC - 完了までの推定)、および各コスト計画の実績を表示することで、より優れた包括的なソリューションを取得します。
- グリッドのインライン編集機能を使用して四半期および年次の合計を直接更新することで、将来の会計期間の計画コストを再予測する。
- 組織用に構成された財務属性で分類された、計画立案アイテムのスコープ全体のリソースのアサインに応じて人件費の生成。属性ベースのマッピングの計画立案属性の詳細については、「Planning 属性の使用」を参照してください。
- 関連するコスト計画の詳細が事前入力されたサイドパネルから、コスト計画について経費ラインの追加または編集。
- [新しい経費ライン (New expense line)] サイドパネルを使用して予定外の経費を記録する。
- 財務ベースラインを作成して比較し、プロジェクトの実行中にプロジェクトの財務を追跡する。
- 財務ベースラインを作成し、ベースラインの比較機能を使用して、最新のコスト (過去の会計期間の実際の経費と、現在および将来の会計期間の計画コスト) を当初の予測計画コストと比較する。
- 財務ベースラインを手動または自動でキャプチャして、コストの差異の原因と、いつ発生したかを経時的に分析する。

[財務] 画面

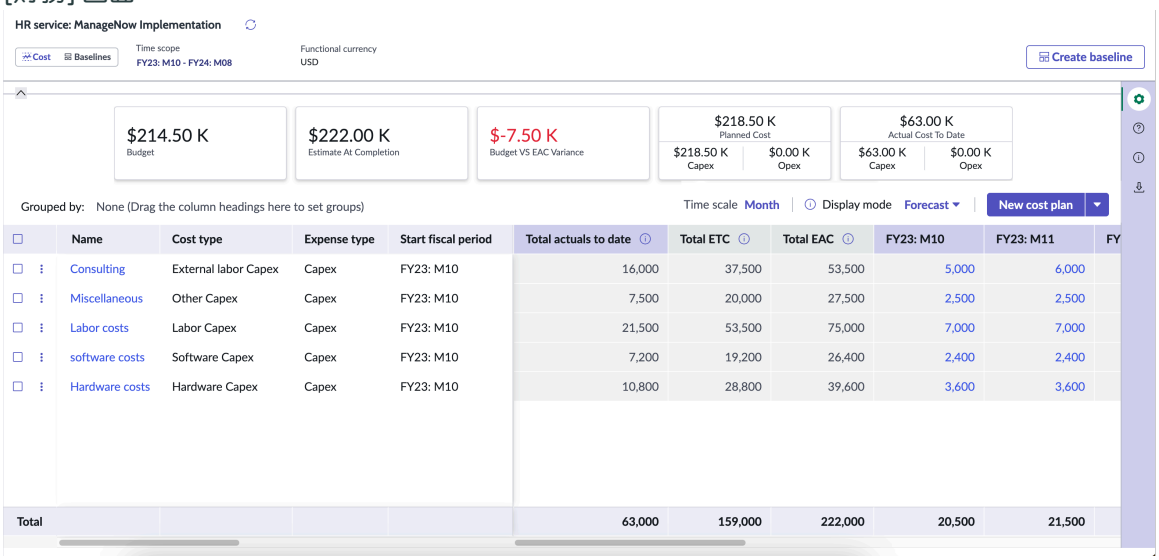

[財務] 画面では、以下の情報を表示できます。

- 時間スコープ:計画立案アイテムまたはコスト計画の期間のうち、会計期間の範囲が大きい方。
- 機能通貨:財務の計算に定義および使用される通貨。
- 割り当てられた予算、予測 (以前の EAC - EAC - EAC)、差異 (予算と予測の差)、計画コストのブレークダウン、原価費目別の実績など、さまざまな財務情報を表示するカスタマイズ可能なウィジェット。

> **注:**
> 「予算」および「予算と EAC の差異」ウィジェットは、デマンドとプロジェクトでのみ使用できます。

- タイムスケール:財務を表示するための期間ブレークダウン。デフォルト値は、会計カレンダータイプに応じて [月]/[期間] に設定されます。
- 人件費の生成:リソースのアサインに応じて計画立案アイテムの計画人件費を生成または更新するためのワンクリックソリューション。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

> **注:**
> このオプションは、リソースがアサインされているプロジェクトでのみ有効になります。

- このペインには、名前、原価費目、経費タイプ、統計会計期間、会計期間の終了、合計計画コスト、従業員タイプ、およびロールが表示されるコスト計画属性が表形式で表示されます。これらのフィールドはカスタマイズできます。詳細については、「財務の左ペインビューのカスタマイズ」を参照してください。
- 右側のペインでは、選択した時間スコープ期間の実績、予測、および残りの推定の合計を表示できます。過去の会計期間のコスト計画に対する実際の経費、現在の会計年度の実績、予測、および残りの見積もり、および現在および将来の会計期間の計画コスト。

> **注:**
> 経費タイプを簡単に識別して区別できるように、実績と計画のヘッダー行が異なる色分けされています。

- 新しいコスト計画:エンティティの新しいコスト計画を作成するための簡素化されたサイドパネルが開きます。
- テーブルの左ペインの列をカスタマイズするためのカスタマイズオプション。
- コストまたはベースライン比較を Microsoft Excel または CSV ファイルとしてダウンロードするためのエクスポートオプション。

でのステータスレポート プロジェクトワークスペース

プロジェクトワークスペースのステータスレポートは、コスト、リソース、マイルストーン、健全性などの主要領域にわたるプロジェクト全体の健全性の概要を示すスナップショットです。

https://player.vimeo.com/video/1093765468?h=414833d0a6&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

プロジェクトワークスペースのステータスレポートは、総合健全性、スケジュール、スコープ、コスト、リソース使用率などの主要なプロジェクトメトリクスをキャプチャして表示することで、プロジェクトの現在のステータスを包括的かつ構成可能かつカスタマイズ可能なビューを提供します。ステータスレポートは、プロジェクトチームとステークホルダーが進捗状況を追跡し、リスクを特定し、プロジェクトに関連する問題をリアルタイムで管理するのに役立ちます。

ステータスレポートのメインメトリクス

メトリクス	説明
総合健全性	プロジェクトの一般的な状態 (緑、黄、または赤)。
完了ステータス	プロジェクトの完了率。
スケジュールとスコープ	主要なマイルストーンとスコープの変更。
コストメトリクス	計画コストと実績コスト、および予算の差異。
リソース使用率	プロジェクトリソースの割り当てと工数の追跡。

主な特長

プロジェクトワークスペースのステータスレポート機能は、プロジェクトの全体的な健全性、進捗状況、および主要なメトリクスを明確に表示し、プロジェクトのライフサイクル全体を通じて効果的なコミュニケーションと追跡を確認します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プロジェクトワークスペースのステータスレポートを使用すると、次のことができます。

- スケジュール、コスト、リソース使用率などの主要なメトリクスのサマリーを簡潔に把握することで、プロジェクトの可視化が向上し、ステークホルダーが進捗状況を追跡できるようになります。
- プロジェクトの現在の状況のスナップショットを提供することで、より良い意思決定を促進し、プロジェクトマネージャーとステークホルダーが潜在的な課題に対処できるようにします。
- リスク、問題、または差異を強調表示することでリスク管理を強化し、チームがプロジェクトの懸念事項に積極的に対応できるようにします。
- 定期的な標準化された更新を提供し、全員がプロジェクトの進捗状況と健全性について常に情報を得られるようにすることで、チームと利害関係者間の一貫したコミュニケーションを維持します。
- レポートの作成を簡素化し、時間を節約し、プロジェクト全体で一貫性を確保しながら、必要に応じてカスタマイズできるようにするテンプレートを使用することで、効率を向上させます。

ステータスレポートテンプレート

ステータスレポートテンプレートは、事前定義された構造を提供して一貫性を確保し、時間を節約することで、プロジェクトの更新を生成するプロセスを簡素化します。次の 2 つのデフォルトテンプレートを使用できます。

- 1 ページのステータスレポート: このテンプレートは、主要なプロジェクトメトリクスの簡潔な 1 ページの要約を提供するため、概要で十分な迅速な更新に最適です。
- デフォルトのステータスレポート:このテンプレートには、マイルストーン、リスク、問題、意思決定、変更要求などの領域をカバーする、より包括的な範囲のデータポイントが含まれています。従来のステータスレポートと同様に、プロジェクトの進捗状況とステータスの詳細ビューを提供します。

- 既存のテンプレートのいずれかを使用して、ステータスレポートを作成できます。 でのステータスレポートの作成 プロジェクトワークスペース
- 独自のステータスレポートテンプレートを最初から作成することもできます。 でのステータスレポートテンプレートの作成 プロジェクトワークスペース

関連情報

- でのステータスレポートの分析 プロジェクトワークスペース
- 古いプロジェクトステータスレポートのインポート先 プロジェクトワークスペース
- でステータスレポートに動的コンテンツを追加する プロジェクトワークスペース

プロジェクトワークスペースの構成

プロジェクト、財務、およびリソースを開始および計画するために、プロジェクトワークスペースアプリケーションを設定および構成します。

関連情報

- プロジェクトワークスペースでのプロジェクトの管理
- プロジェクトの財務管理
- プロジェクトワークスペースでのリソース計画
- プロジェクトワークスペースの参照

プロジェクトワークスペースを使用したプロジェクトの構成

プロジェクトワークスペースアプリケーションを設定し、プロジェクトの計画立案を開始します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション.
- 依存関係、ライセンスやサブスクリプションの要件、およびリリースの互換性については、ServiceNow Store のプロジェクトワークスペース アプリケーションリストを確認してください。
- プロジェクトワークスペースをインストール。

プロジェクトワークスペースをインストール

admin ロールをお持ちであれば、プロジェクトワークスペースアプリケーション (sn_pw) をインストールできます。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション.
- 依存関係、ライセンスやサブスクリプションの要件、およびリリースの互換性については、ServiceNow Store のプロジェクトワークスペース アプリケーションリストを確認してください。
- Yokohama リリース以降、PPM Standard プラグインをインストールすると、プロジェクトワークスペースアプリケーションもインストールされます。
- PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) が有効化されていることを確認してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して、プロジェクトワークスペースアプリケーション (sn_pw) を検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることがあります。

   [インストール] ボタンの横のリストに、使用可能なバージョンが表示されます。
3. リストからバージョンを選択し、[インストール] を選択します。

   表示される [インストールの詳細を確認] ダイアログボックスに、アプリケーションとともにインストールされている依存関係が一覧表示されます。
4. プロンプトが表示された場合は、ServiceNow Store へのリンクに従って、依存関係のエンタイトルメントを取得します。
5. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。
   デモデータは、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードです。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。
6. **[Install** (インストール)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
計画立案属性依存関係プラグインは、プロジェクトワークスペース とともにインストールされます。

プロジェクトワークスペースを使用したリソースの構成

プロジェクトワークスペースでの要件に基づいて、リソース管理のさまざまな側面を構成し、プロジェクトにリソースを割り当てます。

- 依存関係、ライセンスやサブスクリプションの要件、およびリリースの互換性については、ServiceNow Store のプロジェクトワークスペース アプリケーションリストを確認してください。
- プロジェクトワークスペースをインストール。
- PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) がアクティブ化されていることを確認してください。
- リソース管理 の属性が有効になっていることを確認してください。詳細については、「Planning 属性の使用」を参照してください。

プロジェクトワークスペース の財務の構成

財務ビューおよび計画立案属性をカスタマイズし、スケジュール済みジョブをアクティブ化して、プロジェクトのファイナンシャルプランに取り組みます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 作業アイテムへのリソースのアサインに基づいて財務で人件費を生成するように属性を構成します。
   詳細については、「Planning 属性の使用」と「計画立案属性の作成または編集」を参照。
2. デフォルトのマッピング構成を生成してテーブルマップを作成します。
   詳細については、「デフォルトのマッピング構成を生成」を参照してください。
3. プロジェクトの予算割り当てを有効にします。
   詳細については、「プロジェクトワークスペースでのプロジェクトの財務予算割り当ての有効化」を参照してください。
4. 原価費目別または経費タイプ別に予算を割り当てるための予算割り当て属性を定義します。
   詳細については、「予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する」を参照してください。
5. リソースのアサインの経費タイプ属性を有効にして、作業に関連する経費をキャプチャします。
   詳細については、「リソースのアサインで経費タイプを有効にする」を参照してください。
6. ロールアップされた財務データを計画立案アイテムレベルで表示するための新しいウィジェットを作成します。
   詳細については、「ウィジェットの構成とプロジェクトへの関連付け」を参照してください。
7. オプション: 組織の要件に合わせて、[財務] 画面の左ペインをカスタマイズします。
   詳細については、「財務の左ペインビューのカスタマイズ」を参照してください。
8. 組織の要件に合わせて [コスト計画を作成] フォームのフィールドをカスタマイズします。
   詳細については、「[コスト計画] フォームのカスタマイズ」を参照してください。
9. デフォルトの経費タイプをカスタマイズして、プロジェクトとデマンドのコスト計画を管理します。
   詳細については、「Change the default expense type for projects (プロジェクトのデフォルトの経費タイプの変更)」を参照してください

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

10. 計画立案アイテムの財務ベースラインを作成するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
詳細については、「Activate a scheduled job to create financial baselines for your projects and demands (プロジェクトおよびデマンドの財務ベースラインを作成するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化)」を参照してください。
11. 属性ベースのリソースのアサインに基づいてプロジェクトの人件費を生成するスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
詳細については、「Activate a scheduled job to generate labor costs for your projects and demands (プロジェクトおよびデマンドの人件費を生成するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化)」を参照してください。

プロジェクトワークスペースでのプロジェクトの財務予算割り当ての有効化

ネクストエクスペリエンスに移行した後に割り当てプロパティを有効にし、プロジェクトワークスペースを使用してプロジェクトの予算割り当てに取り組みます。

始める前に

- ネクストエクスペリエンスで財務にアクセスする新規顧客の場合、このプロパティはデフォルトで有効になっています。
- 必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > プロパティ.
2. [名前] 列をフィルタリングして、**sn_invst_pln.enable_budget_allocation_v2** プロパティを見つけて開きます。
3. [値] フィールドを **[True]** に更新し、[更新] を選択します。

次のタスク

計画立案アイテムの予算管理に役立つ予算属性を設定します。詳細については、「予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する」を参照してください。

予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する

戦略的計画を使用して計画立案アイテムの予算割り当てを処理するには、経費タイプまたは原価費目で予算属性をインスタンスレベルとして構成します。

始める前に

- 計画立案アイテムの予算業務で機能するように予算割り当てプロパティを有効にします。詳細については、「戦略的計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化」を参照してください。
- 必要なロール：admin

注:
既存のお客様は、予算属性を cost_type に変更することはできません。

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > プロパティ.
2. [名前] 列をフィルタリングして、**budget_allocation_attribute** プロパティを見つけて開きます。
3. [値] フィールドを次のいずれかに更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- **cost_type** - ハードウェア経費、外部労働投資、ソフトウェア投資、ソフトウェア経費などの原価費目別に財務ビューをネストします。
- **expense_type** - 投資や経費などの経費タイプ別に財務ビューをネストします。

4. [更新] を選択します。

リソースのアサインで経費タイプを有効にする

リソースのアサインの経費タイプは、作成されるプロジェクトまたはデマンドと同じです。リソースのアサインで経費タイプを有効にすると、作業のさまざまなタイプの経費を正確に経費計上できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. アクティブにして、スケジュール済みジョブを実行します。
   a. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
   b. [名前] フィールドをフィルタリングして、[タスクタイプ計画立案属性をタスクから移行 **(Migrate task type planning attributes from tasks)**] を見つけて開きます。
   c. [アクティブ] オプションを選択して、スケジュールジョブをアクティブ化します。
   d. [スケジュール済みスクリプト実行] フォームのフィールドを編集してジョブをカスタマイズし、要件を満たします。

      フィールドの説明とスクリプトの詳細については、「Automatically run a script of your choosing」を参照してください。

   e. [今すぐ実行] を選択してスケジュール済みジョブを実行するか、[更新] を選択して変更を保存します。
2. リソースのアサインで経費タイプを有効にします。
   a. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
   b. 名前フィールドをフィルタリングして、リソースのアサインの **sn_plng_att_core_resource_assignment** テーブルを見つけて開きます。
   c. **[Show List** (リストを表示)] 関連リンクを選択します。
   d. [リストをカスタマイズ] (⚙ アイコンを選択します。
   e. [リストをカスタマイズ] 列で、[利用可能] リストから [選択済み] リストに 経費タイプ を追加します。
   f. *[OK]* を選択します。

タスクの結果
経費タイプ フィールドは、プロジェクトとデマンドのリソースのアサインで有効になっています。さまざまな経費タイプを経費計上して、投資や経費などのさまざまな作業タイプを記録できます。

財務の左ペインビューのカスタマイズ

財務の左ペインをカスタマイズして、カスタムフィールド情報を表示します。


始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [Label (ラベル)] フィールドをフィルターして、**[Cost Plan** (コスト計画)] テーブルを開きます。
3. **[Show List** (リストを表示)] 関連リンクを選択します。
4. に移動し、財務ビューを選択します リストコントロール > 表示 > 財務ビュー.



選択したビュー (　) がヘッダーに表示されます。

5. ヘッダーオプションを選択して、リストのレイアウトを構成します。

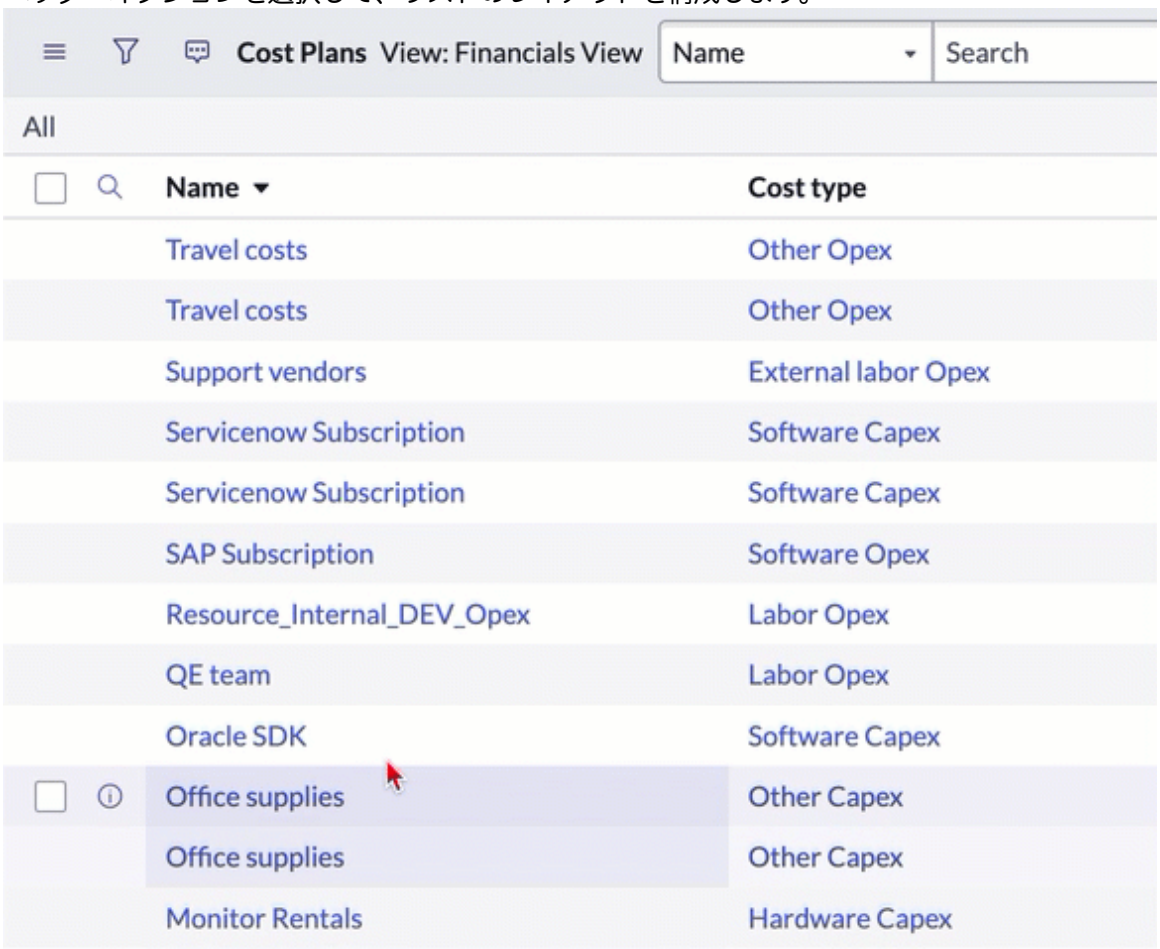

6. [選択済み] 列のフィールドを追加または削除して、財務ビューの左ペインビューをカスタマイズします。
7. [保存] を選択します。

タスクの結果

財務ビューのカスタマイズされたフィールドが含まれるコスト計画テーブルが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[コスト計画] フォームのカスタマイズ

組織のニーズに応じて、新しいコスト計画フォームで必要なフィールドを管理します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [Label (ラベル)] フィールドをフィルターして、**[Cost Plan** (コスト計画)] テーブルを開きます。
3. [フォームをデザイン] 関連リンクを選択します。
4. ヘッダー行で、テーブルリストから [コスト計画 **[cost_plan]]** を選択し、ビューリストから [財務ビュー] を選択します。
5. このフォームでは次のことができます。
   - [フィールド] 列から必要なフィールドをドラッグアンドドロップする。
   - [フィールドを削除] アイコンを使用して、既存のフィールドを削除する。
6. [保存] を選択します。

プロジェクトの予算を移行するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化

[アクティブなデマンドとプロジェクトの予算の移行 **(Migrate budget for active demands and projects)]** スケジュール済みジョブをアクティブ化して、アクティブなプロジェクトの予算をクラシック UI からネクストエクスペリエンスに移行します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. 名前フィールドをフィルタリングし、[アクティブなデマンドとプロジェクトの予算の移行 **(Migrate budget for active demands and projects)]** を見つけて開きます。
3. [スケジュール済みスクリプト実行] フォームのフィールドを編集してジョブをカスタマイズし、要件を満たします。
   フィールドの説明とスクリプトの詳細については、「Automatically run a script of your choosing」を参照してください。
4. [今すぐ実行] を選択してスケジュール済みジョブを実行するか、[更新] を選択して変更を保存します。

プロジェクトワークスペースでのプロジェクトのセキュリティの構成

プロジェクトのセキュリティを構成してプロジェクトを機密にし、許可されたユーザーのみがプロジェクトとそのサブプロジェクトおよび関連エンティティにアクセスできるようにします。

機密性の高いプロジェクトを表示し、指定したユーザーおよびユーザーグループのみがアクセスできるようにすることができます。プロジェクトに適用されるセキュリティ設定は、プロジェクトのサブプロジェクト、フォーム、および関連エンティティにも適用されるため、すべてのプロジェクト関連データは保護されたままになり、権限を持つ担当者のみがアクセスできます。

これらの高度なセキュリティ機能を有効にするには、Project Advanced Security プラグインをインストールする必要があります。プラグインには、前提条件として PPM 標準 プラグインが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

Project Advanced Security プラグインのアクティブ化

プロジェクトワークスペースでプロジェクトのセキュリティを有効にする

Project Advanced Security プラグインのアクティブ化

Project Advanced Security プラグインをアクティブ化して、プロジェクトのプロジェクトセキュリティ設定を有効にします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 選択 すべて > システム定義 > プラグイン.
2. **Project Advanced Security** を検索してインストールします。

関連情報

プロジェクトワークスペースでのプロジェクトのセキュリティの構成

プロジェクトワークスペースでプロジェクトのセキュリティを有効にする

プロジェクトワークスペースでプロジェクトのセキュリティを有効にする

プロジェクトのセキュリティを有効にしてプロジェクトを機密にし、許可されたユーザーのみがプロジェクトとその関連サブプロジェクトおよびエンティティにアクセスできるようにします。

始める前に
Project Advanced Security プラグインをインストールします。

必要なロール：admin

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. リストから [詳細] を選択して、プロジェクトの [詳細] ページを開きます。
3. 一番下までスクロールして 機密 性を見つけ、選択します。
4. 次のフィールドで、プロジェクトにアクセスできるユーザーとユーザーグループを指定します。

   アクセスするユーザーまたはユーザーグループを少なくとも 1 つ指定する必要があります。

   機密プロジェクトには、 許可されたユーザー、 許可されたグループ、 アサイン先 ユーザー、 追加の担当者、プロジェクト マネージャー、およびアドミニストレーターがアクセスできます。

5. **[Save** (保存)] を選択します。

   プロジェクトを機密にすると、機密性設定がプロジェクト、すべてのサブプロジェクト、およびエンティティ (コスト計画、コスト計画ブレークダウン、利益計画、利益計画ブレークダウン、経費ライン、タイムカード、ステータスレポート、ベースライン、ストーリー、投資オブジェクト、プロジェクトタスク、リソース計画、リソースのアサイン、および RIDAC など) に適用されます。

   これらは、プロジェクトに明示的に追加された個人のみがアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この設定は、関連付けられているすべてのワークスペースに適用されます。プロジェクトが 1 つのワークスペースで機密とマークされている場合、以下を含む他のすべてのワークスペースで自動的に機密扱いになります。

- プロジェクト管理ワークスペース
- リソース管理ワークスペース
- 戦略的ポートフォリオワークスペース


関連情報

プロジェクトワークスペースでのプロジェクトのセキュリティの構成


プロジェクトワークスペースでのプロジェクトの管理

プロジェクトワークスペースの機能を使用してプロジェクトを計画および管理します。

ホームページのグリッドビュー

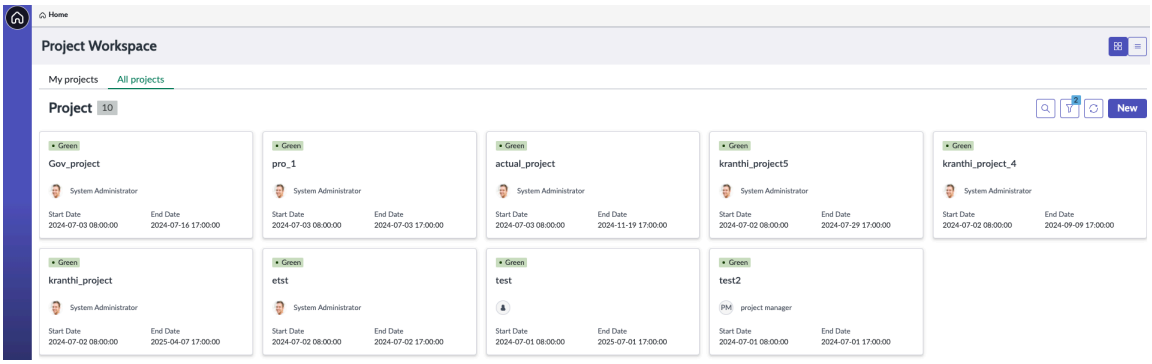

ホームページのリストビュー

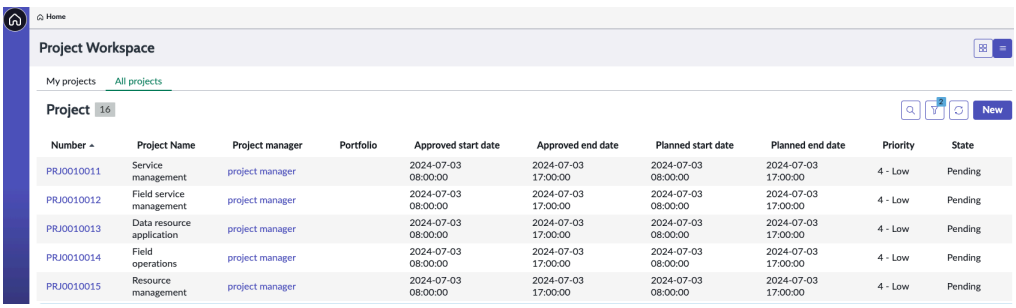

ホームページには、次の UI コンポーネントが含まれており、ワークスペース内を移動するのに役立ちます。

プロジェクトワークスペースホームページ UI

機能	説明
プロジェクトのグリッドビュー ( )	プロジェクトをグリッドビューまたはカードビューで開きます。
プロジェクトのリストビュー ( )	プロジェクトをリストビューで開きます。
自分のプロジェクト	このセクションでは、自分が所有しているすべてのプロジェクト (サブプロジェクトを含む) が表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトワークスペースホームページ UI (続く)

機能	説明
すべてのプロジェクト	このセクションには、システム内のすべてのプロジェクトが表示されます。 すべてのプロジェクトには、カスタマープロジェクト、チームスペース、および監査からのプロジェクトが含まれます。
プロジェクト	このセクションではプロジェクトのみが表示されます。
サブプロジェクト	このセクションではサブプロジェクトのみが表示されます。
プロジェクトカード (Project cards)	各プロジェクトはプロジェクトカードで表されます。 こうしたカードには、プロジェクト名、ステータス、予定日、プロジェクトがアサインされているマネージャーなど、大まかな詳細が表示されます。
プロジェクト検索	プロジェクトを、名前またはアサイン先ユーザーで検索するためのオプション。
フィルター	ホームページにフィルターを適用するオプション。選択したフィルター設定は、フィルタークライテリアに保持されます。
リフレッシュ	ホームページを再ロードします。
新規	プロジェクトを作成するオプション。


計画立案のヘッダー

ヘッダーにはプロジェクト名が表示され、次のさまざまなオプションを備えています。

名前	説明
プロジェクトの詳細を編集 ( )	サイドパネルでプロジェクトの詳細を開いて編集します。 「プロジェクトワークスペースでのプロジェクト作成」を参照してください。
アクティビティ ( )	さまざまなステークホルダー間の会話を促進します。 「プロジェクトワークスペースからのステークホルダーとのコラボレーション」を参照してください。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
添付ファイル ( )	プロジェクトにファイルを追加できます。 「プロジェクトワークスペースからのステークホルダーとのコラボレーション」を参照してください。
プロジェクトをリフレッシュ ( )	計画立案ページを再ロードします。
保存 ( )	変更内容を保存します。このボタンは、プロジェクト計画に加えられた変更の自動保存を容易にするため、デフォルトでは無効になっています。 設定 ( ) パネルの [詳細] タブから自動保存機能を有効または無効にします。
同期されていないリソース ( )	プロジェクトとリソースのアサイン日を同期できます。プロジェクトタスクの予定日または実際の日付に変更がある場合、このアイコンが有効になります。 プロジェクトにクラシックリソース計画がある場合、このアイコンは、デフォルトでは非アクティブです。
	このトグルを有効にすると、[リソースのアサイン] ペインが表示されます。
	[計画立案] ページのグリッドビューとガントビューの両方にデータを表示します。このボタンはデフォルトでアクティブになっています。
	[計画立案] ページのガントビューにデータを表示します。このボタンを使用して、タスクの日付と依存関係を変更します。
	[計画立案] ページのグリッドビューにデータを表示します。このボタンを使用して、タスクの追加と削除、タスクの日付と依存関係の変更、プロジェクト全体の進捗状況の評価を行います。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

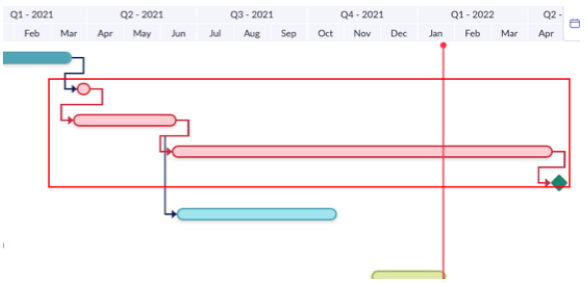名前	説明
ベースライン ( )	スケジュールと財務ベースラインを作成して比較できます。 「プロジェクトワークスペースでのプロジェクトベースラインの作成と比較」を参照してください。
クリティカルパス ( )	ボタンを切り替えてプロジェクトのクリティカルパスの表示をオン/オフにします。 
タスクを追加 	データグリッドにプロジェクトタスクを追加します。 「プロジェクトワークスペースからのプロジェクトタスクの作成およびアサイン」を参照してください。
プロジェクトアクション ( )	プロジェクトで実行する、その他のアクションを提供します。 • テンプレートを適用 • プロジェクトを削除 • プロジェクトを移動 • プロジェクトを複製 • MS プロジェクトからインポート • プロジェクトをエクスポート • ヘルプビデオを起動 • 完了見積を計算 • 部分プロジェクトのコピー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

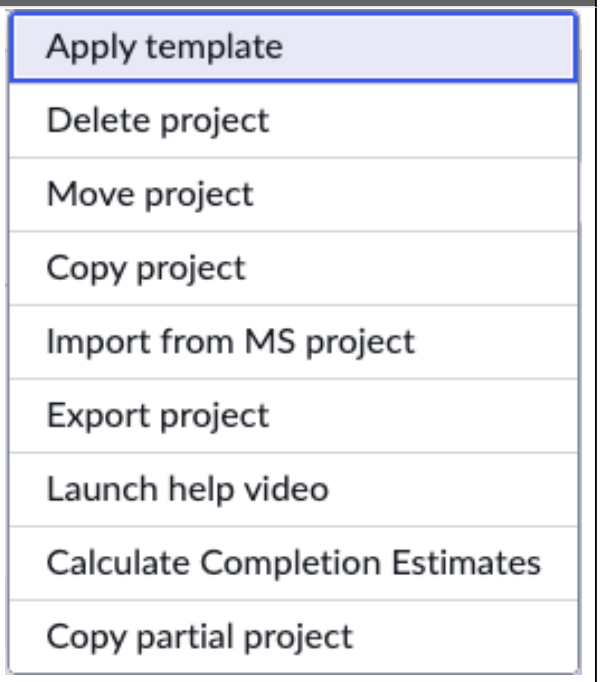名前	説明
	 [プロジェクトを移動] を使用して、プロジェクトの日付を、関連するリソース計画、コスト計画、利益計画、リソースのアサイン、プロジェクトタスク、およびサブプロジェクトの開始日と同期します。

[リソースのアサイン] ペイン

[リソースのアサイン] ペインには、プロジェクトワークスペースからリソースを管理するのに役立つ次の UI コンポーネントが含まれています。

名前	説明
リソースのアサインをリフレッシュ ()	選択したアサインと割り当てをリロードします。
	[リソースのアサイン] ペインにリソース割り当てを表示します。
	工数タイプを FTE、時間、または人日として表示します。
	週または月別に工数を表示します。このボタンは、[割り当てヒートマップ] トグルが有効になっている場合にのみ表示されます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
Add resource	[リソースのアサイン] ペインにリソースを追加します。



データグリッド

データグリッドでは、プロジェクトタスクやサブプロジェクトのリストが行表示され、行に対するアクションを実行するための以下のオプションが表示されます。プロジェクトにサブプロジェクトがある場合は、こうしたサブプロジェクトのタスクとスケジュールにもドリルダウンできます。

オプション	説明
列アクション	ヘッダーのアクションを使用して、プロジェクトタスクをソートおよびフィルタリングします。列ヘッダーにマウスデバイスを合わせると、コンテキストメニューアイコン  ( ) が表示されます。 このメニューを使用して、自動調整、非表示、またはリセットなどのアクションを実行できます。 [簡単な説明] や [ステータス] など、特定の列に対してコンテキストメニュー




自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

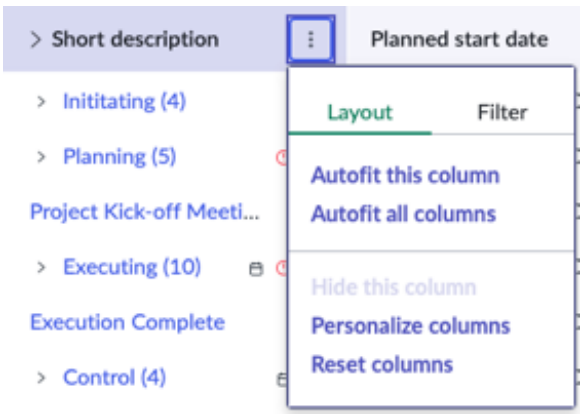オプション	説明
	 ( ) を選択した場合は、プロジェクトタスクの行をフィルタリングすることもできます。 


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
行を再配置  ( )	プロジェクトタスク行をグリッド上の任意の位置にドラッグできるようにします。
行を選択  ( )	複数のプロジェクトタスク行を一度に選択します。 行コンテキストメニュー  ( ) を使用して、さまざまなアクションを実行します。




自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

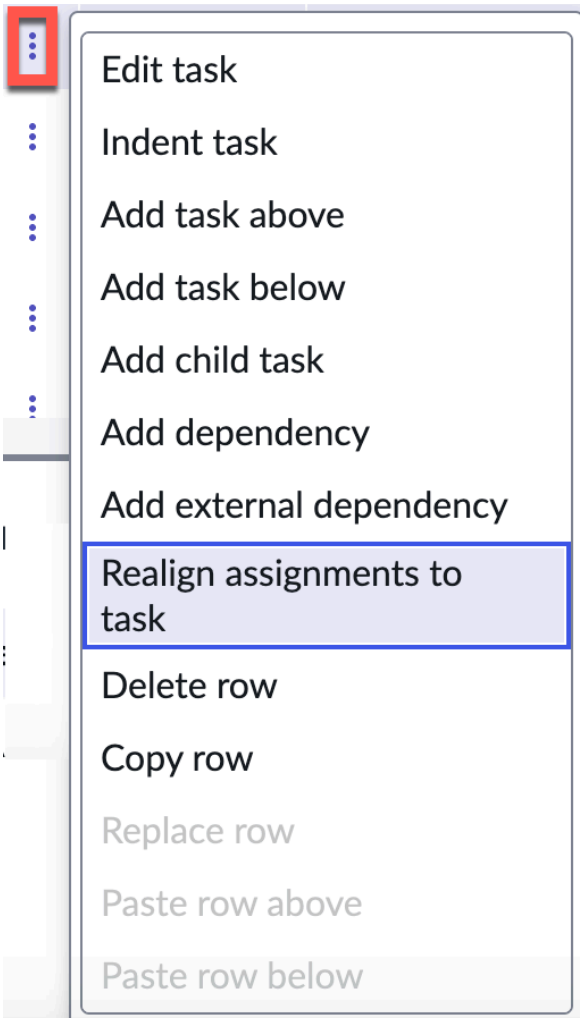オプション	説明
行コンテキストメニュー ( )	タスクの編集、上下のタスクの追加、行の削除、依存関係の追加など、選択した行にさまざまなアクションを提供します。 また、行コンテキストメニューを使用すると、複数の行を選択して、それらに対してアクションを一括で実行することもできます。たとえば、複数のタスクをインデントしたり削除したりすることができます。 


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
展開された行  ( )	プロジェクトタスクの行が展開され、その子タスクが表示されていることを示します。このアイコンを選択すると、行が折りたたまれ、子タスクが非表示になります。
折りたたまれた行  ( )	プロジェクトタスクに子タスクが含まれていることを示します。このアイコンを選択すると行が展開され、子タスクが表示されます。
列を並べ替え  ( )	データグリッドの列を並べ替えます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
個々のセルを編集	セルのコンテキストメニュー  ( ) を選択するか、セルを選択して長押し (または右クリック) し、このセルの情報を編集またはコピーします。 このメニューを使用して、セルの内容をコピーして貼り付けたり、依存関係を追加したり、このセル位置の真上または真下にプロジェクトタスクを追加したり、行全体を削除したりします。
複数のセルを編集	複数のセルを選択して、そのいずれかのセルを選択して長押し (または右クリック) し、セルを一括編集します。セルコンテキストメニュー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	 (を使用してその他のオプションを選択することもできます。)

簡単な説明を選択してプロジェクトタスクを選択すると、サイドパネルにタスクの詳細が表示され、それを編集することができます。「プロジェクトワークスペースからのプロジェクトタスクの更新」を参照してください。

データグリッドを区切る線をドラッグして、データグリッドが占める領域を増減することもできます。

タイムラインビュー

タイムラインビューには、計画された開始日と終了日に基づいてプロジェクトのタイムラインが表示され、プロジェクトのタスクバーとマイルストーンが表示されます。

計画立案の設定 ( ) を使用して、棒ラベル、依存関係行、およびクリティカルパスの表示を選択できます。「プロジェクトワークスペースでの計画ページビューのカスタマイズ」を参照してください。

プロジェクトタイムライン

タイムラインには、プロジェクトの計画期間が表示されます。タイムスケールを [年]、[四半期]、[月]、[日]、または [週] に変更することで、プロジェクト期間の可視化を増減できます。タイムスケールアイコン ( ) を選択して、いずれかのオプションを選びます。

選択したタイムスケールビューが設定に保存されます。

依存関係行

これらの行は、プロジェクトタスク間の依存関係を示します。新しい依存関係をタイムラインビューに描画して追加するか、既存の依存関係を選択してサイドパネルで詳細を編集できます。「プロジェ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クトワークスペースからのプロジェクトタスクの内部的な依存関係の追加」を参照してください。選択した依存関係が設定に保存されます。

新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス

新しいプロジェクトワークスペースに移動し、計画立案ページでプロジェクトを開く方法について説明します。

始める前に


プロジェクトワークスペースをインストール。

必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース.
2. 表示するプロジェクトに応じて、[自分のプロジェクト] または [すべてのプロジェクト] を選択します。

   ホームページのプロジェクトは、カードまたはリストビューで表示できます。
3. プロジェクトを選択し、計画立案ページで開きます。

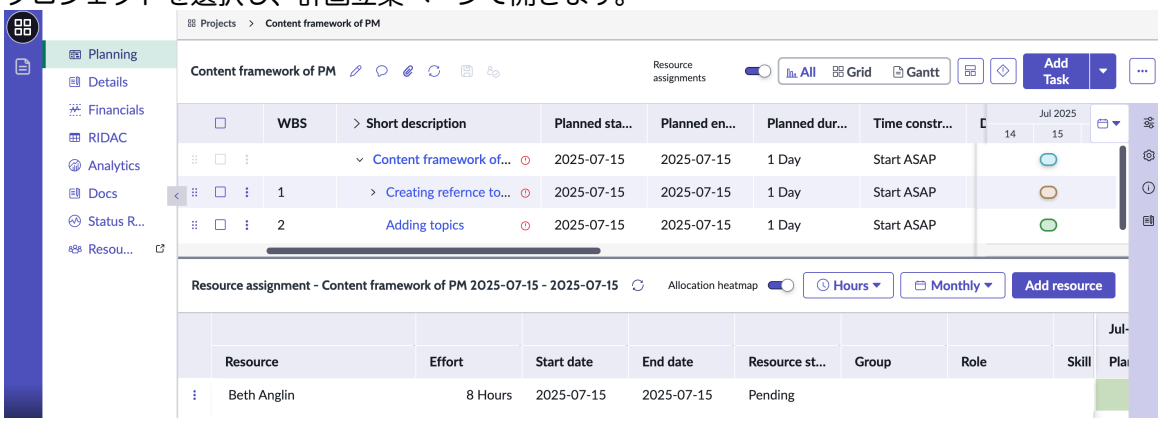

   [プロジェクト] アイコンを選択すると表示されるリストを使用して、計画、詳細、財務、RIDAC、アナリティクス、ドキュメント、およびステータスレポートにアクセスして管理できます。このリストは、レベル 2 (L2) メニューとも呼ばれます。

次のタスク

プロジェクトワークスペースでのプロジェクト作成

プロジェクトワークスペースでのプロジェクト作成

プロジェクトワークスペースを使用してプロジェクトを作成し、プロジェクトタスクの計画立案を開始します。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース.
2. [新規] を選択してホームページからプロジェクトを作成します。
3. フォームで、フィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールドの詳細については、「のプロジェクトフォーム プロジェクトワークスペース」を参照してください。

4. [確認] を選択します。

次のタスク

- プロジェクトワークスペースからのプロジェクト詳細の更新
- プロジェクトワークスペースでの計画ページビューのカスタマイズ

プロジェクトワークスペースからのプロジェクト詳細の更新

プロジェクトワークスペースの [詳細] ページを使用して、プロジェクトの詳細を更新し、更新内容または変更された優先度を反映します。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

プロジェクト、プロジェクトの日付、ビジネスケース、財務、スコア、メモ、および設定を編集できます。[詳細] ページの関連タブを使用して、プロジェクトタスク、サブプロジェクト、要件、リソース計画、コスト計画、金額などを表示および編集します。

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. プロジェクトの [詳細] ページを開くには、リストから [詳細] を選択します。
3. 更新するフィールドを編集します。

   プロジェクトワークスペースでは、ステークホルダーの追加、リソース計画の延長または確認、新しいリソース割り当ての日次追加を行うことができます。また、プログラムのステータスレポートを表示し、[新規テンプレートとして保存]オプションを使用してプロジェクトをテンプレートとして保存することもできます。

   プロジェクトワークスペースから、アジャイルフェーズまたはテストフェーズを作成できます。ストーリーを作成したり、既存のストーリーをプロジェクトに追加したり、新しいエピックを追加したりすることもできます。

   SPM の Now Assist アプリケーションがインストールされている場合は、計画立案アイテムの作成スキルを使用してプロジェクトの説明を絞り込むことができます。

4. **[Save** (保存)] を選択します。
   サイドパネルからプロジェクトまたはプロジェクトタスクの詳細を表示できます。新しいタブでタスクを開く ( ) を選択して、プロジェクトを新しいタブで開きます。[完全な詳細] ページを使用して、作業メモや添付ファイルを追加したり、プロジェクトまたはタスクの関連リストを表示したりできます。

プロジェクトワークスペースからのプロジェクトアナリティクスの分析

プロジェクトワークスペースの [アナリティクス] タブでプロジェクトサマリーを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

注:
プロジェクトサマリーのウォーターフォール、ハイブリッド、スクラムの各ダッシュボードは、ネクストエクスペリエンス UI フレームワークで利用できます。


必要なロール：it_project_user

このタスクについて

[アナリティクス] タブは、未解決のリスク、実際のコスト、遅延したマイルストーンなどの要素を含む、プロジェクトの進捗状況を監視するための事前設定されたウィジェットとレポートを表示するダッシュボードです。レポートは、プロジェクトフォームのフィールドのデータをアグリゲートします。さまざまなプロジェクトタイプで使用できるさまざまなウィジェットとレポートの詳細については、「プロジェクト分析ウィジェットとレポート」を参照してください。

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. リストから [アナリティクス] を選択して、プロジェクトのアナリティクスページを開きます。

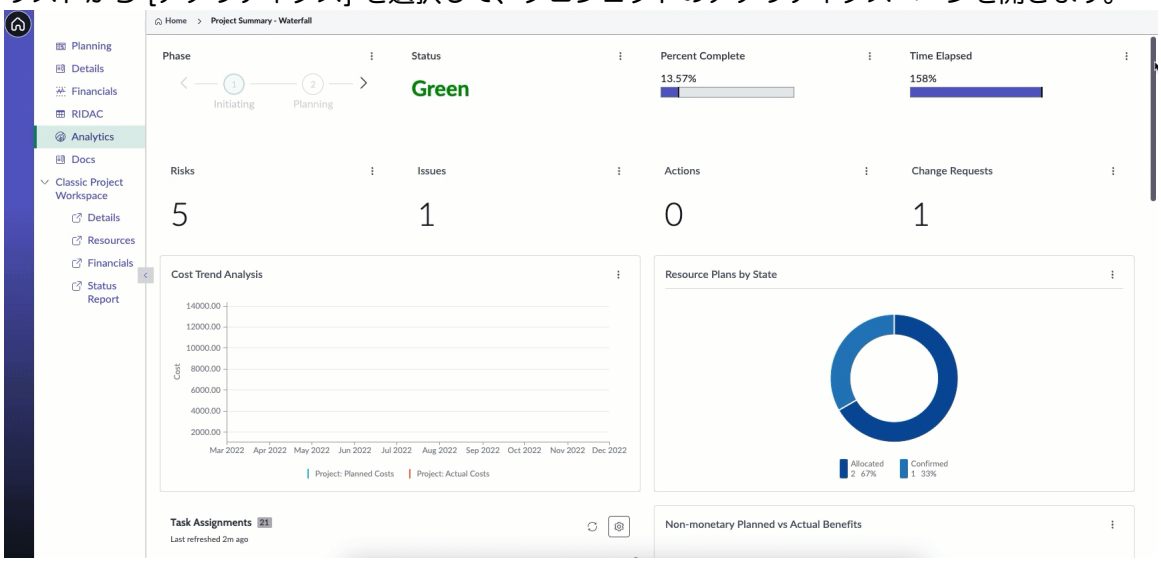

3. 表示されたレポートを確認し、必要に応じて必要なアクションを実行します。

プロジェクトアナリティクスのウィジェットとレポート

ウィジェットとレポートは、アジャイル、ウォーターフォール、およびハイブリッドプロジェクトのプロジェクトワークスペースの [アナリティクス] ページで、プロジェクトサマリーの情報を提供します。

プロジェクトウィジェットとレポート

ウィジェットとレポートは、アジャイル、ウォーターフォール、およびハイブリッドプロジェクトの進捗状況を表示および追跡するための情報を提供します。

注:
アジャイルおよびハイブリッドプロジェクトのウィジェットとレポートを表示するには、 アジャイル開発 2.0 プラグインがインストールされている必要があります。プロジェクトサマリーのウォーターフォール、ハイブリッド、スクラムの各ダッシュボードは、ネクストエクスペリエンス UI フレームワークで利用できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

システムアドミニストレーターは、ダッシュボードのウィジェットとレポートを設定して、[アナリティクス] ページにプロジェクト情報を表示できます。以下のダッシュボードを使用できます。

プロジェクトの実行タイプ	表示されるダッシュボード	説明
ハイブリッド	プロジェクトサマリー - ハイブリッド	ハイブリッドプロジェクトのレポートとウィジェットが含まれます。
アジャイル (Agile)	プロジェクトサマリー - スクラム	アジャイルプロジェクトのレポートとウィジェットが含まれます。
ウォーターフォール	プロジェクトサマリー - ウォーターフォール **注:** このダッシュボードは、以前はプロジェクトマネージャーサマリーダッシュボードと呼ばれていました。	ウォーターフォールプロジェクトのレポートとウィジェットが含まれます。

プロジェクトの実行タイプによって、[アナリティクス] ページに表示されるダッシュボードが決まります。

[アナリティクス] ページにカスタムダッシュボードを埋め込むこともできます。システムアドミンは、 `PMViewDataUtils` スクリプトインクルードを変更し、 `getDashboardUrl` メソッドの `dashboards_tabs` の変数値を設定できます。その結果、プロジェクトアナリティクスでカスタムダッシュボードを表示できます。例：

```
var dashboards_tabs =

    {
        waterfall: {
                dashboard_sysId: '5d4959dd878003008b9b3a0548cb0bd0',
                tab_sysId: '1d99d5dd878003008b9b3a0548cb0bbd'
                  },
        hybrid: {
                dashboard_sysId: '96dc46c78700330047d84c2c59cb0bf1',
                tab_sysId: '520d4ac78700330047d84c2c59cb0bab'
                  },
        agile: {
                dashboard_sysId: 'f3dd4ec78700330047d84c2c59cb0b93&tab',
                tab_sysId: '52fd8ec78700330047d84c2c59cb0bae'
                  },
        any_other_executionType: {
                dashboard_sysId: 'custom_dashboard_sys_id',
                tab_sysId: 'custom_dashboard_tab_sys_id'
                  },
      };
```

すべてのプロジェクトタイプについて、次のウィジェットとレポートが [アナリティクス] ページに表示され、プロジェクトマネージャーがプロジェクトを分析する際に役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイルプロジェクトのウィジェットとレポート

名前	説明
受け入れ条件のないストーリー	受け入れ条件情報のないプロジェクトのストーリーの数。
ストーリーの欠落ポイント	[ポイント] フィールドが空白のプロジェクトのストーリーの数。
ストーリー受け入れの期限切れ	スプリントの終了後に完了またはキャンセルステータスになっていないプロジェクト内のストーリーの数。
チームに関するスプリントステータス	リリース全体でさまざまなスクラムチームのスプリント関連のステータスを追跡します。チーム名をクリックして、スプリントの詳細を表示します。
ステータス別のストーリー	ドラフト、準備完了、WIP など、開発のさまざまなステージにあるストーリーの数を示すドーナツグラフ。適切な状況をクリックして、ストーリーの詳細を表示します。
ポイント別の進捗状況	ポイントに基づいてプロジェクトの進捗状況を追跡します。エピック、アサイン先グループ、およびステータスの任意の組み合わせに基づいて、ストーリーのグループ化と積み重ねを行うことができます。
ストーリー別の進捗状況	ストーリーの数に基づいてプロジェクトの進捗状況を追跡します。エピック、アサイン先グループ、およびステータスに基づいて、ストーリーのグループ化と積み重ねを行うことができます。

ウォーターフォールおよびハイブリッドプロジェクトのウィジェットとレポート

名前	説明
問題	プロジェクトに含まれる [処理待ち]、[オープン]、および [対応中] 状況の問題の数。
アクション	プロジェクトの [処理待ち]、[オープン]、および [対応中] 状況のアクションアイテムの数。
変更要求	プロジェクトの [処理待ち]、[オープン]、および [対応中] 状況の変更要求の数。
ステータス別のストーリー	[ドラフト]、[準備完了]、[WIP] など、開発のさまざまなステージにあるストーリーの数を示す円グラフ 。適切な状況をクリックして、ストーリーの詳細を表示します。 **注:** このウィジェットは、ハイブリッドプロジェクトにのみ適用されます。
ステータス別のタスク	[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ] など、開発のさまざまなステージにあ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウォーターフォールおよびハイブリッドプロジェクトのウィジェットとレポート (続く)

名前	説明
	るプロジェクトタスクの数を示すドーナツグラフ。適切な状況をクリックして、タスクの詳細を表示します。
プロジェクトメンバーに対する割り当ての詳細 (時間)	プロジェクトにアサインされたリソースの割り当てられた時間と実績時間を示す積み上げ棒グラフ。
プロジェクトメンバーに対する割り当ての詳細 - 月次 (時間)	プロジェクトにアサインされたリソースの割り当てられた時間と実績時間を示すピボットグラフ。
タスクのアサイン	アサインされたユーザーまたはグループに基づいて、リリース全体でさまざまなプロジェクトタスクのステータスを追跡します。ユーザー名またはグループ名をクリックして、アサインされたタスクの詳細を表示します。
ステータス別のリソース計画	現在のステータスに従ってグループ化されたリソース計画の数を示すドーナツグラフ。
期限切れのタスクとマイルストーン	プロジェクトタスク [pm_project_task] テーブルの次のいずれかの条件を満たすタスクである、期限切れのプロジェクトタスクとマイルストーンのリスト。 • [開始予定日] の値が本日の日付より前で、[状況] の値が [オープン] または [処理待ち] である。 • [シャドウ] フィールドの値が false に設定されている。
(今後 2 週間に) 予定されている、アサイニーのないタスク	現在の日付から 14 日後に開始する予定の未アサインの [オープン] または [処理待ち] のプロジェクトタスクのリスト。

一般的なウィジェット

名前	説明
フェーズ	[開始中] や [計画中] など、プロジェクトの現在のステータス。
ステータス	プロジェクトのステータスを示すカラーインジケーター。
完了率 (%)	完了済みのプロジェクトの割合。
経過時間	プロジェクトの作業中に実開始日から終了予定日までに経過した時間。 プロジェクトが [オープン] または [処理待ち] ステータスの場合、経過時間は開始予定日と現在の日付に基づいて計算されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

一般的なウィジェット (続く)

名前	説明
リスク	プロジェクト関連の [処理待ち]、[達成]、および [未達成] 状況のリスクの数。
コスト傾向分析	月次での計画コストと実際のコストの比較を示す線グラフです。
利益の傾向分析	月次の計画財務利益の傾向を示す線グラフです。
金銭以外の利益計画	アクティブなプロジェクトの金銭以外の利益計画とそれに関連する利益計画の数のブレークダウン。
金銭以外の計画利益と実績利益	会計期間別にグループ化されたアクティブなプロジェクトの財務以外の合計計画利益と実際利益の比較。
確認済みの時間と配分時間と実績時間	プロジェクトの合計確認時間、割り当て済み時間、および実績時間の比較
タイムカード - 承認待ち (Pending Approval)	選択したプロジェクトの送信済みだがまだ承認されていないタイムカード。
タイムカード - 例外レポート	選択したプロジェクトのタイムカードを送信していないユーザーと、選択したプロジェクトに対してまだ承認されていないタイムカードのリスト。例外レポートは、進行中のタスクにアサインされているユーザー、またはプロジェクト/タスクにハード割り当てされているユーザーに対して生成されます。

自動翻訳

プロジェクトワークスペースでの計画ページビューのカスタマイズ

計画立案ページの表示をカスタマイズします。データグリッドとタイムラインに表示するデータを選択します。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

ステップ 2 ～ 4 は、ワークスペースのさまざまな側面をカスタマイズするためのガイダンスとなります。適用するオプションを選択します。

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. サイドパネルを使用して、計画立案コンソールページをカスタマイズします。

   a. [設定] アイコン ( ) を選択します。
   [設定] サイドパネルが開きます。

   b. [列] タブから、計画立案コンソールのデータグリッドに表示する列を選択します。
   これらの列は、プロジェクトタスクの情報を提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. [全般] タブから、依存関係の線、クリティカルパス、バーのプロジェクトタスク名など、タイムラインビューに表示する属性を選択します。
[サマリータスクを表示] オプションを使用すると、すべてのプロジェクトタスクが 1 つのプロジェクトサマリータスクにグループ化されて表示されます。

d. [詳細] タブでは、自動保存オプションを有効にしたり、予定日の列の日付形式を変更したり、計算モードを [手動] または [自動] に変更したりすることができます。
ワークスペースで計算モードを [自動] から [手動] に変更できるのは、プロジェクトにタスクがない場合のみです。

3. 計画立案コンソールページのプロジェクトタスクに追加の列を表示します。

サイドパネルで利用可能なフィールド以外に、計画立案ページビューに追加の列を表示する場合は、プロジェクトタスクリスト (pm_project_task_list.do) のプロジェクトワークスペースビューをカスタマイズします。「計画立案ページへの新しい列の追加」を参照してください。

注:
[タイムスケール]、[サマリータスクを表示]、[棒ラベル]、および [依存関係行] の設定をカスタマイズできます。[サマリータスクを表示] 設定と [タイムスケール] ビューに加えた変更は、設定に保存されます。

4. タイムスケールを変更することで、タイムラインでのプロジェクト期間の可視化を増減します。

[タイムスケール] アイコン ( ) を選択し、[日]、[週]、[月]、[四半期]、[年]、または [自動調整] を選択します。

計画立案ページへの新しい列の追加

新しいプロジェクトワークスペースの計画立案ページに新しい列を表示して、プロジェクトマネージャーが計画立案ページでプロジェクトタスクのカスタムフィールドを表示できるようにします。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
新しいプロジェクトワークスペースの計画立案ページに表示されるプロジェクトタスクには、pm_project_task テーブルのプロジェクトワークスペースビューのフィールドが表示されます。新しいフィールドを表示するには、pm_project_task テーブルのこのプロジェクトワークスペースビューをカスタマイズする必要があります。

手順

1. **pm_project_task_list.do**に移動します。
2. ビューを [プロジェクトワークスペース] に変更します。
   a. ヘッダーを右クリックし、[表示] を選択します。
   b. [プロジェクトワークスペース] を選択します。
3. 必要な列をリストに追加します。
   a. [カスタマイズされたリスト] アイコン ( ) を選択します。
   b. [利用可能] から [選択済み] に必要なフィールドを移動します。
   c. **[OK]** を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

タスクの結果
変更に応じて pm_project_task テーブルのプロジェクトワークスペースビューが更新されます。新しいプロジェクトワークスペースの計画立案ページに、これらの変更が反映されます。

プロジェクトワークスペースからのプロジェクトタスクの作成およびアサイン

新しいプロジェクトワークスペースから直接、プロジェクトの新しいタスクを追加して、チームにアサインします。


始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. [タスクを追加] を選択します。

   新しい行が計画立案ページのデータグリッドの一番下に追加され、タスクのデフォルト名は「新規タスク」になります。

   または、プロジェクトタスクの行を選択して、[タスクを以下に追加] アイコン ( ) をクリックします。このアクションにより、選択したタスクのすぐ下に新しいタスクが追加されます。



3. タスクの詳細を編集します。
   たとえば、タスク名、予定日、担当者などです。
4. オプション: Enter キーを押して詳細を保存し、別のタスクのための行を作成します。
5. タスクフィールドの外側にあるデータグリッドの任意の場所をクリックして、詳細を保存します。
6. [アサイン先] フィールドを更新して、ユーザーにタスクをアサインします。

   タスクがアサインされたユーザーにはメール通知が送信されます。また、ログイン時の ServiceNow インスタンスでも通知を確認できます。


   通知を機能させるには、アドミニストレーターが [メール通知] および [プロバイダー通知] において、通知レコードにアサインされたプロジェクトタスクを **true** に設定して通知を有効にする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- [タスクをインデント] アイコン ( ) を使用して、新しいタスクを既存のタスクやサブプロジェクトのサブタスクにします。

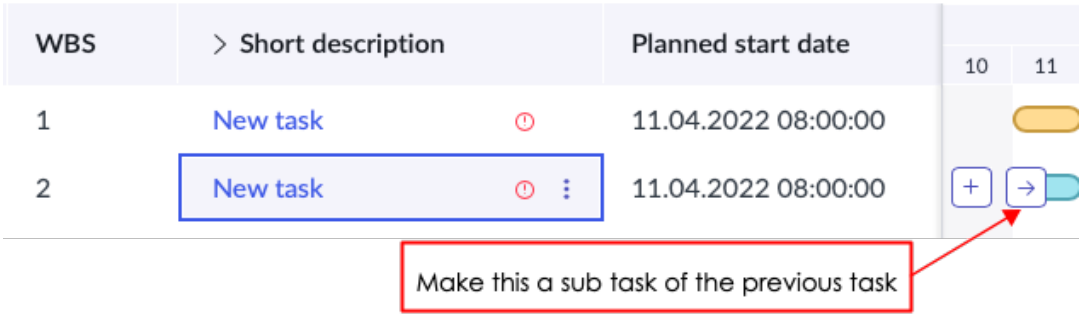

- プロジェクトワークスペースからのプロジェクトタスクの更新。

プロジェクトワークスペースからのプロジェクトタスクの更新

プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページから既存のタスクの詳細を更新します。

始める前に
必要なロール： it_project_manager、it_project_user

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. データグリッド上のタスクのリストから、更新するタスクを選択します。
   サイドパネルにタスクの詳細が開きます。
3. フィールドを編集します。
4. [更新] を選択します。

プロジェクトタスクのチェックリストアイテムの作成

プロジェクトタスクのチェックリストアイテムを作成して、タスクで完了するアイテムを追跡します。

始める前に
必要なロール：it_project_user、it_project_manager

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. プロジェクトタスクに移動します。
3. [計画] ページで、[チェックリスト] セクションの [アイテムの追加] を選択し、アイテムの名前を入力します。
   [詳細] ページからチェックリストアイテムを追加することもできます。プロジェクトタスクを選択し、サイドパネルからチェックリストアイコン ( ) を選択してチェックリストアイテムを追加します。必要に応じて、チェックリストアイテムを追加、編集、整理、または削除できます。
4. [保存] を選択してチェックリストアイテムを保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクのチェックリストアイテムを編集するには、チェックリストセクションで [編集] を選択します。このオプションは、[チェックリスト] セクションに少なくとも 1 つのチェックリストがある場合に表示されます。プロジェクトタスクからチェックリストを削除するには、[アイテムを編集] アイコン () を選択します。

関連情報

プロジェクトタスクのチェックリストアイテム

プロジェクトワークスペースからのプロジェクトタスクの内部的な依存関係の追加

プロジェクトワークスペースのインタラクティブ UI を使用して、プロジェクトタスク間の依存関係を作成します。

始める前に
タイムラインの設定で [依存関係線 (Dependency Lines)] トグルが有効になっていることを確認します。設定の更新方法については、「プロジェクトワークスペースでの計画ページビューのカスタマイズ」を参照してください。

必要なロール：it_project_manager

手順

1. プロジェクトを選択し、計画立案ページで開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. 次のいずれかの方法でタスクの依存関係を作成します。
   作成された依存関係は、タイムラインビュー上の 2 つのタスクバーの間に線として表示されます。

次のタスク
依存関係は編集できます。詳細については、「プロジェクトワークスペースからのタスク依存関係の詳細の更新」を参照してください。

プロジェクトワークスペースからのタスク依存関係の詳細の更新

プロジェクトワークスペースから、依存関係の詳細 (タイプや遅延時間を含む) を更新します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. 2 つの方法のいずれかで依存関係サイドパネルを開きます。
3. フィールドを編集します。
4. [更新] を選択します。

プロジェクトワークスペースからのプロジェクト間の外部的な依存関係の追加

新しいプロジェクトワークスペースを使用して、さまざまなプロジェクトのタスク間に依存関係を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
外部的な依存関係により、先行タスクに変更が生じても、プロジェクトスケジュールへの影響を把握できるようになります。プロジェクトタスクの行コンテキストメニューを使用して、別のプロジェクトのタスクから依存関係を追加します。

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. データグリッドから、依存関係の追加先のプロジェクトタスクを選択します。
3. タスクの行コンテキストメニュー (⋮) を選択し、[外部依存関係を追加] を選択します。
4. [外部依存関係] フォームで、外部タスクが属する プロジェクト を選択します。
5. 依存関係を追加する タスク を選択します。
6. 依存関係タイプを選択します。
7. **[Submit** (送信)] を選択します。
   デフォルトでは [ハード] が選択されています。ハード依存関係では、先行プロジェクトで行われた変更は自動的に後続プロジェクトに伝播されます。

タスクの結果

- 2 つのプロジェクトのタスクに対する依存関係が作成されます。
- プロジェクトの簡単な説明がグレー表示され、名前が「外部プロジェクト名：外部タスク名」の形式に変わり、外部的な依存関係がわかるようになります。
- リンクアイコン (🔗) がタスクの簡単な説明のセルに追加され、依存関係が示されるようになります。

次のタスク
現在のプロジェクトから外部プロジェクトに直接移動して、先行タスクのステータスを表示したり、詳細情報を更新したりすることができます。依存タスクの行コンテキストメニューから、[プロジェクトを表示] を選択します。

関連情報

プロジェクトの外部依存関係の追加

プロジェクトワークスペースでのプロジェクトベースラインの作成と比較

プロジェクトのスケジュールベースラインと財務ベースラインを作成します。ベースラインは、特定の時点でのプロジェクトの進捗状況のスナップショットです。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
必要な数のベースラインを作成し、これらのベースラインを比較して、プロジェクトに加えられた変更や進捗状況を確認します。ベースラインを比較すると、プロジェクトタスクの計画値と実際値の間のリアルタイムの偏差を理解するのに役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
プロジェクトにサブプロジェクトがある場合、計画立案ページビューからそうしたサブプロジェクトのベースラインを作成することはできません。

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. プロジェクトのベースラインを作成します。

   a. [ベースライン] アイコン ( ) を選択します。

   b. [新規作成]を選択します。

   c. フォームのフィールドに入力します。
   ベースラインの名前と説明を入力し、[スケジュールベースライン] または [財務ベースライン]、またはその両方を選択します。

   d. [保存] を選択します。

   ベースラインは当日に対して作成され、[ベースライン] ( ) を選択すると一覧表示されます。
3. プロジェクトのベースラインを比較します。

   a. [ベースライン] アイコン ( ) を選択します。

   b. 利用可能なベースラインのリストから、比較するベースラインを選択します。
   最大 2 つのベースラインを選択できます。

   c. [適用] を選択します。

   - タイムラインビューでは、ベースラインはタスクバーの下に一連の灰色の線として表示されます。これらの灰色の線は予定日を表し、タスクバーは実際の日付を表します。
   - グリッドビューで、ベースライン関連の列を追加することができます。追加した列では、選択したベースラインの以下の情報が表示されます。こうした列は、[設定] サイドパネル ( ) から選択できます。
     - 開始日
     - 終了日
     - 差異

   Trouble?

   データグリッドにベースライン列が表示されない場合、[リフレッシュ] アイコン ( ) を使用してワークスペースをリフレッシュします。

でのステータスレポートテンプレートの作成 プロジェクトワークスペース

プロジェクトワークスペース でステータスレポート用のカスタムテンプレートを作成します。テンプレートを使用して、特定の要件に従ってステータスレポートを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


自動翻訳

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. [ドキュメントテンプレート] [を選択します。
3. **[New** (新規)] を選択します。
4. [新規ドキュメントテンプレートを作成 (Create new document template)] フォームのフィールドに入力します。

   フィールド値の説明については、「新しいドキュメントテンプレートの作成フォーム」を参照してください。

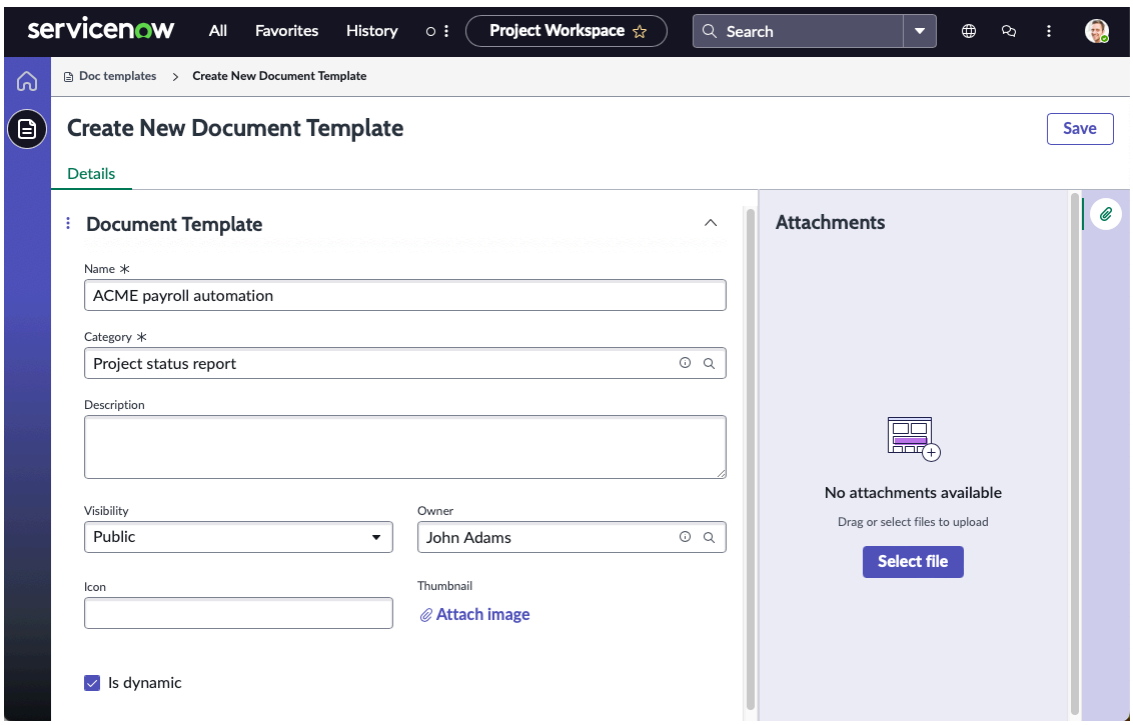

5. **[Save** (保存)] を選択します。

> **注:**
>
> プロジェクトワークスペースでは、ドキュメントテンプレートを作成するためにit_project_managerロールが必要です。プロジェクトワークスペースからドキュメントテンプレートを作成するオプションは、プロジェクトマネージャーロールを持つユーザーのみが使用できます。
>
> ロールにプラットフォームレベルのドキュメントテンプレートの作成アクセス権がある場合は、it_project_managerロールがなくてもテンプレートを作成できます。it_project_managerプロジェクトワークスペース内の可視化を制御しますが、テンプレートを作成する機能は、最終的にはプラットフォームレベルのアクセス制御リスト (ACL) によって制御されます。

タスクの結果
作成したテンプレートは、ステータスレポートを作成しようとするとオプションとして表示されます: でのステータスレポートの作成 プロジェクトワークスペース。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

関連情報

- でのステータスレポート プロジェクトワークスペース
- でのステータスレポートの作成 プロジェクトワークスペース
- でのステータスレポートの分析 プロジェクトワークスペース
- でのステータスレポートの複製 プロジェクトワークスペース
- 古いプロジェクトステータスレポートのインポート先 プロジェクトワークスペース
- でステータスレポートに動的コンテンツを追加する プロジェクトワークスペース

でのステータスレポートの作成 プロジェクトワークスペース

プロジェクトのステータスレポートを プロジェクトワークスペース で作成します。チームはレポートを表示し、プロジェクトの健全性、メトリクス、リスク、問題、およびマイルストーンについて最新情報を得ることができます。

始める前に

必要なロール:it_pps_admin、it_project_manager

このタスクについて


手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. プロジェクトの [ステータスレポート] ページを開くには、リストから [ステータスレポート] を選択します。
3. [ページ] セクションから、[ステータスレポートの作成] を選択します。
4. オプション: テンプレートに基づいてステータスレポートを作成する場合は、[テンプレートからステータスレポートを作成] を選択します。
5. [テンプレートセンターへようこそ!] 画面で、使用するテンプレートに [使用] を選択します。
6. [ステータスレポートを作成 (Create status report)] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「[ステータスレポートを作成] フォーム」を参照して ください。
7. **[Submit** (送信)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

入力したデータと情報が入力されたステータスレポートが表示されま

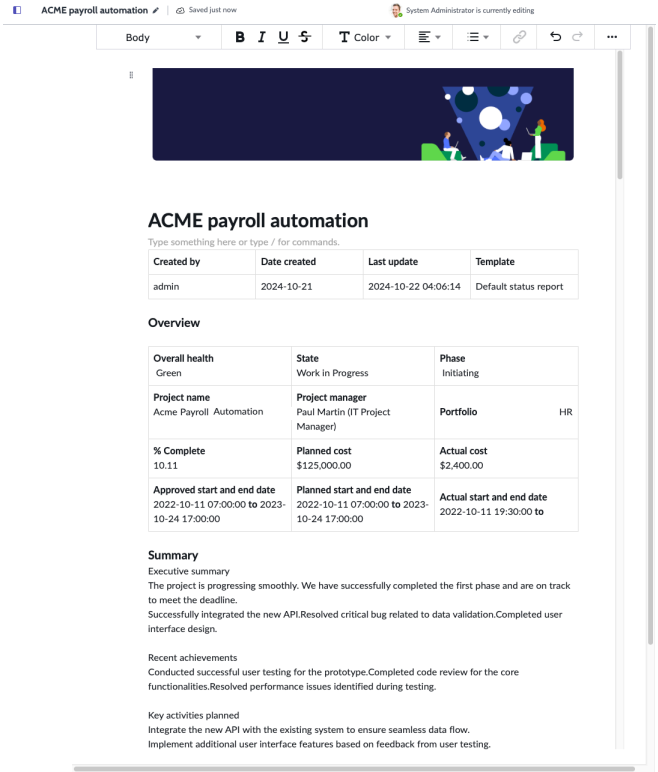

す。

8. オプション: [その他のアクション] アイコンを選択し、次の手順を実行します。

   a. [**PDF** としてエクスポート] を選択して、レポートの PDF バージョンを共有およびアーカイブします。

   b. [ステータスレポートを編集] を選択して、ステータスレポートを開いて編集します。

   c. ライブプレゼンスを非表示にするには、[ライブプレゼンスを非表示 **(Hide Live Presence)]** を選択します。

   d. [コピー] を選択して、ステータスレポートのコピーを作成します。

      (Optional) ステータスレポートを編集することはできません。ステータスレポートを編集するには、ステータスレポート読み取り専用システムプロパティ (sn_pw.status_report_doc_read_only) を無効にします。デフォルトでは true に設定され、ステータスレポートは読み取り専用です。このプロパティは、インスタンスレベルとレコードレベルの両方で有効または無効にできます。

9. データの編集、書式設定、コンテンツの整理、追加データの入力によって、レポートに変更を加えます。

   ここでステータスレポートに加えた変更は、プロジェクトワークスペースのステータスレポートに保存されますが、プロジェクトフォームのステータスレポート関連リストからアクセスする、基礎となるステータスレポートレコードには保存されません。

10. レポートを観察して監視します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスレポートの表示と分析の詳細については、「 でのステータスレポートの分析 プロジェクトワークスペース」を参照してください。

以前のステータスレポートがない場合、インポートオプションは表示されません。既存のステータスレポートのインポートの詳細については、「 古いプロジェクトステータスレポートのインポート先 プロジェクトワークスペース」を参照してください。

関連情報

- でステータスレポートに動的コンテンツを追加する プロジェクトワークスペース
- でのステータスレポート プロジェクトワークスペース
- でのステータスレポートの分析 プロジェクトワークスペース
- 古いプロジェクトステータスレポートのインポート先 プロジェクトワークスペース
- でのステータスレポートテンプレートの作成 プロジェクトワークスペース

でのステータスレポートの分析 プロジェクトワークスペース

プロジェクトのステータスレポートを プロジェクトワークスペース で確認して、プロジェクトの健全性、メトリクス、リスク、問題、およびマイルストーンについて確認します。

始める前に

必要なロール:it_pps_admin、it_project_manager

このタスクについて

デフォルトのステータスレポートテンプレートを使用して作成されたレポートのヘッダーは次のとおりです。1 ページのステータスレポートテンプレートを使用して作成されたレポートは、情報ヘッダーが少なくなります。

側面	説明
概要	フェーズ、健全性、完了率などの重要な詳細を含む、プロジェクトの概要を表示します。
主要マイルストーン	重要なプロジェクトのマイルストーンを追跡し、予定日と実際の日付を比較して差異を特定します。
コスト (予定対実績)	計画プロジェクトコストを経時的な実際の支出と比較し、予算の逸脱を特定するのに役立ちます。
リソース (配分 対 実績)	計画されたリソース割り当てと実際の使用状況を分析し、リソースの過剰/不足を特定するのに役立ちます。
スケジュール	プロジェクトのタイムラインを評価し、遅延を特定し、タスクの完了予定と実際のタスク完了を比較します。
リスク	潜在的なリスク、その可能性、影響度、および現在の軽減計画を評価します。
問題	所有権と目標解決日とともに、プロジェクトに影響する進行中の問題を特定します。
依存関係	プロジェクトの進捗または完了に影響を与える可能性のある外部要因または内部要因を評価します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2 つのレポートを比較して、進捗状況を比較および分析することもできます。

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. プロジェクトの [ステータスレポート] ページを開くには、リストから [ステータスレポート] を選択します。
3. [ページ] セクションから、表示するステータスレポートの名前を選択します。
4. レポートを観察して監視します。

関連情報

- でのステータスレポート プロジェクトワークスペース
- でのステータスレポートテンプレートの作成 プロジェクトワークスペース
- でのステータスレポートの作成 プロジェクトワークスペース
- プロジェクトワークスペースでのステータスレポートの更新
- 古いプロジェクトステータスレポートのインポート先 プロジェクトワークスペース
- でステータスレポートに動的コンテンツを追加する プロジェクトワークスペース

プロジェクトワークスペースでのステータスレポートの更新

プロジェクトの健全性、メトリクス、リスク、問題、およびマイルストーンを更新するには、プロジェクトの プロジェクトワークスペース でステータスレポートを変更します。

始める前に

必要なロール:it_pps_admin、it_project_manager

このタスクについて

デフォルトでは、ステータスレポートは読み取り専用で、*sn_pw.status_report_doc_read_only* システムプロパティは true に設定されています。ステータスレポートを編集するには、このシステムプロパティを false に設定して無効にします。プロパティを false に変更すると、レポートを編集または更新できます。

プロパティが true に設定されているときにステータスレポートフォームで更新を行うと、変更はステータスレポートに反映されます。プロパティが false に設定されている場合、ステータスレポートフォームに加えられた変更はステータスレポートに反映されません。

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. プロジェクトの [ステータスレポート] ページを開くには、リストから [ステータスレポート] を選択します。
3. [ページ] セクションから、更新するステータスレポートの名前を選択します。
4. [その他のアクション] アイコンを選択し、[ステータスレポートを編集] を選択してステータスレポートを編集します。
5. データの編集、書式設定、コンテンツの整理、追加データの入力によって、レポートに変更を加えます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスレポートを削除するには、[ページ] セクションから [その他のアクション] アイコン ( ) を選択し、[削除] を選択します。

*sn_pw.status_report_doc_read_only*を編集するには、「sys_properties.list」と入力します。リストで「 *sn_pw.status_report_doc_read_only*」を検索します。[値] フィールドを変更して [更新] を選択できます。

関連情報

古いプロジェクトステータスレポートのインポート先 プロジェクトワークスペース

でステータスレポートに動的コンテンツを追加する プロジェクトワークスペース

でのステータスレポートの複製 プロジェクトワークスペース

既存のステータスレポートを複製して、 プロジェクトワークスペースで情報を手動でコピーすることなくすべてのプロジェクトの詳細をコピーすることで、時間を節約できます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. でのステータスレポートの作成 プロジェクトワークスペース。
   入力したデータと情報が入力されたステータスレポートが表示されます。
2. オプション: データの編集、書式設定、コンテンツの整理、追加データの入力によって、レポートに変更を加えます。

   (Optional) ここでステータスレポートに加えた変更は、プロジェクトワークスペースのステータスレポートに保存されますが、プロジェクトフォームのステータスレポート関連リストからアクセスする、基礎となるステータスレポートレコードには保存されません。
3. [その他のアクション] アイコンを選択し、[コピー] を選択してステータスレポートのコピーを作成します。
   新しいステータスレポートは、元のステータスレポートと同じ場所に追加されます。

関連情報

でのステータスレポート プロジェクトワークスペース

でのステータスレポートの分析 プロジェクトワークスペース

古いプロジェクトステータスレポートのインポート先 プロジェクトワークスペース

でステータスレポートに動的コンテンツを追加する プロジェクトワークスペース

でのステータスレポートテンプレートの作成 プロジェクトワークスペース

古いプロジェクトステータスレポートのインポート先 プロジェクトワークスペース

古いステータスレポートをクラシック プロジェクトワークスペース から新しい プロジェクトワークスペース に移行し、プロジェクトのレポートプロセスを最適化します。

始める前に
必要なロール:it_pps_admin、it_project_manager

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. プロジェクトの [ステータスレポート] ページを開くには、リストから [ステータスレポート] を選択します。
3. [ページ] セクションから [ステータス レポートの作成] を選択し、[既存のステータス レポートのインポート] を選択します。

   デフォルトでは、[ステータスレポートを作成] オプションと [テンプレートから新規作成] オプションは表示されますが、[既存のステータスレポートをインポート] オプションは古いステータスレポートが存在する場合にのみ表示されます。

4. [インポート] を選択して、古いステータスレポートを新しいレポートツールにインポートします。

   [ステータスレポートをネクストエクスペリエンスにエクスポート] リンクを使用して、クラシックプロジェクトワークスペースからプロジェクトレベルでステータスレポートをエクスポートできます。[**Next Experience** にエクスポート] リンクを使用して、レコードレベルでステータスレポートをエクスポートできます。

関連情報

- でステータスレポートに動的コンテンツを追加する プロジェクトワークスペース
- でのステータスレポートテンプレートの作成 プロジェクトワークスペース
- プロジェクトワークスペースでのステータスレポートの更新
- でのステータスレポートの分析 プロジェクトワークスペース
- でのステータスレポートの複製 プロジェクトワークスペース

でステータスレポートに動的コンテンツを追加する プロジェクトワークスペース

プロジェクトの プロジェクトワークスペース でステータスレポートに動的コンテンツを追加します。動的コンテンツは、レコードが変更されると、ステータスレポートで自動的に更新されます。

始める前に

必要なロール:it_pps_admin、it_project_manager


手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. リストから [ドキュメントテンプレート] を選択して、プロジェクトの [ドキュメントテンプレート] ページを開きます。
3. ドキュメントテンプレートページから、テンプレートを選択して開きます。
4. [ドキュメント] タブを選択して適切な場所をクリックし、「/」 (スラッシュ) と入力して、必要に応じて [ユーザーをメンション]、[レコードをメンション]、[動的コンテンツの挿入] などのアクションのリストを開きます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 「/」 (スラッシュ) を入力し、[ユーザーをメンション] を選択してユーザーをタグ付けできます。

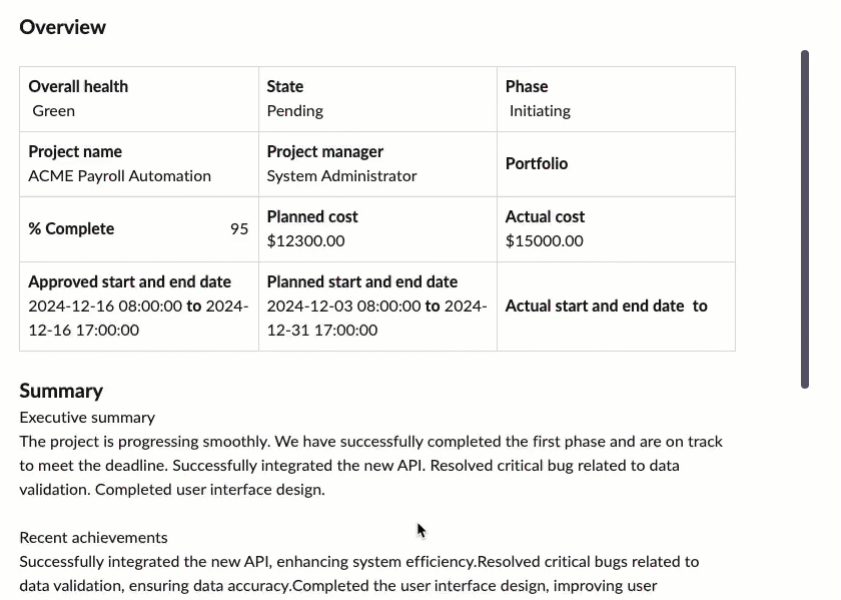


b. 「/」 (スラッシュ) を入力し、[レコードをメンション] を選択すると、レコードが挿入されます。



レコードを挿入すると、リンクとして埋め込まれます。リンクをクリックすると、関連レコードを開いて詳細を確認できます。

c. 「/」 (スラッシュ) と入力して [動的コンテンツの挿入] を選択すると、ステータスレポートに動的コンテンツの挿入を追加できます。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

動的コンテンツの挿入オプションを使用すると、ステータスレポートテンプレートでステータス報告日、プロジェクト、およびその他の動的データを構成して表示できます。このオプションは、[ドキュメントテンプレート] フォームで [動的フィールド] が選択されている場合にのみ使用できます。見出しや箇条書きなどの書式設定オプションを選択できます。

5. レポートを観察して監視します。

ステータスレポートの表示と分析の詳細については、「 でのステータスレポートの分析 プロジェクトワークスペース」を参照してください。

関連情報

- でのステータスレポート プロジェクトワークスペース
- でのステータスレポートテンプレートの作成 プロジェクトワークスペース
- でのステータスレポートの作成 プロジェクトワークスペース
- でのステータスレポートの分析 プロジェクトワークスペース
- でのステータスレポートの複製 プロジェクトワークスペース
- 古いプロジェクトステータスレポートのインポート先 プロジェクトワークスペース

プロジェクトワークスペースからのステークホルダーとのコラボレーション

コメントや添付ファイルをプロジェクトまたはプロジェクトタスクに追加し、組織の他のユーザーと共有します。プロジェクトが組織の優先順位と一致していることを、協力して確認します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
コンピューターからファイルを参照してアップロードします。コメントを追加し、ステークホルダーを彼らのフィードバックやメモにタグ付けします。

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
[計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. 自分のプロジェクトやプロジェクトタスクにファイルを添付します。
3. コメントを追加するか、ステークホルダーをタグ付けして、プロジェクトに関する添付ファイルや情報への注意を促します。
コメントは、プロジェクトレベルで直接追加することも、プロジェクトタスクに対して追加することもできます。

ドキュメントを使用したプロジェクトの共同作業

ドキュメントを使用して、チームメンバーとの共同作業、メモの保存、プロジェクト憲章やプロジェクト概要の作成を行うことができます。


始める前に
必要なロール：it_project_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. プロジェクトワークスペースでプロジェクトを開きます。
   詳細については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. リストから [ドキュメント] を選択して、プロジェクトのドキュメントページを開きます。
3. [ページ] セクションから [ページの作成] を選択し、ドキュメントのテンプレートを追加する場合は [テンプレートからページを作成] を選択します。

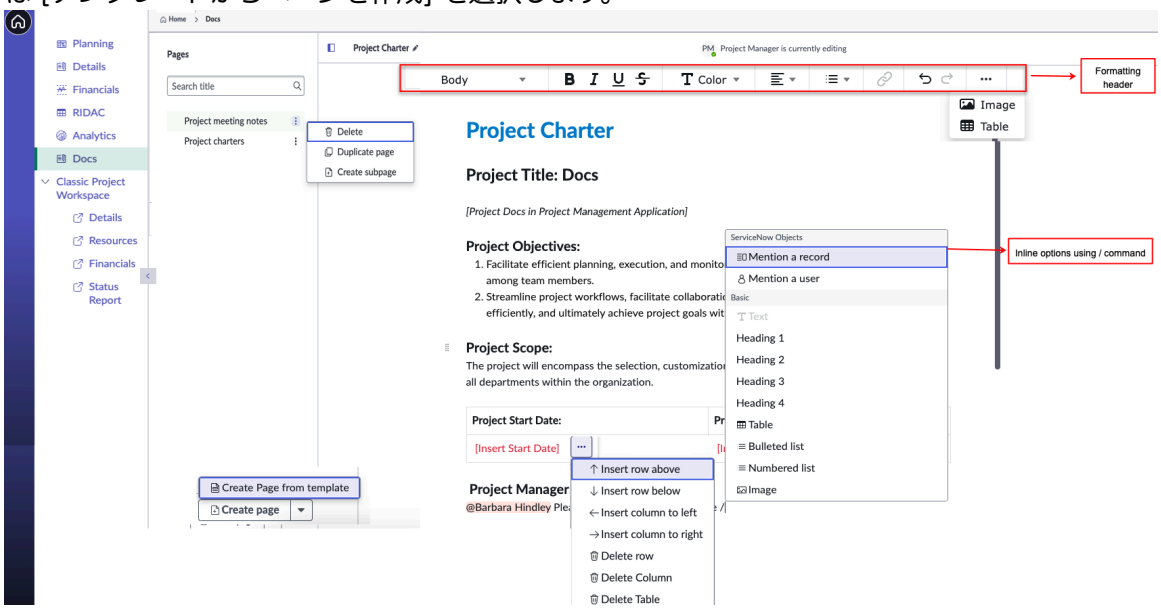

4. [ドキュメント] ページで、以下のタスクを実行できます。
   - キーボードでスラッシュを使用して、必要に応じて [ユーザーをメンション]、または [レコードをメンション] などのアクションのリストを開く。
   - ライブプレゼンスの機能を使用して、ドキュメントを開いているユーザーやドキュメントで作業しているユーザーを確認します。
   - プロジェクト憲章、プロジェクト概要、会議メモなどのドキュメント用テンプレートを作成します。
   - 会議メモを追加して、ディスカッション、決定事項、アクションアイテム、および会議中に話し合われた関連情報を記録します。
   - タスクに関連する情報を保存したり、画像やテーブルを追加したり、ドキュメントを使用してリアルタイムで共同作業を行います。
   - [その他のアクション] メニューを選択して、[ページ] セクションで子ページを削除、複製、または作成する。
   - 見出し、リスト、配置などのスタイル設定オプションを含むリッチテキスト段落の書式設定を適用します。

プロジェクトワークスペースのプロジェクトドキュメントの要約スキルを使用して、選択したコンテンツまたは完了したコンテンツのサマリーを生成します

戦略的計画 でNow Assistによって生成されたサマリーから、ドキュメントの詳細をすばやく把握できます。

https://player.vimeo.com/video/1038147968?h=9451c75819&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

始める前に
必要なロール：it_project_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このスキルへのアクセスを必要とするカスタムロールを持つユーザーがいる場合は、それらのロールの ACL を更新する必要があります。

プロジェクトドキュメント要約スキルがアクティブであることを確認します。

このタスクについて
Now Assist によって生成されたサマリーを使用して、ドキュメント、会議メモ、プロジェクトレポートなどを読む時間を最小限に抑えます。また、学習ニーズに合ったソース資料をドキュメントにコピーアンドペーストして、簡単なサマリーを生成することもできます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、必要なプロジェクトを開きます。
2. ドキュメントから、要件に応じて次のいずれかのアクションを実行します。

   注:
   読み取りロールを持つユーザーは、コンテンツ全体の要約も可能です。

3. オプション: ドキュメントでページの要約が完了したら、フィードバックを提供したり、ページに関する情報をコピーしたり、表示したりできます。

   注:
   これらのフィールドの情報は AI によって生成されるため、テキストを確認して正確であることを確認することをお勧めします。

   Now Assist スキルをアクティブ化できるのはアドミニストレーターのみです。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist の構成」を参照してください。

   プロジェクトのドキュメント要約スキルは、ドキュメントの内容をチェックして、概要を生成するのに十分な情報が利用可能かどうかを判断します。要約するのに十分なコンテンツがない場合は、コンテンツを追加して再試行できます。

   注:
   [要約 を作成 (Summarize)] ボタンは、プロジェクトドキュメント要約スキルがアクティブな場合にのみ表示されます。選択したテキストが Now Assistのトークン制限を超えた場合、プロジェクトのドキュメント要約スキルを実行できません。要約するコンテンツが他にもある場合は、一部のコンテンツを削除して再試行できます。

Email project summary スキルを使用してプロジェクトサマリーメールをスケジュールする

プロジェクトサマリーメールをスケジュールして、 プロジェクトワークスペースでプロジェクトの最も重要な変更に優先順位を付けて追跡します。

https://player.vimeo.com/video/1039117096?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

始める前に
Email project summary スキルがアクティブであることを確認します。

このスキルへのアクセスを必要とするカスタムロールを持つユーザーがいる場合は、それらのロールの ACL を更新する必要があります。

必要なロール：it_project_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
Email project summary スキルを使用すると、簡潔なプロジェクトサマリーを生成できます。プロジェクトの概要はメールで共有されます。プロジェクトマネージャーは、マイルストーン、リソースのアサイン、プロジェクト、プロジェクトタスクなどの重要な要素を監視できます。また、プロジェクトに優先順位を付け、プロジェクトサマリーメールを受信する頻度を決定することもできます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、任意のプロジェクトを開きます。
2. 計画ページで、その他のアクション アイコン (•••) を選択し、 プロジェクト サマリーの電子メール送信 を選択します。
3. [プロジェクトサマリーをメールで送信] モーダルから、要件に応じて [頻度] を [週次]、[隔週]、または [月次] として選択します。
4. [この日を、週次または隔週の曜日、または月次周期の日付として] を選択します。

   注:
   メールでサマリーを送信するには、プロジェクトマネージャーのメール ID が必要です。

   [概要メールを無効にする] チェックボックスをオンにすると、概要メールを無効にすることができます。

5. リストから [ユーザー] を選択します。
   - プロジェクトマネージャーは、プロジェクトのデフォルトのメール受信者として自動的に設定されます。
   - 1 人または複数のユーザーを選択できます。sn_ppm_readロールを持つユーザー、またはプロジェクト情報の読み取りアクセス権または表示アクセス権を持つユーザーのみがユーザーリストに表示されます。
   - メールが受信者に送信されると、プロジェクトマネージャーは [宛先] リストに配置され、他のすべての受信者は [CC] リストに含まれます。
   - 機密プロジェクトの場合、プロジェクトを表示する権限を持つユーザーのリストに受信者を含める必要があります。
6. [クリティカルパスタスクの変更を含める] を選択して、プロジェクトタスクが [プロジェクトサマリーをメールで送信] モーダルから直接 AI エージェントを監視できるようにします。
   クリティカルパスタスクの変更によってプロジェクトのタイムラインが遅れる可能性がある場合は、通知を受け取ることができます。これらの AI 主導のアラートは、リスクがエスカレートする前にアクションを実行するのに役立ちます。
7. [スケジュール] を選択して、プロジェクトのメール周期をスケジュールします。

   注:
   これらのフィールドの情報は AI によって生成されるため、テキストを確認して正確であることを確認することをお勧めします。

   プロジェクトサマリーをメールで送信するスキルは、プロジェクトのさまざまなスナップショットをさまざまなタイミングでキャプチャします。たとえば、週次スケジュールを選択した場合、スキルは今週のプロジェクトのスナップショットをキャプチャし、来週の別のスナップショットをキャプチャします。これらのスナップショットはバックエンドに保存されます。次に、 Now LLM サービス 2 つのスナップショットを比較し、注目すべき重要な変更 (マイルストーンの遅延や予算の増加など) を強調表示します。スキルは、これらの重要な更新のサマリーを作成し、プロジェクトレコードへのリンクを含むメールをプロジェクトマネージャーに送信します。プロジェクトサマリーにより、プロジェクトマネージャーは変更を手動で確認することなく、重要な更新について最新情報を得ることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

8. オプション: [スケジュール] を選択してスケジュールし、プロジェクトのサマリーをすぐに送信します。
   [スケジュールして送信] を選択すると、プロジェクトサマリーがすぐに受信され、選択した頻度に基づいてサマリーも受信されます。メールは、プロジェクトマネージャーとともに選択された受信者に送信されます。

Example: プロジェクトサマリーメールをスケジュールする

週単位の頻度を選択し、月曜日 (2025-07-07 に該当する) を選択したとします。受信者を追加した後、[クリティカルパスタスク変更] チェックボックスをオンにして、プロジェクトタスクモニター AI エージェントを有効にしておきます。

- [スケジュール] を選択すると、プロジェクトサマリーは、2025-07-07 からプロジェクトが非アクティブになるまで毎週月曜日にお客様と受信者にメールで送信されます。
- [スケジュールして送信] を選択すると、最初のサマリーメールがすぐに届き、選択した頻度と日に応じたサマリーも届きます。

関連情報

でのプロジェクトタスクの監視エージェントワークフローの構成 AI エージェントスタジオ


プロジェクトファイナンシャルと **Source-to-Pay** オペレーションの統合

プロジェクトの資産の調達要求を要求、追跡、管理します。

始める前に
ソーシングと調達オペレーションをインストールします

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
プロジェクトマネージャーは、プロジェクトワークスペースから調達アプリケーションに移動し、プロジェクトの購買要求を作成できます。注文された購買要求はプロジェクトワークスペースに反映されます。購買要求が処理されると、購入明細、コスト計画、および経費ラインが自動的に生成されます。統合の詳細については、「Sourcing and Procurement Operations integration with Project Management」を参照してくださ

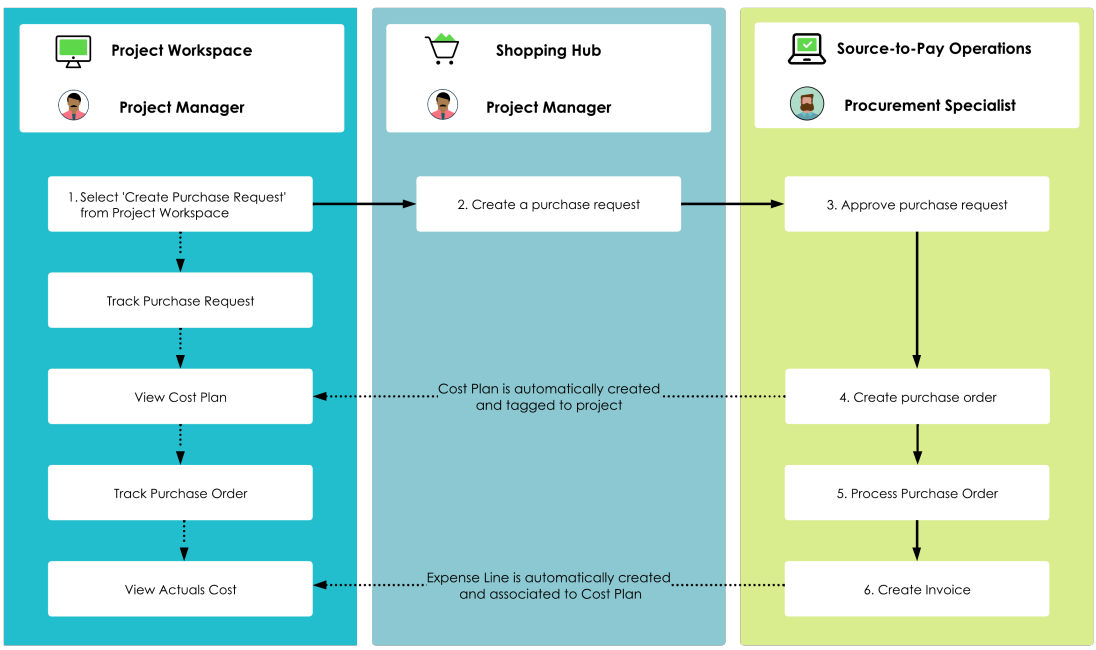

い。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース.
2. プロジェクトを開き、左側のメニューから [詳細] を選択します。

購買要求の作成

プロジェクトマネージャーは、Source-to-Pay オペレーション Shopping Hub ポータルに直接アクセスして、プロジェクトの要件を満たす要求を行うことができます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. プロジェクトの詳細ページで、[その他のアクション] (…) を選択し、[購買要求を作成] を選択します。
   Source-to-Pay オペレーション Shopping Hub ポータルが新しいタブで開きます。
2. 資産を要求します。
   Source-to-Pay 共通アーキテクチャを使用して製品を要求する方法の詳細については、「Order a product with quick checkout」を参照してください。

   注:
   資産の要求を行う際に、[この要求の対象プロジェクトは？ **(What project is this request for?)]** フィールドにプロジェクト番号を入力します。

購入明細と発注明細を追跡する

購買要求が行われた後、購入明細番号、購入数量、単価、税、ステータスなどの要求の詳細をプロジェクトワークスペースから追跡できます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 購買要求の作成時に選択したプロジェクトを開きます。
2. 左側のメニューから [詳細] を選択します。
3. [購入明細] 関連リストを選択します。
   Source-to-Pay オペレーションから調達スペシャリストが購買要求書を承認します。発注書が作成されると、プロジェクトワークスペースに発注書明細が自動的に作成されます。

   プロジェクトワークスペースで発注書を表示するには：

   a. 購買要求の作成時に選択したプロジェクトを開きます。
   b. 左側のメニューから [詳細] を選択します。
   c. [詳細] ページで、[発注書 **(PO)** 明細] 関連リストを選択します。

   注:
   すべての発注書明細は、選択したプロジェクトのコスト計画を作成します。

調達要求の財務状況の追跡

要求された発注書が承認されて処理されると、発注書明細とコスト計画が自動的に作成されます。プロジェクトワークスペースで購入要求のコスト計画を表示することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 購買要求の作成時に選択したプロジェクトを開きます。
2. 左側のメニューから [詳細] を選択します。
3. [コスト計画] 関連リストを選択します。

   注:
   コスト計画は、会計期間の開始と終了、各会計期間の計画コスト計画ブレークダウンなどの追加の詳細とともに [財務] に反映されます。

   次のステップとして、発注書 (PO) が処理され、請求書が生成されます。購買要求の実際の経費をキャプチャする請求書明細が作成されます。プロジェクトワークスペースで処理された請求書から生成された経費ラインを表示することができます。

   a. 購買要求の作成時に選択したプロジェクトを開きます。
   b. 左側のメニューから [財務] を選択します。
   c. 発注明細に対して作成されたコスト計画を見つけます。
   d. コスト計画月次ブレークダウンをスクロールし、発注書が作成された会計期間の行オプション を選択して、[経費ラインの表示] を選択します。
   e. [経費ライン] ビューで、[コスト計画用に自動生成された経費明細の自動生成 **(Auto generated expense line for cost plan)]** オプションを選択します。
   f. 発注書の生成中に発生した合計経費が [金額] フィールドに表示されます。

タスクの結果
処理済みの購買要求が選択したプロジェクトにタグ付けされます。コスト計画や経費ラインなどの財務レコードが自動的に作成され、プロジェクト経費に関連付けられます。

プロジェクトワークスペース でのプロジェクトへの **RIDAC** レコードの追加

プロジェクトワークスペース のプロジェクトにリスク、問題、意思決定、アクション、または変更要求 (RIDAC) レコードを追加します。RIDAC レコードを追加すると、プロジェクトのライフサイクル中にリスクや問題を追跡し、プロジェクトの結果の分析に役立てることができます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
作成するレコードのタイプを選択し、必要な詳細を入力して、プロジェクトに関連付けることができます。プロジェクトワークスペースの [RIDAC] ページを使用して、すべての RIDAC レコードを表示、追加、管理、および評価できます。

プロジェクト管理の RIDAC レコードの詳細については、「プロジェクトの RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの追加」を参照してください。


手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. プロジェクトの [RIDAC] ページを開くには、リストから **[RIDAC]** を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. [その他のアクション] メニューから、作成する RIDAC レコードのタイプを選択します。



4. フォームのフィールドに入力します。
フィールドの詳細については、次を参照：
   - プロジェクトワークスペース のリスクフォーム
   - プロジェクトワークスペース の問題フォーム
   - プロジェクトワークスペース のアクションフォーム
   - プロジェクトワークスペース の意思決定フォーム
   - プロジェクトワークスペース の変更要求フォーム
5. [送信] を選択します。

次のタスク

- 既存のプロジェクトリスクを問題、意思決定、アクション、または変更要求に変換し、リスクをクローズします。詳細については、「プロジェクトワークスペース でプロジェクトの特定の RIDAC レコードを別のレコードに変換する」を参照してください。
- 依存関係を追跡し、将来の傾向を認識できるように、プロジェクトリスクを既存の問題に関連付けます。詳細については、「プロジェクトワークスペース でプロジェクトの既存の RIDAC レコードを関連付け」を参照してください。

プロジェクトワークスペース でプロジェクトの既存の **RIDAC** レコードを関連付け

プロジェクトワークスペース でプロジェクトの既存の RIDAC レコードを相互にリンクします。RIDAC は、リスク、問題、意思決定、アクション、変更要求の略語です。プロジェクトの終了時および計画時の分析のために、リスクまたは問題とその結果のレコードを保持します。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

1 つのレコードを複数の異なるレコードに関連付けることができます。たとえば、1 つの問題レコードを複数のリスク、意思決定、アクション、または変更要求レコードにリンクさせることができます。

手順

1. 特定の RIDAC エントリーを別のエントリーに関連付けるプロジェクトを選択します。
プロジェクトワークスペースでプロジェクトに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. プロジェクトの [RIDAC] ページを開くには、リストから **[RIDAC]** を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. プロジェクトフォームで、個々のリスク、問題、意思決定、アクション、または変更要求レコードの [行コンテキストメニュー] を選択します。
4. **[RIDAC** の関連付け] を選択します。



5. [関連付け] ダイアログボックスの [タイプの選択] リストから、選択したレコードを関連付ける RIDAC レコードを選択します。
   たとえば、問題を意思決定に関連付ける場合は、[意思決定] を選択します。
6. [関連付け先] リストから、選択したレコードの関連付け先のレコード番号を選択します。
   たとえば、選択した問題を意思決定 (DCSN0001005) に関連付ける場合は、**[DCSN0001005]** を選択します。
7. **[OK]** を選択します。

プロジェクトワークスペース でプロジェクトの特定の **RIDAC** レコードを別のレコードに変換する

プロジェクトワークスペース でプロジェクトの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、変更要求) レコードを別のレコードに変換します。プロジェクトの終了時および計画時の分析のために、リスクまたは問題とその結果のレコードを保持します。プロジェクトのライフサイクル全体にわたってリスクと問題を追跡します。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

RIDAC レコードを別のレコードに変換すると、[簡単な説明]、[要求者]、および [アサイン先] フィールドの値が親レコードから引き継がれます。

親レコードを手動でクローズする代わりに、新規レコードの作成時に親レコードを終結するように指定することもできます。

手順

1. 特定の RIDAC エントリーを別のエントリーに変換するプロジェクトを選択します。
   プロジェクトワークスペースでプロジェクトに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. プロジェクトの [RIDAC] ページを開くには、リストから **[RIDAC]** を選択します。
3. プロジェクトフォームで、個々のリスク、問題、意思決定、アクション、または変更要求レコードの [行コンテキストメニュー] を選択します。
4. **[RIDAC** に変換] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



5. [変換] ダイアログボックスの [タスクタイプを選択] リストから、選択したレコードを変換する RIDAC レコードを選択します。
   たとえば、問題を意思決定に変換する場合は、[意思決定] を選択します。
6. 親レコードからコピーされた [簡単な説明] フィールドのテキストを変更します。
7. オプション: [アサイン先] フィールドの親レコードからコピーされたデフォルトのアサインを変更するには、ルックアップアイコン ( ) をクリックし、別のユーザーを選択します。
8. オプション: 新規レコードの作成時に親 RIDAC レコードをクローズする場合は、親レコードをクローズするオプションを選択します。
   親レコードをクローズするオプションのラベルは、親レコードタイプに応じて変わります。たとえば、親レコードが問題で、それを意思決定レコードに変換する場合、レコードをクローズするオプションは [問題をクローズ **(Close Issue)]** と表示されます。
9. **[OK]** を選択します。

プロジェクトステータスレポートのプロジェクトワークスペースから **Microsoft PowerPoint** へのエクスポート

プロジェクトのステータスレポートを生成し、プロジェクトワークスペース から Microsoft PowerPoint ファイルとしてエクスポートします。このファイルを使用して、プロジェクトステータスをステークホルダーに提示したり、リスクや次のステップについてステークホルダーとコラボレーションしたりすることができます。最新の情報で Microsoft PowerPoint ファイルを生成し、情報をスライドにコピーするのを避けることで、時間を節約します。

始める前に

- ServiceNow ストアから 戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート アプリケーションをインストールします。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理向け PowerPoint へのエクスポートのインストール」を参照してください。
- Microsoft PowerPoint テンプレートを作成してアップロードし、ステータスレポートに適用します。テンプレートの作成およびアップロード方法の詳細については、「Create a Microsoft PowerPoint template (Microsoft PowerPoint テンプレートの作成)」および「Upload your Microsoft PowerPoint template (Microsoft PowerPoint テンプレートのアップロード)」をそれぞれ参照してください。

必要なロール：it_project_manager

重要:
PowerPoint へのエクスポートは現在、FedRAMP、NSC DOD IL5、オーストラリアの IRAP で保護されたデータセンターのお客様、セルフホスト型のお客様、またはその他の制限された環境のお客様は利用できません。将来のリリースで可用性の更新を確認してください。

このタスクについて

ステータスレポートを作成したり、既存のステータスレポートを使用して Microsoft PowerPoint ファイルとしてダウンロードしたりします。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステークホルダーがダッシュボードを使用するよりもスライドを使用することを希望する場合は、プロジェクトをエクスポートすると便利です。また、ダッシュボードにアクセスできないが更新を待っているさらに幅広い対象者や外部のステークホルダーにも役立ちます。

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. [その他のアクション] メニュー ( ) から、[ステータスレポートのエクスポート **(Export status report)]** を選択します。
3. [ステータスレポートのエクスポート (Export status report)] フォームで、既存のプロジェクトのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「プロジェクトワークスペース のエクスポートステータスレポートフォーム」を参照してください。
4. [エクスポート] を選択します。
5. プロンプトが表示されたら、目的の場所を選択してファイルを保存します。
6. オプション: [エクスポートステータスレポート] フォームで、[エクスポートできるようにステータスレポートを作成してください] リンクを選択して、プロジェクトのステータスレポートを作成します。



7. [ステータスレポート] タブで、[新規作成] をクリックしてステータスレポートを作成します。
8. [ステータスレポート] フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「プロジェクトステータスレポートを作成する」を参照してください。
9. **[Submit** (送信)] を選択します。
10. [PowerPoint にエクスポート] アイコン ([ ) を選択します。
11. [PowerPoint エクスポート] ウィンドウで、[ステータスレポート日 **(Status report date)]** をクリックしてレポートの日付を選択します。
12. [PowerPoint エクスポート] ウィンドウで、[テンプレートを選択] をクリックしてテンプレートを選択します。
13. **[Export** (エクスポート)] を選択します。

タスクの結果
プロジェクトステータスレポートは、プロジェクト番号とステータスレポートの日付をファイル名として Microsoft PowerPoint ファイルとしてダウンロードされます。

プロジェクトワークスペースのプロジェクトのエクスポート

プロジェクトをファイルとしてプロジェクトワークスペースからエクスポートします。このファイルを使用して、外部のステークホルダーやさらに幅広い対象者にプロジェクトの最新情報を提供します。最新の情報でエクスポートファイルを生成し、情報を別のファイルにコピーするのを避けることで、時間を節約します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
Microsoft PowerPoint の場合：

- ServiceNow ストアから 戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート アプリケーションをインストールします。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理向け PowerPoint へのエクスポートのインストール」を参照してください。
- Microsoft PowerPoint テンプレートを作成してアップロードし、ステータスレポートに適用します。テンプレートの作成およびアップロード方法の詳細については、「Create a Microsoft PowerPoint template (Microsoft PowerPoint テンプレートの作成)」および「Upload your Microsoft PowerPoint template (Microsoft PowerPoint テンプレートのアップロード)」を参照してください。

重要:
PowerPoint へのエクスポートは現在、FedRAMP、NSC DOD IL5、オーストラリアの IRAP で保護されたデータセンターのお客様、セルフホスト型のお客様、またはその他の制限された環境のお客様は利用できません。将来のリリースで可用性の更新を確認してください。

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
プロジェクトを作成したり、既存のプロジェクトを使用して必要なファイル形式でダウンロードしたりします。プロジェクトデータを Excel、CSV、PPT、MS Project (MPP)、および XML ファイル形式でエクスポートすることを選択できます。

ステークホルダーがダッシュボードを使用するよりもファイルを使用することを希望する場合は、プロジェクトをエクスポートすると便利です。また、ダッシュボードにアクセスできないが更新を待っているさらに幅広い対象者や外部のステークホルダーにも役立ちます。

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. [その他のアクション] メニュー ( ) から、[プロジェクトをエクスポート] を選択します。
3. ファイル形式を選択し、必要に応じてテンプレートを選択します。
4. [エクスポート] を選択します。
   プロジェクトの [計画] ページに表示されている列のみがエクスポートされます。

タスクの結果
プロジェクトが選択したファイル形式でダウンロードされます。

プロジェクトワークスペースでのプロジェクトのクローズ

すべてのタスクが完了したら、プロジェクトを終了します。プロジェクトをクローズすると、そのプロジェクトに関連付けられているすべてのプロジェクトタスク、サブプロジェクト、およびリソースのアサインが自動的にクローズされます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
理想的には、プロジェクトをクローズした後に再オープンしないでください。プロジェクトステータスを [クローズ済み] から [対応中]、[処理待ち]、または [オープン] に更新することはできません。クローズしたプロジェクトをそれでも再オープンする必要がある場合は、既存のプロジェクトタスクを再オープンするか、またはプロジェクトに新しいタスクを追加します。タスクに対するこのアクションにより、他のクローズ済みタスクに影響を与えることなく、プロジェクトが [クローズ済み]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

から [対応中] ステータスに移行します。関連する将来のリソース計画をキャンセルし、クローズ済みプロジェクトに割り当てられたリソース計画を完了することができます。

手順

1. プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページからプロジェクトを開きます。
   [計画立案] ページに移動する方法については、「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。
2. クローズするプロジェクトのすべてのタスクの作業が完了していることを確認します。
3. プロジェクトフォームで、ステータスフィールドをいずれかのクローズ済み状況に変更します。
   - 完了してクローズ
   - 未完了でクローズ
   - スキップしてクローズ

   注:
   - プロジェクトをクローズすると、プロジェクトに関連付けられているすべてのリソースのアサインを表示できる通知が表示されます。すべてのリソースのアサイン日をプロジェクトの日付と同期できます。リソースのアサインは、プロジェクトが終了する正確な日時に終了します。
   - [リソースのアサインリスト] ページから、プロジェクトのすべてのリソースのアサインを追跡、変更、および同期できます。

   または、最低レベルの子タスクから始めて、すべてのプロジェクトタスクを最初にクローズします。クローズ済み状況は親タスクにロールアップされ、最上位レベルの親タスクがすべてクローズされると、プロジェクトのステータスがクローズ済みに変更されます。ただし、親タスクおよびプロジェクトのデフォルトのクローズ済みステータスは、[完了してクローズ] です。したがって、プロジェクトタスクの一部またはすべてを [未完了でクローズ] または [スキップしてクローズ] に変更しても、プロジェクトのステータスは [完了してクローズ] に変更されます。

   また、[フェーズ] の値を [終結]に変更します。プロジェクトフェーズは参照専用であり、[ステータス] フィールドにリンクされたり依存したりすることはありません。

   プロジェクトにサブプロジェクトが含まれている場合は、親プロジェクトに影響を与えずにサブプロジェクトをクローズできます。サブプロジェクトをクローズするには、サブプロジェクトの [ステータス] を任意のクローズ済みステータスに変更します。サブプロジェクトを終結すると、そのサブプロジェクトに関連付けられているすべてのタスクのステータスがクローズまたは変更されます。また、サブプロジェクトのステータスを [対応中] に変更すると、関連付けられたすべてのタスクが [対応中] ステータスに移行します。

   クローズされていない親プロジェクトに関連付けられたプロジェクトタスクがある場合、親プロジェクトは [オープン]、[対応中]、または [処理待ち] ステータスのままになります。親プロジェクトに関連付けられたタスクがクローズされると、親プロジェクトのステータスも [完了してクローズ]に変更されます。
4. プロジェクトが完了したら、最終的なベースラインを作成して、プロジェクトの実際の値が推定値にどれだけ近づいたかを確認します。

   注:
   ベースラインでは、開始予定日と終了予定日の値のみを実開始日と実終了日の値と比較します。レポートを使用して、工数とコストを比較します。

タスクの結果

インシデント、問題、または変更から作成されたプロジェクトの場合、プロジェクトステータスを更新しても、関連するインシデント、問題、または変更要求レコードは自動的に更新されません。関連

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レコードは手動で更新する必要があります。たとえば、プロジェクトの完了によって関連する変更もクローズできる場合は、[変更レコード] に移動して、その [ステータス] フィールドを変更します。また、プロジェクトに関連する情報を含むように、関連レコードの作業メモフィールドを更新することもお勧めします。

関連情報

- プロジェクトワークスペースのプロジェクトのエクスポート
- プロジェクトワークスペース でのプロジェクトへの RIDAC レコードの追加

プロジェクトの財務管理

予算、予測としてのコスト計画、経費ラインとしての実際の経費を管理し、人件費を算出し、財務ベースラインを作成し、プロジェクトワークスペースで必要な頻度でプロジェクトの財務パフォーマンスを表示、分析、および比較します。

包括的な財務ビューは、選択したアイテムの計画コストと実績コスト、予測 (以前の EAC - EAC - 完了時の推定)、残りの見積もり (以前の ETC - 完了までの推定)、実績 (以前の現在までの実績) などを把握するのに役立ちます。コスト計画を管理し、経費ラインを関連付けて、計画立案アイテムの実績を反映するように処理することができます。

コスト比較ビューまたはベースライン比較ビューから財務データを Microsoft Excel または CSV ファイルとしてエクスポートし、ステークホルダーと共有してプロジェクトとポートフォリオの財務実績を確認します。

コストビュー

計画コストを予測し、コスト計画と経費ラインを作成および管理して、プロジェクトの財務実績を追跡し、最新のコストと実績を確認します。

コスト画面では、次のことができます。

- プロジェクトマネージャーは、複数のプロジェクトレベルにわたって財務データの可視性と管理を強化することができます。財務のコストビューには、サブプロジェクトのコスト計画と経費ラインが表示され、財務を追跡できます。
- 親プロジェクトウィジェットには、予測コストと経費の連結値が表示されます。
- 親計画立案アイテムのコストビューから直接、任意のサブプロジェクトまたはデマンドの [プロジェクト/デマンド] 列を使用して、コストを特定して管理します。
- 将来の会計期間のすべてのコスト計画値を再予測するには、ダブルクリックして、最小タイムスケールビューで月別または期間別に値を編集します。
- プロジェクトのコスト計画を管理します。詳細については、「コスト計画の追加、編集、または削除」を参照してください。
- プロジェクトの経費ラインを追加または編集して、予定経費または予定外の経費を記録します。詳細については、「経費ラインの追加または編集」を参照してください。
- 会計期間の人件費を生成する。詳細については、「人件費の生成」を参照してください。
- ベースラインを作成して比較し、プロジェクトの財務スナップショットをキャプチャします。詳細については、「プロジェクトの財務ベースラインの作成と比較」を参照してください。
- ウィジェットを構成し て、計画立案アイテムの財務データの概要を取得します。
- サブプロジェクトのすべての財務詳細は集計され、親プロジェクトのコスト計画とウィジェットに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヒント:

コストビューでは、カスタマイズアイコン ( を使用して左ペインの列をカスタマイズしたり、ユーザー設定を保存して、列の非表示、表示、または調整、時間スコープの表示などに行ったカスタマイズを保持することで、ユーザーエクスペリエンスが強化されます。

コスト画面では、次のことができます。

- プロジェクトマネージャーは、複数のプロジェクトレベルにわたって財務データの可視性と管理を強化することができます。財務のコストビューには、サブプロジェクトのコスト計画と経費ラインが表示され、財務を追跡できます。
- 親プロジェクトウィジェットには、予測コストと経費の連結値が表示されます。
- 親計画立案アイテムのコストビューから直接、任意のサブプロジェクトまたはデマンドの [プロジェクト/デマンド] 列を使用して、コストを特定して管理します。
- 将来の会計期間のすべてのコスト計画値を再予測するには、ダブルクリックして、最小タイムスケールビューで月別または期間別に値を編集します。
- 計画立案アイテムのコスト計画を管理します。詳細については、「コスト計画の追加、編集、または削除」を参照してください。
- 計画立案アイテムの経費ラインを追加または編集して、予定経費または予定外の経費を記録します。詳細については、「経費ラインの追加または編集」を参照してください。
- リソースのアサインに基づいて人件費を生成します。詳細については、「人件費の生成」を参照してください。
- ベースラインを作成して比較し、計画立案アイテムの財務スナップショットをキャプチャします。詳細については、「計画立案アイテムの財務ベースラインの作成と比較」を参照してください。
- ウィジェットを構成し て、計画立案アイテムの財務データの概要を取得します。
- サブプロジェクトのすべての財務詳細は集計され、親プロジェクトのコスト計画とウィジェットに表示されます。

ヒント:

コストビューでは、カスタマイズアイコン ( を使用して左ペインの列をカスタマイズしたり、ユーザー設定を保存して、列の非表示、表示、または調整、時間スコープの表示などに行ったカスタマイズを保持することで、ユーザーエクスペリエンスが強化されます。

表示モード

プロジェクトワークスペース の計画立案アイテムの財務ページには、さまざまなモード間の表示モードドロップダウンがあり、計画立案アイテムのさまざまな形式の財務情報を表示できます。これらのビューは、プロジェクトマネージャーと資金調達ユーザーがファイナンシャルプランで作業する際に役立つ、焦点を絞った関連情報を提供します。

- 予測
- 予算と予測
- 計画と実績
- 計画済み

Financial Funding ロール [it_portfolio_manager] を持つユーザーには、予算と予測の代わりに 予算割り当て オプションが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

表示モード値

モード	値
予測	計画立案アイテムの全スコープの実績、残りの推定、および予測を表示します。 タイムスケールを使用して、過去の会計期間の実績と、現在および将来の会計期間の計画コストを表示します。
予算と予測	会計期間の予算、実績、差異、および計画立案アイテムの全スコープの予測値を表示します。 このモードを使用すると、次のことができます。 • 最新の予測をさまざまなタイムスケールで承認された予算と比較します。 • 過去の会計期間の予算と実績、および現在および将来の会計期間の予算と計画を会計期間レベルで表示します。
予算の割り当て (資金調達ロール)	会計期間の予算、実績、差異、および計画立案アイテムの全スコープの予測値を表示します。 このモードを使用すると、資金調達ユーザーは次のことができます。 • 最新の予測を表示し、作業アイテムに承認できる予算を入力します。 • 過去の会計期間の差異を分析し、将来の会計期間の予算割り当てを処理します。 • 最新の予測を承認された予算と比較し、必要に応じて予算を修正します。
計画と実績	過去および現在の会計期間の計画コストを実際の経費と比較し、将来の会計期間の計画コストを表示します。
計画済み	インライン編集機能を使用して、全範囲の計画コストのみを表示し、計画コストを管理します。

注:

- [予算割り当て] または [予算と予測の比較] 表示オプションが表示されない場合は、 予算割り当てプロパティを有効にし 、インスタンスレベルで 予算属性を設定します 。
- ネクストエクスペリエンスを使用して予算割り当てを処理するには、計画立案アイテムの予算を移行するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化。

最後に選択したビューは、ユーザー設定として保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

財務ユーザーのデフォルトの表示モードとアクセスレベル

ユーザーロール	デフォルトモード	ロールレベルのアクセス
it_portfolio_manager	予算の割り当て	予算を割り当てて承認し、コスト計画と経費ラインを管理します。
it_project_manager	予測	コスト計画と経費ラインを管理します。
business_stakeholder	予測	財務データを表示します。

ベースラインビュー

ベースラインを作成して、プロジェクトの財務上の変更のスナップショットをキャプチャします。オンデマンドのベースラインを作成することも、スケジューラージョブを使用して周期的に作成することもできます。


注:
親プロジェクトで作成されたベースラインには、すべての子プロジェクトのコスト計画と経費ラインが含まれ、プロジェクトとサブプロジェクトの財務実績のブレークダウンを計算してより正確に把握できます。

親プロジェクトの財務ベースラインを作成すると、子プロジェクトの財務レコードも計算されるため、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの財務健全性を 1 か所で追跡できます。

ベースラインを比較して、最新ステータスとベースライン間、または任意の 2 つのベースライン間のコストの差を比較します。

注:
各ベースラインには作成された順序に基づいて番号のタグが付けられます。現在の財務ベースラインは財務の詳細をリアルタイムでキャプチャし、常にフラグアイコン (⚑) で表されます。

ベースライン比較ビューは、2 つのベースライン間の差異を理解するのに役立ちます。

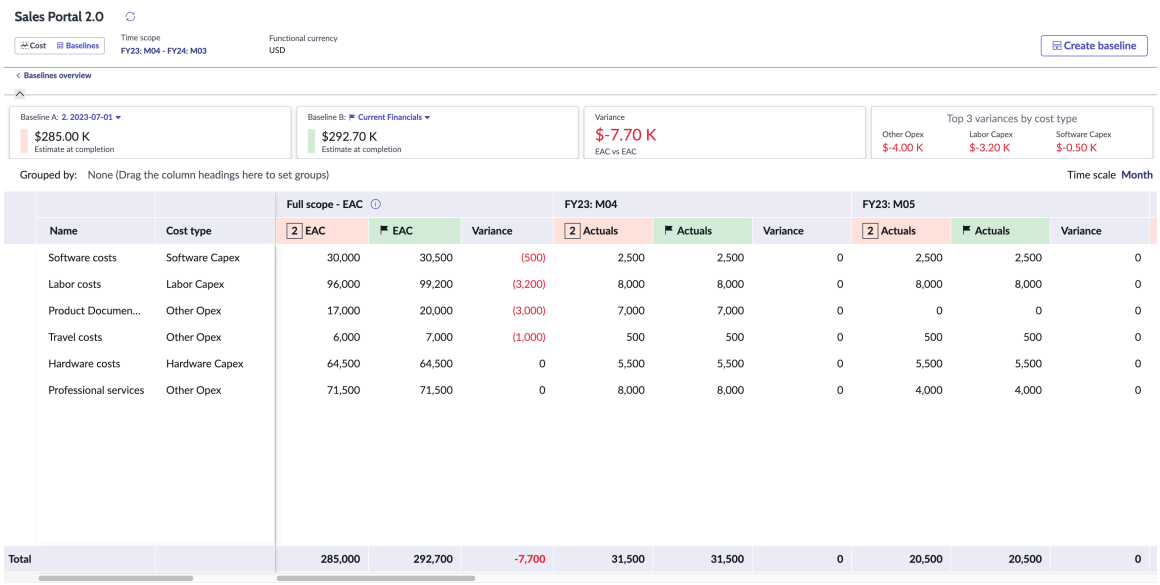

		Full scope - EAC			FY23: M04			FY23: M05		
Name	Cost type	EAC	EAC	Variance	Actuals	Actuals	Variance	Actuals	Actuals	Variance
Software costs	Software Capex	30,000	30,500	(500)	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0
Labor costs	Labor Capex	96,000	99,200	(3,200)	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0
Product Documen...	Other Opex	17,000	20,000	(3,000)	7,000	7,000	0	0	0	0
Travel costs	Other Opex	6,000	7,000	(1,000)	500	500	0	500	500	0
Hardware costs	Hardware Capex	64,500	64,500	0	5,500	5,500	0	5,500	5,500	0
Professional services	Other Opex	71,500	71,500	0	8,000	8,000	0	4,000	4,000	0
Total		285,000	292,700	-7,700	31,500	31,500	0	20,500	20,500	0

ベースラインを比較する場合は、ウィジェットを使用して以下を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 各ベースラインには EAC を表示する 2 つの専用ウィジェットがあります。
- 3 番目のウィジェットには選択したベースラインの EAC 値の間の合計差異が表示されます。
- 4 番目のウィジェットには全体的な差異に寄与する上位 3 つの差異が原価費目別に表示されます。

ウィジェットとヘッダー行は色分けされ、選択したベースラインを識別するのに役立ちます。

ヒント:
いずれかのウィジェットからベースラインの名前を選択して、比較ビューから異なるベースラインを切り替えます。

ベースラインを比較すると、コスト計画とそれに関連する原価費目、フルスコープの EAC、実際の経費と計画コストのブレークダウンビューのリストが表示されます。

デフォルトでは、ブレークダウンビューのタイムスケールは [月] に設定されています。

- [タイムスケール] オプションを使用して、月次、四半期、および年次レベルで比較ブレークダウンビューを表示します。
- 会計期間、ウィジェットのデータ、および比較テーブルをフィルタリングするには、[時間スコープ] を選択します。

ウィジェットとヘッダー行は色分けされ、選択したベースラインを識別するのに役立ちます。

ヒント:
1 番目または 2 番目のウィジェットからベースラインの名前を選択して、さまざまなベースラインを比較します。

2 つのベースライン (ベースライン A：2023-10-01 とベースライン B：現在の財務) の比較ビューの例を見てみましょう。

Example: 異なるタイムスタンプでキャプチャされた **2** つのベースライン間で実績、計画、EAC を比較する方法

作成日に基づいて選択したベースラインについて、テーブルには作成日からの過去の会計期間の実績値と、現在および将来の会計期間の計画値が表示されます。

2023 年 7 月から 2024 年 6 月までの計画立案アイテムを考えてみましょう。ベースライン A は 2023-10-01 に作成されました。2023 年 12 月の現在の財務ベースラインと 2023 年 10 月に取得したベースラインを比較すると、次のようになります。

1. ベースライン比較ビューには、2023 年 7 月から 2023 年 9 月までの [実績] 対 [実績] の列が表示されます。

			FY23: M07			FY23: M08			FY23: M09		
	Name	Cost type	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance
	Professional services	External labor Capex	3,500	3,500	0	3,500	3,500	0	4,700	4,700	0
	Travel costs	Other Opex	800	800	0	450	450	0	0	6,000	(6,000)
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
	other costs	Other Capex									
	Server costs	Hardware Capex									
Total			18,100	18,100	0	20,750	20,750	0	21,500	27,500	-6,000

2. 2023 年 10 月および 2023 年 11 月の [計画] 対 [実績]。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

		FY23: M10			FY23: M11		
Name	Cost type	2 Planned	Actuals	Variance	2 Planned	Actuals	Variance
Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)
Travel costs	Other Opex	450	500	(50)	450	600	(150)
Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
Software costs	Software Capex	3,000	3,500	(500)	3,000	3,000	0
Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
other costs	Other Capex		0	0		0	0
Server costs	Hardware Capex					1,200	(1,200)
Total		20,250	20,800	-550	20,250	22,600	-2,350


3. 2023 年 12 月から 2024 年 6 月までの [計画] 対 [計画]。

		FY23: M12			FY24: M01			FY24: M02			FY24: M03		
Name	Cost type	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance
Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
Travel costs	Other Opex	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0
Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
Software costs	Software Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)
Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)
other costs	Other Capex		1,000	(1,000)									
Server costs	Hardware Capex		1,000	(1,000)									
Total		20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000

注:
列は、前回の会計期間までの実績コストと現在から将来の会計期間の計画コストの合計である EAC を計算するように定義されます。

予算の割り当て

ポートフォリオマネージャーは、プロジェクトの予算を管理および承認できます。承認された予算は、プロジェクトマネージャーが作業を実行するための経費を計画して充足するのに役立ちます。

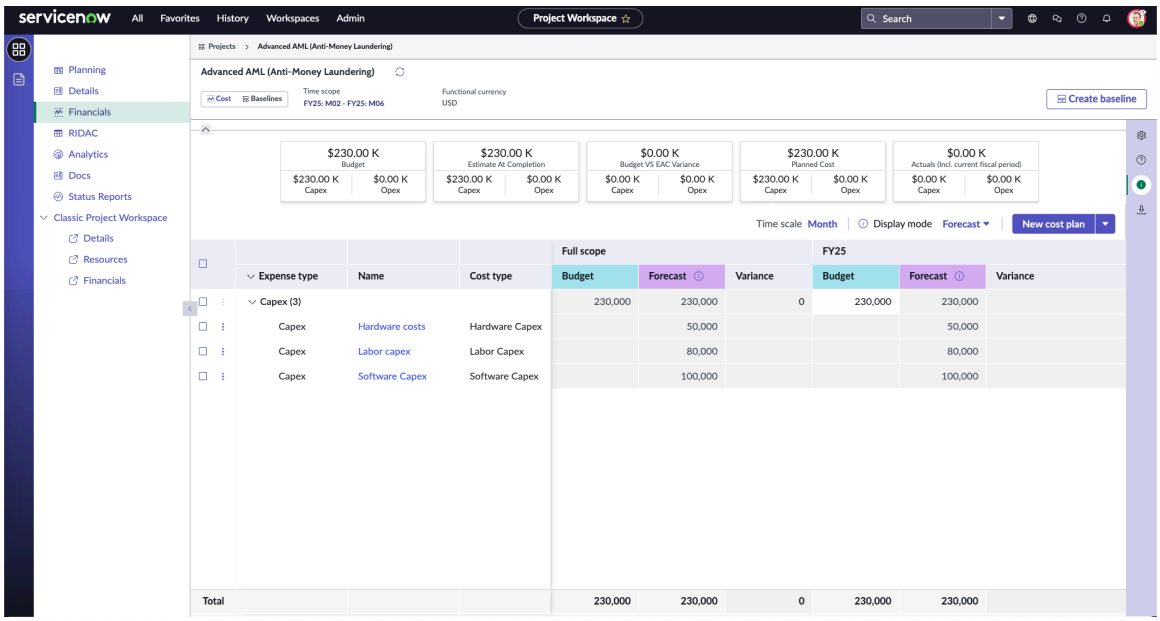

無駄のない予算業務と資金調達の実現可能性を利用して、月次、四半期ごと、または年次のレベルで、より短い計画サイクルの予算を計画および承認します。無駄のない予算業務は、ポートフォリオ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マネージャーが承認された予算のリターン価値を追跡し、将来の会計期間の予算をより適切に計画するのに役立ちます。

> **注:**
> 予算が毎月割り当てられる場合、予算合計は四半期および年次レベルにロールアップされます。同様に、予算が四半期または年次レベルで割り当てられる場合は、月次レベルまで均等にブレークダウンされます。

プロジェクトの予算を割り当て、承認、および処理する方法の詳細については、「 戦略的計画での計画立案アイテムの予算管理」を参照してください。

> **ヒント:**
> 予算割り当てビューでは、ポートフォリオマネージャーは EAC を確認して、プロジェクトマネージャーが行った財務予測を理解し、[コストを予算としてコピー] オプションを使用して、計画コスト全体を予算として割り当てます。

原価費目を属性として選択し、人件費、非労務などの個々の原価費目の予算を割り当てて承認します。

プロジェクトマネージャーは、[予算と計画] の表示モードに切り替えることで、承認された予算を必要なタイムスケールで表示できます。作業が進行し、実績がキャプチャされると、[予算と計画] の表示モードを使用して予算と実績コストを比較し、必要なタイムスケールでインライン編集機能を使用して実績が予算を超えている計画コストを再予測できます。

プロダクトマネージャーは、投資または経費別、原価費目別、および月次、四半期、または年次レベルの必要なタイムスケールで、最新のコストを承認された予算と比較できます。比較ビューは、経費タイプまたは原価費目におけるあらゆる差異を特定し、どの会計期間で発生したものであるかを把握できるよう、プロダクトマネージャーにインサイトを提供します。プロダクトマネージャーは、この情報を活用して、ポートフォリオマネージャーに追加の予算を要求できます。

既存のアクティブなプロジェクトの予算をクラシック UI から ネクストエクスペリエンス に移行できます。ネクストエクスペリエンス の財務には、月次ブレークダウンと原価費目別に詳細なレベルで予算を保存するための新しい予算データモデルがあります。アクティブなプロジェクトとデマンドの予算は、個別に移行することも、スケジュール済みジョブを使用して一括で移行することもできます。

> **注:**
> 移行された予算は sn_invst_pln_invst_budget テーブルにキャプチャされ、必要な時間スコープに対して無駄のない予算業務を有効にします。


利益計画

金銭的利益計画は、計画立案アイテムの実行中に発生する潜在的な利益をキャプチャします。金銭以外の利益計画は、計画立案アイテムの実行中に発生した潜在的な非財務的利益をキャプチャします。金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの潜在的な利益をキャプチャできます。

簡単な財務

簡単な財務では、コストビューからコスト計画をキャプチャしなくても、詳細ページから概要レベルの投資、経費、利益などの計画を入力できます。簡単な財務の値は、計画コストと実績コストがキャプチャされるまで必要に応じて更新できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

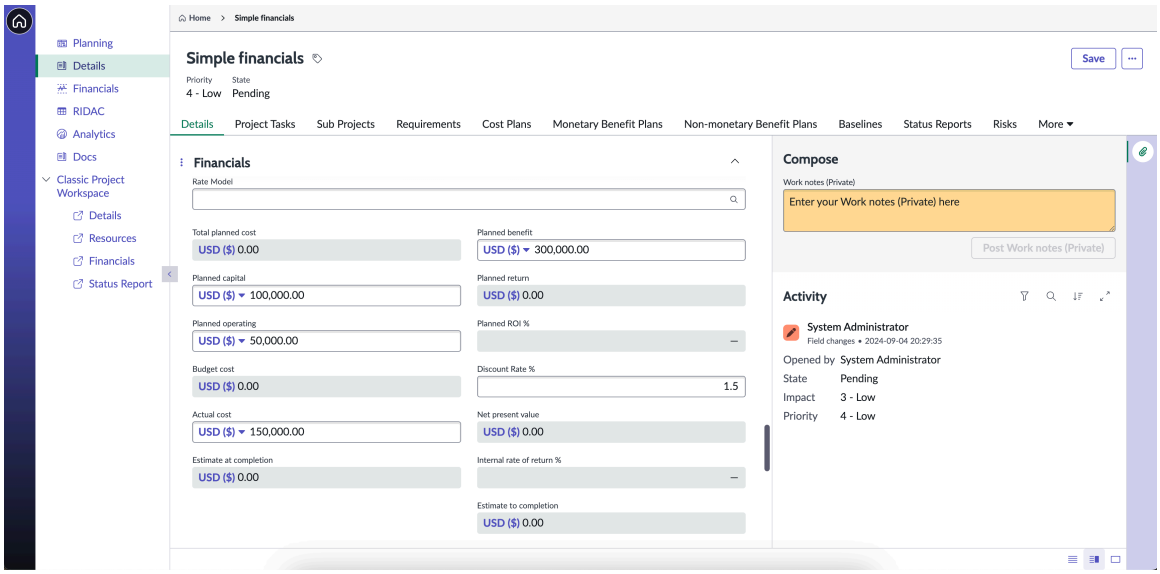

ベースライン機能を使用すると、ここにあるような簡単な財務の値をベースラインでキャプチャし、既存のベースラインと比較できます。以下のことを行うことができます。

- 簡単な財務を再予測し、ベースラインのリストから現在の財務を選択して比較します。
- プロジェクトの進行に合わせて計画の経費と実際の経費をキャプチャし、財務ベースラインを簡単な財務のベースラインと比較して、プロジェクトの財務実績を追跡します。

コスト計画の追加、編集、または削除

必要な期間のコスト計画を作成して、予定経費と実際の経費を追跡します。コスト計画を編集して予定経費を調整し、スコープ対象外の予測を削除します。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. 左側のメニューから [財務] を選択します。

> **ヒント:**
> 初期計画コストをキャプチャした直後に財務ベースラインを作成して、計画コストのスナップショットを作成します。このベースラインを使用して、作業の進捗に応じて、後でベースラインと比較し、初期計画コストと実際の経費の差異を特定します。

これは、将来の経費を計画し、計画コストを再予測するのに役立ちます。

プロジェクトワークスペースを使用したプロジェクトの予算の管理

プロジェクトの予算を割り当て、管理、および承認します。無駄のない予算業務により、計画立案アイテムの全期間に予算を割り当てるのではなく、月次、四半期、年次のブレークダウンレベルなど、さまざまな会計期間の短い計画サイクルに予算を割り当てることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- 管理者は、予算業務で機能するようにプロパティを有効にします。詳細については、「プロジェクトワークスペースでのプロジェクトの財務予算割り当ての有効化」を参照してください。
- 管理者は、原価費目別または経費タイプ別に予算を割り当てて承認する属性を設定します。詳細については、「予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する」を参照してください。
- 必要なロール：it_portfolio_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. 左側のメニューから [財務] を選択します。
3. [予算の割り当て] トグルを有効にします (Budget allocation)。
4. 月次、四半期、または年次レベルで選択したタイムスケールに対して、次のいずれかの方法で予算を管理できます。
   - [予算] 列の各セルをダブルクリックして、値を手動で入力します。
   - [予算] 列のオプションから [コストを予算としてコピー] を選択して、EAC を予算としてコピーします。

   EAC が予算としてコピーされた場合でも、グリッド内編集機能を使用して、各原価費目の予算をいつでも再予測できます。

   注:
   未承認の予算値は、 アイコンで示されます。
5. [予算の承認] (Approve budget) を選択します。
   予算の承認の確認ウィンドウが表示されます。[この予算承認の財務ベースラインを作成します **(Create a financial baseline for this budget approval)]** オプションはデフォルトで有効になっており、最新の予算と財務見積もりがキャプチャされます。

   ヒント:
   予算の承認中に作成された財務ベースラインは、実際の経費がキャプチャされた後に将来のベースラインと比較して、財務パフォーマンスを追跡できます。
6. 確認ウィンドウで、[承認] (Approve) を選択します。

タスクの結果

予算ウィジェットが更新され、最新の承認済み予算が反映されます。プロジェクトマネージャーは、原価費目別の [予算とコスト **(Budget vs cost)]** ビューを使用して、承認済み予算を表示し、それを計画コストと比較できます。

経費ラインの追加または編集

経費ラインを作成または編集して、実績コストをキャプチャします。経費ラインをコスト計画に関連付けるか、スタンドアロンの経費ラインを作成して予定外の経費を記録できます。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
経費ラインは、特定のソースに関連付けることができるプロジェクトコスト計画の一部です。コスト計画に対して複数の経費ラインを作成できます。処理済みステータスの経費ラインのみが作業アイテムのロールアップで考慮されます。
どのコスト計画にも関連付けられていない予定外の経費ラインについては、自動的にコスト計画が作成されるか、同じ経費タイプの既存のシステム生成コスト計画に関連付けられます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. 左側のメニューから [財務] を選択します。
3. 次のいずれかのオプションを使用して、経費ラインを追加します。

4. [経費ラインを作成 (Create expense line)] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[経費ラインを作成] フォーム」を参照してください。
5. **[Save** (保存)] を選択します。

> **注:**
> サブプロジェクトに対して作成された経費ラインは、親プロジェクトの [コスト] 画面で表示できます。

人件費の生成

[計画立案属性] ページで構成された財務属性に基づいて、属性ベースのリソースのアサインに対する [コスト] ビューに人件費を生成します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. 左側のメニューから [財務] を選択します。
3. [人件費の生成] (Generate labor cost) を選択します。
4. [人件費を生成] 確認ウィンドウで [生成] を選択します。

> **注:**
> または、スケジュール済みジョブをアクティブ化して、必要な頻度でベースラインを自動的に作成することもできます。

プロジェクトの財務ベースラインの作成と比較

財務ベースラインを作成して比較し、プロジェクト経費のスナップショットを取得して、計画コストを実際の経費と比較します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. 左側のメニューから [財務] を選択します。
3. ベースラインを作成または比較します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

財務を **Excel** または **CSV** ファイルとしてエクスポート

プロジェクトのコストまたはベースライン比較データをエクスポートして、ステークホルダーと共有できます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. 左側のメニューから [財務] を選択します。
3. [エクスポート] オプション ( ) を選択します。
4. [エクスポート] サイドパネルで、[ファイルタイプ] リストから **[Excel]** または **[CSV]** を選択し、[エクスポート] ボタン (Export) を選択します。

   財務データは、name_fin_mmddyy の命名規則に従って Excel ファイルまたは CSV ファイルとしてダウンロードされます。命名規則の詳細は次のとおりです。

   a. name：計画立案アイテムの名前から最初の 10 文字を取得します。

   b. fin：ファイルに財務データがあることを示します。

   c. mmddyy：このデータをエクスポートするときのシステムの日付形式です。
   たとえば、2024 年 1 月 26 日に「Documentation」という名前の計画立案アイテムの財務データをダウンロードする場合、ファイル名は documentat_fin_012624 になります。

   注:
   財務データは、コストビューとベースライン比較ビューからエクスポートできます。

プロジェクトワークスペースでのリソース計画

リソース管理アプリケーションを使用して、プロジェクトワークスペースでリソースを割り当てて管理します。

主な特長

リソース管理を使用すると、プロジェクトワークスペースのプロジェクトまたはタスクレベルでリソースのアサインを作成、計画、追跡、および監視できます。プロジェクトワークスペースでリソース管理を使用すると、次のことができます。

- 属性ベースのリソースのアサインを作成する。
- プロジェクトの任意のレベルで、リソースのアサイン日、リソース、工数、および提案された割り当てを変更する。
- 新しいヒートマップモーダルを使用してリソース割り当てを表示します。割り当ては、リソースの可用性を表示するために色分けされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [リソースのアサイン] ペインに、各リソースのグループ、ロール、スキルなどのプライマリ属性を表示します。これらは、同じプライマリ属性を持つ別のユーザーにタスクを再アサインするときに役立ちます。
- 時間、**FTE**、または人日の工数タイプを切り替えて、リソース割り当てを表示します。

[リソースのアサイン] ペイン

[リソースのアサイン] ペインには、プロジェクトまたはプロジェクトタスクのリソースのアサインを追加するインターフェイスが表示されます。

リソース割り当てとヒートマップ

[リソース割り当て] ビューでは、リソース別の階層的なタスク構造と、週次または月次の間隔での時間、FTE、人日などの時間ベースおよび作業量ベースの割り当てメトリクスが組み合わされます。

注:
時間、FTE、人日などのさまざまな工数を切り替えて、選択した工数タイプに基づいてリソース割り当てヒートマップを表示します。

割り当てヒートマップモーダルは、リソース使用率の概要を示し、過剰に割り当てられたリソースと利用可能なリソースを特定します。割り当ては、リソースの可用性を表示し、フィルタリングされた期間に対するリソースの可用性を識別しやすくするために色分けされています。新しいヒートマップモーダルは、それぞれのプロジェクトオーナーにアサインされたタスク、リソースステータス、各タスクの工数、承認されたタスクの合計使用率、残りのキャパシティなど、リソースに関する次のインサイトを提供します。


Very Over Utilized	150 +	%
Over Utilized	100 - 150	%
Full Utilization	100	%
Good Utilization	51 - 99	%
Under Utilized	0- 50	%

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヒートマップブレークダウン

割り当てヒートマップブレークダウン

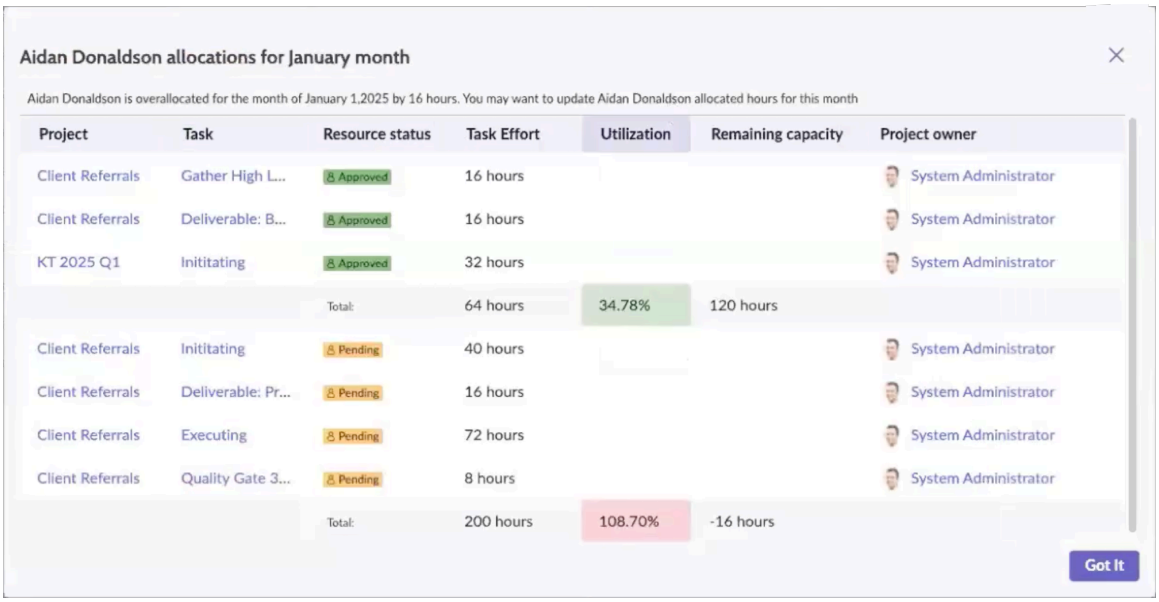

上記の例から、承認された作業アイテムのブレークダウンと、2025 年 1 月のロールアップ工数、使用率、および残りのキャパシティを確認できます。残りのキャパシティが 120 時間であるため、承認された作業はリソースキャパシティ内です。リソースマネージャーは、これらの分析情報を使用して、保留中の作業項目を決定し、使用可能な工数を持つ別のリソースに割り当てることができます。

[リソース割り当て] ビューでは、[承認済み] ステータスが最初に優先されてリストされ、レコードリスト内の順序に基づいて他のステータスが続きます。また、特定の期間にユーザーにキャパシティがない場合は、対応するセルが赤色で表示されます。

プロジェクトワークスペースでのリソースのアサイン

プロジェクトワークスペース内のタスクにリソースをアサインすることで、プロジェクトの実行を最適化します。任意のプロジェクトまたはプロジェクトタスクへのリソースのアサインを作成し、実行するタスクと割り当てるリソースを指定できます。

リソースのアサイン

リソースのアサインは、リソースまたはリソースのグループをプロジェクトタスクに割り当てるプロセスです。リソースのアサインが開始されると、プロジェクト管理 (PM) システムのバックエンドでリソース計画が自動生成されます。このリソース計画には、プロジェクト全体でリソースが割り当てられる方法に関する情報が含まれます。リソースのアサインは、可用性、スキル、プロジェクトの優先順位などの要素を考慮して、割り当てが全体的なリソース戦略と一致していることを確認するために、リソースマネージャーによって承認されます。リソースのアサインは動的であり、プロジェクトのライフサイクル全体を通じて編集できます。リソースは、スキル、専門知識、またはプロジェクトやタスクに関連するその他の基準など、定義された属性に基づいてアサインできます。

注:

リソース労力の計算は、 com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity プロパティによって行われます。アドミニストレーターは、定義された特定のリソースのアサインの工数のみを計算するようにこのプロパティを構成できます。詳細については、「Resource Management プロパティ」を参照してください。

[リソースのアサイン] ペインからインライン編集を使用して、子リソースのアサインを直接編集します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

主な機能

リソースのアサインにより、次のことができます。

- リソースエンゲージメントのタイミングを決定し、指定された期間にリソースを割り当てて、タスク完了のタイムラインの作成に役立てます。
- タスクの実行をプロジェクト計画に合わせて調整し、指定されたタイムラインとリソース要件に従ってタスクが実行されるようにします。
- リソースマネージャーによって実施される承認プロセスを開始し、プロジェクトのターゲットとリソースの可用性に沿っていることを確認します。

関連情報

プロジェクトワークスペースを使用したリソースのアサイン作成

プロジェクトワークスペースからのリソースのアサインの更新

リソースプラン

プロジェクトワークスペースを使用したリソースのアサイン作成

任意のプロジェクトまたはプロジェクトタスクに、プロジェクトワークスペースアプリケーションで属性ベースのリソースのアサインを作成します。

始める前に

リソースのアサインが作成されると、リソース計画がバックエンドで自動的に作成されます。リソースがプロジェクトに割り当てられ、リソースマネージャーによって承認されます。プロジェクトのライフサイクル全体を通じてアサインを編集できます。

必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. [リソースのアサイン] トグルボタンを有効にして、[リソースのアサイン] ペインを表示します。

   注:
   sn_pw.enable_resource_planning プロパティが true に設定されている場合、[リソースのアサイン] トグルボタンと [リソースのアサイン] ペインが プロジェクトワークスペース に表示されます。デフォルト値は false です。このプロパティを有効にするには、pps_admin ロールが必要です。

3. [計画立案] ペインで、プロジェクトタスクの [リソースのアサイン先] フィールドをダブルクリックします。

   [計画立案] ペインと [リソースのアサイン] ペインの両方からリソースをアサインできます。

4. [リソースのアサイン先] リストからユーザーまたはグループを選択し、**Enter** キーを押します。
   リソースのアサインを作成するとき、ユーザーまたはグループの割り当ては選択した工数タイプに基づきます。たとえば、ユーザーを追加し、工数タイプに時間が選択されている場合、割り当ては時間単位で表示されます。
   リソースのアサインレコードが作成され、自動保存されます。[リソースのアサイン] フォームには、プロジェクトまたはタスクの情報が自動入力されます。
5. オプション: [リソースのアサイン] ペインで、[リソースを追加] を選択して、プロジェクトまたはタスクのリソースのアサインを作成します。
   プロジェクトのリソースのアサインは、[リソースのアサイン] ペインからのみ作成できます。
6. 作業に基づいて、経費タイプとして [経費] または [投資] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースは、タイムシートポータルを使用して工数をキャプチャするときに、この情報を使用できます。タイムシートが承認されると、選択した経費タイプに基づいて、投資または経費として経費をキャプチャするプロジェクトの経費ラインが作成されます。

7. [割り当てヒートマップ] トグルボタンを有効にして、ヒートマップにリソースのアサインを表示します。
要件に基づいて、週次ビューから月次ビューに切り替えることができます。

次のタスク
プロジェクトワークスペースからのリソースのアサインの更新

関連情報

[新しいリソースのアサイン (New Resource Assignment)] フォーム

プロジェクトワークスペースからのリソースのアサインの削除

ヒートマップでのリソース割り当ての更新

プロジェクトタスクへのリソースのアサインの再調整

プロジェクトワークスペースでのユーザーのリソースアサインの作成

プロジェクトワークスペースを使用して、ユーザーベースのリソースのアサインを作成します。ユーザーレコードには、インスタンスまたはアプリケーションにアクセスする個人の情報が格納されます。こうしたレコードをグループとロールにアサインして、個人がアクセスできるレコードとアクションを決定できます。

始める前に
必要なロール：admin または it_project_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. [リソースのアサイン] トグルボタンを有効にして、[リソースのアサイン] ペインを表示します。

   注:
   sn_pw.enable_resource_planning プロパティが true に設定されている場合、[リソースのアサイン] トグルボタンと [リソースのアサイン] ペインが プロジェクトワークスペース に表示されます。デフォルト値は false です。このプロパティを有効にするには、pps_admin ロールが必要です。

3. [計画立案] ペインで、プロジェクトタスクの [リソースのアサイン先] フィールドをダブルクリックします。

   [計画立案] ペインと [リソースのアサイン] ペインの両方からリソースをアサインできます。

4. [リソースのアサイン先] リストからユーザーまたはグループを選択し、**Enter** キーを押します。
リソースのアサインを作成するとき、ユーザーまたはグループの割り当ては選択した工数タイプに基づきます。たとえば、ユーザーを追加し、工数タイプに時間が選択されている場合、割り当ては時間単位で表示されます。
リソースのアサインレコードが作成され、自動保存されます。[リソースのアサイン] フォームには、プロジェクトまたはタスクの情報が自動入力されます。
5. オプション: [リソースのアサイン] ペインで、[リソースを追加] を選択して、プロジェクトまたはタスクのリソースのアサインを作成します。
プロジェクトのリソースのアサインは、[リソースのアサイン] ペインからのみ作成できます。
6. 作業に基づいて、経費タイプとして [経費] または [投資] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースは、タイムシートポータルを使用して工数をキャプチャするときに、この情報を使用できます。タイムシートが承認されると、選択した経費タイプに基づいて、投資または経費として経費をキャプチャするプロジェクトの経費ラインが作成されます。

7. [割り当てヒートマップ] トグルボタンを有効にして、ヒートマップにリソースのアサインを表示します。
要件に基づいて、週次ビューから月次ビューに切り替えることができます。

関連情報

プロジェクトワークスペースからのリソースのアサインの更新

リソースのアサインの延長

プロジェクトワークスペースでのグループのリソースアサインの作成

プロジェクトワークスペースを使用してグループを作成し、リソースのアサインに関連付けます。共通の目的を共有する一連のユーザーをグループに関連付けることができます。

始める前に
必要なロール：admin または it_project_manager

このタスクについて
グループを作成して、そのグループにロールをアサインします。グループにアサインされたユーザーは、そのロールを継承します。

手順

1. 移動先 すべて > ユーザー管理 > グループ.
2. グループを作成します。

   グループの作成方法の詳細については、「Create a user group」を参照してください。
3. グループベースのリソースのアサインに必要なグループに pps_resource ロールをアサインします。
ロールをグループにアサインする方法の詳細については、「Assign a role to a group」を参照してください。
4. メンバーをグループに追加して、グループにアサインされたすべてのロールをユーザーが継承するようにします。
詳細については、「グループにユーザーを追加」を参照してください。
5. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
6. [計画立案] ペインで、プロジェクトタスクの [リソースのアサイン先] フィールドをダブルクリックします。

   [計画立案] ペインと [リソースのアサイン] ペインの両方からリソースをアサインできます。
7. [リソース] フィールドで、ステップ 2 のグループを選択し、**Enter** キーを押します。

タスクの結果
グループのリソースのアサインレコードが作成され、自動保存されます。

注:
[リソース] フィールドでグループを選択すると、アサインは [処理待ち] ステータスで作成されます。アサインタイプがグループに設定されている場合、グループのすべてのメンバーにアサインが作成され、そのグループのすべてのメンバーに割り当て時間が均等に分割されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性ベースのリソースのアサイン作成

プロジェクトワークスペースで属性ベースのリソースのアサインを作成します。要件に基づいて属性を事前定義できます。

始める前に
必要なロール：pps_admin または it_project_manager

手順

1. 計画立案属性を作成します。

   > **注:**
   > アサインが属性ベースの場合、アサインは [未アサイン] ステータスで作成されます。計画立案属性を構成するには、pps_admin ロールが必要です。

2. 移動先 すべて > 従業員プロファイル > 従業員プロファイル.
3. 従業員プロファイルを作成します。
   詳細については、「Activate Employee Profile」を参照してください。
4. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
5. [計画立案] ペインで、プロジェクトタスクの [リソースのアサイン先] フィールドをダブルクリックします。

   [計画立案] ペインと [リソースのアサイン] ペインの両方からリソースをアサインできます。

6. [リソースのアサイン先] リストからユーザーまたはグループを選択し、**Enter** キーを押します。
   グループ、スキル、ロールに加えて、場所などの新しいカスタム属性を作成できます。また、これらのカスタム属性を利用してリソースのアサインを作成することもできます。

タスクの結果
属性のリソースのアサインレコードが作成され、自動保存されます。

> **注:**
> リソース管理 に対して [プライマリグループ]、[プライマリスキル]、および [プライマリロール] 属性を有効にできます。要件に基づいて属性をさらに作成できます。

プロジェクトワークスペースからのリソースのアサインの更新

プロジェクトまたはプロジェクトタスクに関連付けられたリソースのアサインを更新します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

リソースのアサインでは、グループリソースのアサインのステータスに加えられた変更は、関連付けられているすべての子リソースのアサインステータスにロールダウンされます。同様に、子リソースのアサインのステータスに加えられた変更は、対応するグループリソースのアサインステータスに自動的にロールアップされます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. [リソースのアサイン] トグルボタンを有効にして、[リソースのアサイン] ペインを表示します。
3. [リソースのアサイン] ペインで、任意のセルをダブルクリックして行全体を編集します。
4. 目的のフィールドを編集し、データグリッドの任意の場所を選択して、詳細を保存します。

   [リソースのアサイン] ペイン内のリソースのアサインが更新されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> 1 フルタイム相当 (FTE) の工数を超える空のリソースのアサインにリソースが追加されると、追加の行が自動的に作成され、リソースのアサインが両方の行で自動更新されます。

[リソースのアサイン] ペインの行コンテキストメニューを使用して、リソースのアサインを延長、編集、または削除します。

リソースのアサインの延長

割り当てられたリソース計画の日付を延長し、延長された期間にリソースを割り当てます。

始める前に
必要なロール：resource_manager

このタスクについて
プロジェクトの作業が開始されたが、プロジェクトが延長されたため、割り当てられたリソース計画の日付を延長する必要があるとします。このシナリオでは、割り当てられたリソース計画の日付を延長できます。リソース計画が延長される新しい日付は、既存の割り当て済みの時間には影響しません。リソース計画を延長する際に、新しい終了日と要求タイプを指定できます。選択した要求タイプに基づいて、必要な割り当て済みの時間が自動的に入力されます。

たとえば、2 か月に 100 時間を割り当て、毎月 50 時間を割り当てたとします。ここで、リソース計画を 1 か月延長するとします。延長月の場合、割り当てレコードは選択した要求タイプに基づいて作成されます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. 次のいずれかのオプションを使用して、リソースのアサインを延長します。

タスクの結果

- アサインの終了日が更新され、リソースの可用性に基づいて割り当てが作成されます。
- 延長された FTE、時間、または人日は、延長されたリソース期間に対して均等に分割されます。

関連情報

- プロジェクトワークスペースでのリソースのアサイン
- プロジェクトワークスペースを使用したリソースのアサイン作成
- プロジェクトワークスペースからのリソースのアサインの更新
- プロジェクトワークスペースからのリソースのアサインの削除
- ヒートマップでのリソース割り当ての更新
- プロジェクトタスクへのリソースのアサインの再調整

プロジェクトワークスペースでのリソースのアサインの移動

タスクのスケジュール設定やリソース割り当ての変更に対応するために、リソースのアサインを新しい開始日と終了日に移動します。リソース間で作業負荷を分散し、過剰割り当てを回避するために割り当てをシフトします。

始める前に
必要なロール:resource_user、resource_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

- アサインを新しい開始日と終了日に移動すると、最初に要求または承認された作業は最新の期間保持されます。
- アサインが移動されると、[レビュー準備完了] ステータスは保持され、リソースマネージャーは作業割り当てのためにアサインに引き続きアクセスできます。
- 作業に実績工数が入力されている場合、リソースのアサインを移動することはできません。
- 新しいアサイン日はタスク期間の日付内である必要があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. [リソースのアサイン] トグルボタンを有効にして、[リソースのアサイン] ペインを表示します。

   注:
   sn_pw.enable_resource_planning プロパティが true に設定されている場合、[リソースのアサイン] トグルボタンと [リソースのアサイン] ペインが プロジェクトワークスペース に表示されます。デフォルト値は false です。このプロパティを有効にするには、pps_admin ロールが必要です。

3. プロジェクトタスクを選択すると、タスクに関連付けられたアサインが表示されます。
4. [リソースのアサイン] ペインで、行コンテキストメニュー (を選択し、[移動] を選択します。
5. [移動割り当て] モーダルから、日付ピッカーモーダルを使用して 新しい開始日 を選択します。
6. オプション: [新規ステータス] リストを使用して、次のいずれかの利用可能なステータスにアサインステータスを変更します。
   ステータスの変更は、resource_managerロールに制限されています。
7. [**Confirm** (確認)] を選択します。
   グループのリソースのアサインを移動すると、そのグループのすべてのメンバーのアサインが移動されます。グループ内の個々のユーザーまたは子リソースのアサインのアサインを移動することはできません。

関連情報

リソースのアサインの延長

プロジェクトワークスペースからのリソースのアサインの更新

プロジェクトワークスペースからのリソースのアサインの削除

ヒートマップでのリソース割り当ての更新

プロジェクトタスクへのリソースのアサインの再調整

プロジェクトワークスペースからのリソースのアサインの削除

プロジェクトワークスペースからリソースのアサインを削除します。アサインを削除すると、関連するすべてのリソースのアサインも削除されます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. [リソースのアサイン] トグルを有効にして、[リソースのアサイン] ペインを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [リソースのアサイン] ペインで、[リソースを追加] を選択して、プロジェクトまたはタスクのリソースのアサインを作成します。

4. [リソースのアサイン] ペインで、行コンテキストメニュー (⋮) を選択し、[行を削除] を選択します。
   リソースのアサインが [リソースのアサイン] ペインから削除されます。

リソースボードを使用したリソースの管理

リソースページを使用して個々のタスク間を移動することなく、すべてのリソースのアサインを表示および管理します。リソースデマンドの予測とビジュアル化をサポートするために、プロジェクトに関連付けられたリソースに基づいて リソース管理ワークスペース でリソースビューを自動的に生成するようにリソースボードを設定します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager、resource_user

このタスクについて
左側のメニューから [リソース] を選択すると、そのプロジェクト内のリソースのアサイン先に基づいてリソースボードを生成するページにリダイレクトされます。リソースボードは リソース管理ワークスペース 内に作成され、その特定のプロジェクトに関連付けられているすべてのリソースとタスクが表示されます。各リソースに割り当てられているタスクの数を表示することもできます。

たとえば、Simon は 2 つのプロジェクトタスクに割り当てられているリソースであるとします。リソースボードから Simon を選択すると、Simon がプロジェクトにアサインされているすべてのプロジェクトタスクを表示できます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. 左側のメニューから [リソース] を選択して、プロジェクトのリソース ページを開きます。
3. 必要に応じて、リソースステータス、タスク工数、開始日、終了日、またはリソースアサインのその他の属性を編集します。
   行を編集したり、再アサインしたり、延長したり、リソースのアサインを開いたりすることができます。リソース管理ワークスペースのリソースボードから、新しいリソースのアサインを直接作成できます。未アサインタスクの切り替えを選択すると、そのプロジェクトのどのタスクにも現在アサインされていないすべての未アサインリソースを表示できます。サブプロジェクトの場合、サブプロジェクトを選択してから [リソース] を選択すると、そのサブプロジェクトに割り当てられたリソースが表示されます。

関連情報
リソースカードの作成

ヒートマップでのリソース割り当ての更新

プロジェクトワークスペースで割り当てヒートマップ機能を使用して、リソース割り当てを表示および更新します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
[割り当てヒートマップ] トグルボタンを使用すると、個々のリソースの割り当ての詳細なブレークダウンが提供されます。割り当てヒートマップは、週または月のリソースの合計使用率を表します。デフォルトでは、その週の割り当て情報が表示されます。この情報は、プロジェクトマネージャーがプロジェクトレベルまたはタスクレベルでリソースを効果的に計画するのに役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


ServiceNow® インスタンスを組織の Microsoft Teams と統合して、Microsoft Teams でのプロジェクトとリソース割り当てのコラボレーションを可能にします。Microsoft Teams 統合を使用すると、プロジェクトのチームメンバーとコミュニケーションを取り、プロジェクトとリソース割り当てのステータスに関するリアルタイムの更新を共有できます。詳細については、「Microsoft Teams 用の PPM コラボレーションの設定」を参照してください。

手順

1. プロジェクトワークスペースを使用したリソースのアサイン作成.
2. [割り当てヒートマップ] トグルボタンを有効にして、ヒートマップにリソースのアサインを表示します。
   要件に基づいて、週次ビューから月次ビューに切り替えることができます。
3. 目的のフィールドを編集し、データグリッドの任意の場所を選択して、詳細を保存します。
   作業割り当てはキャパシティに基づいています。割り当ては、この後に示すようにリソースの可用性を表示するために色分けされます。これらの色は、特定のタスクのリソースの可用性を識別するのに役立ちます。

Very Over Utilized	150 +	%
Over Utilized	100 - 150	%
Full Utilization	100	%
Good Utilization	51 - 99	%
Under Utilized	0- 50	%

4. 割り当て時間のセルを選択して、[リソース割り当て] ウィンドウを編集します。

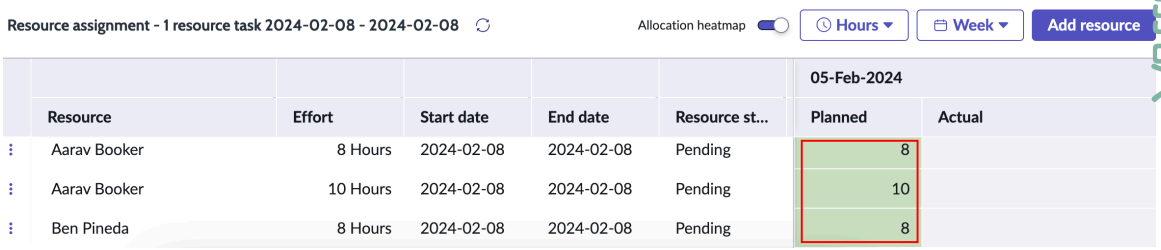

   [実績を表示] トグルを有効にして、各リソースの実績を表示します。実績をプロジェクトワークスペースから編集することはできません。

5. [リソース割り当て] ウィンドウから、リソースのアサインされたプロジェクト、所有者、タスク、および作業工数を表示および追跡します。


   リソースにスケジュールがある場合、リソースの割り当てはリソースのスケジュールに従って行われます。

   割り当てヒートマップモーダルには、[リソースステータス]、[残りのキャパシティ]、および [使用率] 列があり、リソースマネージャーによるタスク工数の評価をサポートします。

6. [プロジェクトオーナー] フィールドを選択して、Microsoft Teamsでプロジェクトオーナーにダイレクトメッセージを送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

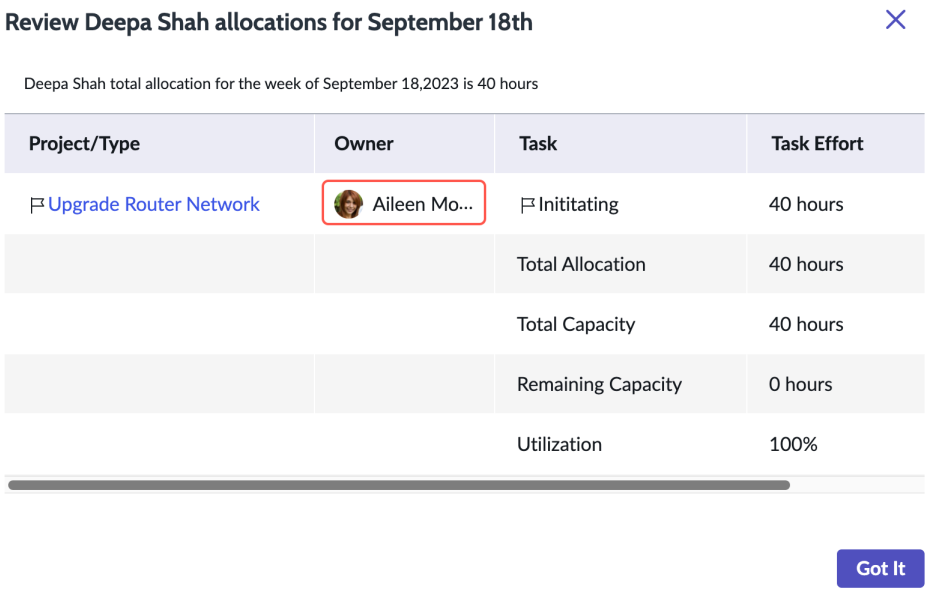

注:
[プロジェクトオーナー] フィールドは、 ServiceNow® インスタンスが組織の Microsoft Teamsと統合されている場合にのみ選択できます。デマンドのリソースのアサインは、プロジェクトになる前と後の両方で割り当てウィンドウに表示されます。

関連情報

プロジェクトワークスペースを使用したリソースのアサイン作成

プロジェクトタスクへのリソースのアサインの再調整

リソースのアサイン日をプロジェクトタスクの日付に再調整または同期します。この同期により、リソースのアサインをスケジュールし、プロジェクトタスクのタイムラインに合わせて調整できるようになります。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 すべて > ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. [プロジェクト計画立案] ペインで、プロジェクトタスクの [開始予定日] または [実際の開始日] をダブルクリックします。
3. フィールドを編集し、**[OK]** を選択します。
4. プロジェクトタスクの行から、行コンテキストメニューを選択し、[タスクへのアサインの再調整] を選択します。

   または、[同期されていないリソース] アイコン を使用して、リソースのアサイン日をプロジェクトレベルでプロジェクトの日付と同期します。フォームを使用しているときに同じアクションを実行するには、[タスクへのアサインの再調整] 関連リンクを使用できます。

タスクの結果
リソースのアサイン日はプロジェクトタスクの日付と同期されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

プロジェクトワークスペースでのリソースのアサイン

プロジェクトワークスペースの参照

プロジェクトワークスペースの参照

フィールド、ユーザーロール、テーブル、スケジュール済みジョブ、システムプロパティ、カスタムスクリプトなど、プロジェクトワークスペースに関する追加の詳細を提供する参照情報です。

プロジェクトワークスペースとともにインストールされるコンポーネントとプロパティは、「プロジェクト管理 (PM)」に記載されているものと同じです。詳細については、次の参照トピックを参照してください。

- Project Management とともにインストールされるプロパティ
- Resource Management プロパティ

プロジェクトワークスペース のフォームフィールドの情報

プロジェクトワークスペース アプリケーションで使用されるフォームのフィールド情報。

プロジェクトワークスペース のアクションフォーム

プロジェクトワークスペース のアクションフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、プロジェクトにアクションを追加します。

アクションフォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成番号。
状況	アクションの現在のステータス。すべての新しいアクションレコードは、ステータスを [オープン] に設定して作成されます。 使用可能な状況は、次のとおりです。 • 処理待ち • オープン • 対応中 • 完了してクローズ • 未完了でクローズ • スキップしてクローズ
優先度	影響度に基づいてアクションを実装または承認する緊急性。
コスト概算	アクションによって生成されるコスト概算
Impact	アクションを実装しない場合のプロジェクトの結果への影響
承認	アクションのステークホルダーからの承認のステータス。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 未要求 • 要求済み

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクションフォーム (続く)

フィールド	説明
	• 承認済み • 却下
担当者	アクションを実装するためにアサインされたプライマリリソース。
期日	アクションを承認または実装する必要がある要求日。
親	このアクションが属するプロジェクト。
プロジェクトステータスレポートに表示	アクション情報をプロジェクトステータスレポートに含めるかどうかを指定するオプション。
簡単な説明	アクションに関係する内容、アクションの実装方法、影響を受けるユーザー、およびアクションの結果など、アクションの簡単な説明。 アクションのタイトルを入力し始めると、アクションのタイトルと一致する可能性がある関連アクションが表示されます。 提案アイコン ( ) をクリックして、事前定義されたアクションのリストから説明を選択します。
説明	アクションとその潜在的な影響の詳細。
作業メモ	アクションに関する情報。作業メモを追加して、アクションの承認、却下、または実装のステータスについて他のユーザーとやり取りします。

プロジェクトワークスペース の意思決定フォーム

プロジェクトワークスペース の意思決定フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、プロジェクトに意思決定を追加します。

意思決定フォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成 ID 番号。
状況	意思決定の現在のステータス。すべての新しい意思決定レコードは、[オープン] ステータスで作成されます。 使用可能なステータスは、次のとおりです。 • 処理待ち • オープン • 対応中 • 完了してクローズ • 未完了でクローズ • スキップしてクローズ
優先度	考えられる影響度に基づいて意思決定を承認または実装する緊急性。
意思決定ステータス	意思決定のステータス。使用可能なオプションは、次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

意思決定フォーム (続く)

フィールド	説明
	• 処理待ち • 承認済み • 却下
Impact	意思決定を実装しない場合のプロジェクトの結果への影響
承認が必要	意思決定の承認が必要かどうかを決定するためのオプション。
コスト概算	意思決定を実装するためのコスト概算。
期日	意思決定を承認または実装する必要がある要求日。
担当者	意思決定の対応をアサインされたプライマリリソース。デフォルト値は、意思決定レコードを作成するユーザーの名前です。
親	この意思決定が属するプロジェクト番号。
プロジェクトステータスレポートに表示	意思決定情報をプロジェクトステータスレポートに含めるかどうかを指定するオプション。
簡単な説明	意思決定の内容、意思決定者、意思決定の影響、および意思決定の結果など、意思決定の簡単な説明。 意思決定のタイトルを入力し始めると、意思決定と一致する可能性がある関連する意思決定が表示されます。 提案アイコン ( ) をクリックして、事前定義された意思決定の説明のリストから説明を選択します。
説明	意思決定とその潜在的な影響の詳細。
作業メモ	意思決定の実装または承認のステータスを記録および追跡するための情報。

プロジェクトワークスペース のエクスポートステータスレポートフォーム

プロジェクトワークスペース のエクスポートステータスレポートフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、プロジェクトのステータスをエクスポートします。

ステータスレポートのエクスポートフォーム

フィールド	説明
エクスポートするレポート	PowerPoint としてエクスポートする既存のプロジェクトステータスレポート。
PowerPoint テンプレート	ステータスレポートに適用する PowerPoint テンプレート

プロジェクトワークスペース の問題フォーム

プロジェクトワークスペース の問題フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、プロジェクトに問題を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

問題フォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成 ID 番号。
状況	問題の現在のステータス。すべての新しい問題レコードは、[オープン] ステータスで作成されます。 使用可能な状況は、次のとおりです。 • 処理待ち • オープン • 対応中 • 完了してクローズ • 未完了でクローズ • スキップしてクローズ
優先度	考えられる影響度に基づいて問題を解決または管理する緊急性。
推定コスト	問題によって生成されるコスト概算
Impact	問題が未解決のままである場合のプロジェクトの結果への影響。
期日	次のいずれかの状況の要求日： • 問題にアサインされたリソースがある場合、 [期日] は問題を解決する日付です。 • 問題がどのリソースにもアサインされていない場合、[期日] は問題をクローズまたは対処する必要がある日付です。
担当者	問題解決の対応をアサインされたプライマリリソース。
親	この問題が属するプロジェクト。
プロジェクトステータスレポートに表示	問題情報をプロジェクトステータスレポートに含めるかどうかを指定するオプション。
簡単な説明	問題、および問題がプロジェクトの成功に与える潜在的な影響の簡単な説明。 問題のタイトルを入力し始めると、問題と一致する可能性がある関連する問題が表示されます。 提案アイコン ( ) をクリックして、事前定義された問題の説明のリストから選択します。
説明	問題とその潜在的な影響の詳細。
作業メモ	問題解決のために完了した作業を記録および追跡するための情報。

のプロジェクトフォーム プロジェクトワークスペース

プロジェクトワークスペースのプロジェクトフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、プロジェクトを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトフォーム

フィールド	説明
プロジェクト名	プロジェクトの希望する名前。
開始予定日	このプロジェクトのタスクを開始する予定の日付。
プロジェクトクラス	作成するプロジェクトのタイプを選択します。たとえば、標準プロジェクト、カスタマープロジェクト、チームスペースプロジェクトなどです。
プロジェクトテンプレート	プロジェクトに適用するテンプレート。 必要なテンプレートがリストにない場合は、後でテンプレートを作成してプロジェクトに適用できます。

プロジェクトワークスペース の変更要求フォーム

プロジェクトワークスペース の変更要求フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、プロジェクトに変更要求を追加します。

変更要求フォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成 ID 番号。
状況	変更要求の現在のステータス。すべての新しい変更要求レコードは、[オープン] ステータスで作成されます。 使用可能な状況は、次のとおりです。 • 処理待ち • オープン • 対応中 • 完了してクローズ • 未完了でクローズ • スキップしてクローズ
優先度	影響度に基づいて要求された変更を承認する緊急度。
コスト概算	要求された変更によって生成されるコスト概算
Impact	要求された変更を承認しない場合のプロジェクトの結果への影響。
承認	要求された変更のステークホルダーからの承認のステータス。
担当者	変更要求の対応をアサインされたプライマリリソース。
期日	変更要求を完了するための要求日。
カテゴリ	変更要求の作成対象のエンティティ。オプションは次のとおりです。 • リソース • スコープ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変更要求フォーム (続く)

フィールド	説明
	• コスト • スケジュール
親	この変更要求が属するプロジェクト番号。
プロジェクトステータスレポートに表示	変更要求情報をプロジェクトステータスレポートに含めるかどうかを指定するオプション。
タイトル	変更要求のタイトル。
説明	変更要求とその潜在的な影響の詳細。
ビジネス上の根拠	プロジェクトで提案された変更を要求する理由とそのビジネスへの影響。
作業メモ	プロジェクトの変更要求の進捗状況を示す追加情報。

プロジェクトワークスペース のリスクフォーム

プロジェクトワークスペース のリスクフォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、プロジェクトにリスクを追加します。

リスクフォーム

フィールド	説明
番号	構成可能なプリフィックス付きのシステム生成 ID 番号。
状況	リスクの現在のステータス。すべての新しいリスクは、[処理待ち] ステータスで作成されます。 使用可能なステータスは、次のとおりです。 • 処理待ち • オープン • 対応中 • 完了してクローズ • 未完了でクローズ • スキップしてクローズ
リスクステータス	リスクのステータス。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 処理待ち • 達成 • 未達成 • 回避 • 緩和 • 移転 • Accept

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リスクフォーム (続く)

フィールド	説明
確率 (Probability)	リスクに記載されているイベントが発生する可能性。使用可能なオプションは、次のとおりです。 • 絶対 • 高 • 中 • 低
Impact	プロジェクトの結果に対するリスクイベントの影響。
推定コスト	リスクイベントによって生成されるコスト概算
リスクのランク	リスクにアサインされた値と色。この値は、リスクの確率と影響度を使用して計算されます。リスク値のルックアップを使用して色と値を設定できます。詳細については、「プロジェクトのカスタムのリスクランクとリスク値の設定」を参照してください。
リスクオーナー (Risk owner)	リスクの監視と管理を担当するプライマリリソース。
担当者	リスクの対応をアサインされたプライマリリソース。
リスク値	リスク値のルックアップから計算された値。詳細については、「プロジェクトのカスタムのリスクランクとリスク値の設定」を参照してください。
期日	次のいずれかの状況の要求日： • リスクにアサインされたリソースがある場合、 [期日] はリスクを解決する日付です。 • リスクが何らかのリソースにもアサインされている場合、[期日] は問題をクローズまたは対処する必要がある日付ではありません。
プロジェクトステータスレポートに表示	リスク情報をプロジェクトステータスレポートに含めるかどうかを指定するオプション。
タスク	このリスクが属するプロジェクト。
簡単な説明	イベント、およびイベントがプロジェクトの成功に与える潜在的な影響の簡単な説明。リスクがリスクライブラリから作成されている場合、このフィールドには [リスクステートメント] 名が表示されます。
説明	イベントとその潜在的な影響の詳細。リスクがリスクライブラリーから作成されている場合、このフィールドにはリスクステートメントの簡単な説明が表示されます。
実績コスト	リスクイベントによって生成されたコスト。この情報は、イベントが発生した場合に追加されます。
軽減計画 (Mitigation plan)	リスクを軽減するために行う取り組みの簡単な説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
[リスクアセスメントのサマリー] セクションは、[*Enable Advanced Risk PPM Integration*] プロパティが有効になっている場合にのみ表示されます。

リスクフォームの [リスクアセスメントサマリー] セクション

フィールド	説明
固有リスク	このフィールドには、リスク査定人が固有リスクを評価する場合のリスクスコアが自動的に入力されます。
エンタープライズリスクに昇格	このオプションは、プロジェクトマネージャーによってリスクがエンタープライズリスクに昇格されたときに自動的に選択されます。
残存リスク	このフィールドには、リスク査定人が残存リスクを評価する場合のリスクスコアが自動的に入力されます。
企業固有リスク (Enterprise inherent risk)	このフィールドには、リスク査定人が企業固有リスクを評価する場合のリスクスコアが自動的に入力されます。
企業残存リスク (Enterprise residual risk)	このフィールドには、リスク査定人が企業残存リスクを評価する場合のリスクスコアが自動的に入力されます。

[リソースのアサイン] フォーム

このフォームを使用して、プロジェクトワークスペースからリソースのアサインを作成します。

[リソースのアサイン] フォーム

フィールド	説明
リソース	リソースのカテゴリ。グループのメンバーまたはユーザーを要求するには、リソースリストから名前を選択します。
工数タイプ	リソースのアサインの作成時に選択された工数のタイプ。次のいずれかの選択肢を選択すると、その選択肢のフィールドが表示されます。 • 時間 • FTE • 人日 たとえば、[時間] を選択すると、[時間] フィールドが表示されます。
工数	リソースのアサインの工数。 • [時間] を選択すると、選択したリソースに割り当てられた時間数が表示されます。 • **[FTE]** を選択すると、選択したリソースのフルタイム相当値の単位数が表示されます。デフォルトでは、リソースのアサインは 1 FTE (1 FTE = 8 時間) の工数で作成されます。 • [人日] を選択すると、選択したリソースの日数が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソースのアサイン] フォーム (続く)

フィールド	説明
開始日	リソースのアサインの開始日。デフォルトでは、このフィールドには関連するプロジェクトレコードまたはタスクレコードの [開始予定日] が表示されます。プロジェクトタスクで開始予定日と実際の開始日の両方が利用可能な場合、リソースのアサイン開始日にはデフォルトで実際の日付が考慮されます。
終了日	リソース計画の終了日。デフォルトでは、日付は関連するプロジェクトレコードまたはタスクレコードの [終了予定日] から取得されます。必要に応じて、デフォルトの日付を編集します。プロジェクトタスクで終了予定日と実際の終了日の両方が利用可能な場合、リソースのアサインにはデフォルトで実終了日が考慮されます。
ロール	ロールリソースのアサインに関連付けられているロール。 **注:** チームメンバーのスキルと能力に基づいて、チームメンバーのプロジェクト固有のロールを定義できます。
グループ	リソースのアサインに関連付けられているグループ。 **注:** [リソース] フィールドでグループを選択すると、アサインはグループのすべてのメンバーに作成されます。ロール、スキル、場所、およびその他の属性をグループに関連付けて、グループ内のユーザーに適用できます。グループは、要件に基づいてプライマリグループとしてアサインすることもできます。
スキル	要求されたリソースが、リソースのアサインにそのリソースを割り当てるために備えているスキル。
リソースステータス	リソースのアサインのステータス。 **注:** リソースのアサインがユーザーまたはグループに対するものである場合、アサインは [処理待ち] ステータスで作成されます。 アサインが属性ベースの場合、アサインは [未アサイン] ステータスで作成されます。
従業員タイプ	従業員のタイプ。たとえば、内部リソースや外部リソースなどです。
割り当てステータス	リソース割り当てのステータス。このフィールドは、自動的に [割り当て済み] に設定されます。
タスク	アサインが適用されるタスク。リソースのアサインがプロジェクトタスクから作成された場合は、タスク番号がここに表示されます。
トップタスク	アサインが作成される親タスク
リソース割り当て	リソースの割り当て番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソースのアサイン] フォーム (続く)

フィールド	説明
アサインタイプ	リソースのアサインのタイプ • グループ • ユーザー
割り当てタイプ	割り当てのタイプ。 • 月次 • 週次 たとえば、[月次] を選択すると、割り当て時間はその月に均等に配分され、[週次] を選択すると、割り当て時間はその週に均等に配分されます。
オフセット (OffSet)	プロジェクトまたはタスクの実際の開始日または開始予定日とリソースのアサイン開始日の差。

[コスト計画を作成] フォーム

このフォームを使用して、計画立案アイテムのコスト計画を作成します。

[コスト計画を作成] フォーム

フィールド	説明
名前	コスト計画の名前。
入力通貨 (Entered currency)	単位コスト値をキャプチャする通貨。
単価	コスト計画の計画コスト。
数量	コスト計画の数量。
合計計画コスト	コスト計画の合計計画コスト値。
会計期間の開始	コスト計画の会計期間の開始月。
会計期間の終了	コスト計画の会計期間の終了月。
コスト配分	会計期間または期間ごとに計画コストを割り当てます。 このリストから値を選択します。 • [会計期間全体で均等に分割 **(Split equally across fiscal periods)]** - 期間全体にわたるすべての会計期間にコストを均等に分配します。 • [会計期間ごとに繰り返し **(Recurring per fiscal period)]** - 期間全体にわたって各会計期間のコストが繰り返し発生します。
原価費目	コスト計画の原価費目。 リストから原価費目のフォームを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[コスト計画を作成] フォーム (続く)

フィールド	説明
	注: 選択した原価費目に基づいて、[ロール] フィールドと [製品モデル] フィールドが表示されます。
従業員タイプ	Read-onlyフィールド。 • 外部：コストタイプが外部労働設備投資または外部労働運用費用の場合。 • 内部：コストタイプが労働設備投資または労働運用費用の場合。
ロール	コスト計画を経費計上するロールの名前。
製品モデル	コストタイプがソフトウェア、ハードウェア、またはその他の設備投資または運用コストの場合に使用できます。 コスト計画を経費計上するモデルをリストから選択します。 コスト計画を経費計上するハードウェア支出のモデル名。

[経費ラインを作成] フォーム

このフォームを使用して、実際の経費の経費ラインを作成します。

[Expense Line を作成] フォーム

フィールド	説明
番号	経費ラインの自動生成番号。
総計	発生した経費。
簡単な説明	経費の簡単な説明を入力します。 経費ラインを識別するための一意で具体的な詳細を記載します。
日付	経費が発生した日付。
処理日	経費の処理日。
コスト計画	経費ラインを記録するための関連コスト計画名。
原価費目	経費の原価費目。 デフォルトでは、コスト計画の原価費目が選択されています。
状況	経費ラインのステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[Expense Line を作成] フォーム (続く)

フィールド	説明
	処理済みの経費ラインのみが投資エンティティに考慮されます。
経費タイプ	経費タイプ (内部または外部) を定義します。 デフォルトでは、経費タイプは [原価費目] フィールドエントリから考慮されます。
レートカード	レートカードの名前。
サマリータイプ	経費ラインのビジネス目的。

[ステータスレポートを作成] フォーム

プロジェクトワークスペースのステータスレポートの作成フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、要件に従って新しいステータスレポートを作成します。デフォルトのステータスレポートテンプレートを使用して作成されたレポートのヘッドは次のとおりです。1 ページのステータスレポートテンプレートを使用して作成されたレポートでは、情報ヘッドが少なくなります。

[ステータスレポートを作成] フォーム

フィールド	説明
ステータスレポート名	レポートの目的を明確に説明するレポートの一意の名前。
ステータス報告日	レポートの日付。
総合健全性	プロジェクトの現在の総合健全性とステータス。
エグゼクティブサマリー	プロジェクトのステータスを簡潔に要約し、主要な成果、課題、および決定事項を強調します。
コメント	追跡にとって重要な追加情報または観察事項。
先週の達成度	進捗状況を示すために前週に完了した主要なマイルストーンまたはタスクのリスト。
予定されている主要アクティビティ	今後の取り組みを可視化するために、翌週に計画されているメインタスクまたはマイルストーン。
スケジュール	プロジェクトが計画されたタイムラインに従って順調に進んでいるかどうかを示します。
スケジュールについてのコメント	予定されたスケジュールからの逸脱に関するコメント。
コスト	現在のプロジェクトコスト。
コストについてのコメント	支出超過やコスト削減など、計画予算からの逸脱に関するコメント。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ステータスレポートを作成] フォーム (続く)

フィールド	説明
リソース	プロジェクトに割り当てられたリソース。リソースが十分で適切に利用されているかを確認します。
リソースについてのコメント	不足、過剰、必要な調整など、リソースの使用に関するコメント。
スコープ	プロジェクトスコープで変更が行われているかどうかを示します。
スコープについてのコメント	プロジェクトスコープの変更に関する観察または説明 (プロジェクトへの影響を含む)。

関連情報

でのステータスレポートの作成 プロジェクトワークスペース

新しいドキュメントテンプレートの作成フォーム

プロジェクトワークスペースの [新規ドキュメントテンプレートを作成] フォームのフィールドについて説明します。このフォームを使用して、要件に従って新しいステータスレポートテンプレートを作成します。

新しいドキュメントテンプレートの作成フォーム

フィールド	説明
名前	テンプレートの一意の名前。
カテゴリ	テンプレートのカテゴリ。プロジェクトステータスレポートを検索して選択します。
説明	テンプレートの説明を入力します。
ヴィジビリティ	テンプレートの可視化。
所有者	テンプレートの所有者。
アイコン	レポートのアイコン。作成しているテンプレートとともにウィンドウに表示されるアイコンファイルを選択します。このファイルは、ステータスレポートのヘッダーに表示されます。
次の条件に一致	このテンプレートを使用して作成されたステータスレポートに動的プロジェクトデータを挿入するオプション。
添付ファイル	テンプレートの添付ファイル。

関連情報

でのステータスレポートテンプレートの作成 プロジェクトワークスペース

プロジェクトワークスペースクラシック版 - レガシー

単一の場所からプロジェクトを定義、計画、追跡、および監視します。ステータスレポートと KPI を表示して、プロジェクトに対してさらにアクションを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


重要:

クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

[自分のプロジェクトスペース] ページのプロジェクト

プロジェクトワークスペースの概要ページ ([自分のプロジェクトスペース]) には、フィルター基準に基づいてプロジェクトがカードとして表示されます。最後に更新された最大 200 件のプロジェクトがページに表示されます。カードをクリックすると、プロジェクトワークスペースでプロジェクトが開きます。カードに表示される情報を設定できます。

[自分のプロジェクトスペース] ページのプロジェクトカード

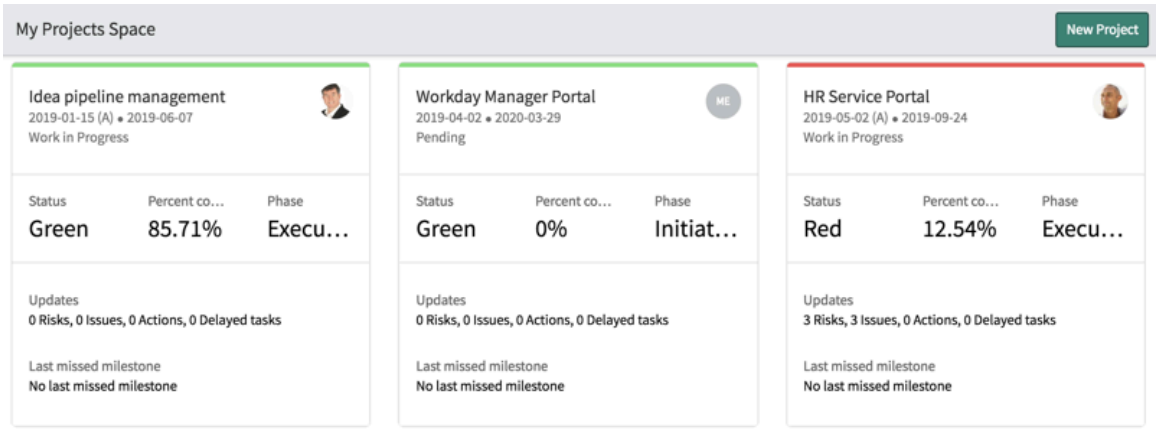

ワークスペースのコンポーネントは次のとおりです。

バナーアイコン

プロジェクトワークスペースでは、次のバナーアイコンを使用できます。

ホーム

ホームアイコン ( ) を使用すると、[自分のプロジェクトスペース] ページのプロジェクトカードのリストに戻ることができます。

プロジェクト選択リスト

選択リストに表示されたプロジェクトを選択して、プロジェクトワークスペースで開くことができます。[自分のプロジェクトスペース] ページで適用されたフィルター基準に基づいて、選択リストにプロジェクトが表示されます。

プロジェクトチェックリスト

チェックリストアイコン ( ) は、プロジェクトで完了する必要があるアクティビティのチェックリストをビルドするのに役立ちます。

プロジェクトワークスペースのタブ

プロジェクトワークスペースは、以下に概要を説明しているタブで構成されています。

アナリティクス

[アナリティクス] タブは、未解決のリスク、未解決の問題、遅延したマイルストーンなどのプロジェクトの要素に関するアナリティクスを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細

[詳細] タブではプロジェクトフォームが開き、プロジェクトの重要な要素を定義できます。

計画

[計画] タブでは、計画立案コンソールにプロジェクトが開きます。このタブでは、プロジェクトワークベンチに移動し、ワークベンチでプロジェクトを追跡することもできます。

リソース

[リソース] タブでは、リソースの検索、およびプロジェクトとプロジェクトタスクのリソース計画の作成および管理ができます。このタブは、プロジェクトマネージャーのみが使用できます。


財務管理

[財務] タブには、プロジェクトのコストコンポーネントのブレークダウン (計画コスト、推定リターン、割り当てられた予算、コスト計画、および利益計画) が表示されます。このタブからベースラインを作成してベースラインを比較し、プロジェクトまたはデマンドの実行中に発生した変更を追跡できます。

ステータスレポート

[ステータスレポート] タブには、プロジェクトステータスレポートが表示されます。

プロジェクトワークスペースの例

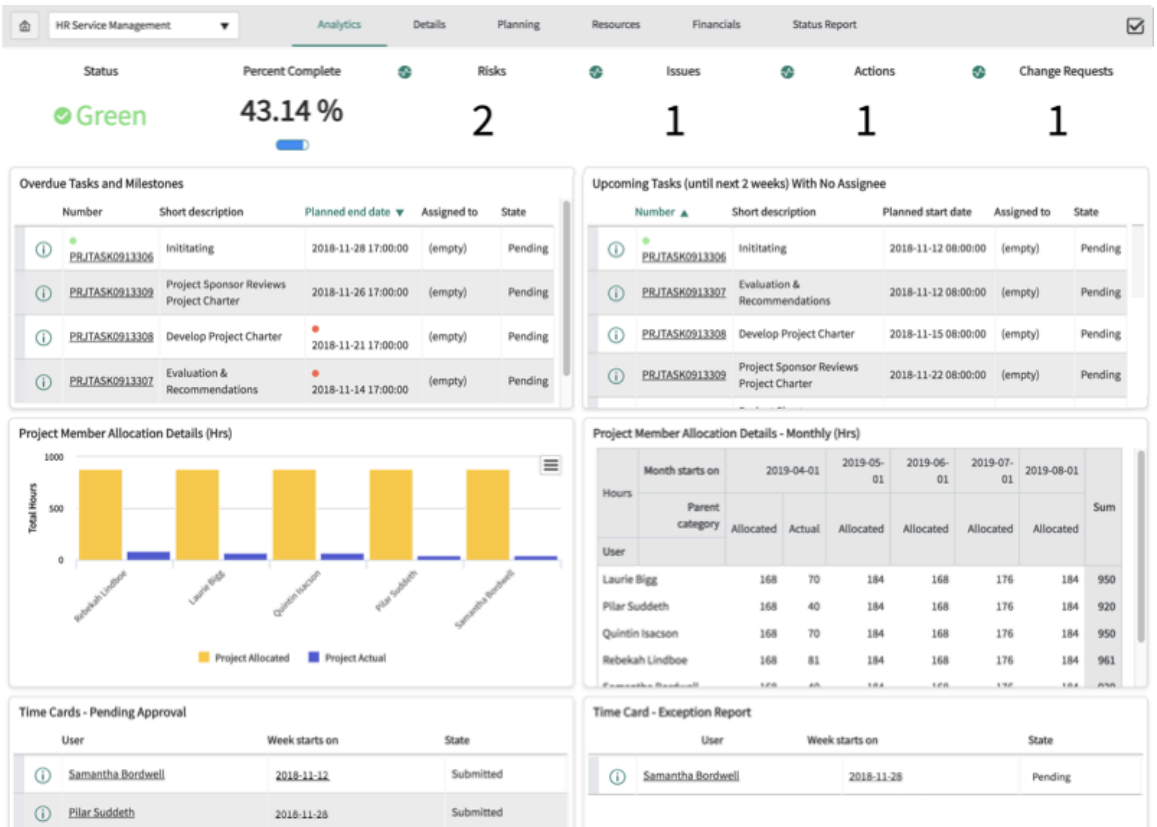

クラシックプロジェクトワークスペースへのアクセス

プロジェクトワークスペースを開くと、すべてのプロジェクトが 1 つの場所に表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:

クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

始める前に
必要なロール:it_project_user または it_project_manager

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース をクリックして、[自分のプロジェクトスペース] ページを開きます。
2. [自分のプロジェクトスペース] ページで、必要なプロジェクトをカードとして表示するためのフィルター基準を追加します。

   注:
   カードに表示される情報を設定できます。

3. プロジェクトをクリックしてプロジェクトワークスペースで開きます。
4. プロジェクトワークスペースで必要なタブをクリックして作業します。

クラシックプロジェクトワークスペースでプロジェクトカードに表示されるパラメーターの設定

クラシックプロジェクトワークスペースの [自分のプロジェクトスペース] ページのプロジェクトカードに表示されるパラメーターを設定します。カードにプロジェクトのサマリーが表示されるため、プロジェクトマネージャーはカードを確認することでプロジェクトのステータスと健全性をすばやく評価できます。

重要:

クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

始める前に
必要なロール：it_pps_admin

このタスクについて
プロジェクトワークスペースの概要ページ ([自分のプロジェクトスペース]) には、フィルター基準に基づいてプロジェクトがカードとして表示されます。カードの上部にはカラーバンドがあります。バンドの色は、それぞれのプロジェクトレコードの [ステータス] フィールドに基づいています。各カードにはさらに、プロジェクトに関する次の情報が 3 行で表示されます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 行 1 には、プロジェクト名、ステータス、プロジェクトマネージャー名、および重要なプロジェクトの日付が表示されます。表示されるプロジェクトの日付は、プロジェクトの現在のステータスに基づいています。
  - プロジェクトのステータスが [処理待ち] または [オープン] の場合、開始予定日と終了予定日が表示されます。
  - プロジェクトのステータスが [対応中] の場合、実開始日と終了予定日が表示されます。
  - プロジェクトのステータスが [クローズ済み] の場合、実開始日と実終了日が表示されます。
- 行 2 には、プロジェクト [pm_project] テーブルの [ステータス]、[完了率 (%)]、および [フェーズ] 列が表示されます。この行に表示される列の数は 3 に固定されていますが、表示する列は [pm_home_page_config] テーブルで設定できます。
- 行 3 には、プロジェクトの現在のステータスに基づいて、次のプロジェクト情報が表示されます。
  - [更新] 見出しの下にあるプロジェクトの未解決のリスク、未解決の問題、アクション、および期限切れのタスク。
  - [実行されなかった直近のマイルストーン] 見出しの下にある実行されなかった直近のマイルストーンタスクの日付と簡単な説明。

表示されるパラメーターは、[pm_home_page_card] テーブルのレコードから取得されます。[pm_home_page_card] テーブルで各プロジェクトのステータスに、表示するパラメーターがアサインされます。

プロジェクトカードの例

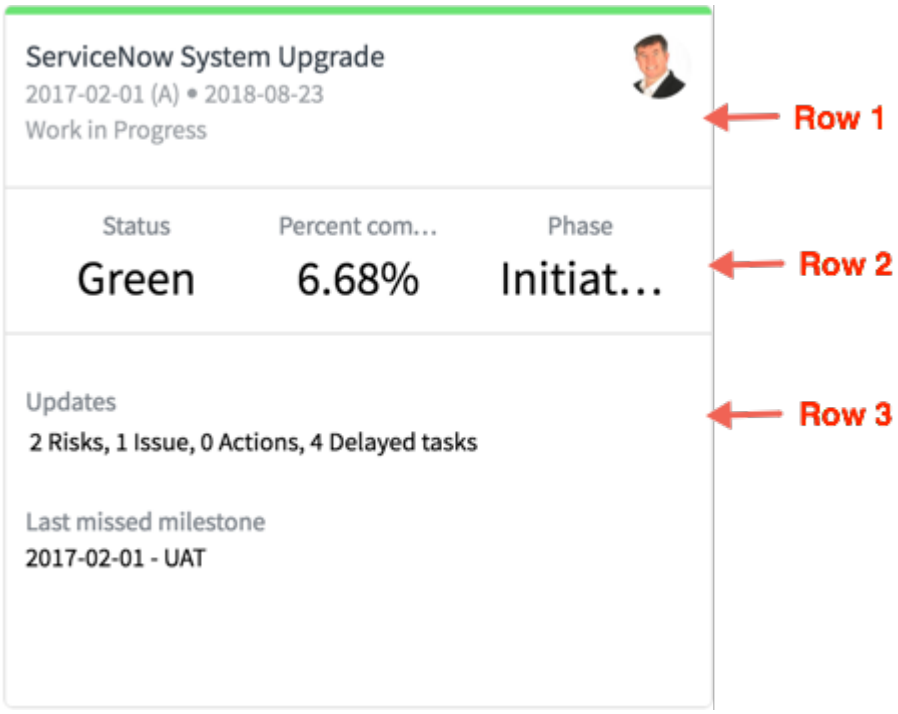

カードの行 2 および行 3 に表示される情報を設定できます。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクトワークスペース.
2. カード構成を変更するテーブルを選択します。たとえば、プロジェクト [pm_project]を選択します。
3. PM ホームページ構成 [pm_home_page_config] テーブルで、カードの行 2 の表示列を設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

a. [列 **-1**]、[列 **-2**]、および [列 **-3**] フィールドに表示する列を選択します。

b. [更新] をクリックします。
選択した列がプロジェクトカードの行 2 に表示されます。

4. PM ホームページカード [pm_home_page_card] テーブルで、カードの行 3 のパラメーターを設定します。
[pm_home_page_card] テーブルで各プロジェクトのステータスに、プロジェクトカードの 3 行目に表示する必要があるパラメーターがアサインされます。

a. **[PM** ホームページカード] 関連リストで、[新規] をクリックします。


b. フォームのフィールドに入力します。

PM ホームページカードフォーム

フィールド	説明
順番	カードの行 3 でパラメーターが表示される位置。
状況	パラメーターを追加する必要があるプロジェクトのステータス。
値	行 3 で選択されたステータスに対して表示されるセクション ([更新] や [実行されなかった直近のマイルストーン] など)。
コンテンツ	選択したステータスの選択したセクションに表示するパラメーターを追加する JSON フィールド。

次のスクリーンショットは、[オープン] ステータスの [更新] 見出しの下にリスク、問題、アクション、および期限切れのタスクのパラメーターを追加する JSON の例を示しています。

行 **3** 構成の **JSON** の例

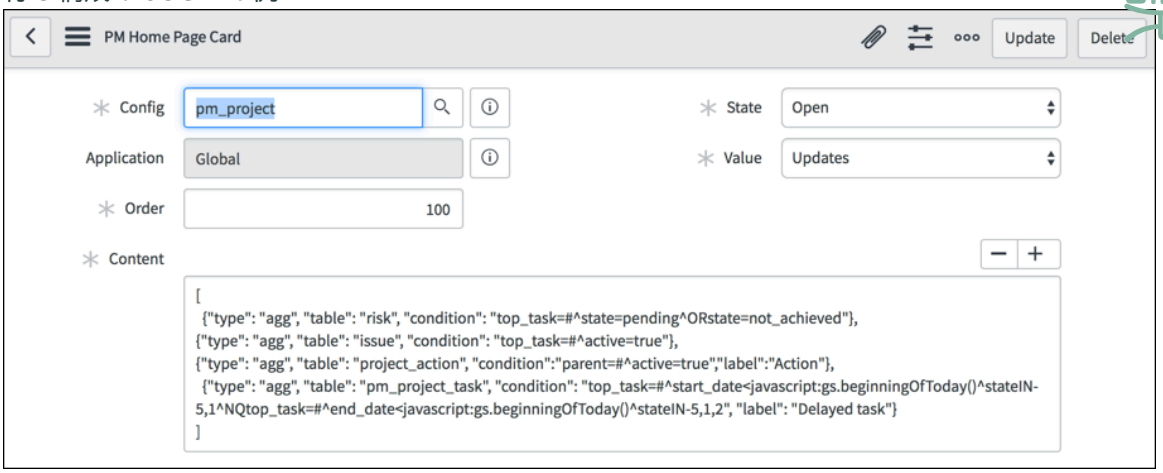

c. [送信] をクリックします。

> **注:**
> 同じ手順を使用して、ステータスにアサインされた表示パラメーターを変更します。

選択したステータスのパラメーターが追加または更新されます。パラメーターが追加されたステータスの、プロジェクトカードの行 3 の選択されたセクションに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラシックプロジェクトワークスペースでのプロジェクト分析の表示

クラシックプロジェクトワークスペースの [分析] タブでのプロジェクトサマリーの表示

> **重要:**
>
> クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

始める前に

必要なロール：it_project_user

このタスクについて

[アナリティクス] タブは、未解決のリスク、実際のコスト、遅延したマイルストーンなど、プロジェクトのさまざまな要素の進捗状況を追跡するための事前設定されたウィジェットとレポートを表示する PA ダッシュボードです。レポートの情報は、プロジェクトフォームのフィールドからロールアップされます。さまざまなプロジェクトタイプの各種ウィジェットとレポートの詳細については、「プロジェクト分析ウィジェットとレポート」を参照してください。

手順

1. プロジェクトワークスペースで必要なプロジェクトを開きます。
2. [アナリティクス] タブをクリックして、そのコンテンツを表示します。
3. 表示されたレポートを確認し、必要に応じて必要なアクションを実行します。

プロジェクト分析ウィジェットとレポート

ウィジェットとレポートは、アジャイル、ウォーターフォール、およびハイブリッドプロジェクトのプロジェクトワークスペースの [アナリティクス] タブで、プロジェクトサマリーの情報を提供します。

> **重要:**
>
> クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

プロジェクトウィジェットとレポート

ウィジェットとレポートは、アジャイル、ウォーターフォール、およびハイブリッドプロジェクトの進捗状況を表示および追跡するための情報を提供します。

> **注:**
> アジャイルおよびハイブリッドプロジェクトのウィジェットとレポートを表示するには、 アジャイル開発 2.0 プラグインがインストールされている必要があります。

システムアドミニストレーターは、ダッシュボードのウィジェットとレポートを設定して、[アナリティクス] タブにプロジェクト情報を表示できます。以下のダッシュボードを使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトの実行タイプ	表示されるダッシュボード	説明
ハイブリッド	プロジェクトサマリー - ハイブリッド	ハイブリッドプロジェクトのレポートとウィジェットが含まれます。
アジャイル (Agile)	プロジェクトサマリー - スクラム	アジャイルプロジェクトのレポートとウィジェットが含まれます。
ウォーターフォール	プロジェクトサマリー - ウォーターフォール **注:** このダッシュボードは、以前はプロジェクトマネージャーサマリーダッシュボードと呼ばれていました。	ウォーターフォールプロジェクトのレポートとウィジェットが含まれます。

プロジェクトの実行タイプによって、[アナリティクス] タブに表示されるダッシュボードが決まります。

[アナリティクス] タブにカスタムダッシュボードを埋め込むこともできます。システムアドミンは、 *PMViewDataUtils* スクリプトインクルードを変更し、 *getDashboardUrl* メソッドの *dashboards_tabs* の変数値を設定できます。その結果、プロジェクトアナリティクスでカスタムダッシュボードを表示できます。例を次に示します。

```
var dashboards_tabs =

    {
        waterfall: {
                dashboard_sysId: '5d4959dd878003008b9b3a0548cb0bd0',
                tab_sysId: '1d99d5dd878003008b9b3a0548cb0bbd'
                  },
        hybrid: {
                dashboard_sysId: '96dc46c78700330047d84c2c59cb0bf1',
                tab_sysId: '520d4ac78700330047d84c2c59cb0bab'
                  },
        agile: {
                dashboard_sysId: 'f3dd4ec78700330047d84c2c59cb0b93&tab',
                tab_sysId: '52fd8ec78700330047d84c2c59cb0bae'
                  },
        any_other_executionType: {
                dashboard_sysId: 'custom_dashboard_sys_id',
                tab_sysId: 'custom_dashboard_tab_sys_id'
                  },
      };
```

すべてのプロジェクトタイプについて、次のウィジェットとレポートが [アナリティクス] タブに表示され、プロジェクトマネージャーがプロジェクトを分析する際に役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイルプロジェクトのウィジェットとレポート

名前	説明
受け入れ条件のないストーリー	受け入れ条件情報のないプロジェクトのストーリーの数。
ストーリーの欠落ポイント	[ポイント] フィールドが空白のプロジェクトのストーリーの数。
ストーリー受け入れの期限切れ	スプリントの終了後に完了またはキャンセルステータスになっていないプロジェクト内のストーリーの数。
チームに関するスプリントステータス	リリース全体でさまざまなスクラムチームのスプリント関連のステータスを追跡します。チーム名をクリックして、スプリントの詳細を表示します。
ステータス別のストーリー	ドラフト、準備完了、WIP など、開発のさまざまなステージにあるストーリーの数を示すドーナツグラフ。適切な状況をクリックして、ストーリーの詳細を表示します。
ポイント別の進捗状況	ポイントに基づいてプロジェクトの進捗状況を追跡します。エピック、アサイン先グループ、およびステータスの任意の組み合わせに基づいて、ストーリーのグループ化と積み重ねを行うことができます。
ストーリー別の進捗状況	ストーリーの数に基づいてプロジェクトの進捗状況を追跡します。エピック、アサイン先グループ、およびステータスに基づいて、ストーリーのグループ化と積み重ねを行うことができます。

ウォーターフォールおよびハイブリッドプロジェクトのウィジェットとレポート

名前	説明
問題	プロジェクトに含まれる [処理待ち]、[オープン]、および [対応中] 状況の問題の数。
アクション	プロジェクトの [処理待ち]、[オープン]、および [対応中] 状況のアクションアイテムの数。
変更要求	プロジェクトの [処理待ち]、[オープン]、および [対応中] 状況の変更要求の数。
ステータス別のストーリー	[ドラフト]、[準備完了]、[WIP] など、開発のさまざまなステージにあるストーリーの数を示す円グラフ 。適切な状況をクリックして、ストーリーの詳細を表示します。 **注:** このウィジェットは、ハイブリッドプロジェクトにのみ適用されます。
ステータス別のタスク	[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ] など、開発のさまざまなステージにあ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウォーターフォールおよびハイブリッドプロジェクトのウィジェットとレポート (続く)

名前	説明
	るプロジェクトタスクの数を示すドーナツグラフ。適切な状況をクリックして、タスクの詳細を表示します。
プロジェクトメンバーに対する割り当ての詳細 (時間)	プロジェクトにアサインされたリソースの割り当てられた時間と実績時間を示す積み上げ棒グラフ。
プロジェクトメンバーに対する割り当ての詳細 - 月次 (時間)	プロジェクトにアサインされたリソースの割り当てられた時間と実績時間を示すピボットグラフ。
タスクのアサイン	アサインされたユーザーまたはグループに基づいて、リリース全体でさまざまなプロジェクトタスクのステータスを追跡します。ユーザー名またはグループ名をクリックして、アサインされたタスクの詳細を表示します。
ステータス別のリソース計画	現在のステータスに従ってグループ化されたリソース計画の数を示すドーナツグラフ。
期限切れのタスクとマイルストーン	プロジェクトタスク [pm_project_task] テーブルの次のいずれかの条件を満たすタスクである、期限切れのプロジェクトタスクとマイルストーンのリスト。 • [開始予定日] の値が本日の日付より前で、[状況] の値が [オープン] または [処理待ち] である。 • [シャドウ] フィールドの値が false に設定されている。
(今後 2 週間に) 予定されている、アサイニーのないタスク	現在の日付から 14 日後に開始する予定の未アサインの [オープン] または [処理待ち] のプロジェクトタスクのリスト。

一般的なウィジェット

名前	説明
フェーズ	[開始中] や [計画中] など、プロジェクトの現在のステータス。
ステータス	プロジェクトのステータスを示すカラーインジケーター。
完了率 (%)	完了済みのプロジェクトの割合。
経過時間	プロジェクトの作業中に実開始日から終了予定日までに経過した時間。 プロジェクトが [オープン] または [処理待ち] ステータスの場合、経過時間は開始予定日と現在の日付に基づいて計算されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

一般的なウィジェット (続く)

名前	説明
リスク	プロジェクト関連の [処理待ち]、[達成]、および [未達成] 状況のリスクの数。
コスト傾向分析	月次での計画コストと実際のコストの比較を示す線グラフです。
利益の傾向分析	月次の計画財務利益の傾向を示す線グラフです。
金銭以外の利益計画	アクティブなプロジェクトの金銭以外の利益計画とそれに関連する利益計画の数のブレークダウン。
金銭以外の計画利益と実績利益	会計期間別にグループ化されたアクティブなプロジェクトの財務以外の合計計画利益と実際利益の比較。
確認済みの時間と配分時間と実績時間	プロジェクトの合計確認時間、割り当て済み時間、および実績時間の比較
タイムカード - 承認待ち (Pending Approval)	選択したプロジェクトの送信済みだがまだ承認されていないタイムカード。
タイムカード - 例外レポート	選択したプロジェクトのタイムカードを送信していないユーザーと、選択したプロジェクトに対してまだ承認されていないタイムカードのリスト。例外レポートは、進行中のタスクにアサインされているユーザー、またはプロジェクト/タスクにハード割り当てされているユーザーに対して生成されます。

クラシックプロジェクトワークスペースでのプロジェクトの定義

期間、コスト概算、およびクラシックプロジェクトワークスペースの組織に対する正味価値など、選択したプロジェクトの重要な要素を定義します。

重要:

クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

始める前に

必要なロール：it_project_user

このタスクについて

プロジェクトワークスペースの [詳細] タブに、選択したプロジェクトのプロジェクトフォームが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. プロジェクトワークスペースで必要なプロジェクトを開きます。
2. [詳細] タブをクリックして、プロジェクトフォームを表示します。
3. 必要に応じてプロジェクトレコードを編集します。

クラシックプロジェクトワークスペースで計画立案コンソールを使用したプロジェクトの計画立案

クラシックプロジェクトワークスペースで計画立案コンソールを使用して、プロジェクトスケジュールの作成、リソースのアサイン、ベースラインの作成、クリティカルパスの表示などのプロジェクト計画立案を実行します。

重要:

クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

始める前に
必要なロール:it_project_user または it_project_manager

このタスクについて
プロジェクトワークスペースの [計画] タブでは、計画立案コンソールに選択したプロジェクトが表示されます。

手順

1. プロジェクトワークスペースで必要なプロジェクトを開きます。
2. [計画] タブをクリックすると、計画立案コンソールにプロジェクトが表示されます。

   注:
   プロジェクトワークベンチが [計画] タブにすでに開いている場合は、バナーの [プロジェクトワークベンチ] 選択矢印をクリックして、[計画立案コンソール] を選択します。

3. WBS 階層やガントチャートなどの計画立案コンソールの機能を使用して、プロジェクトを計画します。
   リストおよびフォームで実行できる計画立案コンソールのタスク (プロジェクトタスクの作成など) を複数実行することもできます。

クラシックプロジェクトワークスペースでプロジェクトワークベンチを使用したプロジェクトの追跡

プロジェクトマネージャーは、プロジェクトワークベンチでプロジェクトの追跡および管理を行います。

重要:

クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
プロジェクトワークスペースの [計画] タブを使用して、プロジェクトワークベンチに選択したプロジェクトを表示できます。

手順

1. プロジェクトワークスペースで必要なプロジェクトを開きます。
2. [計画] タブをクリックします。
3. プロジェクトワークベンチでプロジェクトを表示するには、バナーの [計画立案コンソール] 選択矢印をクリックして、[プロジェクトワークベンチ] を選択します。
4. プロジェクトワークベンチを使用して、プロジェクトのあらゆる要素を追跡および管理します。

クラシックプロジェクトワークスペースでのプロジェクトのリソース計画の作成および管理

リソース要求者は、リソースの可用性の確認、およびプロジェクトとプロジェクトタスクのリソース計画の作成および管理をプロジェクトワークスペースで行います。

重要:

クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
プロジェクトワークスペースの [リソース] タブでは、選択したプロジェクトのリソース計画が編集可能なグリッドビューに表示されます。このタブは、次のセクションで構成されています。

リソースグリッド

ページ上部のセクションで、次のことができます。

- プロジェクトまたはそのタスクのリソース計画を作成できます。グループ、ロール、またはユーザーレベルでリソース計画を作成できます。
- オープンプロジェクトとそのタスクのすべてのリソース計画を 1 つの場所で表示および管理できます。
- 各リソース計画のリソース割り当てをグリッドビューで表示できます。

タブのグリッドビューを使用して、次のことを行います。

- フォームでレコードを開くことなく、計画時間と割り当て済み時間をインラインで編集します。
- 要件に応じて列をグループ化、非表示、または表示します。
- キャンセルまたは完了したリソース計画を非表示にします。
- リソース計画を要求、確認、または割り当てます。
- リソース計画とその割り当てを、グループ、ロール、またはユーザーリソース計画の将来の日付に移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- グループ、ロール、またはユーザーのリソース計画のユーザーを別のユーザーに置き換えて、プロジェクト中にユーザーが休暇を取るなどの状況に対応します。
- 割り当てられたリソース計画の延長を要求します。
- グループまたはロールのリソース計画のユーザー割り当てを将来の日付にシフトします。
- リソース計画の横にある特定のメンバーで作成されたリソース計画アイコン ( ) を確認して、特定のメンバー設定で作成されたリソース計画を特定できます。

リソースファインダー

このセクションはページの下部にあります。このセクションはデフォルトで非表示になっています。ページの右上にあるリソースファインダーアイコン ( ) をクリックして表示できます。これにより、次のことが可能になります。

- リソースを検索し、その可用性を確認します。グループ、ロール、またはユーザーでリソースを検索できます。
- 検索されたリソースのリソース計画をプロジェクトとそのタスクに追加します。
- リソースを検索し、その可用性と利用状況を確認します。グループ、ロール、またはユーザーでリソースを検索できます。
- 現在のリソースのリソース計画を追加または確認します。
- 詳細ビューを使用して [実績] 列を構成します。
- リソースファインダーで、リソースを可用性、割り当て超過、またはすべてのリソースでフィルターします。
- リソースの横にあるリソース計画で指定されたメンバーアイコン ( ) を確認して、リソース計画で特定のメンバーとして作成されたリソースを特定できます。
- キャパシティまたは可用性の列をクリックして、[リソース可用性] グリッドと [リソースキャパシティ] グリッドを表示します。

  [リソース可用性] グリッドで [ユーザー] 列と [割り当て済み時間] 列をそれぞれ選択すると、ユーザーとリソースの割り当ての詳細をポップアップウィンドウに表示できます。

リソースグリッドセクションでリソース計画を選択すると、そのリソースの可用性の詳細が、リソースファインダーセクションに表示されます。たとえば、グループリソース計画を選択した場合、グループとそのメンバーの可用性の詳細が [ファインダー] セクションに表示されます。選択を変更すると、現在の選択に基づいてファインダーが自動的に更新されます。

手順

1. プロジェクトワークスペースで必要なプロジェクトを開きます。
2. [リソース] タブをクリックします。
   - リソース計画を作成するには、[新規] をクリックします。
   - 割り当てを週次または月次形式でグリッドに表示するには、[週] または [月] ボタンをクリックします。選択したオプションにより、リソースグリッドセクションとリソースファインダーセクションの両方のグリッドビューが変更されます。

     グリッド内の期間は、プロジェクトまたはリソース計画の最も早い開始日と、プロジェクトまたはリソース計画の最後の終了日に基づいて表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 割り当てを時間、FTE、または人日形式でグリッドに表示するには、リストの [時間]、**[FTE]**、または [人日] オプションをクリックします。選択したオプションにより、リソースグリッドセクションとリソースファインダーセクションの両方のグリッドビューが変更されます。
- リソースを検索してそれらのリソース計画を作成するには、リソースファインダーアイコン () をクリックします。
- グリッドビューの特定の列を表示または非表示にするには、構成アイコン () をクリックします。アイテム列の非表示と表示を切り替えても、テーブルは更新されません。グループ化された列は非表示にできません。
- リソース割り当てをユーザーレベルで表示するには、グリッドでリソース計画を展開します。ユーザーレベルの割り当ては、グループおよびロールのリソース計画についてのみリストされます。
- 計画済みの時間と割り当て済みの時間をグリッドでインライン編集するには、行をダブルクリックします。[要求済み]、[確認済み]、および [割り当て済み] ステータスのリソース計画について、将来の期間の計画済み時間を更新できます。
- フォームでリソース計画の詳細を表示および更新するには、リソース計画の行の先頭にある情報アイコン () をクリックします。
- [アクション] 列でリソース計画を要求するには、アクションアイコン ( ) をクリックし、[要求] を選択します。
- [アクション] 列でリソース計画を削除するには、アクションアイコン ( ) をクリックし、[削除] を選択します。
- [アクション] 列で、プロジェクトに作成されたすべてのリソース計画を要求するには、プロジェクト行でアクションアイコン ( ) をクリックし、[すべてを要求] を選択します。このアイコンは、リストされたプロジェクトのリソース計画の少なくとも 1 つが [計画] または [却下] ステータスである場合に有効になります。

クラシックプロジェクトワークスペースでのプロジェクトに関する予測の表示と財務計画の管理

プロジェクトワークスペースの [財務] タブを使用して、プロジェクトのコストと利益を取得します。

重要:

クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

[財務] タブには、プロジェクトのコスト要素の内訳が表示されます。合計計画コスト、予算コスト、実績コスト、および予定リターンとそれらのブレークダウンは読み取り専用カードの形式で表示され、コスト計画、利益計画、およびそれらのブレークダウンは編集可能なグリッドビューで提供されます。グリッドビューを使用すると、次のことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 計画レベルの列をグループ化します。計画レベルとブレークダウンの両方の列を設定、ソート、展開、折りたたみ、およびフリーズします。
- フォームで計画を開かずに、コスト計画または利益計画のブレークダウン値をインライン編集します。インライン編集は、 月次ビューでのみ使用できます。
- プロジェクトのコスト計画と利益計画を作成します。

手順

1. プロジェクトワークスペースで必要なプロジェクトを開きます。
2. [財務] タブをクリックします。
3. コスト計画を作成するには：
   a. リストから [コスト計画] を選択します。
   b. [新規] をクリックします。
4. 金銭的利益計画を作成するには：
   a. リストから [利益計画] を選択します。
   b. [新規] をクリックします。
5. 選択した会計年度のプロジェクトコストと財務ブレークダウンサマリーを表示するには、リストから [概要] を選択します。
   [概要] タブには、[予定コスト]、[実際のコスト]、[差異 (計画コストと実績コスト)]、[完了時の推定 (EAC)]、および [残作業コスト見積り (ETC)] の財務概要が表示されます。

   注:
   プロジェクトにコスト計画を備えたサブプロジェクトがある場合、財務概要ブレークダウンビューはデフォルトで有効になりません。このビューを有効にするには、it_pps_admin のロールを有するユーザーが **com.snc.project.rollup.cost** プロパティ値を **true** に設定する必要があります。

   ○ [概要] タブで財務概要ビューを管理できます。
      a. 移動先 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード.
      b. **PmOverviewTabConsts** スクリプトを検索して選択します。
      c. スクリプトのコードを再配置または削除して、[更新] をクリックします。

      ヘッダーをドラッグして必要な位置にドロップすると、[概要] タブの財務概要列を並べ替えることができます。この配置は、現在のセッションが終了または期限切れになるとリセットされます。

   ○ アドミンは、次に移動して、[プロジェクト関連プロパティ] ページで会計年度の財務概要データを表示するレベルを構成できます。 プロジェクト管理 > 設定 > 設定 - プロジェクト. 値が指定されていない場合、デフォルトでは四半期別のブレークダウンが表示されます。
6. オプション: フォームで追加フィールドを確認するか、計画の詳細を表示するか、比較データを再編成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ベースラインを作成するか、利用可能なベースラインを比較するには、ベースライン情報アイコン ( ) をクリックして、[新しいベースラインを作成] または [ベースラインを比較] オプションをそれぞれ選択します。

  財務ベースラインの比較画面では、先頭の 2 行にすべての値が機能通貨またはプロジェクト通貨で表示されます。プロジェクト通貨で値を表示するには、構成アイコン ( ) をクリックし、[プロジェクト通貨でウィジェットを表示] ビューに切り替えます。

  [財務ベースラインの詳細] ペインには、選択された機能通貨とプロジェクト通貨が表示されます。

  財務ベースライングリッドには、機能コスト、プロジェクト通貨でのコスト、実績、およびプロジェクト通貨での実績が表示されます。プロジェクト通貨はグリッドレベルで表示できます。このビューは、異なるプロジェクト通貨のサブプロジェクトのコスト計画がある場合に役立ちます。

- コスト計画または利益計画の詳細をフォームに表示するには、グリッドの [名前] 列にある情報
- コスト計画または利益計画の詳細を年次、四半期ごと、または月次の形式で表示するには、それぞれ [年]、[四半期]、または [月] ビューをクリックします。
- [財務の概要] セクションでウィジェットの表示を切り替えるには、ウィジェットアイコン ( ) をクリックし、[ウィジェットを表示] オプションを選択します。

  個々のウィジェット名を選択してウィジェットを表示します。選択をクリアすると、ウィジェットが非表示になります。

  選択したフィールドの設定が保存され、[財務] タブを再度開くと利用できるようになります。

- グリッドの列を表示または非表示にするには、構成アイコン ( ) をクリックしてフィールド名を選択します。

  グループ化された列を非表示にすることはできません。デフォルトのグリッド列レイアウトにリセットするには、[デフォルト値にリセット] オプションを選択します。

- プロジェクトコストをプロジェクト通貨で表示するには、構成アイコン ( ) をクリックし、プロジェクト通貨での金額を表示する 5 つのウィジェットを選択します。ウィジェットは、[プロジェクト通貨での合計計画コスト]、[プロジェクト通貨での予算コスト]、[プロジェクト通貨での実績コスト]、[プロジェクト通貨での予定リターン (Planned Return in Project Currency)]、および [プロジェクト通貨での利益] です。

  通貨インジケーターでは、機能通貨とプロジェクト通貨の両方を表示できます。

  [コスト計画] および [利益計画] タブの [財務の概要] グリッドビューでは、[プロジェクト通貨でのコスト]、[プロジェクト通貨]、[プロジェクト通貨での合計実績コスト] など、プロジェクト通貨に関連するすべてのアイテムが列見出しとして構成されます。

  デフォルトでは、機能通貨列のみを表示できます。プロジェクト通貨列を表示するには、構成アイコン ( ) をクリックして、アイテム列内のプロジェクト通貨列のチェックボックスをオンにします。

  異なるプロジェクト通貨のサブプロジェクトのコスト計画がある場合、[プロジェクト通貨でのコスト] フィールドの集計金額は空白になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト財務メトリクスのウィジェットの設定

[プロジェクトワークスペース] ページの [財務] タブでプロジェクトの財務メトリクスを表示および追跡するウィジェットを設定します。

重要:

クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

始める前に
必要なロール：pps_admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > ウィジェット.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

ウィジェットフォーム

フィールド	説明
名前	ウィジェットの一意の名前。
スクリプト化	ウィジェットの値がコードスクリプトから取得されたことを示すオプション。 デフォルトでは、このオプションは選択され、読み取り専用です。
ラベルを表示	ラベルまたは色インジケーターを表示するためのオプション。 このチェックボックスをオフにすると、[色] フィールドが表示され、色を設定できます。
有効	ウィジェットのステータスを示すためのオプション。 プロジェクトワークスペースの [財務] タブには、アクティブなウィジェットのみを表示できます。
親ウィジェット	現在のウィジェットの親であるウィジェット。 現在のウィジェットが、選択したウィジェットの [子ウィジェット] 関連リストに表示されます。 最大 3 個の子ウィジェットを親ウィジェットに追加できます。
フォーマッターが必要	ウィジェットに通貨フォーマッターが必要かどうかを指定するためのオプション。
スクリプト	ウィジェットに表示される要求されたメトリクス値を返すコードスクリプト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明

	スクリプトでは、コンテキストオブジェクトとフィルターオブジェクトを使用します。コンテキストオブジェクトには、すべてのプロジェクト財務フィールド (capex_costs、opex_costs、budget_cost など) が含まれています。
	
	次のサンプルスクリプトは、ウィジェットに表示するプロジェクトの [完了時の推定 (EAC)] メトリクス値を返します。
	`var context = JSON.parse(context);`
	`var filter = context.filters;`
	
	`var now_GR = new GlideRecord('pm_project');`
	`gr.addEncodedQuery(filter['pm_project']);`
	`gr.query();`
	`if(gr.next())`
	`gr.getValue('forecast_cost');`
	`Collapse`

簡単な説明	ウィジェットの説明。

次のタスク
ウィジェットをプロジェクトテーブルに関連付けます。

プロジェクトテーブルへのウィジェットの関連付け

ウィジェットを設定したら、それをプロジェクトテーブルに関連付けて、プロジェクトの財務データを表示します。

重要:

クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

始める前に
ウィジェットをプロジェクト [pm_project] テーブルに関連付ける前に 、ウィジェットを設定する必要があります 。

必要なロール：pps_admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > ウィジェット.
2. ウィジェットを開いて、プロジェクトテーブルに関連付けます。
3. [ウィジェットの関連性] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウィジェットの関連性フォーム

フィールド	説明
関連性ID	ウィジェットに関連付けるレコード。 関連するレコードにアクセスするには、 [テーブル名] リストでテーブル [sys_db_objects] テーブルを選択し、 [ドキュメント] リストでプロジェクト [pm_project] テーブルを選択する必要があります。
関連付けテーブル	ウィジェットに関連付けるテーブル。 リストからテーブル [sys_db_objects] を選択する必要があります。
ウィジェット	ウィジェットの一意の名前。
順番	プロジェクトワークスペースの [財務] タブの他のウィジェットに関連するウィジェットの位置。 ウィジェットは番号順に表示され、最も小さい番号が最初に表示されます。
カードに表示	[財務] タブにウィジェットを表示するオプション。
デフォルトで含める	[財務] タブにデフォルトでウィジェットを表示するオプション。

クラシックプロジェクトワークスペースでのプロジェクトの資金の要求

プロジェクトアクティビティに取り組み、ビジネスゴールを達成するためのプロジェクト投資の資金を要求します。

重要:

クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

始める前に

次の条件が満たされている場合は、プロジェクトの資金を要求できます。

- 投資枠管理 (com.snc.investment_funding) プラグインが有効になっている。
- プロジェクトの資金調達エンティティが利用可能で、アクティブになっている。

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

プロジェクトにコスト計画を追加した場合は、各期間の列ヘッダーに表示される合計計画コストを参照して、要求する金額を決定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース.
2. 資金をレビューまたは管理する対象のプロジェクトをクリックします。
3. プロジェクトワークスペースで、[財務] タブをクリックします。
4. [資金] タブをクリックします。
   以前にプロジェクトのために資金調達ソースの資金を要求したことがある場合、[資金] リストには資金調達ソースが表示されます。
5. [新しいソースを追加] リンクをクリックして、資金調達ソースを選択します。
6. [ソースを選択] ペインで、リストから 1 つ以上のソース投資を選択し、[選択項目を追加] をクリックします。
   指定した資金源が [予算を要求] グリッドに追加されます。
7. [予算を要求] グリッドで、資金を要求する資金源の [新規/変更要求] の [投資] 列および [経費] 列で金額を指定します。
   更新されたすべての資金源のステータスが [ドラフト] または [計画] に変更され、セルが強調表示されます。
8. [要求] をクリックします。
9. [要求を確認] ダイアログボックスで、要求を確認し、必要に応じてコメントを追加します。
10. [要求] をクリックします。

クラシックプロジェクトワークスペースでのプロジェクトの実費の入力

プロジェクトの実際の支出を入力して、資金の使用状況を追跡します。

重要:

クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

プロジェクトに割り当てられた資金を使ってプロジェクトアクティビティを完了する場合、その金額を実績として記録し、プロジェクトの財務状況をレビューして追跡します。

注:
経費ラインから計算されたプロジェクトレコードの実績は、資金の実績に自動的に反映されません。実際の支出には人件費やその他の経費が含まれている可能性があるため、[資金] リストの対応する資金調達ソースに対して手動で入力する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース.
2. 資金をレビューまたは管理する対象のプロジェクトをクリックします。
3. プロジェクトワークスペースで、[財務] タブをクリックします。
4. [資金] タブをクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [資金] リストで、対応する資金調達ソースの [実績投資] 列と [実績経費] 列に、プロジェクトで実際に費やした金額を入力します。

   注:

   リストに [実績投資] 列と [実績経費] 列が表示されない場合は、構成アイコン ( ) から選択します。

タスクの結果
入力した金額は、プロジェクトの実績として更新されます。

クラシックプロジェクトワークスペースでのプロジェクトステータスレポートの表示

プロジェクトマネージャーとして、クラシックプロジェクトワークスペースで [ステータスレポート] タブを使用して、プロジェクトのプロジェクトステータスレポートを表示します。

重要:

クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
[ステータスレポート] タブから、次のことを実行できます。

- プロジェクトで利用可能なステータスレポートを表示および印刷します。
- ステータスレポートを作成します。
- プロジェクトの既存のステータスレポートからフィールドをコピーすることで、ステータスレポートの作成時の時間を節約できます。

手順

1. プロジェクトワークスペースで必要なプロジェクトを開きます。
2. [ステータスレポート] タブをクリックします。
   プロジェクトに対して作成された最新のステータスレポートが表示されます。
3. ステータスレポートを作成するには、右上の [新規作成] ボタンをクリックします。
4. 既存のステータスレポートをコピーするには：

   a. 選択リストから、コピーするステータスレポートを選択します。

   b. [新規作成] の横にある選択リストから [コピー] をクリックします。
   このオプションでは、すべてのフィールドを含む選択されたステータスレポートが新しいレポートにコピーされます。

   c. [保存] をクリックします。

5. 選択リストからステータスレポートを選択し、プロジェクトで利用可能なステータスレポートの内容を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レポートは、作成日別に選択リストにリストされます。

6. ステータスレポートを印刷するには、右上の印刷アイコン ( ) をクリックします。

投資ポータル

プロジェクトとデマンドを予算内で予定どおりに完了するのは難題です。投資ポータルでは、直観的なユーザーインターフェイスでプロジェクトとデマンドの財務、期限、およびその他の重要なメトリクスを包括的に把握できるため、プロジェクトとデマンドの管理をより効率的に行うことができます。

投資 (プロジェクトとデマンドの両方) を追跡および管理し、投資レポートを作成してメールで共有するのは時間がかかり、非効率的です。レポートを生成するには、プロジェクトマネージャーとデマンドマネージャーからプロジェクトとデマンドのステータスを取得し、レポートを生成して、メールで送信する必要があります。

投資ポータルを使用すると、フィルター定義を使用して投資ボードを作成し、それを他のステークホルダーと共有できます。必要に応じてボードを作成、クローン、または変更することで、新しい投資の時間を節約できます。フィルタリングを使用すると、情報を臨機応変に表示して、レポートを作成することが容易になります。

以下に、投資ポータルを使用することで管理とレポート作成をより効率的にする方法の例をいくつか示します。

- アプリケーションストアを起動する場合は、プログラムの全体的な進捗状況を監視し、ボトルネックの原因となっているプロジェクトを明らかにすることができます。
- 新しいビジネスアプリケーションの場合は、今後数週間、数か月、または数年間の投資ロードマップを確認および編集できます。
- 重要な戦略的イニシアチブについては、前年に達成したことを確認し、次の 18 か月の計画を立てることができます。


投資ポータルは、次のセクションに分かれています。

バナーアイコン

投資ポータルのヘッダーにあるバナーアイコンを使用して、投資ボードを編集、コピー、削除、ブックマークし、他のメンバーやグループと共有することができます。詳細については、「主要な投資の追跡」を参照してください。

投資ウィジェット

構成可能な投資ウィジェットを使用して、総コスト、実績コスト、および予算などの重要なメトリクスを表示できます。



主要なタブ

次のタブを使用して、プロジェクトとデマンドの重要な要素を 1 つの場所で追跡できます。

- 概要：プロジェクトとデマンドの概括的なサマリー。グリッドの情報は、プロジェクトおよびデマンドフォームのフィールドに基づいています。
- タイムライン：ガントビューの主要なマイルストーン。ガントビューは、タスクの依存関係や長さを示すラインやバーなどのグラフィカル要素を使用して、プロジェクトの概要を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタブの作業ブレークダウン構成 (WBS) には、マイルストーンと主要なマイルストーンのみが表示されます。

- 財務：年次、月次、四半期ごとの形式で、プロジェクトとデマンドに関連付けられたコスト計画に基づいた、プロジェクトとデマンドのコストの詳細なブレークダウン。

  このタブは、it_project_manager ロールを持つユーザーにのみ表示されます。

注:

投資ポータルのロード時間は、定義されたクエリに一致するデマンドまたはプロジェクトの数と、それらに関連するエンティティ (コスト計画やブレークダウンなど) に直接依存します。通常、ボードのパフォーマンスは約 50 のプロジェクトまたはデマンドと、各プロジェクトに 10 ～ 15 のコスト計画が含まれている状態で最適です。

アプリケーションは、フェッチされるレコードの数を制限しません。したがって、パフォーマンスに影響を与えないように、最適な数のレコードがフェッチされるようにクエリを定義することをお勧めします。

すべての投資ボードを 1 つの場所に表示

[自分の投資ビュー] ページを使用して、すべての重要な投資ボードを 1 つの場所に表示します。

投資ポータルモジュールを開くと、[自分の投資ビュー] ページが表示され、次の操作を実行できます。

- フィルター条件を使用して投資ボードを作成します。
- 投資ボードのウィジェットを表示します。
- 名前または所有者で投資ボードを検索します。
- ポートフォリオやプログラムなど、適用されたフィルターに基づいて異なるカラーバンドでボードを表示します。たとえば、次のスクリーンショットにあるカードの緑色のカラーバンドは、プロジェクトとデマンドがポートフォリオでフィルターされていることを示します。
- 投資ボードをドリルダウンして、そのプロジェクトとデマンドをコスト、スケジュール、およびスコープの観点からレビューします。

タブ

タブを使用すると、投資ボードにすばやくアクセスできます。

- 最近：最近アクセスした投資ボード。
- ブックマーク済み：ブックマークされた投資ボード。
- 自分が作成：所有している投資ボード。
- 自分に共有：自分と共有されている投資ボード。

投資ボード


投資ボードの主な詳細は次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 行 **1**：ボードの名前、所有者、およびタイプ。
- 行 **2**：すぐに使用できるいくつかの投資メトリクス。この行に表示されるメトリクスの数は固定ですが、どのメトリクスを表示するかは設定できます。

投資ボードの例

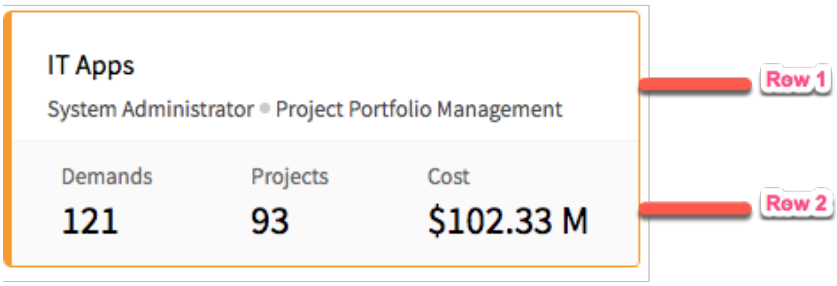

関連情報

投資ポータル

投資ボードの作成

定義したフィルター基準を使用してパーソナライズされた投資ボードを作成し、自分にとって重要なプロジェクトとデマンドを表示します。

始める前に

必要なロール:it_project_manager、it_project_user、または sn_ppm_finance_read

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 投資ポータル.
2. [自分の投資ビュー (My Investment Views)] ページで、[新規] を選択します。
3. 新規作成ウィンドウで、フィールドに入力します。
   詳細については、「投資ボードフォーム」を参照してください。

   注:
   タグをフィルター基準として使用すると、投資で作業するために必要なすべてのタブがフェッチされない場合があります。

4. [作成] を選択してフォームを作成します。

タスクの結果

投資ボードが作成されると、投資ポータルページで開きます。

注:
デフォルトでは、投資ボードには、[デフォルトで含める] チェックボックスがオンになっているウィジェットが含まれています。[ウィジェット構成] を使用して、投資ボードのウィジェットを追加または削除できます。

関連情報

投資ポータル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

主要な投資の追跡

投資ポータルを使用して、投資のコスト、スケジュール、およびスコープを 1 つの場所で追跡および分析します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager または it_project_user

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 投資ポータル.
2. [自分の投資ビュー] ページから、投資レポートを作成し、投資ポータルに移動します。
3. 次のバナーアイコンを使用します。

4. [概要]、[タイムライン]、および [財務] タブで次のアクションを実行します。

関連情報

投資ポータル

ウィジェットとしての投資メトリクスの設定

ビジネス要件に基づいて投資メトリクスを設定します。これらのメトリクスは、[投資ポータル] ページにウィジェットとして表示されます。

始める前に
必要なロール：pps_admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 投資ポータルウィジェット.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。
   詳細については、「ポータルボードウィジェットフォーム」を参照してください。
4. [送信] を選択します。

関連情報

投資ポータル



リソース管理ワークスペース

ServiceNow® リソース管理ワークスペースを使用すると、リソースマネージャーはすべてのリソースにわたるすべての作業を一元的に表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開始するには

探索	構成	使用方法
		
リソース管理ワークスペースの主な機能とビジネス価値について説明します	アプリケーション、依存アプリケーション、またはプラグインをインストールします	計画立案アイテム全体でのリソースの計画と割り当て

トラブルシューティングとサポート

- で質問や回答をする 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) フォーラム ServiceNow コミュニティ
- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

リソース管理ワークスペース の探索

リソース管理ワークスペースが提供する特性、機能、ビジネス価値について説明します。

これにより、リソースの割り当てと要求を一元的に表示できます。リソースマネージャーは、チームの割り当てとリソースにアサインされた作業のブレークダウンを表示する専用のワークスペースを取得します。

リソース管理ワークスペースにより、リソースの割り当てと要求を一元的に表示できます。このワークスペースは、リソース管理の問題を緩和し、より幅広いユースケースをカバーするように設計されています。

機能とメリット

機能	メリット
永続カードビュー	集中ビューを作成して、リソース割り当てを表示して作業します。
リソース割り当てビュー	週次または月次レベルでのリソース割り当てのブレークダウンビュー。
未アサイン作業の割り当て	未アサインタスクをフィルタリングして、作業を表示および割り当てます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	メリット
Microsoft Teams との統合	追加のインサイトを得るために、タスクオーナーと簡単に共同作業します。
リソースに対する作業の承認	アサインされた作業のステータスを [承認済み]、[未承認]、または [処理待ち] に移行して、優先順位付けされた作業を割り当てます。
アイコン	過剰に割り当てられたリソースを特定し、リソースの処理能力内で割り当てを維持するために再割り当てします。
ヒートマップモーダル	アサインされた作業と工数のブレークダウンビュー。

リソース管理ワークスペース の構成

リソース管理ワークスペース を構成します。

リソース管理ワークスペース のインストール

リソース管理ワークスペース アプリケーションを ServiceNow Store からインストールします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して リソース管理ワークスペース アプリケーションを検索します。

   名前または ID (sn_rm_ws) でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、以下から要求する必要がある場合があります。 ServiceNow ストア .
3. [インストール] をクリックします。
4. アプリケーションのインストールダイアログボックスで、アプリケーションの依存関係を確認します。

   使用中のアプリケーションが他のアプリケーションを必要とし、それがまだインストールされていない場合は、先にインストールしておいてください。アプリケーションをインストールする時点で、依存アプリケーションまたはプラグインがインストールされていない場合は、それらも自動的にインストールされます。
5. デモデータをインストールする場合は、[デモデータのロード] を選択します。
   デモデータには、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードが含まれています。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。

   注:
   インストール時にストアアプリケーションのデモデータをインストールしないと、後から要求することはできません。
6. [インストール] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
リソース管理ワークスペースアプリケーションが使用しているインスタンスにインストールされます。


リソースのアサインのカスタムステータスの定義

リソースのアサインのカスタムステータスを定義してアサインし、組織の要件に基づいてアサインをマークします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. [ラベル] フィールドをフィルタリングし、 リソースのアサイン [sn_plng_att_core_resource_assignment] テーブルを開きます。
3. [リストを表示] 関連リンクを選択します。
4. リストからリソースのアサインを開きます。
5. [リソースの状態] ラベルを右クリックし、[選択肢リストの表示] を選択します。

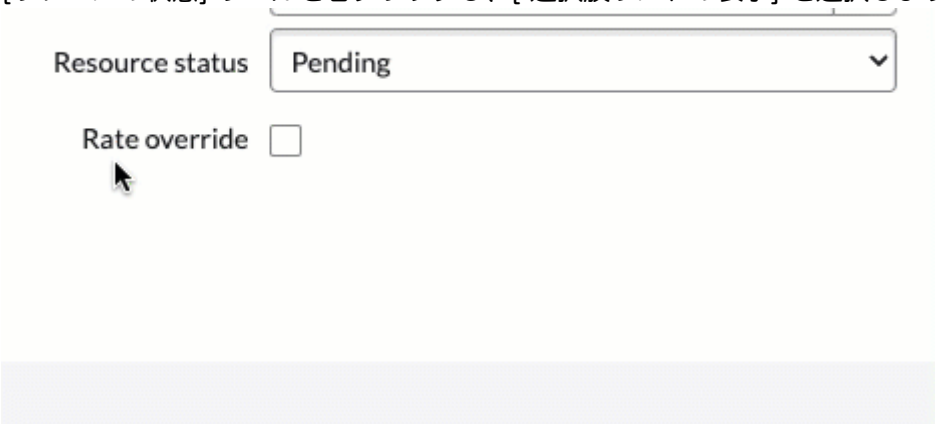

6. ステータスフィールドを選択してレコードを開きます。
7. [ラベル] フィールドにカスタムステータスラベルを入力し、[値] フィールドに値を入力します。

   ヒント:
   命名規則 (大文字) に従うと、UI に一貫した形式で表示されます。

8. ヘッダーを右クリックし、[挿入と維持] を選択します。

   重要:
   [保存] または [更新] を選択すると、ステップ 4 で選択したリソースステータスが上書きされます。

リソースのアサインの使用

この リソース管理ワークスペース は、リソースを結果に割り当てるための新しいアプローチとして提示されます。 リソース管理ワークスペース は、 プロジェクトワークスペース、 戦略的計画、および ポートフォリオ計画 と統合され、ポートフォリオのステークホルダーが作業のリソースのアサインを作成できるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

のメリットとメリット リソース管理ワークスペース

- 成果へのリソースのアサイン:タスクの特定の成果を達成するために人員を割り当てるプロセスを容易にします。
- 計画立案属性:キャパシティ計画立案、リソースのアサイン、財務の共通通貨として機能します。
- 多様な処理:組織をサポートするために避けられない変更と、計画サイクル中の優先度の変更を管理します。
- 詳細な割り当て:アサインを分割または移動して、作業の詳細な変更を効果的に処理します。
- 割り当ての分散:さまざまな計画およびレポートのニーズに対応するリソース割り当ての月次ビューと週次ビューを切り替えます。
- アサインのグループ化:グループ、ロール、スキルなどのプライマリ属性を使用してリソースボードビューをグループ化し、既存の作業を別のユーザーに再アサインします。
- 強化されたインサイト:ヒートマップビューを使用して、割り当ての詳細について、より深く、有益で、より洞察に満ちた詳細を取得します。
- より良い統合:記録された実績でリソースのアサインをロックダウンし、過去の作業データを維持するための変更や削除を防止することで、エラーを防止し、より良いプラクティスを確保します。
- アラートをクリア:過剰な割り当てやアサインステータスの変更を示すアラートアイコンを使用して、ステークホルダーまたはリソースユーザーに通知します。
- コミュニケーションの合理化:メモ内の必須情報または追加情報をキャプチャして、リソースマネージャーとリソース要求者間のシームレスなコミュニケーションを確立します。

リソース管理ワークスペースの使用

永続的なポートフォリオのカスタムリソースボードビューを作成し、すべてのリソースと作業の現在のリソース割り当てとリソース要求を表示します。

リソースのアサインがさまざまな計画ワークスペースからこのリソースマネージャー専用ビューにプルされ、全体的な作業ビューを提供します。リソースマネージャーは、ダッシュボードにアクセスしてアサインの詳細を高レベルで表示し、 リソースカードを作成して 永続的なポートフォリオをビルドし、リソース割り当てを表示できます。

リソースカードを使用して複数のポートフォリオをすばやく作成し、これらのカード間を移動してリソース要求を処理します。詳細条件ビルダーを使用して、チーム、属性、グループなどに基づいてこれらのポートフォリオをカスタマイズし、リソース割り当てを表示します。

ヒント:
作成したフィルタークエリと条件を保存して、リソース割り当てに再度アクセスして作業します。

概要ダッシュボード

リソース管理ワークスペース 概要ダッシュボードには、リソースアサインの詳細の概要がインタラクティブに表示されます。リソースマネージャーは、作業の優先順位付け、競合の特定、予定されているアサインまたは保留中のアサインのレビューに集中できます。このダッシュボードを使用すると、リソースマネージャーはリソースに関するデータを表示し、効率的なリソース予測計画に向けて取り組むことができます。

概要ダッシュボードは、さまざまなリソースボード間を移動して未アサインの作業、保留中のアクティビティを表示し、当日のタスクに優先順位を付ける手間を軽減するように作成されています。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ユーザーが リソース管理ワークスペースに移動すると、概要ダッシュボードがランディングページになります。サイドナビゲーションメニューを使用して、リソースカードに移動できます。

ダッシュボードは以下に基づいて編集できます。

- プライマリ属性と日付範囲の選択。
- ダッシュボードにウィジェットを追加および編集します。

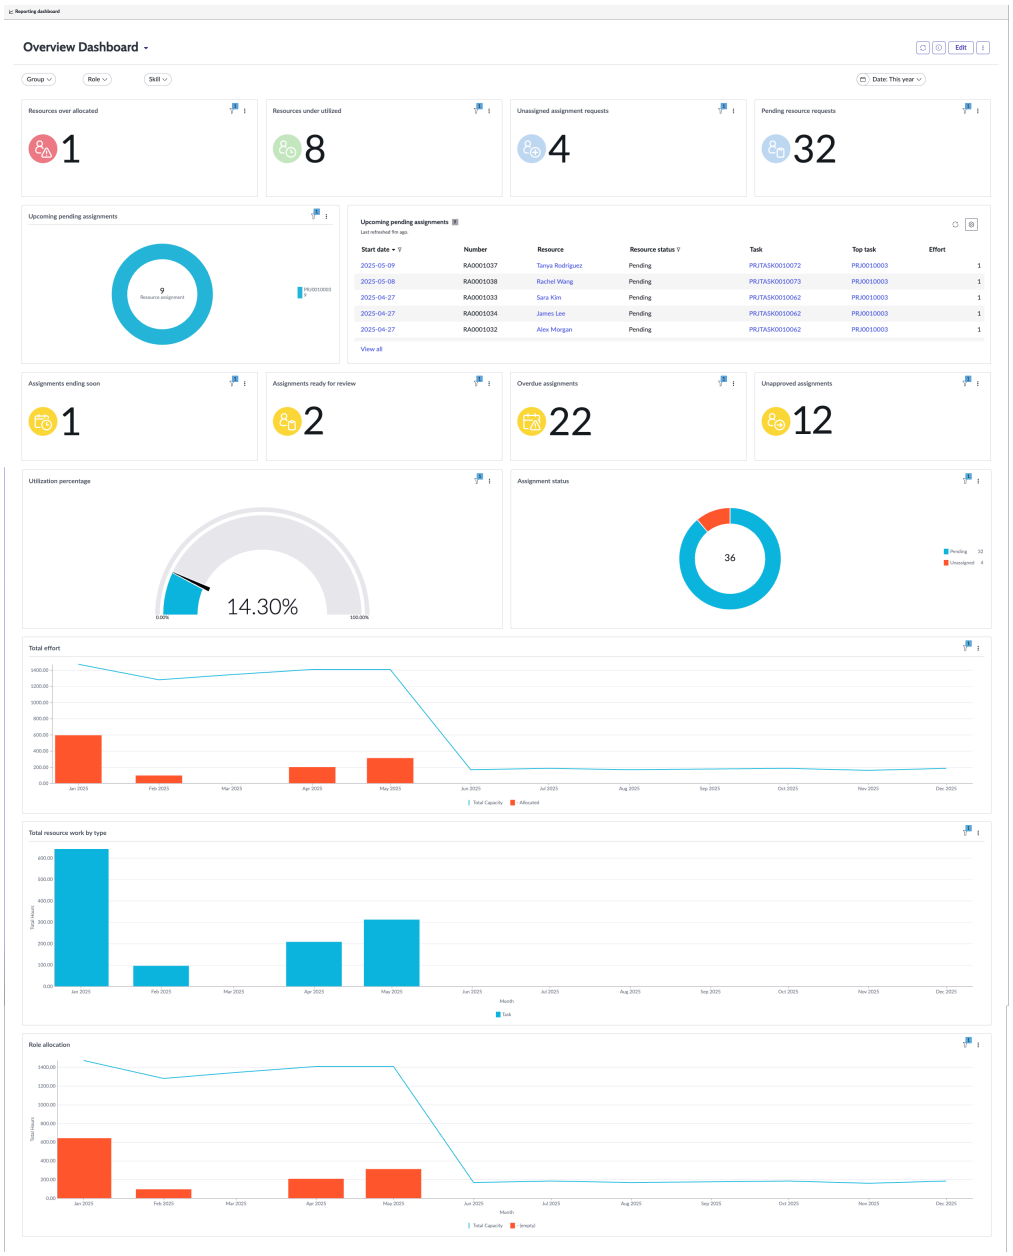


インタラクティブダッシュボードは、選択したデータのリソースボードを作成し、ダッシュボードからカスタマイズされたボードビューに直接アクセスできるようにします。たとえば、[未アサインタスク] ウィジェットを選択すると、ウィジェットから未アサインタスクのリストを含むリソースボードビューが作成され、移動します。

ボードビューでは、ユーザーにアサインされたすべてのアサインのドリルダウンビューを取得できます。ボードビューのタイムライン範囲は、ダッシュボードの日付範囲と一致します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらのカスタムボードにアクセスすることで、リソースマネージャーはアサインをアサインして承認し、所要時間を短縮し、生産性を向上させることができます。

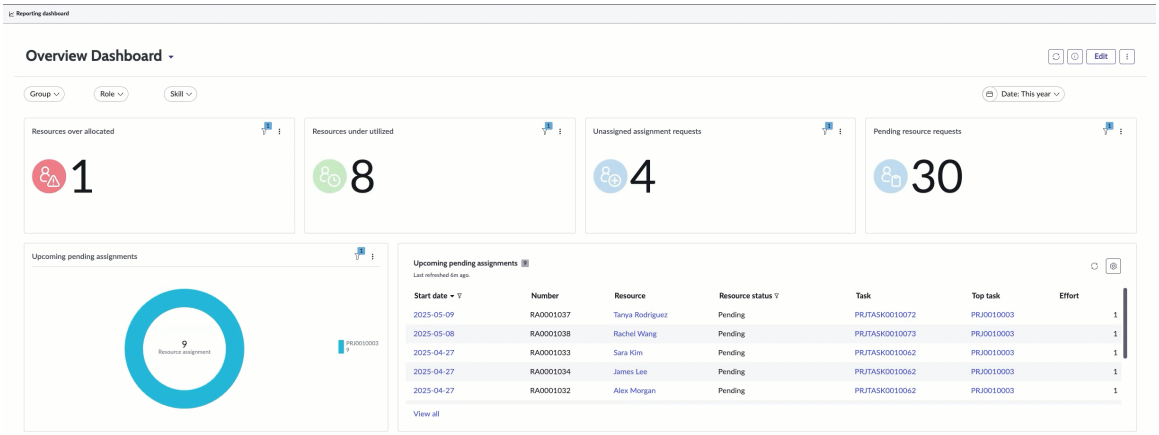

ダッシュボードウィジェットの詳細

ウィジェットタイトル	説明
過剰に割り当てられたリソース	過剰に割り当てられたユーザーの数。
活用されていないリソース	帯域幅が利用可能なユーザーの数。
未アサインのアサイン要求	未アサインタスクの数。
処理待ちのリソース要求	[処理待ち] ステータスの要求の合計数。
今後のアサイン待ち	翌月までに開始するアサインの数。 このウィジェットには 2 つのビューがあります。円グラフとリストビュー。 [円グラフ] を選択すると、リソースボードビューに移動します。 テーブル値を選択します。 • 開始日:リソースのアサインレコードビューを開きます。 • リソース:リソースの詳細ページが開きます。 • タスク:プロジェクトタスクの詳細をレコードビューで開きます。 • トップタスク:トップタスクの詳細をレコードビューで開きます。 [すべて表示] を選択して、割り当ての簡易リスト ビューを表示します。
間もなく終了するアサイン	現在の日付から翌月までに終了するアサインの数。
レビュー準備完了	レビュー準備完了ステータスのアサインの数。
期限切れのアサイン	終了日が過ぎたアサインの数。
未承認のアサイン	未承認のアサインの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ダッシュボードウィジェットの詳細 (続く)

ウィジェットタイトル	説明
使用率	選択したプライマリ属性に基づくユーザーの使用率の平均。 例:プライマリグループを選択して、グループ全体の平均使用率 (%) を表示できます。これにより、プロジェクトマネージャーはリソース要求をより適切に計画できます。リソースマネージャーは、アサインを承認する際にこのデータを使用できます。
アサインステータス	ステータスに基づくリソースのアサインのブレークダウンビュー。
合計工数	割り当てられた時間とキャパシティの月次ブレークダウンビューを表示する棒グラフ。チャートを選択すると、リソースボードにリソース割り当てのドリルダウンビューが表示されます。
タイプ別の合計リソース作業時間	タスクタイプに基づいて割り当てられた時間を表示します。 例:運用作業、プロジェクトタスクなど。
ロールの割り当て	ユーザーロールに基づいて割り当てられた合計時間数の月次ブレークダウンビューを表示する棒グラフ。チャートを選択すると、リソースボードにリソース割り当てのドリルダウンビューが表示されます。

リソースボード

この直感的なワークスペースを利用して、リソースマネージャーは次のことを実行できます。

- リソースにアサインされたタスクの数を表示します。
- アサインのタイプまたはステータスを把握し、アサインに加えられた変更を追跡します。

インジケーター	説明
	リソース割り当てが利用可能な帯域幅内にあることを示します。
	リソースが利用可能な帯域幅に対して過剰に割り当てられていることを示します。
	グループに対して作業がアサインされていることを示します。
	承認されたリソースのアサインの開始日や終了日、割り当てられた時間などの変更を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インジケーター	説明
	注: これらの変更が行われると、アサインのステータスが [保留中] に移行し、行われた変更に必要なレビューがあることがリソースマネージャーに示されます。変更がレビューされ、アサインが承認または未承認になると、このアイコンは表示されなくなります。

- [リソースステータス] 列を使用して、リソースレベルにロールアップされたアサイン済みタスクのステータスを把握します。
- 上部トレイに、各リソースの [グループ]、[ロール]、[スキル] などのプライマリ属性が表示されます。これらは、同じプライマリ属性を持つ別のユーザーにタスクを再アサインするときに役立ちます。
- リソースボードの [優先度] 列と [状況] 列にプロジェクト、デマンド、またはエピックの優先度と状況を表示し、優先度の高い計画立案アイテムまたは高リスクの計画立案アイテムにリソースを割り当てます。
- タスクの実績時間と割り当て済みの時間を表示します。

  設定サイドパネル (から [実績を表示] トグル (

) を有効にして、タイムカードを介してタスクに対してキャプチャされた工数を表示します。承認されたタイムカードは、実績時間としてリソースボードビューに反映されます。
- 新しいヒートマップモーダルを使用してリソース割り当てに関するインサイトを取得します。
- [未アサインのタスク] トグルを使用して、下部のトレイで要求された作業を表示または非表示にします。
- アサインされていない作業をフィルタリングして、カスタム要求を表示します。
- グループ割り当てのタスク作業を編集し、インライン編集機能を使用して上部トレイで承認します。


  注:
  承認されたグループアサインの割り当てを編集すると、確認ウィンドウが表示されます。承認されると、ステータスは [保留中] に変更されます。

- 未アサインタスクをアサインします。
- アサインされた作業要求を承認または未承認にします。
- 必要な日付で 1 つのリソースに対してリソースのアサインを 2 つに分割します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらのリソースカードにアクセスすると、広範なインサイトを含む次のようなビューが表示されます。

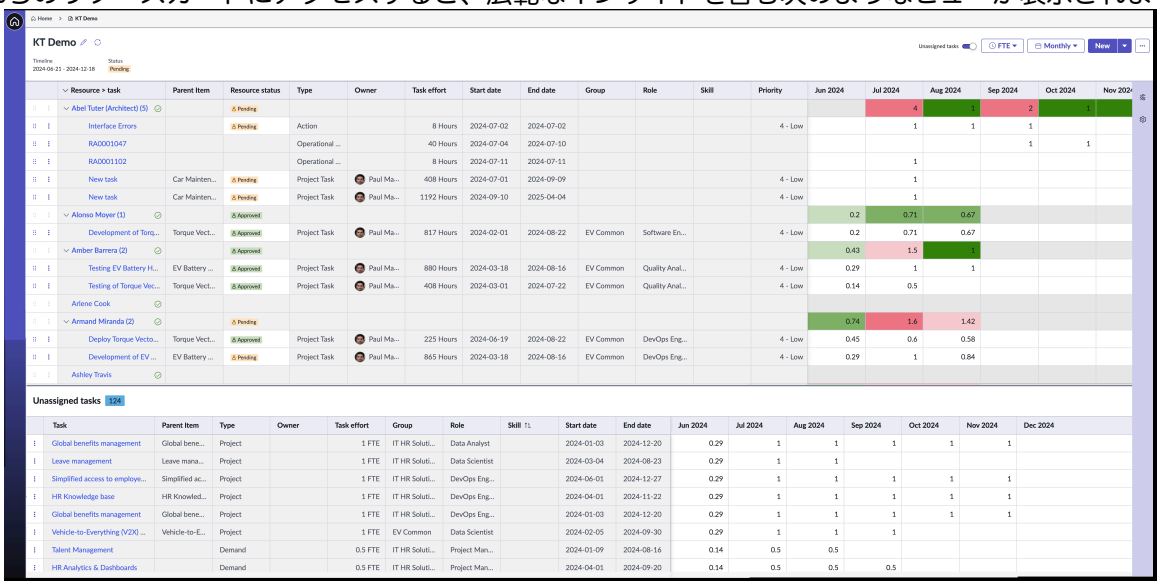

ヒント:

列構成 ( ) 設定を使用して、リソースボードビューの上部と下部のトレイで必要な列を除外または追加できます。


リソースボードビューをカスタマイズする

リソースボードをカスタマイズして、ビューをカスタマイズできます。これらのユーザー設定は、毎回同じビューを提供するために保存されます。

- 未アサインタスクの表示または非表示

  [未アサインのタスク] (Unassigned tasks トグル) を使用して、下部トレイの未アサインタスクを表示または非表示にします。

  下部トレイにある [未アサインタスク] ビューを使用すると、カスタムフィルター条件の構築が容易になり、期間、要求された工数、要求された作業アイテムとその親アイテムのブレークダウンビュー、タスクの所有者または要求者などの詳細を含む未アサイン要求が表示されます。フィルター条件ビルダーを使用して、未アサインタスクのカスタムビューまたは集中ビューを取得します。

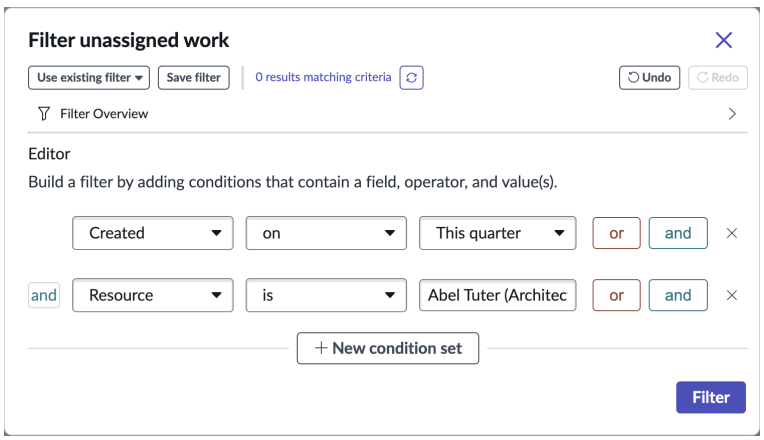

- 工数タイプを変更

  時間、**FTE**、または人日の工数タイプを切り替えて、以下に基づいてリソース割り当てを表示します

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- グループ

  グループ機能を使用してリソースボードのビューをカスタマイズし、組織のニーズに応じてリソースを再グループ化します。プライマリグループ、プライマリロール、プライマリスキル、所有者、またはプロジェクトでグループ化できます。

- 列の表示または非表示

  列構成オプション ( ) を使用して、リソースボードの上部トレイまたは下部トレイの列を表示または非表示にします。

リソース割り当てとヒートマップビュー

上部トレイにある [リソース割り当て] ビューには、リソースレベルにロールアップされているアサインされた作業アイテムのネストされたビュー、および期間 (週次または月次) と作業量 (時間、FTE、または人日) に基づくリソース割り当てブレークダウンビューがあります。

リソースにアサインされた個々のタスクレベル (エピック、デマンドなど) の詳細を取得するには、矢印 ( ) を選択します。これは、ブレークダウンビューで次のことを理解するのに役立ちます。

- 特定のリソースに割り当てられた作業
- リソースが個々のタスクに割り当てられている時間。

ヒント:
時間、FTE、人日などのさまざまな工数を切り替えて、選択した工数タイプに基づいてリソース割り当てヒートマップを表示します。

上部トレイのインライン編集機能を使用して、リソースのアサインを編集できます。

[リソースの状態] 列を使用すると、リソースに割り当てられた作業項目を保留中 (Pending) または未承認 (Unapproved) を簡単に識別できます。

注:
アサインされた作業のステータスは、リソースレベルとリソースカードレベルにロールアップされます。上部トレイに処理待ちまたは未アサインの作業アイテムがある場合、リソースレベルおよびカードレベルでロールアップされたステータスには [処理待ち] と表示されます。

割り当てヒートマップモーダルでリソースキャパシティを計算および表示するためのカスタムステータスを定義します

割り当てヒートマップモーダルは、リソース使用率の概要を示し、過剰に割り当てられたリソースと利用可能なリソースを特定します。割り当ては、リソースの可用性を表示し、フィルタリングされた期間に対するリソースの可用性を識別しやすくするために色分けされています。


新しいヒートマップモーダルは、それぞれのプロジェクトオーナーにアサインされたタスク、リソースステータス、各タスクの工数、承認されたタスクの合計使用率、残りのキャパシティなど、リソースに関する次のインサイトを提供します。

Very Over Utilized	150 +	%
Over Utilized	100 - 150	%
Full Utilization	100	%
Good Utilization	51 - 99	%
Under Utilized	0- 50	%

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

割り当てヒートマップブレークダウン

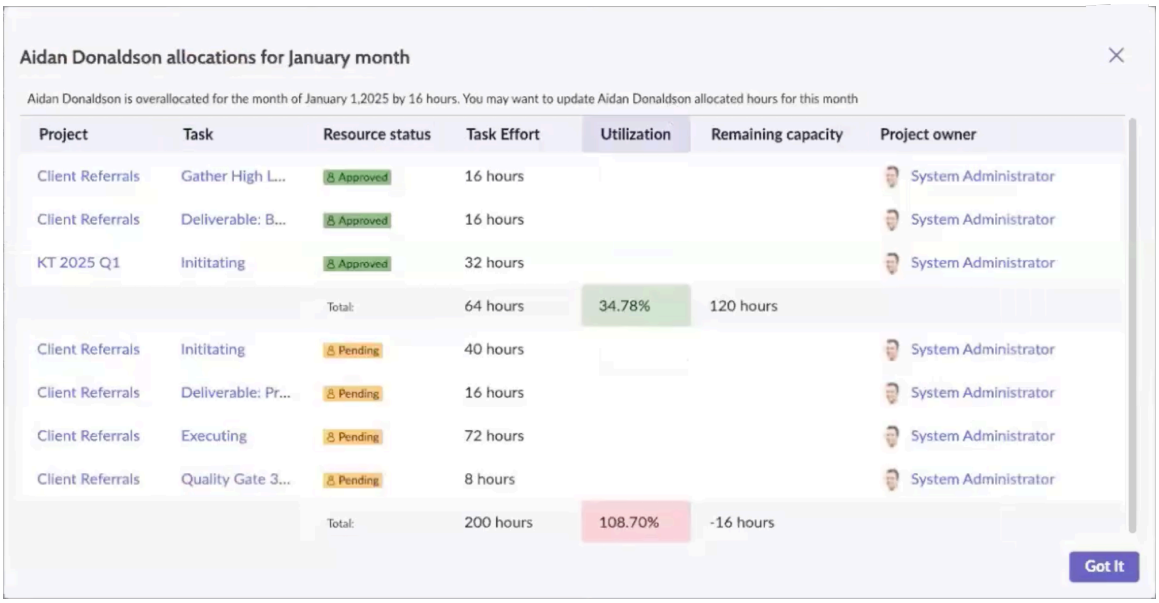

上記の例から、承認された作業アイテムのブレークダウンと、2025 年 1 月のロールアップ工数、使用率、および残りのキャパシティを確認できます。残りのキャパシティが 120 時間であるため、承認された作業はリソースキャパシティ内です。リソースマネージャーは、これらの分析情報を使用して、保留中の作業項目を決定し、使用可能な工数を持つ別のリソースに割り当てることができます。

重要:
リソース労力の計算は、 com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity プロパティによって行われます。アドミニストレーターは、定義された特定のリソースのアサインの工数のみを計算するようにこのプロパティを構成できます。詳細については、「Resource Management プロパティ」を参照してください。

リソースマネージャーは、 com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity プロパティを使用して、ワークスペース内の特定のステータスのリソースのアサインと、割り当て合計モーダルに表示する内容をカスタマイズできます。たとえば、[承認済み]、[未承認]、[処理待ち] のいずれかのリソースのアサイン、またはステータスが [承認済み] および [処理待ち] のリソースのアサインのみを表示できます。

プロパティが設定されると、特定の状況の作業アイテムがリソースのフルキャパシティおよびフル割り当てロールアップで表示されます。新しい割り当てモーダルには、構成された状況の作業アイテムの割り当てブレークダウンとロールアップ値が表示されます。

[グループ] オプションを使用してリソースボードをグループ化すると、グループのヒートマップ割り当てモーダルで次のインサイトが得られます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



たとえば、リソースボードをプライマリグループ別にグループ化して、2025 年 1 月のグループの割り当てヒートマップモーダルを表示すると、次のモーダルが表示されます。このモーダルでは、さまざまなタイプのリソースステータスの全体的な割り当て合計に関するインサイトが得られます。

注:
割り当てモーダルの工数は時間単位で表示されます。

リソースボード上のグループリソース

リソースボードには、さまざまなリソース属性タイプ、プロジェクト、および作業アイテムに応じてフェッチされるリソースの包括的なリストが表示されます。これらのリソースをグループ化して、プロジェクトに関連付けられた特定の属性、所有者、または親アイテムについて正確な視点を得ることができます。リソースを プライマリグループ、 プライマリロール、 プライマリスキル、タスク の所有者 、または作業の 親アイテム でグループ化できます。


リソースボードを プライマリグループでグループ化すると、リソースが関連付けられているプライマリグループのリストと、そのグループ内のリソースのリストのドロップダウン、およびそれらが作業している作業アイテムが表示されます。このビューでは、リソースレベルとグループレベルでの取り組みのロールアップ値も取得します。ロールアップされた値は、月次または週次のブレークダウンで表示できます。

リソースマネージャーは、この情報を使用してリソースを計画し、割り当てを管理できます。

ヒント:
プライマリ属性に基づいてリソースをグループ化すると、プライマリ属性が作業の再アサインと一致する必要があるため、リソースマネージャーは作業を簡単に再アサインできます。作業を再割り当てする方法の詳細については、「 リソース管理ワークスペースを使用した作業の再アサインまたはアサイン解除」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

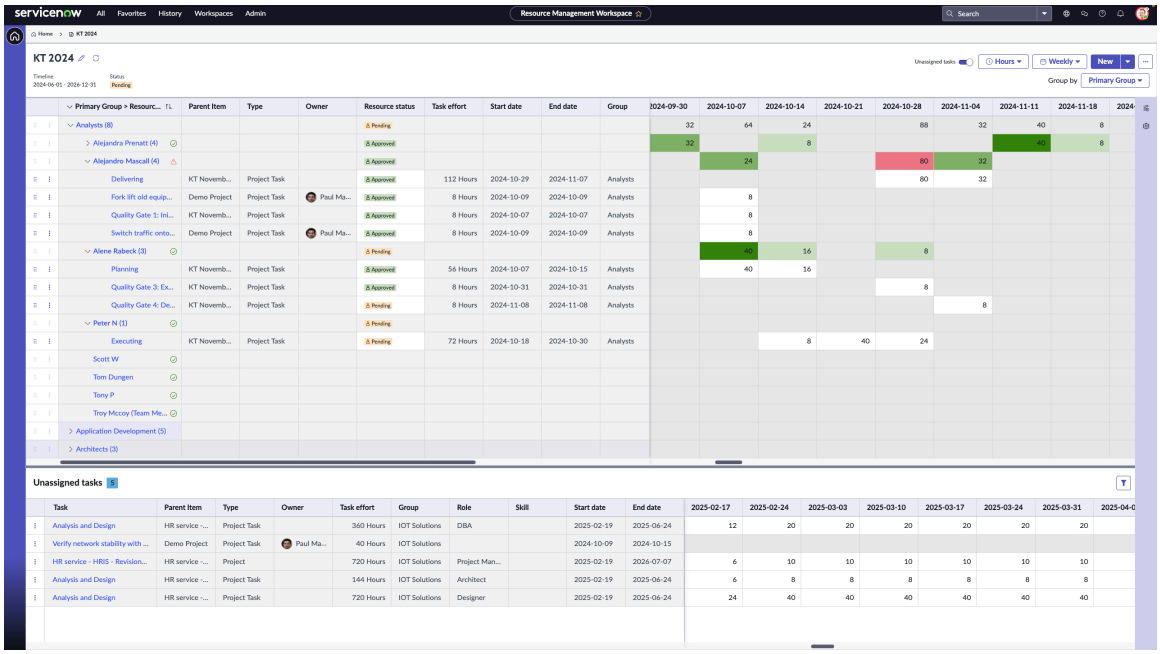

リソースカードの作成

カスタムリソースカードを作成して、リソースと未アサインタスクを表示し、永続的な焦点を絞ったポートフォリオのリソースマッピングを行います。

始める前に

必要なロール:resource_user、resource_manager、it_project_manager

手順


1. 移動先 ワークスペース > リソース管理ワークスペース.
2. メニューから [リソースカード] アイコン ( を選択します。
3. [新しいリソースカード] ボタン () を選択します。
4. 以下の詳細を入力します。
   デフォルトでは、日付範囲は今日の日付から 6 か月に設定されています。最大日付範囲は、選択した開始日から 3 年間です。
5. [次へ] を選択します。
6. リソースのカスタムセットを表示するためのフィルター条件を作成します。
   デフォルトの条件は、すべてのアクティブなユーザーを表示するように設定されています。

   ヒント:
   [フィルターの保存] オプション ([Save filter]) を使用してフィルター条件を保存し、後で識別しやすいようにフィルターに名前を付けます。次回リソースカードを作成するときに、[既存のフィルターを使用] リストから保存済みフィルターの 1 つを選択し、さらにカスタマイズできます。

7. [確認] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

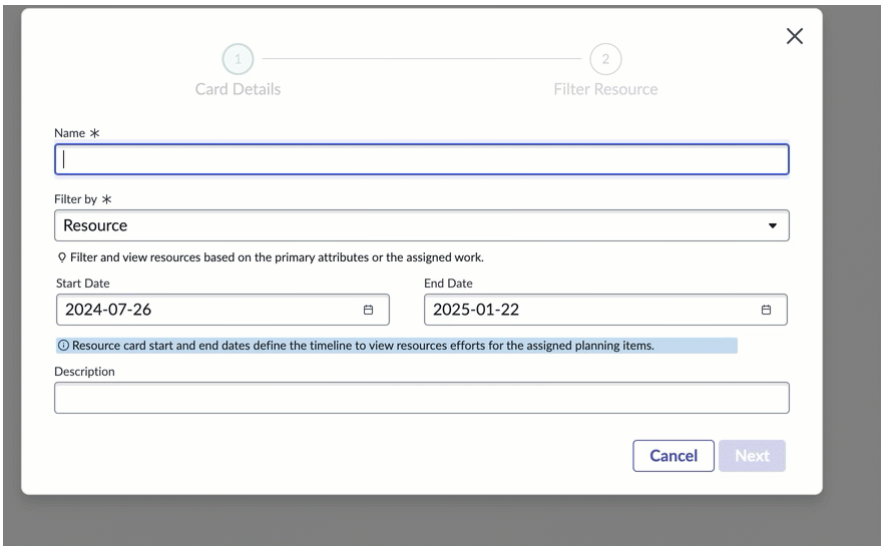

注:

リソースボードの編集アイコン ( ) を使用して、カードの詳細とフィルター条件を編集できます。

タスクの結果

フィルター条件に一致するリソースのリストと、作業割り当て、作業中のプロジェクト、およびアサインステータスが示されたリソースボードビューが表示されます。



次のタスク

[未アサインタスク] トグルを有効にし、フィルター条件を構築して、[未アサインタスク] の下部トレイに未アサインタスクを表示します。

未アサインの作業をフィルター処理して表示する方法、およびリソースのアサインを処理する方法の詳細については、「リソース管理ワークスペースを使用したアサインされていない作業の表示、割り当て、および承認」を参照してください。

リソース管理ワークスペースにおけるリソースのアサインと運用リソースのアサインの作成

リソース管理ワークスペースからリソースのアサインと運用リソースのアサインを作成してアサインします。

始める前に

必要なロール:resource_user、resource_manager、lt_project_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > リソース管理ワークスペース.
2. メニューからリソースカードアイコン ()を選択し、リソースカードを開きます。
3. 次のいずれかのオプションを使用して、リソースのアサインを作成します。
4. [送信] を選択します。

タスクの結果
リソースのアサインが作成されます。このアサインは、[未アサインタスク] の下部トレイでフィルター処理して表示できます。

リソースボードからリソースにアサインが行われた場合、および選択した日付範囲内にある場合、アサインは選択したリソースの下にリアルタイムでネストされて表示されます。


リソース管理ワークスペースを使用したアサインされていない作業の表示、割り当て、および承認

アサインされていない作業をフィルタリングして優先度の高い要求を表示し、リソースにアサインします。Microsoft Teams を使用して要求者にすばやく連絡し、追加のインサイトを取得して、インライン編集機能を使用してアサインされた作業を承認します。

始める前に

- リソースに対して「Create an active employee definition」を行い、リソース管理ワークスペースで割り当ての詳細を確認します。
- リソースカードの作成。
- 必要なロール:resource_user、resource_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > リソース管理ワークスペース
2. メニューからリソースカードアイコン ()を選択し、リソースカードを開きます。
3. [未アサインのタスク] トグル () を有効にして、下部のトレイにアサインされていない作業要求を表示します。
   プロジェクトマネージャーは、プライマリ属性 (グループ、スキル、またはロール) に基づいてリソース要求を作成します。
4. 下部のトレイで、[フィルター] () を選択して、アサインされていない作業をフィルタリングし、表示する内容のカスタムビューを取得します。


   リソースグループ、チーム、ロール、スキル、プロジェクト、期間などの属性を使用して、詳細フィルターを操作できます。

   ヒント:
   条件ビルダーを使用して、フィルターを構築し、優先度の高い要求を処理します。


   例:これは、特定のユーザー向けに作成されたアサインされていない作業要求をフィルタリングする条件です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

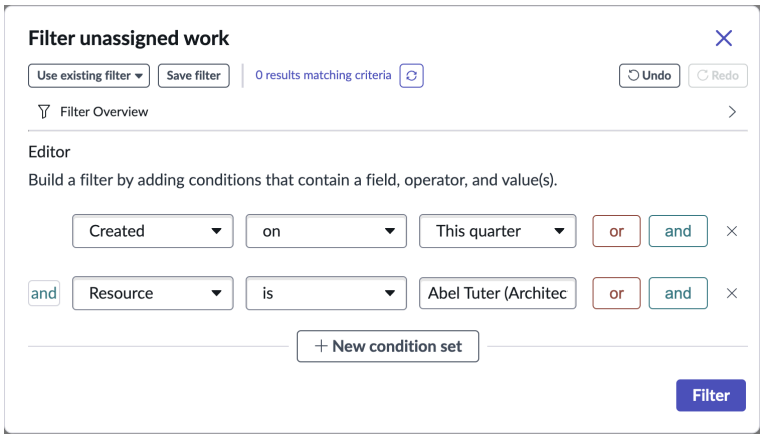

5. [フィルター] を選択します。
フィルター条件に一致するアサインされていない作業が表示されます。

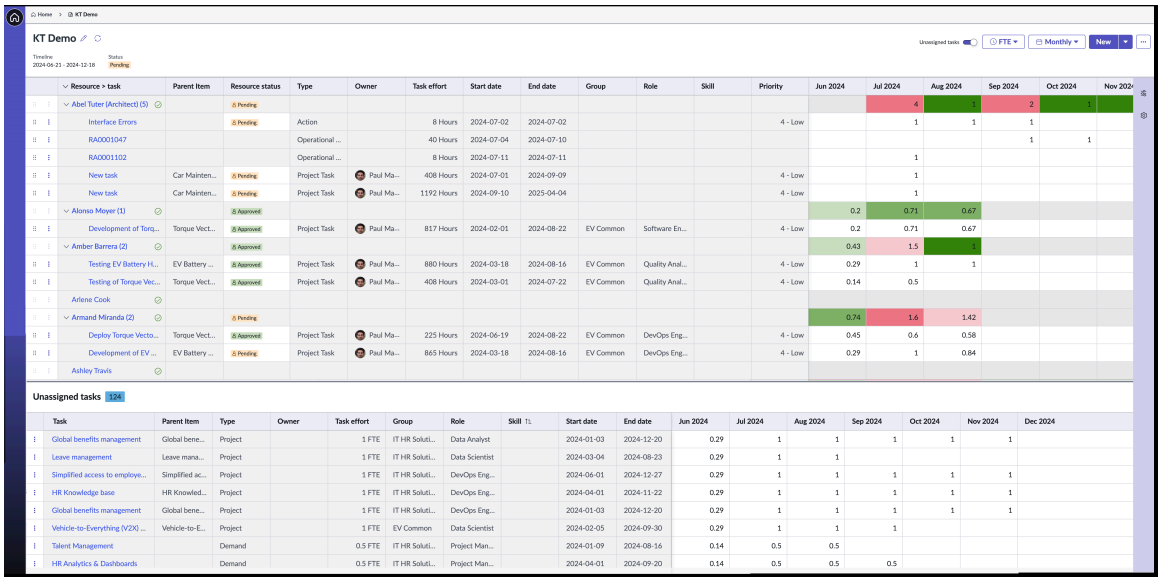

6. 行コンテキストのメニュー (⋮) を選択し、[作業をアサイン **(Assign Work)]** を選択します。
7. [作業をアサイン (Assign Work)] ウィンドウで、[ユーザー] リストをフィルタリングしてリソースを選択し、[割り当て] を選択します。
作業をアサインする際に、未来の期間についても、リソースが利用可能か (✓) 、過剰使用されているか (⚠) を、アイコンを使用して簡単に識別できます。

> **注:**
> デフォルトでは、アサインされた作業は処理待ちステータス (Pending) になり、上部トレイのネストされたビューに移動されます。

8. リソース行を展開して (› 、アサイン済みタスクを表示します。
9. オーナーの名前を選択して Microsoft Teams でコラボレーションし、追加のインサイトを取得して要求を承認または却下できます。
10. タスクの [リソースステータス] セルをダブルクリックし、次のいずれかのオプションを選択して割り当てを管理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
アサインされた作業アイテムは、承認済み (Approved) または未承認 (Unapproved) となり、ワークアサインメントのステータスはリソースレベルにロールアップされます

リソースのアサインを移動する

リソースの可用性に応じて、リソースのアサインを異なる開始日と終了日に移動します。

始める前に
必要なロール:resource_user、resource_manager

このタスクについて

- リソースのアサイン日はタスクの日付に従います。リソースのアサインの開始日と終了日は、タスクの開始日と終了日の範囲内である必要があります。
- リソースのアサインがタスクの日付を超えて移動された場合、日付外の割り当てはクリアされます。
- 作業の実績工数がキャプチャされている場合、リソースのアサインを移動することはできません。

  設定 (サイドパネルから [実績 Show actuals) を使用して、タイムカードを介してアサインに対してキャプチャされた工数を表示します。

手順

1. 移動先 ワークスペース > リソース管理ワークスペース.
2. メニューからリソースカードアイコン ( )を選択し、リソースカードを開きます。
   または、概要ダッシュボードからウィジェットにアクセスして、リソースボードにアクセスすることもできます。
3. リソースにアサインされたタスクのドリルダウンビューを表示するには、山かっこアイコン (山) を選択します。
4. 上部トレイで、必要なタスクの行コンテキストメニュー (を選択し、[移動] を選択します。
5. 移動割り当てモーダルでは、[新しい開始日] フィールドの日付ピッカーモーダルを使用して、新しい開始日を入力または選択できます。
6. オプション: [新規ステータス] リストを使用してアサインステータスを変更します。
7. [**Confirm** (確認)] を選択します。

Example: リソースのアサインの移動

Web サイトのオーバーホールタスクのリソースのアサインが Grace Lee にアサインされているとします。タスク期間は 2025 年 8 月 1 日から 2025 年 8 月 31 日までです。アサイン期間は 2025 年 8 月 1 日から 2025 年 8 月 20 日までです。ここで、アサイン開始日を 2025 年 8 月 15 日に移動するとします。新しいアサイン日にはタスクの日付が遵守され、2025 年 8 月 15 日から 2025 年 8 月 31 日までの作業が自動アサインされます。リソースの残りの労力がクリアされ、クリアされたキャパシティが使用可能として表示されます。

リソース管理ワークスペースを使用した作業の再アサインまたはアサイン解除

リソース管理ワークスペースからアサインされた作業を再アサインまたはアサイン解除します。リソースボードをプライマリ属性でグループ化して、同じプライマリ属性を持つリソースを識別できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- 作業を再アサインするときは、両方のリソースのプライマリ属性が一致している必要があります。プライマリ属性をリソースにマッピングする方法の詳細については、「プライマリ属性をリソースにマッピング」を参照してください。
- 実績時間がキャプチャされない期間の作業アイテムを再アサインできます。
- 全期間にわたってキャプチャされた実績時間が関連付けられている場合、作業アイテムを再アサインすることはできません。
- キャプチャされた実績時間が関連付けられている場合、作業アイテムのアサインを解除することはできません。
- キャプチャされた実績時間が関連付けられている場合、アサインのアサインを解除することはできません。
- グループリソースのアサインを再アサインまたはアサイン解除することはできません。


必要なロール:resource_user、resource_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > リソース管理ワークスペース
2. メニューからリソースカードアイコン ( ) を選択し、リソースカードを開きます。
3. 二重山かっこアイコン ( ) を選択して、上部トレイのリソースビューを展開します。
4. アサインされた作業を再アサインするには：
   a. 必要な作業アイテムの行コンテキストメニュー ( ) を選択します。
   b. [作業を再アサイン] を選択します。

      ヒント:
      リソースボードを プライマリ属性でグループ化し、リソースのアサインを別のリソースにドラッグアンドドロップして作業を完全に再アサインします。

   c. [作業を再アサイン] ウィンドウで、[開始月] と [終了月] の日付ピッカーを使用して作業と期間を再アサインする相手の [ユーザー] フィールドに、リソースの名前を入力します。

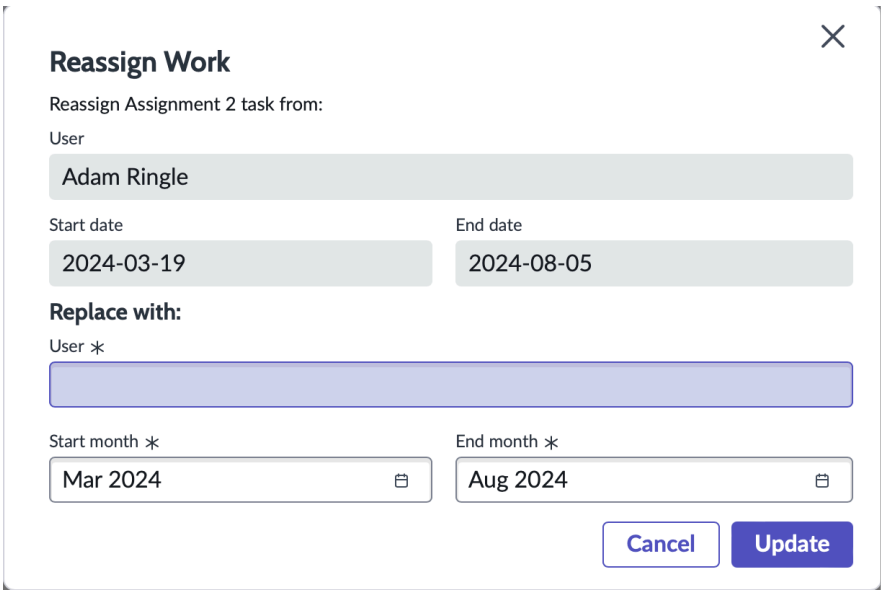

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

5. [更新] を選択します。

   注:
   再アサイン機能を使用して、アサイン日を重複させずにリソース間でタスクの一部または一部をアサインします。

   選択した作業アイテムが選択したリソースに再アサインされます。

6. アサインされた作業のアサインを解除するには：

   a. 必要な作業アイテムの行コンテキストメニュー (⋮) を選択します。

   b. [作業のアサインを解除] を選択します。
   選択した作業アイテムが [未アサイン] タスクトレイに移動されます。

タスクの結果

再アサインされたタスクは選択したリソースにアサインされ、アサイン解除されたタスクは [未アサイン] タスクトレイに移動されます。

Example: 作業の再アサイン

2024 年 1 月 1 日から 2024 年 9 月 30 日までの開発タスクが、次のプライマリ属性を持つ開発者の Tom にアサインされているとします。

- プライマリグループ - 開発
- プライマリスキル - Java
- プライマリロール - Java 開発者 1

Tom の実績時間は 2024 年 1 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日までキャプチャされており、今後 2 か月間は利用できません。

リソースマネージャーは、2024 年 4 月 1 日から 2024 年 9 月 30 日までこのタスク全体を、同じプライマリ属性を持つ Raj に再アサインできます。または、2024 年 4 月 1 日から 2024 年 5 月 31 日までのタスクを Raj に再アサインし、残りのアサインを Tom のままにします。

タスクが再アサインされても、Tom がキャプチャした実績時間は保持されます。Raj は、作業完了後、アサインされた期間の実績時間をキャプチャできます。

次のタスク

アサインされていない作業を割り当て、再アサインされた作業を承認できます。詳細については、「リソース管理ワークスペースを使用したアサインされていない作業の表示、割り当て、および承認」を参照してください。

リソース管理ワークスペースを使用したリソースのアサインの分割

特定の日付でリソースのアサインを分割すると、同じユーザーにリソースのアサインが作成されます。

始める前に

- [承認済み] (Approved) のリソースのアサインのみを分割できます。
- リソースのアサインを分割すると、選択した日付から新しいアサインが作成されます。どちらのアサインも、同じユーザーに [承認済み] 状況でアサインされます。
- 特定の期間にキャプチャされた実績がリソースのアサインにある場合、キャプチャされた実績がない日付でのみ作業を分割できます。
- 必要なロール:resource_user、resource_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ワークスペース > リソース管理ワークスペース.
2. メニューからリソースカードアイコン (を選択し、リソースカードを開きます。
3. 二重山かっこアイコン ( ) を選択して、上部トレイのリソースビューを展開します。
4. 上部トレイで、必要な作業アイテムの行コンテキストメニュー ( ) を選択し、[分割] を選択します。
   [分割] モーダルが表示され、タスクの名前、リソースの名前、開始日、終了日など、タスクに関連するインサイトが提供されます。
5. [分割] モーダルで、日付ピッカーを使用してリソースのアサインを分割する日付を選択します。
6. [分割] を選択します。

タスクの結果
リソースのアサインが選択した日付で分割され、リソースのアサインのコピーが新しい日付で選択したリソースのアサインの下に表示されます。

Example: リソースのアサインの分割

7 月 16 日から 12 月 2 日までに Abel Tuter にアサインされた Implement GenAI in docs (ドキュメントで GenAI を実装) という名前のリソースのアサインを考えてみましょう。リソースのアサインを 9 月 9 日で分割すると、名前と状況が同じ 2 つのリソースのアサインが Abel Tuter にアサインされます。

1 つのリソースのアサインの範囲は 7 月 16 日から 9 月 9 日までで、もう 1 つのアサインの範囲は 9 月 10 日から 12 月 2 日までです。

Resource > task	Parent Item	Type	Owner	Resource status	Task eff...	Start date	End date	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Oct 2024
Abel Tutor (4)				Pending				112	176	168	184
Implement GenAI in docs	Implementat...	Project Task	System ...	Approved	480 Hours	2024-09-10	2024-12-02			120	184
Implement GenAI in docs	Implementat...	Project Task	System ...	Approved	320 Hours	2024-07-16	2024-09-09	96	176	48	

ここでは、分割が 9 月 10 日から行われているため、9 月の Implement GenAI in docs (ドキュメントで GenAI を実装) の工数が重複していることがわかります。

でのリソース割り当ての管理 リソース管理ワークスペース

リソース割り当てを管理して工数、開始日と終了日、延長などを変更し、可用性とタスクの優先度に基づいてリソースを調整します。

始める前に
必要なロール：resource_user

手順

1. 移動先 すべて > ワークスペース > リソース管理ワークスペース.
2. メニューからリソースカードアイコン (を選択し、リソースカードを開きます。
3. 二重山かっこアイコン ( ) を選択して、上部トレイのリソースビューを展開します。
4. リソースボードのドリルダウンビューで、次の割り当ての詳細を編集します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースポートフォリオビューを **Excel** または **CSV** 形式にエクスポート

リソース管理ワークスペースでリソースポートフォリオビューを Microsoft Excel または CSV 形式でエクスポートして、インスタンスへのアクセス権がない場合でも、ステークホルダーとリソースステータスを確認したり共有したりできます。

始める前に
必要なロール:resource_user、resource_manager、it_project_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > リソース管理ワークスペース をクリックし、リソースカードを開きます。
2. [その他のアクション] メニュー ( ) を選択し、[エクスポート] を選択します。
3. [リソースボードをエクスポート] ウィンドウで、[ファイルタイプ] リストから必要な形式を選択してリソースポートフォリオをエクスポートします。
   - **Excel**：リソースポートフォリオを Microsoft Excel 形式でエクスポートします。
   - **CSV**：リソースポートフォリオを CSV 形式でエクスポートします。
4. [エクスポート] (Export) ボタンを選択します。

タスクの結果
リソースポートフォリオビューは、選択した形式でエクスポートされ、ファイル名として export_file が使用されます。

プロジェクトワークスペースからのリソースのアサイン管理

プロジェクトワークスペース内のタスクにリソースをアサインすることで、プロジェクトの実行を最適化します。任意のプロジェクトまたはプロジェクトタスクへのリソースのアサインを作成し、実行するタスクと割り当てるリソースを指定できます。 リソース管理アプリケーションを使用して、プロジェクトワークスペースでリソースを割り当てて管理します。

リソースのアサイン

リソースのアサインは、リソースまたはリソースのグループをプロジェクトタスクに割り当てるプロセスです。リソースのアサインが開始されると、プロジェクト管理 (PM) システムのバックエンドでリソース計画が自動生成されます。このリソース計画には、プロジェクト全体でリソースが割り当てられる方法に関する情報が含まれます。リソースのアサインは、可用性、スキル、プロジェクトの優先順位などの要素を考慮して、割り当てが全体的なリソース戦略と一致していることを確認するために、リソースマネージャーによって承認されます。リソースのアサインは動的であり、プロジェクトのライフサイクル全体を通じて編集できます。リソースは、スキル、専門知識、またはプロジェクトやタスクに関連するその他の基準など、定義された属性に基づいてアサインできます。

注:

リソース労力の計算は、 com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity プロパティによって行われます。アドミニストレーターは、定義された特定のリソースのアサインの工数のみを計算するようにこのプロパティを構成できます。詳細については、「Resource Management プロパティ」を参照してください。

[リソースのアサイン] ペインからインライン編集を使用して、子リソースのアサインを直接編集します。

リソース管理を使用すると、プロジェクトワークスペースのプロジェクトまたはタスクレベルでリソースのアサインを作成、計画、追跡、および監視できます。プロジェクトワークスペースでリソース管理を使用すると、次のことができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 属性ベースのリソースのアサインを作成する。
- プロジェクトの任意のレベルで、リソースのアサイン日、リソース、工数、および提案された割り当てを変更する。
- 新しいヒートマップモーダルを使用してリソース割り当てを表示します。割り当ては、リソースの可用性を表示するために色分けされます。
- [リソースのアサイン] ペインに、各リソースのグループ、ロール、スキルなどのプライマリ属性を表示します。これらは、同じプライマリ属性を持つ別のユーザーにタスクを再アサインするときに役立ちます。
- 時間、**FTE**、または人日の工数タイプを切り替えて、リソース割り当てを表示します。

重要:
リソース労力の計算は、 com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity プロパティによって行われます。アドミニストレーターは、定義された特定のリソースのアサインの工数のみを計算するようにこのプロパティを構成できます。詳細については、「Resource Management プロパティ」を参照してください。

主な機能

リソースのアサインにより、次のことができます。

- リソースエンゲージメントのタイミングを決定し、指定された期間にリソースを割り当てて、タスク完了のタイムラインの作成に役立てます。
- タスクの実行をプロジェクト計画に合わせて調整し、指定されたタイムラインとリソース要件に従ってタスクが実行されるようにします。
- リソースマネージャーによって実施される承認プロセスを開始し、プロジェクトのターゲットとリソースの可用性に沿っていることを確認します。

主な特長

リソース管理を使用すると、プロジェクトワークスペースのプロジェクトまたはタスクレベルでリソースのアサインを作成、計画、追跡、および監視できます。プロジェクトワークスペースでリソース管理を使用すると、次のことができます。

- 属性ベースのリソースのアサインを作成する。
- プロジェクトの任意のレベルで、リソースのアサイン日、リソース、工数、および提案された割り当てを変更する。
- 新しいヒートマップモーダルを使用してリソース割り当てを表示します。割り当ては、リソースの可用性を表示するために色分けされます。
- [リソースのアサイン] ペインに、各リソースのグループ、ロール、スキルなどのプライマリ属性を表示します。これらは、同じプライマリ属性を持つ別のユーザーにタスクを再アサインするときに役立ちます。
- 時間、**FTE**、または人日の工数タイプを切り替えて、リソース割り当てを表示します。

プロジェクトワークスペースを使用したリソースのアサイン作成

任意のプロジェクトまたはプロジェクトタスクに、プロジェクトワークスペースアプリケーションで属性ベースのリソースのアサインを作成します。

始める前に

リソースのアサインが作成されると、リソース計画がバックエンドで自動的に作成されます。リソースがプロジェクトに割り当てられ、リソースマネージャーによって承認されます。プロジェクトのライフサイクル全体を通じてアサインを編集できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. [リソースのアサイン] トグルボタンを有効にして、[リソースのアサイン] ペインを表示します。

   注:
   sn_pw.enable_resource_planning プロパティが true に設定されている場合、[リソースのアサイン] トグルボタンと [リソースのアサイン] ペインが プロジェクトワークスペース に表示されます。デフォルト値は false です。このプロパティを有効にするには、pps_admin ロールが必要です。

3. [計画立案] ペインで、プロジェクトタスクの [リソースのアサイン先] フィールドをダブルクリックします。

   [計画立案] ペインと [リソースのアサイン] ペインの両方からリソースをアサインできます。

4. [リソースのアサイン先] リストからユーザーまたはグループを選択し、**Enter** キーを押します。
   リソースのアサインを作成するとき、ユーザーまたはグループの割り当ては選択した工数タイプに基づきます。たとえば、ユーザーを追加し、工数タイプに時間が選択されている場合、割り当ては時間単位で表示されます。
   リソースのアサインレコードが作成され、自動保存されます。[リソースのアサイン] フォームには、プロジェクトまたはタスクの情報が自動入力されます。
5. オプション: [リソースのアサイン] ペインで、[リソースを追加] を選択して、プロジェクトまたはタスクのリソースのアサインを作成します。
   プロジェクトのリソースのアサインは、[リソースのアサイン] ペインからのみ作成できます。
6. 作業に基づいて、経費タイプとして [経費] または [投資] を選択します。
   リソースは、タイムシートポータルを使用して工数をキャプチャするときに、この情報を使用できます。タイムシートが承認されると、選択した経費タイプに基づいて、投資または経費として経費をキャプチャするプロジェクトの経費ラインが作成されます。
7. [割り当てヒートマップ] トグルボタンを有効にして、ヒートマップにリソースのアサインを表示します。
   要件に基づいて、週次ビューから月次ビューに切り替えることができます。

次のタスク
プロジェクトワークスペースからのリソースのアサインの更新

関連情報

- プロジェクトワークスペースからのリソースのアサインの削除
- ヒートマップでのリソース割り当ての更新
- プロジェクトタスクへのリソースのアサインの再調整

プロジェクトワークスペースを使用したリソースのアサインの更新

プロジェクトまたはプロジェクトタスクに関連付けられたリソースのアサインを更新します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

リソースのアサインでは、グループリソースのアサインのステータスに加えられた変更は、関連付けられているすべての子リソースのアサインステータスにロールダウンされます。同様に、子リソースのアサインのステータスに加えられた変更は、対応するグループリソースのアサインステータスに自動的にロールアップされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. [リソースのアサイン] トグルボタンを有効にして、[リソースのアサイン] ペインを表示します。
3. [リソースのアサイン] ペインで、任意のセルをダブルクリックして行全体を編集します。
4. 目的のフィールドを編集し、データグリッドの任意の場所を選択して、詳細を保存します。

   [リソースのアサイン] ペイン内のリソースのアサインが更新されます。

   注:
   1 フルタイム相当 (FTE) の工数を超える空のリソースのアサインにリソースが追加されると、追加の行が自動的に作成され、リソースのアサインが両方の行で自動更新されます。

   [リソースのアサイン] ペインの行コンテキストメニューを使用して、リソースのアサインを延長、編集、または削除します。

プロジェクトワークスペースを使用したリソースのアサインの削除

プロジェクトワークスペースからリソースのアサインを削除します。アサインを削除すると、関連するすべてのリソースのアサインも削除されます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. [リソースのアサイン] トグルを有効にして、[リソースのアサイン] ペインを表示します。
3. [リソースのアサイン] ペインで、[リソースを追加] を選択して、プロジェクトまたはタスクのリソースのアサインを作成します。

プロジェクトワークスペースを使用したリソースのアサインの更新

プロジェクトワークスペースで割り当てヒートマップ機能を使用して、リソース割り当てを表示および更新します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
[割り当てヒートマップ] トグルボタンを使用すると、個々のリソースの割り当ての詳細なブレークダウンが提供されます。割り当てヒートマップは、週または月のリソースの合計使用率を表します。デフォルトでは、その週の割り当て情報が表示されます。この情報は、プロジェクトマネージャーがプロジェクトレベルまたはタスクレベルでリソースを効果的に計画するのに役立ちます。

ServiceNow® インスタンスを組織の Microsoft Teams と統合して、Microsoft Teams でのプロジェクトとリソース割り当てのコラボレーションを可能にします。Microsoft Teams 統合を使用すると、プロジェクトのチームメンバーとコミュニケーションを取り、プロジェクトとリソース割り当てのステータスに関するリアルタイムの更新を共有できます。詳細については、「Microsoft Teams 用の PPM コラボレーションの設定」を参照してください。

手順

1. プロジェクトワークスペースを使用したリソースのアサイン作成.
2. [割り当てヒートマップ] トグルボタンを有効にして、ヒートマップにリソースのアサインを表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


自動翻訳

要件に基づいて、週次ビューから月次ビューに切り替えることができます。

3. 目的のフィールドを編集し、データグリッドの任意の場所を選択して、詳細を保存します。
作業割り当てはキャパシティに基づいています。割り当ては、この後に示すようにリソースの可用性を表示するために色分けされます。これらの色は、特定のタスクのリソースの可用性を識別するのに役立ちます。

Very Over Utilized	150 + %
Over Utilized	100 - 150 %
Full Utilization	100 %
Good Utilization	51 - 99 %
Under Utilized	0- 50 %

4. 割り当て時間のセルを選択して、[リソース割り当て] ウィンドウを編集します。



[実績を表示] トグルを有効にして、各リソースの実績を表示します。実績をプロジェクトワークスペースから編集することはできません。

5. [リソース割り当て] ウィンドウから、リソースのアサインされたプロジェクト、所有者、タスク、および作業工数を表示および追跡します。


リソースにスケジュールがある場合、リソースの割り当てはリソースのスケジュールに従って行われます。

割り当てヒートマップモーダルには、[リソースステータス]、[残りのキャパシティ]、および [使用率] 列があり、リソースマネージャーによるタスク工数の評価をサポートします。

6. [プロジェクトオーナー] フィールドを選択して、Microsoft Teamsでプロジェクトオーナーにダイレクトメッセージを送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

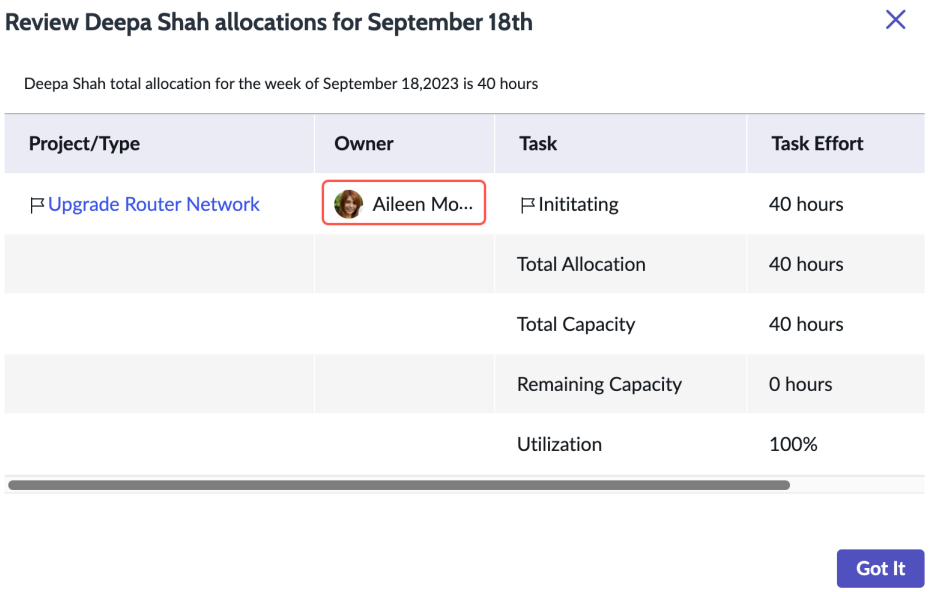

注:
[プロジェクトオーナー] フィールドは、 ServiceNow® インスタンスが組織の Microsoft Teamsと統合されている場合にのみ選択できます。デマンドのリソースのアサインは、プロジェクトになる前と後の両方で割り当てウィンドウに表示されます。

関連情報

プロジェクトワークスペースを使用したリソースのアサイン作成

プロジェクトワークスペースを使用したプロジェクトタスクへのリソースのアサインの再調整

リソースのアサイン日をプロジェクトタスクの日付に再調整または同期します。この同期により、リソースのアサインをスケジュールし、プロジェクトタスクのタイムラインに合わせて調整できるようになります。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 すべて > ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. [プロジェクト計画立案] ペインで、プロジェクトタスクの [開始予定日] または [実際の開始日] をダブルクリックします。
3. フィールドを編集し、**[OK]** を選択します。
4. プロジェクトタスクの行から、行コンテキストメニューを選択し、[タスクへのアサインの再調整] を選択します。

   または、[同期されていないリソース] アイコン を使用して、リソースのアサイン日をプロジェクトレベルでプロジェクトの日付と同期します。フォームを使用しているときに同じアクションを実行するには、[タスクへのアサインの再調整] 関連リンクを使用できます。

タスクの結果
リソースのアサイン日はプロジェクトタスクの日付と同期されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

プロジェクトワークスペースでのリソースのアサイン

プロジェクトワークスペースの参照

リソース管理ワークスペースの参照情報

リソース管理ワークスペースの参照フィールドとフォームの詳細。

[新しいリソースのアサイン **(New Resource Assignment)**] フォーム

リソース管理ワークスペースを使用してリソースのアサインを作成するには、次のフィールドに入力します。

[新しいリソースのアサイン **(New Resource Assignment)**] フォーム

フィールド	説明
アサインのタイプ	リストからアサインタイプを選択します。 • ユーザー：ユーザーのリソースのアサインを作成します。 • グループ：グループのリソースのアサインを作成します。
リソース	リソースの名前。 このフィールドは、[グループ] アサインでは無効です。
グループ	リソースのアサインを作成するグループの名前。 リソースが選択されている場合、プライマリグループ名がデフォルトで入力されます。
ロール	従業員のプライマリロール。 • リソースが選択されている場合は、デフォルトでプライマリロールが入力されます。 • このフィールドは、[グループ] アサインでは無効です。
スキル	リソースのプライマリスキル。 • リソースが選択されている場合は、デフォルトでプライマリロールが入力されます。 • このフィールドは、[グループ] アサインでは無効です。
工数タイプ	リソースを要求する工数タイプを選択します。 • 時間：リソースまたはグループを時間単位で要求します。 • FTE：FTE でリソースまたはグループを要求します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[新しいリソースのアサイン **(New Resource Assignment)]** フォーム (続く)

フィールド	説明
	デフォルトでは、1 FTE は 8 時間です。 • 人日：人日でリソースまたはグループを要求します。
工数	必要な工数を入力します。
名前	リソースのアサインのカスタム名を入力します。
タスク	リストからタスクを選択して、リソースのアサインに関連付けます。
開始日	カレンダーパレットを使用して、アサインの開始日を選択します。
終了日	カレンダーパレットを使用して、アサインの終了日を選択します。
リソースステータス	リソースのアサインの状況を選択します。 • 保留 • 承認済み • 未承認 • アサイン解除済み
レート上書き	組織の要件に合わせてリソースレートを上書きするには、このオプションを選択します。
リソースレート	必要な通貨を選択し、リソースレートを入力します。
レビュー準備完了	リストからオプションを選択して、リソースマネージャーが割り当て要求を確認できるようにします。 • はい:リソースのアサイン要求が確定し、リソースマネージャーによる割り当てのレビューの準備ができている場合。 • いいえ:リソースのアサインの詳細がまだ更新中の場合。
メモ	リソースマネージャーまたはプロジェクトマネージャーがインサイトと追加情報を提供できるように、アサインの詳細を入力します。

[新しい運用のアサイン **(New operational Assignment)]** フォーム

リソース管理ワークスペースを使用して運用のアサインを作成するには、次のフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[新しい運用のアサイン **(New operational Assignment)**] フォーム

フィールド	説明
リソース	リソースの名前。
Group (グループ)	リソースのアサインを作成するグループの名前。 リソースが選択されている場合、プライマリグループ名がデフォルトで入力されます。
ロール	従業員のプライマリロール。 リソースが選択されている場合は、デフォルトでプライマリロールが入力されます。
スキル	リソースのプライマリスキル。 リソースが選択されている場合は、デフォルトでプライマリロールが入力されます。
工数タイプ	リソースを要求する工数タイプを選択します。 • 時間：リソースを時間単位で要求します。 • キャパシティ (%)：運用の作業に対する一定割合のキャパシティを要求します。
工数	必要な工数を入力します。
名前	リソースのアサインのカスタム名を入力します。
運用作業タイプ	リストから運用作業の種類を選択します。 • KTLO • アドミン • 会議 • トレーニング • 不在 • 外部作業 • 休暇 • Appointment (予約) • 電話
レートモデル	既存のレートモデルを選択して、計画および実際のリソースコストを計算します。
開始日	カレンダーパレットを使用して、アサインの開始日を選択します。
終了日	カレンダーパレットを使用して、アサインの終了日を選択します。
リソースステータス	リソースのアサインの状況を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[新しい運用のアサイン **(New operational Assignment)**] フォーム (続く)

フィールド	説明
	• 保留 • 承認済み • 未承認 • 未アサイン
レビュー準備完了	リストからオプションを選択して、リソースマネージャーが割り当て要求を確認できるようにします。 • はい:リソースのアサイン要求が確定し、リソースマネージャーによる割り当てのレビューの準備ができている場合。 • いいえ:リソースのアサインの詳細がまだ更新中の場合。
メモ	リソースマネージャーまたはプロジェクトマネージャーがインサイトと追加情報を提供できるように、アサインの詳細を入力します。

リソース管理クラシック版

ServiceNow® リソース管理 アプリケーションを使用すると、プロジェクトマネージャーや変更マネージャーなどのリソース要求者は、リソース計画を作成し、リソースを要求し、リソースの可用性と使用率を分析できます。

重要:

2026 年 3 月以降、リソース管理のリソース計画は新規のお客様に提供されなくなります。既存のお客様には、作業のアサインと管理の柔軟性を高める、リソースのアサインに取り組むことをお勧めします。

- 新規顧客: 使用方法 リソース管理ワークスペース または プロジェクトワークスペース 任意の作業のリソースを要求します。リソースマネージャーは、リソース管理ワークスペースを使用して 、リソースのアサインをアサイン、承認、および管理 できます。
- 既存の顧客：
  - 既にリソース管理とリソース計画の操作を行っている場合は、引き続き使用できますが、移行してリソースのアサインの使用を開始することをお勧めします。
  - リソース計画からリソースのアサインへの移行の詳細については、「 リソース計画と運用 リソース計画をリソースのアサインに移行する 」および「 リソース管理ワークスペース の使用を開始して引き続き作業を管理する」を参照してください。

リソースマネージャーは、 リソース管理ワークスペース を使用してリソースのアサインをアサイン、承認、および管理することをお勧めします。 リソース管理ワークスペース は、リソースマネージャー専用のワークスペースビューであり、未アサインタスクに関するインサイト、リソース帯域幅のヒートマップビュー、優先度の高いリソースアサイン要求を処理するカスタムビューなどがあります。

リソース管理のパフォーマンスや機能の強化は行われません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースマネージャーは、アプリケーションを使用してタスクにリソースを割り当てます。リソース管理 アプリケーションは、プロジェクトタスク、インシデント、問題、変更など、プラットフォーム上の任意のタスクと組み合わせて使用できます。

この 4 分間のビデオを視聴して、リソース管理 アプリケーションの目的、リソース計画の作成、リソースの要求と割り当て、およびリソースの可用性とキャパシティを分析してリソースを最大限に活用する方法について学習してください。

目的、リソースの計画、リソースの要求と割り当て、およびリソースを最大限に活用できるリソースの可用性とキャパシティの分析を含む リソース管理 の概要。

リソース管理 アプリケーションを使用すると：

- リソース要求者は、タスクに必要なグループまたはユーザーのリソースを指定するリソース計画を作成できます。リソースを要求する前に、リソースの可用性を確認し、リソース計画を変更できます。
- リソースマネージャーは、要求されたリソースの可用性、既存の割り当て、および使用率を表示し、リソースの可用性に基づいて割り当てを行うことができます。
- リソースマネージャーは、リソースの使用率と可用性のリソース計画の日付、リソース、要求された時間、および提案された割り当てを変更できます。

リソース管理 アプリケーションは、PPM Standard の一部として有効化されています。

リソース管理プロセス

リソース計画は、リソース管理がどのように機能するかを理解するための鍵となります。

重要:
2026 年 3 月以降、リソース計画と運用リソース計画は新規のお客様にはご利用いただけません。

リソース管理ワークスペースまたはプロジェクトワークスペースを使用してより柔軟にリソースのアサインに取り組むことをお勧めします。

リソース計画からリソースのアサインへの移行の詳細については、「 リソース計画、運用リソース計画、およびコスト計画の移行」を参照してください。

resource_user ロールを持つユーザーは、リソース要求者になることができます。プロジェクトマネージャーは、通常 resource_user ロールを持っているため、多くの例でリソース要求者として使用されています。

リソース要求者は、タスクのユーザーまたはグループのリソースを要求するリソース計画を作成します。変更要求、Agile スクラムプロセスのタスク、プロジェクトタスクなど、あらゆるタイプのタスクをリソース計画に追加できます。

リソース計画が送信された後、リソースマネージャーは計画をレビューし、リソースを確認して、最終的に計画にリソースを割り当てます。すべての関係者が同意すると、リソースの作業が開始されます。

リソースプラン

リソースプランは、リソース管理の重要な要素です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


重要:
2026 年 3 月以降、リソース計画と運用リソース計画は新規のお客様にはご利用いただけません。

リソース管理ワークスペースまたはプロジェクトワークスペースを使用するリソース管理ワークスペースにおけるリソースのアサインと運用リソースのアサインの作成柔軟性を高めるリソースのアサインに取り組むことをお勧めします。

プロジェクトマネージャーなどのリソース要求者は、リソースを要求し、作業を追跡し、コストを追跡するリソース計画を作成します。リソースマネージャーは、計画が使用される前に、リソース計画を変更して承認します。

タスクのすべてのリソース計画は、プロジェクトタスクフォームの [リソース計画] 関連リストに表示され、リソース要求者がアクセスできます。

[プロジェクト] フォームのリソースプラン

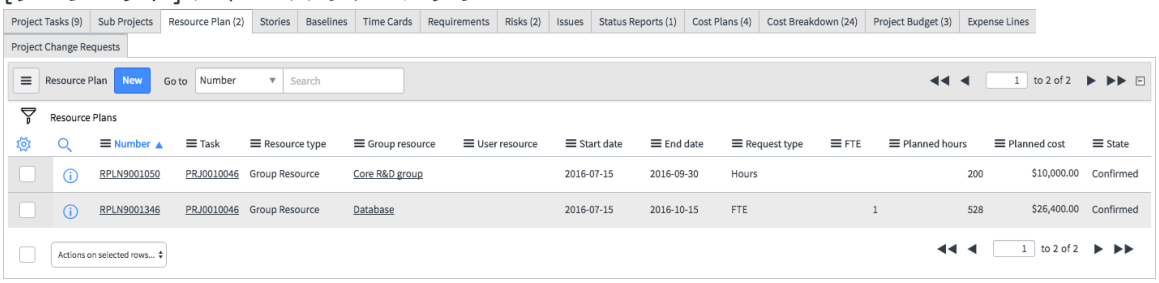

リソース計画は、いくつかの状況を経て進行します。

リソースプラン状況

状況	説明
計画	[計画] は、リソース要求者がリソース計画を作成するときのデフォルトのステータスです。このステータスのすべてのプランを編集できます。要求された割り当て は、リソース計画が [計画] ステータスのときに作成されます。 リソース要求者が既に送信されたプランへの変更を要求すると、プランは [計画] ステータスに戻ります。
要求済み	リソース要求者は、[送信] を選択して、リソースマネージャーがレビューするためのリソース計画を送信します。その後、リソース計画は [要求済み] ステータスに移行します。リソースマネージャーは、リソースを確認して割り当てるか、プランを却下し、最後にプランをクローズします。 リソース要求者は、グループ、グループ内の特定のユーザー、または特定のユーザーに、選択したタスクの作業を要求できます。レビューのためにプランを送信した後、リソースマネージャーは要求されたユーザーの一部またはすべてを確認して割り当てることができます。 タスクに複数のユーザーまたはグループが必要な場合は、指定されたタスクに対して複数のリソース計画を作成できます。
却下	リソースマネージャーは、 [却下] を選択してリソース計画を却下できます。その後、リソース計画は [却下] ステータスに移行します。却下されたプランは、変更が行われ、要求者がリソースを再要求できるようになるまで、そのステータスのままになります。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースプラン状況 (続く)

状況	説明
確認済み	プランが要求された後、リソースマネージャーは将来のプロジェクトとデマンドのためにリソースをブロック/確認できます。その後、リソース計画は [確認済み] ステータスに移行します。[確認済み] ステータスのプランを変更できるのは、リソースマネージャーのみです。 リソース計画が [確認済み] ステータスに移行すると、ソフト割り当てが作成されます。
割り当て数	プランが確認されると、リソースマネージャーはプランを確認し、可用性を表示し、リソース設定を変更し、リソース割り当てを実行できます。その後、リソース計画は [割り当て済み] ステータスに移行します。リソースマネージャーは、キャンセル、完了、または変更のみを行うことができます。 リソース計画が [割り当て済み] ステータスに移行すると、ソフト割り当てはハード割り当てに変換されます。 **注:** [確認および割り当て] オプションを使用して、プランを [要求済み] ステータスから [割り当て済み] ステータスに直接設定することもできます。
完了	関連するすべてのタスクとプロジェクトが完了またはキャンセルされた後、割り当て済みリソース計画を完了できます。これにより、完了日以降のリソース計画のすべてのリソース割り当てが削除されます。
キャンセル	割り当てが不要になった場合は、プランをキャンセルできます。これにより、過去および将来のすべての割り当てが削除されます。キャンセルされたリソース計画は、過去の割り当てがない場合は [計画] ステータスに戻すことができます。 [計画]、[要求済み]、[確認済み]、または [割り当て済み] ステータスのリソース計画はキャンセルできます。

リソース管理の状況

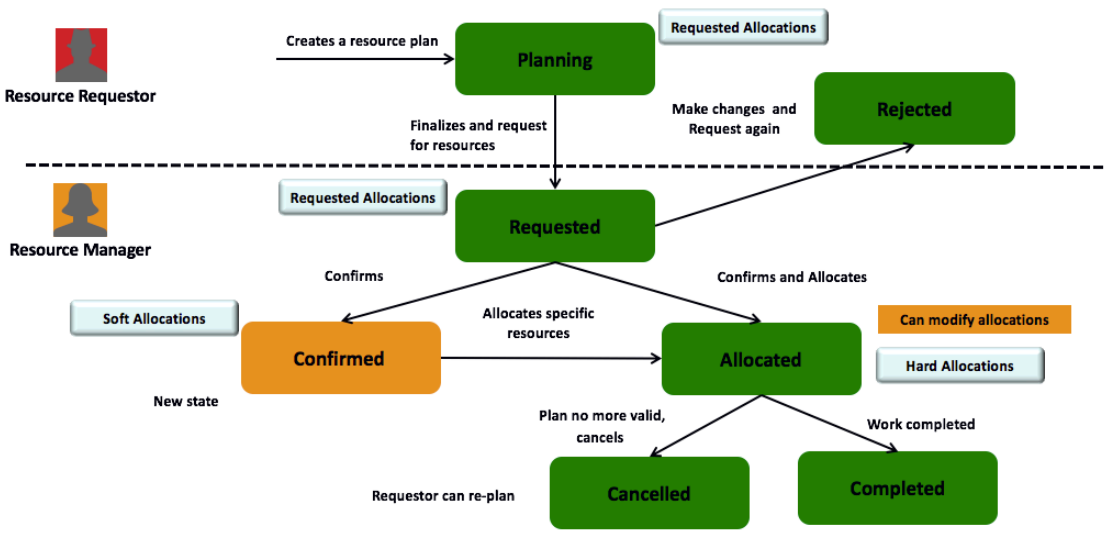

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> リソース要求者が、すでにレビューのために送信されたプラン ([要求済み] または [確認済み] ステータスであるが、まだ割り当てられていない) を変更したい場合、要求者は変更を要求できます。その後、プランは [計画] ステータスに戻ります。

リソース管理は、[自分のカレンダー] および [リソースワークベンチ]モジュールで重要なタイムゾーンをサポートしています。

[確認済み] または [割り当て済み] ステータスの変更

[確認済み] または [割り当て済み] ステータスのリソース計画を変更できるのは、リソースマネージャーのみです。

[確認済み] ステータスの [リソース計画] フォームのヘッダー領域の変更による影響は次のとおりです。

- すべてのソフト割り当てが削除されます。
- 要求された割り当ては、変更された値で再作成されます。
- その後、リソースプランは [要求済み] ステータスに戻ります。

[割り当て済み] ステータスの [リソース計画] フォームのヘッダー領域の変更による影響は次のとおりです。

- すべてのリソース割り当て (ソフトおよびハード) が削除されます。
- 要求された割り当ては、変更された値で再作成されます。
- その後、リソースプランは [要求済み] ステータスに戻ります。

リソース割り当てレコードに実績時間が記録されていない場合、リソースマネージャーは、割り当て済みリソース計画の過去の日付のリソース割り当てを変更または削除することもできます。ユーザーがタイムカードを送信すると、タイムカードが承認された時点で割り当てレコードの実績時間が更新されます。

> **注:**
> 割り当てレコードのみに変更が加えられた場合、リソース計画は [要求済み] ステータスに戻りません。

要求タイプ

次のいずれかのオプションを使用して、リソース計画を要求できます。

- 時間単位：要求は、リソースが必要な時間数で表されます。
- FTE：要求は、フルタイムの作業を表す同等の値で表されます。要求タイプが FTE の場合、予定時間は次のように計算されます：平均日次 FTE * リソース計画の稼働日数 * FTE 値。1 日の平均 FTE 時間は、ユーザーレコードとグループレコードで指定されます。ユーザーまたはグループレコードに値が指定されていない場合、平均日次 FTE 時間は、*Default Average Daily FTE* プロパティから取得されます。

  稼働日数は、ユーザーリソースのユーザースケジュールまたはグループリソースのデフォルトスケジュールに基づいて計算されます。デフォルトのスケジュールは、デフォルトの [スケジュール名] プロパティから取得されます。

  たとえば、グループの 1 日の平均 FTE が 40 時間で、リソース計画期間が 9 月 1 日から 9 月 10 日で、FTE が 0.5 であるとします。

  計画期間中に 8 営業日を想定すると、予定時間数 = 40 * 8 * 0.5 = 160 時間となります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> キャパシティは FTE からではなく、スケジュールから導出されます。FTE とスケジュールの両方が互いに同期している必要があります。

- 人日：要求は人日で表示されます。要求タイプが人日である場合、予定時間数は次のように計算されます：合計人日数 * 平均日次 FTE 時間/人日あたりの時間数。

  たとえば、グループの平均日次 FTE 時間/人日あたりの時間数を 8 時間とし、人日を 3 人日とすると、予定時間数 = 8 * 3 = 24 時間となります。

リソースプランのコスト

リソース計画のコストは、リソース計画レコードで直接追跡できます。リソースプランのコストは、計画済み、割り当て済み、および実績に分けられます。

リソース計画の [レート上書き] オプションが選択されている場合、対応するリソース計画のコストを計算するための時給は、[リソースレート] フィールドで指定されたレートから導出されます。

レートモデルがプロジェクトまたはデマンドに関連付けられている場合、時給はレートモデルから導出されます。関連するレートモデルの時給が変更されるたびに、新しい料金を反映するようにリソース計画のリソースコストを再計算する必要があります。

レートモデルが利用できない場合、対応するリソース計画コストを計算するための時給は、賃金レートカードから導出されます。

プロジェクトとデマンドには、複数のリソース計画を含めることができます。すべてのリソースプランの集計コストは、[予定コスト] フィールドと [割り当てられたコスト] フィールド、およびプロジェクトとデマンドの両方の [リソースコスト] セクションにロールアップされます。

リソース計画の作成

リソース管理 アプリケーションから、デマンド、プロジェクト、プロジェクトタスク、インシデント、問題、変更などの任意のタスクのリソース計画を作成できます。承認のために送信するまで、プランを編集および調整できます。

始める前に

> **重要:**
> 2026 年 3 月以降、新規顧客はリソース計画を利用できなくなります。
>
> 既存のリソース計画を移行してリソースのアサインに取り組むことをお勧めします。これにより、リソース管理ワークスペースまたはプロジェクトワークスペースを使用するリソース管理ワークスペースにおけるリソースのアサインと運用リソースのアサインの作成柔軟性が向上します。

必要なロール:resource_user、resource_manager、it_project_manager、demand_manager、admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、リソース計画を作成します。

オプション	説明
プロジェクトワークスペースの [リソース] タブから	**a.** プロジェクトワークスペースでプロジェクトレコードを開きます。「新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス」を参照してください。 **b.** [リソース] タブで、[新規] をクリックします。
[プロジェクト] フォームから	**a.** 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース. **b.** プロジェクトレコードを開きます。 **c.** [リソースプラン] 関連リストで、[新規] をクリックします。
デマンドフォームから	**a.** 移動先 デマンド > デマンド > すべて. **b.** デマンドを開きます。 **c.** [リソース計画] 関連リストで、[管理] をクリックします。 **d.** [リソース計画] タブで、[新規] をクリックします。
プロジェクトタスクから	**a.** 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース. **b.** プロジェクトレコードを開きます。 **c.** [詳細] タブをクリックします。 **d.** [プロジェクトタスク] 関連リストで、[タスク] を開きます。 **e.** [リソースプラン] 関連リストで、[新規] をクリックします。
既存のリソース計画から	**a.** コピーするリソース計画レコードを開きます。 **b.** 関連リンクで、[リソースプランをコピー] をクリックします。 注: 既存のリソース計画からリソース計画を作成すると、すべてのフィールドが新しいリソース計画にコピーされます。新しいプランが [計画] ステータスで作成されます。

2. [リソース計画] フォームのフィールドに入力します。
フィールド名の説明については、「[リソースプラン] フォーム」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. フォームヘッダーの [保存] をクリックします。
   リソース計画が保存され、[計画] ステータスになります。
4. [リソース計画] フォームのタブの値の更新を確認します。
   フィールド名の説明については、「[リソースプラン] フォームタブ」を参照してください。

   注:
   割り当てられたレートモデルが削除または置換された場合、またはレートモデルの時給が変更された場合、関連するリソース計画のコストフィールドは自動的に再計算されません。レートモデルからの新しいレートを反映するには、リソース計画のリソースコストを再計算する必要があります。

   ただし、コストに影響するフィールドのいずれかがリソース計画で更新されると、時給を取得するためにレートモデルが呼び出されます。たとえば、リソース計画の終了日を変更してリソース計画を延長すると、新しいレートが利用可能になる可能性があるため、レートモデルが呼び出されます。

タスクの結果

- リソース計画が保存され、[計画] ステータスになります。
- リソース計画がリソースグリッドから作成されると、計画はプロジェクトまたはデマンドのリソース計画リストの一番上の行として表示されます。プランには、次のいずれかのプリフィックスがあります。
  - グループに対して作成されたリソース計画の [G]。
  - ロールに対して作成されたロールリソース計画の [R]。
  - ユーザーに対して作成されたユーザーリソース計画の [U]。

  プリフィックスは、[リソースタイプ] フィールドで選択されたリソースのタイプに基づいています。
- 最後に作成されたリソース計画は、プロジェクトまたはデマンドのリソース計画リストの一番上に表示されます。

次のタスク

リソースプラン関連リンクとリストを使用して、リソース計画、ワークベンチで作業するか、既存の要求割り当てを変更します。

リソースファインダーを使用してリソースの可用性を分析する

リソースファインダーを使用してリソースの可用性を検索して分析し、プロジェクトまたはデマンドのリソース計画を作成できるようにします。

始める前に

必要なロール：it_project_manager、it_demand_manager、または resource_manager

このタスクについて

リソースファインダーで、必要なリソースを検索し、選択したリソースの計画を作成します。

- ステップ 1 と 2 で、リソースファインダーに移動します。
- ステップ 3 は、リソースの可用性をフィルタリングおよび分析するためのさまざまなオプションに関するガイダンスを提供します。ニーズに合ったオプションを選択してください。
- ステップ 4 は、選択したリソースの新しいリソース計画を作成する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


手順

1. プロジェクトまたはデマンドの [リソース計画] ページを開きます。

2. リソースグリッドセクションでプロジェクトまたはデマンドを選択し、リソースファインダーアイコン () をクリックします。


   ページの下部に [リソースファインダー] セクションが開きます。最大 50 件のレコードリストが最初に表示されます。リソースが 50 件を超える場合は、[詳細を取得] をクリックしてロードできます。

3. 次のオプションを使用して、リソースのキャパシティをフィルタリングおよび分析します。

オプション	説明
利用可能なリソースまたは割り当て超過リソースを表示する	[表示/非表示] メニュー  ( ) を使用して、リソースを対応可能または割り当て超過でフィルタリングします。
シンプルな検索を実行する	検索条件を選択して、グループ、ロール、またはユーザー属性でリソースを検索します。 
独自の検索条件をビルドする	詳細検索を使用して、フィルター条件を追加します。 たとえば、[グループで検索] を選択し、[詳細] をクリックして、詳細検索フィルターアイコン



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
	 ( ) をクリックします。ここでは、このグループをさらにフィルタリングするための条件を追加できます。 **注:** フィルターを追加するときは、同じ属性の異なる値に AND 条件を追加しないようにしてください。たとえば、スキル **[X]** AND スキル **[Y]** の条件でユーザーグループをフィルタリングしないでください。 
長期間のリソースの可用性を表示する	日付範囲セレクターのオプションを使用します。 Yokohama リリース以降では、カスタムの日付範囲を選択できます。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

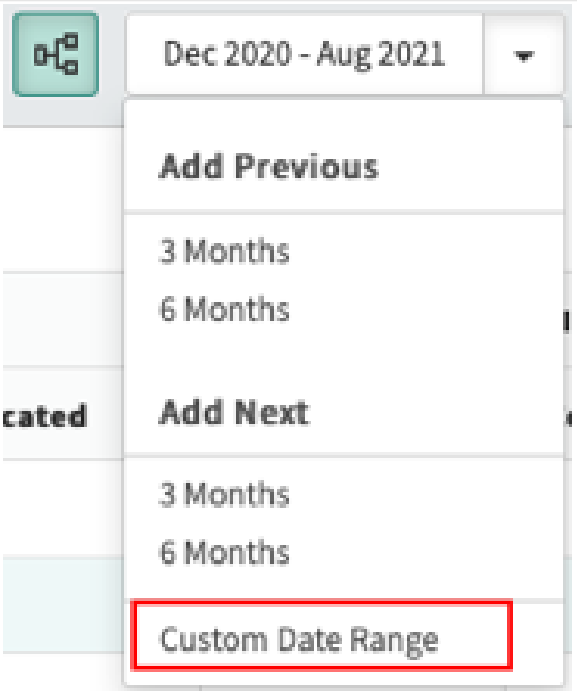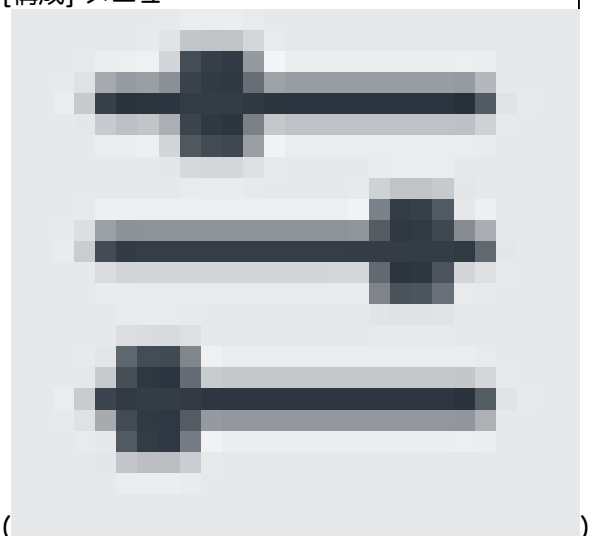オプション	説明
	 プロパティ *Maximum time duration in Resource Finder in months* の値は、リソースファインダーにリソースの詳細が表示される最大期間を決定します。
リソースリストを分析する	[構成] メニュー  ( ) を使用して、キャパシティ、可用性、実際の時間などのさまざまな制約をさまざまな期間で分析します。 デフォルトでは、[可用性] の時間のみが表示されます。その他の詳細を表示するには、[詳細ビュー]


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

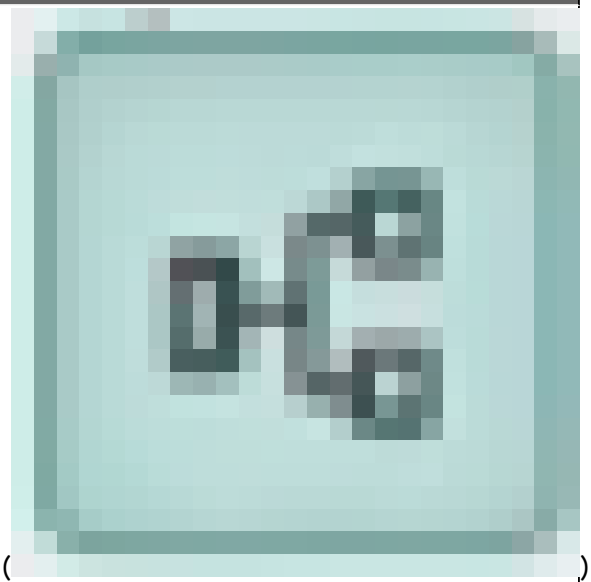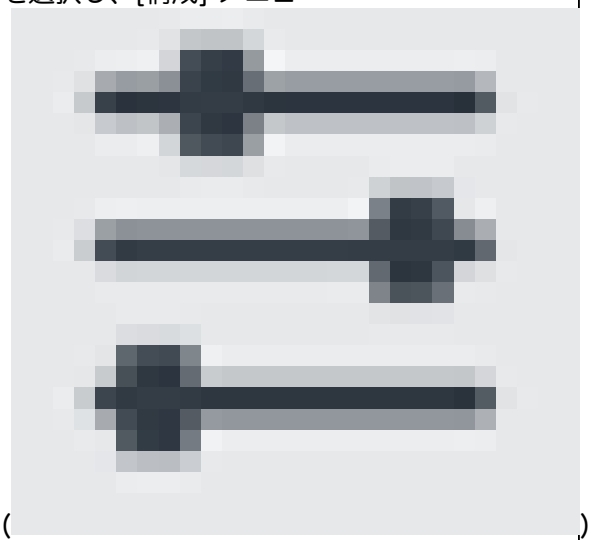オプション	説明
	 ( ) を選択し、[構成] メニュー  ( ) から必要な列を選択します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

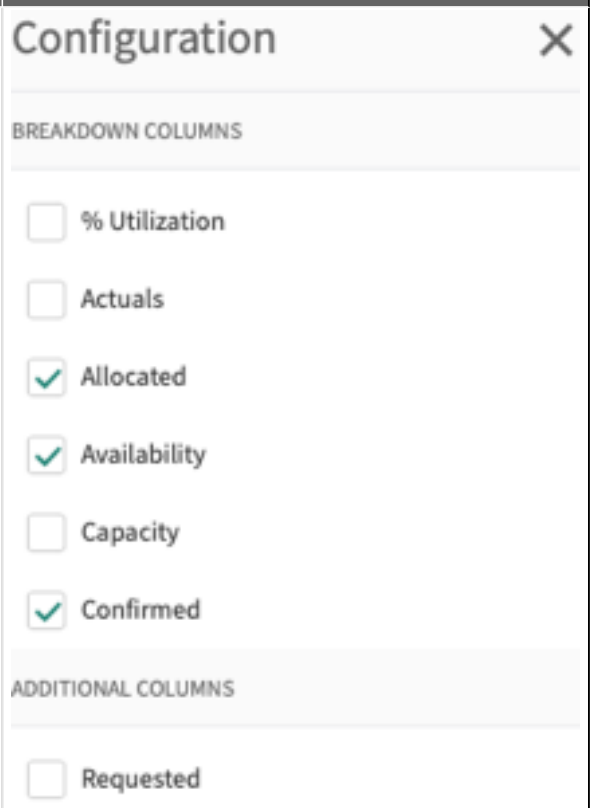オプション	説明
	 ユーザーグループまたはロールに要求された時間を表示すると、リソース要求を履行する必要があるかどうかがすぐにわかり、そのユーザーグループまたはロールに十分なキャパシティがある場合に、それを実行できます。 次の条件では、[要求済み] 列は [構成] メニューで使用できません。 ○ シンプルフィルターまたは詳細フィルターを使用してリソースリストをさらにフィルタリングする ○ 可用性ビューでリソースファインダーを使用する ○ [表示/非表示] メニューを使用して [利用可能を表示 (show available)] または [過剰割り当てを表示 (show over allocated)] オプションを使用する 列が既に有効になっていても、後で上記の条件のいずれに合致した場合、[要求済み] 列は自動的に無効になります。 カレンダーからユーザーに対して作成されたすべての非プロジェクトイベントは、リソースファインダーでユーザーの運用作業として表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

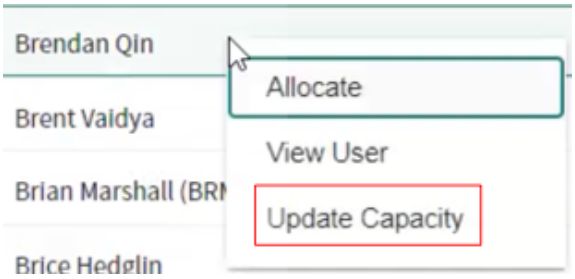オプション	説明
リソースキャパシティの更新	ユーザーを右クリックし、[キャパシティを更新] を選択します。 

4. リソース計画を作成するリソースを選択し、[新しいプランを追加] をクリックします。

タスクの結果

- リソース計画は、予定時間数ゼロの [計画] ステータスで作成されます。
- リソース計画は、プロジェクトまたはデマンドのリソース計画リストの一番上の行として表示されます。ファインダーで選択されたリソースのタイプに基づいて、リソース計画には次のいずれかのプリフィックスが付きます。
  - グループに対して作成されたリソース計画の [G]。
  - ロールに対して作成されたロールリソース計画の [R]。
  - ユーザーに対して作成されたユーザーリソース計画の [U]。

> **注:**
> 最後に作成されたリソース計画は、プロジェクトまたはデマンドのリソース計画リストの一番上に表示されます。

次のタスク

- リソースグリッドを使用して、リソース計画の予定時間を更新します。
- リソース計画の詳細を表示および更新するには、リソース計画の行の先頭にある情報アイコン (ⓘ) をクリックします。
- リソース計画を要求できるようになりました。

運用リソース計画の作成

運用リソース計画を作成し、管理、会議、トレーニングなどの運用作業にチームキャパシティの特定の部分を割り当てます。

始める前に

> **重要:**
> 2026 年 3 月以降、新規顧客は運用リソース計画を利用できなくなります。
>
> 既存のリソース計画を移行してリソースのアサインに取り組むことをお勧めします。これにより、リソース管理ワークスペースまたはプロジェクトワークスペースを使用して、より柔軟でリソース管理ワークスペースにおけるリソースのアサインと運用リソースのアサインの作成できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必要なロール:resource_user、resource_manager、it_project_manager、demand_manager、admin

このタスクについて
会議、トレーニング、アドミン作業、電話などの運用作業タイプのリソース計画を作成します。

運用リソース計画の詳細については、「運用リソース計画 - 知っておくべきこと」を参照してください。

手順
1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > 新しい運用計画の作成.
2. [リソース] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[リソース] フォーム」を参照してください。
3. [保存] を選択します。

関連情報
運用作業タイプにタイムカードカテゴリをマップ

リソースの要求
リソース計画を作成したら、リソースマネージャーにリソースを要求します。

始める前に
必要なロール：it_project_manager、resource_user

このタスクについて
注:
リソース計画のリソースタイプがグループの場合、そのグループにアクティブなメンバーが存在する場合にのみ、リソースを要求できます。

手順
1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > すべて.
2. [計画] ステータスのリソース計画を開きます。
3. [要求] を選択します。

タスクの結果
リソース計画は [要求済み] ステータスに移行し、リソースマネージャーによるレビューの準備が整います。

リソース計画の確認
リソースマネージャーは、リソース計画が要求された後に、リソースを確認またはブロックできます。リソース計画を確認するには、[要求済み] ステータスである必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

> **重要:**
> 2026 年 3 月以降、新規顧客はリソース計画を利用できなくなります。
>
> 既存のリソース計画を移行してリソースのアサインに取り組むことをお勧めします。これにより、リソース管理ワークスペースまたはプロジェクトワークスペースを使用して、より柔軟でリソース管理ワークスペースにおけるリソースのアサインと運用リソースのアサインの作成できます。
>
> リソースマネージャーは、リソース管理ワークスペースを使用して未アサインのリソースのアサインを表示してアサインできます。

必要なロール：resource_manager

このタスクについて
[確認済み] ステータスのリソース計画を変更またはキャンセルできます。

リソースタイプがグループのリソース計画の場合、指定したグループにアクティブなメンバーが存在する場合にのみ、リソースを確認できます。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > 要求済み.
2. 確認するリソース計画を開き、[確認] を選択します。

タスクの結果
リソース計画が [確認済み] ステータスに移行し、ソフト割り当てが作成されます。

リソース計画の確認と割り当て

リソース計画が要求されたら、リソースマネージャーはリソースを直接割り当てることができます。確認して割り当てるには、リソース計画が [要求済み] ステータスである必要があります。

始める前に

> **重要:**
> 2026 年 3 月以降、新規顧客はリソース計画を利用できなくなります。
>
> 既存のリソース計画を移行してリソースのアサインに取り組むことをお勧めします。これにより、リソース管理ワークスペースまたはプロジェクトワークスペースを使用して、より柔軟でリソース管理ワークスペースにおけるリソースのアサインと運用リソースのアサインの作成できます。
>
> リソースマネージャーは、リソース管理ワークスペースを使用して未アサインのリソースのアサインをアサインおよび承認できます。

必要なロール：resource_manager

このタスクについて
[割り当て済み] ステータスのリソース計画を変更またはキャンセルできます。

リソース計画のリソースタイプがグループの場合、そのグループにアクティブなメンバーが存在する場合にのみ、リソースを要求できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > 要求済み.
2. 確認して割り当てるリソース計画 (要求済み) を開き、[確認して割り当て] を選択します。

タスクの結果
リソース計画は、[要求済み] ステータスから [割り当て済み] ステータスに自動的に移行されます。リソース計画が [割り当て済み] ステータスに移行すると、ソフト割り当てはハード割り当てに変換されます。

割り当て中のエラーまたは警告は、[リソースプラン] フォームの [リソースプランログ] 関連リストに記録されます。特定の日にリソースが 24 時間を超えて割り当てられた場合、ログが生成されます。これらのログを確認して、適切なアクションを実行し、さらにリソースを割り当てることができます。

リソース計画の変更要求

レビューのために送信した後にリソース計画を変更するには、リソース計画の変更を要求します。

始める前に
必要なロール：resource_user

このタスクについて
変更できるのは、[要求済み] または [確認済み] ステータスのリソース計画のみです。計画のフォームフィールドを変更するには、最初にリソース計画の変更を要求する必要があります。ただし、変更を要求することなく、要求された割り当てをプランで直接調整することができます。これらの調整は、リソース計画にロールアップされます。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > すべて.
2. [要求済み] または [確認済み] のリソース計画を開き、[変更を要求] を選択します。

タスクの結果
リソース計画は [計画] ステータスに戻り、フォームフィールドが有効になり、必要な変更が可能になります。

プロジェクトまたはデマンドのリソース計画のコストの再計算

関連するレートモデルで時間レートが変更されるたびに、プロジェクトまたはデマンドの個々のリソース計画のリソースコストを再計算します。

始める前に
次のセットアップを確認してください。

- プロジェクトまたはデマンドには、アクティブなレートモデルが割り当てられている必要があります。
- リソース計画が [計画済み]、[要求済み]、[確認済み]、または [割り当て済み] 状況である必要があります。

必要なロール：resource_manager

このタスクについて
プロジェクトまたはデマンドのすべてのリソース計画のコストを一度に更新するには、プロジェクトフォームまたはデマンドフォームから [リソースコストを再計算] オプションを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. プロジェクトまたはデマンドのリソース計画を開くには、次のいずれかのアクションを実行します。
   - 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > すべてをクリックし、プロジェクトを開きます。
   - 移動先 デマンド > デマンド > すべてをクリックし、デマンドを開きます。
2. [リソース計画] 関連リストから、コストを再計算するリソース計画を開きます。
3. [リソース計画] フォームで、[リソースコストの再計算] 関連リンクを選択します。
4. [リソースコストの再計算] ダイアログボックスで、[開始日] フィールドと [終了日] フィールドに再計算期間を指定します。
   デフォルトでは、[開始日] フィールドには現在の日付があり、[終了日] フィールドにはリソース計画の終了日があります。
5. 予定コストを再計算するには、[予定コストを含める] オプションを選択します。
   [予定コストを含める] オプションは、[確認済み] または [割り当て済み] ステータスのリソース計画で使用できます。このオプションはデフォルトでは選択されていません。
6. **[OK]** を選択します。

タスクの結果

- プロジェクトまたはデマンドに関連付けられたレートモデルから導出された最新の時給に基づいて、選択したリソースコストを再計算します。
- [リソース計画] フォームの各コストフィールドで再計算されたリソースコストと、関連するプロジェクトまたはデマンドの [リソース計画] 関連リストを更新します。
- 変更された値を、関連するプロジェクトまたはデマンドのそれぞれのコストフィールドに反映します。

リソース計画に関連するコストプランの更新

リソース計画がプロジェクト、プロジェクトタスク、またはデマンドに関連付けられ、関連するコストプランがある場合、要求者またはリソースマネージャーは、リソース計画を更新した後に関連するコストプランを更新できます。

始める前に
必要なロール：resource_user または resource_manager または it_project_manager または it_demand_manager

このタスクについて
リソース計画に関連コストプランがない場合、リソース計画の [コストプランを更新] 関連リンクは表示されません。

手順

1. リソース計画の更新を保存します。
2. [コストプランを更新] 関連リンクをクリックします。

   リソース計画に関連付けられているコストプランは、リソース計画の [予定コスト] が更新されるとすぐに自動的に更新されます。以下に変更があると、リソース計画の予定コストが更新されます。
   - 予定時間数
   - ユーザー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 状況
- 開始日と終了日

タスクの結果

リソース計画に関連付けられたコストプランが次のように更新されます。

- リソース計画が [計画] または [要求済み] ステータスの場合、コストプランの予定時間が更新されます。
- リソース計画が確認済み/割り当て済みステータスで、確認済み/割り当て済み時間が予定時間数よりも少ない場合、計画コストと確認済み/割り当て済みコストのうち高い方がコストプランで更新されます。
- リソース計画が確認済み/割り当て済みステータスで、確認済み/割り当て済み時間が予定時間数以上の場合、確認済み/割り当て済みコストがコストプランで更新されます。

リソース計画のコストは、コスト計画 [cost_plan] テーブルの unit_cost フィールドに接続されます。

リソース計画の完了

関連するすべてのタスクとプロジェクトが完了またはキャンセルされた後、リソースマネージャーはリソース計画を [完了] ステータスに移行してクローズできます。

始める前に

完了するリソース計画は、[割り当て済み] ステータスである必要があります。

必要なロール：resource_manager

このタスクについて

プロジェクトマネージャーとデマンドマネージャーは、プロジェクト、プロジェクトタスク、計画立案コンソール、またはデマンドからリソース計画を完了できます。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > 割り当て済み.
2. 完了するリソース計画を開きます。
3. フォームのすべての情報を確認します。

   注:
   [実績時間] および [実績コスト] フィールドには、計画タスクに費やされた時間とリソースコストが表示されます。これらのフィールドはタイムカード情報から取得され、リソース計画で編集することはできません。

4. オプション: メモを追加します。
5. [完了] を選択します。
6. [確認] ダイアログボックスで、リソース計画の完了日を選択し、[はい] を選択します。

   デフォルトでは、システム日付またはリソース計画の終了日のいずれか早い方が [完了日] に入力されます。

   注:
   [完了日] はリソース計画開始日より前にすることはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果

- その後、リソース計画は [完了] ステータスに移行します。
- 完了日がリソースプランの終了日よりも前の日付である場合、リソース計画の終了日が完了日で更新されます。入力された完了日がリソース計画の終了日より後の場合、リソース計画の終了日が保持されます。
- 完了日以降のリソース計画のすべての要求された割り当てとリソース割り当てが削除されます。割り当てに対して実績時間が記録されている場合、その割り当てレコードは削除されません。ただし、割り当て済みの時間はゼロになり、実績時間は保持されます。リソースの利用可能な時間と割り当て済みの時間も、アグリゲートテーブルで更新されます。

Example:
例 1：11 月 1 日から 1 月 31 日までの [月次] の割り当てタイプのリソース計画は、12 月 15 日に完了します。完了時に、

- 1 月のリソース割り当てエントリが [Resource_Allocation] テーブルから削除されます。
- 12 月のリソース割り当て終了日がリソース計画の完了日に更新されます。
- 完了日以降の 12 月の [Resource_Allocation_Daily] テーブルのエントリーが削除されます。

例 2：同じリソース計画に [予定期間] と割り当てタイプがある場合、割り当ては削除されず、割り当ての終了日が完了日に更新されます。

プロジェクト、計画立案コンソール、またはデマンドレコードからリソース計画を完了する

プロジェクトまたはプロジェクトタスクが「クローズ済み」とマークされている場合、プロジェクトマネージャーは関連する割り当て済みリソース計画を完了できます。同様に、デマンドマネージャーは、クローズ済みまたは保留デマンドのリソース計画を完了することができます。

始める前に
完了するリソース計画は、[割り当て済み] ステータスである必要があります。

必要なロール：it_project_manager または it_demand_manager

このタスクについて
プロジェクトまたはプロジェクトタスクが [完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、または [スキップしてクローズ] ステータスに移行すると、次の条件が満たされると、プロジェクトとプロジェクトタスクフォーム、および計画立案コンソールで、割り当てられたリソース計画を完了するためのメッセージが表示されます。

- 対応するリソース計画が [割り当て済み] ステータス
- リソースプランの開始日がプロジェクトまたはタスクの実際の終了日以前

デマンドが [クローズ済み] または [保留] ステータスに移行すると、リソース計画を完了するための同様のメッセージがデマンドフォームに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. プロジェクト、タスク、またはデマンドレコードを [クローズ済み] ステータスで開きます。

オプション	説明
クローズ済みプロジェクトレコードを開く	**a.** 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース. **b.** プロジェクトレコードを [クローズ済み] ステータスで開きます。 **c.** [詳細] タブを選択して、プロジェクトフォームを表示します。
クローズ済みプロジェクトタスクレコードを開く	**a.** 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース. **b.** 必要なプロジェクトレコードを開きます。 **c.** [プロジェクトタスク] 関連リストで、プロジェクトタスクレコードを [クローズ済み] ステータスで開きます。
計画立案コンソールでクローズ済みプロジェクトを開く	**a.** 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース. **b.** プロジェクトレコードを [クローズ済み] ステータスで開きます。 **c.** [計画] タブを選択すると、計画立案コンソールにプロジェクトが表示されます。
クローズ済みまたは保留デマンドレコードを開く	**a.** 移動先 デマンド > デマンド > すべて. **b.** [クローズ済み] または [保留] ステータスでデマンドレコードを開きます。

関連するリソース計画を完了するためのメッセージがレコードの上部に表示されます。

リソース計画を完了するためのメッセージ



注:
計画立案コンソールでは、プロジェクトタスクの [クローズ済み] ステータスに関係なく、プロジェクトが [クローズ済み] ステータスの場合にのみメッセージが表示されます。

2. 完了するリソース計画のリストを開くには、メッセージ内のリンクを選択します。

注:
計画立案コンソールで、プロジェクトを右クリックし、[リソース計画の完了] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- リストには、完了する必要があるレコードのリソース計画のみが含まれます。
- [プロジェクト] フォームのメッセージリンクからリストを開くと、プロジェクトのリソース計画とプロジェクトタスクが一覧表示されます。
- プロジェクトタスクフォームのメッセージリンクからリストを開くと、プロジェクトタスクのリソース計画のみが一覧表示されます。

3. リストで、完了するリソース計画を選択し、[完了] を選択します。
4. [確認] ダイアログボックスで、リソース計画の完了日を選択し、[はい] を選択します。

   デフォルトでは、システム日付またはリソース計画の終了日のいずれか早い方が [完了日] に入力されます。

   注:
   [完了日] はリソース計画開始日より前にすることはできません。

タスクの結果

- 選択したリソース計画が [完了] ステータスに移行します。
- 完了日がリソースプランの終了日よりも前の日付である場合、リソース計画の終了日が完了日で更新されます。入力された完了日がリソース計画の終了日より後の場合、リソース計画の終了日が保持されます。
- 完了日を過ぎたリソース計画のすべての要求された割り当てとリソース割り当てが削除されます。割り当てに対して実績時間が記録されている場合、その割り当てレコードは削除されません。ただし、割り当て済みの時間はゼロになり、実績時間は保持されます。リソースの利用可能な時間と割り当て済みの時間も、アグリゲートテーブルで更新されます。

リソース計画のキャンセル

リソース計画が不要になった場合は、キャンセルすることができます。これにより、過去および将来の割り当てもキャンセルされます。

始める前に

キャンセルされるリソース計画は、[計画]、[要求済み]、[確認済み]、または [割り当て済み] ステータスである必要があります。

必要なロール:resource_user、resource_manager

このタスクについて

プロジェクトマネージャーとデマンドマネージャーは、プロジェクト、プロジェクトタスク、計画立案コンソール、またはデマンドからリソース計画をキャンセルすることもできます。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > すべて.
2. キャンセルするリソース計画レコードを開きます。
3. フォームヘッダーで [キャンセル] を選択します。

タスクの結果

- その後、リソース計画は [キャンセル] ステータスに移行します。
- リソース計画に対する過去および将来のすべての割り当てもキャンセルされます。割り当てに対して実際の時間が記録されている場合、その割り当ては削除されません。ただし、割り当て済みの時間はゼロになり、実績時間は保持されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
変更を加えて計画を再度使用する場合は、キャンセルされた計画を編集します。リソース計画を [計画] ステータスに戻すには、[再計画] を選択します。

注:
リソース計画の状況は、過去に割り当てがない場合にのみ [キャンセル] から [計画] ステータスに戻すことができます。

プロジェクト、計画立案コンソール、またはデマンドレコードからリソース計画をキャンセルする

プロジェクトまたはプロジェクトタスクが「クローズ済み」とマークされている場合、プロジェクトマネージャーは関連する将来のリソース計画をキャンセルできます。同様に、デマンドマネージャーは、クローズ済みまたは保留デマンドの将来のリソース計画をキャンセルできます。

始める前に
キャンセルされるリソース計画は、[確認済み]、[計画]、または [要求済み] ステータスである必要があります。リソース計画の開始日がプロジェクト、タスク、またはデマンドの終了日より後の場合、割り当てられたリソースプランをキャンセルできます。

必要なロール：it_project_manager または it_demand_manager

このタスクについて
プロジェクトまたはプロジェクトタスクが [完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、または [スキップしてクローズ] ステータスに移行すると、次の条件の 1 つが満たされると、プロジェクトとプロジェクトタスクフォーム、および計画立案コンソールで、割り当てられたリソース計画をキャンセルするためのメッセージが表示されます。

- 対応するリソース計画が [確認済み]、[計画]、または [要求済み] ステータス
- リソースプランがプロジェクトまたはタスクの終了日より後の開始日の [割り当て済み] ステータス

デマンドが [クローズ済み] または [保留] ステータスに移行すると、リソース計画をキャンセルするための同様のメッセージがデマンドフォームに表示されます。

手順
1. プロジェクト、タスク、またはデマンドレコードを [クローズ済み] ステータスで開きます。

オプション	説明
クローズ済みプロジェクトレコードを開く	**a.** 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース. **b.** プロジェクトレコードを [クローズ済み] ステータスで開きます。 **c.** [詳細] タブをクリックして、プロジェクトフォームを表示します。
クローズ済みプロジェクトタスクレコードを開く	**a.** 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース. **b.** 必要なプロジェクトレコードを開きます。 **c.** [プロジェクトタスク] 関連リストで、プロジェクトタスクレコードを [クローズ済み] ステータスで開きます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	説明
計画立案コンソールでクローズ済みプロジェクトを開く	**a.** 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > プロジェクトワークスペース. **b.** プロジェクトレコードを [クローズ済み] ステータスで開きます。 **c.** [計画] タブをクリックすると、計画立案コンソールにプロジェクトが表示されます。
クローズ済みまたは保留デマンドレコードを開く	**a.** 移動先 すべて > デマンド > デマンド > すべて. **b.** [クローズ済み] または [保留] ステータスでデマンドレコードを開きます。

関連するリソース計画をキャンセルするためのメッセージがレコードの上部に表示されます。

リソース計画をキャンセルするためのメッセージ



注:
計画立案コンソールでは、プロジェクトタスクの [クローズ済み] ステータスに関係なく、プロジェクトが [クローズ済み] ステータスの場合にのみメッセージが表示されます。

2. キャンセルするリソース計画のリストを開くには、メッセージ内のリンクをクリックします。

   注:
   計画立案コンソールで、プロジェクトを右クリックし、[リソース計画をキャンセル] を選択します。

   - リストには、キャンセルできるレコードのリソース計画のみが含まれます。
   - [プロジェクト] フォームのメッセージリンクからリストを開くと、プロジェクトのリソース計画とプロジェクトタスクが一覧表示されます。
   - プロジェクトタスクフォームのメッセージリンクからリストを開くと、プロジェクトタスクのリソース計画のみが一覧表示されます。
3. リストで、キャンセルするリソース計画を選択し、[キャンセル] をクリックします。

タスクの結果

- 選択したリソース計画が [キャンセル] ステータスに移行します。
- リソース計画に対する過去および将来の割り当てはすべてキャンセルされます。割り当てに対して実績時間が記録されている場合、その割り当ては削除されます。この場合、割り当て済みの時間はゼロになり、実績時間はそのまま保持されます。

リソース計画の削除

プランを削除すると、関連するすべてのリソース割り当ても削除されます。

始める前に

必要なロール：resource_manager


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > すべて.
2. リソース計画を開き、フォームヘッダーで [削除] を選択します。
   確認メッセージが表示されます。

削除確認メッセージ

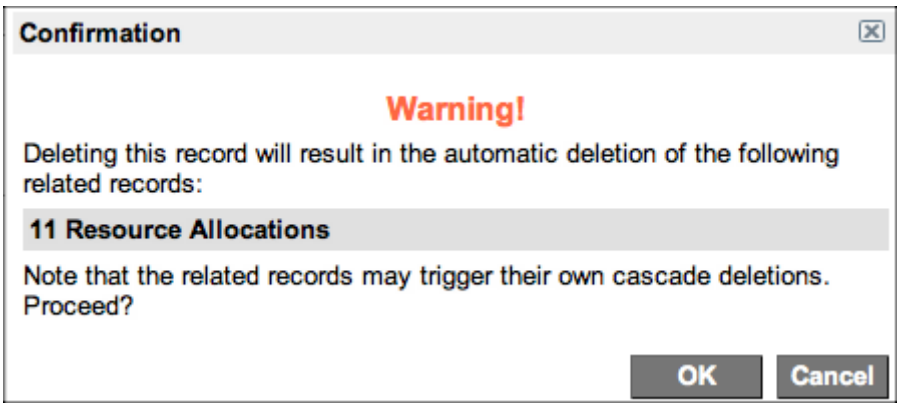

3. **[OK]** を選択します。
   リソース計画と関連するすべての割り当てが削除されます。

リソース計画の延長

割り当てられたリソース計画の日付を延長し、延長された期間にリソースを割り当てることができます。

始める前に

重要:
2026 年 3 月以降、新規顧客はリソース計画を利用できなくなります。

既存のリソース計画を、より柔軟性のあるリソースのアサインに取り組むように移行し、リソース管理ワークスペースの使用を開始することをお勧めします。

リソース要求者は、リソース管理ワークスペースを使用して、アサイン済みまたは未アサインのリソースのアサインを延長できます。

必要なロール：resource_manager

このタスクについて

プロジェクトの作業が開始されたが、プロジェクトが延長されたため、割り当てられたリソース計画の日付を延長する必要があるとします。このシナリオでは、割り当てられたリソース計画の日付を延長できます。リソース計画が延長される新しい日付は、既存の割り当て済みの時間には影響しません。リソース計画を延長する際に、新しい終了日と要求タイプを指定できます。選択した要求タイプに基づいて、必要な割り当て済みの時間が自動的に入力されます。

たとえば、2 か月に 100 時間を割り当て、毎月 50 時間を割り当てたとします。ここで、リソース計画を 1 か月延長するとします。延長月の場合、割り当てレコードは選択した要求タイプに基づいて作成されます。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > すべて.
2. リソース計画を開き、[リソース計画を拡張] を選択します。
3. **[OK]** を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [リソース計画を拡張] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
フィールド名の説明については、「[リソース計画を拡張] フォーム」を参照してください。

タスクの結果

- リソース計画の終了日が更新されます。
- [延長] フィールドに、ステータスが [割り当て済み]として表示されます。
- 延長期間の場合、割り当てレコードは選択した要求タイプに基づいて作成されます。
- 要求された FTE 数、時間数、または人日数は、割り当て期間ごとに均等に分割され、各割り当てレコードに事前に入力されます。
- リソース計画を延長すると、時給を取得するためのレートモデルが呼び出されます。

割り当てられたリソース計画の延長の要求

プロジェクトマネージャーは、割り当てられたリソース計画の延長を要求できます。

始める前に

重要:
2026 年 3 月以降、新規顧客はリソース計画を利用できなくなります。

既存のリソース計画を、より柔軟性のあるリソースのアサインに取り組むように移行し、リソース管理ワークスペースの使用を開始することをお勧めします。

リソース要求者は、リソース管理ワークスペースを使用してリソースのアサインを延長できます。

必要なロール：it_project_manager、resource_user

このタスクについて
リソースが割り当てられたプロジェクトが 1 か月遅れると仮定します。期間のリソースが必要な場合は、プロジェクトマネージャーとして、リソース計画の延長を要求できます。このオプションは、リソース計画が [割り当て済み] ステータスの場合にのみ使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > すべて.
2. リソース計画を開き、[拡張を要求] を選択します。
3. [拡張を要求] フォームのフィールドに入力します。
フィールド値の説明については、「[拡張を要求] フォーム」を参照して ください。

タスクの結果
リソース計画の終了日が更新され、[延長] フィールドが [要求済み] に設定されます。

次のタスク
延長期間にリソースを割り当てる。

延長期間にリソースを割り当てる

リソースマネージャーは、延長期間にリソースを割り当てることができます。

始める前に
必要なロール：resource_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
プロジェクトマネージャーが、割り当てられたリソース計画を延長する要求を送信した後、リソースマネージャーはリソース計画の上部にメッセージを受け取ります。次に、リソースマネージャーは、延長期間にリソースを確認して割り当てます。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > すべて.
2. リソース計画を開きます。
3. 次のいずれかの方法で拡張を確認します。
   - [リソース割り当て] 関連リストで、[要求された時間]、**[FTE]**、または [人日] フィールドの値を確認して更新します。
   - [拡張] フィールドで [割り当て済み] を選択します。

タスクの結果
リソースは延長期間に割り当てられます。

割り当て中のエラーまたは警告は、[リソースプラン] フォームの [リソースプランログ] 関連リストに記録されます。特定の日にリソースが 24 時間を超えて割り当てられた場合、ログが生成されます。これらのログを確認して、適切なアクションを実行し、さらにリソースを割り当てることができます。

リソース計画の期間の短縮

リソースごとに個別に行う必要なく、割り当てられたまたは確認されたリソース計画の期間を短縮し、1 つのアクションでリソースの割り当てを解除します。

始める前に

重要:
2026 年 3 月以降、新規顧客はリソース計画を利用できなくなります。

既存のリソース計画を、より柔軟性のあるリソースのアサインに取り組むように移行し、リソース管理ワークスペースの使用を開始することをお勧めします。

リソース要求者は、リソース管理ワークスペースを使用して、アサイン済みまたは未アサインのリソースのアサインを移動できます。

必要なロール：resource_manager

このタスクについて
リソース計画の終了日が現在の日付より後の場合にのみ、割り当て済みまたは確認済みのリソース計画を減らすことができます。

ステータスが割り当てられている場合にのみ、運用リソース計画の期間を短縮できます。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > すべて.
2. リソース計画を開き、[短縮] を選択します。
   リソース計画の終了日を減らすと、新しい終了日以降にリソース割り当てが削除され、すべてのリソースが解放されます。

   リソース計画に将来の実績が転記されていない場合、リソース計画を短縮すると、リソースの割り当て済みまたは確認済みの時間がすべて解放されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

実績が将来転記される場合、リソース計画の終了日は実績が存在する将来の日付に更新され、実績が存在する日から元の終了日までのすべてのリソースのすべての割り当て済みまたは確認済みの時間がリリースされます。

3. リソース計画の新しい終了日を [終了日] フィールドに入力します。
4. 確認メッセージで [はい] を選択します。

タスクの結果

- リソース計画の終了日が新しい短縮終了日に更新されます。
- リソース計画の状況は変わりません。
- リソース計画に将来の実績が転記されていない場合、リソースの割り当て済みまたは確認済みの時間はすべて解放されます。
- 実績が将来転記される場合、リソース計画の終了日は実績が存在する将来の日付に更新され、実績が存在する日から元の終了日までのすべてのリソースのすべての割り当て済みまたは確認済みの時間がリリースされます。

Example: 実績に関するリソース割り当て

たとえば、2021 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までの 1 FTE のリソース計画が作成され、2021 年 3 月 1 日にリソース計画の終了日が 2021 年 3 月 1 日に更新されたとします。この場合、2021 年 3 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までのこのプランで割り当てられた、または確認されたリソースのすべての時間が解放されます。たとえば、2021 年 5 月 25 日など、将来の実績が転記された場合、リソース計画の終了日は 2021 年 5 月 25 日として更新され、2021 年 3 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までの確認済みまたは割り当て済みのすべての時間がリリースされます。

リソース計画のタイムゾーン

リソースタスクを実行するユーザーとグループが異なる地域にいる場合、リソース管理においてタイムゾーンが重要になります。

ユーザーは [自分のカレンダー] モジュールで時間を管理し、リソースマネージャーはリソースワークベンチまたはリソース計画を使用して、さまざまなユーザーにタスクを割り当てます。

すべてのユーザーにスケジュールが割り当てられます。ユーザーのスケジュールが変更されると、すべての時間計算が自動的に変更されます。スケジュールは、フローティングまたはタイムゾーン固有にすることができます。

- フローティングスケジュールはどのタイムゾーンでも同じです。たとえば、アムステルダムのリソースマネージャーがフローティングスケジュールを午前 8 時から午後 5 時までに設定した場合、サンノゼのユーザーにはそのスケジュールが午前 8 時から午後 5 時と表示されます。
- スケジュールが特定のタイムゾーンで定義されている場合、異なるタイムゾーンのユーザーには、自分のタイムゾーンが適用されたスケジュールが表示されます。たとえば、リソースマネージャーが、タイムゾーン固有のスケジュールを午前 8 時から午後 5 時までに設定した場合、サンノゼのユーザーには、前日の午後 11 時から現在の日の午前 7 時までのスケジュールが表示されます。これは、サンノゼのタイムゾーンがアムステルダムのタイムゾーンより 9 時間遅れているためです。

タイムカードをリソース計画に関連付ける

1 つのリソースが 2 つのリソース計画で同じ名前のタスクに割り当てられている場合は、次の手順を使用して、タイムカードを割り当てるリソース計画を指定します。

始める前に

必要なロール：resource_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて


- リソース計画にユーザーのハード割り当てが含まれている場合にのみ、リソース計画をタイムカードに関連付けることができます。
- リソース計画が手動でタイムカードに関連付けられていない場合、リソース計画は自動的に関連付けられます。自動関連付けは、タイムカードで選択した [タスク] に基づいて行われます。

手順

1. に移動します すべて > タイムカード > すべて.
2. タイムカードを選択します。
3. [リソースプラン] フィールドを追加するフォームを設定します。
4. [リソース計画] フィールドで、タイムカードの割り当て先の計画を選択します。

   選択したタスクを含むリソース計画のみが一覧表示されます。

   リソースプランを含むタイムカード

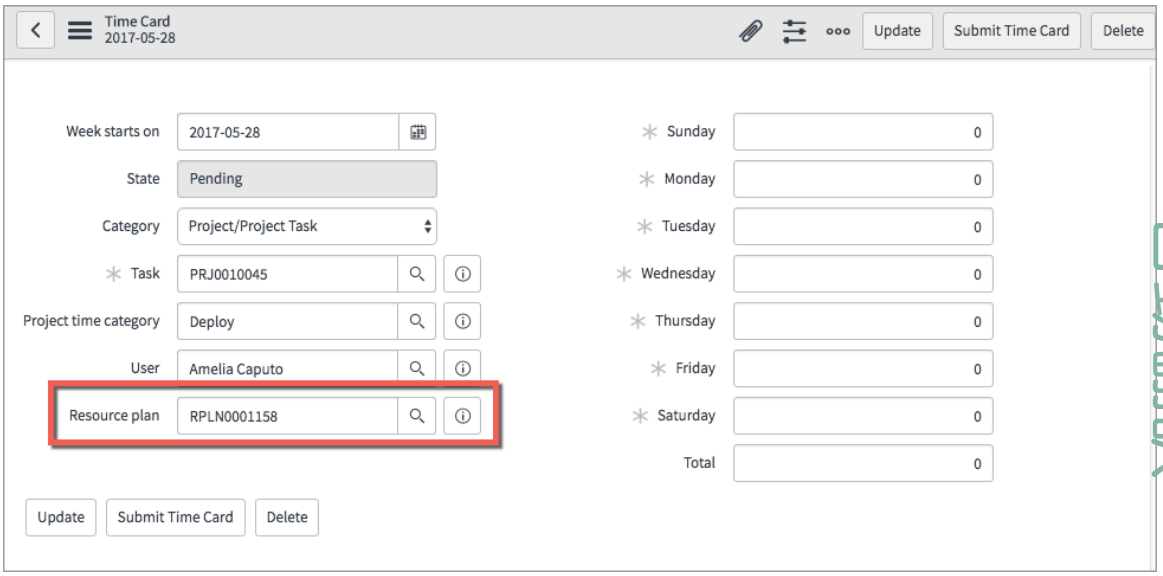

5. [更新] を選択します。

リソース計画、運用リソース計画、およびコスト計画の移行

プロジェクトワークスペースを使用して、リソース計画をリソースのアサインに、関連するコスト計画をプロジェクトまたはデマンドの属性ベースの人件費に簡単に移行し、リソースの割り当てを簡単に処理できます。

ヒント:
リソースマネージャーは、次のものを表示することをお勧めします リソース管理ワークスペース ブートキャンプ リソース管理の ネクストエクスペリエンスへの移行について学習します。

リソース計画からリソースのアサインへの移行

計画属性に応じてプロジェクトまたはデマンドのすべてのリソース計画を属性ベースのリソースのアサインに移行し、プロジェクトワークスペースおよび キャパシティ計画を使用して Next Experience でプロジェクトを簡単に管理できるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グループ、スキル、およびロールは、リソースのアサインに移行されるリソース計画に応じて、リソース管理で有効になるプライマリ属性です。

重要:
[計画]、[要求済み]、[確認済み]、[割り当て済み]、[却下済み]、および [完了] 状況のリソース計画のみが、リソースのアサインに移行されます。[キャンセル済み] および [対応中] 状況のリソース計画は移行されません。

リソース計画の状況がリソースのアサインのステータスにどのようにマッピングされるかを以下に示します。

リソース計画とリソースのアサイン間のステータスマッピング

リソース計画の状況	リソースのアサインのステータス
計画済みまたは要求済み	未アサイン
割り当て済み	承認済み
確認済み	承認済み
完了	承認済み
キャンセル済みまたは対応中	リソース計画は移行されない
却下	未承認

リソース計画が移行されると、リソース計画のプライマリ属性に基づいて対応するリソースのアサインが作成されます。リソースのアサインは、割り当てタイプと割り当て分散のカスタム選択をサポートしていません。

リソース計画の移行では、次のようになります。

- リソース計画が [計画中] または [要求済み] 状況の場合、リソースのアサインは、デフォルトのステータスが [未アサイン] で、予定日と計画期間に基づいて作成される。
- 割り当てタイプが計画された期間に設定される。
- 割り当て分散は常に [均等] である。
- 既存のリソース割り当ては削除され、リソース名と計画された期間を含むリソース割り当てに対応するために再度作成される。
- 割り当てられたコストと割り当てられた時間が、計画コストと予定時間数にコピーされる。
- [確認済み] および [割り当て済み] ステータスのリソース計画の実際の時間数は、リソース計画とともに保持される。


注:
リソースのアサインはプライマリ属性 (グループ、スキル、およびロール) の一意の組み合わせごとに 1 つのみ作成され、選択したメンバー設定でリソース計画が作成されている場合は、ユーザーごとに 1 つ作成されます。移行後に、既存の組み合わせのいずれかを使用してリソースのアサインを作成すると、利用可能なリソースのアサインが新しい要求で更新されます。

Example: リソース計画からリソースのアサインへの移行

さまざまな状況のリソース計画：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

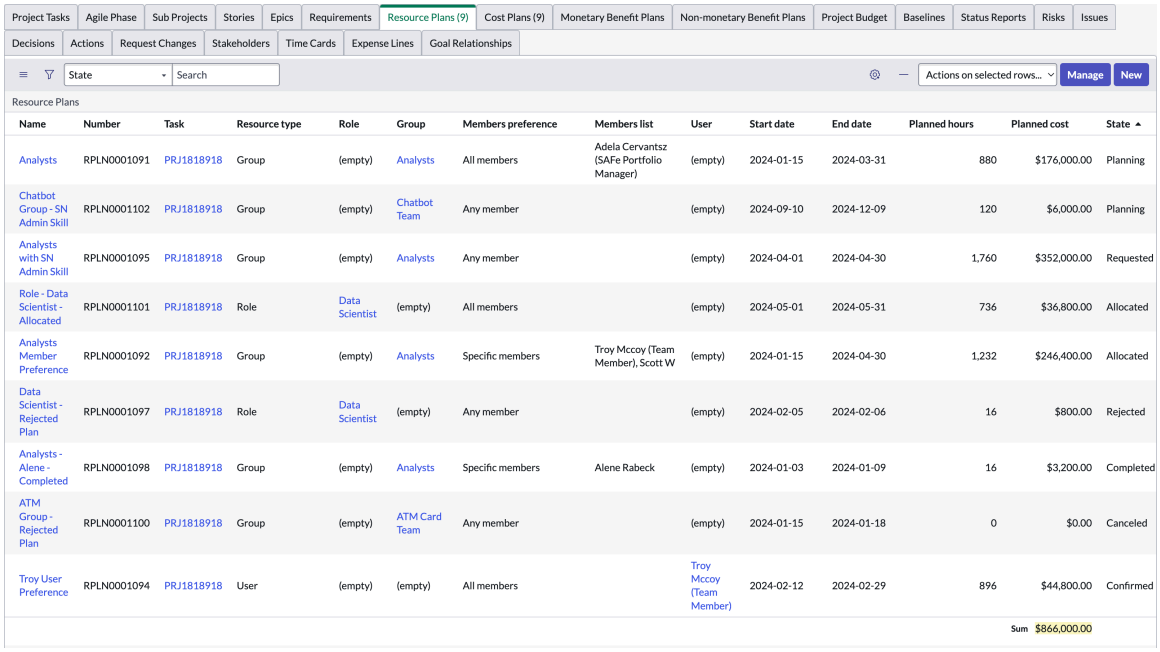

Project Tasks | Agile Phase | Sub Projects | Stories | Epics | Requirements | Resource Plans (9) | Cost Plans (9) | Monetary Benefit Plans | Non-monetary Benefit Plans | Project Budget | Baselines | Status Reports | Risks | Issues

Decisions | Actions | Request Changes | Stakeholders | Time Cards | Expense Lines | Goal Relationships

State | Search | Actions on selected rows... | Manage | New

Resource Plans

Name	Number	Task	Resource type	Role	Group	Members preference	Members list	User	Start date	End date	Planned hours	Planned cost	State
Analysts	RPLN0001091	PRJ1818918	Group	(empty)	Analysts	All members	Adela Cervantsz (SAFe Portfolio Manager)	(empty)	2024-01-15	2024-03-31	880	$176,000.00	Planning
Chatbot Group - SN Admin Skill	RPLN0001102	PRJ1818918	Group	(empty)	Chatbot Team	Any member		(empty)	2024-09-10	2024-12-09	120	$6,000.00	Planning
Analysts with SN Admin Skill	RPLN0001095	PRJ1818918	Group	(empty)	Analysts	Any member		(empty)	2024-04-01	2024-04-30	1,760	$352,000.00	Requested
Role - Data Scientist - Allocated	RPLN0001101	PRJ1818918	Role	Data Scientist	(empty)	All members		(empty)	2024-05-01	2024-05-31	736	$36,800.00	Allocated
Analysts Member Preference	RPLN0001092	PRJ1818918	Group	(empty)	Analysts	Specific members	Troy Mccoy (Team Member), Scott W	(empty)	2024-01-15	2024-04-30	1,232	$246,400.00	Allocated
Data Scientist - Rejected Plan	RPLN0001097	PRJ1818918	Role	Data Scientist	(empty)	Any member		(empty)	2024-02-05	2024-02-06	16	$800.00	Rejected
Analysts - Alene - Completed	RPLN0001098	PRJ1818918	Group	(empty)	Analysts	Specific members	Alene Rabeck	(empty)	2024-01-03	2024-01-09	16	$3,200.00	Completed
ATM Group - Rejected Plan	RPLN0001100	PRJ1818918	Group	(empty)	ATM Card Team	Any member		(empty)	2024-01-15	2024-01-18	0	$0.00	Canceled
Troy User Preference	RPLN0001094	PRJ1818918	User	(empty)	(empty)	All members		Troy Mccoy (Team Member)	2024-02-12	2024-02-29	896	$44,800.00	Confirmed
											Sum	$866,000.00	

リソースのアサインとして移行されたリソース計画：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



Project Tasks | Agile Phase | Sub Projects | Stories | Epics | Requirements | Resource Plans (9) | Cost Plans (11) | Monetary Benefit Plans | Non-monetary Benefit Plans | Project Budget | Baselines | Status Reports | Risks | Issues

Decisions | Actions | Request Changes | Stakeholders | Time Cards | Expense Lines (3) | Goal Relationships | Resource assignments (35)

Number | Search | Actions on selected rows... | New

Task = PRJ1818918

Number	Resource	Group	Role	Skill	Effort type	Effort	Start date	End date	Resource status	Planning item	Resource rate	Resource plan	Plan type
RA0001621	(empty)	Analysts	(empty)	(empty)	FTE	2	2024-01-15	2024-03-31	Unassigned	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001091	Task
RA0001622	(empty)	Chatbot Team	(empty)	ServiceNow Administration	Hours	120	2024-09-10	2024-12-09	Unassigned	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001102	Task
RA0001623	(empty)	Analysts	(empty)	ServiceNow Administration	FTE	10	2024-04-01	2024-04-30	Unassigned	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001095	Task
RA0001620	(empty)	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	1	2024-02-05	2024-02-06	Unapproved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001097	Task
RA0001619	Troy Mccoy (Team Member)	Analysts	(empty)	(empty)	FTE	0.99	2024-01-15	2024-04-30	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001092	Task
RA0001618	Scott W	Analysts	(empty)	(empty)	FTE	1	2024-01-15	2024-04-30	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001092	Task
RA0001617	Shane McConnell	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001616	Salem O'Connell	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001615	Nicolas Butler	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001613	Lily Schroeder	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001614	Madilynn Vance	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001612	Leighton Olson	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001611	Lauryn King	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001610	Lana Gordon	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001609	Kyrie Owens	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001608	Karter Thornton	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001607	Julian Ibarra	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001606	Jillian Myers	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001605	Jaxtyn Sanchez	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001604	Jaxon Caldwell	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001603	Izaiah Wiley	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001602	Isabel Shields	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001601	Halo Perkins	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001598	Devon Lamb	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001599	Evelynn Eaton	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001600	Haisley Bryan	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001597	Casen Reeves	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001596	Aron Guevara	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001595	Aria Mitchell	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001594	Amaya Sims	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001592	Alexia Wyatt	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001593	Amaia Hull	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001591	Adam McCarty	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001590	Alene Rabeck	Analysts	(empty)	(empty)	Person days	2	2024-01-03	2024-01-09	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001098	Task
RA0001589	Troy Mccoy (Team Member)	(empty)	(empty)	(empty)	FTE	2.9	2024-02-12	2024-02-29	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001094	Task

1 to 35 of 35

運用リソース計画から運用リソースのアサインへの移行

運用リソース計画も同じロジックに従って、運用リソース計画を運用リソースのアサインに移行します。


> **重要:**
> [割り当て済み] および [完了] 状況の運用リソース計画は、運用リソースのアサインとしてのみ移行されます。

移行後、運用リソース計画の要求タイプは [時間] に変更されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


Example: 運用リソース計画から運用リソースのアサインへの移行

デモグループ A に対して作成された割り当て済みステータスの運用リソース計画：

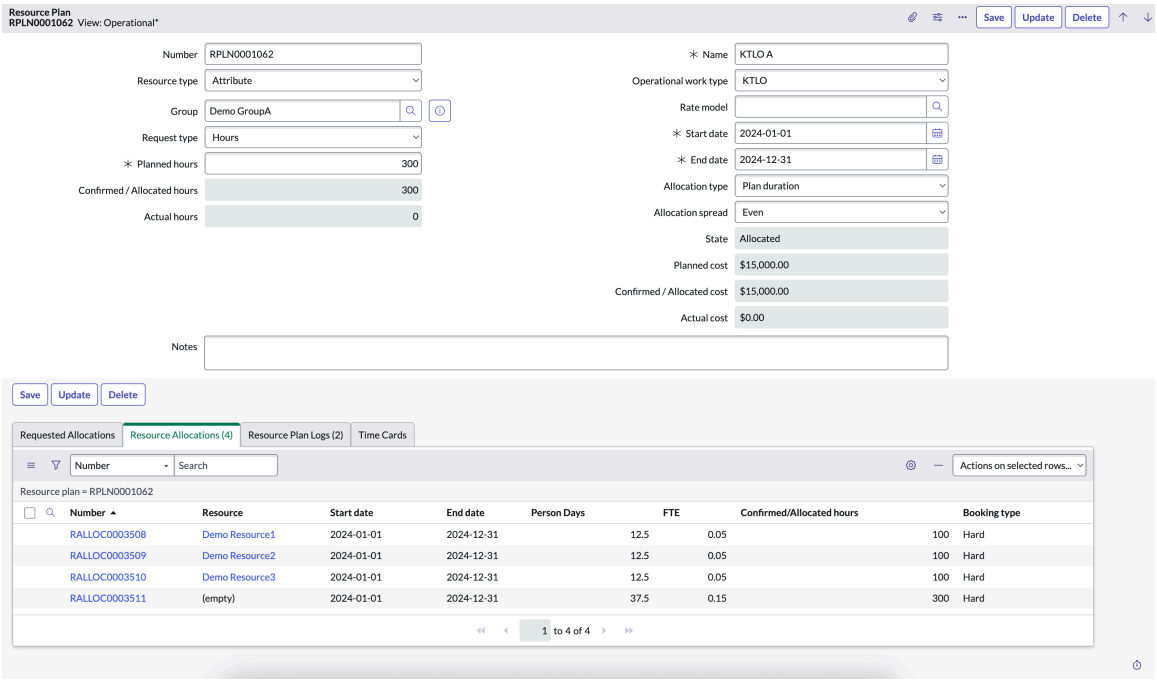

移行後、グループのすべてのメンバーに対して次の運用リソースのアサインが行われます。

注:
親子マッピングは保持され、リソースが空の追加のリソースのアサインが表示される場合があります。



Number	Resource	Group	Role	Skill	Effort type	Effort	Start date	End date	Resource status	Operational work type
RA0001254	Demo Resource1	Demo GroupA	(empty)	(empty)	% Capacity	4.77	2024-01-01	2024-12-31	Approved	KTLO
RA0001256	Demo Resource3	Demo GroupA	(empty)	(empty)	% Capacity	4.77	2024-01-01	2024-12-31	Approved	KTLO
RA0001255	Demo Resource2	Demo GroupA	(empty)	(empty)	% Capacity	4.77	2024-01-01	2024-12-31	Approved	KTLO
RA0001253	(empty)	Demo GroupA	(empty)	(empty)	% Capacity	4.77	2024-01-01	2024-12-31	Approved	KTLO

コスト計画から属性ベースのコスト計画への移行

プロジェクトまたはデマンドのリソース計画がリソースのアサインに移行されると、リソース計画に基づいて対応する財務コスト計画が新しい属性ベースの人件費に移行されます。[リソース計画を移行 (Migrate resource plans)] 関連リンクトリガーは、リソース計画の移行とともにコスト計画を移行します。

すべてのリソース計画には、原価費目として人件費の投資を含むコスト計画が関連付けられています。移行中に、リソース計画の計画属性が分析され、 財務に対して有効になっている 3 つの計画属性 (従業員タイプ、経費タイプ、およびロール) の一意の組み合わせに対して属性ベースのコスト計画が作成されます。移行後、リソースのアサインと属性ベースのコスト計画の間に 1 対 1 の関連付けは存在しません。


注:
リソース計画が従業員タイプにもロールにも関連付けられていない場合、移行されたコスト計画のコストは単一のコスト計画に統合されます。

計画コストは新しい属性ベースのコスト計画に移行されますが、実績コストは既存のコスト計画レコードに残ります。プロジェクトまたはデマンドに関連付けられたレートモデル値は、属性ベースの人件費を生成する際に考慮されます。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: コスト計画から属性ベースのコスト計画への移行

リソース計画に関連付けられたコスト計画：



属性ベースのコスト計画 **Resource_Internal_Capex** は移行後に作成されます。



プロジェクトとデマンドのリソース計画とコスト計画の移行

プロジェクトまたはデマンドのリソース計画とコスト計画をリソースのアサインと属性ベースのコスト計画に移行し、プロジェクトワークスペースを使用してリソースの割り当てとプロジェクトの財務に対応します。

始める前に

- リソース計画、運用リソース計画、およびコスト計画の移行 の詳細を確認してください。
- プロジェクトまたはデマンドにリソース計画とコスト計画があることを確認します。
- 必要なロール：resource_user

手順


1. プロジェクトまたはデマンドを開くには、次のいずれかのオプションを使用します。
   - プロジェクトを開くには、 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて をクリックし、プロジェクトを開きます。
   - デマンドが未解決すぎる場合は、次に移動します: すべて > デマンド > デマンド > すべて をクリックし、デマンドを開きます。
2. [リソース計画を移行 **(Migrate resource plans)]** 関連リンクを選択します。

   注:
   この選択により、リソース計画とコスト計画の移行が同時にトリガーされます。

3. [リソース計画を移行 (Migrate resource plans)] 確認ウィンドウで、**[OK]** を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



ヒント:
リソース計画とコスト計画を移行するスケジュール済みジョブのアクティブ化ができます。

タスクの結果
リソース計画はリソースのアサインに移行され、コスト計画は属性ベースのコスト計画に移行されます。プロジェクトページを更新して、[リソースのアサイン] 関連リストにリソースのアサインを表示します。

次のタスク
リソースのアサインを作成して、リソースの工数を管理します。

属性ベースのリソースのアサインを有効にする

属性ベースのリソースのアサインを処理して計画立案アイテムの工数を要求するには、プロパティを有効にします。

始める前に

- プロジェクト、デマンド、またはタスクに少なくとも 1 つの属性ベースのリソース計画がある場合、[リソース計画] 関連リストは非表示になります。
- プロジェクト、デマンド、またはタスクに属性ベースのリソースのアサインのないリソース計画が少なくとも 1 つある場合は、[リソース計画] 関連リストが表示されます。
- プロジェクト、デマンド、またはタスクにリソース計画がなく、*sn_pw.enable_resource_planning* プロパティが有効になっている場合は、[リソースのアサイン] 関連リストを使用できます。それ以外の場合は、[リソース計画] 関連リストが使用可能になります。
- プロジェクト、デマンド、またはタスクに少なくとも 1 つの属性ベースのリソースのアサインがある場合、リソース計画の [新規] オプションと [管理] オプションは非表示になります。
- プロジェクト、デマンド、またはタスクに属性ベースのリソースのアサインのないリソース計画が少なくとも 1 つある場合は、リソース計画で [新規] オプションと [管理] オプションを使用できます。
- プロジェクト、デマンド、またはタスクにリソース計画がなく、*sn_pw.enable_resource_planning* プロパティが有効になっている場合、リソース計画の [新規] および [管理] オプションは非表示になります。それ以外の場合は使用できます。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > すべて.
2. [名前] フィールドをフィルタリングし、 **sn_pw.enable_resource_planning** を見つけて開きます。
3. インスタンスのスコープを プロジェクトワークスペースに変更します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [値] フィールドをクリアし、「 **true**」と入力します。
5. **[Update** (更新)] を選択します。

リソースのアサイン作成

リソースのアサインを作成して、プロジェクトまたはデマンドのチームまたはリソースのキャパシティの一部を要求します。

始める前に

- プロジェクトとデマンドのリソース計画とコスト計画の移行
- リソースのアサインのみで作業を作成するには、リソース計画プロパティを true に設定します。詳細については、「属性ベースのリソースのアサインを有効にする」を参照してください。
- 必要なロール:resource_user、resource_manager、it_project_manager、demand_manager、admin

手順

1. プロジェクトまたはデマンドを開くには、次のいずれかのオプションを使用します。
   - プロジェクトを開くには、 すべて > プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて をクリックし、プロジェクトを開きます。
   - デマンドが未解決すぎる場合は、次に移動します: すべて > デマンド > デマンド > すべて をクリックし、デマンドを開きます。
2. [リソースのアサイン] 関連リストで、[新規] を選択します。
3. [リソースのアサイン] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[リソースのアサイン] フォーム」を参照してください。
4. **[Submit** (送信)] を選択します。

> ヒント:
> リストビューから子リソースのアサインを編集できます。

運用リソース計画の移行

必要な運用リソース計画を属性ベースの運用リソースのアサインに移行します。

始める前に

必要なロール:resource_manager、it_project_manager、demand_manager、admin

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > すべての運用計画.
2. 移行する運用リソース計画のリストを選択します。
3. [選択した行のアクション...] リストから [リソース計画を移行 **(Migrate resource plans)]** を選択します。
   運用リソース計画は、運用リソースのアサインに移行されます。運用リソースのアサインのリストは、 すべて > リソース > リソースのアサイン > 運用リソースのアサイン.

> ヒント:
> リソース計画とコスト計画を移行するスケジュール済みジョブのアクティブ化できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

運用リソースのアサイン作成

運用リソースのアサインを作成し、管理作業、会議、トレーニングなどの運用作業にチームまたはリソースキャパシティの一部を割り当てます。

始める前に
必要なロール:resource_user、resource_manager、it_project_manager、demand_manager、admin

手順

1. 移動先 すべて > リソースのアサイン > 運用リソース計画のアサインを作成.
2. [リソースのアサイン] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[リソースのアサイン] フォーム」を参照してください。
3. [送信] を選択します。

タスクの結果
運用リソースのアサインが作成されます。次に移動できます すべて > リソースのアサイン > 運用リソースのアサイン 運用リソースのアサインのリストを表示します。

リソース計画とコスト計画を移行するスケジュール済みジョブのアクティブ化

「リソース計画を移行 (Migrate resource plans)」スケジュール済みジョブをアクティブ化して、プロジェクトとデマンドのリソース計画、運用リソース計画、およびコスト計画を、リソースのアサインと属性ベースのコスト計画に移行します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [名前] フィールドをフィルターし、[リソース計画を移行 **(Migrate resource plans)]** スケジュール済みジョブを見つけて開きます。
3. [アクティブ] オプションを選択してジョブをアクティブ化してスケジュールします。
4. [スケジュール済みスクリプト実行] フォームのフィールドを編集してジョブをカスタマイズし、要件を満たします。
   フィールドの説明とスクリプトの詳細については、「Automatically run a script of your choosing」を参照してください。
5. [今すぐ実行] を選択してスケジュール済みジョブを実行するか、[更新] を選択して変更を保存します。
   または、リソース計画を移行し、必要なプロジェクトとデマンドの運用リソース計画を移行することもできます。

リソース計画に対する要求された割り当ての作成

要求された割り当ては、リソース計画が送信され、[計画] ステータスになると自動的に作成されます。必要に応じて、リソース要求者は、[計画] または [却下] ステータスのリソース計画に対して、要求された新しい割り当てを作成できます。リソースマネージャーは、[要求済み] ステータスのプランに対して要求された割り当てを作成できます。

始める前に
必要なロール：resource_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
要求された割り当てには、名前付きリソースの割り当てがありません。開始日、終了日、および予定時間の詳細のみが表示されます。

月次または週次の割り当てタイプのリソース要件の分割を指定するために、要求された割り当てを変更できます。たとえば、1 月から 2 月に 100 時間のリソースを要求しましたが、1 月に 20 時間、2 月に 80 時間のリソースが必要であるとします。これらの詳細は、[要求された割り当て] フォームで指定できます。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > 計画 または却下。
2. リソース計画を開きます。
3. [要求された割り当て] 関連リストで、[新規] を選択します。
4. [要求された割り当て] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「[要求された割り当て] フォーム」を参照して ください。
5. レコードを保存してリソース計画に戻るには、[送信] を選択します。

Example:
リソースが 9 月 1 日から 11 月 30 日まで 360 時間要求された場合、要求された割り当てレコードは次のように作成されます。

ケース 1：計画期間割り当てタイプ

計画期間割り当てタイプの場合、次の要求された割り当てレコードが作成されます。

開始日	終了日	予定時間数
9 月 1 日 (リソースプラン開始日)	11 月 30 日 (リソースプラン終了日)	360

ケース 2：月次割り当てタイプ

月次割り当てタイプの場合、時間は次のように稼働日に基づいて比例割り当てされます。

- 計画期間の合計作業日数 = 65 日
- 作業日あたりの割り当て時間 = 360/65 = 5 時間

次の要求された割り当てレコードが作成されます。

開始日	終了日	稼働日数	予定時間数
9 月 1 日	9 月 30 日	22	22 * 5 = 110
10 月 1 日	10 月 31 日	21	21 * 5 = 105
11 月 1 日	11 月 30 日	22	22 * 5 = 110

週次割り当ての場合、要求された割り当てレコードは月次と同様に作成されます。月ごとに 1 つずつ、合計 3 つの割り当てレコードが作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソース割り当て

リソース要求者がリソース計画を作成した後、リソースマネージャーはリソースを確認して、プランを [確認済み] ステータスに移行できます。リソースマネージャーは、リソースをプランに割り当て、それを [割り当て済み] ステータスに移行できます。

カレンダーとスケジュールの情報に基づいて、Resource Manager (リソースマネージャー) はリソースの可用性を表示し、確認して特定のタスクに割り当てることができる管理下のリソースを選択します。

ソフト割り当てとハード割り当て

リソース計画が [確認済み] ステータスに移行すると、要求された割り当てに対応するリソース割り当てが自動的に作成されます。これらの割り当ての [予約タイプ] は [ソフト] です。ソフト割り当ては、要求されたユーザーの一時的な割り当てに似ており、カレンダーイベントを作成しません。

プランが [割り当て済み] ステータスに移行すると、[予約タイプ] が [ソフト] から [ハード] に変更されます。ハード予約の場合、リソースはプランに割り当てられ、割り当て済みの時間内に他のプランで利用することはできません。予約時間はユーザーカレンダーにも表示されます。要求されたリソースを割り当て期間全体にわたって割り当てることができない場合、割り当てレコードの予約タイプは [ソフト] のままになります。

割り当て中のエラーまたは警告は、[リソースプラン] フォームの [リソースプランログ] 関連リストに記録されます。これらのログを確認して、適切なアクションを実行し、さらにリソースを割り当てることができます。

注:
リソースプロパティ *com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes* を使用すると、10 進数値でソフト割り当てとハード割り当てを作成できます。

ソフト割り当ての時間の計算

ケース 1：比例割り当て

たとえば、[メンバー設定] 値が [すべてのメンバー] または [特定のメンバー] に設定されている場合に、2 つのリソースを持つグループに要求された割り当ては次のようになります。

開始日	終了日	予定時間数
10 月 3 日	10 月 7 日	40

デフォルトでは、[リソースプラン] フォームの予定時間数は、要求された各割り当てレコードの作業日数に基づいて、要求されたすべての割り当てに比例割り当てされます。

リソース	リソースの休暇	利用可能なキャパシティ (時間)	ソフト割り当て時間
リソース 1	2 日間	3 * 8 = 24	24 * 0.625 = 15
リソース 2		5 * 8 = 40	40 * 0.625 = 25

次の計算が使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 合計利用可能キャパシティ = 利用可能キャパシティユーザー 1 + 利用可能キャパシティユーザー 2 = 24 + 40 = 64 時間
- 利用可能なキャパシティの 1 時間あたりの割り当て時間 = 予定時間/利用可能な総キャパシティ = 40/64 = 0.625 時間

注:
グループリソース計画に対して要求された 1 つの割り当てに対して、複数のソフト割り当てを作成できます。

ケース 2：利用可能な最も利用可能なリソースが最初に要求される

たとえば、[メンバー設定] 値が [すべてのメンバー] に設定されている場合に、3 つのリソースを持つグループに要求された割り当ては次のようになります。

開始日	終了日	予定時間数
10 月 3 日	10 月 7 日	40

指定された期間内に最も利用可能なリソースが検索され、これらのリソースに対するソフト割り当てが作成されます。

リソース	利用可能な時間	ソフト割り当て時間
リソース 1	24	10
リソース 2	30	30
リソース 3	20	

リソース 2 は最も利用可能なリソースです。リソース 2 から利用可能なすべての時間を消費するまで、最初にリソース 2 のソフト割り当てが作成されます。その後、次に利用可能なリソースに移動し、以下同様に続きます。すべてのリソースの利用可能時間が消費され、すべてのメンバーに割り当てた後も予定時間が残っている場合 (利用可能なものが最も多いものから少ないものへ)、残りの時間はすべてのリソースに均等に割り当てされます。

ハード割り当ての時間の計算

ケース 1：均等に分散

ハード割り当て分散タイプとして [均等] を選択すると、すべての営業日に時間を均等に分割することにより、リソースのリソースイベントが作成されます。

スマート均等負荷割り当て分散は、割り当て時にリソースの可用性を考慮に入れ、可能な場合にのみ時間を均等に適用します。リソースが 1 日過剰に割り当てられている場合、その日をバイパスし、リソース計画が履行されるまで次の日に割り当てを再開します。

たとえば、1 週間に 20 時間要求されたリソースの場合、均等に分散されたハード割り当ては次のようになります。

曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
利用可能な時間	6	6	6	6	休暇
割り当て済みの時間	5	5	5	5	0

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ケース 2：フロントロード

ハード割り当て分散タイプとして [フロントロード] を選択すると、割り当ての開始日から利用可能なすべてのリソーススロットがいっぱいになります。リソースが開始日と終了日の間に完全に割り当てられると、残りの時間は開始日から最大 24 時間まで入力されます。

たとえば、1 週間に 20 時間要求されたリソースの場合、フロントロード分散のハード割り当ては次のようになります。

曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
利用可能な時間	6	6	6	6	休暇
割り当て済みの時間	6	6	6	2	0

ハード割り当て中のイベント作成

イベントの最小単位を制御するには、カレンダーイベント期間 (分) (*com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes property*) を変更します。デフォルトは 60 分です。

リソース割り当てでは、このプロパティを使用して 10 進数値で割り当てを作成します。次のテーブルを使用して、プロパティ値を正しく設定してください。

ユーザーの予定時間	カレンダーイベント期間値
0.5	30
0.25/0.5/0.75	15
0.2/0.4/0.6/0.8	12
0.1、0.2 など	6

自動翻訳

例：1 週間で 4 時間、割り当て間隔は 60 分

月曜日から木曜日までの 60 分のブロックを作成します。

月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
60 分	60 分	60 分	60 分	

例：1 週間で 4 時間、割り当て間隔は 30 分

このプロパティの値が 30 分に設定されており、1 時間をユーザーに割り当てる必要がある場合、ユーザーが空いているときにその割り当ては 2 つの 30 分ブロックに分割されます。この設定では月曜日から水曜日まで 60 分のブロックが作成され、木曜日と金曜日に 30 分のブロックが作成されます。

月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
30 分 + 30 分	30 分 + 30 分	30 分 + 30 分	30 分	30 分

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
スケジュールされた時間がカレンダーイベント期間プロパティで割り切れない場合、1 日あたり数時間の損失が生じます。たとえば、1 日あたりの予定時間数が 8.5 で、プロパティ値が 60 に設定されているとします。この場合、各日に割り当てられる最大時間は 8 になり、1 日あたり 0.5 時間の損失になります。

休暇処理

リソースプランのリソースイベントは、リソースが休暇をマークした日、または他のイベント (トレーニングや会議など) に参加した日には作成されません。アドミニストレーターは、プロパティ *com.snc.resource_management.exclude_events_from_schedule* を使用してリソースのキャパシティと割り当てを管理し、以下を指定できます。


- キャパシティ計算で除外する必要があるイベント。たとえば、リソースの休暇が月曜日と水曜日の間にある場合、リソースの週次キャパシティは (40 時間ではなく) 16 時間として計算されます。
- システムが割り当てを作成してはならない場合。たとえば、リソースが金曜日にトレーニング中の場合、リソースは金曜日のタスクに割り当てられません。

過剰割り当て

リソースの過剰割り当ては許可されます。リソースを過剰に割り当てると、ユーザーの予定時間内にユーザーカレンダーに重複するイベントが作成されます。ただし、任意の日に割り当てることができるのは最大 24 時間です。重複するイベントは、週次ビューのカレンダーで重複して表示されます。月次ビューでは、重複するイベントが別のイベントの上または下に表示されます。

たとえば、ユーザーが、毎日の作業日を 08:00 から 17:00 まで指定するスケジュールがあるとします。イベント 1 は、ユーザーのカレンダーの 08:00 から 14:00 までです。同じ日にイベント 2 に対してさらに 5 時間を追加すると、空いていた 3 時間 (14:00 ～ 17:00) にイベントが作成されます。重複するイベントも、その日の始まり (08:00 ～10:00) から残りの 2 時間に作成されます。


月次ビューからの重複イベント

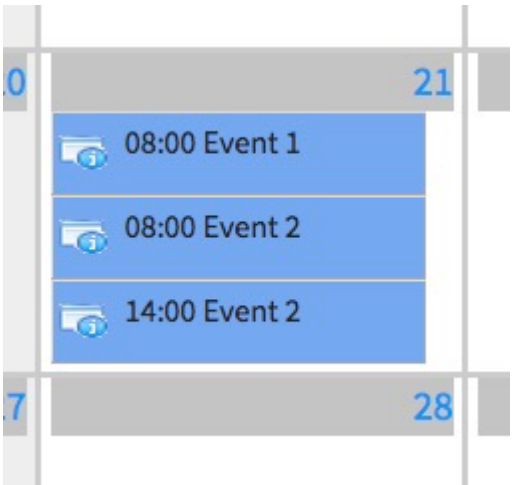

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

週次ビューからの重複イベント

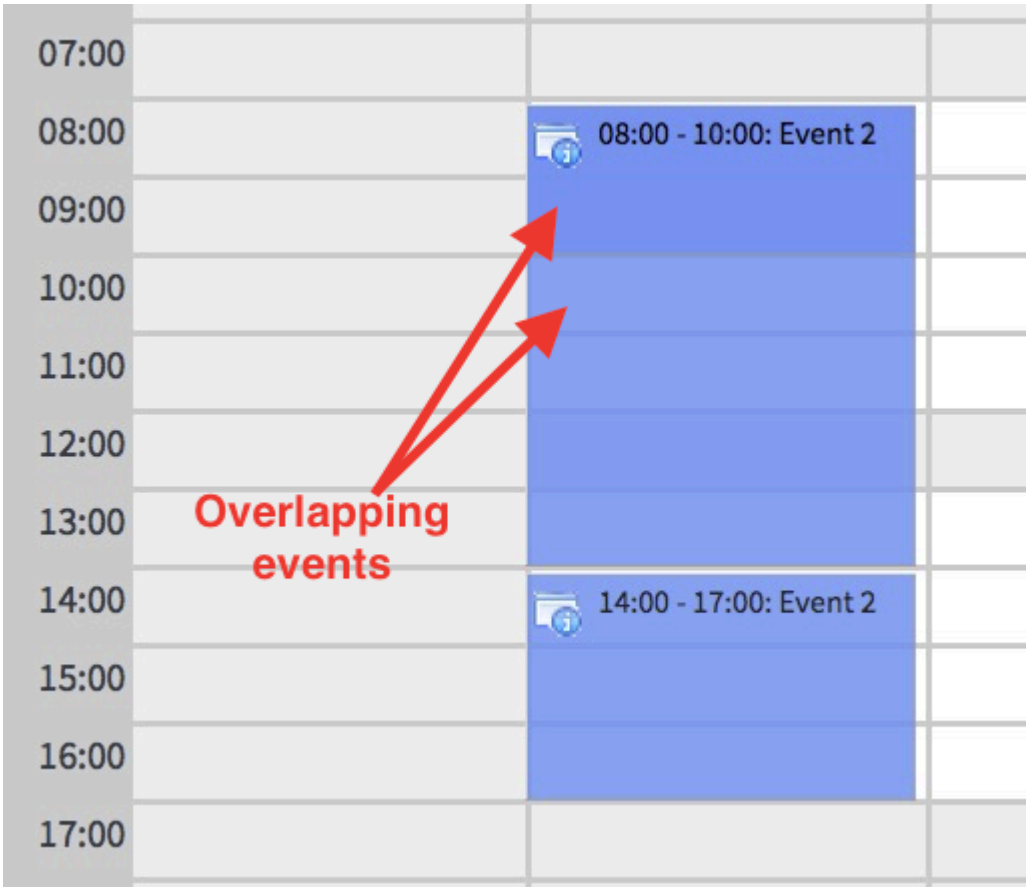

リソースロールの作成

チームメンバーのスキルと能力に基づいて、プロジェクト固有のロールを定義します。

始める前に
必要なロール：resource_manager

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース > リソースロール.
2. [新規] を選択します。
3. [リソースロール] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[リソースロール] フォーム」を参照してください。
4. [送信] を選択します。

ユーザーリソースとグループリソース

リソースを割り当てる場合、リソースマネージャーはアドミニストレーターと協力して、pps_resource ロールを持つグループにユーザーを追加する必要がある場合があります。

[リソースマネージャー] ビュー

のリソースマネージャービュー リソース > リソース > ユーザー pps_resourceロールを持つユーザーのみをリストします。[ユーザー管理] > [ユーザー] フォームに表示される一部のフィールドに加えて、[リソースマネージャー] ビュー > [ユーザー] フォームには、resource_manager ロールを持つユーザーのみが編集できる次のフィールドも表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ロケーション
- スケジュール
- タイムシートポリシー
- 平均日次 **FTE** 時間 **/** 人日あたりの時間数

> **注:**
> [リソースキャパシティの更新] 関連リンクを使用して、日付範囲を指定します。ユーザーキャパシティは、ユーザーのスケジュールに基づいてすべての集計テーブルに入力されます。

のリソースマネージャービュー リソース > リソース > グループ pps_resourceロールを持つグループのみをリストします。リソースマネージャーがこのビューから新しいグループを作成すると、デフォルトで pps_resource ロールがグループレコードに追加されます。リソースマネージャーにはいくつかのフィールドへの書き込みアクセス権がありますが、編集する必要があるのは [平均日次 **FTE** 時間/人日あたりの時間数] および [時給] のみです。

リソースキャパシティの更新

[リソースマネージャー] ビューから、特定の期間のユーザーのキャパシティを更新します。ユーザーのスケジュールと指定された期間に基づいて、それに応じてユーザーのキャパシティがすべてのリソース集計テーブルに入力されます。

始める前に
必要なロール：resource_manager

このタスクについて
次のシナリオでは、[リソースキャパシティを更新] 関連リンクを使用します。

- ユーザーが新たに追加され、ユーザーのキャパシティを更新する場合。
- 既存のユーザーのスケジュールが変更され、ユーザーのキャパシティを更新したい場合。

このアクションのために使用されるスケジュール済みジョブは、[リソースキャパシティの更新] です。

キャパシティは、人事アプリケーションの従業員プロファイルで指定された雇用開始日と雇用終了日の間の日付範囲に対してのみ生成されます。この情報は、従業員プロファイルプラグインがインストールされている場合に利用可能です。従業員の開始日と終了日が利用できない場合は、これらの日付を手動で指定します。

また、年の開始後に従業員が利用可能になった場合は、不足しているキャパシティが確実に考慮されるように、現在の年の始めからキャパシティが生成されます。たとえば、従業員のキャパシティが 2022 年 3 月 1 日から 2022 年 6 月 1 日まで利用可能である場合、更新されたキャパシティは 2022 年 1 月 1 日から 2022 年 6 月 1 日まで生成されます。

終了日がジョブの実行日より後である場合、[リソース終了ハンドラー] ジョブを実行すると、終了したリソースのキャパシティと可用性が自動的に 0 に更新されます。ユーザーの終了日を超えてリソースが予約されている場合、それらの予約もリソース計画で 0 に更新されます。

手順

1. 移動先 すべて > リソース管理 > リソース > ユーザー.

2. ユーザー **ID** を選択します。

3. [リソースキャパシティを更新] 関連リンクを選択します。

4. ウィンドウで、開始日と終了日を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> 従業員プロファイルプラグインがインストールされている場合、雇用開始日より前の開始日または雇用終了日より後の終了日を選択することはできません。

5. **[OK]** を選択します。

リソース集計の更新

[リソースマネージャー] ビューから、特定の期間のリソース集計を更新できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
次のシナリオでは、[リソース集計の更新] 関連リンクを使用できます。

- 集計の不一致に気づき、正しいデータを生成したい場合。
- 特定の期間のリソース割り当て日次 [resource_allocation_daily] エントリと集計を同期する場合。

手順

1. 移動先 すべて > リソース管理 > リソース > ユーザー.
2. ユーザー **ID** を選択します。
3. [リソース集計を更新] 関連リンクを選択します。
4. ウィンドウで、開始日と終了日を入力します。
5. **[OK]** を選択します。

割り当ての作成

リソースマネージャーは、[リソース割り当て] 関連リストを使用して割り当てを作成できます。

始める前に
必要なロール：resource_manager

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > 要求済み.
2. リソース計画を開きます。
3. [リソース割り当て] 関連リストで、[新規] を選択します。
4. [リソース割り当て] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「[リソース割り当て] フォーム」を参照して ください。
5. [送信] を選択してレコードを保存し、リソース計画に戻ります。

次のタスク
[リソース計画] フォームで、[確認] または [確認して割り当て] を選択して、リソースを [確認済み] または [割り当て済み] ステータスに移行します。

[リソース計画] フォームからリソース計画を却下する

リソースマネージャーは、[リソースプラン] フォームまたはリソースワークベンチからプランを却下できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：resource_manager

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース計画 > 要求済み.
2. 却下するプランを開きます。
3. オプション: 却下理由の説明を [メモ] フィールドに追加します。
4. [却下] を選択します。

リソーススケジュール

Resource Management で使用されるデフォルトスケジュールを理解し、独自のカスタムスケジュールを作成する方法を学びます。

リソース管理では、「リソース管理スケジュール」という名前のデフォルトのスケジュールが使用されます。リソース管理スケジュールには、次の特性があります。

- 毎週平日
- 月曜日から金曜日の 08:00 ~ 12:00
- 月曜日から金曜日の 13:00 ~ 17:00

リソース計画のリソース要求を計画する際、そのリソース計画内のすべてのユーザーが同じスケジュールを持ち、そのスケジュールがリソース管理スケジュールと異なる場合、ユーザーのスケジュールは予定時間数と要求時間数を計算するために考慮されます。

デフォルトスケジュール

各ユーザーに割り当てられたスケジュールは、ユーザープロファイルに関する次の情報を使用して把握できます。

- [スケジュール] フィールドに指定された値
- [スケジュール] 関連リストで提供され、[コンテキスト] フィールドが [リソース管理] に設定されているスケジュール。

  この関連リストは、ユーザープロファイルの [リソースマネージャー] ビューに表示されます。

[スケジュール] 関連リストにエントリーがない場合は、[スケジュール] フィールドに指定された値を使用してリソーススケジュールが決定されます。[スケジュール] フィールドが空の場合も、*Default Schedule Name (com.snc.resource_management.default_schedule)* プロパティで指定されたスケジュールがリソーススケジュールとして適用されます。このプロパティ値を変更する方法を理解するには、「デフォルトのリソース管理スケジュールの指定」を参照してください。

リソースのカスタムスケジュール

リソースに関連付けられたデフォルトのスケジュールを確認し、それを必要とするリソースにカスタムスケジュールを適用します。

カスタムスケジュールが必要な場合は、アドミニストレーターと協力してそれらを作成します。アドミニストレーターは、要件に従ってスケジュールを作成し、それをユーザーに割り当てることができます。このカスタムスケジュールは、必要に応じて他のユーザーに割り当てることもできます。

ユーザープロファイルの [スケジュール] フィールドで指定されたスケジュールで、*Default Schedule Name* プロパティで指定されたスケジュールが上書きされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
スケジュールの [タイムゾーン] フィールドを [フローティング] に設定することをお勧めします。


必要に応じて、アドミニストレーターはスケジュールの階層を作成できます。これは、月曜日～金曜日 8 時～ 17 時などのプライマリスケジュールと、土曜日～日曜日 12 時～ 16 時などのセカンダリスケジュールをユーザーに設定する場合に便利です。「カスタムスケジュール階層」を参照してください。

カスタムスケジュール階層

任意のユーザーのスケジュール階層を作成するには、[スケジュール] 関連リストを使用します。スケジュールを作成し、新しいスケジュール内で、[スケジュール エントリー] 関連リストを使用してタイプ、日付、繰り返しスケジュールを定義します。

たとえば、Alene さんの通常のスケジュールは 8 ～ 5 時で、これはユーザープロファイルの **[Schedule]** フィールドで指定されています。Alene さんは通常の作業に加えて、毎週土曜日に現場を確認する必要があります。この予約のスケジュールは、[スケジュール] 関連リストから作成できます。


カスタムスケジュール階層の例

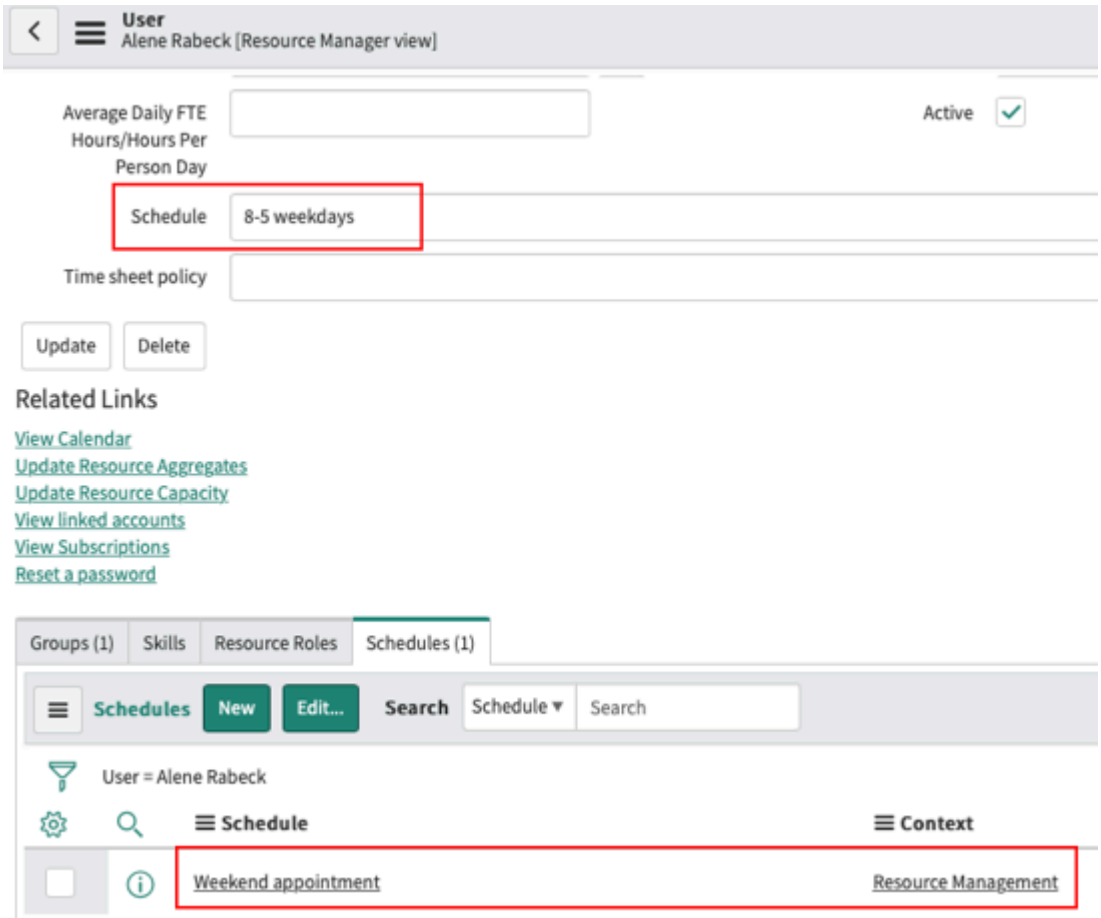

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カスタムスケジュール内のスケジュールエントリー

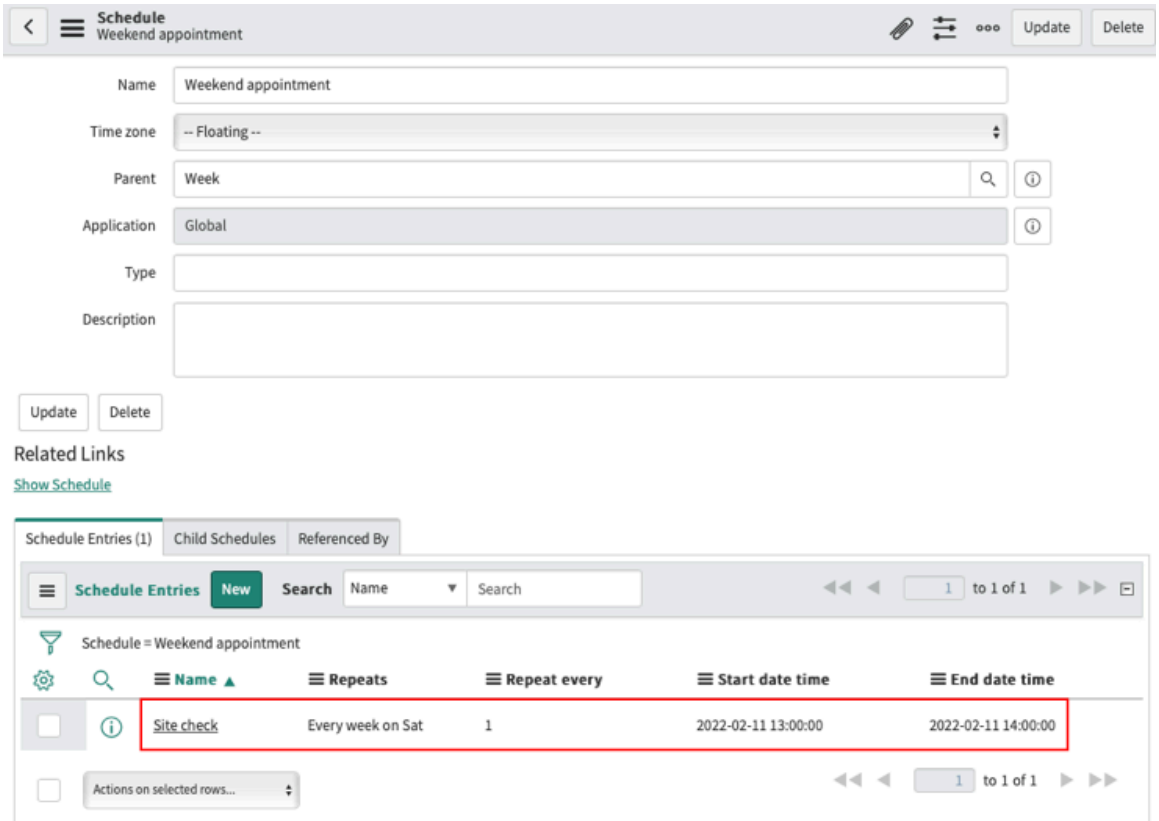

デフォルトのリソース管理スケジュールの指定

リソースに適用するデフォルトのスケジュールを選択します。

始める前に

必要なロール：it_pps_admin

このタスクについて

ベースシステムはリソース管理スケジュールを使用します。*`Default Schedule Name`* プロパティを使用して、いつでもデフォルトのスケジュールを変更できます。

手順

1. 移動先 すべて > システムスケジューラ > スケジュール > スケジュール.
2. スケジュールを確認し、使用するスケジュールの [名前] をコピーします。
3. 移動先 プロジェクト管理 > 設定 > プロパティ - リソース.
4. [デフォルトスケジュール名] プロパティフィールドに、ステップ 2 で特定したスケジュールの名前を貼り付けます。

リソースイベント

リソースイベントは、リソースがタスクに費やす時間のブロックです。

リソースマネージャーが割り当てを行うたびに、システムはそのリソースに対して 1 つ以上のリソースイベントを作成します。リソースイベントは、ユーザーのパーソナルカレンダーに表示されます。

予約がソフトからハードに変更されると、リソースのリソースイベントが作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースイベントとスケジュール

スケジュールは、時間を作業時間と非作業時間として分類し、リソースとプロジェクトに関連付けることができます。

[自分のカレンダー] モジュールには、ユーザーの作業スケジュールと非作業時間が表示されます。

リソースマネージャーが割り当てを行うと、自動的に次のことが行われます。

- 指定されたリソースに関連付けられたスケジュールが分析されます。
- [ハード] イベントおよびカレンダーイベントへの割り当てタイプの変更は、ユーザースケジュール内の個々のリソースに対して作成されます。時間は、ハード割り当て分散タイプに応じて分散されます。

カレンダーイベント期間プロパティを使用して、イベントのデフォルトの最小単位を制御します。例については、Resource Management プロパティ を参照してください。

注:
Geneva リリース以降は、過剰割り当てが許可されています。ただし、特定の日にユーザーに割り当てることができるのは 24 時間以内です。詳細については、「リソース割り当て」を参照してください。

リソースイベントの変更

リソース計画に含まれていないリソースイベントは変更できます。

「自分のカレンダー」モジュールで自分用に作成したイベントのみを変更できます。リソースマネージャーがカレンダーにイベントを追加した場合は、リソースマネージャーのみがイベントを変更できます。

リソースマネージャーは、イベントを削除して作成することで、リソース計画に含まれているイベントを変更できます。たとえば、リソースマネージャーがリソース計画のタスクにリソースを割り当てた後、タスクの作業タイプを [電話] に変更したいとします。リソースマネージャーは、イベントを削除してから、作業タイプを [電話] に設定して別のイベントを作成する必要があります。

リソース計画の一部であるリソースイベントを変更する

リソース計画の一部であるリソースイベントを変更できます。

始める前に
必要なロール：resource_manager

手順


1. 移動先 リソース > リソース計画 > すべて.
2. 計画の番号を選択します。
3. [リソース割り当て] 関連リストで、割り当ての番号をクリックします。
4. [リソースイベント] フォームで、フィールドを更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド名の説明については、「[リソースイベント] フォーム」を参照してください。

リソースイベント

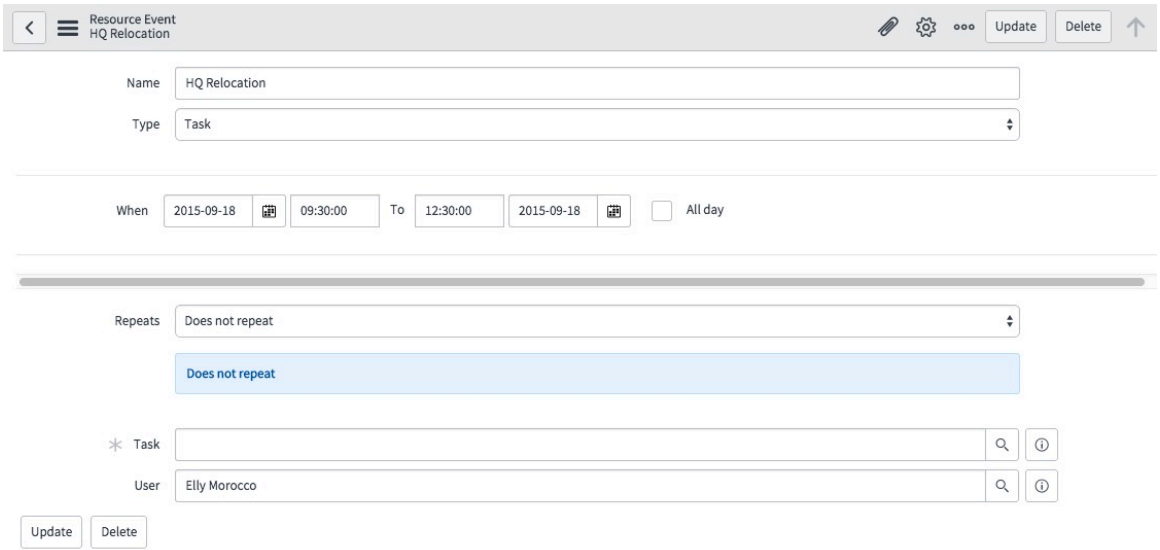

自己作成のリソースイベントの変更

作成したリソースイベントを変更できます。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > リソース > カレンダー > 自分のカレンダー.
2. リソース計画に割り当てられていないイベントをダブルクリックします。
3. 必要に応じてイベントを変更します。
4. [更新] を選択します。

リソースイベントの色の変更

各イベントタイプは色で表されます。PPS アドミニストレーターはいつでも色を変更できます。

始める前に
必要なロール：it_pps_admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 設定 > リソースイベントの色.
2. [イベントタイプ] をクリックします。
3. 別の [色] を指定します。
4. [更新] をクリックします。

リソース管理レポート

リソース管理レポートは、リソースの割り当て、可用性、および使用率をリソース要求者とリソースマネージャーに提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


重要:
リソース管理 レポートは、 Zurich リリース以降廃止されました。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベース の「Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184]」の記事を参照してください。

または、リソースマネージャーは、 リソース管理ワークスペースでインタラクティブな概要ダッシュボードを使用することをお勧めします。ダッシュボードの詳細については、次を参照してください。 の概要ダッシュボード リソース管理ワークスペース.

次のタイプの情報のレポートを生成できます。

可用性


両方の ソフト割り当てとハード割り当て後にリソースが利用可能な合計時間。可用性は、キャパシティから割り当てを引いたもので

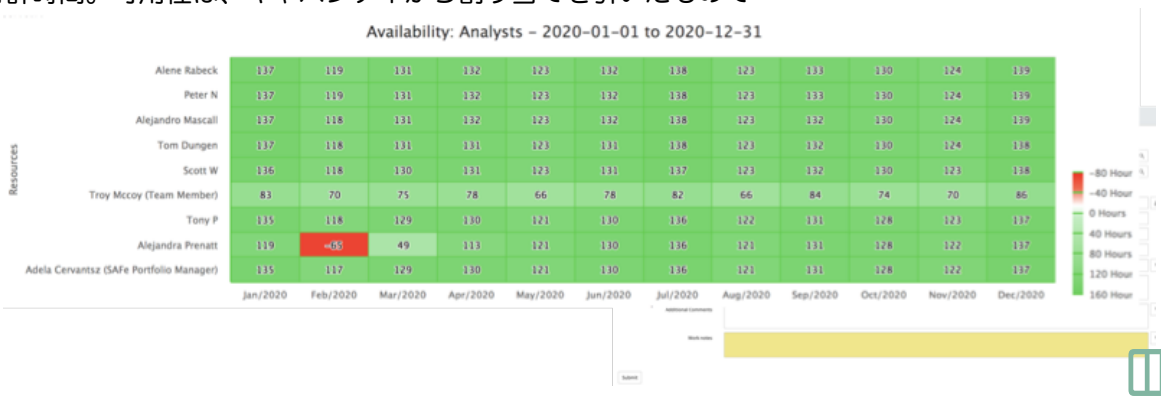

す。

稼働率の予測


予測されるリソース時間使用率。割り当て済みの時間と確認済みの時間の合計を総キャパシティで割って計算されま

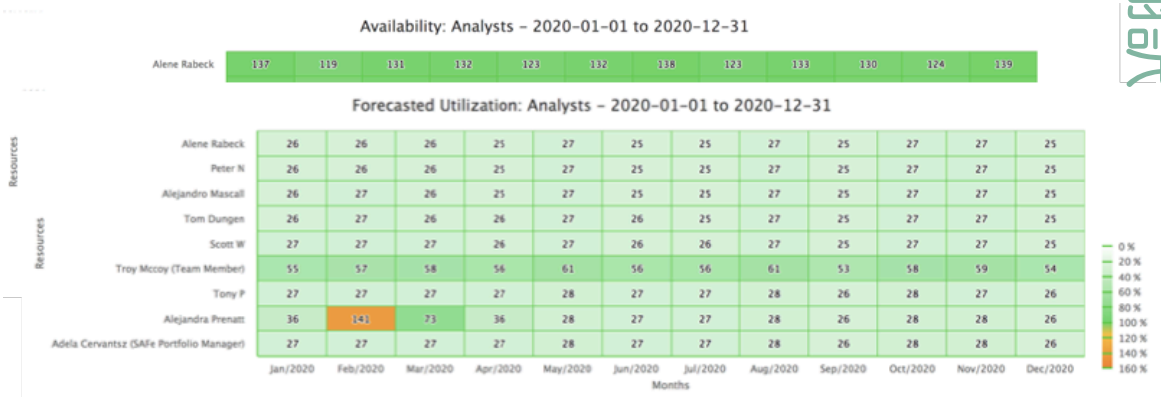

す。

確定した稼働率

確定したリソース時間使用率。割り当て済み時間を総キャパシティで割って計算されま

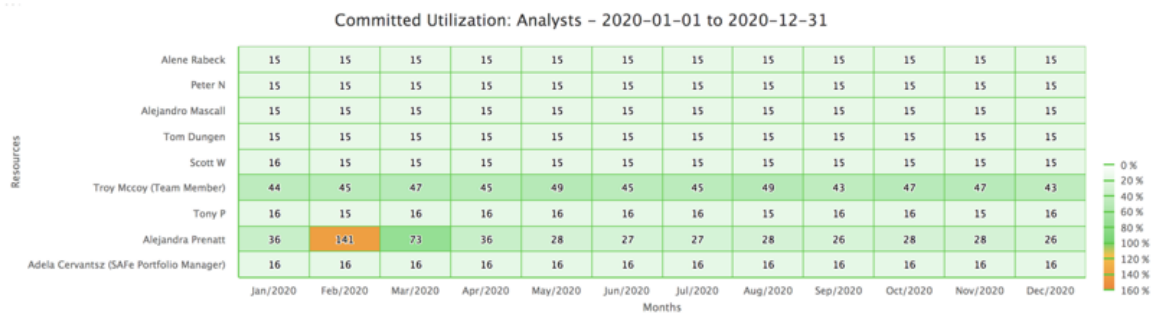


す。

割り当て

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースのキャパシティ、割り当て、可用性、および使用

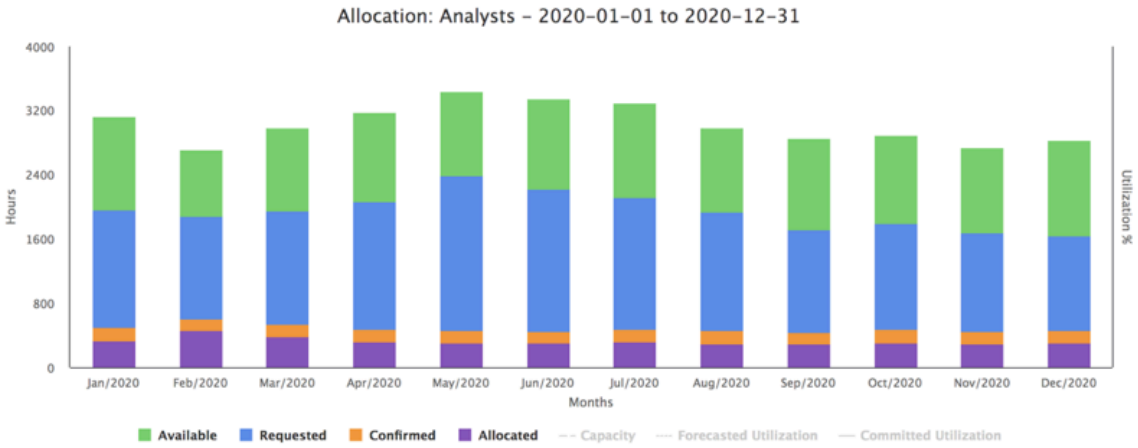

率。

割り当ての詳細

すべての割り当て要求 (ソフト予約)、確定した割り当て (ハード予約)、可用性、キャパシティ、および実績時間の表形式のブレークダウン。

リソースの実績時間が割り当て済みの時間よりも長い場合、実績時間のセルが強調表示され、マウスにカーソルを合わせるとメッセージが表示されます。

Allocation Details: Analysts - 2020-08-26 to 2021-08-25

	Months																	
	Aug/2020						Sep/2020						Oct/2020					
Resource	Capacity	Requested	Confirmed	Allocated	Actuals	Available	Capacity	Requested	Confirmed	Allocated	Actuals	Available	Capacity	Requested	Confirmed	Allocated	Actuals	Available
Adela Cervantsz (SAFe Portfolio Manager)	32	0	0	0	0	32	176	0	30	66	0	80	176	0	30	69	0	77
Alejandra Prenatt	32	6	0	0	0	32	176	30	30	66	0	80	176	30	30	69	0	77
Alejandro Mascall	32	0	0	0	0	32	176	0	30	63	0	83	176	0	30	66	0	80
Alene Rabeck	32	5	0	0	0	32	176	29	27	58	120	91	176	29	27	349	65	-200
Peter N	32	0	0	36	0	-4	176	0	27	268	0	-119	176	0	27	271	0	-122
Scott W	32	0	0	0	0	32	176	0	30	63	0	83	176	0	30	69	0	77
Tom Dungen	32	0	0	0	0	32	176	0	30	63	0	83	176	0	30	69	0	77
Tony P	32	0	0	0	0	32	176	0	30	66	0	80	176	0	30	69	0	77
Troy Mccoy (Team Member)	32	5	0	0	0	32	176	32	30	63	20	83	176	32	30	69	0	77

自動翻訳

可用性、使用率、および割り当てレポートの表示

リソースの可用性、使用率、および割り当てに焦点を当てたリソースレポートを表示できます。

始める前に

必要なロール：admin、resource_user、または resource_manager

重要:
リソース管理 レポートは、 Zurich リリース以降廃止されました。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベース の「Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184]」の記事を参照してください。

または、リソースマネージャーは、 リソース管理ワークスペースでインタラクティブな概要ダッシュボードを使用することをお勧めします。ダッシュボードの詳細については、次を参照してください。 の概要ダッシュボード リソース管理ワークスペース.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソースレポート > リソースレポート.
2. [リソースレポート] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[リソースレポート] フォーム」を参照してください。
3. [実行] を選択して、レポートを表示します。

リソース管理レポートの編集

リソース管理レポートには、さまざまな期間のさまざまな形式でリソース割り当ての詳細が表示されます。ビジネス要件に従ってこれらのレポートを構成して使用します。

始める前に
必要なロール：resource_user または admin

> **重要:**
> リソース管理 レポートは、 Zurich リリース以降廃止されました。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベース の「Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184]」の記事を参照してください。
>
> または、リソースマネージャーは、 リソース管理ワークスペースでインタラクティブな概要ダッシュボードを使用することをお勧めします。ダッシュボードの詳細については、次を参照してください。 の概要ダッシュボード リソース管理ワークスペース.

このタスクについて
新しいレポートの集計タイプ、要求タイプ、カレンダータイプなどのレポート設定を更新できます。たとえば、[リソース - グループに対する割り当ての詳細 - 月次 (時間)] レポートを編集して、時間ではなく FTE で割り当ての詳細を表示できます。レポートに関連付けられたチャートをグループ化された棒または積み上げ棒別に表示するように選択することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソースレポート > レポート - 新規.
   次のレポートが表示されます。

   a. [編集] アイコン ( ) を選択するか、レポート名を選択します。
   b. [構成] タブのフィールド値を更新して、レポートを構成します。
   c. [実行] を選択してレポートを実行するか、[保存] を選択して後でレポートを実行します。

2. オプション: [レポートの作成] を選択して、新しいレポートを作成します。

自分のカレンダー

resource_user ロールを持つすべてのユーザーは、[自分のカレンダー] を開いて、予定されている作業、実際の作業、運用作業、管理タスク、および個人アクティビティを表示、追加、および変更できます。

ユーザーがカレンダーにイベントを追加すると、そのイベントの時間ブロックは、リソースコンソールとリソース可用性ダッシュボードに、ビジー状態を示す赤色で表示されます。

リソースマネージャーは、ユーザーのカレンダーを表示してタスクを完了するためのオープン時間を決定し、任意のリソースのパーソナルカレンダーにタスクを追加できます。ユーザーのカレンダーで

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

作成されたすべてのイベントについて、ユーザーカレンダーイベント [user_calendar_event] テーブルにレコードが作成されます。リソースイベントは、ユーザーにとって多忙な時間の塊です。ユーザーとリソースマネージャーは、これらのレコードを変更できる場合があります。「リソースイベントの変更」を参照してください。

カレンダーはタイムゾーンを使用します。時間は、ユーザー設定に従ってローカルタイムゾーンでユーザーに表示されます。「リソース計画のタイムゾーン」を参照してください。

各リソースイベントは特定の色で表されます。PPS アドミニストレーターはこれらの色を変更できます。「リソースイベントの色の変更」を参照してください。

注:
ユーザーはインシデントなどのタスクをカレンダーに追加できますが、タスクの [アサイン先] フィールドには追加されません。

カレンダーへのイベントの追加

カレンダーにタスク、イベント、予約を追加します。

始める前に
必要なロール：pps_resource または resource_manager

このタスクについて
日次、週次、または月次で繰り返されるイベントを作成するには、「繰り返し可能なイベントの作成」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > 自分のカレンダー.

   カレンダーはデフォルトで週次ビューに表示され、今日のスケジュールが強調表示されます。ユーザーの非番のスケジュール (グレー)。

2. 必要に応じてビューを変更します。
   - [日]、[週]、または [月] を選択します。
   - 前後矢印を使用して、日、週、月の間を移動します。
   - カレンダーアイコン ( ) を使用して日付を選択します。
   - [今日] を選択すると、カレンダービューが設定変更されて今日のカレンダーが表示されます。
3. カレンダーの空のセルをダブルクリックして、[イベントの追加] フォームを開きます。
4. [新しいイベント] フォームのフィールドに入力します。

   フィールド名の説明については、「[新しいイベント] フォーム」を参照してください。

5. [送信] を選択します。

タスクの結果

- カレンダーイベントを追加すると、日次、週次、月次のリソース集計テーブルが更新されます。リソース集計日次テーブルは、デフォルトでは有効になっていません。日次集計を生成してこのテーブルに保存するには、*com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates* プロパティを作成し、その値を [true] に設定します。
- カレンダーからユーザーに対して作成されたすべての非プロジェクトイベントは、リソースファインダーでユーザーの運用作業として表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

繰り返し可能なイベントの作成


イベントは、毎日、毎週、毎月などの定期的なスケジュールで繰り返すように設定できます。

始める前に
必要なロール：resource_manager

このタスクについて
タイムスロットが他のイベントによって予約されている場合でも、イベントを作成できます。

手順

1. 移動先 すべて > セルフサービス > 自分のカレンダー.
2. カレンダーの空白のセルをダブルクリックします。
3. [新しいイベント] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[新しいイベント] フォーム」を参照してください。

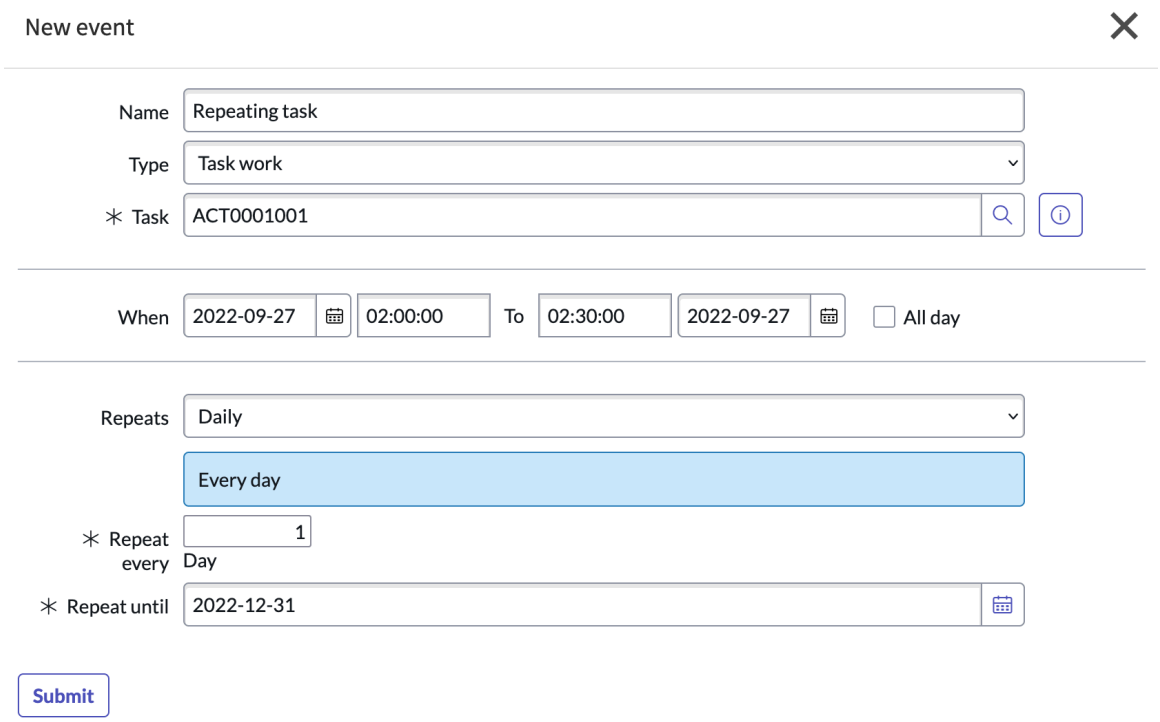

> **注:**
> [When] フィールドと [To] フィールドの日付は同じである必要があります。

4. [送信] をクリックします。

ユーザーカレンダーの表示

ユーザーのカレンダーを表示して、可用性を確認します。

始める前に
必要なロール：resource_manager

このタスクについて
グループ内のすべてのユーザーではなく、特定のユーザーのカレンダーを表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース > ユーザー.
2. 次のいずれかのオプションを実行します。

オプション	説明
[ユーザー] リストから	[ユーザー] リストでユーザー名を右クリックし、[カレンダーを表示] を選択します。
[ユーザー] フォームから	[ユーザーレコード] を選択して [ユーザー] フォームを開き、[カレンダーを表示] 関連リンクを選択します。

ユーザーカレンダーへのイベントの追加

リソースマネージャーは、ユーザーカレンダーにイベントを追加できます。

始める前に
必要なロール：resource_manager

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソース > ユーザー.
2. 次のいずれかを実行します。

オプション	説明
[ユーザー] リストから	[ユーザー] リストでユーザー名を右クリックし、[カレンダーを表示] を選択します。
[ユーザー] フォームから	[ユーザーレコード] を選択して [ユーザー] フォームを開き、[カレンダーを表示] 関連リンクを選択します。

   そのユーザーのカレンダーが新しいウィンドウまたはタブで開きます。
3. カレンダーの空のセルを選択して、[イベントの追加] フォームを開きます。
4. フォームの各フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「カレンダーへのイベントの追加」を参照してください。

タスクの結果

- カレンダーイベントを追加すると、日次、週次、月次のリソース集計テーブルが更新されます。リソース集計日次テーブルは、デフォルトでは有効になっていません。日次集計を生成してこのテーブルに保存するには、*com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates* プロパティを作成し、値を [true] に設定します。
- カレンダーからユーザーに対して作成されたすべての非プロジェクトイベントは、リソースファインダーでユーザーの運用作業として表示されます。

イベントの削除

作成したイベントはいつでも削除できます。

始める前に
必要なロール：resource_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
リソースマネージャーによってカレンダーに追加されたイベントを削除することはできません。

手順
1. 移動先 すべて > セルフサービス > 自分のカレンダー.
2. 削除するイベントを検索します。

   カレンダーの上にあるアイコンを使用して、適切な日、週、または月を見つけます。
3. イベントをダブルクリックします。
4. [削除] を選択します。
5. **[OK]** を選択します。

タスクの結果
カレンダーイベントを削除すると、それに応じて日次、週次、月次のリソース集計テーブルが更新されます。リソース集計日次テーブルは、デフォルトでは有効になっていません。日次集計を生成してこのテーブルに保存するには、*com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates* プロパティを作成し、値を [true] に設定します。

リソース診断を使用して破損したリソースデータを検出する

リソース診断機能は、アプリケーション診断ツールを使用して、ユーザーの重複集計やトップタスクのない日次など、リソースの破損データを検出します。

始める前に
必要なロール：pps_admin

手順
1. 移動先 すべて > リソース > リソース診断.
2. [アプリケーション診断ツール] ページで、[リソース管理] を選択します。
3. 1 つまたは複数の診断スキャンを選択します。
4. [診断を実行] を選択します。
5. スキャンの結果を表示します。
   トップタスクがない場合は、ユーザーまたはプロジェクト関連のリソース割り当て日次の重複集計が一覧表示されます。

次のタスク
独自の診断スキャンを追加し、スクリプトを修正します。

リソースの診断機能の追加

アプリケーション機能を評価し、アプリケーションのさまざまな診断スキャンを整理するための診断機能を作成します。診断機能がターゲットアプリケーションに表示され、そのアプリケーションの診断機能に関連付けられているすべての診断スキャンが一覧表示されます。

始める前に
必要なロール：adt_admin

このタスクについて
診断機能は、単一または複数の診断スキャンで構成できます。これらの診断スキャンは、マッピングされているスクリプトを実行して、データの破損や無効なデータを検出します。その後、スクリプトを使用して診断スキャンを作成し、これらのスキャンを実行して、破損または無効なデータがないか

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースをチェックできます。修正スクリプトがスキャンに関連付けられている場合は、破損または無効なデータを修正するために使用できます。

ユーザーが特定のフィルター条件を作成するためのフィールドを定義することもできます。診断スクリプトは、これらのフィルター条件の結果を、破損または無効なデータを検出するための入力として使用します。

[機能] モジュールで既存の機能を確認できます。ニーズに一致するものが見つからない場合は、診断機能を作成し、それをアプリケーションに関連付けます。

手順

1. 移動先 すべて > アプリケーション診断ツール > 機能.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [診断機能] フォームで、フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「診断機能フォーム」を参照してください。
4. [診断入力] セクションでフィルター条件を指定するためのユーザー入力値を定義します。

   このセクションのフィールドは、条件ビルダーとしてアプリケーションに表示されます。フィールド名の説明については、「[診断入力] フォーム」を参照してください。
5. [送信] を選択します。

次のタスク

診断スクリプトを作成し、診断機能で使用する修正スクリプトを追加します。詳細については、「リソースの診断と修正スクリプトの追加」を参照してください。

リソースの診断と修正スクリプトの追加

既存または新規の診断スクリプトを追加して、アプリケーションのデータに破損がないかどうかをスキャンします。修復スクリプトを添付して、診断スクリプトによって特定された破損または無効なデータを修正することもできます。

始める前に

必要なロール：adt_admin

このタスクについて

複数の診断スクリプトを作成して、データのさまざまな側面を確認できます。診断機能で指定したフィルター条件の結果は、実行時に診断スクリプトの入力として使用されます。1 つのスクリプトの結果を後続のスクリプトで使用することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > アプリケーション診断ツール > スクリプト.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [診断スクリプト] フォームで、フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[診断スクリプト] フォーム」を参照してください。
4. オプション: 診断スクリプトによって特定された破損または無効なデータを修正するためのスクリプトを含める場合は、[スクリプトを修正する] チェックボックスをオンにします。
5. [修正スクリプトアクセスロール] を使用して、必要なロールを [選択済み] リストに移動します。
   選択したロールを持つユーザーは、診断スクリプトにアクセスできます。
6. [修正スクリプト] セクションで、修正スクリプトの実際のコードを追加します。
7. [送信] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースの診断スキャンおよびマッピングスクリプトの作成

診断および修正スクリプトを使用して、診断スキャンおよびマッピング診断機能を作成します。診断スクリプトを実行する診断スキャンを作成して、アプリケーションのデータの健全性を確認できます。修正スクリプトを使用して、診断スキャンで特定された破損または無効なデータを修正します。

始める前に

- 必要なロール：adt_admin
- 診断機能を作成します。詳細については、「リソースの診断機能の追加」を参照してください。
- 診断および修正スクリプトを作成します。詳細については、「診断と修正スクリプトの追加」を参照してください。

このタスクについて

診断機能、診断スクリプト、および修正スクリプトを作成したら、診断機能とスクリプトをマッピングして診断スキャンを作成します。診断スキャンごとに複数のスクリプトをマッピングし、実行順序を定義できます。

手順

1. 移動先 すべて > アプリケーション診断ツール > 診断.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [診断] フォームで、フィールドに入力します。
   フィールド名の説明については、「[診断] フォーム」を参照してください。
4. [診断とスクリプトのマッピング] セクションで、診断スキャンにマッピングする診断スクリプトを検索して選択します。
5. [送信] を選択します。

リソース管理 の参照

フィールド、ユーザーロール、テーブル、ガイドラインなど、リソース管理 に関する追加の詳細を提供するための参照情報。

Resource Management プロパティ

リソース管理 アプリケーションには、割り当て、スケジュール、およびその他の設定を制御するためのいくつかのプロパティが用意されています。

リソースプロパティにアクセスするには、PPS admin ロールが必要です。

リソースのプロパティを管理するには、次に移動します: プロジェクト管理 > 設定 > プロパティ - リソース.

Resource Management プロパティ

プロパティ	説明	デフォルト値
確認と割り当てのための同期モードで考慮する必要がある日次リソース割り当てレコードの最大数 (*com.snc.resource_management.plan.auto_async_threshold*)	確認と割り当て中に同期モードで考慮する必要がある日時リソース割り当てレコードの最大数を決定します。このプロパティは、日次割り当てレコードの数がプロパティに設定された値より多い場合に、システムパフォーマンスを向上させます。 デフォルト値は 2600 です。これは、同期モードで確認または割り当てが考慮される日次レコードの数が	2600

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Resource Management プロパティ (続く)

プロパティ	説明	デフォルト値
	2600 であることを意味します。この値は、グループリソース計画で 1 年間 (260 営業日) に 10 人のユーザーを確認または割り当てるか、2 年間で 5 人のユーザーを割り当てるか、などに相当します。グループリソース計画に 1 年間で 11 人のユーザーが含まれている場合、日次レコードの数は 2860 になります。したがって、この場合のリソース計画の確認と割り当ては非同期モードになります。 常に同期モードでリソース計画を確認して割り当てる場合は、要件に基づいてプロパティの値をより高い数値に設定します。 **注:** プロパティ *com.snc.resource_management.run_state_changes_async* が [true] に設定されている場合、リソース計画の確認と割り当ては常に非同期モードで考慮されます。	
リソースグリッドインターフェイスに週/月トグルを表示 (*com.snc.resource_management.show_week_month_toggle*)	リソースグリッドで週と月を切り替えるための切り替えボタンを表示します。	あり
リソースファインダーの最大期間 (月) (*com.snc.resource_management.max_dur_resource_finder*)	リソースファインダーにリソースの詳細を表示する最大期間。	24
予算参照レートを使用し、リソース要求/割り当て済みコストを計算して、賃金レートカードから時給を導出 (*com.snc.resource_management.use_budget_reference_rates*)	• プロパティが [はい] に設定されている場合、予算参照レート [itfm_fx_rate] は、要求されたリソースまたは割り当てられたコストを計算するために使用されます。 • プロパティが [いいえ] に設定されている場合、為替レート [fx_rate] は、要求されたリソースまたは割り当てられたコストを計算するために使用されます。アップグレードされたお客様の場合、プロパティはデフォルトで [いいえ] に設定されています。	あり
リソース計画を作成できる最大日数 (*com.snc.resource_management.plan.max_duration*)	リソース計画を作成する最大日数を制限します。	3660
デフォルトスケジュール名 (*com.snc.resource_management.default_schedule*)	リソース管理 アプリケーションがデフォルトで使用するインスタンスのスケジュール。	リソース管理スケジュール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Resource Management プロパティ (続く)

プロパティ	説明	デフォルト値
リソース/グループにレポートするresource_managementにおいて、percentage_allocationの値がこの値よりも小さい場合は、緑色で表示されます。(*com.snc.resource_management.percentage_allocation_normal*)	リソースの可用性がリソースレポートに緑色で表示されるタイミングを決定する値。緑色は、リソースが十分に活用されておらず、作業が割り当てられる可能性があることを示します。	50
リソース/グループにレポートするresource_managementにおいて、percentage_allocationの値がこの値よりも小さく、com.snc.resource_management.percentage_allocation_normalよりも大きい場合は、オレンジ色で表示されます。(*com.snc.resource_management.percentage_allocation_warning*)	リソースの可用性がリソースレポートにオレンジ色で表示されるタイミングを決定する値。オレンジ色は、リソースの可用性が低いことを示します。	90
平均日次 FTE 時間 / 人日あたりの時間数 (*com.snc.resource_management.average_daily_fte*)	人日あたりの平均日次フルタイム換算時間数 (時間数)。ユーザーまたはグループリソースレコードの [平均日次 FTE 時間 / 人日あたりの時間数] フィールドに値が指定されていない場合、この値はフルタイムの 1 日と同等に使用されます。 **注:** キャパシティは FTE からではなく、スケジュールから導出されます。FTE とスケジュールの両方が互いに同期している必要があります。	8 (時間)
カレンダーイベント期間 (分) (*com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes*)	カレンダーイベントのデフォルトの期間。 リソース割り当ては、このプロパティを使用して 10 進数値で割り当てを作成します。 たとえば、ユーザーは 30 分ブロック 2 つと 60 分ブロック 1 つで対応可能です。 • このプロパティの値が 30 分に設定されており、1 時間をユーザーに割り当てる必要がある場合、ユーザーが空いているときにその割り当ては 2 つの 30 分ブロックに分割されます。 • このプロパティの値が 60 分に設定されている場合、割り当ては 60 分ブロックに割り当てられます。	60 (分)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Resource Management プロパティ (続く)

プロパティ	説明	デフォルト値
	注: デフォルト値を変更する場合は、60 で割ったときに有限の値になる値を入力します。たとえば、6、12、15、30 などです。	
週の初日 (月曜日 = 1、日曜日 = 7) (*com.snc.resource_management.first_day_of_week*)	最初の曜日を指定します。リソースワークベンチでは、この値を使用して週数を計算します。 たとえば、リソースが 10 月 14 日 (水曜日) から 10 月 21 日 (水曜日) に要求されたとします。 このプロパティの値が 2 (火曜日) に設定されている場合、割り当てが行われ、ワークベンチに次の 2 つのブロックで表示されます。 • 10 月 14 日水曜日から 10 月 15 日土曜日まで。 • 10 月 20 日火曜日。	1 (月曜日)
リソースの確認/割り当て/キャンセルを非同期モードで実行 (*com.snc.resource_management.run_state_changes_async*)	リソース計画を確認、割り当て、またはキャンセルするときに非同期モードを使用して、アプリケーションのパフォーマンスを向上させます。 リソースの確認と割り当てでは、グループ内の各リソースのカレンダーイベントが作成され、各リソースのスケジュールも考慮されるため、確認と割り当てのプロセスが完了するまでに非常に長い時間がかかることがあります。 非同期モードでは、アプリケーションはイベントマネージャーを使用して、リソース計画の状況を処理するときに発生する可能性のあるエラーを処理します。プロパティが有効になっている場合： • リソース計画の状況が [確認処理中] / [割り当て処理中] / [キャンセル処理中] に変わります。 • 確認、割り当て、またはキャンセルが機能しない場合は、[確認]、[割り当て]、または [キャンセル] UI アクションが表示され、アクションを再処理できます。割り当てが一部しか完了していない場合は、[割り当て] UI アクションを再度クリックして、プランに対して以前に作成されたすべてのイベントを削除し、アクションを再処理できます。 確認、割り当て、またはキャンセルを処理するときにエラーが発生したり、処理時間が長くなったりする場合は、このプロパティを有効にします。これは、グループに 25 人を超えるメンバーがいる場合、またはリソース計画の期間が 6 か月を超えている場合に発生する可能性があります。	なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Resource Management プロパティ (続く)

プロパティ	説明	デフォルト値
使用可能なキャパシティを計算し、イベント (time_off、meeting など) のある日にリソースが割り当てられないようにするために、ユーザーのスケジュールから除外されるリソースイベントタイプのカンマ区切りのリスト (*com.snc.resource_management.exclude_events_from_schedule*)	リソースのキャパシティ計算から除外する必要があるイベントと、システムがイベントを作成してはならないタイミングを指定します。 入力するイベントは、タイムカードテーブルの [カテゴリ] フィールドからのものである必要があります。	time_off
カレンダーにソフト割り当てを表示 (*com.snc.resource_management.calendar_show_soft_allocations*)	次のオプションが表示されます。 • リソースマネージャー：選択すると、ソフト割り当てはリソースマネージャーのみがカレンダーに表示できます。 • 全員：選択すると、PPS リソースロールを持つすべてのユーザーがソフト割り当てをカレンダーに表示できます。	リソースマネージャー
リソースグリッドで一度にフェッチするレコードの数 (*com.snc.resource_management.number_of_records_to_fetch_at_a_time*)	1 回のサーバー呼び出しでリソースグリッドにフェッチされたレコードの数。 たとえば、割り当てボードに 100 のプロジェクトがある場合、最初の呼び出しでは 30 のみがフェッチされます。ユーザーが下にスクロールすると、次の 30 のプロジェクトをフェッチするための呼び出しが行われます。同様に、ユーザーがたとえば 100 のリソース計画を含むプロジェクトを展開すると、最初の呼び出しで 30 のリソース計画のみがフェッチされます。スクロールすると、次の 30 のプランがフェッチされ、以下同様に続きます。	30
リソース計画の日付をプロジェクト/デマンドの日付以外にすることはできません (*com.snc.resource_management.do_not_allow_resource_plan_dates_outside_project_demand_da*	プロジェクトまたは要求の日付とリソース計画の日付の間の不一致を避けるために、プロジェクトまたは要求の日付を超えるリソース計画の日付の入力を制限します。 このプロパティが有効になっている場合、リソース計画を拡張、シフト、移動、またはそのステータスを要求済みから確定または割り当てに変更するときは、リソース計画の開始日と終了日がプロジェクトまたはデマンドの日付範囲内である必要があります。	いいえ
リソースファインダー検索でグループまたはロールに対して取得す	リソースファインダーでユーザーを検索するときにグループまたはロールに表示する必要があるユーザーの最大数を設定します	50

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Resource Management プロパティ (続く)

プロパティ	説明	デフォルト値
るユーザーの数を制限 (*com.snc.resource_management.number_of_users_to_fetch_in_finder_at_once*)		
リソース当たり 1 日 24 時間を超える労力を割り当てる (*com.snc.resource_management.allocate_more_than_24hours_per_day*)	1 日あたりのリソースに 24 時間を超える工数を割り当てます。	いいえ
特定の状況のリソースのアサインをキャパシティ計算から除外する (*com.snc.resource_management.exclude_status_from_availability*)	ステータスが定義されたリソースのアサインを、リソースの可用性と集計の計算から除外します。 [処理待ち]、[未承認] などの値をカンマで区切って入力できます。	このフィールドは空のままです。

[リソースプラン] フォーム

[リソース計画] フォームフィールドのフィールドの説明。

[リソースプラン] フォーム

フィールド	説明
番号	プランの自動生成された識別番号。
リソース タイプ	リソースのカテゴリ。グループを選択するには、[グループ] を選択します。個々のユーザーを選択するには、[ユーザー] を選択します。ロール別にリソースを選択するには、[ロール] を選択します。
グループ	プランに関連付ける特定のグループリソース。 [リソースタイプ] フィールドで [ロール] を選択した場合、[グループ] リストには選択したロールのグループのみが含まれます。
ユーザー	プランに関連付ける特定のユーザーリソース。 このフィールドは、[リソースタイプ] フィールドで [ユーザー] を選択した場合に表示されます。
ロール	プランに関連付ける特定のリソースロール。 このフィールドは、[リソースタイプ] フィールドで [ロール] を選択した場合に表示されます。
メンバー設定	選択したグループまたはロールの特定のメンバー、任意のメンバー、またはすべてのメンバー。デフォルトは [すべてのメンバー] です。 このフィールドは、[リソースタイプ] フィールドで [グループ] または [ロール] オプションが選択されている場合にのみ表示されます。 • グループまたはロールのすべてのメンバーを要求するには、[すべてのメンバー] を選択します。要求済みの時間は、キャパシティに応じて、選択したグループまたはロールのすべてのメンバー間で分割されます。ハード割り当てを行う前に、すべてのメンバーが必要で

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソースプラン] フォーム (続く)

フィールド	説明
	ない場合、リソースマネージャーはグループまたはロールの目的のメンバーのみを選択できます。 • グループまたはロールの特定のメンバーを要求するには、[特定のメンバー] を選択し、[メンバー] リストからメンバーを選択します。要求済みの時間は、キャパシティに応じて、選択したグループまたはロールの選択したメンバー間で分割されます。 • グループまたはロールの任意のメンバーを選択するには、[任意のメンバー] を選択します。計画期間中に最も利用可能なリソースが最初に要求されます。確認時に、これらのリソースに対してのみソフト割り当てが作成されます。 ソフト割り当てとハード割り当ての時間計算に対するメンバー設定の影響の詳細については、「リソース割り当て」を参照してください。 **注:** このフィールドは、リソースグリッドから開いた場合、デフォルトでフォームでは使用できません。必要に応じて、これらのフィールドを設定できます。リソース計画がリストビューから作成されている場合、フィールドは既に利用可能です。
スキル	リソース計画に割り当てるために要求されたリソースが持つ必要がある特定のスキル。 このフィールドは、[リソースタイプ] フィールドで [グループ] または [ロール] を選択し、[メンバー設定] フィールドで [すべてのメンバー] または [任意のメンバー] を選択した場合に表示されます。 詳細については、「スキル管理」を参照してください。
要求タイプ	要求のタイプ。要求を時間単位で指定するには、[時間] を選択します。フルタイムで同等の要求を指定するには、**[FTE]** を選択します。
FTE	フルタイム相当の選択の単位数。 このフィールドは、[要求タイプ] フィールドで **[FTE]** を選択した場合に表示されます。 詳細については、「リソースプラン」を参照してください。
予定時間数	すべてのリソース計画の作業を完了するために必要な推定作業時間。 **注:** リソース計画内のすべてのユーザーが同じスケジュールを持ち、そのスケジュールがリソース管理スケジュールと異なる場合、ユーザーのスケジュールは予定時間数を計算するために考慮されます。
名前	プランの内容を表す名前名前を入力しない場合、名前は [番号] + [簡単な説明] になります。タスクの簡単な説明が空の場合は、計画番号が使用されます。
タスク	プランが適用されるタスク。リソース計画がプロジェクトタスクから作成された場合は、タスク番号がここに表示されます。
開始日	リソース計画の開始日。デフォルトでは、このフィールドには関連するプロジェクトレコードまたはタスクレコードの [開始予定日] が表示されます。必要に応じて、デフォルトの日付を編集します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソースプラン] フォーム (続く)

フィールド	説明
	注: [リソース計画の日付をプロジェクト/デマンドの日付以外にすることはできません] プロパティが有効になっている場合、リソース計画の開始日をプロジェクトまたはデマンドの開始日より前にすることはできません。
終了日	リソース計画の終了日。デフォルトでは、日付は関連するプロジェクトレコードまたはタスクレコードの [終了予定日] から取得されます。必要に応じて、デフォルトの日付を編集します。 **注:** [リソース計画の日付をプロジェクト/デマンドの日付以外にすることはできません] プロパティが有効になっている場合、リソース計画の終了日をプロジェクトまたはデマンドの開始日より後にすることはできません。
割り当ての分散	ハード割り当てのタイプ。このフィールドの値は、ハード割り当ての作成中に割り当て済みの時間を分散する方法を決定します。以下のいずれかのオプションを選択します。 • 均等：割り当て期間のすべての営業日に時間を均等に分割して、リソースのリソースイベントを作成します。 • フロントロード：割り当ての開始日からリソースの利用可能なすべてのスロットを埋めることによって、リソースのリソースイベントを作成します。 たとえば、リソースが第 10 週に 30 時間要求された場合： • [均等] を選択すると、30 時間をすべての平日に均等に分割します。つまり、週 5 日間の作業で 1 日あたり 6 時間になります。 • [フロントロード] を選択すると、最初に月曜日に利用可能なすべての時間が消費され、次に火曜日に移動し、以下同様に続きます。すべての 30 時間が割り当てられます。リソースが第 10 週に 30 時間利用できない場合は、開始日から 1 日あたり 24 時間までの残り時間を埋めることで、フロントロードが過剰に割り当てられます。 **注:** このフィールドは、リソースグリッドから開いた場合、デフォルトでフォームでは使用できません。必要に応じて、これらのフィールドを設定できます。リソース計画がリストビューから作成されている場合、フィールドは既に利用可能です。
状況	リソース計画の状況。プランは [計画] ステータスで開始されます。 **注:** このフィールドは、リソースグリッドから開いた場合、デフォルトでフォームでは使用できません。必要に応じて、これらのフィールドを設定できます。リソース計画がリストビューから作成されている場合、フィールドは既に利用可能です。
レート上書き	レートモデルまたは賃金レートカードから導出された時給を上書きするオプション。 オプションを選択すると、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソースプラン] フォーム (続く)

フィールド	説明
	• リソースプランの予定コスト、確認済みコスト、および割り当て済みコストは、[リソースレート] フィールドで指定されたレートから導出されます。 • ユーザーがリソース計画のタイムカードを送信すると、[リソースレート] フィールドで指定されたレートが、リソース計画の実績コストの計算に使用されます。 このオプションは、リソース計画が [計画済み] ステータスの場合にのみ有効になります。 デフォルトでは、このオプションは選択されていません。
リソースレート	リソース計画の予定コストと実績コストを計算するためにレートモデルから返される時給を上書きする、リソースの時給。 このフィールドは、[レート上書き] オプションを選択すると表示されます。[レート上書き] チェックボックスをオフにすると、リソースレート値もクリアされ、すべての計算から削除されます。[レート上書き] チェックボックスを再度選択すると、以前のリソースレートは取得されません。

注:
[メンバーの基本設定]、[割り当て分散]、および [ステータス] フィールドは、リソースグリッドから開いた場合、フォームではデフォルトで使用できません。必要に応じて、これらのフィールドを設定できます。リソース計画がリストビューから作成されている場合、フィールドは既に利用可能です。

[リソースプラン] フォームタブ

[リソース計画] フォームのタブを使用して、リソース計画を作成します。

[リソースの詳細] タブのフィールド

フィールド	説明
リソースタイプ	リソース計画の作成時に選択されたリソースのタイプ。
グループ	リソース計画に関連付けられているグループ。
ロール	ロールリソース計画に関連付けられているロール。
ユーザー	ユーザーリソース計画に関連付けられているユーザー。
スキル	要求されたリソースがリソース計画に割り当てるために備えているスキル。 **注:** このフィールドは、すべてまたは任意のメンバー設定のリソース計画でのみ使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソースの詳細] タブのフィールド (続く)

フィールド	説明
メンバー設定	選択したグループまたはロールの特定のメンバー、任意のメンバー、またはすべてのメンバー。
メンバーリスト	特定のメンバー設定リソース計画の特定のメンバーとして選択されたリソース。
確認済み/割り当て済みのユーザー	リソース計画のためにリソースマネージャーによって確認/割り当てられたリソース。デフォルトでは、このフィールドは、リソース計画の特定のメンバー設定タイプに対して表示されます。

[要求の詳細] タブのフィールド

フィールド	説明
要求タイプ	リソース計画の作成時に選択された要求のタイプ。 • [要求タイプ] フィールドで **[FTE]** を選択すると、**[FTE]** フィールドが表示されます。 • [要求タイプ] フィールドで [人日] を選択すると、[人日] フィールドが表示されます。
予定時間数	すべてのリソース計画の作業を完了するために必要な推定作業時間。
確認済み/割り当て済みの時間	リソース割り当てからロールアップされた確認済みまたは割り当て済みの時間。
実績時間	タイムカードエントリーからロールアップされた実績時間。
FTE	フルタイム相当の選択の単位数。
デマンド通貨	PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効で、デマンド通貨ビューが有効になっている場合に、デマンドタスクに関連付けられている通貨のタイプ。詳細については、「デマンド管理における複数通貨」トピックを参照してください。
プロジェクト通貨	PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効で、プロジェクト通貨ビューが有効になっている場合に、プロジェクトまたはプロジェクトタスクに関連付けられている通貨のタイプ。詳細については、「プロジェクト管理における複数通貨」トピックを参照してください。
予定コスト	[予定時間] の値に、指定されたユーザーまたはグループリソースの時給を掛けたもの。この金

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[要求の詳細] タブのフィールド (続く)

フィールド	説明
	額は、リソース計画コストの最初のドラフト見積もりです。 時給は、次のいずれかのソースから算出されます。 • [レート上書き] オプションが選択されている場合、[リソースレート] フィールドで指定された時給が使用されます。 • レートモデルがリソース計画が関連付けられているプロジェクトまたはデマンドに設定されている場合、時給はレートモデルから導出されます。 • リソース計画が特定のユーザーに割り当てられ、そのユーザーのタイムシートポリシーが複数のレートタイプに設定されている場合、予定コストは、デフォルトのレートタイプの賃金レートカードを使用して決定されます。デフォルトのレートタイプが無効の場合、システムレートを使用して予定コストが決定されます。 • リソース計画が特定のユーザーに割り当てられており、ユーザーのタイムシートポリシーが複数のレートタイプに設定されていない場合、予定コストはレートタイプのない賃金レートカードを使用して決定されます。それ以外の場合は、システムレートが使用されます。 • 時給が機能しない通貨である場合、予算参照レートが使用されます。 **注:** リソースのレートを設定すると、リソース計画のより正確な予測と予定コストが提供されます。 予定コストは、[計画] または [要求済み] ステータスのプランの [要求済みの割り当て] から、および [確認済み] または [割り当て済み] ステータスのプランの [リソース割り当て] からロールアップされます。グループにリソースを要求しているときにリソースロールが指定されている場合、予定コストは指定されたロールの時給から計算されます。
デマンド通貨での予定コスト	PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効で、デマンド通貨ビューが有効になっている場合に、デマンド通貨でのデマンドまたはデマンドタスクに関連付けられているリソース計画の予定コスト。デマンド通貨での予定コストの

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[要求の詳細] タブのフィールド (続く)

フィールド	説明
	値は、予定時間を指定されたユーザーまたはグループリソースの時給で乗算し、その結果を予算参照レートに基づいてデマンド通貨に変換することによって導出されます。
プロジェクト通貨での予定コスト	PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効で、プロジェクト通貨ビューが有効になっている場合に、プロジェクト通貨でのプロジェクトまたはプロジェクトタスクに関連付けられているリソース計画の予定コスト。プロジェクト通貨での予定コストの値は、予定時間を指定されたユーザーまたはグループリソースの時給で乗算し、その結果を予算参照レートに基づいてプロジェクト通貨に変換することによって導出されます。
確認済み/割り当て済みのコスト	確認済みまたは割り当て済みのリソースの時給を掛けた、確認済みまたは割り当て済みの時間数。確認または割り当てられたプランのコストをより正確に見積もることができます。 • [レート上書き] オプションが選択されている場合、[リソースレート] フィールドで指定された時給が使用されます。 • レートモデルがリソース計画が関連付けられているプロジェクトまたはデマンドに設定されている場合、時給はレートモデルから導出されます。 • レートモデルが利用できない場合は、賃金レートカードによって時給が決定されます。 • ユーザーの賃金カードが見つからない場合、時給は次のタイムカードプロパティから取得されます。[タイムカードの処理時に、賃金レートカードからレートを取得できない場合に使用するデフォルトの時給 (システム通貨)]。
デマンド通貨での確認済み/割り当て済みコスト	PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効で、デマンド通貨ビューが有効になっている場合に、デマンド通貨でのデマンドまたはデマンドタスクに関連付けられているリソース計画の確認済みまたは割り当て済みのコスト。デマンド通貨での確認済み/割り当て済みコストは、確認済みまたは割り当て済みの時間に確認済みまたは割り当て済みのリソースの時給で乗算し、その結果を予算参照レートに基づいてデマンド通貨に変換することによって導出されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[要求の詳細] タブのフィールド (続く)

フィールド	説明
プロジェクト通貨での確認済み/割り当て済みコスト	PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効で、プロジェクト通貨ビューが有効になっている場合に、プロジェクト通貨でのプロジェクトまたはプロジェクトタスクに関連付けられているリソース計画の確認済みまたは割り当て済みのコスト。プロジェクト通貨での確認済み/割り当て済みコストは、確認済みまたは割り当て済みの時間に確認済みまたは割り当て済みのリソースの時給で乗算し、その結果を予算参照レートに基づいてプロジェクト通貨に変換することによって導出されます。
実績コスト	実績時間に使用されたものと同じタイムカードに基づいて、各ユーザーの時給と作業時間を使用して実績コストが計算されます。ユーザーリソースが承認済みタイムカードに追加した実績時間に基づいて、リソース要求者とリソースマネージャーに実績コストを通知するために使用されます。 時給は次のように算出されます。 • [レート上書き] オプションが選択されている場合、[リソースレート] フィールドで指定された時給が使用されます。 • レートモデルがリソース計画が関連付けられているプロジェクトまたはデマンドに設定されている場合、時給はレートモデルから導出されます。 • ユーザーのタイムシートポリシーが複数のレートタイプに設定されている場合、実績コストは、デフォルトのレートタイプの賃金レートカードを使用して決定されます。 • デフォルトのレートタイプが無効の場合、システムレートを使用して実績コストが決定されます。 • ユーザーのタイムシートポリシーが複数のレートタイプに設定されている場合、実績コストは、レートタイプのない賃金レートカードを使用して決定されます。それ以外の場合は、システムレートが使用されます。
デマンド通貨での実績コスト	PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効で、デマンド通貨ビューが有効になっている場合に、デマンド通貨でのデマンドまたはデマンドタスクに関連付けられているリソース計画の実績コスト。デマンド通貨での実績コストの値は、各ユーザーの時給を作業時間で乗算し、その結果を為替レートに基づいてデマンド通貨に変換することによって導出されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[要求の詳細] タブのフィールド (続く)

フィールド	説明
プロジェクト通貨での実績コスト	PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効で、プロジェクト通貨ビューが有効になっている場合に、プロジェクト通貨でのプロジェクトまたはプロジェクトタスクに関連付けられているリソース計画の実績コスト。プロジェクト通貨での実績コストの値は、各ユーザーの時給を作業時間で乗算し、その結果を為替レートに基づいてプロジェクト通貨に変換することによって導出されます。

[割り当ての構成] タブのフィールド

フィールド	説明
割り当てタイプ	割り当てレコードのタイプを決定するプロジェクト全体のリソース割り当てのタイプ。このフィールドの値は、要求されたリソース間で予定時間数がリソース計画期間全体にどのように割り当てされるかを決定します。 • 週次：終了予定日の終わりまでの 1 週間分の割り当てを作成します。 • 月次：終了予定日の終わりまでの 1 か月間分の割り当てを作成します(デフォルト値)。 • 計画期間：リソース計画の全期間について、ユーザーごとに 1 つの割り当てを作成します。 たとえば、リソースが 1 月 1 日から 3 月 31 日までに要求された場合、タイプごとに次のレコードが作成されます。 • 月次：毎月 1 つずつ、3 つの割り当てレコード。 • 週次：月曜日が週の最初の日である各週に 1 つずつ、合計 14 件の割り当てレコード。 • 計画期間：リソース計画の全期間について 1 つのレコードのみ。
割り当ての分散	リソース計画の作成時に選択されたハード割り当てのタイプ。

[メモ] タブのフィールド

フィールド	説明
メモ	リソース計画に関するその他の連絡およびメモ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソースのアサイン] フォーム

[リソースのアサイン] フォームのフィールドについて説明します。

[リソースのアサイン] フォーム

フィールド	説明
リソース	プランに関連付ける特定のユーザーリソース。 **注:** 特定のリソースを選択すると、そのリソースに関連付けられたグループ、ロール、およびスキルの計画立案属性が自動的に入力されます。
グループ	計画に関連付けられているリソースのグループ。
ロール	プランに関連付けるリソースのロール。
スキル	プランに関連付けるリソースのスキル。
工数タイプ	計画に関連付ける工数のタイプ。 [時間] を選択して定義された時間セットを要求するか、[キャパシティ **(%)**] を選択してリソースキャパシティの特定の割合を要求します。
工数	必要な工数タイプ。
運用作業タイプ	運用作業のタイプ：KTLO、アドミン、会議、トレーニング、不在、外部作業、休暇、予約、および電話。
レートモデル	運用リソース計画に割り当てられたレートモデル。レートモデルは、リソース計画の時給を導出するために使用されます。 運用リソース計画に割り当てられたレートモデルを変更または削除すると、計画のコストフィールドが再計算されます。
開始日	運用リソース計画が開始される日付。
終了日	運用リソース計画が終了する日付。
リソースステータス	リソースのアサインのステータス。

リソースプラン関連リンクとリスト

リソース計画の関連リンクとリストを使用して、リソース計画の詳細のクローン作成、リソースワークベンチの表示、コスト計画の更新、リソースコストの再計算、または要求割り当ての変更の作業を行います。

関連リンク

フィールド	説明
リソース計画をコピー	開いたリソース計画を新しいリソースプランにコピーします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連リンク (続く)

フィールド	説明
コスト計画を更新	プロジェクトポートフォリオ管理を使用している場合、リソース計画はプロジェクトまたはデマンドのコストプランを自動的に作成します。 リソース計画を更新するたびに、[コストプランを更新] をクリックしてコストプランを最新の状態に保ちます。 注: リソース計画が更新されると、リソース計画に関連付けられたコストプランも自動的に更新されます。
リソースコストを再計算	レートモデルで時給が変更されるたびにリソース計画のリソースコストを再計算して、コストを最新に保ちます。

関連リスト

要求された割り当て	リソース計画に対して要求された割り当てのリスト。 作成される要求された割り当てレコードの数は、[割り当てタイプ] フィールドの値によって異なります。たとえば、リソースが 1 月 1 日から 3 月 31 日までに要求された場合、タイプごとに次の要求された割り当てレコードが作成されます。 • 月次：毎月 1 つずつ、3 つの割り当てレコード。 • 週次：月曜日が週の最初の日である各週に 1 つずつ、合計 14 件の割り当てレコード。 • 計画期間：計画された期間全体について 1 つのレコードのみ。
リソース割り当て	プランに割り当てられたリソースのリスト。
リソースプランのログ	リソースの割り当て中に発生する可能性があるエラーまたは警告を一覧表示します。

[リソース] フォーム

[リソース] フォームを使用して、運用リソース計画を作成します。

[リソース] フォーム

フィールド	説明
番号	運用リソース計画の自動生成された識別番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソース] フォーム (続く)

フィールド	説明
リソース タイプ	リソースのカテゴリ。グループを選択するには、[グループ] オプションを選択します。個々のユーザーを選択するには、[ユーザー] オプションを選択します。ロール別にリソースを選択するには、[ロール] を選択します。
グループ	運用リソース計画が作成されるグループ。 [リソースタイプ] フィールドで [ロール] を選択すると、選択リストには選択したロールのグループが表示されます。
ユーザー	運用リソース計画が作成されるユーザー。このオプションは、[リソースタイプ] フィールドで [ユーザー] を選択した場合に表示されます。
ロール	プランに関連付ける特定のリソースロール。このオプションは、[リソースタイプ] フィールドで [グループ] または [ロール] を選択した場合に表示されます。 [リソースタイプ] フィールドで [グループ] を選択すると、選択リストには選択したグループのロールが表示されます。
メンバー設定	選択したグループまたはロールの特定のメンバー、またはすべてのメンバー。デフォルトは [すべてのメンバー] に設定されています。このフィールドは、[リソースタイプ] フィールドで [グループ] または [ロール] オプションが選択されている場合にのみ表示されます。 • [すべてのメンバー] オプションを選択した場合、選択したグループまたはロールのすべてのメンバーがリソース計画に含まれます。時間は、そのキャパシティに応じて、選択したグループまたはロールのメンバー間で比例的に分割されます。ハード割り当てを行う前に、すべてのメンバーが必要でない場合は、リソースマネージャーとして、グループまたはロールから特定のメンバーのみを選択できます。 • [特定のメンバー] オプションが選択されている場合、指定されたメンバーに対して要求が行われます。要求済みの時間は、利用可能なキャパシティに基づいて、グループまたはロールの指定されたユーザー間で比例して分割されます。
スキル	プランに関連付ける特定のスキル。このフィールドは、[メンバー設定] フィールドで [すべてのメンバー] オプションが選択されている場合にのみ表示されます。 スキル管理の詳細については、「スキル管理」を参照してください。
要求タイプ	要求のタイプ：[時間単位] または [% キャパシティ]。作業時間を時間単位で見積もるには、[時間単位] オプションを選択します。作業をキャパシティのパーセンテージで見積もるには、[% キャパシティ] オプションを選択します。
予定時間数	運用作業を完了するために必要な推定時間数。
確認済み/割り当て済みの時間	運用作業のために確認または割り当てられたリソースの時間。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソース] フォーム (続く)

フィールド	説明
実績時間	計画された運用タスクに費やされた時間。 **注:** タイムカードを送信すると、タイムカードの承認時に、運用リソース計画の割り当てレコードの実績時間が更新されます。
名前	運用リソース計画の内容を表す名前
運用作業タイプ	運用作業のタイプ：KTLO、アドミン、会議、トレーニング、不在、外部作業、休暇、予約、および電話。デフォルトは **[KTLO]** です。
レートモデル	運用リソース計画に割り当てられたレートモデル。レートモデルは、リソース計画の時給を導出するために使用されます。 運用リソース計画に割り当てられたレートモデルを変更または削除すると、計画のコストフィールドが再計算されます。
開始日	運用リソース計画が開始される日付。
終了日	運用リソース計画が終了する日付。
割り当てタイプ	割り当てレコードのタイプを決定するリソース分散タイプ。このフィールドの値は、要求されたリソース間で予定時間数がリソース計画期間全体にどのように割り当てされるかを決定します。次のオプションのいずれかを選択します。 • 週次：終了予定日の終わりまでの 1 週間分の割り当てを作成します。 • 月次：終了予定日の終わりまでの 1 か月間分の割り当てを作成します。[月次] がデフォルト値です。 • 計画期間：リソース計画の全期間について、ユーザーごとに 1 つの割り当てを作成します。 たとえば、リソースが 1 月 1 日から 3 月 31 日までに要求された場合、タイプごとに次のレコードが作成されます。 • 月次：毎月 1 つずつ、3 つの割り当てレコード。 • 週次：月曜日が週の最初の日である各週に 1 つずつ、合計 14 件の割り当てレコード。 • 計画期間：リソース計画の全期間について 1 つのレコードのみ。
割り当ての分散	割り当て分散のタイプ。このフィールドの値は、ハード割り当ての作成中に割り当て済みの時間を分散する方法を決定します。 • 均等：割り当て期間のすべての営業日に時間を均等に分割して、リソースのリソースイベントを作成します。 • フロントロード：割り当ての開始日からリソースの利用可能なすべてのスロットを埋めることによって、リソースのリソースイベントを作成します。 たとえば、リソースが第 10 週に 30 時間要求された場合：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソース] フォーム (続く)

フィールド	説明
	• [均等] を選択すると、すべての平日の間で 30 時間が均等に分割されます。これは、週 5 日間の勤務時間で 1 日あたり 6 時間になります。 • [フロントロード] を選択すると、30 時間すべてが割り当てられるまで、月曜日に利用可能なすべての時間が消費され、次に火曜日に移動し、以下同様に続きます。リソースが第 10 週に 30 時間利用できない場合は、開始日から 1 日あたり 24 時間までの残り時間を埋めることで、フロントロードが過剰に割り当てられます。
状況	プランは [計画] ステータスで開始されます。プランは、送信後に [要求済み] ステータスに移行します。
予定コスト	*Planned Hours* の値に、指定されたユーザーまたはグループリソースの時給を掛けたもの。予定コストは、リソース計画コストの最初のドラフト見積もりです。 予定コストは、[計画] または [要求済み] 状況のプランの [要求済みの割り当て] から、および [割り当て済み] 状況のプランの [リソース割り当て] からロールアップされます。 時給は、次のいずれかのソースから算出されます。 • レートモデル (運用リソース計画に設定されている場合)。 • レートモデルが利用できない場合の賃金レートカード。 • 他のすべての条件が満たされない場合は、システムプロパティ *com.snc.time_card.default_rate* を使用します。 **注:** グループにリソースを要求しているときにリソースロールが指定されている場合、予定コストは指定されたロールの時給から計算されます。
確認済み/割り当て済みのコスト	確認済みまたは割り当て済みのリソースの時給を掛けた、確認済みまたは割り当て済みの時間数。確認または割り当てられたプランのコストをより正確に見積もることができます。 時給は、次のいずれかのソースから算出されます。 • レートモデル (運用リソース計画に設定されている場合)。 • レートモデルが利用できない場合の賃金レートカード。 • 他のすべての条件が満たされない場合は、システムプロパティ *com.snc.time_card.default_rate* を使用します。
実績コスト	実績時間の値に、指定されたリソースの時給を掛けたもの。 **注:** タイムカードを送信すると、タイムカードの承認時に、運用リソース計画の割り当てレコードの実績コストが更新されます。
メモ	追加の連絡および情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連リンク

フィールド	説明
リソース計画をコピー	開いたリソース計画をコピーして、新しいリソース計画を作成します。

関連リスト

フィールド	説明
要求された割り当て	リソース計画に対して要求された割り当てのリスト。 作成される要求された割り当てレコードの数は、[割り当てタイプ] フィールドの値によって異なります。たとえば、リソースが 1 月 1 日から 3 月 31 日までに要求された場合、タイプごとに次の要求された割り当てレコードが作成されます。 • 月次：毎月 1 つずつ、3 つの割り当てレコード。 • 週次：月曜日が週の最初の日である各週に 1 つずつ、合計 14 件の割り当てレコード。 • 計画期間：リソース計画の全計画期間について 1 つのレコードのみ。
リソース割り当て	プランに割り当てられたリソースのリスト。

[リソース計画を拡張] フォーム

[リソース計画を拡張] フォームのフィールドを使用して、プロジェクトのリソース計画を拡張します。

[リソース計画を拡張] フォームのフィールド

フィールド	説明
新しい終了日	リソース計画をいつまで延長するかという日付。
要求タイプ	要求のタイプ。オプションには、FTE、人日、または時間が含まれます。
FTE または人日または時間	リソースを要求する単位数。 このフィールドは、[要求タイプ] フィールドでオプションの 1 つを選択した場合に表示されます。選択した要求タイプに基づいて、単位を指定します。 詳細については、「要求タイプ」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[拡張を要求] フォーム

[拡張を要求] フォームを使用して、割り当てられたリソース計画の延長を要求します。

[拡張を要求] フォーム

フィールド	説明
延長期限	リソース計画を延長してリソースを要求する日付。
要求タイプ	要求のタイプ。オプションには、FTE、人日、または時間が含まれます。
FTE または人日または時間	リソースを要求する単位数。 このフィールドは、[要求タイプ] フィールドでオプションの 1 つを選択した場合に表示されます。選択した要求タイプに基づいて、単位を指定します。 詳細については、「要求タイプ」を参照してください。
メモ	プロジェクトマネージャーがリソースマネージャーと連絡するために必要な、リソース計画に関するその他の連絡および情報。

[要求された割り当て] フォーム

[要求された割り当て] フォームを使用して、[計画] または [却下] ステータスのリソース計画の要求を作成します。

[要求された割り当て] フォーム

フィールド	説明
開始日	要求された割り当てレコードの開始日。
終了日	要求された割り当てレコードの終了日。
FTE	要求された割り当てレコードのフルタイム相当の選択の単位数。 リソースが FTE として要求された場合、要求された各割り当てレコードの予定時間が最初に計算されます。すべての時間の合計が、リソース計画の予定時間としてロールアップされます。FTE の説明については、「リソースプラン」を参照してください。 **注:** キャパシティは FTE からではなく、スケジュールから導出されます。FTE とスケジュールの両方が互いに同期している必要があります。
リソースプラン	要求された割り当てレコードが添付されているリソースプラン番号。要求された割り当てレコードがリソース計画からアクセスされた場合、このフィールドは自動的に入力されます。
予定時間数	要求された割り当てレコードに割り当てる時間数。 デフォルトでは、[リソース計画] フォームの[リソースプラン] フォームは、要求された各割り当てレコードの作業日数に基づいて、要求されたすべての割り当てに比例配分されます。ただし、予定時間または FTE を上書きすることは可能です。
予定コスト	リソースのコスト概算。 `予定コスト = 予定時間 * 時給` 時給は、次のいずれかのソースから算出されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[要求された割り当て] フォーム (続く)

フィールド	説明
	• [レート上書き] オプションが選択されている場合、リソース計画の [リソースレート]。 • リソース計画が関連付けられているプロジェクトまたはデマンドにデータが設定されている場合、レートモデル。 • ユーザーリソース計画の賃金レートカード。 • ロールにレートがある場合、リソースロールによってリソースが要求されたときのロールレート。 • ロールにレートがない場合、またはロールが null の場合は、時給をグループ化します。 • 他のすべての条件が満たされない場合は、システムプロパティ *com.snc.time_card.default_rate* を使用します。 予定コストは、リソース計画の [予定コスト] フィールドにロールアップされます。
プロジェクト通貨での予定コスト	PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインがアクティブ化されており、プロジェクト通貨ビューが有効になっている場合の、プロジェクト通貨でのプロジェクトタスクの予定コスト。
デマンド通貨での予定コスト	PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効で、デマンド通貨ビューが有効になっている場合の、デマンド通貨でのデマンドタスクの予定コスト。

[リソースロール] フォーム

[リソースロール] フォームを使用して、プロジェクトチームメンバーのロールを作成します。

[リソースロール] フォーム

フィールド	説明
名前	リソースロールの名前。 **注:** リソースロール名は一意である必要があります。重複するロールを作成しないでください。
時間単価	作業時間に基づいてタスクコストを計算するために使用されるリソースロールの時給。
説明	リソースロールの詳細な説明。

[リソース割り当て] フォーム

[リソース割り当て] フォームを使用して、リソースの割り当てを行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソース割り当て] フォーム

フィールド	説明
開始日	リソース割り当ての開始日。開始日と終了日は、リソース計画の日付内である必要があります。
終了日	リソース割り当ての終了日。
リソース	割り当てられるリソース。ルックアップの結果は、リソース計画で選択されたグループ、ロール、またはユーザーによってフィルタリングされます。
確認済み/割り当て済みの時間	リソース計画が確認または割り当てられたときに、システムが確認またはリソースに割り当てる時間数。確認済みおよび割り当て済みの時間は、リソース計画の [確認済み/割り当て済みの時間] フィールドにロールアップされます。
FTE	フルタイム相当の選択の単位数。 このオプションは、リソース計画の [要求タイプ] フィールドで **[FTE]** を選択した場合に表示されます。
人日	人日選択の単位数。 このオプションは、リソース計画の [要求タイプ] フィールドで [人日] を選択した場合に表示されます。
予定コスト	リソースの予定コスト。 `予定コスト = 予定時間 * 時給`時給は、次のいずれかのソースから算出されます。 • [レート上書き] オプションが選択されている場合、リソース計画の [リソースレート]。 • リソース計画が関連付けられているプロジェクトまたはデマンドにデータが設定されている場合、レートモデル。 • レートモデルが利用できない場合の賃金レートカード。 • 他のすべての条件が満たされない場合は、システムプロパティ *`com.snc.time_card.default_rate`* を使用します。 予定コストは、リソース計画の [予定コスト] フィールドにロールアップされます。 デフォルトでは、このフィールドはフォームに表示されません。このフィールドが表示されていない場合は、それを追加するようにフォームを設定します。
確認済み/割り当て済みのコスト	リソースのコスト。 `確認済み/割り当て済みコスト = 確認済み/割り当て済み時間 * 時給` 時給は、次のいずれかのソースから算出されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソース割り当て] フォーム (続く)

フィールド	説明
	• [レート上書き] オプションが選択されている場合、リソース計画の [リソースレート]。 • リソース計画が関連付けられているプロジェクトまたはデマンドにデータが設定されている場合、レートモデル。 • レートモデルが利用できない場合の賃金レートカード。 • 他のすべての条件が満たされない場合は、システムプロパティ *com.snc.time_card.default_rate* を使用します。 確認済みおよび割り当て済みのコストは、リソース計画の [確認済み/割り当て済みのコスト] フィールドにロールアップされます。 デフォルトでは、このフィールドはフォームに表示されません。このフィールドが表示されていない場合は、それを追加するようにフォームを設定します。
デマンド通貨での確認済み/割り当て済みコスト	PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効で、デマンド通貨ビューが有効になっている場合の、デマンド通貨でのデマンドタスクの確認済み/割り当て済みコスト。
プロジェクト通貨での確認済み/割り当て済みコスト	PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効で、プロジェクト通貨ビューが有効になっている場合の、プロジェクト通貨でのプロジェクトタスクの確認済み/割り当て済みコスト。

[新規作成] フォーム

[新規作成] フォームを使用して、割り当てボードを作成します。

新しいフォームの作成

フィールド	説明
名前	割り当てボードの一意の名前。
タイプ	リソースをフィルタリングするレベル。 • デマンド/プロジェクト：選択すると、リソースはデマンドとプロジェクトからフィルタリングされます。 • グループ：選択すると、リソースはグループからフィルタリングされます。 • グループマネージャー：選択すると、pps_resource ロールを持つすべてのリソースがフィルタリングされます。 • ポートフォリオ：選択すると、リソースはポートフォリオからフィルタリングされます。 • プログラム：選択すると、リソースはプログラムからフィルタリングされます。 • リソースプラン：選択すると、リソースはフィルター基準でフィルタリングされ、特定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

新しいフォームの作成 (続く)

フィールド	説明
	のグループ、ロール、マネージャー、ポートフォリオ、またはプログラムにバインドされません。 • ロール：選択すると、リソースはロールからフィルタリングされます。 • ユーザーマネージャー：選択すると、pps_resource ロールを持つすべてのリソースがフィルタリングされます。 [タイプ] フィールドの値に応じて、レコードの名前を選択するフィールドが表示されます。たとえば、[タイプ] が [グループ] の場合、グループの名前を選択できる [グループ] フィールドが表示されます。

[リソースイベント] フォーム

[リソースイベント] フォームを使用して、リソース計画に含まれているリソースであっても更新します。

[リソースイベント] フォーム

フィールド	説明
名前	イベントの名前
タイプ	イベントのタイプ： • 休暇 • 予約 • 会議 • 電話 • タスク
時期/宛先	イベントの開始日と終了日。
終日	イベントがスケジュールで指定された終日のイベントである場合。
周期	イベントが [日次]、[週次]、[月次]、または [繰り返さない] 場合。
タスク	このイベントに関連付けられたタスク。
ユーザー	イベントに関連付けられたユーザー。

[リソースレポート] フォーム

[リソースレポート] フォームを使用して、リソースレポートを生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソースレポート] フォーム

フィールド	説明
レポートタイプ	表示するレポートのタイプ。次のオプションから選択できます。 • [可用性]- 選択した期間のエンティティの可用性を表示します。 • [稼働率の予測] - 選択した期間のエンティティの稼働率の予測を表示します。 • [確定した稼働率] - 選択した期間のエンティティの確定した稼働率を表示します。 • [割り当て] - 選択した期間の割り当てを表示します。 • [割り当ての詳細] - 選択した期間のエンティティの割り当ての詳細を表示します。
エンティティ タイプ	レポートを表示するエンティティ。次のオプションから選択できます。 • ユーザー • グループ • デマンド • プロジェクト • プログラム • ポートフォリオ • 他のタスク **注:** [レポートタイプ] フィールドで [割り当て] を選択した場合は、[ユーザー] と [グループ] のみを使用できます。
ユーザー	レポートを表示するユーザー。このフィールドは、[エンティティタイプ] フィールドで [ユーザー] を選択した場合にのみ表示されます。
グループ	レポートを表示するグループ。このフィールドは、[エンティティタイプ] フィールドで [グループ] を選択した場合にのみ表示されます。
グループごと	選択したグループのレポートを [ロール] または [メンバー] でフィルタリングするオプション。このフィールドは、[レポートタイプ] フィールドで [可用性] または [稼働率の予測] または [確定した稼働率] を選択し、[エンティティタイプ] フィールドで [グループ化] を選択した場合にのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソースレポート] フォーム (続く)

フィールド	説明
メンバー	レポートを表示する、選択したグループのグループメンバー。このフィールドは、[エンティティタイプ] フィールドで [グループ] を選択し、[グループ] フィールドで [メンバー] を選択した場合にのみ表示されます。
ロール	レポートを表示する、選択したグループのリソースロール。このフィールドは、[エンティティタイプ] フィールドで [グループ] を選択し、[グループ] フィールドで [ロール] を選択した場合にのみ表示されます。
デマンド	レポートを表示するデマンド。このフィールドは、[エンティティタイプ] フィールドで [デマンド] を選択した場合にのみ表示されます。
プロジェクト	レポートを表示するプロジェクト。このフィールドは、[エンティティタイプ] フィールドで [プロジェクト] を選択した場合にのみ表示されます。
プログラム	レポートを表示するプログラム。このフィールドは、[エンティティタイプ] フィールドで [プログラム] を選択した場合にのみ表示されます。
ポートフォリオ	レポートを表示するポートフォリオ。このフィールドは、[エンティティタイプ] フィールドで [ポートフォリオ] を選択した場合にのみ表示されます。
他のタスク	レポートを表示するタスク (デマンド、プロジェクト、プログラム、またはポートフォリオ以外)。このフィールドは、[エンティティタイプ] フィールドで [他のタスク] を選択した場合にのみ表示されます。
リソースプラン	レポートを表示するリソース計画。このフィールドは、[エンティティタイプ] フィールドで [ユーザー] または [グループ] を選択した場合表示されません。
開始日と終了日	レポートを表示する開始日から終了日までの期間
ズームレベル	レポートを表示するズームレベル。次のオプションから選択できます。 • 週次：選択した期間中の各週のデータを表示します。 • 月次：選択した期間中の各月のデータを表示します。
レポートの単位	リソースのキャパシティ、可用性、または割り当てが表示される単位。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リソースレポート] フォーム (続く)

フィールド	説明
	• 時間：リソースのキャパシティ、可用性、または割り当てを時間単位で表示します。 • FTE：リソースのキャパシティ、可用性、または割り当てを FTE で表示します。 • 人日：リソースのキャパシティ、可用性、または割り当てを人日で表示します。 このフィールドは、[レポートタイプ] フィールドの値が [可用性]、[割り当て]、または [割り当ての詳細] である場合にのみ表示されます。

[新しいイベント] フォーム

[新しいイベント] フォームを使用して、タスク、イベント、および予約をカレンダーに追加します。

[新しいイベント] フォーム

フィールド	説明
名前	イベントのわかりやすい名前を入力します。
タイプ	リストからタイプを選択します。 • 休暇：個人の休暇。 • 予約：管理タスクの一種。 • 会議：仕事に関連する会議。 • 電話：仕事に関連する電話。 • タスク作業：ServiceNow システム内のタスク (アサインされているインシデントや変更など)。
タスク	参照ルックアップアイコンをクリックし、実行する必要のあるタスクを選択します。 このフィールドは、アクティビティのタイプとして [タスク] を選択した場合にのみ表示されます。 **注:** このアクションによって、タスクフォームの [割り当て先] フィールドにユーザーが追加されることはありません。
時期	開始と終了の日時を選択するか、[終日] オプションを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[新しいイベント] フォーム (続く)

フィールド	説明
	このフィールドを使用して反復可能なイベントを設定しないでください。
周期	[日次]、[週次]、[月次] など、アクティビティが繰り返される頻度を選択するか、このイベントが繰り返されないイベントの場合は [繰り返さない] を選択します。 たとえば、月曜日と金曜日に作業するタスクがある場合は、月曜日と金曜日に週次の繰り返し可能なイベントを設定します。「繰り返し可能なイベントの作成」を参照してください。
繰り返し間隔	頻度を表す数値を入力します。 このフィールドは、[繰り返し] フィールドで [日次]、[月次]、または [年次] を選択した場合にのみ表示されます。
繰り返し：	アクティビティを繰り返す曜日を選択します。 このフィールドは、[繰り返し] フィールドで、[週次] を選択した場合にのみ表示されます。
繰り返し期限：	終了日を選択します。 このフィールドは、[繰り返し] フィールドで [日次]、[月次]、または [年次] を選択した場合にのみ表示されます。

診断機能フォーム

診断機能フォームを使用して、リソースの新しい診断機能を作成します。

診断機能フォーム

フィールド	説明
名前	診断機能の名前。この名前は、この診断機能が属するアプリケーションに表示されます。
有効	診断機能を有効にするためのオプション。
アプリケーション	この診断機能を関連付けるアプリケーションを検索して選択します。
ロール	目的のロールを [選択済み] リストに移動します。選択したロールを持つユーザーは、診断機能にアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

診断機能フォーム (続く)

フィールド	説明
説明	診断機能の詳細。説明は、診断機能が属するアプリケーションに表示されます。これにより、ユーザーは機能で実行された診断スキャンを理解できます。

[診断入力] フォーム

[診断入力] フォームのフィールドを使用して、ユーザーのフィルター条件を指定します。

[診断入力] の各フィールド

フィールド	説明
ラベル	入力フィールドのラベルの名前。
フィールド タイプ	[参照] フィールドタイプを選択します。
テーブル	条件で指定されたクエリを実行するテーブルの名前。
キー	ユーザー入力条件の識別子。ユーザーが複数の条件を指定した場合、このキーは各条件の一意の識別子として機能します。このキーは、診断スクリプトの `scanContext` セクションの入力として使用できます。

[診断スクリプト] フォーム

[診断スクリプト] フォームを使用して、アプリケーションのデータに破損がないかどうかをスキャンします。

[診断スクリプト] フォームフィールド

フィールド	説明
名前	診断スクリプトの名前。スクリプトの目的を明確に説明する名前を使用してください。スクリプト名を使用すると、診断スキャンの作成時にスクリプトを機能にマッピングするときに、正しいスクリプトを識別できます。
説明	診断スクリプトの詳細。説明により、ユーザーはスクリプトの機能を理解できます。
診断スクリプト	診断スクリプトの実際のコード。

[診断] フォーム

[診断] フォームを使用して、診断スクリプトと修正スクリプトを備えた診断スキャンおよびマッピング診断機能を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[診断] フォームフィールド

フィールド	説明
名前	診断スキャンの名前。この名前は、この診断スキャンが属するアプリケーションに表示されます。
有効	診断スキャンを有効にするためのオプション。
順番	この診断スキャンがアプリケーションに表示される順序。
機能	この診断スキャンを関連付ける診断機能を検索して選択します。
ロール	目的のロールを [選択済み] リストに移動します。選択したロールを持つユーザーは、診断スキャンにアクセスできます。
説明	診断スキャンの詳細。説明は、診断スキャンが属するアプリケーションに表示されます。これにより、ユーザーは診断スキャンを理解できます。

ポートフォリオ管理

ServiceNow® Portfolio Management アプリケーションを使用すると、関連するプログラム、プロジェクト、およびデマンドのコレクションであるポートフォリオを作成できます。その後、ファイナンシャルプランを実行し、これらのポートフォリオのステータスと進捗状況を監視できます。

ポートフォリオ構造、ポートフォリオとプログラムの作成、ステークホルダーレジストリーの設定、およびポートフォリオワークベンチについては、この 4 分間のビデオをご覧ください。 ポートフォリオ構造、ポートフォリオとプログラムの作成、ステークホルダーレジストリーの設定、およびポートフォリオワークベンチに関する情報。

ポートフォリオを管理するには、it_portfolio_manager ロールが必要です。ポートフォリオ管理アプリケーションは、ポートフォリオマネージャーに次の機能を提供します。


- 関連するプログラム、プロジェクト、およびデマンドを追加して、ポートフォリオを作成します。
- デマンド、プロジェクト、およびプログラムを選択して、年毎ポートフォリオ計画立案を実行します。
- ポートフォリオの一部であるすべてのプログラム、プロジェクト、およびデマンドの進捗状況とステータスを追跡します。コスト、リソース、スケジュール、リスク、および問題を追跡できます。

次の図は、ポートフォリオ管理の概要を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポートフォリオ管理の概要

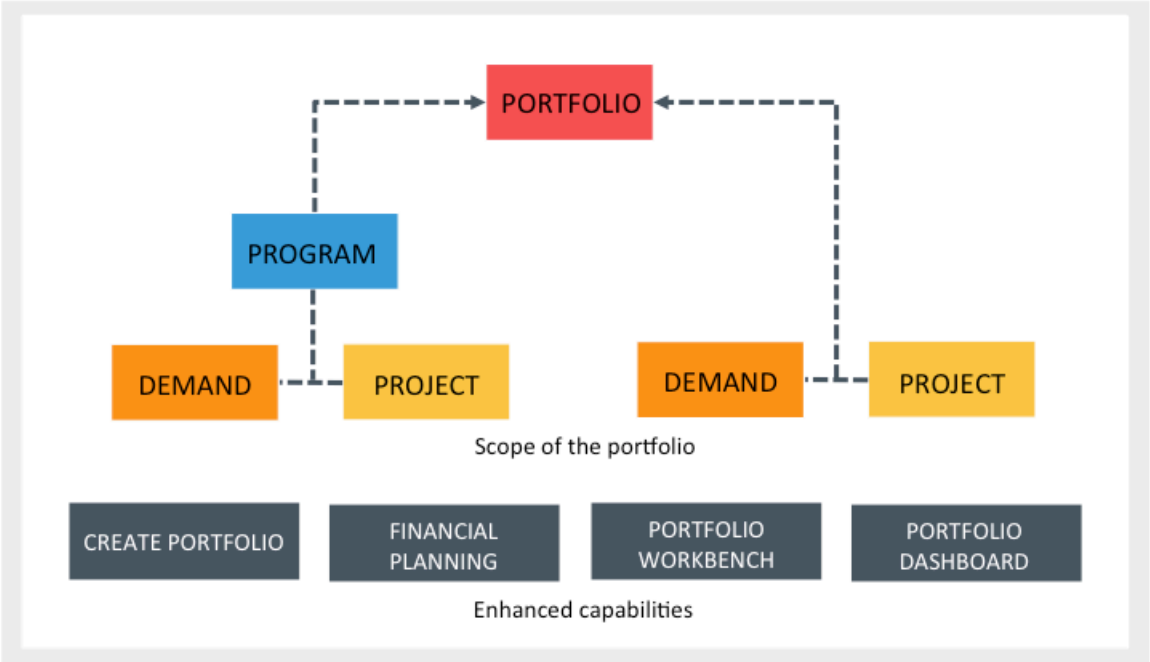

特徴

ポートフォリオ管理には、次の機能もあります。

ポートフォリオワークベンチ

ポートフォリオワークベンチは、ポートフォリオの一部であるプログラム、プロジェクト、およびデマンドの進捗状況を表示および監視するための中心的な場所を提供します。また、年毎ポートフォリオ計画の実行や、ポートフォリオの予算および予測計画の作成を行うこともできます。

ポートフォリオの年毎計画

年毎計画ウィザードは、ポートフォリオワークベンチで利用できます。年毎計画プロセスは、次のステップで構成されています。

1. ポートフォリオの全体的なコスト要件を決定し、ターゲットを設定します。
2. 予算ターゲットとリソースの可用性に基づいて、会計年度のデマンドとプロジェクトを選択します。
3. 予算計画を作成および昇格します。
4. 必要に応じて、予算が確定する前にプロジェクトとデマンドを追加または削除して what-if 分析を実行し、予算計画を再度昇格させます。

ポートフォリオの予算予測

ポートフォリオワークベンチを使用して、ポートフォリオマネージャーは、実績コストおよび変更されたプロジェクト要件に基づいて、将来の期間のポートフォリオ予算を再見積もり (予測) できます。

ポートフォリオの追跡

ファイナンシャルプランが完了すると、ポートフォリオワークベンチでポートフォリオの進捗状況を追跡できます。この追跡には、予算に対して費やされている実際の金額、費やされた実際の時間、リスク、および問題が含まれます。

ポートフォリオマネージャーダッシュボード

ポートフォリオマネージャーダッシュボードは、ポートフォリオおよびポートフォリオ財務のさまざまなグラフィカルレポートを生成するための中心的な場所を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

シナリオベースのポートフォリオ計画立案

PPM のシナリオ計画アプリケーションを ServiceNow Store からインストールして、ポートフォリオマネージャーがデマンドとプロジェクトのさまざまな組み合わせでシナリオベースのポートフォリオ計画立案を実行できるようにします。ポートフォリオ内の複数のシナリオを比較し、組織に財務的価値を付加するデマンドとプロジェクトにのみ資金を提供することができます。

ポートフォリオの作成

関連するプログラム、プロジェクト、およびデマンドを管理するためのポートフォリオを作成します。

始める前に

- ポートフォリオの一部として含めるデマンド、プログラム、およびプロジェクトを作成します。
- 必要なロール：it_portfolio_manager または admin

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > ポートフォリオ > 新規作成.
   に移動することもできます プロジェクト管理 > ポートフォリオ > ワークベンチをクリックし、[新規作成] をクリックします。
2. このポートフォリオに含まれるプログラム、プロジェクト、およびデマンドを要約する一意の名前を入力します。
3. 付属するさまざまなプログラム、プロジェクト、およびデマンドを適切に説明するポートフォリオの説明を入力します。
4. ポートフォリオマネージャーの名前を入力します。
5. [ポートフォリオを作成] をクリックします。

タスクの結果

ポートフォリオが作成され、フォームが再度開いて、追加のフィールド、関連リンク、および関連リストが表示されます。

次のタスク

次の関連リンクとリストに入力して、ポートフォリオを完成させます。

ポートフォリオフォーム 関連リンク

フィールド	説明
デマンドワークベンチ	デマンドワークベンチを開くためのリンク。
ポートフォリオターゲット	各会計年度の投資および経費ターゲットを入力する [ポートフォリオターゲット] ダイアログボックスを開くためのリンク。このターゲット金額は、会計期間の間で均等に分割されます。 ポートフォリオターゲットは、[ポートフォリオターゲット] 関連リストに含まれます。
ポートフォリオワークベンチ	ポートフォリオワークベンチを開くためのリンク。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポートフォリオフォーム 関連リンク (続く)

フィールド	説明
ポートフォリオ計画立案	シナリオ計画用のポートフォリオ計画立案ワークベンチを開くためのリンク。この関連リンクは、PPM のシナリオ計画 がインスタンスにインストールされている場合に利用できます。詳細については、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。

ポートフォリオフォーム 関連リスト

フィールド	説明
デマンド	ポートフォリオの一部であるデマンドのリスト。 デマンドを作成するには、[新規] をクリックします。 既存のデマンドをポートフォリオに追加するには、[編集] をクリックします。
プロジェクト	ポートフォリオの一部であるプロジェクトのリスト。既存のプロジェクトをポートフォリオに追加するには、[編集] をクリックします。
プログラム	ポートフォリオの一部であるプログラムのリスト。 プログラムを作成するには、[新規] をクリックします。 既存のプログラムをポートフォリオに追加するには、[編集] をクリックします。
リスク	ポートフォリオの一部であるリスクのリスト。プログラム、プロジェクト、およびデマンドのリスクもこのリストに表示されます。 リスクを作成するには、[新規] をクリックします。
問題	ポートフォリオの一部である問題のリスト。ポートフォリオ、プログラム、プロジェクト、およびデマンドの問題もこのリストに含まれます。 問題を作成するには、[新規] をクリックします。
コスト計画	ポートフォリオの一部であるプロジェクトとデマンドのコスト計画のリスト。
利益計画	ポートフォリオの一部であるプロジェクトとデマンドの金銭的利益計画のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポートフォリオフォーム 関連リスト (続く)

フィールド	説明
	金銭的利益計画を作成するには、プロジェクトまたはデマンドレコードを開き、[金銭的利益計画] 関連リストで [新規] をクリックします。
金銭以外の利益計画	ポートフォリオの一部であるプロジェクトとデマンドの金銭以外の利益計画のリスト。 金銭以外の利益計画を作成するには、プロジェクトまたはデマンドレコードを開き、[金銭以外の利益計画] 関連リストで [新規] をクリックします。
ポートフォリオターゲット	さまざまな会計年度のポートフォリオ投資コストターゲットと経費コストターゲットのリスト。値は、project_finding テーブルから表示されます。これらの値は、ポートフォリオワークベンチの [ターゲットを設定] ステージで設定します。さまざまな会計期間のターゲットを作成できます。 **注:** PPS アドミニストレーターは、次の場所に移動してポートフォリオターゲットを設定することもできます プロジェクト管理 > ポートフォリオターゲットの入力.
予算計画と予算策定	会計年度に応じて、ポートフォリオの一部であるプロジェクトとデマンドを一覧表示します。プロジェクトまたはデマンドをポートフォリオ予算計画に含めることも、除外することもできます。 ポートフォリオワークベンチの [プロジェクトおよびデマンドを選択] ステップでプロジェクトまたはデマンドを選択して次のステージに進むと、[計画] の値が **[true]** に変わります。

ポートフォリオステータスリストを開く

ポートフォリオのステータスリストを開いて、ポートフォリオに含まれているプロジェクトを確認します。

始める前に

必要なロール：it_portfolio_manager

手順

1. 移動先 プロジェクト管理 > ポートフォリオ > すべて.
2. ポートフォリオを開きます。
3. [ポートフォリオのステータス] 関連リンクをクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポートフォリオステータスレコードリストが開きます。

4. 必要に応じて、現在のポートフォリオに関連付けられている別のプロジェクトを選択できます。

従来のポートフォリオワークベンチ

ポートフォリオワークベンチは、関連するデマンドとプロジェクトのリストを表示し、ポートフォリオを計画し、その進捗状況を追跡するための中心的な場所を提供します。ポートフォリオワークベンチは、Paris リリースで廃止されました。ポートフォリオワークベンチは、以前のリリースからアップグレードしたインスタンスでは引き続き使用できますが、新しいインスタンスでは使用できません。

注:
このトピックの内容は、以前のリリースから Yokohama にアップグレードしたお客様向けのものです。新しいお客様の場合は、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。

ポートフォリオワークベンチを次の目的で使用するには、it_portfolio_manager ロールが必要です。

- ポートフォリオ計画立案：ポートフォリオの計画立案を実行します。ポートフォリオでターゲットを設定し、プロジェクトとデマンドを選択し、予算計画を作成できます。
- ポートフォリオ予算予測：ファイナンシャルプランの一環として、実績コストに基づいて将来の期間のポートフォリオ予算を再見積もり (予測) します。
- ポートフォリオ追跡：プログラムの進捗状況と、ポートフォリオの一部であるプロジェクトおよびデマンドを表示および監視します。

注:

- ポートフォリオワークベンチはサービスポータルに基づいています。つまり、要件および組織のワークフローに応じてワークベンチを構成、カスタマイズ、および拡張できます。詳細については、サービスポータル ドキュメントを参照してください。
- ポートフォリオワークベンチでは、モバイルデバイスをサポートしていません。

New York で始まるポートフォリオワークベンチに加えて、ポートフォリオ計画立案ワークベンチを使用してシナリオベースのポートフォリオ計画立案を実行できます。このシナリオベースの計画立案では、投資予算とリソースを組織に最適なデマンドとプロジェクトに集中させることができます。

PPM のシナリオ計画 を使用すると、将来発生する可能性のあるリスクと不確実性を特定し、考えられる計画立案シナリオを作成し、いずれかのシナリオが現実になるのを追跡できます。たとえば、選択したすべてのデマンドとプロジェクトを含むシナリオ A があるが、チームの速度を低下させる可能性があるリスクがあることがわかっているとします。シナリオ B では速度を下げて、特定したリスクが現実になったときにシナリオ B に切り替えることができます。詳細については、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。

ポートフォリオワークベンチには、 開いているポートフォリオの次のセクションが表示されます。

- 左側のセクションには、ポートフォリオの計画立案に使用される次のフィールドがあります。
  - 会計年度：計画立案を行う対象の会計年度を選択するリスト。

    注:
    リストに会計年度がない場合は、会計カレンダーを生成 します。

  - 計画立案ステップ **(Planning Steps)**：ポートフォリオの計画立案に関連するステップ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 完了した、および現在の計画立案ステップ番号を表示します。
- 完了した計画立案ステップにチェックを入れます。
- ポートフォリオの現在の計画立案ステップを強調表示します。

示されているポートフォリオワークベンチの例では、ポートフォリオはステップ 2 (デマンドおよびプロジェクトの選択) にあります。ステップ 1 (ターゲットの設定) は実行されています。


- 中央のセクションには、ポートフォリオの一部であり、選択した会計年度に属するすべてのデマンドとプロジェクトのリストが表示されます。緑色のチェックマークは、選択した会計年度での実行が選択されたデマンドとプロジェクトを示します。

  注:

  - このセクションでデマンドまたはプロジェクトをクリックして、それぞれのレコードを開きます。プロジェクトまたはデマンドフォームに必要な変更を加えることができます。
  - デマンドは、[開始予定日] および [期日] フィールドが設定されており、デマンドが承認済みまたは認定済みステータスの場合にのみ含まれます。

- 右上のセクションのロックは、ポートフォリオ計画立案がまだ完了しておらず、追跡アクションが有効になっていないことを示しています。財務計画立案が完了すると、[ポートフォリオを追跡] アクションが有効になり、ポートフォリオマネージャーがポートフォリオの進捗状況を追跡できるようになります。

ポートフォリオワークベンチの例

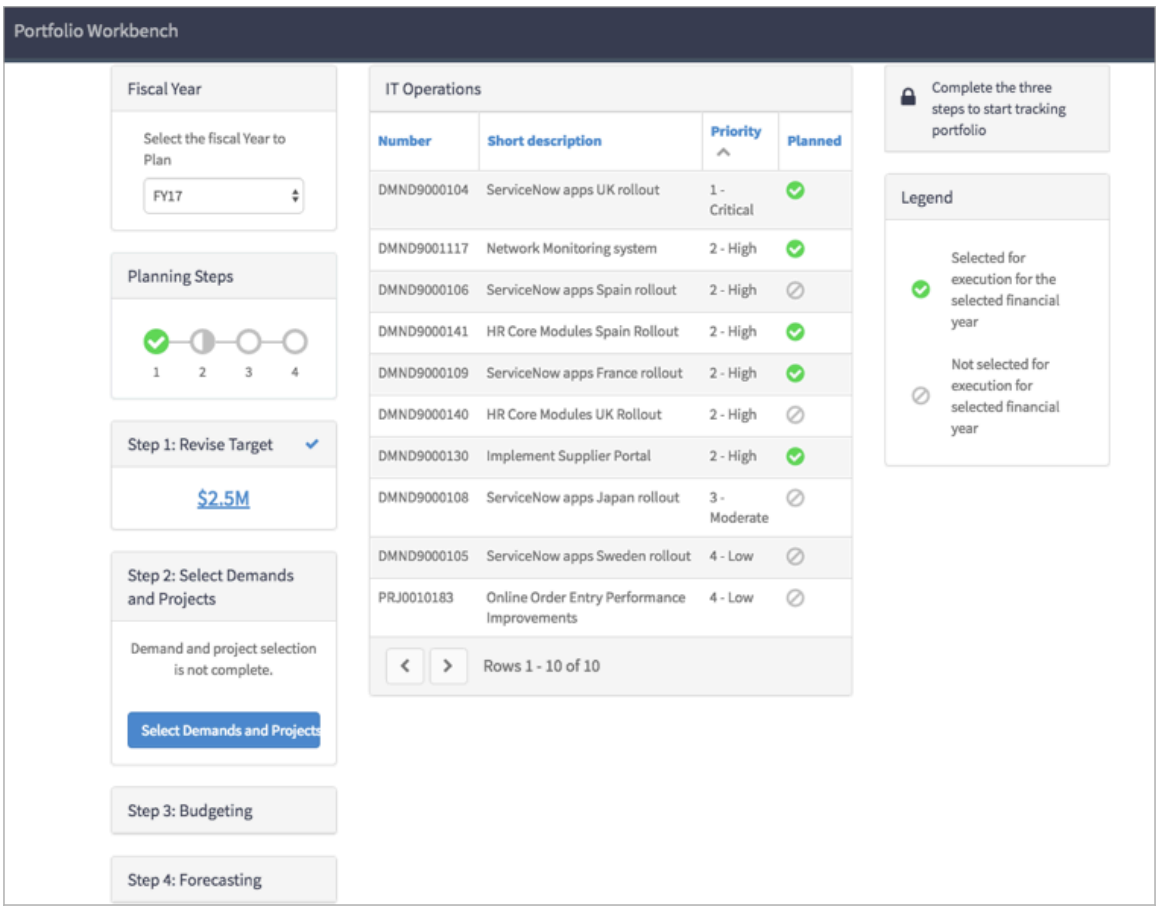

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


従来のポートフォリオワークベンチへのアクセス

ポートフォリオワークベンチにアクセスすると、すべてのポートフォリオのリストがダッシュボードに表示されます。

始める前に
必要なロール：it_portfolio_manager

手順

1. ポートフォリオワークベンチに次のいずれかの方法でアクセスします。
   - ポートフォリオフォームで、[ポートフォリオワークベンチ] 関連リンクをクリックします。
   - 移動先 すべて > プロジェクト管理 > ポートフォリオ > ワークベンチ
2. 構成アイコン ( ) をクリックし、プロジェクト、タスク、ポートフォリオなどの色を選択します。
   ワークベンチではこれらの色を使用して、ポートフォリオのアイテムをタイムラインビューのガントチャートに表示します。

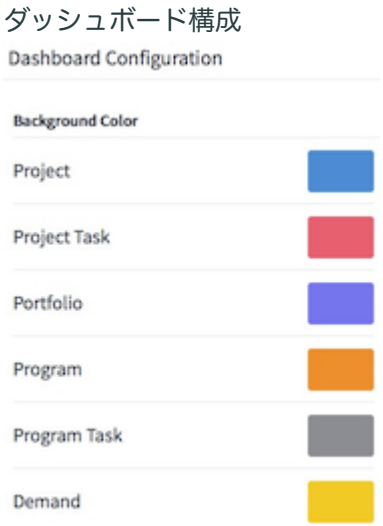3. 開くポートフォリオをクリックします。

レガシー - ポートフォリオの計画立案

ポートフォリオマネージャーは、ポートフォリオワークベンチを使用して、会計年度のポートフォリオのファイナンシャルプラン立案を実行できます。ポートフォリオ計画立案は、簡易モードまたは詳細モードのいずれかを使用して完了できます。

このトピックの内容は、以前のリリースから Yokohama にアップグレードしたお客様向けのものです。新しいお客様の場合は、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。


ポートフォリオフォームで、[ポートフォリオ計画立案] フィールドを [詳細] または [シンプル] に設定できます。選択内容に応じて、ポートフォリオワークベンチに計画立案ステップが入力されます。

次の図は、詳細計画立案モードと簡易計画立案モードでの計画立案プロセスの概要を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポートフォリオの計画立案

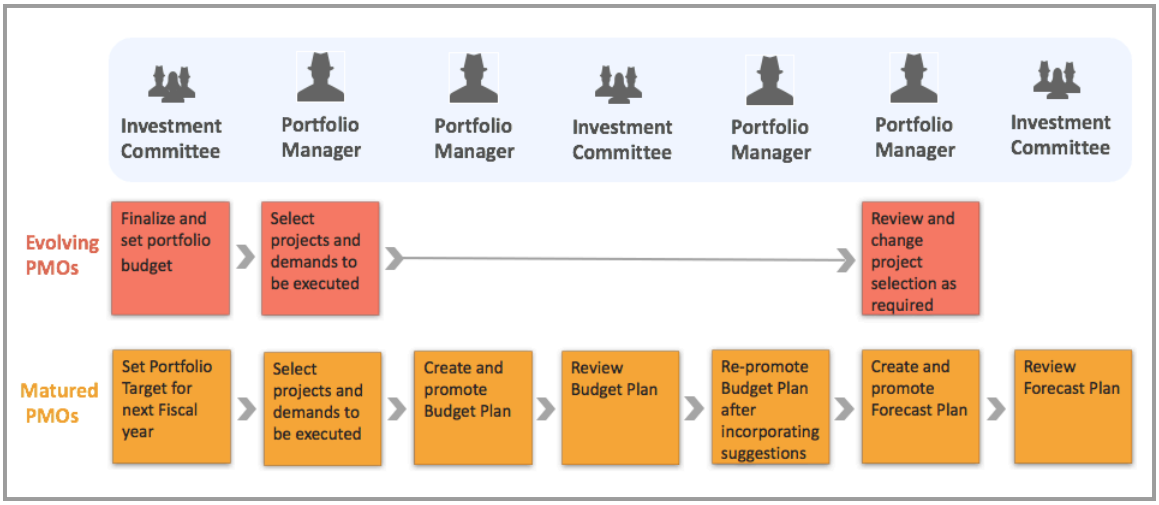

簡易モードでのポートフォリオ計画

ポートフォリオが簡易計画立案モードの場合は、ポートフォリオ内のプロジェクトおよびデマンドに対して簡易のファイナンシャルプランを実行できます。次の手順を実行します：

1. 会計期間を選択し、ターゲットを設定します。
2. プロジェクトおよびデマンドを選択します。

計画立案が完了したら、ポートフォリオのパフォーマンスを追跡し、予定予算を実績と比較し、リスクと問題をレビューします。

詳細モードでのポートフォリオの計画立案

ポートフォリオが詳細計画立案モードの場合は、次の手順に従います。


1. 会計年度を選択し、ターゲットを設定します。
2. プロジェクトおよびデマンドを選択します。
3. 予算計画を作成します。
4. 必要に応じて、予算計画を再度昇格させます。
5. 予測計画を作成します。

詳細モードでのポートフォリオ計画立案フローの例が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細ポートフォリオ計画立案の例

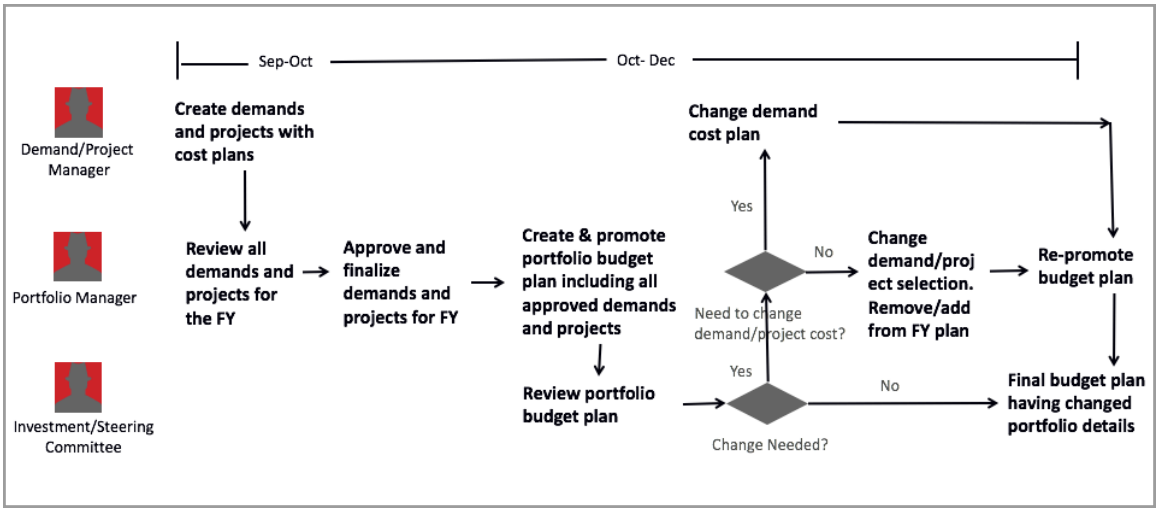

計画立案が完了したら、ポートフォリオのパフォーマンスを追跡し、予定予算を実績と比較し、リスクと問題をレビューします。

PPM のシナリオ計画

PPM のシナリオ計画アプリケーションを ServiceNow Store からインストールして、ポートフォリオマネージャーがデマンドとプロジェクトのさまざまな組み合わせでシナリオベースのポートフォリオ計画立案を実行できるようにします。ポートフォリオ内の複数のシナリオを比較し、組織に財務的価値を付加するデマンドとプロジェクトにのみ資金を提供することができます。

レガシー - ポートフォリオワークベンチの計画立案ビュー

選択した会計年度にスケジュールされているすべてのデマンドとプロジェクトを、計画コスト、リソース要件、および優先度とともに表示し、実行用に確定できます。

これらのセクションは、ポートフォリオワークベンチの計画立案ビューに表示されます。

デマンドおよびプロジェクト

デマンドおよびプロジェクトは、2 つの異なるタブに表示されます。

- [バブルチャート] タブ：選択した会計年度に計画されている認定済みまたは承認済みのすべてのデマンドを表示します。デマンドは、計画コスト、ROI %、リスクなどの属性に基づいてスコアが付けられ、 バブルチャート形式で表示されます。

  実行用に選択されたデマンドは、青色の境界線 ( ) で強調表示されます。

  選択されたデマンドの数とデマンドの合計数の対比は、チャートの右上隅にカウンターとして表示されます (DMN: 3 of 4)。

  > **注:**
  > デマンドがプロジェクトに変換され、プロジェクトが [対応中] ステータスになっている場合があります。これらのデマンドはバブルチャートには表示されません。これらのデマンドをプロジェクトとしてタイムラインビューに表示します。

- [タイムライン表示] タブ：ポートフォリオの一部であるすべてのデマンドとプロジェクトのリストを表示します。また、ポートフォリオ内のすべてのプロジェクト、デマンド、およびプログラムの経時的なガントチャートも表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

バブルチャートで実行用に選択されたすべてのデマンドは、タイムラインビューで選択済みとして表示されます。

ポートフォリオマネージャーは、次のアクションを実行できます。

- [ダッシュボード構成] 設定を使用して、ガントチャートのポートフォリオアイテムの色を設定します。
- ガントチャートカレンダーのズームレベルに [自動調整] を選択します。ガントビューは、スクロールバーを使用せずにタイムライン全体を表示できるように 1 ページに収まります。
- 各デマンドまたはプロジェクトの横にあるチェックボックスをオンにして、実行するデマンドまたはプロジェクトをオンまたはオフにします。選択されたデマンドの数、デマンドの合計数、選択されたプロジェクトの数、およびプロジェクトの合計数が、それぞれのカウンターとして表示されます (DMN: 3 of 4 および PRJ: 8 of 10)。
- 必要に応じて [投資予算] および [経費予算] 列を使用して、個々のプロジェクトおよびデマンドの投資予算および経費予算を直接レビューまたは修正します。
- ポートフォリオのプロジェクト間の外部依存関係を確認します。
- スコア、通貨、数値属性、または手動調整に基づいてデマンドとプロジェクトをランク付けします。ランクは、ポートフォリオ内でのデマンドとプロジェクトの承認と実行のための優先順位付けに役立ちます。

  デフォルトでは、[スコアによるランク付け] リストは、システムで生成されたスコアに基づいてデマンドとプロジェクトをランク付けします。リストには次のオプションがあります。

  - ビジュアルソートによるランク付け：ROI %、優先度、計画コストなどの通貨または数値属性に基づいてプロジェクトとデマンドをランク付けする場合は、最初に必要な属性でソートし、このアクションを実行してその属性でランク付けする必要があります。
  - ランクを調整：ランクにギャップがある場合 (たとえば、一部のプロジェクトが次の会計年度に移動された場合やキャンセルされた場合)、このアクションを実行してプロジェクトを再配置できます。たとえば、ランクが 1、2、5、8 の場合、このアクションではランクを 1、2、3、および 4 として調整します。

  ポートフォリオマネージャーは、[ランク] フィールドを編集してランクを変更することもできます。プロジェクトまたはデマンドのランクが変更されると、他のランクが自動的に調整されます。たとえば、ランク 2 のプロジェクトが 4 とランク付けされた場合、ランク 3 のプロジェクトは自動的にランク 2 と見なされ、ランク 4 のプロジェクトは自動的にランク 3 と見なされます。

  注:
  エンティティのランクは会計年度に固有です。プロジェクトを FY17 に 3 としてランク付けし、FY18 には 6 としてランク付けできます。

注:

- 重要なマイルストーンは、プロジェクトタイムラインの上にオーバーレイとして表示されます。
- アドミニストレーターは、タイムラインビューの列フィルターリスト ( ) に表示する列をカスタマイズできます。

チャート

表示されるチャートはポートフォリオのさまざまな要素を表しており、ポートフォリオの計画立案に役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コスト (計画 対 ターゲット)：計画コストと、[ターゲットを設定] ステップで入力したターゲットを表示します。ポートフォリオ計画のためにプロジェクトとデマンドを選択する場合に、このチャートを使用します。

  デマンドまたはプロジェクトを選択すると、選択したすべてのデマンドとプロジェクトの合計計画コストを表すコストバーが埋まり始めます。選択したすべてのデマンドおよびプロジェクトの合計計画コストが目標予算を超えている場合、例外アイコン () が合計計画コストとともに表示されます。

  このウィジェットでは、次のことを実行できます。

  - 選択リストで会計期間を選択します。
  - [投資] または [経費] についてのみ、または [すべて] について計画コストを表示します。

- [リソースの概要] と [使用率 **(%)**]：ポートフォリオ計画のためにプロジェクトとデマンドを選択する場合は、これらのチャートを使用します。
  - [リソースの概要] タブ：次のアイテムを積み上げ棒グラフで表示します。棒グラフの任意のセクションをポイントすると、その詳細が表示されます。
    - キャパシティ：ポートフォリオ内の選択したデマンドおよびプロジェクトによって要求されたすべてのグループまたはリソースの総キャパシティ。
    - 要求された時間：ポートフォリオの選択されたすべてのデマンドとプロジェクトによって要求された合計時間数。他のポートフォリオのデマンドまたはプロジェクトによって要求された時間は含まれません。
    - 確認済みの時間：選択したデマンドおよびプロジェクトによって要求されたグループのすべてのポートフォリオで確認された時間数。
    - 割り当てられた時間：選択したデマンドおよびプロジェクトによって要求されたグループのすべてのポートフォリオで割り当てられた時間数。

    チャートの設定を変更するには、次のいずれかのオプションを選択します。
    - 時間：時間と会計期間に関連してチャートを表示します。
    - **FTE**：FTE および会計期間の観点からチャートを表示します。
    - 人日：人日と会計期間に関連してチャートを表示します。

    理想的には、合計リソース時間 (すべての四半期) が、リソースの総キャパシティ以下である必要があります。合計時間がリソースのキャパシティを超えている場合は、いくつかのデマンドまたはプロジェクトを保留するか、リソースを追加してキャパシティを増やすことができます。

    割り当て済み、確認済み、または要求済みを示す棒グラフのセクションをクリックすると、関連するリソース計画が開きます。

  - [使用率 **(%)**] タブ：ポートフォリオ内の選択したデマンドおよびプロジェクトによって要求されたすべてのリソースの使用率のヒートマップが表示されます。各リソースグループまたはグループのロールの使用率は、次のように計算されます。

    `(現在のポートフォリオの選択されたデマンドとプロジェクトにより要求された合計時間 + すべてのポートフォリオの選択されたデマンドおよびプロジェクトにより確認済みのグループの合計時間および割り当てられたグループの合計時間) / グループキャパシティ`

    グループの使用率が 100% を超える場合、ポートフォリオマネージャーはドリルダウンして、デマンドまたはプロジェクトの要求を確認できます。その後、優先度の低いデマンドまたはプロジェクトを除外して、使用率のバランスを取ることができます。

    ヒートマップの表示設定を変更するには、次のいずれかのオプションを選択します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- グループ：ポートフォリオに対して要求されたリソースグループのヒートマップを表示します。
- ロール：ポートフォリオに対して要求されたリソースロールのヒートマップを表示します。

ヒートマップ内の任意のセルをクリックすると、関連するリソース計画にドリルダウンし、特定のグループが要求されている場所が示されます。例：

ヒートマップからのリソース計画のドリルダウン

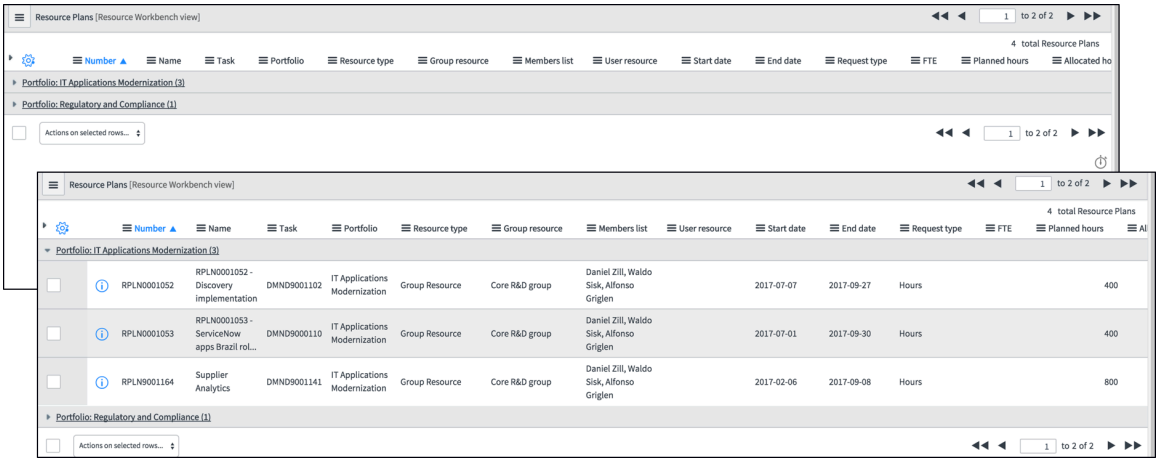

UI アクション

ポートフォリオワークベンチの計画立案ビューの上部には、次のオプションがあります。


- リフレッシュアイコン ( )：デマンドまたはプロジェクトが実行用に選択または選択解除された後に、コストチャートとリソースチャートを手動で更新します。
- [自動リフレッシュ] スイッチ：構成アイコン ( ) をクリックすると、[自動リフレッシュ] スイッチが表示されます。スイッチは、デマンドまたはプロジェクトが実行用に選択されるか選択解除されると、コストチャートとリソースチャートの自動リフレッシュを有効にします。

計画立案ビューの例 1



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

計画立案ビューの例 **2**

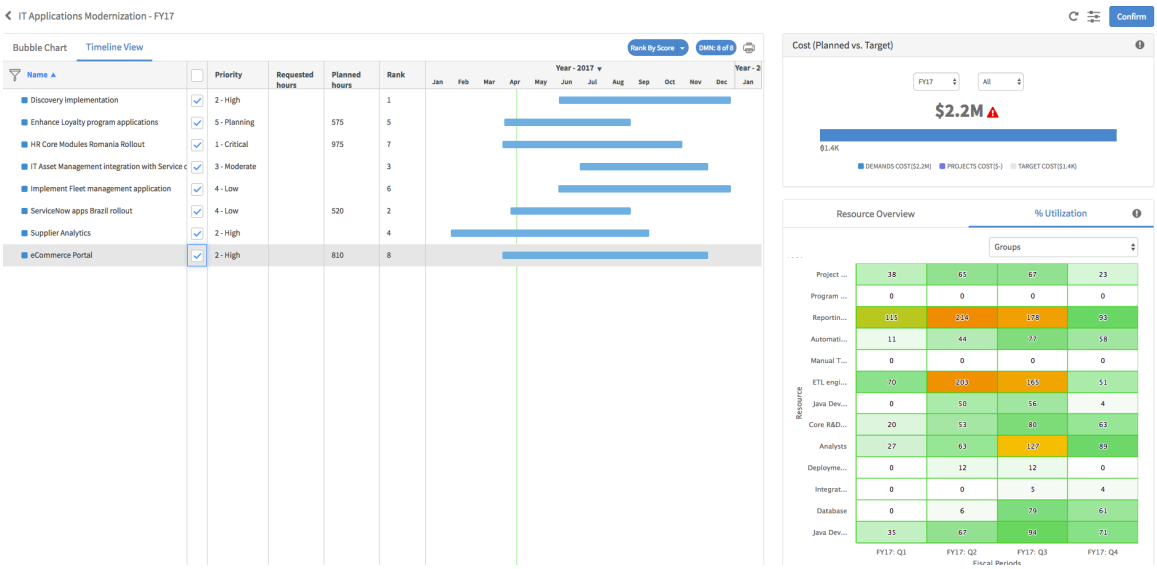

レガシー - 会計年度の選択およびターゲットの設定

ポートフォリオの簡易および詳細計画立案のいずれにおいても、最初のステップは、処理するデータの会計期間を選択することです。次に、経費と投資コストのターゲット金額を設定します。

始める前に

ポートフォリオフォームで、ポートフォリオの [ポートフォリオ計画立案] フィールドを [シンプル] または [詳細] に設定します。

必要なロール：it_portfolio_manager または it_pps_admin

このタスクについて

通常、ターゲット金額は運営委員会または投資委員会によって提供されます。計画会計年度のターゲットは、前会計年度の実績支出額を基準にして、前年度の支出額の 110% にすることができます。ターゲットは、翌会計年度の計画立案プロジェクトの出発点です。

注:
PPS アドミニストレーターは、次の場所に移動してポートフォリオターゲットを設定することもできます プロジェクト管理 > ポートフォリオターゲットの入力.

手順

1. 従来のポートフォリオワークベンチへのアクセス、計画立案を行うポートフォリオを開きます。
2. [会計年度] 選択リストで、計画立案を行う対象の年を選択します。
   ファイナンシャルプランは、一度に 1 つの会計期間についてのみ実行できます。
3. [ステップ 1：ターゲットの設定 **(Step 1: Set Target)]** で、[ターゲットを設定] をクリックします。
4. [投資ターゲット] および [経費ターゲット] の金額を入力します。

   注:
   ポートフォリオワークベンチで定義された予算ターゲットは、ITFM でも表示できます。

5. [保存] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果

- ステップ 1 で予算ターゲットが表示されます。ターゲット金額をクリックすると、金額を変更できます。
- 異なる会計年度のポートフォリオの投資コストおよび経費コストターゲットは、ポートフォリオレコードの [ポートフォリオターゲット] 関連リストで更新されます。

次のタスク

レガシー - ポートフォリオ計画立案のためのデマンドとプロジェクトの選択。

レガシー - ポートフォリオ計画立案のためのデマンドとプロジェクトの選択

会計期間を選択して予算ターゲットを設定したら、予算計画立案に含めるデマンドとプロジェクトを選択します。選択した会計年度に予定されているすべてのデマンドとプロジェクトを、その計画コストおよび優先度とともに表示して、実行用に確定できます。

始める前に

必要なロール：it_portfolio_manager

このタスクについて

このステージでは、デマンドまたはプロジェクトとそれらの計画コストを含めたり除外したりして、what-if 分析を実行できます。計画コストは、プロジェクトまたはデマンドに対して作成されたすべてのコスト計画から導出されます。これは、会計年度における特定のプロジェクトまたはデマンドのすべてのコスト計画のすべてのコストの合計です。

手順

1. ポートフォリオワークベンチの [ステップ **2]** で [デマンドおよびプロジェクトを選択] をクリックします。
2. ポートフォリオワークベンチの計画立案ビューで、次の操作を実行できます。

オプション	説明
バブル チャート内	右クリックして、次の項目を選択します。 ○ デマンドを表示：デマンドフォームを開いて表示できます。 ○ 実行用に選択 ：デマンドをポートフォリオ計画立案に含めることができます。 ○ 削除：デマンドをポートフォリオ計画立案から除外できます。
タイムラインビュー内	リストの各プロジェクトまたはデマンドの横にあるチェックボックスを使用して、計画立案に含めるか、または除外します。

3. 計画立案ビューで次のアイテムを確認し、計画立案に含めるまたは除外するデマンドとプロジェクトを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [コスト (計画 対 ターゲット)] チャートを使用して、計画コストと、[ターゲットを設定] ステージで入力したターゲットを確認します。計画コストがターゲットコストを上回っている場合、例外アイコン ( ) が計画コストとともに表示されます。
- [リソースの概要] チャートを使用して、選択したデマンドとプロジェクトの実行用に要求されたリソース時間数を確認します。この数を、すべてのポートフォリオ全体で確認済み/割り当て済みの、要求されたリソースの数と比較します。
- ポートフォリオ内の選択したデマンドおよびプロジェクトによって要求されたすべてのリソースに対する [使用率 **(%)**] ヒートマップを使用します。

注:
計画コストをターゲット予算内に、またリソース使用率を 100% 以内にするために、ポートフォリオマネージャーは優先度の低いいくつかのデマンドまたはプロジェクトの選択を解除します。これらの選択解除されたデマンドとプロジェクトは、別の会計期間に移動できます。

4. 必要に応じて [投資予算] および [経費予算] 列を使用して、個々のプロジェクトおよびデマンドの投資および経費予算を直接レビューまたは修正します。

   タイムラインビューでフィルターアイコン ( ) をクリックし、[投資予算] および [経費予算] 列が表示されていない場合は追加します。
5. デマンドとプロジェクトを確定したら、[確認] をクリックします。
6. [確認] ダイアログボックスで、2 つのチェックボックスをオンにして、選択したデマンドとプロジェクトに対して追加のアクションを実行できます。
   選択したデマンドのみを承認するか、またはデマンドをプロジェクトに変換するには、最初のチェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、 プロジェクトプロパティの [ポートフォリオワークベンチからのデマンドの確認後にプロジェクトを作成します] が true と false のいずれに設定されているかに応じて異なります。
   - プロジェクトプロパティが true の場合、チェックボックスは [選択したすべてのデマンドをプロジェクトに変換] になり、これをオンにすると選択したデマンドが承認され、プロジェクトに変換されます。
   - プロジェクトプロパティが false の場合、チェックボックスは [選択したすべてのデマンドをプロジェクトに対して承認 **(Approve all the selected demands to projects)**] になり、これをオンにすると、選択したデマンドが承認だけされます。

   選択したデマンドとプロジェクトのリソースを確認するには、2 番目のチェックボックス [選択したプロジェクトとデマンドのリソースを確認] をオンにします。
7. [確認] ダイアログボックスで **[OK]** をクリックします。

タスクの結果
[確認] ダイアログボックスで選択したチェックボックスに基づいて、次のアクションが実行されます。

- 選択したデマンドが承認されてプロジェクトに変換されるか、または承認だけされます。
- 選択したデマンドとプロジェクトに対してリソースが確認されます。関連するすべてのリソース計画が、[要求済み] ステータスから [確認済み] ステータスに移行します。

次のタスク
レガシー - 予算計画の作成および昇格：[ポートフォリオ計画立案] が [詳細] に設定されている場合。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レガシー - ポートフォリオワークベンチを使用した、デマンドまたはプロジェクトの開始予定日の変更

デマンドまたはプロジェクトの開始日を変更し、別の会計期間にシフトすることで、コストとリソースのバランスを取ります。

始める前に

デマンドとプロジェクトは、ポートフォリオワークベンチのタイムラインビューで開きます。

必要なロール：it_portfolio_manager

手順

1. ポートフォリオワークベンチの [ステップ **2]** で [デマンドおよびプロジェクトを選択] をクリックします。
2. タイムラインビューで、フィルターアイコン ( ) をクリックし、[開始予定日] 列が表示されていない場合は追加します。
3. デマンドの開始予定日を変更するには、[開始予定日] 列の値をダブルクリックし、新しい日付を選択します。
4. プロジェクトの開始予定日を変更するには、次のアクションを実行します。
   a. プロジェクトを右クリックし、[編集] オプションを選択します。
   b. プロジェクトフォームでヘッダーバーを右クリックして、コンテキストメニューから [プロジェクト移動] オプションを選択します。
   c. ダイアログボックスで日付を選択し、**[OK]** をクリックします。

タスクの結果

日付を変更すると、コスト計画とリソース計画に次のような影響があります。

- コスト計画：コスト計画の日付は、プロジェクトまたはデマンドの日付の変更に対応して変更されます。たとえば、デマンドが 2 か月シフトすると、関連するすべてのコスト計画も 2 か月シフトします。
- リソース計画：リソース計画の日付は、プロジェクトまたはデマンドの日付の変更に関連して変更されます。リソース計画の状況の変更は次のとおりです。
  - 割り当て済みステータスのリソース計画：割り当て済みステータスのリソース計画への影響は次のとおりです。
    - リソース計画の開始日が将来の場合、リソース計画は [要求済み] ステータスに戻されます。
    - リソース計画の開始日が過去の場合、リソース計画はキャンセルされます。過去の日付のハード割り当ては保持され、将来のハード割り当ては削除されます。新しい日付の新しいリソース計画が [要求済み] ステータスで作成されます。
  - 確認済みステータスのリソース計画：ソフト割り当ては削除され、計画は [要求済み] ステータスに移動します。
  - 計画ステータスおよび要求済みステータスのリソース計画：リソース計画の状況に変更はありません。

注:
プロジェクトプロパティの [デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更でリソースプランとコスト計画の開始日を変更 **(Change Resource Plan and Cost Plan Start Date with Demand or Project Start Date Change)]** が、デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更に関するコスト計画とリソース計画の変更を制御します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レガシー - プロジェクト間の外部依存関係の確認

ポートフォリオ内のプロジェクト間の外部依存関係を確認し、相互に依存しているプロジェクトをより詳細に追跡します。

始める前に

必要なロール：it_portfolio_manager
デマンドとプロジェクトを、ポートフォリオ計画立案ワークベンチのタイムラインビューで開きます。

このタスクについて

ポートフォリオマネージャーは、互いに依存しているプロジェクトを把握して、これらのプロジェクトをより詳細に追跡することができます。
たとえば、プロジェクト B がプロジェクト A (外部ソフト依存関係) に依存していて、プロジェクト B のスケジュールが影響を受けないように、プロジェクト A が時間どおりに実行されるようにしたいとします。[依存関係] 列には、プロジェクト A から送信する外部依存関係とプロジェクト B に受信する外部依存関係があることが示されます。受信する依存関係を使用して、プロジェクト A の遅延がプロジェクト B に影響するかどうかを判断できます。

手順

1. タイムラインビューで、ガントで列を表示または非表示アイコン ( ) をクリックし、表示されていない場合は [依存関係] 列を追加します。
   受信および送信する外部依存関係の数が表示されます (存在する場合)。
2. プロジェクトの [依存関係] 列で外部依存関係をクリックします。
3. [依存関係] ポップアップダイアログで、タブをクリックして依存関係を確認します。


   [受信] タブ

   プロジェクトから受信する依存関係を持つタスクがリストされます。

   [送信] タブ

   プロジェクトに送信する依存関係を持つタスクがリストされます。

   プロジェクト間の外部依存関係

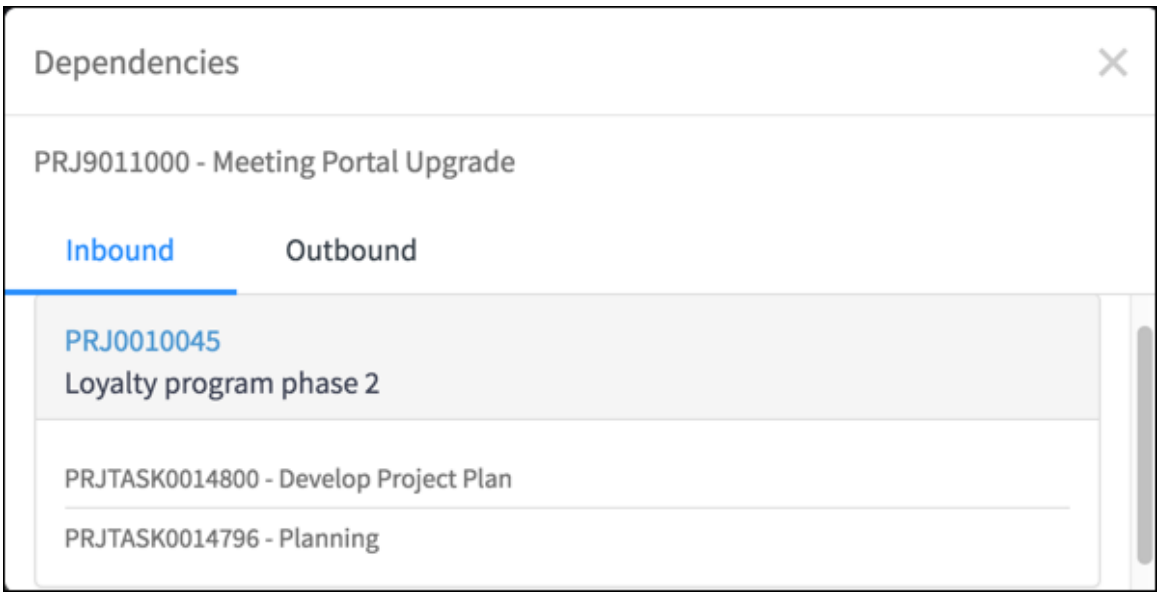

4. タブのプロジェクト番号をクリックして、リンクされたプロジェクトを計画立案コンソールビューで開いて確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レガシー - 予算計画の作成および昇格

PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理) 統合の一環として、ポートフォリオの予算計画を作成して昇格することができます。

始める前に

- 必要なロール：it_portfolio_manager
- ポートフォリオフォームで、ポートフォリオの [ポートフォリオ計画立案] フィールドを [詳細] に設定する必要があります。
- ポートフォリオマネージャーの名前は、ポートフォリオフォームの [ポートフォリオマネージャー] フィールドで設定する必要があります。
- ポートフォリオの予算計画を作成して昇格するには、選択した会計期間の予算期間がオープンしている必要があります。

> **注:**
> PPS アドミニストレーターは、以下から会計期間の予算期間をオープンおよびクローズすることもできます。 プロジェクト管理 > 予算期間のオープン/クローズ.

このタスクについて

予算計画には、選択したすべてのプロジェクトとデマンドからのコストが含まれます。予算計画の概要はポートフォリオワークベンチに表示され、詳細はファイナンシャルプランで確認できます。詳細計画モードでは、ポートフォリオを追跡できるように予算計画の作成が必須です。

手順

1. ポートフォリオワークベンチに移動し、追跡するポートフォリオを開きます。
2. [ステップ 3：予算業務] で [予算計画を昇格] をクリックします。

タスクの結果

- 選択した会計年度のポートフォリオの予算計画が作成され、昇格されます。必要に応じて、予算計画を再度昇格させることができます。
- 予算期間内で初めてポートフォリオマネージャーが予算計画を昇格させると、ステータスが [承認待ち] の予算タスクが作成されます。タスクのステータスは、ポートフォリオワークベンチに表示されます。

次のタスク

- ポートフォリオワークベンチの [ステップ 3：予算業務] の下で、予算計画名の下にある予算計画の状況を確認します。[ステータス] リンクをクリックして、 ファイナンシャルプランワークベンチで予算計画の予算タスクを表示します。経理は、 計画立案ワークベンチでポートフォリオ予算計画をレビューし、計画を承認します。
- レガシー：ポートフォリオの追跡。
- レガシー - 予測計画の作成および昇格。
- 予算計画が確定し、それ以上変更が予定されていない場合は、予算期間をクローズする必要があります。

関連情報

従来のポートフォリオワークベンチ

ファイナンシャルマネジメント - 従来

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レガシー - ファイナンシャルプランワークベンチ

ファイナンシャルプランワークベンチは、予算タスクを管理し、昇格した計画をレビューおよび承認するための中心的な場所です。ファイナンシャルプランワークベンチは、Paris リリースで廃止されました。ファイナンシャルプランワークベンチは、以前のリリースからアップグレードしたインスタンスでは引き続き使用できますが、新しいインスタンスでは使用できません。

注:
このトピックの内容は、以前のリリースから Yokohama にアップグレードしたお客様向けのものです。新しいお客様の場合は、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。

ファイナンシャルプランワークベンチを使用するには、itfm_plan_analyst ロールが必要です。

予算タスクは、予算プロセスの簡素化を支援します。予算期間中に経理が予算オーナーと会話するのに役立ちます。

IT ファイナンスアナリストロールでは、ワークベンチを使用して次のことを実行できます。


- 予算タスクの生成：すべての予算オーナーの予算タスクを作成します。
- 予算タスクの公開：予算オーナーが予算期間の計画の作業を開始できるように、予算タスクを公開します。
- 計画の進捗状況の追跡：予算期間の昇格された計画を表示および監視します。
- 計画の承認：タスクを承認して、昇格した計画を承認します。

注:
計画立案ワークベンチは、 Jakarta リリースで使用された予算コンソールに置き換わるものです。計画立案ワークベンチを使用できるのは IT ファイナンスアナリストのみで、予算オーナーは使用できません。

ファイナンシャルプランワークベンチの詳細は次のとおりです。

- ファイナンスアナリストは、年および予算計画の定義を選択できます。予算期間がオープンで、計画がまだ昇格されていない場合、アナリストには、予算オーナーの予算タスクを作成するオプションがあります。
- 予算タスクが生成された後、ファイナンスアナリストはターゲットを更新し、予算タスクに特定の指示を入力できます。予算タスクは、予算期間の計画を実行できるように予算オーナーに対して公開されます。
- その後、オープンしている予算または予測期間の昇格された計画が左ペインに表示されます。

計画立案ワークベンチのサンプル

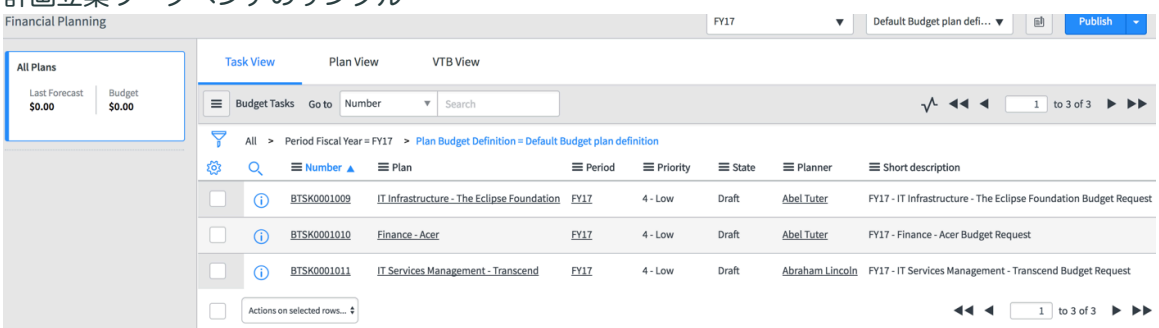

ファイナンシャルプランワークベンチの右ペインには、次の 3 つのタイプのビューがあります。

タスクビュー

各計画者のタスクとそのステータスのリストを表示します。タスクレコードを開いて計画者にメモを追加し、タスクのステータスを更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

計画ビュー

計画者が昇格した計画を表示します。グリッドビューを使用すると、次のことができます。

- テンプレートで構成した列別にデータを表示します。
- コストセンターやベンダーなど、任意の列で列をグループ化します。
- 予算金額、前回の予測金額、および年別、四半期別、または月別の実績を表示します。

VTB ビュー

予算タスクをステータス別に表示します。

ドラフト

IT ファイナンスアナリストが予算期間のタスクを生成しました。

公開

IT ファイナンスアナリストが、計画タスクを実行できるように計画者にタスクを公開しました。

入力待ち

計画者はタスクを IT ファイナンスアナリストに昇格しますが、アナリストは計画者が予算金額について再作業できるようにタスク作業メモを更新します。

承認待ち

計画者がタスクを送信し、IT ファイナンスアナリストが計画タスクに関するコメントを承認または提供するのを待機しています。

承認済み

IT ファイナンスアナリストが計画を承認します。

[実績を生成] ボタンを使用すると、予算定義データソースの実績を生成してグリッドに表示できます。

次に行うこと

予算計画を昇格させる予算期間を作成します。

レガシー - 予算期間の作成

予算期間は、予算計画の昇格を制御します。会計年度に作成された予算計画は、予算期間がオープンである場合にのみ昇格させることができます。

始める前に

必要なロール：itfm_plan_analyst、admin

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルプラン > アドミニストレーション > 予算期間.
2. [予算期間] リストビューで [新規] をクリックします。
3. 選択リストから [予算期間] を入力します。
4. [オープン] チェックボックスをオンにします。
   チェックボックスをオンにすると、値が true に設定され、会計年度に作成された予算計画を昇格させる予算期間が開きます。
5. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レガシー - 予測期間

予測期間は、予測計画の昇格を制御することを目的とした予算期間に似ています。

クローズ済み予算期間に対して予測期間を作成できます。予測計画は、予測会計月期間がオープンである場合にのみ昇格させることができます。

注:

いずれの時点においても、オープンすることができるのは 1 つの予測期間のみです。

レガシー：予算ターゲットの作成

予算ターゲットは、特定の会計期間における推定金額と、経費および投資コストの予算キーの組み合わせです。予算ターゲットを使用して、予算計画の財務目標を設定します。

始める前に

必要なロール：itfm_plan_analyst、admin

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルプラン > ファイナンシャルプラン > 予算ターゲット.
2. フォームフィールドに入力します (表を参照)。
3. [送信] をクリックします。

予算ターゲットフォーム

フィールド	説明
予算キー	このターゲットが適用される予算キー。キーを選択します。
会計期間	このターゲットが適用される会計期間の年。会計期間を選択します。
ターゲット通貨	使用通貨。
資本ターゲット	使用されている通貨でのターゲットの金額。
運用ターゲット	経費のターゲット金額。

レガシー - 生成済み実績

アカウントコード (予算キー) 経費は、予算キーの総勘定元帳金額を示すレコードです。金額は会計期間ごとに集計されます。

アカウントコード経費 [itfm_plan_actuals] テーブルの経費は、ファイナンシャルプランワークベンチで実際の経費の計算に使用されます。通常、このテーブルのデータを作成または変更する必要はありません。

ファイナンスアナリストは、アカウントコード経費に ファイナンシャルプラン > ファイナンシャルプラン > 生成済み実績. 経費は、財務ワークベンチの [実績を生成] ボタンをクリックすると入力されます。

レガシー - 計画立案ワークベンチを使用した予算計画の開始

予算プロセス定義を設定した後、予算を開始できます。予算期間を開きます。ファイナンシャルプランワークベンチを使用して、会計期間と予算計画定義を選択し、予算タスクを生成します。

始める前に

必要なロール：itfm_plan_analyst
IT ファイナンスアナリストは、プランナーごとにタスクを生成します。計画者は、次の場所に移動して、計画者が所有するタスクを表示できます ファイナンシャルプラン > 自分のタスク.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ファイナンシャルプラン > ワークベンチ.
2. ワークベンチの右上にある選択リストから、計画立案している予算期間を選択します。
   予算期間を作成して開き、予算策定に使用することもできます。
3. 選択リストから予算計画定義を選択します。
4. [タスクを生成] をクリックします。

   計画が存在せず、選択した会計期間の計画タスクの場合は、[タスクを生成] ボタンをクリックすると、各計画キーの計画が作成されます。計画者に関連付けられた計画キーは、計画の生成時にのみ考慮されます。生成された予算タスクは、[ドラフト] ステータスです。
5. 予算リストから予算タスクレコードを開き、確認して、必要に応じて更新します。
   IT ファイナンスアナリストは、[作業メモ] フィールドで計画者にメモを追加できます。
6. [更新] をクリックして変更を保存します。
7. タスクを公開するには、[公開] をクリックします。
   表示される [計画タスクを公開] ポップアップで、計画の [開始日] と [終了日] を期限として設定します。
8. [作成] をクリックします。
9. [計画ビュー] をクリックします。

   ビューの列を非表示にするには、[構成] アイコンをクリックします。

   アイテム列は、予算定義 [itfm_plan_definition] テーブルからレンダリングされます。アイテム列を非表示にするか表示しても、テーブルは更新されません。グループ化された列は非表示にできません。
10. **[VTB** ビュー] をクリックします。
11. 予算タスクをステータス別に表示します。
    計画者が計画を昇格した場合、その計画は [承認待ち] 列に表示されます。必要に応じて、計画をレビューし、推奨事項を作成できます。
12. 予算に対する推奨事項を作成するには、[承認待ち] 列のタスクをクリックします。
13. [説明を追加] フィールドにコメントを追加します。
14. 予算タスクのポップアップを閉じます。
15. 計画を [入力待ち] 列にドラッグします。
    計画者が計画を更新して昇格させると、タスクのステータスは [承認待ち]になります。
16. 計画者が推奨事項で計画を更新し、予算金額が目標を満たしている場合は、計画を [承認済み] 列に移動します。
    予算計画が承認されます。

次のタスク

計画者は、計画を更新してファイナンスに昇格することができます。

レガシー - 予算計画の再昇格

予算計画を再度昇格させて、デマンドまたはプロジェクト選択の計画コストの変更によって生じたポートフォリオ予算の変更を反映します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- 必要なロール：it_portfolio_manager
- ポートフォリオの予算計画を再度昇格させるには、選択した会計期間の予算期間がオープンしている必要があります。

> **注:**
> PPS アドミニストレーターは、次の場所に移動して、会計期間の予算期間をオープンおよびクローズすることもできます。 プロジェクト管理 > 予算期間のオープン/クローズ.

このタスクについて

ポートフォリオ予算計画を昇格した後、ポートフォリオマネージャーは、投資委員会の提案に基づいて予算を変更するよう決定できます。プロジェクトマネージャーおよびデマンドマネージャーと連携して、デマンドおよびプロジェクトのコスト計画を変更し、提案された変更を実装できます。その後、予算計画の変更を反映するために、予算計画を再度昇格させることができます。

手順

1. ポートフォリオワークベンチに移動し、追跡するポートフォリオを開きます。
2. [ステップ 3：予算業務] で [予算計画を再度昇格] をクリックします。


タスクの結果

予算計画は、選択した会計年度の更新された予算として再度昇格されます。

次のタスク

- ポートフォリオワークベンチの [ステップ 3：予算業務] の下で、予算計画名の下にある予算計画の状況を確認します。ファイナンシャルプランワークベンチで予算計画の予算タスクを表示するには、[ステータス] リンクをクリックします。

予算ステータス

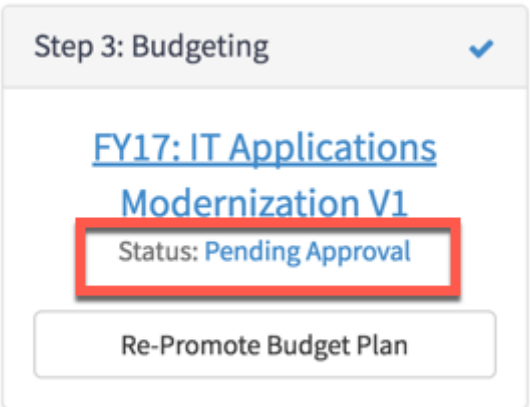

- 予算計画が再度昇格された後、それ以上変更が予定されていない場合は、予算期間をクローズする必要があります。

レガシー - 計画立案ワークベンチでの昇格済みポートフォリオ予算計画の表示

ファイナンシャルプランワークベンチを使用して、ポートフォリオマネージャーによって昇格されたポートフォリオ予算計画を表示します。これはプロジェクトポートフォリオ管理で開始され、 ファイナンシャルマネジメント で予算計画として変換されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

注:
このトピックの内容は、以前のリリースから Yokohama にアップグレードしたお客様向けのものです。新しいお客様の場合は、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。

必要なロール：itfm_plan_analyst


ポートフォリオの予算策定と予測を実行するには、ファイナンシャルを備えたプロジェクトポートフォリオスイート [com.snc.financial_planning_pmo] プラグインが必要です。

このタスクについて
プロジェクトポートフォリオ管理では、ポートフォリオマネージャーはポートフォリオワークベンチを使用して、ポートフォリオの年毎予算計画を計画し、昇格させます。

注:
ポートフォリオ計画を昇格させるには、予算期間または予測期間がオープンしている必要があります。

予算期間内で初めてポートフォリオマネージャーが予算計画を昇格させると、ステータスが [承認待ち] の予算タスクが作成されます。タスクのステータスは、ポートフォリオワークベンチに表示されます。

ポートフォリオワークベンチ

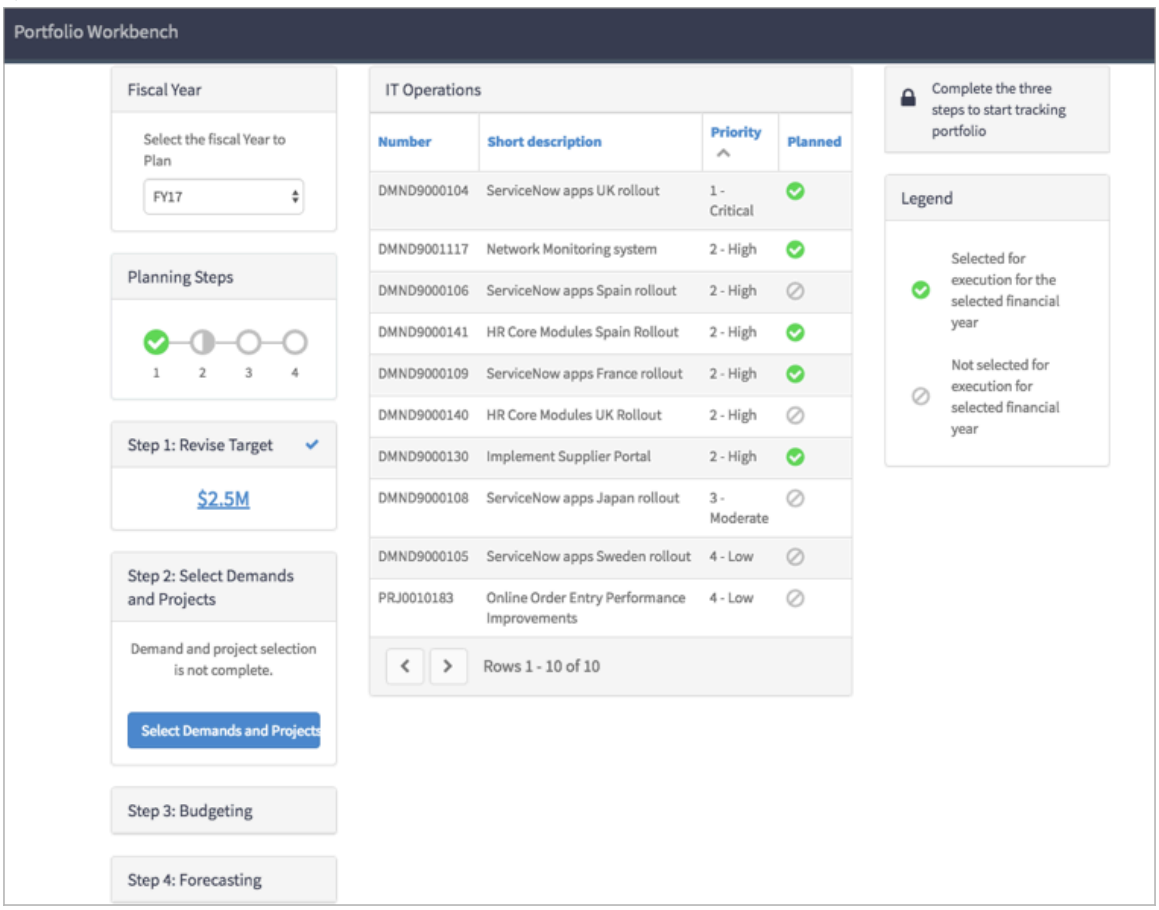

経理は、 計画立案ワークベンチでポートフォリオ予算計画をレビューし、計画を承認します。

ポートフォリオマネージャーと IT ファイナンスの間の計画立案プロセスは完全に自動化されています。ポートフォリオワークベンチで昇格された計画は、計画立案ワークベンチで利用できます。経理は、タスクを承認して計画を承認するか、ステータスを [入力待ち] として示して、タスクをポート

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フォリオマネージャーに返送します。ポートフォリオマネージャーは、IT ファイナンスレビューの推奨事項を再検討し、計画を昇格させます。


> **注:**
> 計画立案ワークベンチは、 Jakarta リリースで使用された予算コンソールに置き換わるものです。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルプラン > ワークベンチ.
2. ワークベンチの右上にある選択リストから、計画立案している予算期間を選択します。
   予算期間を作成して開き、予算策定に使用することもできます。
3. 選択リストから、[ポートフォリオ予算計画 **(Portfolio Budget Planning)]** 定義を選択します。

> **注:**
> ポートフォリオワークベンチから発生した予算タスクは、最初は [承認待ち] ステータスになっています。

ポートフォリオ予算計画

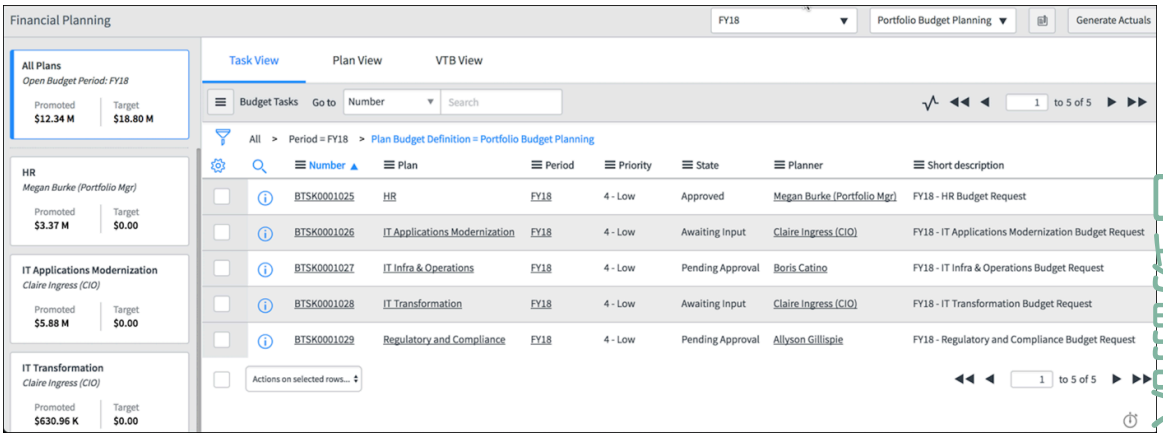

4. 昇格された予算金額または前回の予測金額を表示するには、[計画ビュー] をクリックします。
5. 予算タスクリストから予算タスクレコードを開きます。

このタスクは、ワークベンチの VTB ビューでも実行できます。


IT ファイナンスアナリストは、昇格された計画の詳細を承認するか、[作業メモ] フィールドにメモを追加してポートフォリオマネージャーに返送し、[ステータス] フィールドを [入力待ち] に更新します。

予測

予測期間についても同様のプロセスが適用されます。計画ビューには、最後に昇格された列 (ポートフォリオマネージャーから最後に昇格された予測計画) が表示されます。予測金額には、予測月までの実績とポートフォリオマネージャーによる残りの期間の予測が含まれます。

コスト計画実績

計画ビューの実績列は、プロジェクトポートフォリオ管理のタイムカードの承認された経費ラインと実績に基づいて生成されるコスト計画実績に基づいています。実績金額の不一致に気付いた場合は、ワークベンチの右上隅にある [実績を生成] から実績を再生成します。



自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レガシー - ポートフォリオ予算オブジェクト構成

ポートフォリオ内のコスト計画の計画コストは、ポートフォリオマネージャーによって昇格されると、予算計画に変換されます。ベースシステムには、読み取り専用の予算定義 [ポートフォリオ予算計画 (Portfolio Budget Planning)] プロセスがシードされており、ポートフォリオの昇格に使用されます。


注:
このトピックの内容は、以前のリリースから Yokohama にアップグレードしたお客様向けのものです。新しいお客様の場合は、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。

予算計画プロセス

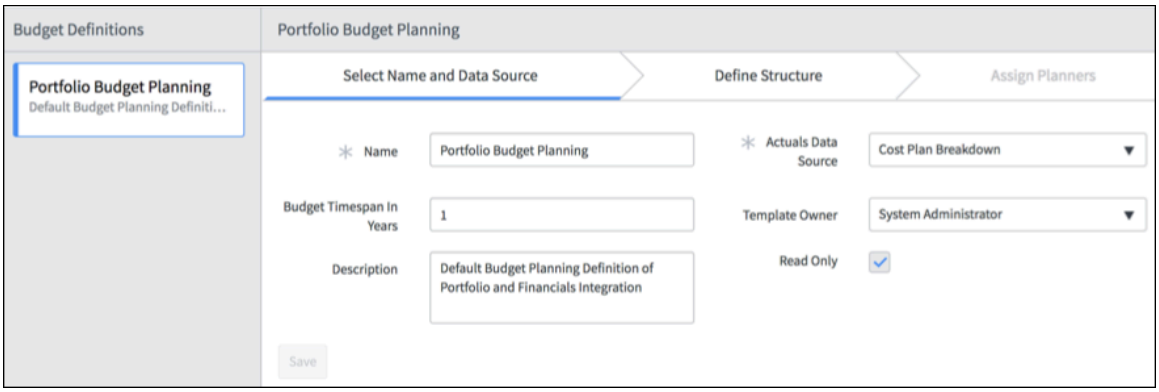

昇格された予算オブジェクトの粒度は、[ポートフォリオ予算計画 (Portfolio Budget Planning)] プロセスの予算定義の [構造の定義] ステップで定義されます。デフォルトでは、プロジェクト定義の粒度は、[ポートフォリオ]、プロジェクトまたはデマンド ([ポートフォリオタスク])、および [アカウント番号] です。

構造ステップ

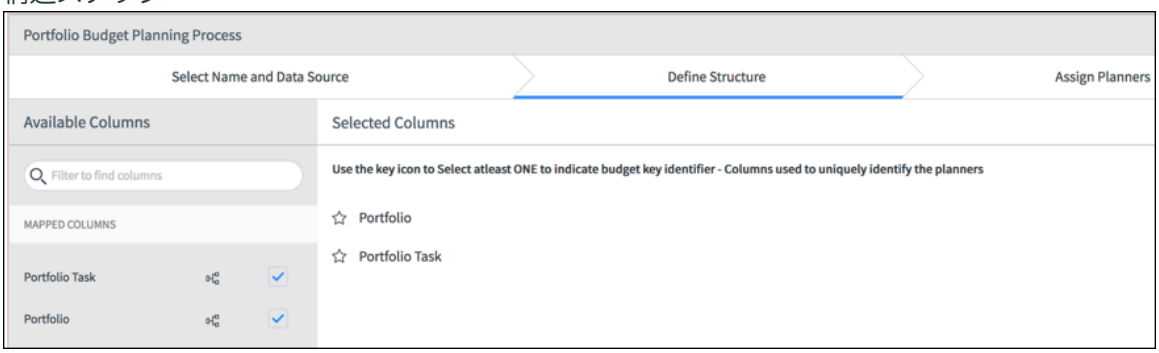

昇格させたポートフォリオ予算オブジェクトで組織がより多くの属性 (コストセンターやコスト計画名など) を必要とする場合は、コスト計画データソースで追加のマッピングを定義できます。コスト計画オブジェクトから必要な属性をドット連結して設定します。マッピングが完了したら、[ポートフォリオ予算計画プロセス (Portfolio Budget Planning Process)] の [構造の定義] で属性を選択して、保存します。


昇格された予算には、[ポートフォリオ]、プロジェクトまたはデマンド ([ポートフォリオタスク])、[アカウント番号] で選択した属性が含まれます。この属性は、ポートフォリオワークベンチにも表示されます。

注:
GL アカウント番号は、自動的にいずれかのテンプレート列と見なされます

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


計画立案データフィールド

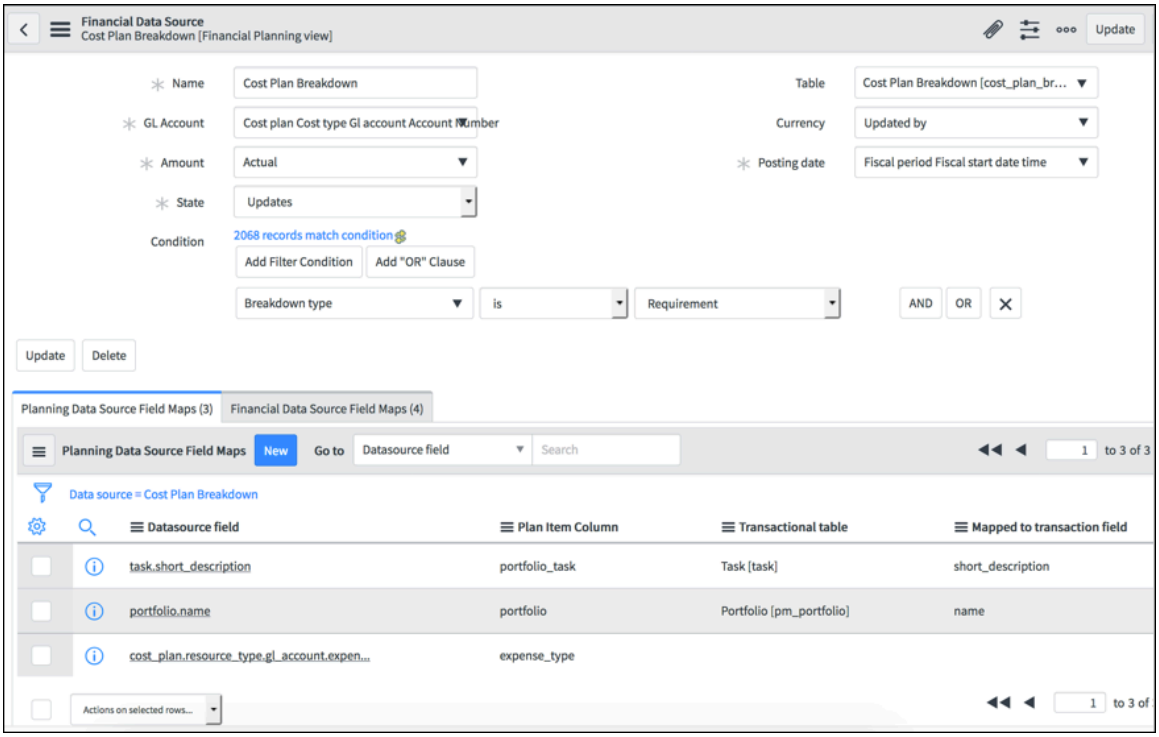

ワークベンチの追加の列

昇格済みポートフォリオを確認しながら、追加のドット連結列をワークベンチにプルして可視化できます。[ポートフォリオ予算計画プロセス (Portfolio Budget Planning Process)] の [構造の定義] を使用して、ポートフォリオマネージャーなどの追加のドット連結列をプルして、構成を保存します。保存すると、列がワークベンチに表示されます。


追加の列

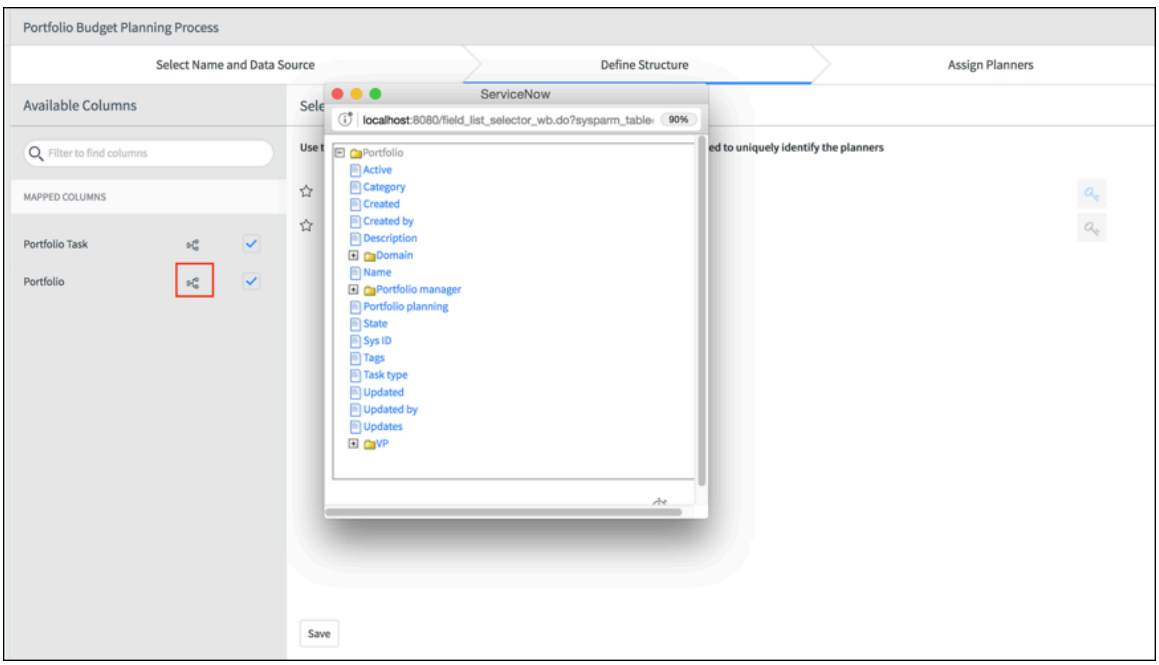


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

構造の定義

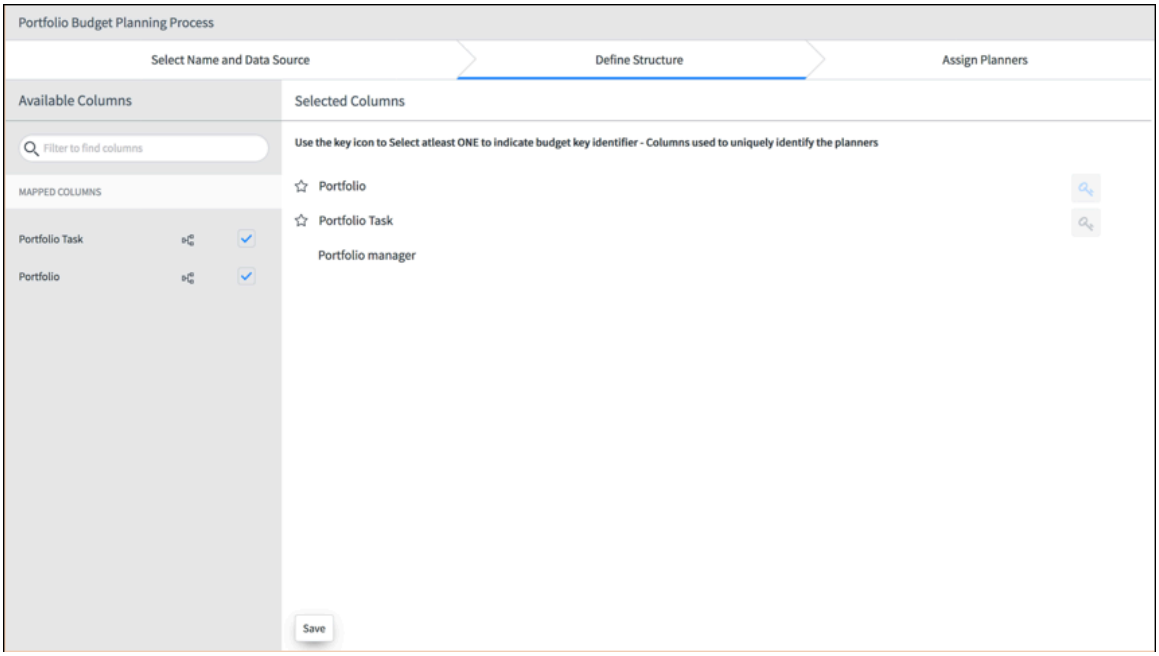

計画ビュー

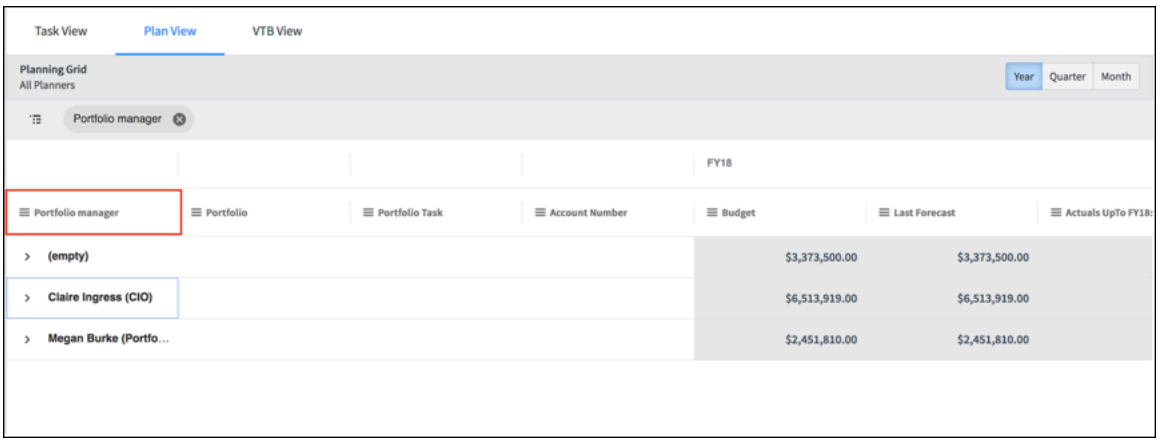

自動翻訳

レガシー - ポートフォリオの予算の予測

プロジェクトマネージャーまたはポートフォリオマネージャーは、実績コストおよび変更されたプロジェクト要件に基づいて、プロジェクトとポートフォリオの将来のコストを予測できます。予算予測は、Paris リリースで廃止されました。予算予測は、以前のリリースからアップグレードしたインスタンスでは引き続き使用できますが、新しいインスタンスでは使用できません。


注:
このトピックの内容は、以前のリリースから Yokohama にアップグレードしたお客様向けのものです。新しいお客様の場合は、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。

予算の計画立案と承認の後、プロジェクトの実行中に、プロジェクトマネージャーは将来の期間の計画コストを再見積もり (予測) することができます。この予測は、プロジェクトで発生した実績コストやその他の変更に基づいています。予測されたプロジェクトコストはポートフォリオにロールアップされ、ポートフォリオマネージャーはポートフォリオの予測計画を作成できます。

4 月四半期の四半期予測プロセスの例を示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

予算予測

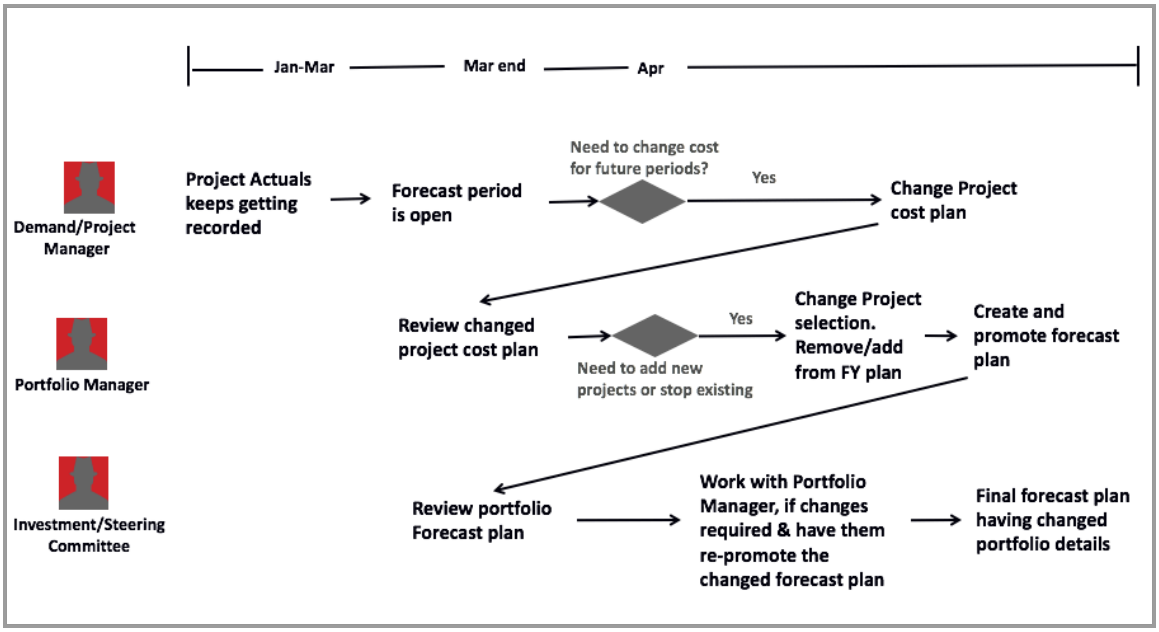

予測期間が所定の期間についてオープンの場合：

- プロジェクトマネージャーは、次のことを行います。
  - 現在および過去の期間の実績コストを確認し、予測期間と将来のすべての期間のコスト概算を編集します。たとえば、予測期間が 2016 年 4 月においてオープンである場合、4 月以降の月のコスト概算を編集できます。

    注:
    プロジェクトマネージャーは、過去の期間のコストを編集することはできません。たとえば、この場合、4 月より前の月のコストは編集できません。

  - 必要に応じて、プロジェクトのコスト計画を予測 (再見積もり) します。予測されたプロジェクトコストはポートフォリオにロールアップされます。
- ポートフォリオマネージャーは、次のことを行います。
  - ポートフォリオワークベンチで、ポートフォリオ内のすべてのプロジェクトの再見積もりコストを確認します。
  - 会計年度中に予算ターゲットが変更されたときに、ポートフォリオ計画立案ビューを使用して、新しいプロジェクトを含めるか、またはいくつかのプロジェクトを除外するかを決定します。
  - 変更されたプロジェクト見積もりを含むポートフォリオの予測計画を作成し、レビューのために計画を投資委員会に送信します。
  - 投資委員会からのフィードバックに基づいてポートフォリオの予測計画を更新し、再昇格させます。

ポートフォリオマネージャーは、ITFM 計画立案ワークベンチでプロジェクトの予算コスト、実績コスト、および予測コストを表示することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- ポートフォリオの予算計画を作成するには、会計期間の予測期間がオープンしている必要があります。たとえば、4 月に予測計画を作成するには、「FY17：4 月」の予測期間をオープンします。PPS アドミニストレーターは、次の場所に移動して会計期間の予測期間を開くことができます プロジェクト管理 > フォーキャスト期間のオープン/クローズ.
- 対応する会計期間の予測期間をオープンするには、会計期間の予算期間をクローズする必要があります。PPS アドミニストレーターは、次の場所に移動して、会計期間の予算期間をクローズできます プロジェクト管理 > 予算期間のオープン/クローズ.
- 一度にオープンすることができるのは 1 つの予測期間のみです。

レガシー - 予測計画の作成および昇格

ポートフォリオマネージャーは、実績コストおよび変更されたプロジェクト要件に基づいて、将来の期間のポートフォリオ予算を再見積もり (予測) できます。

始める前に

注:
このトピックの内容は、以前のリリースから Yokohama にアップグレードしたお客様向けのものです。新しいお客様の場合は、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。

- 必要なロール：it_portfolio_manager
- ポートフォリオフォームで、ポートフォリオの [ポートフォリオ計画立案] フィールドを [詳細] に設定する必要があります。
- ポートフォリオの予算計画を作成するには、会計期間の予測期間がオープンしている必要があります。たとえば、4 月に予測計画を作成するには、「FY17：4 月」の予測期間がオープンしている必要があります。PPS アドミニストレーターは、次の場所に移動して会計期間の予測期間を開くことができます プロジェクト管理 > フォーキャスト期間のオープン/クローズ.
- 対応する会計期間の予測期間をオープンするには、会計期間の予算期間をクローズする必要があります。PPS アドミニストレーターは、次の場所に移動して、会計期間の予算期間をクローズできます プロジェクト管理 > 予算期間のオープン/クローズ.
- 一度にオープンすることができるのは 1 つの予測期間のみです。

手順

1. ポートフォリオワークベンチに移動し、追跡するポートフォリオを開きます。
2. [ステップ 4：予測] で [予測計画を昇格] をクリックします。

タスクの結果

- 選択した予測期間のポートフォリオの予測計画が作成され、昇格されます。必要に応じて、予測計画を再度昇格させることができます。
- ポートフォリオマネージャーが予測計画を昇格させると、ステータスが [承認待ち] のタスクが作成されます。タスクのステータスは、ポートフォリオワークベンチに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- 予測計画のタスクを表示するには、[ステータス] リンクをクリックします。経理は、 計画立案ワークベンチでポートフォリオ予測計画をレビューし、計画を承認します。
- ポートフォリオのすべての昇格済み予測計画のリストを表示するには、[ステップ 4：予測] で [すべての昇格済み予測計画] リンクをクリックします。昇格された予測計画が、すべての予測期間についてリストされます。
- 予測計画の確定後、それ以上変更が予定されていない場合は、予測期間をクローズする必要があります。

レガシー - 予測計画の再昇格

ポートフォリオ予測コストが変更されている場合、ポートフォリオマネージャーは予測計画の変更を反映するために、予測計画を再度昇格させることができます。

始める前に

注:
このトピックの内容は、以前のリリースから Yokohama にアップグレードしたお客様向けのものです。新しいお客様の場合は、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。

- 必要なロール：it_portfolio_manager
- ポートフォリオの予測計画を再度昇格させるには、選択した会計期間の予測期間がオープンしている必要があります。

注:
PPS アドミニストレーターは、次の場所に移動して、会計期間の予測期間をオープンおよびクローズすることもできます。 プロジェクト管理 > フォーキャスト期間のオープン/クローズ.

このタスクについて

ポートフォリオ予測計画を作成した後、投資委員会で計画がレビューされます。デマンドとプロジェクトの予測計画を変更するよう決定して、投資委員会によって提案された変更を実装できます。その後、予測計画の変更を反映するために、予測計画を再度昇格させることができます。

手順

1. ポートフォリオワークベンチに移動し、追跡するポートフォリオを開きます。
2. [ステップ 4：予測] で [予測計画を再度昇格] をクリックします。

タスクの結果

予測計画が、選択した予測期間の更新済みの計画として再度昇格されます。

次のタスク

- ポートフォリオのすべての昇格済み予測計画のリストを表示するには、[ステップ 4：予測] で [すべての昇格された予測計画] リンクをクリックします。昇格された予測計画が、すべての予測期間についてリストされます。
- 予測計画が再度昇格された後、それ以上変更が予定されていない場合は、予測期間をクローズする必要があります。

レガシー：ポートフォリオの追跡

財務計画立案を完了したら、ポートフォリオの進捗状況の追跡を開始できます。ポートフォリオ追跡ビューには、ポートフォリオ内の選択されたデマンドとプロジェクトのみが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：it_portfolio_manager

このタスクについて

注:
このトピックの内容は、以前のリリースから Yokohama にアップグレードしたお客様向けのものです。新しいお客様の場合は、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。

ファイナンシャルプランが完了すると、ポートフォリオワークベンチの [ポートフォリオを追跡] アクションが有効になり、ポートフォリオの進捗状況の追跡を開始できます。

ポートフォリオの追跡の詳細については、この 3 分間のビデオをご覧ください。

https://www.youtube.com/embed/t7A61MtVFws

手順

1. ポートフォリオワークベンチに移動し、追跡するポートフォリオを開きます。
2. [会計年度] 選択リストで会計年度を選択し、[ポートフォリオを追跡] をクリックします。
3. タイムラインビューで、プロジェクトまたはデマンドを右クリックして、次を選択します。
   - 編集：プロジェクトまたはデマンドを編集します。
   - 計画立案コンソール：プロジェクトの計画立案コンソールを開きます。このオプションは、プロジェクトについてのみ使用できます。
   - ステータスレポート：最新のプロジェクトステータスレポートを開きます。このオプションは、プロジェクトについてのみ使用できます。
4. タイムラインビューで、ポートフォリオのプロジェクト間の外部依存関係を確認します。
5. [プロジェクト **KPI**] タブで、ポートフォリオ内の選択されたすべてのプロジェクトの総合健全性、スケジュール、コスト、リソース、およびスコープなどの最新のステータスを表示します。
6. 次のチャートを確認します。
   - コスト (計画 対実績) ：ポートフォリオ内の選択したすべてのプロジェクトの実績コストと計画コストの比較を追跡します。
   - リソース (配分 対実績)：すべてのプロジェクトタスクに費やされた実際のリソース時間と、ポートフォリオ内の選択されたプロジェクトおよびデマンドを実行するために割り当てられたリソース時間の比較を追跡します。
7. ポートフォリオで選択されたすべてのプロジェクトのリスク、問題、およびプロジェクト変更要求を確認するには、[リスク]、[問題]、および [変更] タブを使用します。

次のタスク
レガシー - ポートフォリオの予算の予測。

レガシー - ポートフォリオワークベンチの追跡ビュー

財務計画立案が完了すると、ポートフォリオワークベンチの [ポートフォリオを追跡] オプションが有効になります。デマンドとプロジェクトの進捗状況の追跡、およびポートフォリオで選択された会計期間のコスト、リソース、スケジュール、およびスコープのステータスの監視を行うことができます。

注:
このトピックの内容は、以前のリリースから Yokohama にアップグレードしたお客様向けのものです。新しいお客様の場合は、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。

ポートフォリオワークベンチは、追跡ビューの次のコンポーネントで構成されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムラインビュー：このタブには、ポートフォリオの一部である選択されたデマンドとプロジェクトのリスト、および経時的なガントチャートが表示されます。

[タイムラインビュー] タブでは、次のことを実行できます。

- [ダッシュボード構成] 設定を使用して、ガントチャートのポートフォリオアイテムの色を設定します。
- ガントチャートカレンダーのズームレベルに [自動調整] を選択します。ガントビューは、スクロールバーを使用せずにタイムライン全体を表示できるように 1 ページに収まります。
- ポートフォリオのプロジェクト間の外部依存関係を確認します。

注:

アドミニストレーターは、タイムラインビューの列フィルターリスト ( ) に表示する列をカスタマイズできます。

プロジェクト **KPI**：このタブには、ポートフォリオ内の選択されたすべてのプロジェクトの総合健全性、スケジュール、コスト、リソース、およびスコープなどの、プロジェクト KPI の最新のステータスが表示されます。この情報は、プロジェクトに対して作成された最新のステータスレポートから入力されます。

以下のことを行うことができます。

- タブでプロジェクトの名前をクリックして、プロジェクトに対して作成された最新のステータスレポートを開きます。
- プロジェクト KPI のステータスインジケーターをポイントして、そのプロジェクトの KPI に入力されたコメントを表示します。

コスト (計画 対実績)：このチャートには、ポートフォリオ内の選択したすべてのプロジェクトの実績コストと計画コストの比較が表示されます。プロジェクトの実績コストは、経費ラインから導出されます。

注:

特定の経費が発生した場合、プロジェクトの経費ラインを手動で作成できます。たとえば、プロジェクト用にハードウェアを調達した場合、ハードウェアの調達に費やした金額の経費ラインを作成できます。ServiceNow 調達 を使用してアイテムを受け取ると、経費ラインが自動的に作成されます。リソース時間については、プロジェクトのタイムカードが承認されると、経費ラインが自動的に作成されます。

チャートの表示設定を変更するには、選択リストから次のいずれかを選択します。

- 投資：投資コストのみに関するコストチャートを表示します。
- 経費：経費のみに関するコストチャートを表示します。
- すべて：投資コストと経費の両方に関するコストチャートを表示します。

リソース (配分 対実績)：このチャートには、すべてのプロジェクトタスクに費やされた実際のリソース時間と、ポートフォリオ内の選択されたプロジェクトおよびデマンドを実行するために割り当てられたリソース時間の比較が表示されます。実際に費やされた時間は、プロジェクトの処理済みタイムカードから取得されます。

[リスク]、[問題]、および [変更]：これらのタブには次の情報が表示されます。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- リスク：ポートフォリオ内の選択されたすべてのデマンドとプロジェクトに関するリスクとその可能性を表示します。この情報は、ポートフォリオに関連付けられたデマンドとプロジェクトの一部であるリスクから入力されます。
- 問題：ポートフォリオ内の選択されたすべてのプロジェクトのすべての問題とその優先度を表示します。この情報は、ポートフォリオ内のプロジェクトについて報告された問題から入力されます。
- 変更：ポートフォリオ内の選択されたすべてのプロジェクトのすべてのプロジェクト変更要求とその優先度を表示します。この情報は、ポートフォリオ内のプロジェクトに対して作成された変更要求から入力されます。

ポートフォリオ追跡タイムラインビューの例 **1**



ポートフォリオ追跡 **KPI** ビューの例 **2**

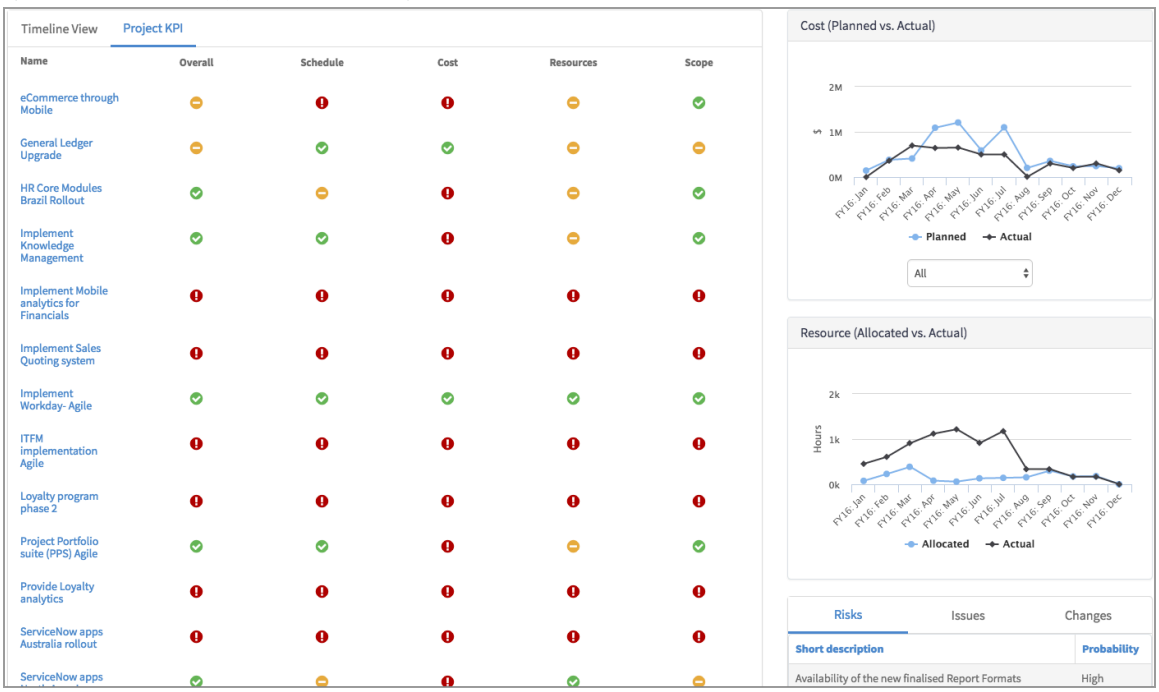

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

実際のプロジェクトコスト

実際のプロジェクトコストは、コスト計画の経費ラインを作成した後、または人事がタイムカードを使用して経費ラインを作成した後に表示されます。

システムは、経費ラインから実際のプロジェクトコストをキャプチャします。

- コスト計画からの経費ライン：コスト計画から経費ラインを作成できます。経費が発生した金額と日付を指定できます。発生した実際の金額は、経費ラインが処理された後にコスト計画に含まれます。
- タイムカードからの経費ライン：人事は、タイムカードを使用して、プロジェクト作業の時間を記録できます。タイムカードが承認されると、システムにより経費ラインが生成されます。経費ラインが処理された後、実際のコストがプロジェクトに記録されます。タイムカードの作成時にリソース計画を指定すると、コスト計画名はリソース計画から取得され、コストはリソース計画に対してキャプチャされます。リソース計画を指定しない場合、コストはプロジェクトに対してキャプチャされます。

実際のプロジェクトコストの表示

プロジェクトポートフォリオ管理 with Financials を使用すると、コスト計画およびプロジェクトの実際のプロジェクトコストを表示できます。

始める前に
必要なロール：it_project_manager

このタスクについて
実績コストで考慮されるためには、経費ラインを処理する必要があります。実績コストは、処理日ではなく、経費ラインの作成日に対して記録されます。経費ラインは、承認されたタイムカードに対してのみ作成されます。
プロジェクトの実績コストも同じ方法でポートフォリオにロールアップされます。

手順

1. 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 実績コストを表示するプロジェクトを開きます。
3. [コスト計画] 関連リストをクリックします。

PPM のシナリオ計画

PPM のシナリオ計画 アプリケーションは、ポートフォリオマネージャーが特定の会計年度のプロジェクト実行のロードマップを作成および追跡するための中心的な場所を提供します。プロジェクトおよびデマンドのロードマップやリソースのさまざまなシナリオを作成して比較することで、予算とリソースの使用を最適化します。

シナリオは、資金調達の意思決定をサポートするために、選択された会計年度の計画インスタンスとして機能するデマンドとプロジェクトの集まりです。

ポートフォリオ内の対象となるデマンドとプロジェクトは、計画サイクルのデフォルトまたは既存のシナリオに収集されます。追加のシナリオを作成するための基礎として、デフォルトまたは既存のシナリオを使用します。デマンドまたはプロジェクトは、現在の計画サイクルの複数のシナリオに属することができますが、複数のポートフォリオに属することはできません。詳細については、「計画立案シナリオの作成」を参照してください。

ポートフォリオワークベンチを使用したポートフォリオ計画立案への影響

ポートフォリオワークベンチは、シナリオベースのポートフォリオ計画立案をサポートしていません。ポートフォリオは、簡易計画立案モードまたは詳細計画立案モードで計画できます。詳細モードでは、予算計画を再度昇格させ、予測計画を作成できます。Paris リリース以降、ポートフォリオ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークベンチは新規顧客に対しては廃止されました。詳細については、「ポートフォリオワークベンチ」を参照してください。

シナリオベースの計画立案では、複数のシナリオを作成して比較し、シナリオを確認または再確認することができます。

ポートフォリオ計画立案にポートフォリオワークベンチを使用しており、シナリオベースの計画立案に切り替える場合は、次の点に注意してください。

- PPM のシナリオ計画 をインストールした後、ポートフォリオフォームから [ポートフォリオワークベンチ] モジュールと関連リンクを削除します。2 つの方法の計画立案とデータ破損との競合を避けるために、ポートフォリオワークベンチの非アクティブ化が必要です。詳細については、「アプリケーションメニューまたはモジュールを有効または無効にする」を参照してください。
- [ポートフォリオ計画立案] 関連リンクまたは [ポートフォリオ計画立案ワークベンチ] モジュールを使用して、ポートフォリオ計画立案ワークベンチに移動します。
- ポートフォリオのデマンドとプロジェクトの既存の選択はすべて、ポートフォリオ計画立案ワークベンチを開くと、デフォルトのシナリオとして表示されます。詳細については、「計画立案シナリオの作成」を参照してください。

特徴

PPM のシナリオ計画 は、ポートフォリオマネージャーに次の機能を提供します。

- 1 年または複数年のリソースキャパシティに基づいてポートフォリオを計画します。
- 継続的な追跡と計画調整のために、複数年のポートフォリオ計画を小さな計画期間に分割します。
- 投資枠管理からポートフォリオ内のデマンドとプロジェクトに予算を割り当てます。
- ポートフォリオのシナリオベースの計画を作成します。
- フィルターを適用して、ポートフォリオ内の選択したデマンドとプロジェクトのリストを絞り込みます。
- 計画立案シナリオで、デマンドとプロジェクトのさまざまな組み合わせを試します。
- 戦略的目標に沿っていないデマンドとプロジェクトの詳細を表示します。
- 各シナリオのデマンドとプロジェクトの資金調達方法を編集します。
- 各種のシナリオを比較して、さまざまなプロジェクトとデマンドの組み合わせの結果を評価します。
- 現在のポートフォリオ計画として、組織の目標に最も適した計画立案シナリオを確認します。
- 変化する優先度と環境に応じて、以前に確認された計画立案シナリオを上書きします。
- 実績コストと計画コスト、プロジェクト、目標や戦略に沿っていないデマンド、およびプロジェクトの実際のコストなど、予算の詳細を表示します。
- リソースの使用率と割り当てを表示します。
- リソースが過剰に割り当てられているデマンドとプロジェクトを表示します。

PPM のシナリオ計画 のインストール

ServiceNow Store アプリケーションから PPM のシナリオ計画 アプリケーションをインストールします。 ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

始める前に

インストールと設定をスムーズに行うには、次のセットアップチェックリストを完了してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

設定チェックリスト

セットアップタスク	説明
PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) がアクティブ化されていることを確認します。	移動先 サブスクリプション管理 > サブスクリプション インスタンス内にありますリストには、組織で購入したサブスクリプションが表示されます。
PPM 向け投資枠管理 (com.snc.investment_planning_pmo) プラグインがアクティブ化されていることを確認します。 **注:** このプラグインは、 投資枠管理から 年毎タイプの計画のポートフォリオについてターゲット金額を取得する場合にのみアクティブ化する必要があります。	移動先 サブスクリプション管理 > サブスクリプション インスタンス内にありますリストには、組織で購入したサブスクリプションが表示されます。

必要なロール：admin

このタスクについて

PPM のシナリオ計画 をインストールする前に、ServiceNow インスタンスの PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) をアクティブ化します。詳細については、「PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理) の有効化」を参照してください。

手順

1. 移動先 システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してアプリケーションを検索します。
   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow へのリクエストが必要になることもあります。

   ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースメモ情報については、「ServiceNow Store バージョンの履歴リリースノート」を参照してください。
3. [インストール] をクリックします。
4. アプリケーションのインストールダイアログボックスで、アプリケーションの依存関係を確認します。

   依存するプラグインとアプリケーションがインストールされている場合、現在インストールされている場合、またはインストールする必要がある場合は、リストに表示されます。インストールする必要があるプラグインまたはアプリケーションがある場合は、PPM のシナリオ計画をインストールする前にインストールする必要があります。
5. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] をクリックします。

   (Optional) デモデータには、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードが含まれています。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **重要:**
> インストール時にデモデータを読み込んでおかないと、後から読み込むことはできません。

6. [インストール]をクリックします。

関連情報

プラグインのリスト (Yokohama)

PPM のシナリオ計画 とともにインストールされるコンポーネント

PPM のシナリオ計画 アプリケーションのインストール時に、いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、デモデータなど) がインストールされます。

> **注:**
> アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

PPM のシナリオ計画 とともにインストールされるテーブル

テーブル	説明
ポートフォリオシナリオ [sn_pw_scenario_pm_portfolio_scenario]	シナリオの名前、シナリオのステータス、会計年度、およびシナリオが属するポートフォリオの名前などのポートフォリオ計画立案シナリオ情報を保存します。
ポートフォリオシナリオ資金調達 [sn_pw_scenario_pm_portfolio_scenario_funding]	ポートフォリオ計画立案シナリオに関する資金調達情報を保存します。資金調達情報には、シナリオの名前、経費予算、資本予算、予算合計、およびデマンドまたはプロジェクトが実行用に選択されているかどうかが含まれます。
シナリオ計画の構成 [sn_pw_scenario_pm_portfolio_scenario_configuration]	計画タイプやスコープなどのポートフォリオ計画立案構成情報を保存します。
[ポートフォリオ計画立案] ウィンドウ [sn_pw_scenario_pm_planning_window]	複数年およびリソースキャパシティベースの計画のための、ポートフォリオの計画期間情報を保存します。

年毎および複数年のリソースキャパシティベースの計画

利用可能なキャパシティに対するリソースの使用率を分析した後、単一会計年度または複数年のシナリオを使用してポートフォリオを計画します。すべてのポートフォリオまたは 1 つのポートフォリオにデマンドとプロジェクトを含めて、ビジネスゴールに一致するデマンドとプロジェクトを評価、優先順位付け、および選択します。

ポートフォリオを計画し、ターゲット予算内で実行するデマンドとプロジェクトを選択します。シナリオを作成して、ポートフォリオと組織の事業達成目標との整合性を分析します。PPM のシナリオ計画 アプリケーションを使用すると、複数セットの予測シナリオを評価し、投資を一貫して分析できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

年毎財務およびリソースキャパシティベースの計画

単一会計年度のポートフォリオを計画します。計画用に、すべてのポートフォリオまたは単一のポートフォリオを選択できます。ポートフォリオを選択したら、複数のシナリオを作成して、総コスト、リソース使用状況とキャパシティ、および戦略的目標に基づいてデマンドとプロジェクトを評価できます。

年毎計画では、特定の会計年度の特定のポートフォリオまたはすべてのポートフォリオから、さまざまな組み合わせのデマンドとプロジェクトを使用してシナリオを作成します。選択したデマンドとプロジェクトに基づいて、関連付けられたリソース計画から導出された、選択したデマンドとプロジェクトのリソース割り当てを分析します。リソースの可用性とキャパシティを分析した後、各種のシナリオでデマンドとプロジェクトの選択を変更し、リターンを最大化して組織に財務価値を追加するシナリオを確認します。

重要:
デフォルトの構成は、新規インストールまたはアップグレードの場合は [年毎財務およびリソースキャパシティベースの計画] および [単一の選択されたポートフォリオ] です。計画の構成を変更して、複数年のポートフォリオおよびすべてのポートフォリオを計画できます。

投資枠管理データ連携

PPM のシナリオ計画 と 投資枠管理 を統合して、年毎財務およびリソースキャパシティベースの計画のために、トップレベルの投資資金から 1 つのポートフォリオまたはすべてのポートフォリオのターゲット金額を取得します。単一のポートフォリオを計画している場合、そのポートフォリオのターゲット金額は、トップレベルの投資におけるそのポートフォリオ投資と会計期間の [新しい資金] 列から取得されます。すべてのポートフォリオを計画している場合は、組織に資金を提供する必要がある資金調達エンティティを設定し、投資計画者がトップレベルの投資でその特定のエンティティの資金を追加できます。たとえば、組織が事業部門である場合、その事業部門を資金調達エンティティとして有効にし、その事業部門に割り当てられたすべての資金を組織のターゲットとして設定できます。

注:
PPM のシナリオ計画 を 2.3.0 以降のバージョンにアップグレードする場合は、データ連携が機能するように従来の 投資枠管理 を ServiceNow Store にアップグレードする必要があります。従来の 投資枠管理 から ServiceNow Store アプリケーションへのアップグレード手順については、従来の 投資枠管理 をストアアプリケーションにアップグレードを参照してください。

複数年のリソースキャパシティベースの計画

複数年計画を使用すると、3 か月から 24 か月の計画期間を使用してポートフォリオを計画できます。ポートフォリオが 1 年超にわたるデマンドとプロジェクトで構成されている場合、またはより長い期間を計画している場合は、より小さな計画期間でポートフォリオを計画することができます。複数年計画を使用すると、選択した計画期間中にさまざまなデマンドとプロジェクトのリソース使用状況を分析し、予算、リソース、またはビジネス環境の変更に対応するために優先度を調整できます。

複数年計画では、年毎計画と同様のシナリオを作成しますが、特定のポートフォリオまたはすべてのポートフォリオの指定された計画期間に対して作成します。選択したデマンドとプロジェクトに基づいて、選択した計画期間のリソース割り当てを分析します。リソースの可用性とキャパシティを分析した後、各種のシナリオでデマンドとプロジェクトの選択を変更し、リターンを最大化して組織に財務価値を追加するシナリオを確認します。

シナリオ計画のタイプとスコープの構成

シナリオ計画タイプを設定し、ポートフォリオのスコープを選択して、ポートフォリオの計画と作業方法を決定します。ポートフォリオ内のデマンドとプロジェクトの資金調達用の 投資枠管理 を使用して指定することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

重要:
計画タイプとスコープを変更すると、既存のシナリオと確認済みの計画がすべて削除されます。

必要なロール：it_pps_admin

このタスクについて
ポートフォリオの資金調達に 投資枠管理 を使用するオプションは、投資枠管理プラグインをアクティブ化した場合にのみ使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > ポートフォリオ > 計画立案の構成.
2. シナリオ計画の設定レコードを開きます。
3. 計画のタイプとスコープを構成します。
4. オプション: 完了または非アクティブ状況のデマンドとプロジェクトの選択を有効にする場合は、[完了したプロジェクトの選択を許可] を選択します。
5. オプション: 投資枠管理 からターゲット金額を取得する場合は、[投資枠管理データ連携] を選択します。

   注:
   このオプションは、PPM 向け投資枠管理 (com.snc.investment_planning_pmo) プラグインがアクティブで、計画タイプが [年毎財務およびリソースキャパシティベースの計画] として選択されている場合にのみ使用できます。

   - 計画スコープが [単一の選択されたポートフォリオ] である場合、そのポートフォリオのターゲット金額は、選択されたポートフォリオ投資の [新しい資金] 列から取得されます。詳細については、「投資への資金の割り当て」を参照してください。
   - 計画スコープが [すべてのポートフォリオ] の場合は、ターゲット金額を取得するソースを指定します。
     a. [資金調達エンティティ] リストから、デマンドとプロジェクトの資金調達元となる資金調達エンティティを選択します。
     b. [資金調達レコード] リストから、選択した資金調達エンティティのトランザクションテーブルを選択します。
6. [更新] をクリックします。

タスクの結果
シナリオ計画構成が更新され、すべてのシナリオ計画と確認済みの計画が削除されます。構成を変更すると、ポートフォリオ計画立案ワークベンチも更新され、更新された計画タイプとスコープに基づいてシナリオ計画を実行できるようになります。

シナリオ計画のタイプとスコープを変更した場合の影響

計画のタイプとスコープを変更すると、計画立案シナリオとポートフォリオ計画立案におけるデマンドとプロジェクトの選択に影響します。計画のタイプとスコープは、ポートフォリオ計画立案中にいつでも変更できます。

計画タイプの変更

計画タイプを変更すると、この変更の時点でポートフォリオに確認済みの計画または計画立案シナリオがあるかどうかに関係なく、ポートフォリオ計画に影響します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

年毎ファイナンシャルプランから複数年のリソースキャパシティベースの計画への変更

この計画タイプの変更は、確認済みの計画と計画立案シナリオに次の影響を及ぼします。

- すべてのシナリオとシナリオ資金調達レコードが削除されます。
- デフォルトのシナリオは、現在の月を開始月として、デフォルトの 3 か月の計画期間で作成されます。

複数年のリソースキャパシティベースの計画から年毎ファイナンシャルプランへの変更

この計画タイプの変更は、確認済みの計画と計画立案シナリオに次の影響を及ぼします。

- すべてのシナリオとシナリオ資金調達レコードが削除されます。
- 以前に年毎計画を使用していた場合は、ターゲット予算が取得されます。そうでない場合は、現在の会計年度がデフォルトとして設定され、ターゲット予算の設定が必要になります。

計画期間の変更

計画期間を変更すると、計画に関与するすべてのユーザーに影響し、ポートフォリオ計画立案に次の影響があります。

- 新しい計画期間は、すべてのポートフォリオのすべてのシナリオと確認済みの計画に適用されます。
- 選択した計画期間外のデマンドまたはプロジェクトは、選択または選択解除できません。ただし、プロジェクトまたはデマンドの [計画] チェックボックスの値は変更されません。これらのデマンドとプロジェクトは、引き続きシナリオに関連します。
- シナリオを確認すると、計画期間に当てはまるデマンドとプロジェクトのみが確認され、計画期間外のデマンドとプロジェクトは確認されません。

計画スコープの変更

計画スコープを、単一の選択されたポートフォリオからすべてのポートフォリオに変更すると、確認済みの計画と計画立案シナリオに次の影響があります。

- 年毎計画の場合、確認済みの計画がいずれかのポートフォリオに存在する場合、追跡ステータスでポートフォリオ計画立案レコードが作成されます。
- 年毎計画の場合、すべての会計年度の確認済み計画と、いずれかのポートフォリオに対して少なくとも 1 つの確認済み計画を作成します。
- 複数年計画の場合、ポートフォリオに対して確認済みの計画が保持されます。
- 既存のすべてのシナリオとシナリオ資金調達レコードが削除されます。

会計年度のターゲット予算の設定

1 つのポートフォリオまたはすべてのポートフォリオを計画するときは、作業するデマンドとプロジェクトの会計期間を選択することから始めます。次に、シナリオ計画が投資枠管理と統合されていない場合は、ポートフォリオの経費と投資コストの両方のターゲット金額を設定します。

始める前に
必要なロール：it_portfolio_manager または it_pps_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

内部グループは通常、会計年度のターゲット金額を提供します。計画会計年度のターゲットは、実績支出額を基準にして前年度の支出額の 110% にすることができます。ターゲットは、翌会計年度の計画立案プロジェクトの出発点です。

注:
PPS アドミニストレーターは、次の場所に移動してポートフォリオターゲットを設定できます プロジェクト管理 > ポートフォリオターゲットの入力.

シナリオ計画が投資枠管理と統合されている場合、ターゲット金額は、単一のポートフォリオまたはすべてのポートフォリオに割り当てられた上位の投資資金から取得されます。

単一のポートフォリオまたはすべてのポートフォリオの投資資金調達設定を構成する方法については、「シナリオ計画のタイプとスコープの構成」を参照してください。

トップレベルの投資の作成と資金の割り当てについては、「トップレベルの投資の作成」トピックを参照してください。

手順

1. 次の 2 つの開始点のいずれかから、ポートフォリオ計画立案ワークベンチに移動します。
2. ポートフォリオ計画立案ワークベンチの [会計年度] 選択リストで、計画立案を行う対象の年を選択します。
   ファイナンシャルプランは、一度に 1 つの会計期間についてのみ実行できます。
3. ターゲット予算金額を設定または更新します。
   - 選択した会計年度の計画立案を初めて行う場合は、[ターゲットを設定] をクリックします。
   - 選択した会計年度のターゲット予算金額を既に設定していて、その金額を変更する場合は、[ターゲットを編集] をクリックします。
4. [ターゲットを編集] ダイアログボックスで、[投資ターゲット] および [経費ターゲット] の金額を入力します。
5. [保存] をクリックします。

タスクの結果

異なる会計年度のポートフォリオの投資コストおよび経費コストターゲットは、ポートフォリオレコードの [ポートフォリオターゲット] 関連リストで更新されます。

次のタスク

ポートフォリオ計画立案のシナリオの作成を開始します。詳細については、「計画立案シナリオの作成」を参照してください。

計画立案シナリオの作成

ポートフォリオ内のデマンドとプロジェクトのさまざまな組み合わせで、計画立案シナリオを作成します。さまざまなシナリオを試して、会計年度の予算支出を計画します。

始める前に

年毎タイプの計画の計画立案シナリオを作成する対象の、会計年度のターゲット予算が設定されていることを確認します。詳細については、「会計年度のターゲット予算の設定」を参照してください。
複数年のリソースキャパシティタイプの計画では、ターゲットの設定は必要ありません。

必要なロール：it_portfolio_manager

このタスクについて

実行対象のプロジェクトとデマンドのさまざまな組み合わせで、最大 4 つの計画立案シナリオを作成できます。たとえば、シナリオ A を作成し、標準のリソース割り当てですべてのプロジェクトと

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドを選択することができます。リスクがビジネスの成果に影響を与える可能性があることを認識している場合は、プロジェクトとデマンドの数を減らしてシナリオ B を作成し、その戦略によってリスクを軽減または回避できるかどうかを確認できます。シナリオの定義の詳細については、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。

手順

1. 次の 2 つの開始点のいずれかから、ポートフォリオ計画立案ワークベンチに移動します。

2. ポートフォリオ計画立案ワークベンチで、年毎財務およびリソースキャパシティベースの計画または複数年のリソースキャパシティベースの計画のシナリオを作成します。
   - 年毎計画の場合は、次の手順を実行します。

   a. 計画立案シナリオを作成する対象の会計年度を選択します。

   b. ようこそページの [計画を開始] ボタンをクリックします。
   選択した会計年度のすべてのアクティブなデマンドとプロジェクトを含むデフォルトの計画立案シナリオが作成されます。

   > **注:**
   > 選択した会計年度のポートフォリオ計画が存在する場合、ポートフォリオ計画立案ワークベンチには、それが現在の計画として表示されます。

   c. シナリオ作成アイコン (+) をクリックします。

   d. [シナリオを作成] ダイアログボックスで、シナリオの名前と簡単な説明を入力します。

   e. [データのコピー元 (Copy Data From)] リストで、データのコピー元のソースを選択します。

   使用可能なオプションは、次のとおりです。

   - なし：プロジェクトまたはデマンドが選択されていないシナリオを作成します。
   - 前年に資金調達された進行中のプロジェクト **(Ongoing projects funded last year)**：前年中に資金調達され、選択した現在の年に継続しているプロジェクトを使用してシナリオを作成します。このオプションは、前年に承認された既存の計画が存在する場合にのみ使用できます。これは、特定の会計年度の初期シナリオを作成するときのデフォルトのオプションです。
   - 他のシナリオのリスト **(A list of other scenarios)**：別の既存のシナリオから選択されたプロジェクトとデマンドを使用してシナリオを作成します。このオプションは、同じ会計年度の同じポートフォリオに他のシナリオが存在する場合に使用できます。
   - 確認済み計画 **(Confirmed Plan)**：既存の承認済み計画から選択されたプロジェクトとデマンドを使用してシナリオを作成します。このオプションは、現在の会計年度に確認済みの計画が存在する場合にのみ使用できます。

   f. [保存] をクリックします。

   - 複数年計画の場合、現在の月を開始月とし、[シナリオ計画の構成] ページで構成された計画期間を使用して、デフォルトの計画が自動的に作成されます。新しいシナリオを作成するには、次の手順を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. シナリオ作成アイコン (+) をクリックします。

b. [シナリオを作成] ダイアログボックスで、シナリオの名前と簡単な説明を入力します。

c. [データのコピー元 (Copy Data From)] リストで、データのコピー元のソースを選択します。

使用可能なオプションは、次のとおりです。

- なし：プロジェクトまたはデマンドが選択されていないシナリオを作成します。
- 前年に資金調達された進行中のプロジェクト **(Ongoing projects funded last year)**：前年中に資金調達され、選択した現在の年に継続しているプロジェクトを使用してシナリオを作成します。このオプションは、前年に承認された既存の計画が存在する場合にのみ使用できます。これは、特定の会計年度の初期シナリオを作成するときのデフォルトのオプションです。
- 他のシナリオのリスト **(A list of other scenarios)**：別の既存のシナリオから選択されたプロジェクトとデマンドを使用してシナリオを作成します。このオプションは、同じ会計年度の同じポートフォリオに他のシナリオが存在する場合に使用できます。
- 確認済み計画 **(Confirmed Plan)**：既存の承認済み計画から選択されたプロジェクトとデマンドを使用してシナリオを作成します。このオプションは、現在の会計年度に確認済みの計画が存在する場合にのみ使用できます。

d. [保存] をクリックします。

タスクの結果
計画立案シナリオが作成され、新しいタブに表示されます。

次のタスク
計画立案シナリオで実行するプロジェクトとデマンドを選択します。

ポートフォリオ計画立案のためのデマンドとプロジェクトの選択

計画立案シナリオを作成したら、予算計画立案に含めるデマンドとプロジェクトを選択します。選択した会計年度または計画期間のすべてのデマンドとプロジェクトを、その計画コストおよび優先度とともに表示して、実行用に確定できます。

始める前に
少なくとも 1 つの計画立案シナリオが必要です。詳細については、「計画立案シナリオの作成」を参照してください。

必要なロール：it_portfolio_manager

このタスクについて
デマンドまたはプロジェクト、およびそれらの年毎タイプの計画の計画コストを含めたり除外したりして、 what-if 分析を実行できます。計画コストは、プロジェクトまたはデマンドに対して作成されたすべてのコスト計画から導出されます。これは、会計年度または計画期間における特定のプロジェクトまたはデマンドのすべてのコスト計画のすべてのコストの合計です。

デマンドまたはプロジェクト、およびそれらの複数年のリソースキャパシティタイプの計画の計画コスト、予算、および使用状況を含めたり除外したりして、 what-if 分析を実行できます。

手順

1. 次の 2 つの開始点のいずれかから、ポートフォリオ計画立案ワークベンチに移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. ポートフォリオ計画立案ワークベンチで、デマンドとプロジェクトを含めるまたは除外するシナリオをクリックします。
選択したポートフォリオのプロジェクトとデマンドが [タイムラインビュー] に表示されます。
3. オプション: [バブルチャート] タブを使用して、デマンドの相対的な順位を比較および評価します。

   (Optional) デマンドを右クリックし、コンテキストメニューから [実行用に選択] を選択して、ポートフォリオ計画立案にデマンドを含めます。詳細については、「デマンドワークベンチのバブルチャート」を参照してください。特定のデマンドを検索するには、フィルター ( ) アイコンを使用してフィルターを適用します。

   > **注:**
   > [バブルチャート] タブは、複数年のリソースキャパシティベースの計画の構成では使用できません。

4. 各プロジェクトまたはデマンドの横にあるチェックボックスをオンまたはオフにして、[タイムラインビュー] タブでデマンドおよびプロジェクトを計画立案に含めるか、または除外します。
   タイムラインの特定のデマンドとプロジェクトを検索するには、フィルター ( ) アイコンを使用してフィルターを適用します。
   選択したプロジェクトとデマンドの数は、[概要] タブの [選択されているアイテム] セクションで更新されます。
5. オプション: ポートフォリオで選択されているプロジェクト間の外部依存関係を確認します。
詳細については、「プロジェクト間の外部依存関係の確認」を参照してください。
6. 右側の [概要] セクションの情報と [リソース] タブを確認して、計画に含めるデマンドとプロジェクトの選択を評価および調整します。
[概要] タブの次のセクションを確認します。
   - 年毎タイプの計画で [ターゲットを設定] ステージ (予算 対 ターゲット] セクション) に入力した予算合計とターゲットの比較。予算合計がターゲットコストを上回っている場合、例外アイコン ( ) が合計計画コストとともに表示されます。
   - [合計計画コスト] セクションの複数年タイプの計画のすべてのプロジェクトおよびデマンドの合計計画コスト。
   - [利益合計] セクションで選択したデマンドおよびプロジェクトの実行時に発生する可能性のある利益合計。

     > **注:**
     > 複数年のリソースキャパシティタイプの計画の場合、選択した計画期間に関係なく、プロジェクトまたはデマンドの全期間における計画コストと利益の合計値が表示されます。


   - 組織の戦略や目標に関連付けられていないデマンドとプロジェクトの数を [未調整] セクションで表示することによる、ポートフォリオの戦略的配置。
   - 選択した会計年度のいずれかの四半期において、要求された時間数が [割り当て超過のグループ] セクションの合計時間キャパシティを超えるアサイン先グループの数。
   - [実績] セクションで、実行用に選択されたプロジェクトとポートフォリオ内の残りのプロジェクトに費やされた実績額を確認します。

     > **注:**
     > 複数年のリソースキャパシティタイプの計画の場合、実績値は、選択および未選択のプロジェクト実績の凡例なしでウィジェットに表示されます。

   次の画像は、年毎タイプの計画の [概要] セクションにポートフォリオ情報がどのように表示されるかの例を示しています。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

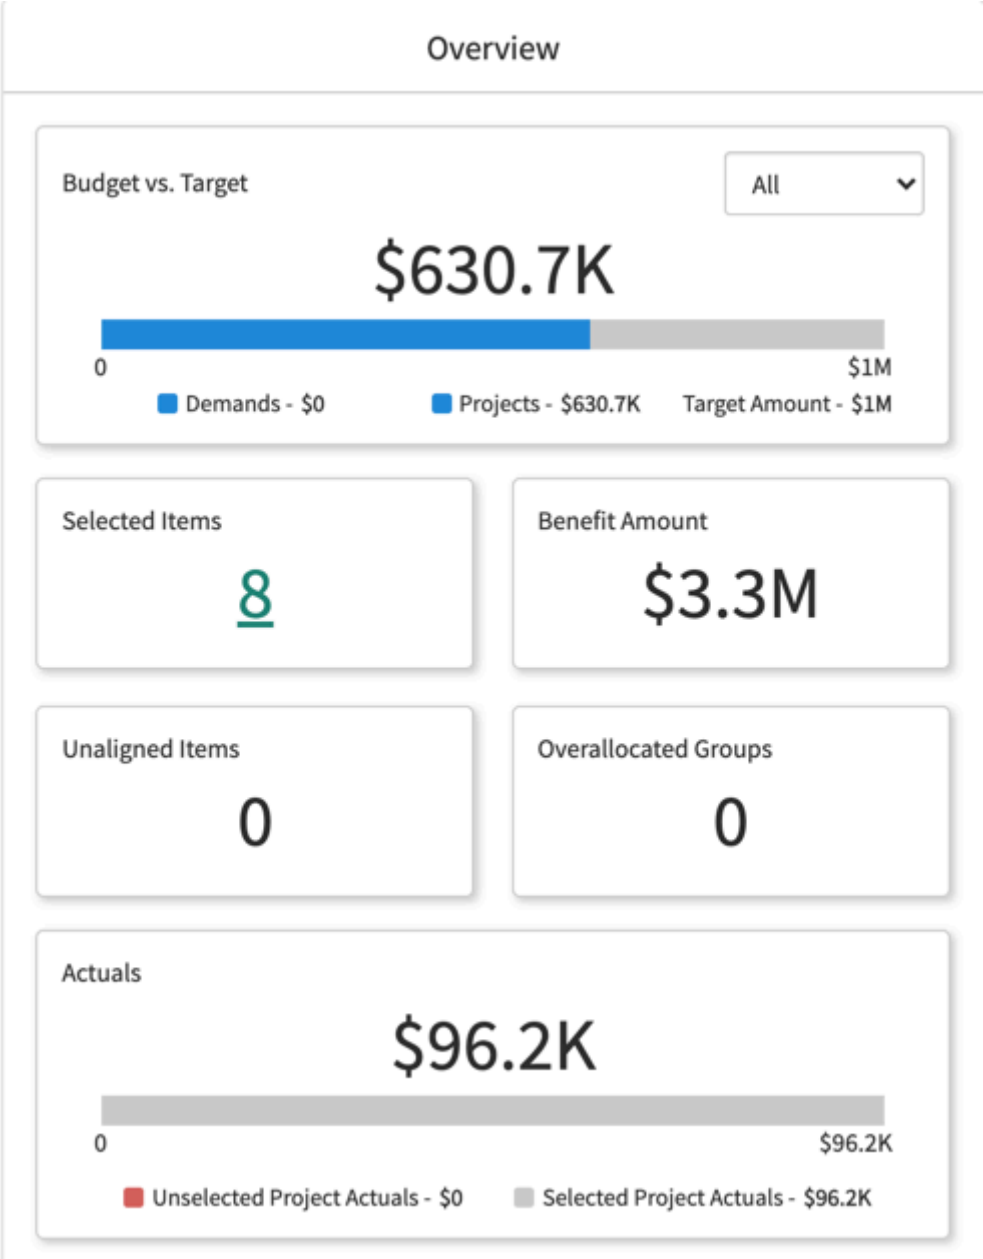

次の画像は、複数年タイプの計画の [概要] セクションにポートフォリオ情報がどのように表示されるかの例を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

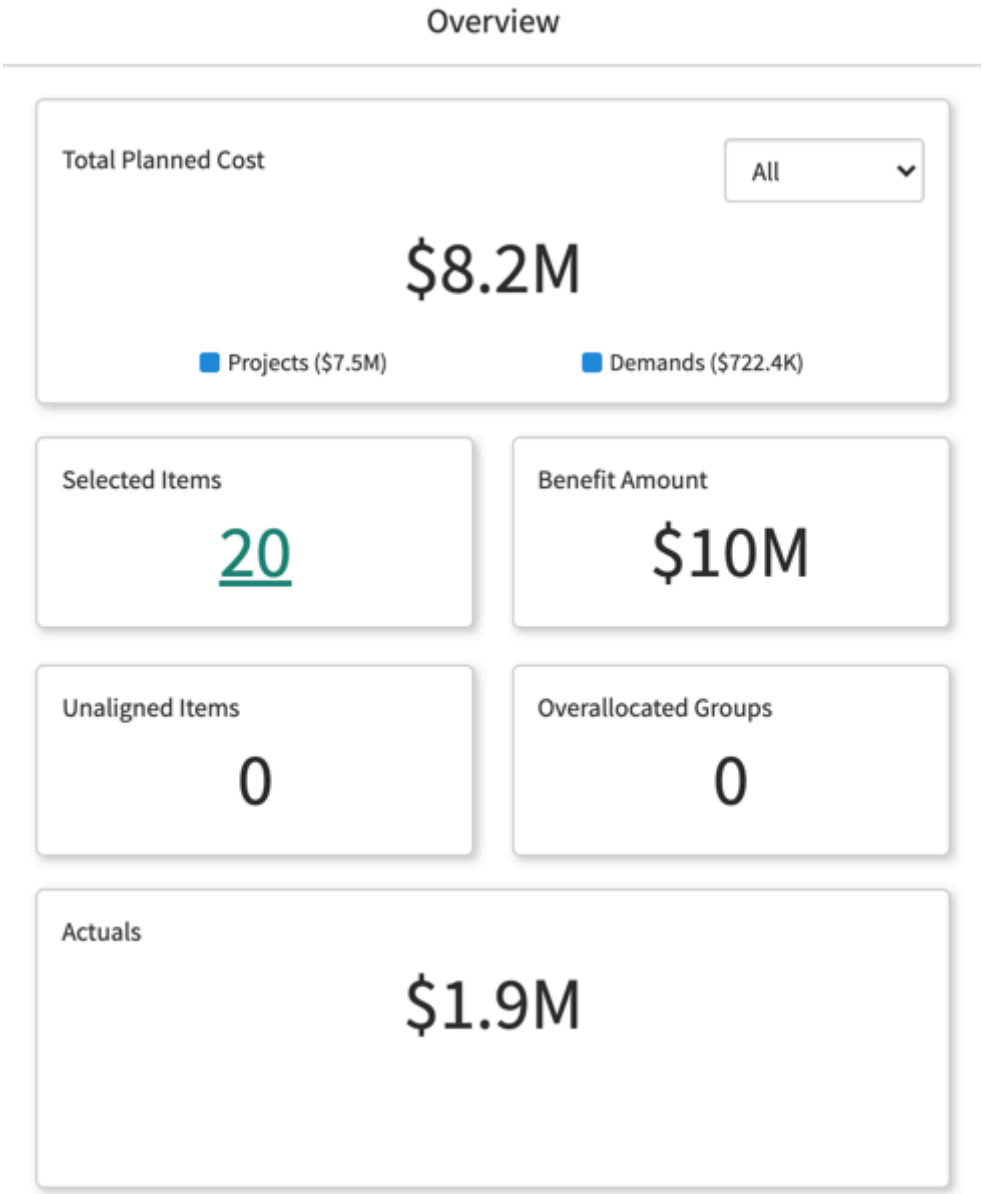

[リソース] タブの次のセクションを確認します。

ヒートマップ内のポートフォリオの選択したデマンドおよびプロジェクトによって要求されたすべてのリソースの使用率が表示されます。すべてのリソースグループまたは過剰に割り当てられたリソースグループの使用率を月または四半期で表示できます。

ヒント:
ヒートマップ内の任意のセルをクリックして、選択したリソースグループに関連付けられたプロジェクトまたはデマンドを表示します。

次の画像は、リソース情報がヒートマップにどのように表示されるかの例を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



ヒント:
計画コストをターゲット予算内に、またリソース使用率を 100% 以内にするために、優先度の低いいくつかのデマンドまたはプロジェクトの選択を解除することを検討します。選択解除されたデマンドとプロジェクトは、その後で、別の会計期間に移動できます。

7. オプション: 必要に応じて [投資予算] および [経費予算] 列を使用して、個々のプロジェクトおよびデマンドの投資および経費予算を直接レビューして修正します。

   注:
   [タイムラインビュー] タブで、列を表示または非表示 ( ) をクリックし、これらの列が表示されていない場合は [投資予算] 列および [経費予算] 列を追加します。

8. オプション: 編集アイコン ( ) をクリックして変更を加えることで、名前と簡単な説明を更新します。
9. オプション: 削除アイコン ( ) をクリックして、シナリオを削除します。
10. オプション: [確認] をクリックして、選択したシナリオを現在の計画になるように変換します。
11. オプション: 計画立案シナリオをさらに作成して比較します。
12. オプション: リフレッシュアイコン (ボタン) をクリックして、デマンドまたはプロジェクトが実行用に選択または選択解除された後に、コストウィジェットとリソースウィジェットを手動で更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
計画立案シナリオを比較して、プロジェクトとデマンドのさまざまな組み合わせを分析し、組織の目標に最も適したシナリオを選択します。詳細については、「計画立案シナリオの比較」を参照してください。

プロジェクト間の外部依存関係の確認

ポートフォリオ内のプロジェクト間の外部依存関係を確認し、相互に依存しているプロジェクトをより詳細に追跡します。

始める前に
必要なロール：it_portfolio_manager
デマンドとプロジェクトを、ポートフォリオ計画立案ワークベンチのタイムラインビューで開きます。

このタスクについて
ポートフォリオマネージャーは、互いに依存しているプロジェクトを把握して、これらのプロジェクトをより詳細に追跡することができます。
たとえば、プロジェクト B がプロジェクト A (外部ソフト依存関係) に依存していて、プロジェクト B のスケジュールが影響を受けないように、プロジェクト A が時間どおりに実行されるようにしたいとします。[依存関係] 列には、プロジェクト A から送信する外部依存関係とプロジェクト B に受信する外部依存関係があることが示されます。受信する依存関係を使用して、プロジェクト A の遅延がプロジェクト B に影響するかどうかを判断できます。

手順

1. タイムラインビューで、ガントで列を表示または非表示アイコン ( ) アイコンをクリックし、表示されていない場合は [依存関係] 列を追加します。
   受信および送信する外部依存関係の数が表示されます (存在する場合)。
2. プロジェクトの [依存関係] 列で外部依存関係をクリックします。
3. [依存関係] ポップアップダイアログで、タブをクリックして依存関係を確認します。

   [受信] タブ

   プロジェクトから受信する依存関係を持つタスクがリストされます。


   [送信] タブ

   プロジェクトに送信する依存関係を持つタスクがリストされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト間の外部依存関係の例。

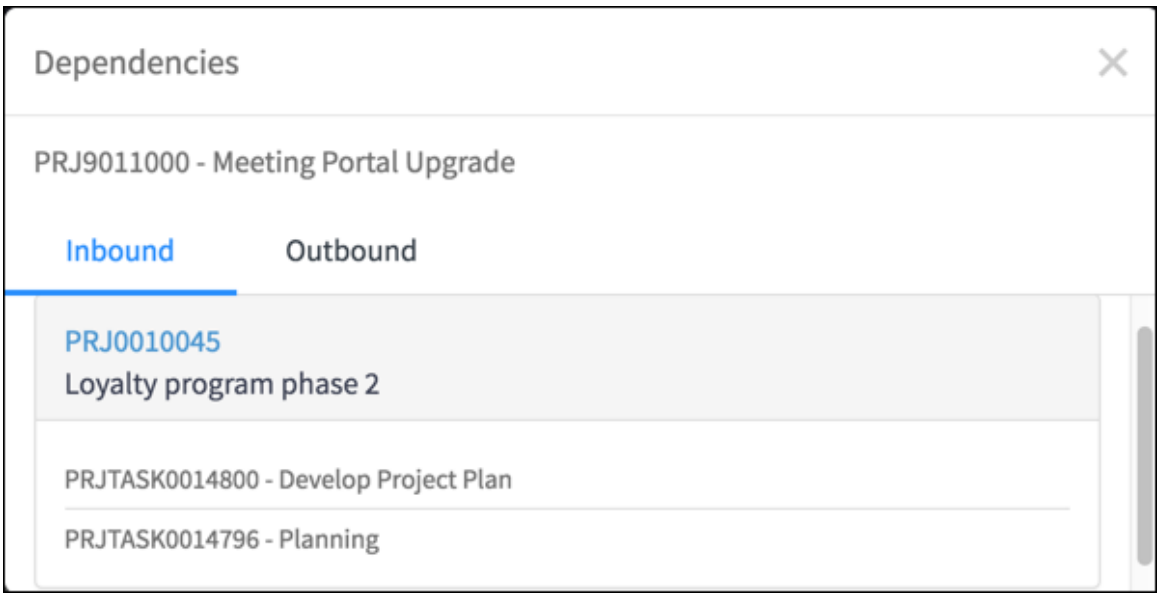

4. タブのプロジェクト番号をクリックして、リンクされたプロジェクトを計画立案コンソールビューで開いて確認します。

デマンドおよびプロジェクトのランク付け

デマンドとプロジェクトをランク付けして、ポートフォリオ内でのデマンドとプロジェクトの承認と実行のために優先順位付けします。

始める前に

必要なロール：it_portfolio_manager

このタスクについて

デフォルトでは、[スコアによるランク付け] リストは、システムで生成されたスコアに基づいてデマンドとプロジェクトをランク付けします。デマンドまたはプロジェクトのランクは会計年度に固有です。プロジェクトが FY17 で 3 番目にランク付けされながら、FY18 では 6 番目にランク付けされることもあります。

手順

1. 次の 2 つの開始点のいずれかから、ポートフォリオ計画立案ワークベンチに移動します。

2. オプション: ランクを自動または手動で調整します。

Example:
次の表で、ランクの手動調整について説明します。

ランクを編集する場合のシナリオ	ランクの更新	手動編集前のランク	手動編集後のランク
最初のランクが 0 または空白で他のランクが存在する場合、編集の	• 最初のランク：0 • 編集済みランク：2	• Task_1：**0** • Task_2：1	• Task_2：1 • Task_1：**2**

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ランクを編集する場合のシナリオ	ランクの更新	手動編集前のランク	手動編集後のランク
後、後続のランクは 1 ずつインクリメントされます。		• Task_3：2 • Task_4：3	• Task_3：3 • Task_4：4
最初のランクが編集済みランクより大きい場合、編集の後、後続のランクは 1 ずつインクリメントされます。	• 最初のランク：4 • 編集済みランク：1	• Task_1：1 • Task_2：2 • Task_3：3 • Task_4：**4**	• Task_4：**1** • Task_1：2 • Task_2：3 • Task_3：4
最初のランクが編集済みランクより小さく、ランクの順序にギャップがない場合、編集の後、前のランクは 1 ずつデクリメントされます。	• 最初のランク：1 • 編集済みランク：3	• Task_1：**1** • Task_2：2 • Task_3：3 • Task_4：4	• Task_2：1 • Task_3：2 • Task_1：**3** • Task_4：4
最初のランクが編集済みランクより小さく、ランクの順序にギャップがある場合、編集の後、後続のランクは 1 ずつインクリメントされます。	• 最初のランク：1 • 編集済みランク：4	• Task_1：**1** • Task_2：2 • Task_3：4 • Task_4：5	• Task_2：2 • Task_1：**4** • Task_3：5 • Task_4：6

自動翻訳

計画立案シナリオの比較

さまざまな計画立案シナリオを現在の計画またはデフォルトの計画と比較して、実行するポートフォリオ内のプロジェクトとデマンドのさまざまな組み合わせを評価します。What-if 分析を実行し、ターゲット予算の達成とリソースの使用を最適に行う計画立案シナリオを決定できます。

始める前に

最大 4 つの計画立案シナリオを作成し、実行するプロジェクトとデマンドを選択していることを確認します。詳細については、「計画立案シナリオの作成」と「ポートフォリオ計画立案のためのデマンドとプロジェクトの選択」を参照。

必要なロール：it_portfolio_manager

手順

1. 次の 2 つの開始点のいずれかから、ポートフォリオ計画立案ワークベンチに移動します。

2. ポートフォリオ計画立案ワークベンチの [計画] タブで、[シナリオを比較] をクリックします。[シナリオを比較] ページには、すべての計画立案シナリオが表示されます。
3. 選択したプロジェクトとデマンドのコスト、プロジェクトとデマンドの数、利益合計、実績など、シナリオのさまざまな要素を比較します。
4. コスト、プロジェクトとデマンドの数、利益合計、選択したプロジェクトとデマンドの実績などのシナリオ間の差異を比較します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

さまざまなフィールドの差異の値は、赤色または緑色で表示されます。たとえば、シナリオの計画コストが確認済み計画の計画コストよりも大きい場合、計画コストの差異は赤色で表示されます。または、シナリオの利益合計が確認済み計画の利益合計より多い場合は、利益合計の差異が緑色で表示されます。

次のタスク

組織の目標に最も適合し、ターゲット予算を最適に達成し、リソースを活用できるシナリオを確認します。詳細については、「計画立案シナリオの確認」を参照してください。

計画立案シナリオの確認

選択したデマンドとプロジェクトを会計年度に実行するための予算とリソースを割り当てるシナリオを選択して確認します。

始める前に

最大 4 つの計画立案シナリオを作成し、実行するプロジェクトとデマンドを選択していることを確認します。詳細については、「計画立案シナリオの作成」と「ポートフォリオ計画立案のためのデマンドとプロジェクトの選択」を参照。

必要なロール：it_portfolio_manager

手順

1. 次の 2 つの開始点のいずれかから、ポートフォリオ計画立案ワークベンチに移動します。

2. プロジェクト計画立案ワークベンチで、次のいずれかのオプションを使用して、シナリオを会計年度の現在の計画として確認します。
   - シナリオを選択し、[確認] をクリックします。
   - [シナリオを比較] をクリックし、[シナリオを比較] ページで [シナリオを確認] をクリックします。
   - 確認済みの計画を上書きする場合は、[上書き] をクリックします。
3. [確認] ダイアログボックスで、計画立案シナリオを保存した後に選択したデマンドとプロジェクトに対して実行する追加オプションを設定します。

   注:
   確認済みの計画が存在する場合、ダイアログボックスの名前は [確認] ではなく [選択を上書き] になります。

   - プロジェクトプロパティ [ポートフォリオワークベンチからのデマンドの確認後にプロジェクトを作成します] が false に設定されている場合は、[選択したすべてのデマンドを承認 (まだ承認されていない場合)] を選択することで、保存後に選択したすべてのデマンドを承認するよう選択できます。
   - プロジェクトプロパティ [ポートフォリオワークベンチからのデマンドの確認後にプロジェクトを作成します] が true に設定されている場合は、[選択したすべてのデマンドをプロジェクトに変換] を選択することで、保存後に選択したデマンドをプロジェクトに変換するよう選択できます。
   - 選択したデマンドとプロジェクトのリソースを確認するには、[選択したデマンドまたはプロジェクトのリソースを確認 **(Confirm resources for selected demands or projects)]** をオンにします。
   - 新たに選択されていないデマンドとプロジェクトに関連付けられた確認済みおよび割り当て済みのリソース計画に、実績時間が関連付けられていない場合は、[選択されていないデマンドおよびプロジェクトのリソース計画の状況を要求済みにします (実績時間/コストが入力されていないリソース計画のみ変更されます)] を選択して、そのようなリソース計画の状況を要求済みに変更

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

します。確認済みおよび割り当て済みのリソース計画に実績が関連付けられている場合、そのようなリソースを手動で解放する必要があることを示す通知がプロジェクトマネージャーまたはデマンドマネージャーに送信されます。

- 選択したシナリオを確認した後、[すべての作業シナリオを削除] を選択して、未確認の作業シナリオをすべて削除します。このオプションがデフォルトで選択されています。

4. [保存] をクリックします。

タスクの結果

予算は、選択したデマンドとプロジェクトに割り当てられます。残りのデマンドとプロジェクトは実行から削除されます。ただし、選択されていないデマンドとプロジェクトについて確認済みのリソースは、自動的には削除されません。

ポートフォリオの進捗状況の追跡

シナリオを確認してポートフォリオの計画立案を完了したら、ポートフォリオの進捗状況を追跡します。ポートフォリオで選択された会計期間または計画期間のコスト、リソース、スケジュール、およびスコープのステータスを監視することもできます。

始める前に

必要なロール：it_portfolio_manager

手順

1. 次の 2 つの開始点のいずれかから、ポートフォリオ計画立案ワークベンチに移動します。

2. ポートフォリオ計画立案ワークベンチで、[追跡 **(Track)]** タブをクリックします。
プロジェクトとデマンドのステータスは、経時的なガントチャートを含む [タイムライン表示] タブおよび **[KPI]** タブに表示されます。

3. [タイムライン表示] タブで主要なパラメーターのステータスを確認して、ポートフォリオの進捗状況を追跡します。

- 選択したデマンドとプロジェクトの計画コストと実績コスト、差異、計画日と終了日、優先度などの詳細。
- 相互に依存しているプロジェクトを特定するには、ポートフォリオ内のプロジェクト間の外部依存関係を確認します。詳細については、「プロジェクト間の外部依存関係の確認」を参照してください。
- [ステータスレポート] オプションを選択して最新のプロジェクトステータスレポートを表示し、個々のプロジェクトの現在のステータスを追跡します。
- [計画立案コンソール] オプションを使用して、ポートフォリオ内の個々のプロジェクトのプロジェクトタスクの進捗状況を追跡します。このオプションは、プロジェクトのコンテキストメニューで使用できます。

4. [プロジェクト **KPI]** タブで、ポートフォリオ内の選択されたすべてのプロジェクトの総合健全性、スケジュール、コスト、リソース、およびスコープなどのステータス情報を確認します。
プロジェクトに対して作成された最新のステータスレポートにより、この情報が入力されます。ステータスインジケーターをポイントして、プロジェクトマネージャーがその KPI に入力したコメントを表示します。

> **注:**
> 任意のプロジェクト KIP の横にある灰色の X アイコン ( ) は、プロジェクトマネージャーがステータスレポートに、その要素についてコメントを入力していないことを示します。

5. コストおよびリソース関連の情報を、[コスト (予算 対 実績)] および [リソース (配分 対 実績)] チャートで確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [コスト (予算 対 実績)] チャートに示されている、ポートフォリオ内の選択されたすべてのプロジェクトの実績コストと計画コストの比較を確認します。プロジェクトの実績コストは、経費ラインから導出されます。

  注:
  [コスト (予算 対 実績) グラフは、複数年タイプの計画には使用できません。

- リストからそれぞれのオプションを選択すると、投資または経費のみ、あるいはその両方を表示できます。

- 割り当てられたリソースの使用状況を確認するには、[リソース (配分 対 実績)] チャートに示されている、すべてのプロジェクトタスクに費やされた実際のリソース時間と、ポートフォリオ内の選択したプロジェクトとデマンドの実行に割り当てられたリソース時間の比較を確認します。実際に費やされた時間は、プロジェクトの処理済みタイムカードから取得されます。

6. ポートフォリオ内の選択されたすべてのプロジェクトのリスク、問題、意思決定、アクション、およびプロジェクト変更要求を追跡するには、[リスク]、[問題]、[意思決定 **(Decisions)]**、[アクション]、および [変更] タブに移動します。

ポートフォリオダッシュボード

ポートフォリオダッシュボードは、ポートフォリオマネージャーがポートフォリオのさまざまなグラフィカルレポートを生成するための中心的な場所を提供します。

Madrid リリース以降、ポートフォリオマネージャーダッシュボードは廃止され、PMO ダッシュボードに置き換えられました。PMO ダッシュボードを使用して、ポートフォリオに関するインサイトを取得できます。詳細については、「PMO ダッシュボード」を参照してください。

ポートフォリオダッシュボードへのアクセス

さまざまなグラフィカルレポートを PMO ダッシュボードに表示します。

始める前に
必要なロール：it_portfolio_manager

手順

移動先 プロジェクト管理 > ポートフォリオ > ポートフォリオダッシュボード.
PMO ダッシュボードが表示されます。

プログラム管理

プログラムは、関連するプロジェクトまたはデマンドを単一のエンティティの下で論理的にグループ化するのに役立ちます。ServiceNow プログラム管理 アプリケーションを使用すると、関連するプロジェクトとデマンドを協調的に管理できます。これは、プロジェクトとデマンドを個別に管理する場合には実現できないことです。

it_program_manager ロール は、プログラムを管理するうえで不可欠です。プログラム管理 アプリケーションは、プログラムマネージャーに次の機能を提供します。

- 関連するプロジェクトおよびデマンドを追加して、プログラムを作成します。
- プログラムに固有のタスクを作成します。これらのタスクはプログラムの完了に不可欠ですが、プロジェクトのスコープ外です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


- プログラムの主要なマイルストーン、予想されるリスク、および問題を定義します。
- プログラムの一部であるすべてのプロジェクトとデマンドの進捗状況とステータスを追跡します。プログラムマネージャーは、コスト、リソース、およびスケジュールを追跡できます。

プログラムを作成するときは、次の点を考慮してください。

- プログラムは、ポートフォリオの一部にすることも、どのポートフォリオにも含まれない汎用のスタンドアロンプログラムにすることもできます。
- プログラムを複数のポートフォリオに含めることはできません。
- プロジェクトまたはデマンドを複数のプログラムの一部にすることはできません。
- プロジェクトとデマンドを、プログラムには含めずに、直接ポートフォリオに含めることができます。

次の図は、プログラムを実装する方法を示しています。

プログラムの実装

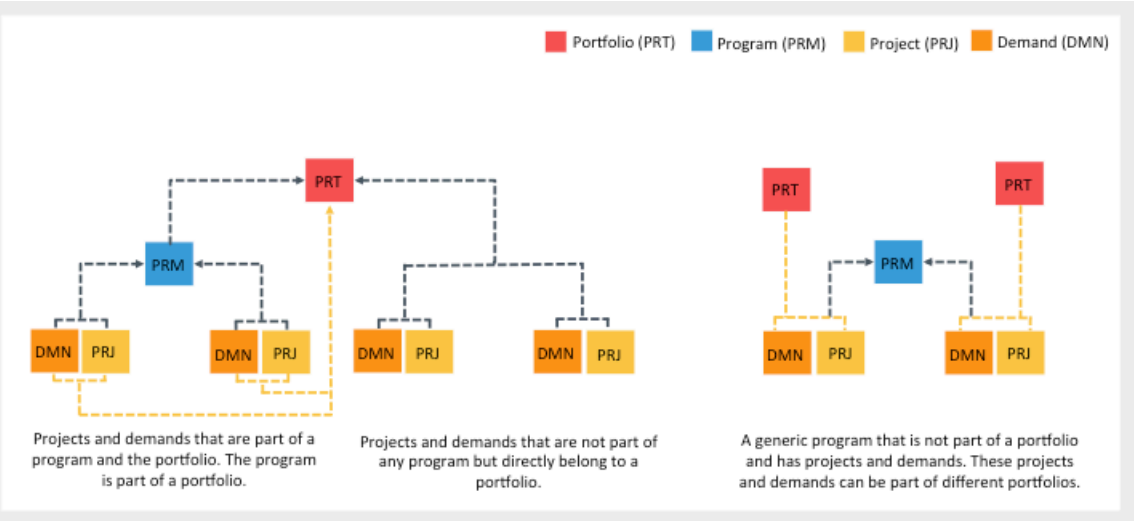


プログラム管理 の基本

プログラムを作成するときに、複数のプロジェクトまたはデマンドを追加できます。プロジェクトとデマンドのコスト計画を作成した場合、特定の値は、プログラムのコスト明細からロールアップされます。同時に、プロジェクトとデマンドのリスクと問題もプログラムに含められます。次の図は、プログラム内の情報が、プログラムの一部であるプロジェクトとデマンドにどのように関連しているかを示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プログラムへの情報の入力

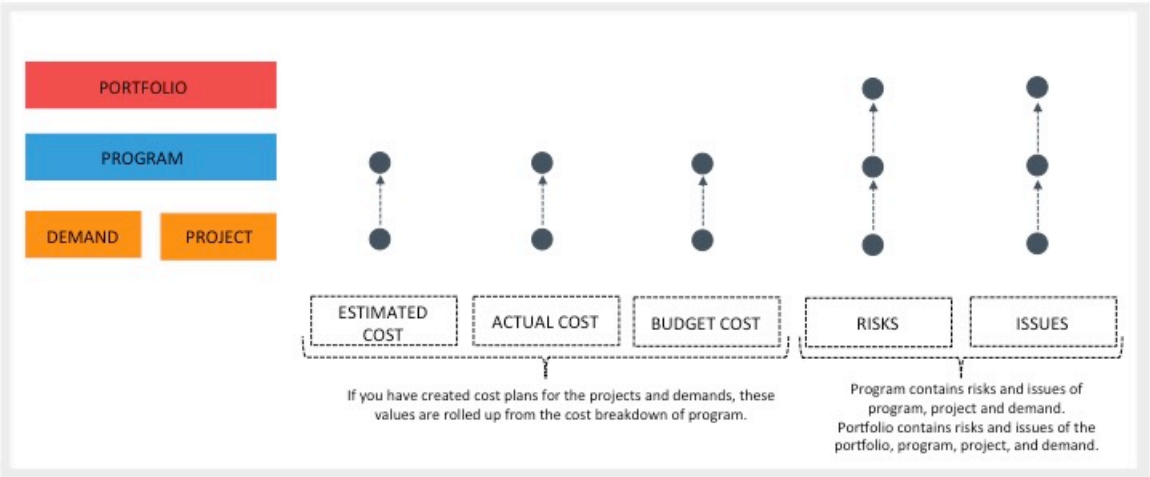

プロジェクトワークベンチは、プログラムと、その一部であるプロジェクトとデマンドの進捗状況を表示および監視するためのグラフィカルなチャートを提供します。プログラム、プロジェクト、およびデマンドの進捗状況を、マイルストーンと主要マイルストーンの詳細を含むタイムラインに照らして表示することもできます。

プロジェクトマネージャーダッシュボードは、プログラムマネージャーが、プログラムとプログラム財務のさまざまなグラフィカルレポートを生成するための中心的な場所を提供します。

プロジェクトとデマンドを管理するためのプログラムの作成

関連するプロジェクトとデマンドを管理するためのプログラムを作成します。期間、コスト概算、利益、および ROI を組織に対して定義します。

始める前に

必要なロール：it_program_manager

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > プログラム > 新規作成.
2. プログラムフォームの各フィールドに入力します。

プログラムフォーム

フィールド	説明
プログラム名	プログラムの名前。
プログラムマネージャー	プログラムにアサインされたプログラムマネージャー。
番号	設定可能なプリフィックス付きのシステム生成番号。
ポートフォリオ	プログラムが属するポートフォリオ。 プログラムのポートフォリオを選択しない場合、プログラムはグローバルプログラムになります。グローバルプログラム内のプロジェクトとデマンドを任意のポートフォリオに関連付けることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
優先度	プログラムに関連付けられた優先度。
ステータス	プログラムのステータス。この情報は、このプログラムの一部であるすべてのプロジェクトのステータスからロールアップされます。
状況	プログラムの現在の状態。 デフォルトの状況：[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ]。 **注:** プログラムのステータスを [クローズ済み] に手動で設定します。プログラムタスク、プロジェクト、およびデマンドが [クローズ済み] ステータスに移行しても、プログラムステータスは [クローズ済み] ステータスにロールアップしません。
フェーズ	[開始中]、[計画中]、および [実行中] などのプロジェクトの現在のフェーズ。
事業部門	このプログラムが属する事業部門。
投資タイプ	プログラムの投資タイプ。 デフォルトで利用可能なオプションは、[コスト削減 **(Cost Reduction)]**、[エンドユーザーエクスペリエンス]、[法務と規制 **(Legal and Regulatory)]**、[収益の創出 **(Revenue Generating)]**、[サービスの維持 **(Service Sustaining)]**、および [戦略の実現 **(Strategic Enabler)]** です。
影響を受ける事業部門	このプログラムが影響する組織の事業部門。
戦略	プログラムが達成する組織の戦略的目標。1 つのプログラムで複数の戦略的目標を達成することができます。 **注:** プログラムで戦略的目標を達成できない場合は、このフィールドを空のままにします。
目標	選択した戦略に関連付けられた目標。プログラムは複数の目標を達成できます。 戦略を選択しない場合、目標リストにはシステム内のすべての目標が表示されます。 **注:** プログラムに関連付けられた目標がない場合は、このフィールドを空のままにします。
説明	プログラムの詳細な説明。

プログラムフォームの [日付] セクション

フィールド	説明
開始予定日	予定されているプログラム開始日。関連するプログラムタスク、プロジェクト、およびデマン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	ドの開始日がプログラム開始日よりも前である場合、開始日はより早い日付に調整されます。 プログラムからデマンドまたはプロジェクトを削除しても、プログラムの開始予定日には影響しません。
終了予定日	予定されているプログラム終了日。終了日は、プログラムタスク、プロジェクト、およびデマンドの終了日に基づいて延長されます。 プログラムからデマンドまたはプロジェクトを削除しても、プログラムの開始予定日には影響しません。 関連するプログラムタスク、プロジェクト、またはデマンドの開始日と終了日に基づいて、プログラムの終了日を手動で調整できます。 **注:** プログラムの終了日より後の日付のデマンドが追加された場合、 [終了予定日] フィールドは読み取り専用になります。
計画された期間	このプログラムの予定期間。予定期間は、プログラムの開始予定日または終了予定日の変更に基づいて変更されます。
開始実績日時	プログラムが実際に開始される日付。
終了実績日時	プログラムが実際に終了した日付。
実際の期間	プログラムの開始から終了までのプログラムの実際の期間。

プログラムフォームの [財務] セクション

フィールド	説明
合計計画コスト	プログラムのコスト概算。 運用支出と資本的支出がプログラムに関連付けられている場合、計画コストは、機能通貨で表された運用支出と資本的支出の合計です。
計画投資	プログラムの資本的支出 (投資)。プログラムにコスト計画が関連付けられていない場合、[投資コスト] フィールドは編集可能です。通貨タイプを選択して、値を入力します。
計画経費	プログラムの運用支出 (経費)。プログラムにコスト計画が関連付けられていない場合、[経費 **(Operational expense)]** フィールドは編集可能です。通貨タイプを選択して、値を入力します。
予算コスト	このプログラムの予算コスト。
実績コスト	プログラムの実際のコスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	値は、プログラム内のプロジェクトとデマンドのコスト計画明細からロールアップされます。
計画利益	プログラムの計画利益の値。 この値は、プログラムの利益計画明細からロールアップされます。 また、値を手動で入力することもできます。[通貨タイプ] リストから通貨を選択し、値を入力します。
予定リターン (Planned returns)	予定リターンは、計画利益と計画コストの差異に基づいています。
計画 ROI (%)	結果は、[予定リターン **(Planned return)**] フィールドと [計画コスト] フィールドの値から導出されます。 式は、予定リターン / 計画コスト x 100 です。
スコア	プログラムスコアは、[リスクスコア]、[値スコア]、および [サイズスコア]の各属性の個々のスコアに基づいています。また、これらの属性はそれぞれ、リスク属性、計画 ROI % 属性、およびコスト概算属性 (プログラム上) に基づいて計算されます。 **注:** スコアの計算式を設定できます。
リスク	プログラムに関連付けられたリスク。

3. [送信] をクリックします。

次のタスク

次の関連リンクとリストを使用します。

プログラムフォーム関連リンク

フィールド	説明
PMO ダッシュボード	PMO ダッシュボードにアクセスして、プログラム内のプロジェクトとデマンドの包括的なレポートを表示します。
プログラム予算 (Program Budget)	プログラムに予算を割り当てることができます。
プログラムワークベンチ	プログラムワークベンチにアクセスして、プログラムに関連付けられたプロジェクト、デマンド、およびプログラムタスクの詳細を表示します。
ステータスレポート	最新のプログラムステータスレポートを表示するか、新しいプログラムステータスレポートを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プログラムフォーム関連リスト

フィールド	説明
プログラムタスク	関連付けられたすべてのプログラムタスクのリストを表示します。 新しいプログラムタスクを作成するには、[新規] ボタンをクリックします。詳細については、「プログラムタスクの作成」を参照してください。
プロジェクト	プログラムに含まれるプロジェクトのリストを表示します。 新しいプロジェクトを作成するには、[新規] をクリックします。詳細については、「プロジェクトの定義」を参照してください。 既存のプロジェクトをプログラムに追加するには、[編集] をクリックします。
デマンド	プログラムに含まれるデマンドのリストを表示します。 新しいデマンドを作成するには、[新規] をクリックします。詳細については、「デマンドの作成」を参照してください。 既存のデマンドをプログラムに追加するには、[編集] をクリックします。
リスク	プログラムまたはプログラム自体のプロジェクトとデマンドに関連付けられたリスクのリストを表示します。 新しいリスクを作成するには、[新規] をクリックします。
問題	プログラムまたはプログラム自体のプロジェクトとデマンドに関連付けられた問題のリストを表示します。 新しい問題を作成するには、[新規] をクリックします。
コスト計画	プログラムの一部であるプロジェクトとデマンドのすべてのコスト計画のリストを表示します。
利益計画	プログラムの一部であるプロジェクトとデマンドのすべての利益計画のリストを表示します。
プログラム予算 (Program Budget)	会計年度に応じたプログラム予算を表示します。リスト内の金額をクリックして金額を修正します。
プログラムステータスレポート	プログラムのステータスレポートのリストを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プログラムフォーム関連リスト (続く)

フィールド	説明
	新しいステータスレポートを生成するには、[新規] をクリックします。詳細については、「プログラムステータスレポートの作成」を参照してください。

プログラムタスクの作成

[プログラムフォーム] 関連リストからプログラムタスクを作成できます。

始める前に

必要なロール：it_program_manager

このタスクについて

手順

1. 移動先 プロジェクト管理 > プログラム > すべて.
2. リストからプログラムを選択します。
3. [プログラムタスク] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. フォームフィールドに入力します (テーブルを参照)。
   タスクの作成後に入力されるフィールドがいくつかあります。
5. [送信] をクリックします。

タスクの結果

新しいタスクが、プログラムフォームの [プログラムタスク] 関連リストに表示されます。

プログラムタスクフォーム

フィールド	説明
簡単な説明	[必須] プログラムタスクの簡単な説明。
番号	設定可能なプリフィックス付きのシステム生成番号。
ステータス	プログラムの現在のステータス。状況には、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] などがあります。
開始予定日	プログラムタスクの推定開始日時。
終了予定日	プログラムタスクの推定終了日時。
計画された期間	プログラムタスクの推定所要時間 (開始時間から終了時間まで)。
アサイン先	プログラムタスクにアサインされたユーザー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プログラムタスクフォーム (続く)

フィールド	説明
マイルストーン	マイルストーンは、期間がゼロ (0) のプログラムタスクです。マイルストーンを使用して、主要な意思決定ポイントや承認など、プログラムの重要な日付をマークします。
主要マイルストーン	プログラムの進捗状況を追跡するための主要なマイルストーンとしてマイルストーンを定義できます。たとえば、プログラム計画などの成果物完了のための主要なマイルストーンを作成できます。主要なマイルストーンはプログラムのタイムラインに表示されます。
説明	プログラムタスクの詳細な説明。
追加コメント (顧客に表示)	ユーザーに表示する情報を入力します。
作業メモ	プログラムの進行に伴うマイルストーン、障害、または変更に関する作業メモを入力します。 **注:** PPM のビジネスステークホルダーロールを持つユーザーは、このフィールドを表示できます。詳細については、「PPM のビジネスステークホルダーロール」を参照してください。

タスクの作成後に入力および更新されるフィールド

フィールド	説明
開始実績日時	このプログラムが開始された日付。この日付は、プログラムのステータスを [対応中] に更新した後に入力されます。
終了実績日時	このプログラムが終了した日付。この日付は、プログラムのステータスを [完了してクローズ] に更新した後に入力されます。
実際の期間	プログラムの開始から終了までのプログラムの実際の期間。計画期間と同様に、実際の期間には合計プログラム時間が表示されます。

プログラムへの予算の割り当て

会計年度に応じて、プログラムの予算を設定します。

始める前に

必要なロール：it_portfolio_manager

手順

1. プログラムフォームを開きます。
2. 関連リンクで、[プログラム予算 **(Program Budget)]** をクリックします。
   [プログラム予算 **(Program Budget)]** ダイアログボックスが開きます。
3. プログラムの予算を設定する年を選択します。
4. [投資予算] および [経費予算] の金額を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[予算合計] は、投資と経費の合計金額で更新されます。

5. [**OK**] をクリックします。

タスクの結果

選択した年のプログラム予算が、[プログラム予算] 関連リストに表示されます。リストで金額をクリックすると修正できます。

プログラムステータスレポートの作成

プログラムステータスレポートを定期的に作成して、プログラム内のプロジェクトのステータスロールアップを表示します。ステータスレポートを作成すると、プログラムのさまざまな要素のステータスが、すべてのプロジェクトのプロジェクトステータスレポートからロールアップされます。

始める前に

ステータスレポートに含めるすべてのプロジェクトについて、プロジェクトフォームの [プログラムステータスレポートに表示] オプションが選択されていることを確認します。

必要なロール：it_program_manager

手順

1. 移動先 プロジェクト管理 > プログラム > すべて.
2. プログラムリストで、プログラムレコードを開きます。
3. [プログラムステータスレポート] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。

注:

プログラムステータスレポートフォームの任意の要素のステータスを変更すると、プログラムフォームの対応するフィールドも更新されます。

プログラムステータスレポートフォーム

フィールド	説明
プログラム	プログラムの名前。
ステータス報告日	ステータスレポートを生成する期限の日付。 デフォルト値は現在の日付です。
番号	設定可能なプリフィックス付きの、ステータスレポートのシステム生成 ID 番号。

プログラムフォームからロールアップされた読み取り専用フィールド

フィールド	説明
状況	[処理待ち]、[オープン]、[対応中] など、プログラムの現在のステータス。
完了率 (%)	プログラムが完了したパーセンテージ。
開始予定日	プログラムの開始予定日。
終了予定日	プログラムの終了予定日。
開始実績日時	プログラムの実開始日。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
終了実績日時	プログラムの実終了日。
計画コスト	プログラムのコスト概算。
実績コスト	プログラムの実際のコスト。

プログラムステータスレポートフォームの [全体的なステータス] セクション

フィールド	説明
総合健全性	プログラムの総合健全性は、プログラム内の各プロジェクトの最新のステータスレポートからロールアップされます。ステータスは、デフォルトで赤色、緑色、および黄色を使用して示されます。
エグゼクティブ サマリー	プログラムの簡単な要約と分析。
コメント	全体的なステータスに関するコメント。
先週の達成度	前週に完了した主要なタスクまたはプログラムの重要な進捗の説明。
予定されている主要アクティビティ	プログラムで次に予定されているアクティビティ。

プログラムステータスレポートフォームの [スケジュール] セクション

フィールド	説明
スケジュール	プログラムのスケジュールのステータスは、プログラム内の各プロジェクトの最新のプロジェクトステータスレポートからロールアップされます。ステータスは、デフォルトで赤色、緑色、および黄色を使用して示されます。
スケジュールについてのコメント	プログラムのスケジュールに関する情報。

プログラムステータスレポートフォームの [コスト] セクション

フィールド	説明
コスト	プログラムコストのステータスは、プログラム内の各プロジェクトの最新のプロジェクトステータスレポートからロールアップされます。ステータスは、デフォルトで赤色、緑色、および黄色を使用して示されます。
コストについてのコメント	プログラムのコストに関する情報。

プログラムステータスレポートフォームの [リソース] セクション

フィールド	説明
リソース	リソースのステータスは、プログラム内の各プロジェクトの最新のプロジェクトステータスレポートからロールアップされます。ステータスは、デフォルトで赤色、緑色、および黄色を使用して示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
リソースについてのコメント	プログラムのリソースに関する追加情報。

プログラムステータスレポートフォームの [スコープ] セクション

フィールド	説明
スコープ	プログラムのスコープのステータスは、プログラム内の各プロジェクトの最新のプロジェクトステータスレポートからロールアップされます。ステータスは、デフォルトで赤色、緑色、および黄色を使用して示されます。
スコープについてのコメント	プログラムのスコープに関する情報。

5. オプション: プログラムのさまざまな要素のロールアップされた色を上書きするには、別のステータス色を選択します。または、プログラムステータスレポートに要素のステータスを表示しない場合は、[なし] を選択します。

   (Optional) [なし] を選択すると、プログラムステータスレポートでそのプログラム要素に灰色の X アイコン ( ) が表示されます。

   設定した上書きの色は、あるレポートから次のレポートに保持されません。次のプログラムステータスレポートが生成されると、関連するプロジェクトの色が使用されます。

6. [送信] をクリックします。
7. オプション: プログラムステータスレポートを印刷するには、[ステータスレポート] タブのヘッダーにある印刷アイコン ( ) をクリックします。

プログラムステータスレポートの表示

プログラムステータスレポートでは、いくつかのカテゴリにおけるプログラム内のすべてのプロジェクトの最新の進捗状況を一目で確認できます。

始める前に

必要なロール：it_program_manager

このタスクについて

[プログラムステータスレポート] 関連リストを使用して、プログラムに対して作成されたプログラムステータスレポートを表示します。レポートがリストされていない場合は、プログラムステータスレポートを作成します。

手順

1. 移動先 プロジェクト管理 > プログラム > すべて.
2. プログラムリストで、プログラムレコードを開きます。
3. [ステータスレポート] 関連リンクをクリックします。
4. ページの左上隅からステータスレポートを選択して、その内容を表示します。
5. レポートでプログラムのステータスを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プログラムステータスレポート

セクション	説明
概要	プログラムに関する一般的な概要情報を提供します。 ○ プログラム名：プログラムの名前。 ○ プログラムマネージャー：プログラムマネージャー。 ○ ポートフォリオ：プログラムが属するポートフォリオ。 ○ 事業部門：プログラムが属する事業部門。 ○ 投資タイプ：プログラムの投資タイプ。 ○ 影響を受ける **BU**：このプログラムが影響する組織の事業部門。 ○ ステータス：プログラムの現在のステータス。 ○ フェーズ：プログラムの現在のフェーズ ([開始中]、[計画中]、および [実行中] など)。 ○ 完了率 **(%)**：プログラムが完了したパーセンテージ。 ○ 開始予定日：プログラムの開始予定日。 ○ 終了予定日: プログラムの終了予定日。 ○ 計画コスト：プログラムのコスト概算。 ○ 開始実績日時：プログラムの実開始日。 ○ 終了実績日時：プログラムの実終了日。 ○ 実績コスト：プログラムの実際のコスト。 この情報は、プログラムフォームからロールアップされます。
サマリー	プロジェクトのプログラムマネージャーによって入力された最新のステータスに基づく、プログラムの総合健全性に関する情報。 ○ エグゼクティブ サマリー：プログラムの簡単な要約と分析。 ○ 先週の達成度：プログラムの前週の進捗状況。 ○ 予定されている主要アクティビティ：プログラムで次に予定されているアクティビティ。
現在のステータス	プログラム内のすべてのプロジェクトの最新のプロジェクトステータスレポートからロールアップされた、総合健全性、スケジュール、コスト、リソース、およびスコープに関連するプログラムのステータス。 これらのプロジェクトごとに複数のプロジェクトステータスレポートがある場合は、各プロジェクトの最新のプロジェクトステータスレポートの値が集計され、プログラムステータスにロールアップされます。詳細については、「プログラムステータスレポートフォーム」を参照してください。 異なる色で上記の要素のステータスを示します。最終ステータスのロールアップされた色は、デフォルトでは赤色、黄色、緑色の順です。赤色、黄色、および緑色のプロジェクトがある場合、プログラムのステータスは赤色になります。黄色および緑色のみのプロジェクトがある場合、プログラムのステータスは黄色になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セクション	説明
	次の画像は、プロジェクトからロールアップされたプログラムステータスのカラーコードを示しています。  **注:** プログラムの要素に灰色の X アイコン ( ) がある場合は、プログラムマネージャーがその要素をステータスレポートから除外したことを意味します。
プロジェクト KPI	プログラム内の各プロジェクトの総合健全性、スケジュール、コスト、リソース、およびスコープの重要業績評価指標のステータス。プロジェクトフォームの [プログラムステータスレポートに表示] オプションが選択されているプロジェクトのみがリストされます。 これらの KPI の値はロールアップされ、プログラムステータスレポートの [現在のステータス] セクションに表示されます。 **注:** プロジェクト KPI の横にある灰色の X アイコン ( ) は、プログラムマネージャーがその要素をステータスレポートから除外したことを意味します。

6. オプション: 印刷されたレポートのコピーが必要な場合は、[ステータスレポート] タブのヘッダーにある印刷アイコン ( ) をクリックします。

プログラムワークベンチ

プログラムワークベンチは、プログラム、およびプログラムの一部であるプロジェクトとデマンドの詳細を表示するための中心的な場所です。

プログラムマネージャーロールは、プログラムワークベンチを使用して、プログラム、およびプロジェクトとデマンドの進捗状況を表示および監視できます。プログラムワークベンチは、プログラムを追跡するための情報のみを提供します。

デマンドとプロジェクトの進捗状況を追跡し、プログラムに対して選択した会計期間のコスト、リソース、スケジュール、およびスコープのステータスを監視できます。

注:

- プログラムワークベンチはサービスポータルに基づいています。つまり、要件および組織のワークフローに応じてワークベンチを構成、カスタマイズ、および拡張できます。詳細については、サービスポータルI のドキュメントを参照してください。
- プログラムワークベンチでは、モバイルデバイスをサポートしていません。

プログラムワークベンチは、次のコンポーネントで構成されています。

会計期間：右上にある選択リストで、プログラムを監視する会計年度を選択します。

タイムラインビュー：プログラムの一部である選択したすべてのデマンドとプロジェクトのリスト、および経時的なすべてのプロジェクトとデマンドのガントチャートを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

以下のことを行うことができます。

- [ダッシュボード構成] 設定を使用して、ガントチャートのプログラムアイテムの色を設定します。
- ガントチャートカレンダーのズームレベルに [自動調整] を選択します。ガントビューは、スクロールバーを使用せずにタイムライン全体を一度に表示できるように 1 ページに収まります。
- プログラム内のプロジェクト間の外部依存関係を確認します。外部依存関係の確認の詳細については、「ポートフォリオ内のプロジェクト間の外部依存関係の確認」を参照してください。
- 表示/非表示アイコン (⚙) をクリックして、列を表示または非表示にします。

注:

- デマンドは、[開始予定日] および [期日] フィールドが設定されており、デマンドが認定済みまたは承認済みステータスの場合にのみタイムラインビューに含まれます。
- アドミンは、タイムラインビューで列を表示/非表示アイコン (⚙) がクリックされたときに列フィルターリストに表示される列をカスタマイズできます。

プロジェクト **KPI**：このタブには、プログラム内のすべてのプロジェクトの総合健全性、スケジュール、コスト、リソース、スコープなどの、プロジェクト KPI の最新ステータスが表示されます。この情報は、プロジェクトに対して作成された最新のステータスレポートから入力されます。

以下のことを行うことができます。

- タブでプロジェクトの名前をクリックして、プロジェクトに対して作成された最新のステータスレポートを開きます。
- プロジェクト KPI のステータスインジケーターをポイントして、そのプロジェクトの KPI に入力されたコメントを表示します。

コスト (計画 対実績)：このチャートには、プログラム内のすべてのプロジェクトの実際のコストと承認済み予算の比較が表示されます。プロジェクトの実績コストは、経費ラインから導出されます。

注:
特定の経費が発生した場合、プロジェクトの経費ラインを手動で作成できます。たとえば、プロジェクト用にハードウェアを調達した場合、ハードウェアの調達に費やした金額の経費ラインを作成できます。ServiceNow 調達 を使用してアイテムを受け取ると、経費ラインが自動的に作成されます。リソース時間については、プロジェクトのタイムカードが承認されると、経費ラインが自動的に作成されます。

チャートの表示設定を変更するには、選択リストから次のいずれかを選択します。


- 投資：投資コストのみに関するコストチャートを表示します。
- 経費：経費のみに関するコストチャートを表示します。
- すべて：投資コストと経費の両方に関するコストチャートを表示します。

リソース (配分 対実績)：このチャートには、すべてのプロジェクトタスクに費やされた実際のリソース時間と、プログラム内のプロジェクトおよびデマンドを実行するために割り当てられたリソース時間の比較が表示されます。実際に費やされた時間は、プロジェクトの処理済みタイムカードから取得されます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プログラムワークベンチの例 1

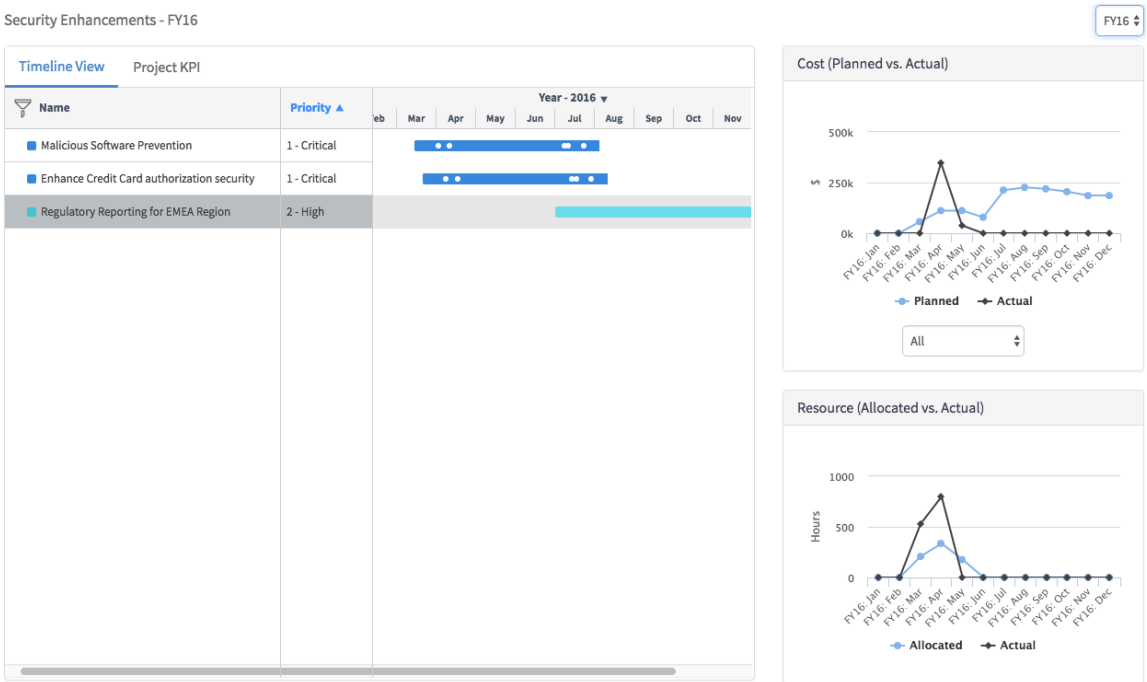

プログラムワークベンチの例 2

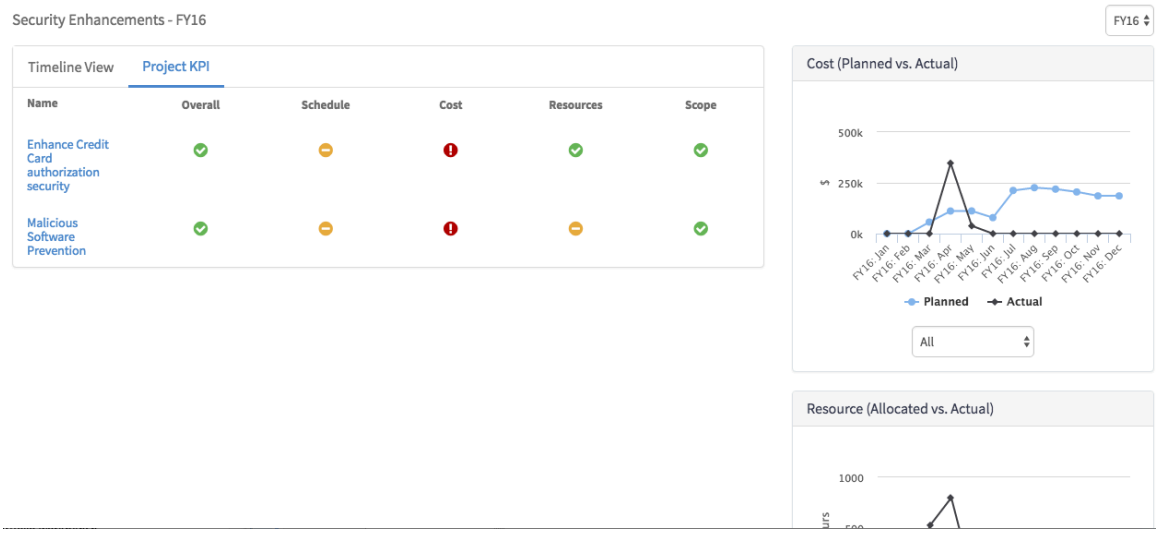

プログラムワークベンチへのアクセス

プログラムワークベンチにアクセスすると、すべてのプログラムのリストが表示されます。

始める前に

必要なロール：it_program_manager

このタスクについて

プログラムワークベンチには、次のいずれかの方法でアクセスできます。


手順

1. プログラムフォームで [プログラムワークベンチ] 関連リンクをクリックします。
2. 移動先 プロジェクト管理 > プログラム > ワークベンチ をクリックし、構成アイコン( )をクリックして、プロジェクト、タスク、プログラムなどの色を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークベンチではこれらの色を使用して、プログラムのアイテムをタイムラインビューのガントチャートに表示します。

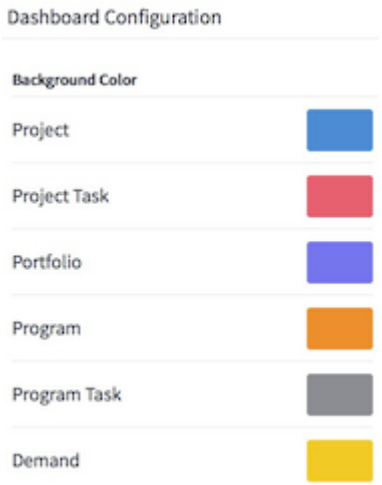

3. 開くプログラムをクリックします。
ワークベンチに表示されるプログラムは、プログラムワークベンチをどのように起動したかによって異なります。

   - すべてのプログラムは、ワークベンチでナビゲーションメニューオプションを使用して利用できます。
   - プログラムフォームを使用して表示されるのは、関連付けられたプログラムのみです。

プログラムダッシュボード

PMO ダッシュボードは、プログラムマネージャーがさまざまなグラフィカルレポートを生成するための中心的な場所を提供します。

Madrid リリース以降、プログラムマネージャーダッシュボードは廃止され、PMO ダッシュボードに置き換えられました。PMO ダッシュボードを使用して、プログラムに関するインサイトを取得できます。詳細については、「PMO ダッシュボード」を参照してください。

プログラムダッシュボードへのアクセス

プログラムのさまざまなグラフィカルレポートを PMO ダッシュボードに表示します。

始める前に
必要なロール：it_program_manager

手順

移動先 プロジェクト > プログラム > プログラムダッシュボード.
PMO ダッシュボードが表示されます。

レートモデル

レートモデルを使用して、プロジェクトまたはデマンドの計画および実際のリソースコストを計算するための、日付有効で基準に基づく時給を導出します。

ユーザー属性のみに基づく賃金レートとは異なり、レートモデルでは最大 10 の属性に基づいて時給を導出できます。これらの属性は、プロジェクト、デマンド、ユーザー、ロールなどの事前定義されたエンティティから選択できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レートライン

レートモデルは、複数のレートラインの集合です。レートラインは、特定の日付範囲のリソース、グループ、またはロールの時給を定義するさまざまな基準値の一意の組み合わせです。同じ基準のセットに対して、異なる日付範囲に対して異なるレートで複数のレートラインを作成することができます。ただし 日付は重複しません。

レートモデルの処理


プロジェクトまたはデマンドのリソース計画とタイムカードのレートモデルから時給を導出するには、レートモデルをプロジェクトまたはデマンドに関連付けます。

> **注:**
> レートモデルのないプロジェクトまたはデマンドは、レートタイプに関連付けられた賃金レートカードを使用してタイムカードのレートを検索します。

プロジェクトまたはデマンドに関連付けられたレートモデルは、レートラインを評価して、要求された基準に一致する時給を見つけて返します。レートは、リソースの計画または割り当て時、およびタイムカード処理時にレートモデルから導出されます。

レートは、一致するレートラインで指定された機能通貨で返されます。

レートモデル処理フロー図

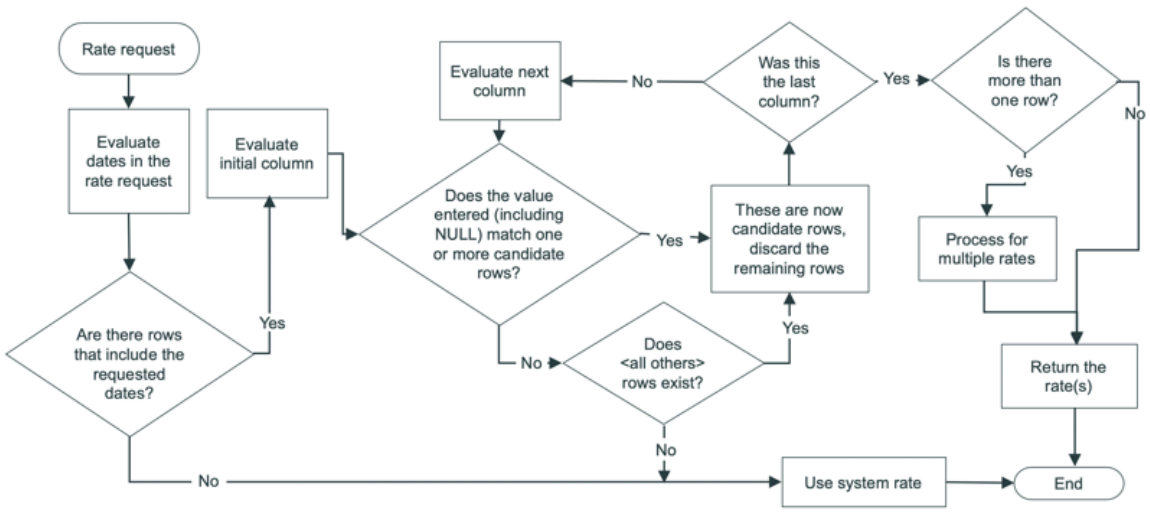

次のビデオでは、要求の時給を見つけて返すレートモデルと評価方法を設定する方法について説明しています。 レートモデルの操作方法を説明するビデオ

レートが要求されると、レートモデルは次のプロセスを使用します。

1. 要求された日付範囲内のレートラインを検索し、残りのレートラインを破棄します。
2. 識別されたレートラインを評価して、最初の基準列で要求された値に一致する値を見つけ、残りのレートラインを破棄します。

   要求された値が空の場合、NULL を含むレートラインをチェックします。

   完全に一致するものが見つからない場合は、値が [その他すべて (*)] であるレートラインをチェックします。

   すべての基準列が処理されるまで、他の基準列の評価が優先度順に繰り返されます。
3. 1 つ以上のレートラインが要求に一致した場合にレートを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 単一のレートラインが見つかった場合は、対応するレートが返されます。
- 複数のレートラインが見つかった場合、システムは各レートに適用される要求の時間数を決定します。
- たとえば、要求されたレートが 7 月 1 日から 7 月 30 日までのリソース割り当てであるとします。レートモデルには、7 月 1 日から 7 月 15 日までのレートが 1 つあり、同じ基準セットに対して 7 月 16 日から 7 月 30 日まではレートが異なります。レートモデルは、7 月 1 ～ 15 日の要求された時間に最初のレートを適用し、7 月 16 ～ 30 日の要求された時間に 2 番目のレートを適用します。

要求に一致するレートラインがない場合、要求はデフォルトのレートカードを使用します。

レートモデルの作成または変更

プロジェクトまたはデマンドにリンクできるレートモデルを作成または変更して、リソースの予定コストと実績を決定します。レートモデルは、これらの投資に対して、日付有効で基準に基づく時給を提供します。

始める前に

レートモデルを作成する前に：

- 時給を導出するためのレートモデルの基準を定義する属性を選択します。
- 必要な期間における非機能通貨の予算参照レートを定義します。

必要なロール：pps_admin または it_rate_model_admin

手順

1. レートモデルを作成します。
2. フォームのフィールドに入力します。

[レートモデル] フォーム

フィールド	説明
名前	レートモデルの一意の名前。
有効	レートモデルのステータスを示すオプション。 プロジェクトまたはデマンドに割り当てることができるのは、アクティブなレートモデルのみです。
デフォルト	レートモデルをデフォルトとして設定するためのオプション。 デフォルトとして設定できるレートモデルは 1 つだけです。 デフォルトのレートモデルは、新しいプロジェクトとデマンドに自動的に関連付けられます。
レートモデルコンテキスト	レートモデルに設定されたコンテキスト。 読み取り専用システムフィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
通貨	レートモデルのレートラインのデフォルト通貨。
レートタイプ	レートモデルのレートラインでレートタイプ属性を有効にするためのオプション。 選択すると、[レートタイプ] が他の定義済み属性とともに属性の 1 つとして追加されます。詳細については、「賃金レードカードのレートタイプ」を参照してください。
説明	レートモデルの簡単な説明。

3. [送信] をクリックします。

次のタスク
事前定義されたエンティティのセットから属性を追加して、リソースコストを導出するためのレートモデルの基準を定義します。

レートモデルの基準の定義

事前定義されたエンティティのセットから属性を追加してレートモデルの基準を設定し、基準に基づいてリソース時給を導出します。

始める前に
必要なロール：pps_admin または it_rate_model_admin

このタスクについて
レートモデルは、1 つ以上のレートラインで構成されます。各ラインには、基準値とリソースの時給の一意の組み合わせが含まれています。基準を定義するには、次のエンティティから最大 10 個の属性を追加します。

- プロジェクト
- プロジェクトタスク
- デマンド
- ユーザー
- グループ
- ロール
- リソースプラン

タイプが [文字列]、[参照]、[数値]、[ブール]、および [選択肢] の属性を選択できます。

手順

1. 次のアクションのいずれかを実行して、レートモデルを開きます 。
   - 移動先 プロジェクト管理 > レートモデル > すべて.
   - 移動先 タイムシート > レートモデル > すべて.
2. [レートモデル属性] 関連リストで [新規] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[レートモデル属性] フォーム

フィールド	説明
エンティティ	基準を定義するために属性が使用されるエンティティ。
属性	基準を定義する、選択したエンティティの属性のリスト。
優先度	時給を導出するためにレートモデルの属性が評価される順序を決定する一意の番号。 優先度が最も低い属性が最初に評価されます。 **注:** 2 つの属性に同じ優先度を設定することはできません。
名前	属性を識別するための分かりやすい名前。 入力されるデフォルトの名前は、選択したエンティティと属性に基づいています。たとえば、[エンティティ] フィールドで [リソース]、[属性] フィールドで [場所] を選択した場合、デフォルト名は [リソース/場所] です。

4. [送信] をクリックします。

次のタスク
リソースの時給を定義するレートラインを作成します。

レートラインの作成

レートモデルで、特定の日付範囲の一連の基準に基づいて時給を定義するレートラインを作成します。

始める前に
必要なロール：pps_admin または it_rate_model_admin

このタスクについて
レートラインを作成または更新する前に、次の点に注意してください。

- 同じ基準値のセットを持つレートラインの日付を重複させることはできません。
- 基準フィールドは空にすることができます。
- フォームのすべての基準フィールドの値は [その他すべて (*)] であり、選択した場合、その基準に完全に一致するものがない場合は、レートモデルによってこの値が検討されます。
- レートラインで機能しない (デフォルト以外の) 通貨を使用するには、対応する予算参照レートが使用可能であることを確認してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 次のアクションのいずれかを実行して、レートモデルを開きます 。
   - 移動先 プロジェクト管理 > レートモデル > すべて.
   - 移動先 タイムシート > レートモデル > すべて.
2. [レートモデル] フォームで、[レートラインを表示] 関連リンクをクリックします。
3. [レートライン] フォームで、[新規] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。

[レートライン] フォーム

フィールド	説明
レートモデル	レートラインが属するレートモデル。
開始日	レートが適用される期間の開始日。
終了日	レートが適用される期間の終了日。
基準フィールド	基準を定義するために追加されたレートモデル属性に対応するフィールド。フィールドの数は異なる場合があります。 たとえば、グループと場所をレートモデル属性として追加した場合、それらの値を指定できるフォームのフィールドとして使用できます。
レート	レートラインの適用レートと通貨。 デフォルトでは、レートラインが属するレートモデルの通貨が通貨として選択されます。レートモデル通貨とは異なるレート通貨を選択できます。同じ基準値と通貨のセットを持つレートラインには、重複する日付があってはなりません。 プロジェクトまたはデマンドマネージャーは、PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインをインストールし、リソース計画のプロジェクト通貨ビューまたはデマンド通貨ビューを有効にすることで、対応するプロジェクトまたはデマンド通貨でプロジェクトまたはデマンドのリソースコストを追跡できます。詳細については、「リソース計画の作成」トピックを参照してください。
レートタイプ	レートラインに適用される賃金レートタイプ。 [レートモデル] フォームの [レートタイプ] チェックボックスが選択されている場合、このフィールドが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
機能通貨のレート	ファイナンシャルマネジメントアプリケーションで設定されたデフォルト通貨でのレート。このフィールドは編集できません。

5. [送信] をクリックします。

タスクの結果
定義された属性に基づいてリソースの時給を表すレートラインが作成されます。

レートラインのファイルへのエクスポート

レートラインを Microsoft Excel または CSV ファイルにエクスポートして、新しいレートラインをすばやく更新または追加し、レートモデルにインポートし直します。

始める前に
レートラインをエクスポートする前に、属性を追加してレートモデルの基準を定義します。ダウンロードされたエクスポートファイルには、選択した属性に対応する列と次のデフォルト列が含まれています。

必要なロール：pps_admin または it_rate_model_admin。

このタスクについて
レートラインを一度に 1 つ作成する だけでなく、レートラインのエクスポートおよびインポート機能を使用して、レートモデルに複数のレートラインを追加することもできます。

- レートモデル
- 番号
- 開始日
- 終了日
- 通貨
- レート
- レートタイプ

> **注:**
> [レートタイプ] 列は、レートモデルの [レートタイプ] チェックボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。

基準列の数は、レートモデルに追加された属性の数によって異なります。

手順
1. 次のアクションのいずれかを実行して、レートモデルを開きます 。
   - 移動先 プロジェクト管理 > レートモデル > すべて.
   - 移動先 タイムシート > レートモデル > すべて.
2. [レートモデル] フォームで、[レートラインを表示] 関連リンクをクリックします。
3. [その他のアクション] アイコン ( ) をクリックし、**[CSV** にエクスポート] オプションを選択します。
   エクスポートファイルを保存するか開くかを尋ねるダイアログボックスが表示される場合があります。デフォルトでは、ファイルの名前はレートモデルと同じです。ただし、別のファイル名を指定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

することはできます。CSV ファイルまたは Microsoft Excel (.XLSX) ファイルとしてファイルを保存します。

> **注:**
> ブラウザの設定によっては、ブラウザがファイルをダウンロードフォルダに自動的に保存する場合があります。

4. 希望するアプリケーションを使用して、ダウンロードしたファイルを開きます。
   新しいレートラインを入力するか、既存のレートラインを更新して、ファイルを CSV ファイルまたは Microsoft Excel (.XLSX) ファイルとして保存します。

タスクの結果
レートモデルのすべてのレートラインがファイルにエクスポートされます。レートモデルにレートラインがない場合、ファイルは最初の行の列名のみを含む空のテンプレートになります。

次のタスク
ファイルからレートモデルにレートラインをインポートします。

レートラインのレートモデルへのインポート

レートラインのインポート機能を使用して、エクスポートファイルからレートモデルに複数のレートラインをすばやく追加します。

始める前に
`glide.import_set_row.dynamically_add_fields` システムプロパティを true に設定します。

必要なロール：pps_admin または it_rate_model_admin

このタスクについて
エクスポート機能を使用して作成されたファイルでレートラインを追加または更新した後、ファイルからレートモデルにレートラインをインポートできます。

> **注:**
> 次の状況では、レートラインをインポートできません。
>
> - 同じ基準値セットの有効日が重複している場合。
> - システムに一致するデータがない基準値の場合。たとえば、レートラインに [ロール] 基準としてビジネスアナリストが含まれていても、そのロールがシステムに存在しない場合があります。
> - 機能しない (デフォルト以外の) 通貨でのレートであり、必要な期間に対応する予算参照レートがシステムに存在しない場合。

手順
1. 次のいずれかの方法で、インポートファイルからレートモデルにレートラインをインポートします。
   - 移動先 プロジェクト管理 > レートモデル > レート行をインポート.
   - 移動先 タイムシート > レートモデル > レート行をインポート.
   - 移動先 タイムシート > レートモデル > すべてでレートモデルレコードを開き、[レートラインをインポート] 関連リンクをクリックします。
2. [ファイルを選択] をクリックして、インポートファイルを選択します。
3. オプション: 複数のシートを含む Excel ファイルからインポートする場合は、インポートするデータを含むシート番号を [シート番号] フィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
CSV ファイルからインポートする場合、最後に保存された CSV ファイルのデータは、指定されたシート番号に関係なくインポート対象と見なされます。

4. オプション: インポートファイルにヘッダー行がある場合は、ヘッダー情報を含む行番号を [ヘッダー行] フィールドに入力します。
5. [送信] をクリックします。
6. [変換を実行] をクリックしてデータをインポートします。
詳細については、「インポートを実行」を参照してください。

タスクの結果

- 新しいレートラインがレートモデルのレートラインリストに追加されます。
- レートモデルの既存のレートラインは、最新の値で更新されます。

タイムカード管理

タイムカード管理機能を使用すると、タスクの割当先などのタイムカードユーザーは、割り当てられたタスクの時間を報告および追跡できます。

https://player.vimeo.com/video/1107432259?h=08347ba78f&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

時間追跡機能のセットアップ、時刻の入力、承認については、この 3 分間のビデオをご覧ください。

タイムカード管理は、タスクテーブルと連携して、プロジェクト、インシデント、問題、変更要求などのさまざまなタスクタイプで作業した時間を記録します。

タイムカード管理機能：

- タイムカードユーザーは、タイムカードとタイムシートを使用して、タスクの作業時間を記録できます。ユーザーは、タイムカードとタイムシートを承認のために送信できます。
- タイムカードとタイムカードは承認のために、ユーザータイムシートポリシーの [プロジェクト以外の時間承認者] および [プロジェクト時間の承認者] フィールドに基づいてルーティングされます。タイムカード承認者ロールを持つユーザーマネージャーは、時間を記録し、リソースのタイムシートを送信することもできます。
- タイムカード承認者は、次のタスクを実行できます。
  - 送信されたタイムシートのタイムカードを確認し、承認または却下します。
  - 承認されたタイムシートまたはタイムカードを取り消して、修正のためにユーザーに返却します。
  - ダッシュボードを使用して、タイムカードとタイムシートの例外レポートを表示し、ユーザーによって報告された時間を分類します。
  - 時間がない場合や利用できない場合に、別のタイムカード承認者に委任して、リソースのタイムシートを処理することができます。委任の際には、次の点に注意してください。
    - 個々のリソースに対してのみ承認を委任することはできません。
    - 委任されたタイムカード承認者は、タイムシート承認をこれ以上委任することはできません。

  project_manager ロールと resource_manager ロールには、ベースシステムの timecard_approver ロールが含まれています。ただし、timecard_approver ロールは、これらのロールがなくても独立して使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タイムカードアドミンは、タイムシートポリシーを作成および管理できます。また、例外により承認または却下し、タイムシートを処理することもできます。タイムカードのステータスが [処理待ち] または [却下済み] の場合、タイムカードアドミンは任意のユーザーのタイムカードを作成または編集することもできます。

> **注:**
> [変更管理 - リスク アセスメント] プラグインが有効化されているときは、「 タイムカード 管理プラグイン はタイムカードの使用に必要です。一部の手順では、タイムカードを自動的に有効化するプロジェクト管理 (PM)機能が必要です。詳細については、プロジェクト管理(PM) (com.snc.financial_planning_pmo) を参照してください。

タイムカード管理におけるドメインセパレーション

ドメインセパレーションは、ドメイン固有のユーザーに対して完全なデータ分離を提供します。タイムカード管理は、データのみのレベルでドメインセパレーションに準拠しています。

タイムカード管理の有効化

アドミニストレーターは タイムカード Management プラグイン (com.snc.time_card) を有効化できます。プラグインは、パフォーマンスアナリティクス - Content Pack - Project Portfolio Suite Dashboards プラグイン (com.snc.pps_dashboards) を有効化できます。ただし、ダッシュボードを使用するには パフォーマンスアナリティクス ライセンスが必要です。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

> **注:**
> タイムカード Management プラグインは、PPM 標準プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) の一部としても有効になります。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   > **注:**
   > ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

タイムシートポリシー

タイムシートポリシーには、タイムシートまたはタイムカードで遵守する必要があるポリシーが含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトでは、デフォルトのタイムシートポリシーがシステムで利用可能です。タイムカードアドミンは、組織内のさまざまな要件とワークフローに基づいて、複数のタイムシートポリシーを作成できます。たとえば、各部門またはチームのタイムシートポリシーを指定し、適切なユーザーを割り当てます。

タイムシートポリシーでは、プロジェクトおよび非プロジェクトタスクに適切な承認ワークフローを指定することもできます。

タイムシートポリシーは、デフォルトポリシーとして設定できます。デフォルトのポリシーは、タイムシートポリシーにアサインされていない他のすべてのユーザーに適用される、グローバルタイムシートポリシーです。1 つのタイムシートポリシーのみをデフォルトポリシーとして設定できます。

移動先 タイムシート > アドミニストレーション > タイムシートポリシー タイムシートポリシーのリストを表示します。

タイムシートポリシーの作成

タイムカードアドミニストレーターは、タイムシートポリシーを作成して、タイムカードユーザーが作業時間を記録するための要件を定義できます。タイムカード承認者は、該当するタイムシートポリシーに基づいてタイムシートを確認し、処理する必要があります。

始める前に
必要なロール：timecard_admin

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > アドミニストレーション > タイムシートポリシー.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

タイムシートポリシーのフォーム

フィールド	説明
名前	一意のポリシー名。
空のタイムカードを許可する	承認のために空のタイムカードを送信できるようにするオプション。 デフォルトでは、このオプションが選択されていません。
予定されているタスク更新時にタイムカードを自動作成する	次の条件が満たされている場合に、予定されているタスクの更新時にタイムカードを自動的に作成するオプション。 ○ あなたがタイムカードユーザーであること。 ○ [アサイン先] または [追加のアサイン先リスト] フィールドからタスクにアサインされていること。 ○ タスクの状況が処理待ちでないこと。 デフォルトでは、このオプションが選択されていません。
作業時間の入力によりタイムカードを自動入力する	タスクフォームの [作業時間] フィールドに時間を入力すると、タイムカードを自動的に入力するオプション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	タスクのタイムカードが存在しない場合、次の条件が満たされていれば、作業時間が更新されたときにタイムカードが作成されます。 ○ あなたがタイムカードユーザーであること。 ○ [アサイン先] または [追加のアサイン先リスト] フィールドからタスクにアサインされていること。 デフォルトでは、このオプションが選択されていません。
タイムカードを毎週自動作成する	タイムシートポリシーに割り当てられたすべてのユーザーのスケジュール済みジョブを通じて、毎週自動的にタイムカードを生成するオプション。タイムカードは、ユーザーの計画されたタスク割り当てとハード割り当てされたリソース計画に基づいて生成されます。 デフォルトでは、このオプションが選択されています。
リソース計画/レポートの実績時間とコストを更新	承認済みタイムカードに入力された時間に基づいて、関連するリソース計画の実績時間と実績コストを更新するオプション。 選択すると、以下の方法で、選択したタスクに関連するリソース計画をタイムカードに関連付けることができます。 ○ タスクに複数のリソース計画がある場合、適切な計画を選択できます。 ○ タスクにリソース計画が 1 つある場合、そのプランがデフォルトで選択されます。 タイムカードエントリからの時間と時間単位のリソースレートは、関連するリソース計画の [実績時間] と [実績コスト] の値を更新するために使用されます。 **注:** タスクにリソース計画がない場合、関連するレコードは対応するプロジェクトを更新します。 デフォルトでは、このオプションが選択されていません。
取り消しを許可	タイムシートまたはタイムカードが承認および処理された後に取り消しアクションを有効にするオプション。 デフォルトでは、このオプションが選択されています。
許可された取り消し期間 (日数)	タイムシートまたはタイムカードを取り消すことができる日数。 このフィールドは、[取り消しを許可] オプションを選択すると表示されます。 デフォルト値は 30 です。
週の開始日	タイムシートの開始曜日。 デフォルト値は日曜です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: このフィールドを使用したタイムシートのフィルタリングの詳細については、Now Support ナレッジベース の KB0852458 の記事を参照してください。
1 日あたりの最大時間数	タイムシートに毎日入力できる最大時間数。 デフォルト値は 24 です。 このフィールドを -1 に設定すると、リソースは次のように入力できます。 ○ 毎日の作業時間としての 0 から 24 までの値 ○ 以前に入力したタイムカードを修正するための負の値。
週あたりの最大時間数	タイムシートで 1 週間に許容される最大時間数。 タイムシートの 1 週間の合計時間の値は、その週の 1 日あたりに入力された時間の合計です。-1 に設定されている場合、許容される 1 週間あたりの合計時間は最大 168 (24 x 7) 時間です。 デフォルト値は 40 です。
プロジェクト以外の時間の承認者	プロジェクト以外のタスクがアサインされているタイムカードを送信するときに必要な承認のタイプ。 ○ 自動：タイムカードは送信時に自動承認されます。 ○ ユーザーマネージャー：タイムカードは、送信時に承認のためにユーザーマネージャーにルーティングされます。 ユーザーマネージャーはタイムカード承認者ロールを持ち、[ユーザー] フォームでタイムカードユーザーのマネージャーとしても選択されます。 ○ なし：timecard_admin ロールを持つユーザーは、送信時にタイムカードを承認できます。
プロジェクト時間の承認者	プロジェクトタスクがアサインされているタイムカードを送信するときに必要な承認のタイプ。 ○ 自動：タイムカードは送信時に自動承認されます。 ○ プロジェクトマネージャー：プロジェクトタスクのタイムカードは、送信時に承認のためにそれぞれのプロジェクトマネージャーにルーティングされます。プロジェクトマネージャーは、時間を送信する対象のタスクから選択されます。 ○ ユーザーマネージャー：タイムカードは、送信時に承認のためにユーザーマネージャーにルーティングされます。 ○ 両方：タイムカードは、送信時に承認のためにユーザーマネージャーおよびプロジェクトマネージャーの両方にルーティングされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	いずれかの承認者のみがタイムカードを承認した場合、タイムカードは[送信済み]ステータスのままになります。 ○ なし：time_card admin ロールを持つユーザーは、タイムカードを承認できます。 注: ○ プロジェクトマネージャーとユーザーマネージャーは、承認のためにルーティングされたタイムカードのみを表示できます。 ○ タイムカードがまだ承認されていない間にユーザーマネージャーまたはプロジェクトマネージャーが変更された場合、システムはタイムカードの承認者を自動的に更新します。 ○ プロジェクトマネージャーまたはユーザーマネージャーの名前がそれぞれのフォームに入力されていない場合は、time_card admin ロールを持つユーザーがタイムカードを承認できます。
複数のレートタイプを許可	経費ラインの生成時に使用するレートタイプをタイムカードに提供するオプション。 このオプションを選択すると、タイムカードフォームに [レートタイプ] フィールドが表示され、レートタイプを選択できるようになります。 詳細については、「賃金レートカードのレートタイプ」を参照してください。
デフォルトレートタイプ	タイムカードにデフォルトで使用されるレートタイプ。 [なし] を選択すると、[標準料金タイプ] オプションが使用されます。 このフィールドは、[複数のレートタイプを許可] チェックボックスが選択された場合に表示されます。
デフォルトポリシー	タイムシートポリシーをデフォルトとして設定するオプション。デフォルトのポリシーは、タイムシートポリシーにアサインされていない他のすべてのユーザーに適用される、グローバルタイムシートポリシーです。 デフォルトとして設定できるタイムシートポリシーは 1 つだけです。 デフォルトポリシーとして設定したタイムシートポリシーは削除できません。最初に、別のポリシーをデフォルトポリシーとして設定する必要があります。

4. [送信] をクリックします。

次のタスク

- 必要に応じて、タイムシートポリシーをデフォルトポリシーとして設定します。
- タイムシートポリシーをユーザーにアサインします。

タイムシートポリシーをデフォルトポリシーとして設定する

タイムカードアドミニストレーターは、タイムシートポリシーをデフォルトのポリシーとして設定できます。デフォルトのポリシーは、タイムシートポリシーにアサインされていない他のすべてのユーザーに適用される、グローバルタイムシートポリシーです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：timecard_admin

このタスクについて
1 つのタイムシートポリシーのみをデフォルトポリシーとして設定できます。

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > アドミニストレーション > タイムシートポリシー.
2. タイムシートポリシーレコードを開きます。
3. [デフォルトとして設定] 関連リンクをクリックします。

> **注:**
> 関連リンクは、デフォルトポリシーとしてまだ設定されていないタイムシートポリシーに対してのみ表示されます。

タスクの結果
[レコードフォーム] の [デフォルトポリシー] オプションは、現在のタイムシートポリシーがデフォルトポリシーとして設定されていることを示すために選択されています。以前のデフォルトのタイムシートポリシーの [デフォルトポリシー] オプションはクリアされます。

デフォルトのタイムシートポリシーは削除できません。現在のデフォルトポリシーを削除するには、最初に別のポリシーをデフォルトポリシーとしてマークする必要があります。

タイムシートポリシーをユーザーにアサインする

タイムカードアドミニストレーターは、タイムシートポリシーをユーザーに割り当てることができます。

始める前に
必要なロール：timecard_admin

このタスクについて
ユーザーに割り当てることができるタイムシートポリシーは 1 つだけです。

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > アドミニストレーション > タイムシートポリシー.
2. タイムシートポリシーレコードを開きます。
3. [ユーザー]関連リストで、[編集]をクリックします。
4. [メンバーの編集] フォームで、ユーザーを [ユーザーリスト] に移動します。
5. [保存] をクリックします。

タスクの結果
選択したユーザーが [ユーザー] 関連リストに表示されます。選択したユーザーにタイムシートポリシーが割り当てられます。

プロジェクト時間カテゴリの作成

タイムカードアドミニストレーターまたはプロジェクトマネージャーは、サブカテゴリを作成してプロジェクト内の特定のアクティビティを定義できます。タイムカードユーザーは、これらのプロジェクトサブカテゴリを使用して、プロジェクト内の特定のアクティビティの時間を報告できます。

始める前に
必要なロール：timecard_admin、it_project_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > アドミニストレーション > プロジェクト時間カテゴリ.
2. [**New**] をクリックします。
3. フィールドに入力します。

[プロジェクト時間カテゴリ] フォームのフィールド

フィールド	説明
名前	プロジェクト時間カテゴリの一意の名前。
説明	プロジェクトアクティビティのタイプの説明。

4. [送信] をクリックします。

レートタイプの作成

レートタイプは、レートタイプ機能を使用して作成できます。

始める前に
必要なロール：timecard_admin

このタスクについて
レートタイプ機能は、さまざまなタイプの作業を分類するために使用されます。たとえば、標準と残業などです。また、実行された作業の性質について下流のサードパーティ製品に指示することもできます。

たとえば、

- 日中に作業時間の延長があるユーザーは、標準時間を残業と区別する必要があります。
- タスクの実行に関連した作業タイプに基づいて、技術者に高いレートで給与が支払われることがあります。
- 装置の修理タスクは、最初の 1 時間と残りの時間を別々のレートで請求される場合があります。
- サービスコールは 4 時間続き、その間に専用の機器が 1 時間使用されます。企業は、追加請求から法務コンプライアンスや保証の追跡などの目的のために、特殊な機器の使用を把握する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > アドミニストレーション > レートタイプ.
2. [新規] をクリックし、フォームに入力します。
3. [送信] をクリックします。

タスクの結果

- レートタイプが [レートタイプ] リストに表示されます。
- レートタイプがアクティブな場合は、[賃金レートカード] フォーム、[作業時間] フォーム、[タイムカード] フォーム、およびタイムシートポータルの [レートタイプ] フィールドにも表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムシートポータル


タイムシートポータルでは、特定の週に割り当てられたすべてのタスクを 1 つのビューに分類して表示します。ポータルを使用すると、タスクに費やされた時間を毎日記録し、一回でタイムシートを送信できます。

タイムシートポータルは、タスクテーブルと連携して、プロジェクト、インシデント、問題、変更要求などのさまざまなタスクタイプに費やした時間を記録します。タスクに対して入力した時間、タスクカテゴリ、および 1 週間の日数の完全なブレークダウンが表示されます。これにより、次のことが可能になります。

- 割り当てられたプロジェクトまたはプロジェクトタスクのタイムカードを生成します。
- 前のタイムシートからタイムカードをコピーします。
- 割り当て済みのタスクリストに表示されていないタスクのタイムカードを検索して作成します。
- タイムカードのメモを編集、削除、または追加します。
- タイムシートを送信、承認、却下、取り消します。
- 送信済み、却下済み、取り消し済みのタイムシートまたはタイムカードの通知を表示します。

タイムシートポータルは、次のセクションで構成されています。

ヘッダー




タイムシートポータルのヘッダー：

- 選択した週のタイムシートの日付範囲を表示し、前週または翌週のタイムシートに移動するオプションを提供します。
- 日付範囲とカレンダーを提供します。カレンダーの日付をクリックすると、選択した日付の週のタイムシートが表示されます。
- 別のタイムシートを表示しているときに、現在の週のタイムシートに移動するためのリンクを提供します。
- [自分のタイムシート] の下に、リソースのタイムシートを開いて編集できるオプションがあります。このオプションは、ユーザーマネージャーのみが使用できます。
- タイムシートフォームビューアイコン ( ) を使用して、フォームビューでタイムシートを表示するオプションを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


- 送信済み、却下済み、または取り消し済みのタイムシートの通知を、通知を表示アイコン ( ) の下に表示します。各エントリには、タイムカードの数とステータスが表示されます。通知アイテムをクリックして、タイムシートを開きます。

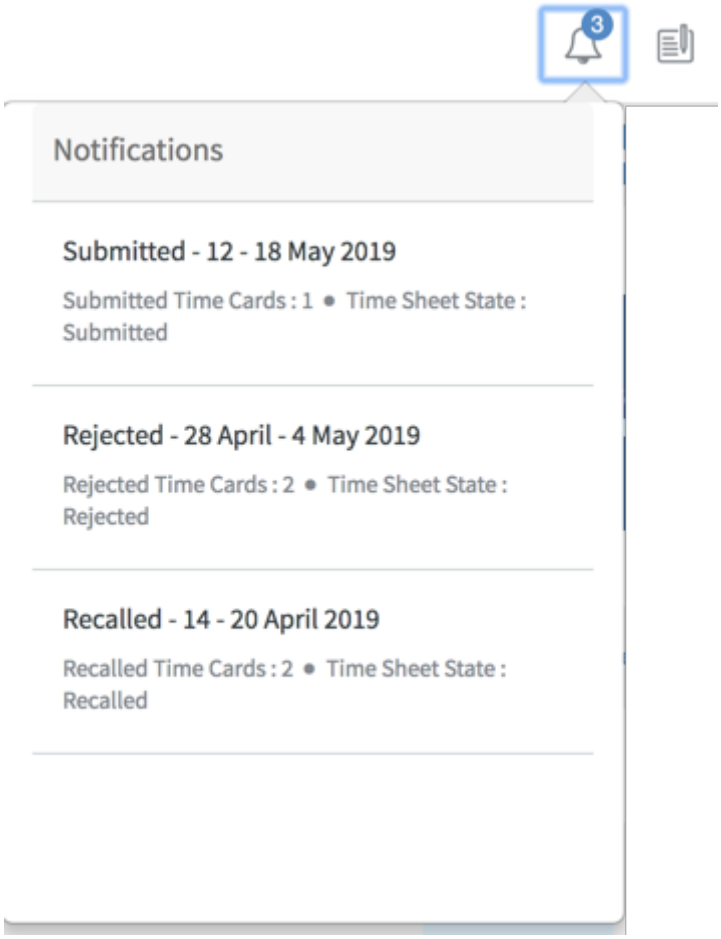

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスク

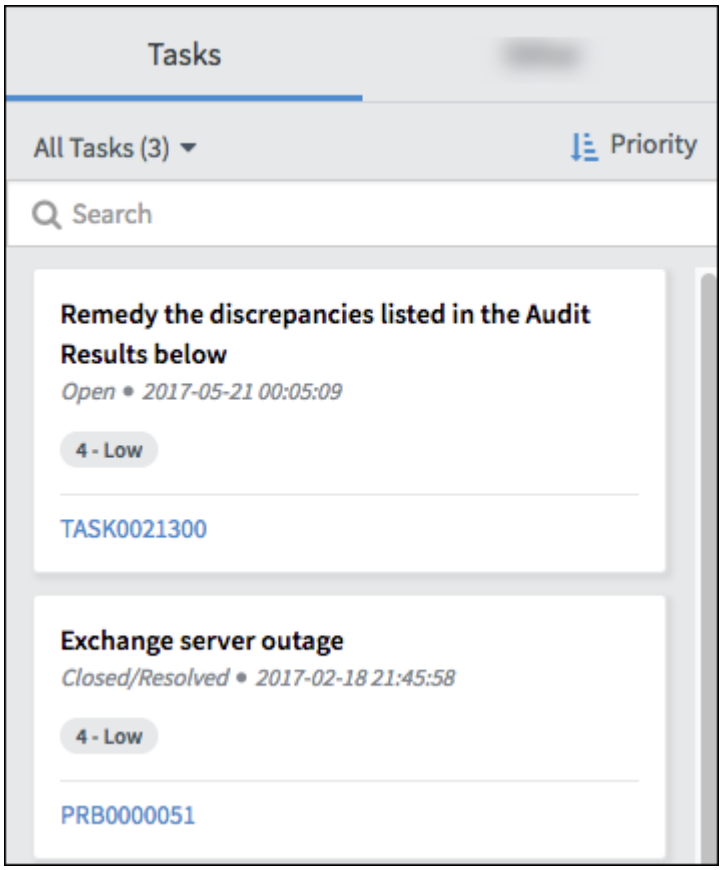

[タスク] タブに割り当てられたタスクがカードとして表示されます。各カードには、簡単な説明、ステータス、最終更新日時、優先度など、タスクに関する情報が記載されています。タスクは、次のフィルター条件から派生します。

- あなたに割り当てられたすべてのアクティブなインシデント、問題、または変更要求。
- 選択した週であなたに割り当てられたすべてのクローズ済みのインシデント、問題、または変更要求。
- 選択した週にハードアサインされたすべてのタスク。
- あなたに割り当てられたすべてのプロジェクトまたはプロジェクトタスクで、選択した週にアクティブであるものすべて。プロジェクトまたはプロジェクトタスクは、次の条件から派生します。
  - すでに開始され、実際の開始日が選択した週の終わりより前のプロジェクトまたはプロジェクトタスク。
  - すでにクローズされ、実際の終了日が週の始まりより後のプロジェクトまたはプロジェクトタスク。
  - プロジェクトの実績日付がない場合、プロジェクトの予定日は選択した週内である必要があります。
- 自分に割り当てられているすべてのアクティブなストーリー。
- 自分にアサインされた、または選択した週にクローズされたすべてのアクティブなスクラムタスク。
- 自分に割り当てられているすべてのアクティブなテストプラン。
- 自分にアサインされた、または選択した週にクローズされたすべてのアクティブな欠陥および拡張。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
カスタマーサービス管理 (CSM) プラグイン (com.sn_customerservice) が有効になっている場合、選択した週にアクティブおよびクローズされている割り当て済みタスクも、次のテーブルから派生します。


- ケース [sn_customerservice_case]
- 作業指示 [wm_order]
- 作業指示タスク [wm_task]

[タスク] タブでは、次の操作を実行できます。

- 検索フィールドにキーワードを入力すると、キーワードにマッチする詳細を含んだカードのみが表示されます。
- タスクタイプに関係なく、優先度に基づいて昇順または降順でカードをソートします。
- プロジェクト、プロジェクトタスク、インシデント、問題、変更、欠陥、拡張、テストプラン、スクラムタスクなどのカテゴリに基づいてカードを表示します。
- 割り当てられたタスクのタイムカードを作成します。「タイムシートポータルを使用してタイムカードを作成して時間を記録する」を参照してください。

注:
タイムシートポリシー はタイムカードを作成または編集するときに適用されます。

グループタスク

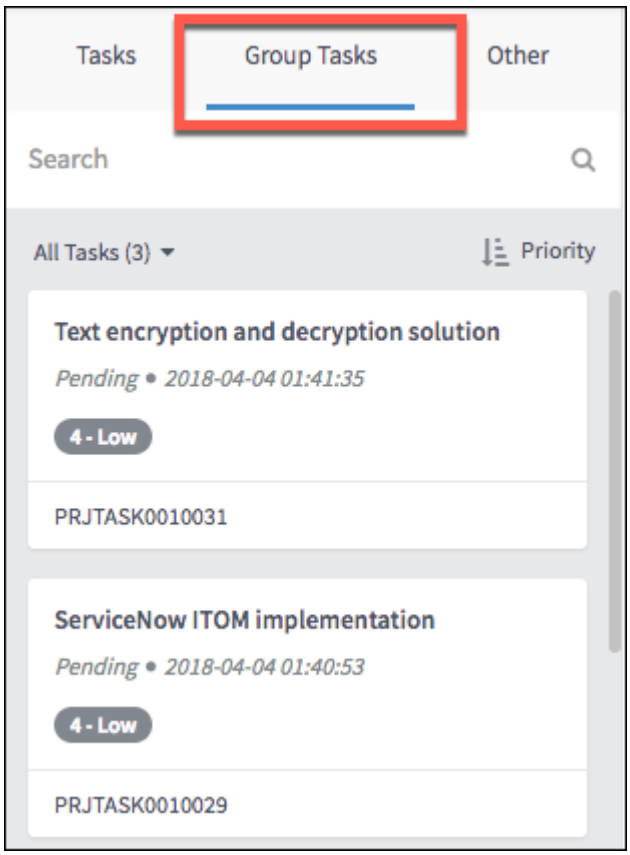


[グループタスク] タブには、自分のアサイン先グループにアサインされたタスクが表示されます。グループタスクは、タブにカードとして表示されます。カードには、簡単な説明、ステータス、最終更新日時、優先度など、タスクに関する情報が記載されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


その他

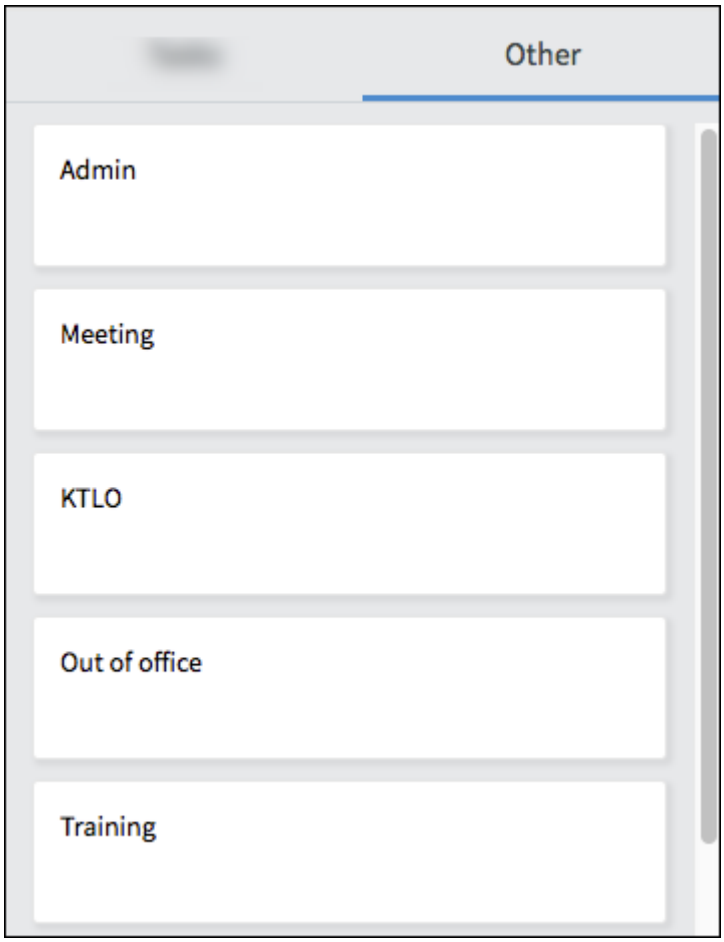

[その他] タブでは、管理、会議、KTLO などの運用作業で時間記録のために使用されるカードが表示されます。

注:
タイムカードのカテゴリのリストは、[その他] タブに表示されるカードのリストを制御します。アドミニストレーターがタイムカードでいずれかのカテゴリを非アクティブとしてマークした場合、それらのカテゴリは [その他] タブに表示されません。

タイムシート

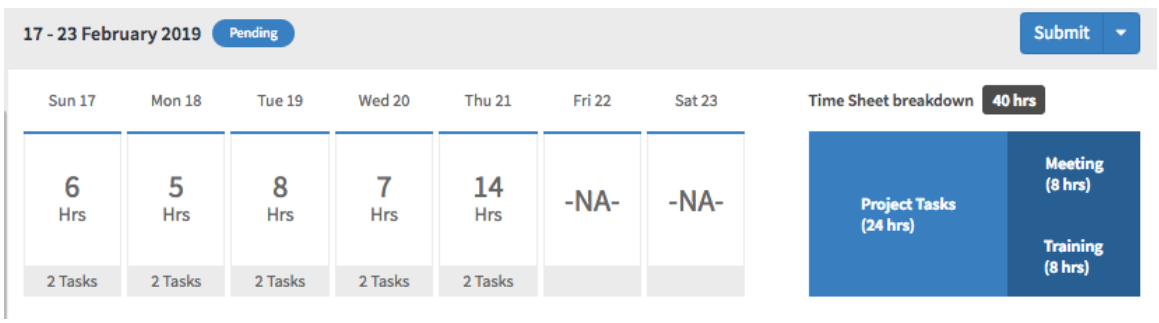

Yokohama リリース以降、タイムカードとタイムシートポータルはリソースの割り当てをサポートします。ユーザーは、タイムカードを作成し、タイムシートポータルを介してタイムカードを送信するときに、特定のリソースを割り当てることを選択できます。システムアドミニストレーターは、タイムシートポータルの [リソースのアサイン] 列を有効にできます。タイムシートに [リソースのア

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


自動翻訳

サイン] 列を追加する方法の詳細については、KB1649389 の ナレッジベース を参照してください。

[タイムシート] セクション：

- 選択した週のタイムシートの日付範囲を表示します。
- 表示されているタイムシートのステータスを示します。
- 1 週間の各日に入力したタスクの合計数と時間を表示します。タイムシートで日をクリックすると、その日の列が [タイムシート] セクションと [記録されたタイムカード] セクションの両方で強調表示されます。[タイムシート] セクションに表示される最初の曜日は、ユーザーの [タイムシートポリシー] の [週の開始日] フィールドで指定された値に基づきます。たとえば、[週の開始日] フィールドが金曜日に設定されている場合、[タイムシート] セクションは金曜日から始まります。
- タイムシートに入力した合計時間数を示します。タイムシートの内訳には、プロジェクトタスク、アドミン、会議、後続タスク、変更要求など、さまざまな作業カテゴリでユーザーが入力した時間のブレークダウンも表示されます。
- タイムシートを送信し、以前のタイムシートからタイムカードをコピーできるオプションを提供します。承認者は、送信されたタイムシートを承認または却下し、処理済みのタイムシートを取り消すオプションを利用できます。

ログが記録されたタイムカード

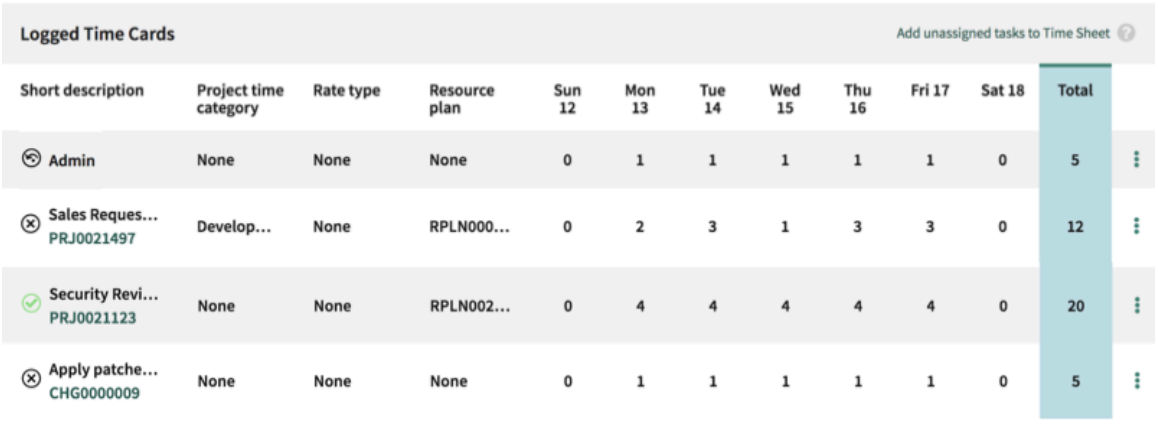

[ログが記録されたタイムカード] セクションの各行は、特定の週のタイムカードエントリを表します。タイムカードのステータスのアイコン、タスクの簡単な説明、プロジェクト時間カテゴリ、レートタイプ、リソース計画、ログに記録された時間などの詳細が表示されます。タイムカードの各行には、タイムカードのメモを編集、削除、または追加できるオプションが含まれています。詳細については、「タイムシートポータルを使用してタイムカードを作成して時間を記録する」を参照してください。

注:

- [レートタイプ] 列は、ユーザーのタイムシートポリシーで [複数のレートタイプを許可] オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
- [リソース計画]列は、ユーザーのタイムシートポリシーで[リソースプラン/レポートの実績時間とコストを更新]オプションが選択されている場合にのみ表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

行についての簡単な説明の横にあるアイコンは、タイムカードのステータスを示します。タイムカード行の結合アイコン ( ) は、同じタスクに対して重複するタイムカードがタイムシートに存在することを示し、それらを単一のタイムカードに結合するオプションを提供します。

タイムカードがない場合、[ログに記録されたタイムカード] セクションには、タイムカードを作成するための [タイムカードを生成] および [以前のタイムシートからコピー] ボタンが表示されます。

注:
タイムシートポータルはモバイルデバイス用に設計されていないため、このドキュメントに示されているとおりに表示されない場合があります。

ログに記録されたタイムカードリストに列を追加

タイムシートポータルのログに記録されたタイムカードリストに列を追加して、タイムカードのログ記録に必要な追加情報を表示します。

始める前に
必要なロール：admin または sp_admin

このタスクについて

手順

1. 移動先 すべて > サービスポータル > ウィジェットインスタンス.
2. [ウィジェット] 列で タイムカードポータルメインコンテナ を検索し、レコードを開きます。
3. [インスタンス] フォームで、[追加オプション、JSON 形式] フィールドに次の列構成の値を入力して、コードを更新します。

インスタンスフォーム

列構成	説明
name	テーブル内の列名。
label	タイムシートポータルのログに記録されたタイムカードリストに表示する列名。 タイムカード [time_card] テーブル以外のテーブルの列を追加する場合、この設定は必須です。
width_in_percent	ログに記録されたタイムカードリストの列幅 (%)。

注:
複数の列を追加するには、各列構成をカンマで区切ります。列は、コードに追加するのと同じ順序で追加されます。

4. [更新] をクリックします。

Example:
次のサンプルコードは、タイムシートポータルのログに記録されたタイムカードリストに、列名が [カテゴリ] で幅が 10 % のタイムカード [time_card] テーブルの [カテゴリー] 列を追加します。

```
{
  "tm_grid_options": {
    "displayValue": "Time card grid options",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "value": {
    "header_fields": [
      {name:"category",label:'Category', width_in_percent: 10}
    ]
  }
 }
}
```

タイムシートポータルを使用してタイムカードを作成して時間を記録する

タイムシートポータルでタイムカードを作成した後、タイムカードに時間を記録します。

始める前に

- タイムシートポータルのサポート を使用して作成されたリソースのアサイン プロジェクトワークスペース. タイムカードが承認されると、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトワークスペース および リソース管理ワークスペース ヒートマップビューでアサインの予定時間と実績時間を表示できます。
- 必要なロール：timecard_user

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > タイムシートポータル.
2. 次のいずれかのオプションを使用して、[ログに記録されたタイムカード] セクションでタイムカードを作成します。

   プロジェクトの [設定] タブの [タイムカードレポートを許可する] フィールド設定に基づいて、[タイムシートに追加] および [選択項目をタイムシートに追加] オプションがタイムシートポータルに表示されます。

   タイムカードに重複するタイムカードが存在する場合、処理済み、承認済み、または取り消し済みステータスのタイムカードを除き、両方のタイムカードを結合して単一のタイムカードにすることができます。重複するタイムカードは、タイムカードの [簡単な説明]、[ステータス]、[タスク]、[カテゴリ]、[レートタイプ]、[リソースプラン]、または [プロジェクト時間カテゴリ] フィールドの値を比較することによって識別されます。

3. [ログが記録されたタイムカード] セクションで、タイムカードに時間を記録します。

タイムシートポータルからタイムシートを送信

特定の週の作業時間でタイムシートを更新したら、承認のために送信します。

始める前に
必要なロール：timecard_user

このタスクについて
タイムシートを送信すると、タイムカードは割り当てられたタイムシートポリシーに照らして検証されます。タイムシートポリシーが割り当てられていない場合、タイムカードはデフォルトのタイムシートポリシーに照らして検証されます。ビジネスルールにより、違反が見つかった場合は、タイムシートを送信することはできません。

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > タイムシートポータル.
2. [**Submit** (送信)] を選択します。
   タイムシートが [送信済み] ステータスに移行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムシートポータルからタイムシートを承認または拒否

管理しているタイムカードユーザーによって送信されたタイムシートをレビュー、承認、または却下します。

始める前に
必要なロール：timecard_approver または timecard_admin

このタスクについて
ユーザーマネージャーは、タイムカードユーザーが送信したタイムシートまたはタイムカードをレビュー、承認、または却下できます。ユーザーマネージャーは、必要なロールのいずれかを持ち、タイムカードユーザーのマネージャーとして一覧表示されています。

休暇中、ユーザーマネージャーは、タイムシート承認者として必要なロールを持つ[別のユーザーを委任する]などの操作を行うことができます。委任されたユーザーは、指定された期間、タイムカードユーザーが送信したすべてのタイムシートを受信して処理します。

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > タイムシートポータル.
2. [マイタイムシート] リストをクリックし、[マイリソース] でタイムカードユーザーを選択します。
   [マイタイムシート] リストは、ユーザーマネージャーのみが使用できます。
3. カレンダー内を移動して、適切なタイムシート期間を選択します。
4. 承認または却下をクリックします。

時間を記録し、リソースのタイムシートを送信する

ユーザーマネージャーは、時間を記録したり、リソースのタイムシートを送信できます。

始める前に
タイムカードを作成および編集し、他のタイムカードユーザーのタイムシートを送信するために、ユーザーマネージャーにはタイムカード承認者ロールが必要です。ユーザーマネージャーは、必要なロールのいずれかを持ち、タイムカードユーザーのマネージャーとして一覧表示されています。

必要なロール：timecard_approver

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > タイムシートポータル.
2. [自分のタイムシート] 選択リストをクリックし、[自分のリソース] でタイムシートを承認または却下するユーザーを選択します。

   [自分のリソース] セクションには、自分の部下であるタイムカードユーザーが一覧表示されます。

   注:
   [自分のタイムシート] 選択リストは、ユーザーマネージャーのみが使用できます。

3. 必要に応じて タイムシートポータルを使用してタイムカードを作成して時間を記録する。
4. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果

- 選択したユーザーのタイムシートが [送信済み] ステータスに移行します。タイムカードユーザーに割り当てられたタイムシートポリシーは、タイムシートを送信する際の検証に使用されます。
- タイムシートに関連付けられているすべてのタイムカードも自動的に送信され、[送信済み] ステータスに移行します。
- [タイムシート] セクションに [承認] および [却下] ボタンが表示されます。前述した 2 つのボタンは、ユーザーマネージャーに対してのみ表示されます。

次のタスク
リソースのタイムシートを送信したら、[承認] または [却下] をクリックして承認または却下できます。ユーザーマネージャーにルーティングされたタイムカードのみが承認または却下されます。承認へのルーティングは、タイムカードユーザーのタイムシートポリシーの [プロジェクト以外の時間承認者] および [プロジェクト時間の承認者] フィールドに基づいて実行されます。

タイムシート

タイムシートには、特定の週におけるユーザーのすべてのタイムカードがグループ化されます。

タイムシートでは以下のことができます。

- タイムカードユーザーは、タイムシートを使用するとワンステップで 1 週間の作業をすべて送信できます。
- タイムカード承認者は、タイムシートを承認することで、ユーザーのタイムシート内のすべてのタイムカードをワンステップで承認できます。特定のユーザーの複数のタイムカードを個別に承認する必要はありません。
- タイムシートフォームの [アクティビティ] セクションで、タイムシートを送信または承認したユーザーなど、タイムシートのアクティビティを追跡します。このタイムシートアクティビティ監査は、タイムカード処理の責任を別のユーザーに委任した場合の追跡に役立ちます。アクティビティを追跡するには、タイムカードアクティビティを監査するためにタイムカード [time_card] テーブルの [ステータス] フィールドを有効にします (まだ有効になっていない場合)。詳細については、「 監査にテーブルフィールドを含める 」を参照してください。

タイムシートの状況は次のいずれかになります。

処理待ち
: タイムシートが作成されましたが、送信前にユーザーはまだ変更を行っています。

送信済み
: タイムシートが承認のために送信されました。承認者はそれを承認または却下できます。

承認済み
: タイムシートが承認されました。タイムシートが自動的に [処理済み] に更新されない場合は、タイムシートに関連付けられたタスクがなかったことを意味します。

処理済み
: タイムシートがシステムによって処理されました。タイムシートが承認されると、後 (After) ビジネスルール [承認されたタイムカードから経費を作成 (Create expense from approved time card)] がトリガーされます。このビジネスルールは、関連するタスクの経費ラインを作成し、状況を [処理済み] に更新します。

却下
: 変更のためにタイムシートが送信者に返送されました。

取り消し済み
: 送信者が修正のためにタイムシートを取り消しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムシートを作成

タイムカードユーザーとして、指定された週のすべてのタイムカードをグループ化するタイムシートを作成し、ワンステップで送信します。

始める前に

必要なロール：timecard_user

このタスクについて

ユーザーは、1 週間に 1 つのタイムシートしか作成できません。

注:
ユーザーが 1 週間のタイムカードを作成すると、その週のタイムシートも自動的に作成されます。

手順

1. これらのオプションのいずれかを使用してタイムシートを作成します。

2. フォームのフィールドに入力します。

タイムシートのフォーム

フィールド	説明
週の開始日	タイムシートが作成される週の開始曜日。 **注:** [タイムシートポリシー][週の開始日]は、週の開始日を制御します。
合計時間	ユーザーがその週に作業した時間数。このフィールドは、関連付けられたタイムカードに記録された時間から自動的に入力されます。
ユーザー	タイムシートが作成されるユーザーの名前。
状況	タイムシートの現在のステータス。すべての新しいタイムシートは [処理待ち] として開始されます。 デフォルトの状況：[処理待ち]、[送信済み]、[承認済み]、[処理済み]、[却下済み]、[取り消し済み]。
コメント	タイムシートに関連するコメント。
メモ	その他の追加情報。

3. [送信] をクリックします。

次のタスク

タイムシートにタイムカードを追加します。関連リンクと関連リストを使用して、タイムカードを追加できます。タイムシートポータルを使用してタイムカードを追加することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムシートフォームの関連リンク

フィールド	説明
タイムカードを生成	割り当てられたプロジェクトタスクのタイムカードを生成するリンク。
前のタイムシートからコピー	以前のタイムシートからタイムカードをコピーするための [タイムシートをコピー] ウィンドウを開くためのリンク。
タイムシートポータル	タイムシートを表示および管理するためのタイムシートポータルを開くためのリンク。

タイムシートフォーム関連リスト

フィールド	説明
タイムカード	タイムシートの一部であるタイムカードのリスト。 タイムカードを作成するには、[新規] をクリックします。

タイムシートを送信

タイムシートが作業した時間で更新されたら、その週のタイムシートとその週のすべてのタイムカードをまとめて送信できます。

始める前に

必要なロール：timecard_user

このタスクについて

タイムシートを送信する際、ユーザーに割り当てられた タイムシートポリシーは検証に使用されます。ユーザーにタイムシートポリシーが割り当てられていない場合、タイムカードはデフォルトのタイムシートポリシーが使用されます。ビジネスルールにより、ユーザーの違反が見つかった場合は、タイムシートを送信することはできません。

注:
このタスクは、 タイムシートポータルからも実行できます。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、タイムシートに移動します。
   - 保留中ステータスのタイムシートを送信するには、次に移動します:タイムシート > 自分のタイムシート > 保留中.
   - 今週のタイムシートを送信するには、次に移動します: タイムシート > 自分のタイムシート > 現在のタイムシート.
   - 却下済みステータスのタイムシートを送信するには、 タイムシート > 自分のタイムシート > 却下. 却下コメントに提案されている必要な変更を加えて、却下されたタイムシートを再送信することができます。
2. タイムシートリストで送信するには、タイムシートを開きます。
3. 必要に応じてコメントを追加します。
4. [タイムシートの送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果

- タイムシートが [送信済み] ステータスに移行します。
- タイムシートに関連付けられているすべてのタイムカードも自動的に送信され、[送信済み] ステータスに移行します。

タイムシートの承認または却下

指定された週のユーザーのタイムシートまたはタイムカードを 1 つのステップで表示、承認、または却下します。

始める前に

必要なロール：timecard_approver または timecard_admin

このタスクについて

ユーザーマネージャーは、必要なロールのいずれかを持ち、タイムカードユーザーのユーザーフォームの [マネージャー] フィールドで選択されます。

休暇中、ユーザーマネージャーは、タイムシート承認者として必要なロールを持つ別のユーザーにタイムシートの承認を委任するなどの操作を行うことができます。委任されたユーザーは、指定された期間、タイムカードユーザーが送信したすべてのタイムシートを受信して処理します。

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > タイムシート > 承認待ち.
2. [タイムシート] リストで、承認または却下するタイムシートを開きます。
3. 必要に応じてコメントを追加します。
4. 承認または却下をクリックします。

タスクの結果

- タイムシートが [承認済み] または [却下] ステータスに移行します。

  注:

  タイムシートが却下された場合、 タイムシートポータルの [通知を表示] アイコン ( ) の下にある却下済みのタイムシートの通知に一覧表示されます。

- タイムシートに関連付けられているすべてのタイムカードも、自動的に承認または却下されます。
- タイムシートポリシーとして定義されているタイムシート内のいずれかのタイムカードが承認者の誰かによる承認待ちの場合、シートは [送信済み] ステータスのままになります。

注:

- 1 つ以上のタイムカードを選択して承認または却下することで、タイムシート内のタイムカードを選択的に承認または却下することもできます。
- タイムシートが却下された場合、[送信済み] ステータスの関連するすべてのタイムカードも自動的に却下されます。タイムシートの [承認済み] および [処理済み] ステータスのタイムカードは影響を受けません。
- タイムシート内のすべてのタイムカードが承認されると、タイムシートは自動的に [承認済み] ステータスに移行します。
- タイムシート内のタイムカードが [却下済み] ステータスの場合、タイムシート内の他のタイムカードのステータスに関係なく、タイムシートも[却下済み]ステータスに移行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

処理済みのタイムシートを取り消す

承認済みまたは処理済みステータスの誤ったタイムシートを取り消して、送信者に戻すことができます。送信者は必要な変更を行い、タイムシートを再送信できます。

始める前に
必要なロール：timecard_approver または timecard_admin

このタスクについて
取り消しオプションは、関連付けられたタイムシートポリシー で [取り消しを許可]オプションが選択されている場合にのみ使用できます。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、取り消したい承認済みまたは処理済みのタイムシートに移動します。

2. [取り消し]をクリックします。

タスクの結果

- タイムシートと関連するタイムカードのステータスが、[取り消し済み]に変わります。
- タスクタイプのタイムカードが承認されたときに作成されたプロジェクトまたはデマンドの実際の労力とリソース時間を元に戻します。
- タイムシートが承認されたときに作成された、対応する経費ラインをゼロにするために、負の経費ラインを作成します。
- 変更のためにタイムシートを送信者に戻します。

タイムシートの承認を別のユーザーに委任する

時間がない場合や利用できない場合に、リソースのタイムシートを処理する責任を別のユーザーに委任することができます。

始める前に
必要なロール：timecard_admin または timecard_approver

このタスクについて
委任には、timecard_approver ロールが必要です。

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > 委任者.
2. [代理人] リストで、[新規] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

委任フォーム

フィールド	説明
ユーザー	別のユーザーへの承認とタスクの委任元のユーザー。
代理人	承認とタスクが委任されたユーザー。
開始	委任期間の開始日。
終了	委任期間の終了日。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
Approvals	タイムカード承認の委任を有効にするオプション。

注:
フォームの他のオプション ([アサイン]、**[CC** 通知]、および [ミーティング招待]) は、タイムシート承認の委任には適用されません。

4. [送信] をクリックします。

タスクの結果

承認委任は、指定された期間に次の影響を及ぼします。

- 自分と代理人の両方が、承認アクティビティに関する通知を受け取ります。
- タイムシートポータルで、代理人は[自分のタイムシート] リストの[代理人] の下にリソースを表示できます。
- 自分がタイムシートポータルでリソースに対して実行できるすべての機能、すなわちタイムシートの作成と送信、送信されたタイムシートの承認または却下、処理されたタイムシートの取り消しを、代理人が実行できます。

タイムカード

タイムカードは、タスクの割当先がタスクに費やした時間を記録するために使用されます。

タイムカード管理機能は、タスクテーブルと連携して、プロジェクト、インシデント、問題、および変更要求の作業時間を記録します。

タスクの割当先は、タスクレコードの [作業時間] フィールドに作業時間を記録するか、タイムカードに直接時間を入力することができます。一部のテーブルでは、開始日と終了日フィールドに基づくタイムカードの自動作成に対応しています。

タイムカードフォームの [アクティビティ] セクションで、タイムカードを送信または承認したユーザーなど、タイムカードのアクティビティを追跡します。このタイムカードアクティビティ監査は、タイムシート処理の責任を別のユーザーに委任した場合の追跡に役立ちます。アクティビティを追跡するには、タイムカードアクティビティを監査するためにタイムカード [time_card] テーブルの [ステータス] フィールドを有効にします (まだ有効になっていない場合)。詳細については、「 監査にテーブルフィールドを含める 」を参照してください。

プロジェクトタスクや、会議やトレーニングなどの他のタスクカテゴリのタイムカードを、関連するリソース計画に関連付けることができます。

タイムカードを承認すると、タイムカードに記録された時間が、日ごとにタイムカード日次 [time_card_daily] テーブルに保存されます。日次のタイムログデータを使用して、タイムカードが属するタイムシート期間に関係なく、任意の期間のタイムカードレポートを日単位で生成できます。たとえば、月初日から最終日までのタイムカードを含む月次タイムカードレポートを作成できます。

タイムカードには、プロジェクトマネージャーがタイムカードを承認するためのオプションの承認メカニズムもあります。アドミニストレーターとタイムカード承認者は、その週のすべてのタイムカードを表示できます。タスクの作業を担当するロールに属するすべてのユーザーは、自分のタイムカードにアクセスすることもできます。タイムカードの状況は次のいずれかになります。

タイムカードの状況

状況	説明
処理待ち	承認のために送信されていないタイムカード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムカードの状況 (続く)

状況	説明
送信済み	承認のために送信されたタイムカード。
承認済み	承認済みのタイムカード。
処理日時	関連タスクの経費ラインを含む承認済みのタイムカード。
却下	却下されたタイムカード。
取り消し済み	必要な調整のために取り消される承認済みのタイムカード。

タイムカードを作成

タイムカードを作成して、実行した作業の時間を記録できます。

始める前に

必要なロール：timecard_user

このタスクについて

Yokohama リリース以降、ユーザーはリソースのアサインを選択してタイムカードに関連付け、実績工数を計算してそれぞれのプロジェクトにタグ付けできます。

[プロジェクトフォーム] の [タイムカードレポートを有効にする] フィールドによって、プロジェクトタスクのタイムカードを作成できるレベルが決まります。

注:
プロジェクトフォームから作成されたタイムカードは、ランダム割り当てを避けるためにリソース計画に自動的に入力されません。詳細については、Now Support ナレッジベース の記事 KB0814884 を参照してください。

タイムカードは、自動または手動で作成できます。

- 自動：タイムカードを自動的に生成するには、次のオプションを使用します。
  - タスクを更新する：

    タスク更新時にタイムカードを自動作成する

    ユーザーがタスクレコードを更新したときに作成されるタイムカードを設定します。割り当てられたタイムシートポリシーの [タスク更新時にタイムカードを自動作成] 設定がこの動作を制御するため、デフォルトでは false に設定されています。

    作業時間の入力によりタイムカードを自動入力する

    ユーザーが作業時間を記録した時にタイムカードが作成されるように設定します。タスクのタイムカードが存在しない場合、タイムカードが作成されます。タイムシートポリシーの [作業時間の入力によりタイムカードを自動入力する] は、この動作を制御するため、デフォルトでは false に設定されています。

    [プロジェクトタスク]、[インシデント]、[問題]、および [変更] のレコードで、[作業時間] フィールドはデフォルトでは表示されないため、フォームで設定する必要があります。

  - スケジュール済みジョブ別：スケジュール済みジョブを通じて、ユーザーに対して自動的に生成されるプロジェクトタスクのタイムカードを設定します。アドミンだけがスケジュール済みジョブを設定できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> モバイルインターフェイスを使用している場合、タイムカードを自動的に作成することはできません。自動タイムカード機能を使用する場合は、デスクトップインターフェイスを使用します。

- 手動：タスクごとにタイムカードを作成し、手動で時間を入力します。

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、タイムカードを作成します。

2. フォームのフィールドに入力します。

タイムカードフォーム

フィールド	説明
週の開始日	タイムシートの週の開始曜日。 **注:** [タイムシートポリシー][週の開始日]は、週の開始日を制御します。タイムカードの開始週がリソース計画の日付外である場合に、リソース計画をタイムカードに関連付けようとすると、メッセージが表示されます。
状況	タイムカードの現在のステータス。新しいタイムカードはすべて [処理待ち] 状態で開始されます。 タイムカードの状況には、[処理待ち]、[送信済み]、[承認済み]、[処理済み]、[却下済み]、[取り消し済み] があります。
カテゴリ	タイムカードが作成されるタスクのタイプ。
タスク	タイムカードに関連付けられているタスク。
プロジェクト時間カテゴリ	時間が報告されるプロジェクト内のアクティビティタイプ。 このフィールドは、[カテゴリ] フィールドで [プロジェクト/プロジェクトタスク] または [タスク作業] を選択すると表示されます。
ユーザー	タイムカードが作成されるユーザーの名前。
リソースのアサイン	ユーザーにアサインされているリソースのアサインを選択します。タイムカードが承認されると、実績時間を使用して、プロジェクトワークスペース および リソース管理 ワークスペース のヒートマップビューに予定時間と実績時間が表示されます。 リソースのアサインは、次の方法でタイムカードに関連付けられます。 ○ ユーザーに複数のリソースアサインが存在する場合は、適切なアサインを選択できます。 ○ ユーザーにアサインされているリソースが 1 つのみの場合、そのプランがデフォルトで選択されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明

3. **[Submit** (送信)] をクリックします。

タスクの結果

- 選択したタイムカード期間のタイムカードが作成されます。
- その週のタイムシートが存在しない場合は、タイムカード週のタイムシートが作成されます。

次のタスク

タイムカードの作成後、タスクにかかった時間をタスクレコードの [作業時間] フィールドから自動的にインクリメントできます。タイムシートポリシーの[作業時間の入力によりタイムカードを自動入力する] は、タイムカードでの時間の更新方法を制御します。デフォルトでは、このポリシーは *[false]* に設定されています。作業時間の自動更新が設定されていない場合、ユーザーはタイムカードを手動で更新する必要があります。

関連情報

運用作業タイプにタイムカードカテゴリをマップ

以前のタイムシートからタイムカードをコピー

タイムカードを作成するもう 1 つのオプションは、既存のタイムシートからタイムカードをコピーすることです。これにより、選択したタイムシートから (プロジェクトおよびプロジェクト以外のタスクの) すべてのタイムカードがコピーされます。

始める前に

必要なロール：timecard_user

このタスクについて

このタスクは、 タイムシートポータルからも実行できます。

手順

1. タイムカードを作成するタイムシートレコードを開きます。
2. [以前のタイムシートからコピー] 関連リンクをクリックします。
3. [タイムシートを選択] フィールドで、タイムカードをコピーする以前のタイムシートを選択します。
4. オプション: 以前のタイムシートのタスクについて記録された時間をコピーできます。[ログに記録された時間をコピー] チェックボックスをオンにします。
5. **[OK]** をクリックします。

タスクの結果

プロジェクトタスクのタイムカード

今週進行中または予定されているすべてのプロジェクトタスクのタイムカードが、選択したタイムシートからコピーされます。選択した週にプロジェクトタスクのタイムカードが存在する場合、コピー中は重複するタイムカードは作成されません。

タスク以外のカテゴリのタイムカード

会議やトレーニングなど、タスク以外のすべてのカテゴリのタイムカードが、選択したタイムシートからコピーされます。選択した週にタスク以外のカテゴリのタイムカードが存在する場合、コピー中に重複するタイムカードが作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- 以前のタイムシートにレートタイプがあり、ユーザー のタイムシートポリシーでレートタイプが許可されている場合、レートタイプも現在のタイムシートにコピーされます。
- 以前のタイムシートにレートタイプがあっても、ユーザーのタイムシートポリシーでレートタイプが許可されなくなった場合、レートタイプは現在のタイムシートにコピーされません。
- 以前のタイムシートに非アクティブなレートタイプがある場合、そのレートタイプはコピーされません。必要に応じて、ユーザーは個々のタイムカードを保存する前に別のレートタイプを入力できます。

タイムカードを自動生成

アドミンは、タイムカードユーザーに割り当てられたプロジェクトタスクのタイムカードを自動的に生成するように、スケジュール済みジョブを設定できます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

手動オプション [タイムカードを生成] に加えて、スケジュール済みジョブを実行して、プロジェクトタスクのタイムカードを自動的に生成することもできます。たとえば、毎週日曜日にジョブを毎週実行するようにスケジュールして、翌週のすべてのユーザーのタイムシートを生成することができます。組織のビジネスプロセスに基づいて、スケジュール済みジョブをいつ実行するかを設定できます。デフォルトでは、スケジュール済みジョブはオフになっています。詳細については、「スクリプト実行のスケジュール」を参照してください。

注:
スケジュール済みジョブでは、割り当てられたタイムシートポリシーで [タイムカードを毎週自動作成する] オプションが true に設定されているユーザーに対してのみ、タイムカードが自動生成されます。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [スケジュール済みジョブ] リストで、[タイムカードの自動生成] を選択します。
3. ビジネス要件に従って、スクリプトで次のパラメーターを構成します。
   - 実行対象 (CURRENT_WEEK, NEXT_WEEK, LAST_WEEK)
   - グループ名 (includeGroups、excludeGroups)

   注:
   - タイムカードの週にプロジェクトタスクのタイムカードが存在する場合、重複するタイムカードは作成されません。
   - タイムカードは、週中に進行中または予定されているプロジェクトタスクに対してのみ生成されます。
   - [プロジェクトフォーム]の [タイムカードレポートを許可]フィールドによって、プロジェクトタスクのタイムカードを作成できるレベルが決まります。

Example:
次のスクリプト例は、スケジュール済みジョブが実行され、`データベース`グループと`ハードウェア`グループの現在の週のタイムカードが生成されるときに実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Clone this schedule job to run separately for different groups at different times
// One of the following values
// TimeCardConstants.CURRENT_WEEK
// TimeCardConstants.NEXT_WEEK
// TimeCardConstants.LAST_WEEK
var runFor = TimeCardConstants.CURRENT_WEEK;

// Comma separated group sys ids or group names. TimeSheet/TimeCards will be auto
 generated for time card users in the given groups.
var includeGroups = [Database,Hardware];
var excludeGroups = [];

var generator = new TimeCardGenerator();
generator.generateFromConfig(runFor, includeGroups, excludeGroups);
```

タイムカードを送信

タイムカードユーザーは、その週のタイムカードが作業した時間で更新されると、個別にタイムカードを送信できます。

始める前に
[処理待ち] または [却下済み] ステータスのタイムカードを送信できます。

必要なロール：timecard_user

このタスクについて
タイムカードを送信する際、ユーザーに割り当てられた タイムシートポリシーは検証に使用されます。ユーザーにタイムシートポリシーが割り当てられていない場合、タイムカードはデフォルトのタイムシートポリシーが使用されます。ビジネスルールにより、ユーザーの違反が見つかった場合は、タイムカードを送信することはできません。

手順

1. 移動先：
   - タイムシート > 私のタイムカード > すべて
   - タイムシートのタイムカード関連リスト。

   注:
   送信するタイムカードは複数選択できます。

2. [タイムカード] リストで、送信するタイムカードを開きます。
3. [タイムカードを送信] をクリックします。

タスクの結果

- タイムカードが [送信済み] ステータスに移行します。
- タイムカードは、ユーザーに割り当てられたタイムシートポリシーの[プロジェクト時間の承認者]フィールドと[プロジェクト以外の時間承認者]フィールドに設定された値に基づいて承認者に送信されます。

  注:
  タイムカードの送信後にプロジェクトまたはユーザーマネージャーが変更された場合、タイムカードは承認のために新しいプロジェクトまたはユーザーマネージャーに自動的にリダイレクトされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムカードの承認または却下

タイムカード承認者は、送信されたタイムカードを表示して承認または却下できます。

始める前に
必要なロール：timecard_approver または timecard_admin

このタスクについて
承認のために送信されたタイムカード、または他のユーザーマネージャーによってタイムカード承認者として委任されたタイムカードのみを表示できます。ユーザーに割り当てられたタイムシートポリシーによって、承認プロセスが決まります。

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > タイムカード > 承認待ち.
2. 承認または却下するタイムカードを選択します。
3. 承認または却下をクリックします。

タスクの結果

- タイムカードが [承認済み] または [却下済み] ステータスに移行します。
- 承認されたタイムカードの経費ラインが作成されます。
- 承認されたタイムカードの場合、タイムカード日次レコードが作成されます。

注:

- ユーザーマネージャーは、1 つ以上のタイムカードを選択して承認することで、タイムシート内のタイムカードを承認することもできます。タイムシート内のすべてのタイムカードが承認されると、タイムシートは自動的に [承認済み] ステータスに移行します。

  ユーザーマネージャーは、タイムカードユーザーのユーザーフォームのマネージャーフィールドで選択されます。

- タイムカードが [却下] ステータスの場合、タイムシート内の他のタイムカードのステータスに関係なく、関連するタイムシートも [却下] ステータスに移行します。

  注:

  タイムシートが却下された場合、 タイムシートポータルの [通知] アイコン ( ) の下にある却下済みタイムシートの通知に一覧表示されます。

- 割り当てられたタイムシートポリシーで [プロジェクト時間の承認者] が [両方] に設定されている場合、タイムカードは双方の承認者が承認した場合にのみ [送信済み] ステータスになります。承認者のいずれかが却下した場合、タイムカードのステータスは [却下済み] に設定され、[承認者] フィールドがクリアされ、再送信時に両方の承認者の承認が必要になります。

処理済みのタイムカードを取り消す

承認済みまたは処理済みステータスの誤ったタイムカードを取り消して、送信者に戻すことができます。送信者は必要な変更を行い、タイムカードを再送信できます。

始める前に
必要なロール：timecard_approver または timecard_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
取り消しオプションは、関連付けられたタイムシートポリシー で [取り消しを許可]オプションが選択されている場合にのみ使用できます。

手順
1. 移動先 すべて > タイムシート > タイムシートポータル.
2. [自分のタイムシート]リストをクリックし、[自分のリソース]でユーザーを選択します。
3. カレンダーウィジェット内を移動して、タイムシートを選択します。
   タイムシートは、タイムシートポリシーで指定された取り消し期間内でなければなりません。
4. タイムカードを取り消すには、[その他のアクション] アイコン ( ) をクリックして、[取り消し] を選択します。
   タイムカードを取り消す前にコスト計画の原価費目が更新された場合、取り消されたタイムカードの経費ラインには新しい経費タイプが設定されます。例：
   a. タイムカードが、コスト計画 = 人件費で処理され、経費タイプ = 人件費の $500 の経費ラインが生成されます。
   b. コスト計画の原価費目が、原価費目 = 人件費に更新された場合。
   c. タイムカードが取り消された場合、取り消された経費ラインは、経費タイプ = 人件費になります。

タスクの結果
- タイムカードのステータスが、[取り消し済み] に変わります。タイムシート内のすべてのタイムカードが承認されるか、再度処理されるまで、関連するタイムシートのステータスも [取り消し済み] に変更されます。
- タスクタイプのタイムカードが承認されたときに作成されたプロジェクトまたはデマンドの実際の労力とリソース時間を元に戻します。
- タイムカードが承認されたときに作成された、対応する経費ラインをゼロにするために、負の経費ラインを作成します。
- 変更のために関連するタイムシートを送信者に戻します。

運用作業タイプにタイムカードカテゴリをマップ

カスタムタイムカードカテゴリを運用作業タイプにマップして、投稿時間中の特定のタイムカード期間とカテゴリのユーザーに関連付けられている運用リソース計画のみを選択できるようにします。

始める前に
必要なロール：pps_admin

このタスクについて
デフォルトでは、すべての基本システムのタイムカードカテゴリが基本システムの運用作業タイプにマッピングされます。カスタムカテゴリのマッピングが行われていない場合、[リソース計画] フィールドには、タイムカードの作成時にその期間のユーザーに関連付けられたすべての運用リソース計画が表示されます。

タイムカードの作成時に、タイムカードのカテゴリとタスクを選択した後、または他のカテゴリのタイムカードのタイムシート送信時に、次の表に示すように、そのカテゴリとタスクの運用リソース計画が設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクとカテゴリの運用リソース計画

カテゴリ	タスク	リソースプラン
• アドミン • 外部作業 • 会議 • 電話 • トレーニング • 不在 • 予約 • 休暇 • KTLO	タスク、プロジェクト、デマンド、プロジェクトタスク、デマンドタスクが [タスク] フィールドで選択されているか、値が選択されていません。	タスクが選択されたときに、タスク、プロジェクト、デマンド、プロジェクトタスク、またはデマンドタスクに関連付けられたリソース計画を表示します。 選択したタスクにリソース計画が関連付けられていない場合、またはタスクが選択されていない場合は、そのカテゴリの運用作業タイプにマップされた運用リソース計画が表示されます。
カスタム	タスク/プロジェクト/デマンド/プロジェクトタスク/デマンドタスクのいずれか	タスクが選択されたときに、タスク、プロジェクト、デマンド、プロジェクトタスク、またはデマンドタスクに関連付けられたリソース計画を表示します。 選択したタスクにリソース計画が関連付けられていない場合、またはタスクが選択されていない場合は、そのカテゴリのカスタム運用作業タイプにマップされた運用リソース計画が表示されます。 マッピングが行われていない場合は、すべての運用リソース計画が表示されます。
タイムシートポータルのその他のカテゴリ (カスタムおよびOOTB)	適用外	マップされた運用リソース計画を表示します。 マッピングが行われていない場合は、すべての運用リソース計画が表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > タイムカードカテゴリマッピング.
2. [**New**] をクリックします。
3. [タイムカードカテゴリ] メニューから、必要なタイムカードカテゴリを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [運用作業タイプ] メニューから、前のステップで選択したタイムカードカテゴリにマップする運用作業タイプを選択します。
5. [送信] をクリックします。

作業時間の記録

タイムカードは、プロジェクトで発生した時間またはタスクテーブルの任意のレコードの作業に費やされた時間を [作業時間] フィールドから取得します。

このフィールドは、[プロジェクトタスク]、[インシデント]、[問題]、および [変更] フォームでデフォルトでは表示されません。フォームをパーソナライズして追加する必要があります。このフィールドに記録された時間は、既存のタイムカードを入力するため、またはタイムカードが存在しない場合は新しいタイムカードを作成するために使用されます。タイムシートポリシーは、この動作を制御します。

注:

作業時間が更新されると、タイムカードは次の場合にのみ作成されます。

- ユーザーがタイムカードユーザーであり、かつ
- ユーザーが [アサイン先] または [追加のアサイン先リスト] フィールドからタスクにアサインされている。

[作業時間] フィールドには、レコードに使われた時間の間、ストップウォッチのように機能するカウンターがあります。フィールドのボタンで、カウンターを停止および開始できます。デフォルトでは、 作業時間カウンターは有効になっており、レコードを開くと経過時間の記録を開始します。停止ボタンでカウンターを停止し、開始ボタンで再開します。

作業時間エントリからタイムカードを作成する場合は、[作業時間] 関連リストを追加してタイムカードフォームに作業時間レコードを表示するようにアドミンに依頼することができます。また、タイムカードには、作業時間レコードへの変更がタイムカードの値よりも優先されることを知らせる情報メッセージが表示されます。これは フォーマッター を使用して表示され、フォームを設定することで追加または削除できます。

コストを管理

コスト管理機能を有効にすると、コスト管理アプリケーションでタイムカードを使用して人件費を管理できます。

プロジェクトタスクのタイムカードが承認されると、プロジェクトに関連付けられた対応する人件費の経費ラインが生成されます。プロジェクトにレートモデルが関連付けられている場合、経費ラインの人件費を計算するための時給はレートモデルから算出されます。レートモデルがプロジェクトに関連付けられていない場合は、賃金レートカードに記載されているレートが考慮されます。適用可能な賃金レートカードがない場合は、プロパティ `com.snc.time_card.default_rate` によってデフォルトの時給が定義されます。

ロール

timecard_admin ロールを使用すると、ユーザーは他のユーザーのタイムカードを承認、変更、削除できます。

関連情報

コスト管理を有効化

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アナリティクスプロジェクトマネージャー

アナリティクスプロジェクトマネージャーは、タイムカードの例外のクイックレポートと、プロジェクトについて報告されたカテゴリごとの時間をプロジェクトマネージャーに提供します。ダッシュボードには、プロジェクトマネージャーによって管理されているプロジェクトのタイムカードレポートのみが表示されます。

重要:
Xanadu リリース以降、プロジェクトマネージャーダッシュボードは、新規顧客向けにアナリティクスプロジェクトマネージャーに名前が変更されています。

ダッシュボードは、パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - プロジェクトポートフォリオスイートダッシュボードプラグイン (com.snc.pps_dashboards) を使用して有効化できます。このダッシュボードを使用するには、パフォーマンスアナリティクス ライセンスが必要です。

ダッシュボードのレポートは、[プロジェクト] と [選択した日付] に基づいてフィルタリングされます。

アナリティクスプロジェクトマネージャーは、次のコンポーネントで構成されています。

プロジェクトタイムカードの例外数

プロジェクトタイムカードの例外レポートのエントリ合計数が表示されます。

プロジェクトタイムカードの例外数



プロジェクトタイムカードの例外レポート

プロジェクトタイムカードの例外レポートには、タイムカードを送信しなかったユーザーと、選択したプロジェクトおよび時間範囲に対してまだ承認されていないタイムカードが一覧表示されます。例外レポートは、進行中のタスクにアサインされているユーザー、またはその時間範囲内のプロジェクト/タスクにハード割り当てされているユーザーに対して生成されます。このレポートには、次のデータが表示されます。


- ユーザー：選択したプロジェクトに割り当てられたタイムカードユーザー、またはプロジェクトに関連付けられたリソース計画にハード割り当てされたタイムカードユーザー。指定された日付範囲のユーザーに対して、送信されていないか承認が必要なタイムカードが複数ある場合、そのユーザーの複数のエントリーがリストされます。
- 週の開始日：選択した時間範囲内のタイムカード週の開始日。
- ステータス：タイムカードのステータス。その週のタイムカードが作成されていない場合は、ステータスが未送信のタイムカードエントリーも一覧表示されます。

レポートは、project_timecard_exceptionion テーブルから生成されます。最新の情報を取得するには、スケジュールジョブ [プロジェクトタイムカードの例外] を実行する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


プロジェクトタイムカードの例外レポート

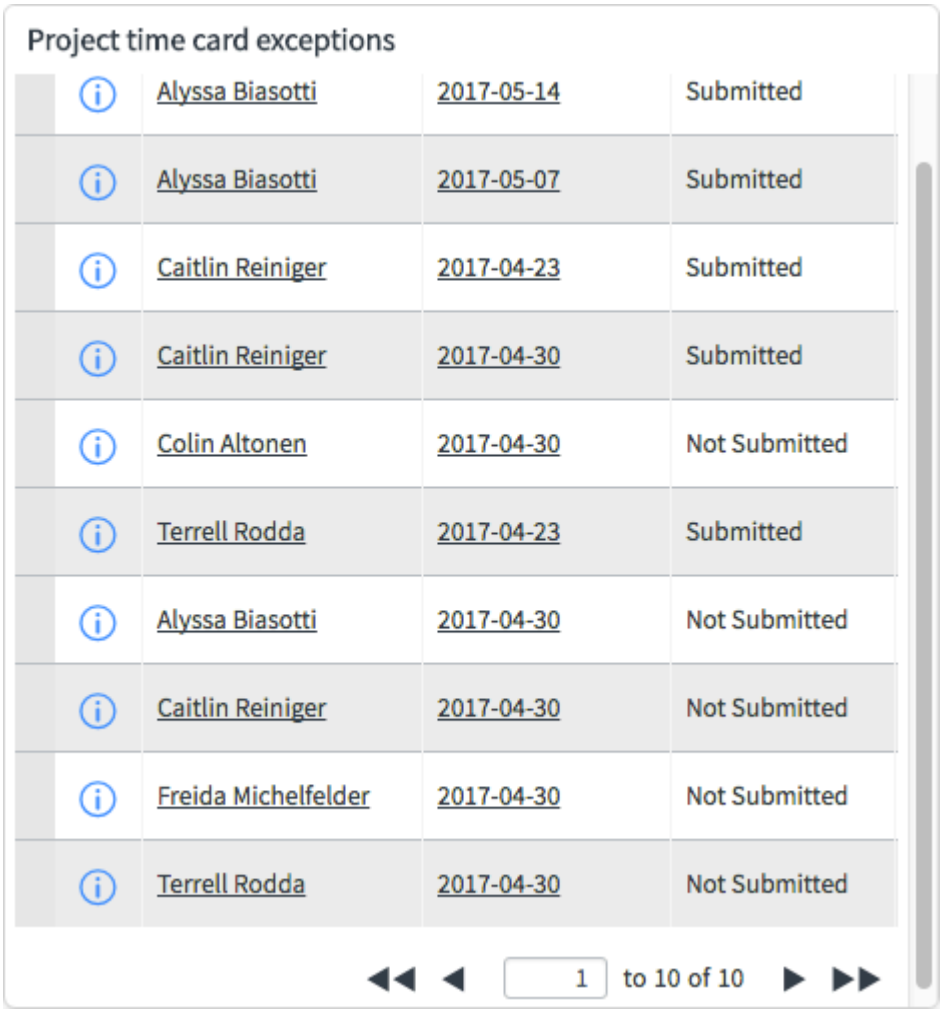

プロジェクトの合計承認時間

[プロジェクト時間カテゴリ別の時間] レポートに示される、すべてのプロジェクトカテゴリの合計承認時間が表示されます。

プロジェクトの合計承認時間

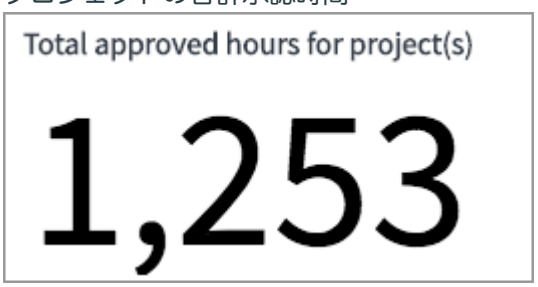


プロジェクト時間カテゴリ別の時間レポート

棒グラフレポートには、選択したプロジェクトに割り当てられたユーザーの各プロジェクトカテゴリに対して承認された時間が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト時間カテゴリ別の時間レポート

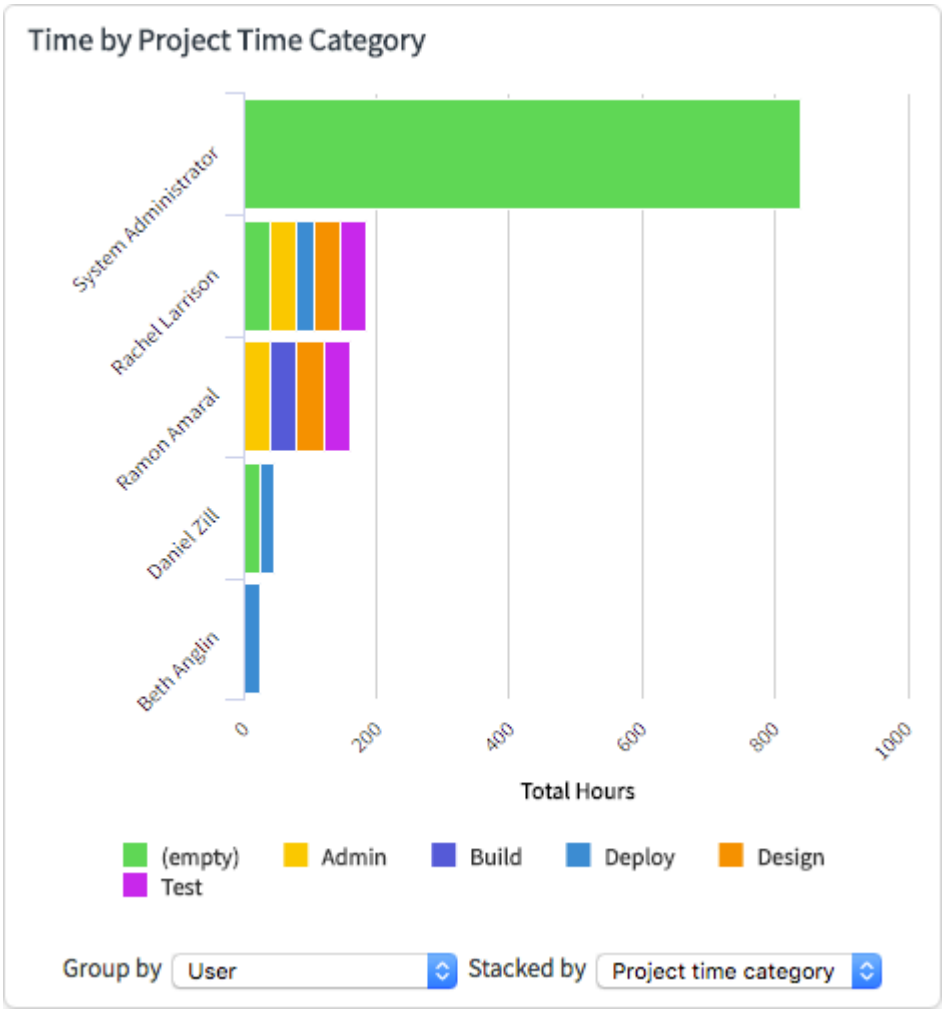

自動翻訳

アナリティクスプロジェクトマネージャーの使用

アナリティクスプロジェクトマネージャーには、選択したプロジェクトのタイムカードレポートが表示されます。

このタスクについて

重要:
Xanadu リリース以降、プロジェクトマネージャーダッシュボードは、新規顧客向けにアナリティクスプロジェクトマネージャーに名前が変更されています。

始める前に

必要なロール：it_project_manager、timecard_admin

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > アナリティクスプロジェクトマネージャー.
2. [プロジェクト] および [日付] 選択リストからプロジェクトと日付範囲を選択します。
3. 表示されたレポートを確認し、必要に応じて必要なアクションを実行します。
4. 必要に応じて、[その他のアクション] アイコン (⋮) をクリックして、選択したレポートを複製、共有、またはエクスポートします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アナリティクスユーザーマネージャー

アナリティクスユーザーマネージャーは、タイムシートの例外レポートと、ユーザーごとに報告されたカテゴリごとの時間をユーザーマネージャーに提供します。

重要:
Xanadu リリース以降、ユーザーマネージャーダッシュボードは、新規顧客向けにアナリティクスユーザーマネージャーに名前が変更されています。

ダッシュボードは、パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - プロジェクトポートフォリオスイートダッシュボードプラグイン (com.snc.pps_dashboards) を使用して有効化できます。このダッシュボードを使用するには、パフォーマンスアナリティクス ライセンスが必要です。

ダッシュボードには、[ユーザーフォーム] の [マネージャー] フィールドが現在のユーザーに設定されているタイムカードユーザーのタイムシートレポートのみが表示されます。


ダッシュボードのレポートは、選択した [日付] 範囲と [ユーザー] に基づいてフィルタリングされます。

アナリティクスユーザーマネージャーは、次のコンポーネントで構成されています。

タイムシートの例外数

タイムシートの例外レポートのエントリ合計数が表示されます。

タイムシートの例外数



タイムシートの例外数

タイムシートの例外数レポートは、タイムシートを提出/作成していないユーザー、ならびに選択されたユーザーおよび時間範囲に対して承認されていないタイムシートを一覧表示します。このレポートには、次のデータが表示されます。


- ユーザー：ユーザープロファイル内のマネージャーが現在のユーザーであるタイムカードユーザー。指定された日付範囲のユーザーに対して、送信されていないか承認が必要なタイムシートが複数ある場合、そのユーザーの複数のエントリーがリストされます。
- 週の開始日：選択した時間範囲内のタイムシート週の開始日。
- ステータス：タイムカードのステータス。その週のタイムシートが作成されていない場合は、ステータスが未送信のタイムシートエントリーも一覧表示されます。

レポートは、time_sheet_exception テーブルから生成されます。最新の情報を取得するには、スケジュールジョブ [タイムシートの例外] を実行する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


タイムシートの例外数

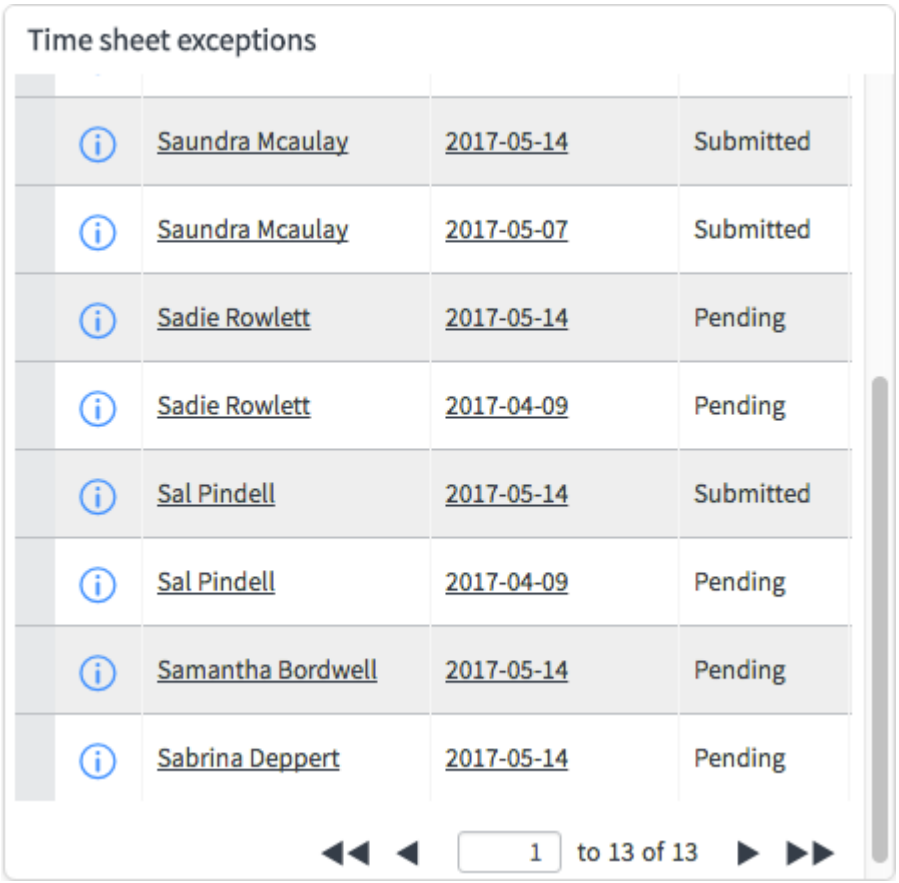

承認された合計時間

カテゴリ別時間レポートに示される、すべてのカテゴリの合計承認時間が表示されます。

承認された合計時間

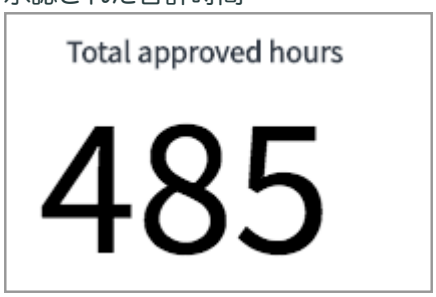


カテゴリレポート別の時間

棒グラフレポートには、ユーザープロファイル内のマネージャーが現在のユーザーである、選択されたユーザーの各カテゴリに対して承認された時間が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カテゴリレポート別の時間

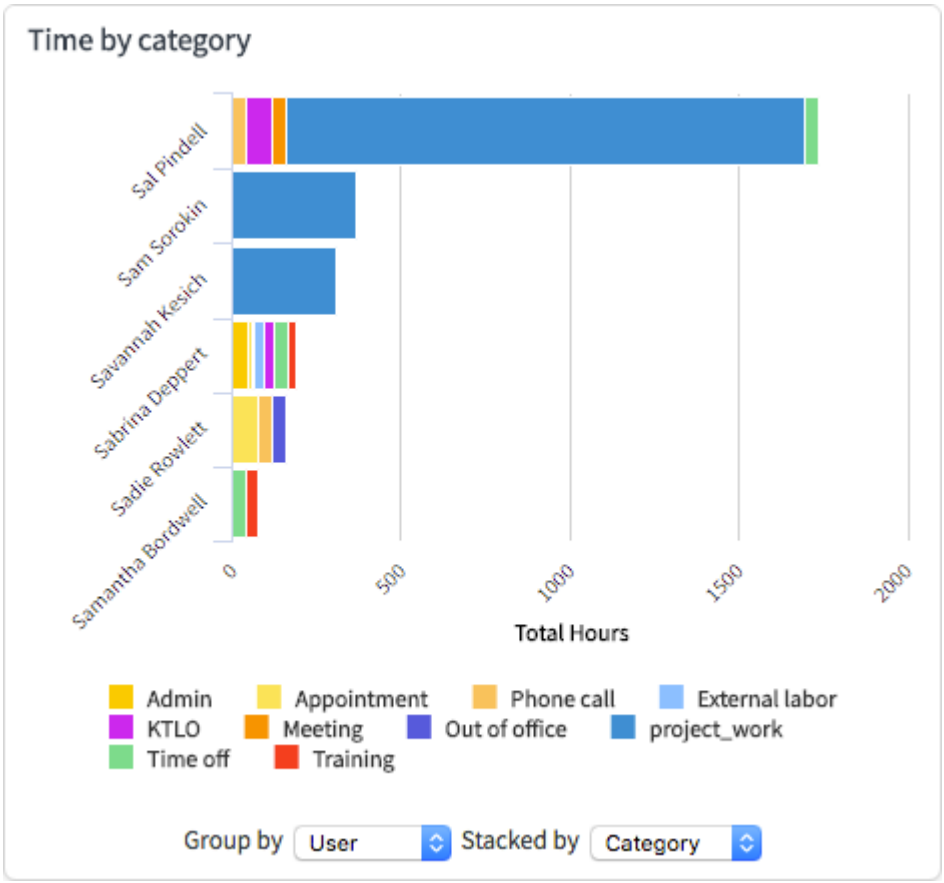

アナリティクスユーザーマネージャーの使用

アナリティクスユーザーマネージャーには、ユーザーのタイムシートレポートが表示されます。

始める前に
必要なロール：resource_manager、timecard_admin

このタスクについて

重要:
Xanadu リリース以降、ユーザーマネージャーダッシュボードは、新規顧客向けにアナリティクスユーザーマネージャーに名前が変更されています。

ダッシュボードには、[ユーザーフォーム] の [マネージャー] フィールドがあなたに設定されているタイムカードユーザーのタイムシートレポートのみが表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > タイムシート > アナリティクスユーザーマネージャー.
2. [日付] および [ユーザー] 選択リストから日付範囲とユーザーを選択します。
3. 表示されたレポートを確認し、必要に応じて必要なアクションを実行します。

タイムカード 管理のパフォーマンスアナリティクスダッシュボード

この プラットフォームアナリティクスソリューション には事前構成済みのダッシュボードが含まれます。これらのダッシュボードには、アクション可能なデータ表示方法が豊富に用意されており、ビジネスプロセスとビジネスプラクティスの改善に役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムカード管理ダッシュボードとタイムシートダッシュボードは、ファイナンシャルを備えたプロジェクトポートフォリオスイートダッシュボードに含まれています。詳細については、「プロジェクトポートフォリオ管理 プラットフォームアナリティクスソリューション」を参照してください。

ドメインセパレーションとタイムカード

ドメインセパレーションはタイムカードでサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

タイムカード でのドメインセパレーションの使用の詳細については、「https://community.servicenow.com/community?id=community_article&sys_id=616d706edbb318d066f1d9d9689619c1」を参照してください。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

モバイルタイムシート

ServiceNow® モバイルタイムシートアプリを使用すると、タイムシートユーザーとマネージャーはモバイルデバイスからタイムシートにアクセスできます。モバイルタイムシートは Now Mobile アプリで利用でき、iOS および Android デバイスでサポートされています。

タイムシートユーザーは、モバイルタイムシートを使用して、モバイルデバイスからタイムカードの作成、表示、編集、メモの入力、および送信を行うことができます。タイムシートプロジェクトマネージャーまたはユーザーマネージャーは、モバイルデバイスからタイムシートまたはタイムカードを表示、承認、却下、または取り消すことができます。


モバイルデバイスからタイムシートにアクセスするには、Now Mobile アプリケーションをダウンロードします (iOS プラットフォームには Apple App Store から、Android プラットフォームには Google Play Store から)。

特徴

モバイルタイムシートアプリは、タイムシートユーザーに次の機能を提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タイムシートを作成
- タイムカードを作成
- タイムカードに時間を記録
- 特定のタイムカードの週の時間を更新
- タイムカードにメモを追加
- タイムシートを送信
- タイムカードを送信

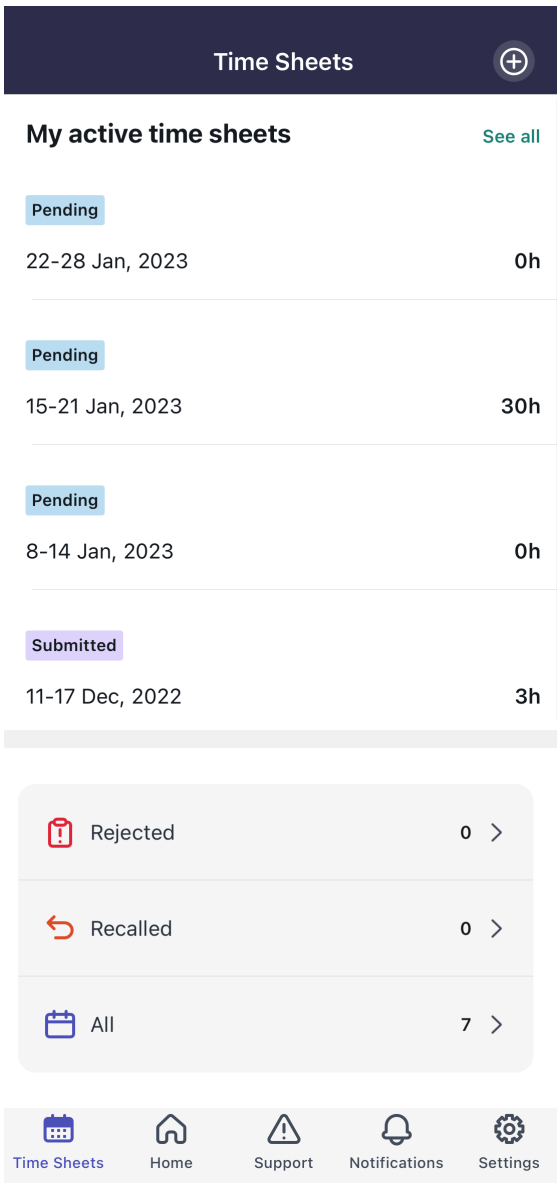


モバイルタイムシートアプリは、リソースマネージャーまたはプロジェクトマネージャーに次の機能を提供します。

- タイムシートの承認または却下
- タイムカードの承認または却下
- タイムシートまたはタイムカードを取り消す

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

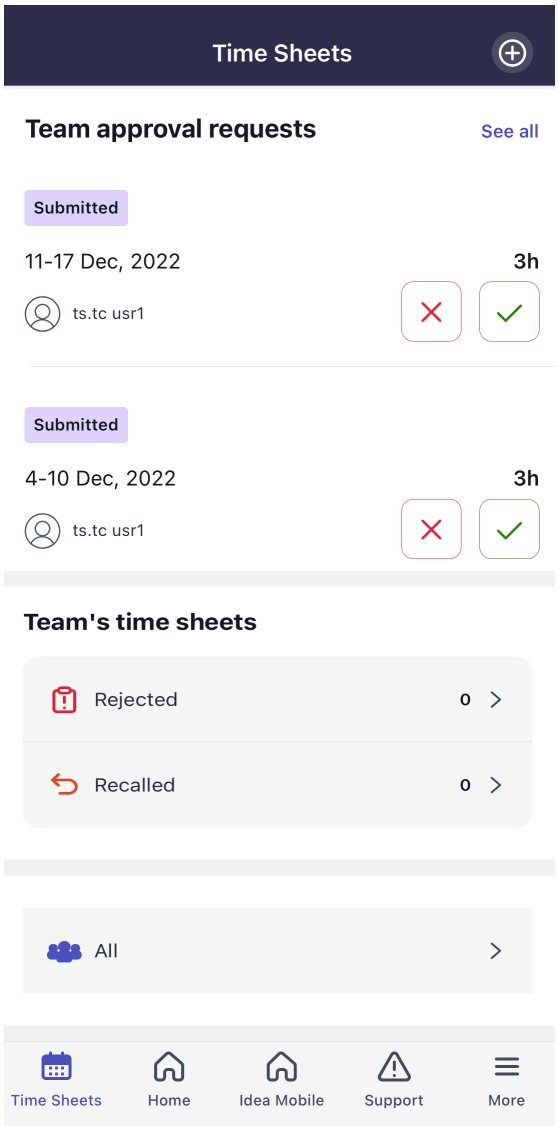

自動翻訳

モバイルタイムシートをインストール

ServiceNow Store の Web サイトからモバイルタイムシートアプリケーションをインストールします。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してアプリケーションを検索します。
   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow ストアへのリクエストが必要になることもあります。
3. [インストール] をクリックします。
4. アプリケーションのインストールダイアログボックスで、アプリケーションの依存関係を確認します。

   使用中のアプリケーションが他のアプリケーションを必要とし、それがまだインストールされていない場合は、先にインストールしてください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーションをインストールする時点で、依存アプリケーションまたはプラグインがインストールされていない場合は、それらも自動的にインストールされます。

5. 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] をクリックします。
一部のアプリケーションには、デモデータ (一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコード) が含まれています。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。
6. [インストール] をクリックします。

モバイルタイムシートのモバイルエクスペリエンスを有効化

モバイルタイムシートのモバイルエクスペリエンスを有効にして、ユーザーがタイムシートに記入し、ユーザーマネージャーがモバイルデバイスからタイムシートを承認または却下できるようにします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. Mobile Time Sheets アプリケーション をインスタンスにインストールします。
2. Now Mobile アプリケーションをダウンロードします (iOS プラットフォームには Apple App Store から、Android プラットフォームには Google Play Store から)。

   モバイルアプリの使用方法の詳細については、「Now Mobile アプリ 」を参照してください。
3. モバイルタイムシートがインストールされているインスタンスを Now Mobile アプリケーションに追加し、ログインしてモバイルデバイスのアプリケーションデータにアクセスします。

次のタスク
モバイルアプリを使用してインスタンスにログインする 。

Now Mobile で **Mobile Time Sheets** を使用する

Now Mobile アプリケーションでモバイルタイムシートを使用するようにプラットフォームシステムを設定できます。デフォルトでは、モバイルタイムシートは Now Mobile アプリケーションで表示できます。

始める前に
必要なロール：admin
モバイルタイムシートアプリがシステムにインストールされている必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > システムモバイル > ナビゲーションバー.
2. **[Now Mobile** ナビ] をクリックします。
3. [ナビゲーションタブ] 関連リストから、タイムシートレコードを削除します。
4. 移動先 システムモバイル**>**ナビゲーションバー.
5. **[Now Agent]** をクリックします。
6. [ナビゲーションタブ] 関連リストで、タイムシートの新しいレコードを作成します。
7. Now Mobile アプリをダウンロードして有効にします。
詳細については、「Now Mobile アプリ 」トピックを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

モバイルデバイスからタイムシートを作成

指定された週のすべてのタイムカードをグループ化するタイムシートを作成し、Now Mobile アプリケーションからワンステップで送信します。

始める前に
必要なロール：timecard_ user

手順

1. Now Mobile アプリケーションを使用してインスタンスにログインします。
2. 右上隅にあるプラスアイコンをタップします。
3. [タイムシートの作成日を選択] フィールドで、タイムシートの作成を開始する日を選択します。
4. 進むアイコンをタップします。

次のタスク
タイムシートにタイムカードを追加します。

タイムシートリストからタイムシートを検索

フィルターを適用して、タイムシートリストから特定のタイムシートを検索します。

始める前に
必要なロール：timecard_user

このタスクについて
タイムシートリストにフィルターを適用して、[すべて]、[却下]、および [取り消し] の各グループで特定のタイムシートを検索したり、以前のタイムシートからタイムカードをコピーしたりすることができます。タイムシートの検索中に 1 つ以上のフィルターを適用できます。

手順

1. Now Mobile アプリケーションを使用してインスタンスにログインします。
2. [却下]、[取り消し]、または [すべて] リストを開きます。
3. 右上隅にある [フィルター] アイコンをタップして、フィルター基準を指定します。
4. [ステータス] メニューからタイムシートのステータスを選択し、[戻る] アイコンをタップします。
5. [名前] フィールドでタイムシートにアサインされたユーザーを選択します。
6. タイムシートを開始する週を選択します。
7. [適用] をタップします。

モバイルタイムシートアプリケーションを使用してタイムカードを追加し、時間を記録します

モバイルアプリケーションから作業時間を記録するタイムカードを作成します。

始める前に
必要なロール：timecard_user

このタスクについて
[プロジェクトフォーム] の [タイムカードレポートを有効にする] フィールドによって、プロジェクトタスクのタイムカードを作成できるレベルが決まります。たとえば、プロジェクトレベルでは、ユーザーがプロジェクト内の複数のタスクに割り当てられている場合、すべてのタスクに費やされた時間は 1 つのタイムカードにのみ記録されます。プロジェクトタスクレベルでは、計画された各タスクに対応する個別のタイムカードが作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. Now Mobile アプリケーションを使用してインスタンスにログインします。
2. [タイムシート] タブからタイムシートを開きます。
3. アクションアイコンをタップします。
4. タスク関連またはタスク以外の関連タイムカードを追加します。
5. タイムカードに時間を記録します。
   - タイムシートのタスクをタップし、該当する日の作業時間を入力します。
6. [保存] をタップします。

タスクのタイムカード時間を更新

特定の日のタイムカードの時間を更新します。

始める前に
必要なロール：timecard_user

このタスクについて
特定のタイムカードの指定された日の時間フィールドを更新できます。既存の値は、タイムカードの新しい値で上書きされます。

手順

1. Now Mobile アプリケーションを使用してインスタンスにログインします。
2. [自分のアクティブなタイムシート] からタイムシートを開きます。
3. 時間を更新する日を選択します。
4. 時間を更新するタスクをタップします。
5. テキストボックスの時間を更新します。
6. デバイスのキーボードを使用して変更を保存します。

タイムカードを管理

モバイルデバイスでタイムカードを表示、編集、または削除します。

始める前に
必要なロール：timecard_user

このタスクについて
モバイルデバイスを使用して、タイムカードの送信、メモの表示、メモの追加、リソース計画の編集、またはタイムカードの削除などのアクションを実行して、タイムカードを管理します。

手順

1. Now Mobile アプリケーションを使用してインスタンスにログインします。
2. [タイムシート] タブからタイムシートを開きます。
3. [すべての週] タブで、タスクのアクションメニューをタップします。
4. タイムカードを管理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

モバイルデバイスからタイムカードを送信

その週のタイムカードが作業した時間で更新されると、モバイルアプリケーションからタイムカードを送信できます。

始める前に
必要なロール：timecard_user

手順

1. Now Mobile アプリケーションを使用してインスタンスにログインします。
2. タイムシートを開きます。
   未送信のカードは、[処理待ち] ステータスになります。却下の原因となった問題を修正した後、却下ステータスのカードを送信することもできます。
3. タイムシート上のタイムカードのアクションメニューをタップし、[タイムカードを送信] を選択します。

タスクの結果

- タイムカードが [送信済み] ステータスに移行します。
- タイムカードは、ユーザーに割り当てられたタイムシートポリシーの[プロジェクト時間の承認者]フィールドと[プロジェクト以外の時間承認者]フィールドに設定された値に基づいて承認者に送信されます。

> **注:**
> タイムカードの送信後にプロジェクトまたはユーザーマネージャーが変更された場合、タイムカードは承認のために新しいプロジェクトまたはユーザーマネージャーに自動的にリダイレクトされます。

モバイルデバイスからタイムシートを送信

作業した時間でタイムシートを更新したら、その週のタイムシートとその週のすべてのタイムカードをモバイルアプリケーションから一緒に送信できます。

始める前に
必要なロール：timecard_user

手順

1. Now Mobile アプリケーションを使用してインスタンスにログインします。
2. 送信するタイムシートを開きます。
3. 次のいずれかのオプションを使用して、タイムシートを送信します。
   - アクションアイコンをタップし、[タイムシートを送信] をタップします。
   - 画面の下部にある [タイムシートを送信] をタップします。

   タイムシートは、自分にアサインされたタイムシートポリシーに対して検証されます。タイムシートポリシーが未アサインの場合は、デフォルトのタイムシートポリシーに対して検証されます。
   - タイムシートがタイムシートポリシー要件を満たしている場合、タイムシートが送信されます。タイムシートに関連付けられているすべてのタイムカードも自動的に送信され、[送信済み] ステータスに移行します。
   - タイムシートがタイムシートポリシー要件を満たしていない場合、検証エラーが表示されます。エラーメッセージで示された問題を解決し、タイムシートを再送信してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

モバイルデバイスからのタイムシートまたはタイムカードの承認または却下

ユーザーマネージャーは、タイムシートを承認または却下することで、特定の週のユーザーのすべてのタイムカードをモバイルデバイスからワンステップで承認または却下できます。

始める前に

必要なロール：timecard_approver または timecard_admin

このタスクについて

ユーザーマネージャーは、いずれかの必要なロールを持つユーザーです。タイムシートを承認または却下できるマネージャーは、タイムカードユーザーのユーザーフォームの [マネージャー] フィールドで選択されます。

マネージャーは、タイムシート承認者として必要なロールを持つ別のユーザーに委任することができます。委任されたユーザーは、指定された期間、タイムカードユーザーが送信したすべてのタイムシートを受信して処理します。

手順

1. Now Mobile アプリケーションを使用してインスタンスにログインします。
2. [タイムシート] リストで、承認または却下するタイムシートを開きます。
3. タイムシートまたはタイムカードを承認または却下します。
   - チームのタイムシートを承認するには、[チームの承認要求] セクションで、承認 ( ) アイコンをタップします。
   - チームのタイムシートを却下するには、[チームの承認要求] セクションで、却下 ( ) アイコンをタップします。
   - タイムシートを承認するには、アクションアイコンをタップして [タイムシートを承認] を選択するか、画面の下部にある [タイムシートを承認] ボタンをタップします。
   - タイムシートを却下するには、アクションアイコンをタップして [タイムシートを却下] を選択するか、画面の下部にある [タイムシートを却下] ボタンをタップします。
   - 特定のタイムカードを承認するには、アクションメニューをタップし、[タイムカードを承認] をタップします。
   - 特定のタイムカードを却下するには、アクションメニューをタップし、[タイムカードを却下] をタップします。

タスクの結果

- タイムシートが [承認済み] または [却下] ステータスに移行します。
- タイムシートに関連付けられているすべてのタイムカードも、自動的に承認または却下されます。
- タスクタイプ以外のタイムカードは、[処理済み] ステータスに移行します。
- タイムシート内のいずれかのタイムカードが承認者の誰かによる承認待ちの場合、シートは [送信済み] ステータスのままになります。
- タイムシート内のタイムカードが [却下] ステータスの場合、タイムシート内の他のタイムカードのステータスに関係なく、タイムシートも [却下] ステータスに移行します。

タイムシートを追跡

提出日 (今週、先週、またはそれ以前など) に従ってグループ化されたタイムシートを表示および追跡します。

始める前に

必要なロール：timecard_approver または timecard_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. Now Mobile アプリケーションでインスタンスにログインします。
2. タイムシートリストから、[すべて] セクションに移動し、進むアイコンをタップします。
3. 現在または前の週のさまざまな状況 (送信済み、処理待ち、承認済み、取り消し済みなど) のタイムシートを表示します。
   - 今週のタイムシートを表示するには、[今週] タブをタップします。
   - 先週のタイムシートを表示するには、[先週] タブをタップします。
   - 以前の週のタイムシートを表示するには、[それ以前] タブをタップします。

モバイルデバイスで処理済みのタイムシートまたはタイムカードを取り消す

ユーザーマネージャーは、承認済みまたは処理済みステータスの誤ったタイムシートまたはタイムカードを取り消して、送信者に戻すことができます。送信者は必要な変更を行い、タイムシートまたはタイムカードを再送信できます。

始める前に
必要なロール：timecard_approver または timecard_admin

手順

1. Now Mobile アプリケーションを使用してインスタンスにログインします。
2. [チーム承認要求] セクションのタイムシートリストから、取り消すタイムシート、または取り消すタイムカードを含むタイムシートを開きます。
3. タイムシートまたはタイムカードを取り消します。
   - 承認されたタイムシートを取り消すには、[すべて] のタイムシートセクションに移動し、[今週]、[先週]、または [それ以前] タブからタイムシートを選択して、取り消し ( ) アイコンをタップします。
   - タイムシートを取り消すには、アクションアイコンをタップして [タイムシートを取り消す] を選択するか、画面の下部にある [タイムシートを取り消す] ボタンをタップします。
   - 特定のタイムカードを取り消すには、アクションアイコンをタップし、[タイムカードを取り消す] をタップします。

ファイナンシャルマネジメント - 従来

ServiceNow® ファイナンシャルマネジメント アプリケーションを使用して、組織内で経費を割り当て、追跡、およびレポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:

2021 年 3 月以降、ファイナンシャルモデリングは有効化できなくなりました。

- 新規顧客：現在ファイナンシャルモデリングのエンタイトルメントがなく、その使用に興味がある場合は、パートナーストアアプリに連絡してください。ServiceNow 実装パートナーがパートナーストアアプリの詳細をお手伝いします。
- 既存の顧客：
  - 現在ファイナンシャルモデリングのエンタイトルメントがあるが実装していない場合は、パートナーストアアプリに連絡してください。ServiceNow 実装パートナーがパートナーストアアプリの詳細をお手伝いします。
  - ファイナンシャルモデリングのエンタイトルメントを既に実装している場合は、引き続き使用できます。ServiceNow サポートチームは、実装された方法で引き続きアプリケーションをサポートします。

    将来、アプリケーションの拡張はパフォーマンスに対してのみ行われ、機能に対しては行われません。

財務計画、実際の経費、および予算業務の詳細については、この 5 分間のビデオをご覧ください。ファイナンシャルマネジメントにおけるファイナンシャルプラン、実績経費、予算業務に関する情報

アプリケーションは、総勘定元帳から経費を抽出するために使用できる視覚的なツールであるワークベンチを提供します。また、これを使用して経費を処理し、IT が使用する機能にマッピングすることもできます。支出のうち IT に関連する金額を正確に把握するためのさまざまなレポートも用意されています。

ファイナンシャルマネジメントアプリケーションは Fuji リリースから利用可能です。Fuji リリースより前のファイナンシャルマネジメントアプリケーションのモジュールは、IT コスト管理に含まれています。

ファイナンシャルマネジメントの仕組み

ファイナンシャルマネジメントアプリケーションは、次のコンポーネントを使用します。

- 総勘定元帳：組織経費のリスト。
- 会計期間：経費が発生した期間。一度に作業できる会計期間は 1 つだけです。
- コストモデル：セグメントの階層内のアカウントに経費を割り当てる方法をアプリケーションに指示する基礎となるレコード。
- 割り当てエンジン：コストモデルを使用して経費を計算し、経費を割り当てる方法を決定するアプリケーションの中核。
- 財務レポートとダッシュボード：経費がどこから来ているかを示す経費割り当てのグラフィカル表現。

ワークベンチでは、会計期間を選択し、コストモデルをビルドし、割り当てエンジンを実行できます。

ビジネスアプリケーションに関連する重要なデータを追跡するために使用できるビジネスアプリケーション原価計算コストモデル専用のダッシュボードがあります。

要件

ファイナンシャルマネジメントを使用するには、次の条件が必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- すべての財務概要レポートとダッシュボードレポートが正しく機能するようにするために、インスタンスで Report Charting v2 を有効にします。
- Internet Explorer を使用している場合は、バージョン 11 以降を使用してください。他の一般的にサポートされている Web ブラウザーを使用することもできます。

ファイナンシャルマネジメント - 従来版とともにインストールされる内容

ファイナンシャルマネジメントアプリケーションにはいくつかのコンポーネントがインストールされています。

デモデータはファイナンシャルマネジメントで利用できます。デモデータは、セグメント情報、割り当て、および経費のサンプル階層を提供します。

ファイナンシャルマネジメント - 従来とともにインストールされるテーブル

ファイナンシャルマネジメントは、次のテーブルを追加します。

テーブル	説明
実績ログ [itfm_actuals_run_log]	関連する計画定義に対して生成された実績とキーのログ。
基本ステートメントのアイテムブレークダウン [itfm_charge_item_breakdown]	ステートメントアイテムブレークダウンの定義。
ブレークダウンの関係性 [itfm_breakdown]	ステートメントアイテムブレークダウンの定義。
バケット [itfm_bucket]	類似の経費をグループ化するために割り当てワークベンチで使用されるバケット。
バケットアカウント割り当て [itfm_bucket_account_allocation]	バケット割り当て情報。
バケット割り当てアカウント [itfm_bucket_allocation_account]	バケット、アカウント、およびコストモデル間の参照リンク。
バケット割り当てルール [itfm_bucket_allocation_rule]	経費をバケットに割り当てます。
予算 [itfm_budget]	最終予算。
実績予算 [itfm_cl_actuals]。	実際の経費。
予算定義 [itfm_plan_definition]	名前、予算計画の年スパン、予測期間、所有権、予測頻度などのメタデータを保持する予算業務の親テーブル。
予算予測 [itfm_budget_forecast]	すべての予算予測。
予算予測アイテム [itfm_bf_item]	予算予測のすべてのアイテム。
予算キー [itfm_plan_key]	予測と計画を識別するために使用されるキー。
予算メモ [itfm_budget_note]	予算差異レポートに入力する予算に関するメモ。
予算の上書きカテゴリ [itfm_budget_override_categories]	予算の上書きを分類するために使用するカテゴリ。
予算期間 [itfm_budget_period]	予算期間。
予算参照レート構成 [itfm_fx_config]	為替レート/会計期間の関係。
予算参照レート [itfm_fx_rate]	予算で使用される為替レート。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
予算セグメントマップ [itfm_budget_segment_map]	予算が使用するセグメントと予算キーの間の関係。
予算目標 [itfm_budget_target]	すべての予算目標値。
予算タスク [itfm_budget_task]	予算タスク。
事業部門 [business_unit]	すべての事業部門。
クレンジング条件 [itfm_cleansing_condition]	ワークベンチのデータをクリーンアップするときにアプリケーションが自動的に生成する条件。
消費ブレークダウン [itfm_charge_item_breakdown_cons]	ユーザー定義の消費テーブルに基づくステートメントアイテムのブレークダウン定義。
消費ステートメントアイテム [itfm_charge_item_cons]	ユーザー定義の消費テーブルに基づくステートメントアイテムのショーバックソース定義。
コスト割り当て [itfm_account_allocation]	各アカウントとの間で行われる割り当ての包括的なビュー。
コスト割り当て [itfm_allocation]	割り当てから処理されるすべての割り当て明細。このテーブルには、コスト割り当て集計テーブルと比較してより詳細なレベルの割り当て明細が保持されます。
コスト割り当てブレークダウン集計 [itfm_allocation_breakdown]	コスト割り当てブレークダウンの関係性に基づいて作成された割り当て明細。
コスト割り当てグループ [itfm_cost_allocation_group]	割り当てに関連付けることができるグループ。
コスト配分評価指標 [itfm_cost_allocation_metric]	重み付けおよびカスタム割り当て方法で使用されるメトリクス。
コスト割り当て集計 [itfm_allocation_aggregate]	コスト割り当て [itfm_allocation] テーブルに保存されるよりも簡単な割り当て明細データのセット。
コスト割り当てロールアップ [itfm_rollup]	ワークベンチを使用するときにアプリケーションによって作成されるロールアップ。
コスト割り当てロールアップ上書き [itfm_rollup_override]	割り当てロールアップを上書きするために使用できる値。
コスト割り当て実行ログ [itfm_ca_run_log]	実行されたすべての割り当てのログ。
コストモデルブレークダウン [itfm_charge_item_breakdown_cm]	ファイナンシャルモデリングの出力に基づくステートメントアイテムのブレークダウン定義。
コストモデルステートメントアイテム [itfm_charge_item_cm]	ファイナンシャルモデリングの出力に基づくステートメントアイテムのショーバックソース定義。
財務データソース [itfm_data_source]	財務データのソース：ステージング済みの総勘定元帳またはコスト計画のブレークダウン。
財務データソースフィールドマップ [itfm_data_source_field_map]	財務データのソースにマッピングされた個々のフィールド。
財務モデル [itfm_cost_model]	財務コストモデル。
FM レポート [itfm_report]	財務レポート。
予測期間 [itfm_forecast_period]	予測期間。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
総勘定元帳アカウント [itfm_cl_accounts]	アカウントと関連するアカウント番号。
総勘定元帳クレンジング済みデータ [itfm_cl_data_cleansed]	クレンジングされる総勘定元帳の経費。
総勘定元帳ログ [itfm_gl_log]	会計期間の総勘定元帳に経費が追加されたときに作成されるログレコード。
総勘定元帳ステージング済みデータ [itfm_gl_data_staged]	クレンジングも調整もされていないインポート済み経費。
調整済み総勘定元帳データ [itfm_cl_data_groomed]	調整された総勘定元帳の経費。
調整条件 [itfm_grooming_condition]	ワークベンチでの財務調整プロセス中にアプリケーションが作成する条件。
ITCOA 定義 [itfm_itcoa_definition]	コストモデルの参照フィールドマッピング。
IT シェアードサービス [itfm_shared_service]	IT インフラストラクチャ全体で共有されるサービス。
IT シェアードサービスタイプ [itfm_shared_service_type]	IT シェアードサービスに関連付けられているカテゴリ。
ITFM セッション [itfm_session]	ワークベンチのセッション情報を保存します。
メインレポート構成 [itfm_ca_main_config]	メインのファイナンシャルマネジメントレポートの構成設定。
計画実績 [itfm_plan_actuals]	ステージング済みソース経費ラインからの予算定義に基づいて作成された実際のアイテム。
計画実績のブレークダウン [itfm_ai_breakdown]	各会計期間におけるアイテムの実績金額のブレークダウン。
計画コア [itfm_plan_core]	計画の名前、元の計画、予算通貨などのメタ情報。itfm_plan および itfm_plan_versions はテーブルから拡張されます。
計画アイテムブレークダウン [itfm_pi_breakdown]	特定の計画アイテムのコストのブレークダウン。
計画アイテム実行 [itfm_plan_item_execution]	単位コストと計画アイテムの有効性。
計画アイテム [itfm_plan_item]	アカウント番号、予算金額、予測金額、実績金額、資産、プロジェクト、カタログ、契約に関連付けられた属性などの財務詳細。
計画 [itfm_plan]	予算キーと計画の会計年度の詳細を関連付けます。
計画者 [itfm_planner]	予算キーの所有者。
計画テンプレート列 [itfm_plan_template_column]	予算定義のテンプレート列として列を定義します。
計画バージョン [itfm_plan_versions]	各プランの昇格時に作成されるプラン。
計画ビューアー [itfm_plan_viewer]	計画を表示するためのアクセス。
年次詳細計画 [itfm_plan_year_details]	年間計画の詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
計画データソースフィールドマップ [itfm_plan_data_source_field_map]	計画立案データソースフィールドマップ
計画立案ログ [itfm_plan_run_log]	計画立案ログ。
レポートエンティティ [itfm_reporting_entity]	ユーザーまたはグループに割り当てられたレポートエンティティ。
セグメント定義 [itfm_ca_segment_map]	セグメントの階層で指定されたセグメント。
セグメントグループアカウント [itfm_group_segment_acct]	グループ化された ITCOA アカウント。
セグメント関係 [itfm_itcoa_hierarchy]	ワークベンチのデータ定義ステージで定義されたセグメント階層内のセグメント間の関係。
サービスカタログブレークダウン [itfm_charge_item_breakdown_sc]	サービスカタログ要求に基づくステートメントアイテムのブレークダウン定義。
サービスカタログステートメントアイテム [itfm_charge_item_sc]	サービスカタログ要求に基づくステートメントアイテムのショーバックソース定義。
サービスの課金ライン [itfm_charge_line]	個々のショーバックライン
サービスの課金ラインドリルダウン [itfm_charge_line_drilldown]	個々のショーバックラインのドリルダウン。
サービスの課金価格レートカード [itfm_sc_price_rate_card]	ショーバック価格レートカード。
ショーバックステートメント [itfm_sb_stmt]	ショーバックステートメント。
ショーバックステートメントの定義 [itfm_sb_stmt_def]	ショーバックステートメント定義。
ショーバックステートメントラインの定義 [itfm_sb_stmt_def]	ショーバックステートメントライン定義。
ショーバックステートメントライン単位コストの定義 [itfm_sb_stmt_line_unit_cost_def]	ショーバックステートメントライン単位コスト定義。
兄弟ロールアップ関係 [itfm_sibling_relationship]	兄弟セグメントロールアップ関係定義。
ステートメント異議申し立て [itfm_dispute]	ショーバックの異議申し立て。
ステートメント経費ライン [itfm_charge_expense_line]	個々のショーバックステートメントの経費アイテム。
ステートメント経費ラインの詳細 [itfm_charge_expense_line_details]	詳細なショーバック経費情報。
ステートメントアイテム [itfm_charge_item]	ショーバックステートメント定義。
ステートメントアイテムドリルダウン [itfm_chg_item_drilldown]	ステートメントアイテムドリルダウンの定義。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
単位コストメトリクス [itfm_segment_unit_metrics]	単位コストメトリクスの定義。
単位コスト [itfm_unit_cost]	コスト割り当てによって生成された単位コストライン。
重み付けマップ実行ログ [itfm_weight_map_run_log]	重み付けマップ生成ログ。
重み付けマップ [itfm_weight_map]	アプリケーションが重み付けされたメトリクスを計算するために使用する重み付けの関係。

アプリケーションは、会計カレンダーによって作成されたこのテーブルも使用します。

会計カレンダーのテーブル

テーブル	説明
会計期間 [fiscal_period]	会計カレンダーおよび会計カレンダーで使用される期間。

ファイナンシャルマネジメント - 従来とともにインストールされるユーザーロール

ファイナンシャルマネジメントは、次のユーザーロールを追加します。

ロール	説明	ロールを含む
cost_transparency_admin	すべての ファイナンシャルモデリングメニューとモジュールにアクセスできます。	• cost_transparency_analyst • cost_transparency_owner
cost_transparency_user	総勘定元帳および割り当てレコードへの読み取り専用アクセス権があります。	なし
cost_transparency_analyst	ファイナンシャルモデリングモジュールとワークベンチにアクセスできます。	cost_transparency_user
sn_itfm_read	ベースシステムによって提供される FM APM ダッシュボードと、ダッシュボードのデータが取得される基礎となるテーブルを表示するためにアクセスします。 ファイナンシャルマネジメントアプリケーションの TCO ダッシュボード、ビジネスアプリケーション向け原価計算ダッシュボード、CIO ダッシュボードを表示します。	• pa_viewer • cmdb_read
service_charging_analyst	• 課金アイテムを作成、更新、削除、および表示できます。 • 課金アイテムブレークダウンを作成、更新、削除、および表示できます。	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロール	説明	ロールを含む
	• 課金アイテムドリルダウンを作成、更新、削除、および表示できます。 • ショーバックステートメント定義を作成、更新、削除、および表示できます。 • ショーバックステートメントライン定義を作成、更新、削除、および表示できます。 • ショーバックステートメントを生成して公開します。	
service_charging_owner	• 課金アイテムを表示します。 • サービスの課金コンソールにアクセスして、価格設定ポリシーを確認および設定します。 • 利用可能なブレークダウンとドリルダウンを使用して、課金アイテムのドリルダウンを確認します。	
showback_user	• ショーバックステートメントを表示します。 • ショーバックステートメントを受け入れます。	

自動翻訳

ファイナンシャルマネジメント - 従来型の読み取り専用ロール

ファイナンシャルマネジメント (FM) ダッシュボードを表示できる読み取り専用ロールを使用して、ユーザーのアクセスレベルを制限できます。読み取り専用ロールを持つユーザーは、FM レポートと、データを提供する基礎となるテーブルを表示できます。

プラグイン情報

新規のお客様の場合、PPM Standard (com.snc.pmo_read_roles) プラグインの読み取り専用ロールが zBoot で有効化されます。ただし、APM のファイナンシャルマネジメント (com.snc.financial_management_for_apm) プラグインも必要です。これにより、パフォーマンスアナリティクス – コンテンツパック – アプリケーションポートフォリオ管理のファイナンシャルマネジメント (com.snc.pa.fm.apm) プラグインが有効になります。このプラグインを使用すると、FM APM ダッシュボードにアクセスできます。

FM に読み取り専用ロールがある理由

ファイナンシャルマネジメント (sn_itfm_read) の読み取り専用ロールは、PPM Standard プラグイン (com.snc.pmo_read_roles) の読み取り専用ロールが有効になっている場合に使用できます。このロールを持つユーザーは、アプリケーションポートフォリオ管理のファイナンシャルマネジメントでダッシュボードにアクセスし、レポートを表示できます。読み取り専用ロールを含むユーザーロールを割り当てるには、「ユーザーへのロールの割り当て」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

FM 読み取りロールを持つユーザーがアクセスできるダッシュボード

読み取り専用ロールを持つユーザーが使用できるダッシュボードは次のとおりです。

- ファイナンシャルマネジメントアプリケーションの TCO ダッシュボード
- ビジネスアプリケーション原価計算ダッシュボード
- CIO ダッシュボード

FM 読み取りロールを持つユーザーがアクセスできるテーブル

FM 読み取りロールを持つユーザーがアクセスできる ファイナンシャルマネジメント テーブルは次のとおりです。

FM テーブル

ラベル	テーブル名
コスト割り当て集計	itfm_allocation_aggregate
コスト割り当て	itfm_allocation
財務モデル	itfm_cost_model
バケット	itfm_bucket
セグメント定義	itfm_ca_segment_map
IT シェアードサービス	itfm_shared_service
コスト割り当てブレークダウン集計	itfm_allocation_breakdown

ドメインセパレーションと ファイナンシャルマネジメント - 従来

ファイナンシャルマネジメント ではドメインセパレーションはサポートされていません。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル: サポートなし

- ドメインフィールドがデータテーブル に存在している可能性がありますが、データを管理するロジックがありません。
- このレベルでは、ドメイン分割は考慮されません。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート」を参照してください。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

ライセンスされた APM ユーザー向けファイナンシャルマネジメント - 従来


エンタープライズアーキテクチャ (以前の アプリケーションポートフォリオ管理) ライセンスを取得したユーザーがファイナンシャルマネジメントを使用している場合、ベースシステムは、ビジネスアプリケーションのコストを所定のメトリクスとともに評価するために使用できるビジネスアプリケーション原価計算コストモデルを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスアプリケーション原価計算コストモデル

ビジネスアプリケーション原価計算コストモデル



ビジネスアプリケーション原価計算コストモデルの仕様は次のとおりです。

- コストバケットレイヤーは ITFM バケットテーブル [itfm_bucket] に関連付けられており、コストバケットはモデルに固有です。
- IT シェアードサービスセグメントアカウントは、IT シェアードサービステーブル [itfm_shared_service] から供給されます。
- ビジネスアプリケーションセグメントアカウント (このモデルの中間層) は、ビジネスアプリケーション [cmdb_ci_business_app] テーブルから供給されます。このテーブルは、アプリケーションセグメントに対するアカウントのソースです。または、アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルまたは他のカスタムテーブルにすることもできます。
- 事業部門レイヤーは、プラットフォーム事業部門テーブル [business_unit] に関連付けられています。
- このコストモデルにはデータソースがありません。つまり、総勘定元帳から取得するのではなく、モデルに直接支出情報を入力する必要があります。支出情報のソースとして総勘定元帳を使用することは、構成可能なオプションの機能です。詳細については、「コストモデルのデータソースを変更するための前提条件」を参照してください。

シードされた **IT** シェアードサービス

IT シェアードサービス：エンドユーザーコンピューティング

IT シェアードサービス：エンドユーザーに装備：パーソナル (共有ではない) デバイスをエンドユーザーに提供するために費やした資金、これらのデバイスで実行されるソフトウェア、およびこれらのデバイスの機能の作成と維持に関連するサポートを保持するコスト収集コンテナーです。このコンテナーには、進行中の変更の円滑化コンテナー内で取得される主要なデバイスのアップグレード、リースサイクルの売上高、およびその他の補充関連コストは含まれません。

IT シェアードサービス：データベース

IT シェアードサービス：構成変更の促進は、ITSM の変更、リリース、および構成管理プロセスのサポートに費やされた資金を保持するコスト収集コンテナーです。つまり、進行中、日次、共通、およびアドホックの構成変更の管理に費やされた金額です。これには、パッチ適用 (セキュリティ関連以外)、ファームウェアの更新、ハードウェア/ソフトウェア構成設定の変更、ハードウェアコンポーネントのインストール、アンインストール、アップグレード、および IT ランドスケープ全体での一般的な追加、移動、または変更要求などのアクティビティが含まれます。このコンテナーは、プロジェクト計画や資金を確保する必要がある環境の大部分での主要なアップグレードや変更を除外します。

IT シェアードサービス：ネットワーク

IT シェアードサービス：Facilitate Connectivity は、企業へのすべてのデバイスネットワーク接続、そのコンピューティングおよび/または知識資産、それを行うためのハードウェアとソフトウェア、およびアクセスの作成 (および維持) に関連するサポー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トの提供に費やされた費用を保持するコスト収集コンテナーです。これには、すべての個人用デバイスとエンタープライズデバイスが含まれます。このコンテナーには、「環境の監視」コンテナーに取り込まれた監視ハードウェア、ソフトウェア、および人件費は含まれません。

IT シェアードサービス：IT 管理

IT シェアードサービス：管理およびオーバーヘッドは、IT 役員報酬に費やされた金額のほか、IT 運用、コンプライアンスまたは監査コスト、その他未分類のコストの存在に適用される 1 回限りの課金アイテムを保持するコスト収集コンテナーです。このコンテナーは、他の IT プロセス定義で取得または計上されたコストを除外します。

IT シェアードサービス：データセンター

IT シェアードサービス：環境の監視は、ITOM イベント管理プロセスのサポートに費やされた資金を保持するコスト収集コンテナーです。つまり、IT 全体の監視に費やされた金額です。これには、エンドポイント接続速度、エンドポイントアプリケーションパフォーマンステスト、ハードウェア/ソフトウェア/ネットワーク/ストレージしきい値チェック、運用管理担当者が使用する障害およびイベント相関管理ツールが含まれます。このコンテナーは、他のプロセス領域で言及されているセキュリティ固有のサービスやクラウド監視サービスを除外します。

IT シェアードサービス：IT 運用

IT シェアードサービス：アップグレード/メインテナンスの実行は、ITSM の変更、リリース、および構成管理プロセスのサポートに費やされた資金を保持するコスト収集コンテナーです。つまり、計画されたプロジェクトおよび/または特別に資金提供された主要なアップグレードの管理に費やされたすべての金額です。これには、広範な OS アップグレード、ハードウェア交換サイクルアクティビティ、および IT ランドスケープ全体にわたる内部またはサードパーティのビジネスまたは IT 管理ソフトウェアパッケージのリリース更新などのアクティビティが含まれます。このコンテナーは、変更チケットの実行のみを必要とする進行中、日次、共通、およびアドホック構成の変更を除外します。

IT シェアードサービス：サービスデスク

IT シェアードサービス：技術サポートの提供は、ITSM インシデント、問題、およびナレッジ管理プロセスのサポートに費やされた資金を保持するコスト収集コンテナーです。つまり、組織全体のエンドユーザーにテクニカルサポートサービスを提供するために費やした費用です。これには、階層 1、2、および 3 の担当者、インシデントまたは問題管理ソフトウェア、根本原因分析時間、ルーチンまたはアドホック支援 (パスワードのリセット、Q&A の方法)、および/または標準運用手順ガイダンスが含まれます。このコンテナーは、文書化された変更チケットによって実行されたエンドユーザーや企業資産に対する実際の構成変更を除外します。

IT シェアードサービス：アプリケーション

IT シェアードサービス：ビジネスアプリケーションの実行は、ビジネスアプリケーションの運用を維持するために継続的な人事時間に費やされた金額を保持するコスト収集コンテナーです。これには、アプリケーション専用のリソースが含まれ、IT やインフラストラクチャの運用コストは含まれません。

IT シェアードサービス：セキュリティとコンプライアンス

IT シェアードサービス：Secure the Environment は、Security Operations のサポートに費やされた資金を保持するコスト収集コンテナーです。つまり、企業の IT ランドスケープ全体で情報セキュリティを提供するために費やされた金額です。これには、すべてのデスクトップ、ラップトップ、スマートフォン、ネットワーク機器、サーバー、データベース、およびアプリケーションに加えて、個々のユーザーエンドポイントデバイス、クラウドアプリケーション、クラウドコンピューティング、および/またはすべてのタイプのオンプレミスコンピューティングリソースが含まれます。これには、データセンターおよびオフィススペースカードリーダーに関連する物理的なセキュリティコストは含まれません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IT シェアードサービス：ストレージ

IT シェアードサービス：データの保存と管理は、構造化データと非構造化データの管理に関連する基盤となるツールと基本的なアクティビティ (暗号化、バックアップ、パージ、アーカイブ、移行、DR レプリケーションなど) および/ またはストレージ容量 (たとえば、再編成や過剰容量の取得) に費やされた金額を保持するコスト収集コンテナーです。これには、これらのタイプのアクティビティと、データおよびストレージ状況の健全性を確保するために使用されるすべての人員権限が含まれます。このコンテナーは、個人および特定のアクティビティによって使用されるエンドユーザーデバイスのローカルストレージに関連する要素と、特定のアプリケーションまたはシステムに関連する可能性のある割り当てられたストレージを除外します。

IT シェアードサービス：コンピューティング


IT シェアードサービス：供給計算能力は、既存の基本要素の提供に費やされた費用、維持に費用がかかるが、災害復旧施設や契約、ハードウェアの予備インベントリ、オンプレミス UPS システム、およびジェネレーターなど、実際には使用されない可能性のあるコスト収集コンテナーです。また、スペース、電力、冷却などに関連する毎日のアクティブなデータセンターのコストも含まれます。

ITFM で規定されたメトリクス

アクティブユーザー数に基づいてアプリケーションに割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたメトリクスに基づいて共有サービスコストをアプリケーションに割り当てます。

アクティブユーザー数を使用してアプリケーションに割り当てる




- ビジネスアプリケーション [cmdb_ci_business_app] テーブルには、すべてのビジネスアプリケーションのリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、アクティブなユーザーの合計を実行し、**[Sys ID]** による受信アプリケーションに応じてコストを重み付けします。

計算能力に基づいてアプリケーションに割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたテーブルに基づいて共有サービスコストをアプリケーションに割り当てます。

計算能力に基づいてアプリケーションに割り当てる

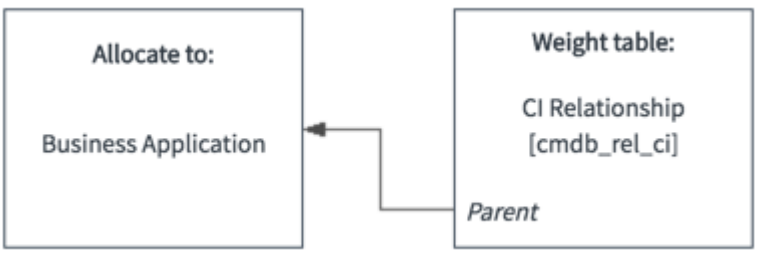

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルには、構成アイテム間のすべての関係のリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、Child.Class = Server の構成アイテムのカウントを実行し、受信アプリケーションに応じてコストを重み付けします。

人数によって事業部門に割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたテーブルに基づいて共有サービスコストを事業部門に割り当てます。

人数によって事業部門に割り当てる

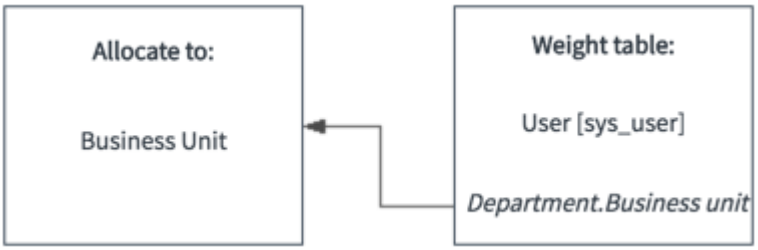

- ユーザー [sys_user] テーブルには、すべてのシステムユーザーとその関連部門のリストが表示されます。
- 部門 [cmn_department] テーブルには、すべての部門とその関連事業部門のリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、事業部門あたりのユーザー数をカウントし、それに応じてコストを重み付けします。

  フィルター基準：アクティブなユーザーのみをカウントします。

ビジネスアプリケーション原価計算コストモデルのダッシュボード

ビジネスアプリケーション原価計算コストモデルでアクセスできるパフォーマンスアナリティクスダッシュボードは 3 つあります。それらは次のとおりです。

- アプリケーション TCO ダッシュボード。
- ビジネスアプリケーション原価計算ダッシュボード。
- ビジネスアプリケーション用の CIO ダッシュボード。ビジネスアプリケーション用の CIO ダッシュボード。

ビジネスアプリケーション原価計算コストモデルの構成 - 従来

経費を割り当てるビジネスアプリケーション原価計算コストモデルを構成し、要件に合わせて会計期間のバケットコストラインを生成します。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_analyst

手順

1. 移動先 すべて > **APM** のファイナンシャルモデリング > ビジネスアプリケーションの原価設定モデル.

   財務モデル - [ビジネスアプリケーション] フォームのフィールド値は事前に入力されています。ビジネスアプリケーション原価計算コストモデルのモデル所有者とユーザーグループを入力できます。このコストモデルのデータソースはありません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

2. フォームで、必須フィールドを更新します。

財務モデル – [ビジネスアプリケーション原価計算] フォーム

フィールド	説明
名前	コストモデルの名前。
説明	コストモデルの簡単な説明。
モデル所有者	コストモデルを所有するユーザー。
データソース	コストモデルのデータのソース。 このコストモデルにはデータソースがないため、このフィールドは編集できません。
ユーザーグループ	コストモデルにアクセスできるユーザーのグループ。
サブバケット情報を含める	サブバケット情報を表示するオプション。選択すると、生成されたコストラインとブレークダウンラインにサブバケット情報が保持されます。

3. **[Update** (更新)] をクリックします。
4. コスト割り当てを実行するには、[経費割り当て] ボタンをクリックします。

> **注:**
> アナリストのライセンスを受けていない顧客である場合は、各セグメントのアカウント数とコストモデルのアカウントの合計数がそれぞれ 4000 と 12000 のしきい値内にあることを確認してください。

必ずしもワークベンチからではなく、コストモデルフォームからコスト割り当てを実行するには、このオプションを使用します。

a. [経費割り当て] ダイアログボックスで会計期間を選択します。

b. **[OK]** をクリックします。

割り当てエンジンが実行され、選択した会計期間のコスト割り当てが生成されます。エンジンはクレンジングとバケットを実行します。経費を割り当て、割り当て明細を作成します。ただし、コストモデルにデータソースがない場合、エンジンはクレンジングステージとバケットステージを無視して、割り当て明細を作成します。

5. コストモデルに関連付けられたリーフバケットのコスト行を生成するには、[バケットコストを生成] ボタンをクリックします。

データソースのないこのコストモデルのバケット金額行を生成するには、このオプションを使用します。それ以上サブバケットがないリーフバケットごとにコスト行が生成されます。バケットに金額がない場合でも、調整済みの総勘定元帳データ [itfm_gl_data_groomed] テーブルに金額行が生成され、[金額] 列にゼロが入力されます。テーブルには、選択した会計期間のコストモデルに関連付けられたバケット、サブバケット、および金額が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [バケットコストを生成] ダイアログボックスで会計期間を選択します。

b. **[OK]** をクリックします。

- バケットに金額がない場合でも、割り当てエンジンは、コストモデルの選択された会計期間に対して、経費ゼロの調整済み行を生成します。
- その会計期間のバケットに金額がある調整済み行が既に存在する場合、エンジンはそれらのコスト行を上書きしません。

[金額] 列を編集して、各サブバケットの金額を入力できます。

6. バケット金額を表示するには、次に移動します: **APM** のファイナンシャルモデリング > バケット金額.

   詳細については、「データソースのないコストモデルの調整済みラインを作成する」を参照してください。

7. このコストモデルに関連付けられているバケットを表示するには、次に移動します: **APM** のファイナンシャルモデリング > バケット.


   詳細については、「アカウントのバケットの作成」を参照してください。

8. このコストモデルで利用可能なダッシュボードにアクセスするには、次に移動します: **APM** のファイナンシャルモデリング > **APM** ダッシュボードのファイナンシャルモデリング.

ライセンスされた **SPM** ユーザー向けファイナンシャルマネジメント - 従来

サービスポートフォリオ管理 (SPM) ユーザーで、ファイナンシャルマネジメントを有効にしている場合、ベースシステムはサービスオファリングの原価計算コストモデルを提供します。このコストモデルを使用して、各サービスレベルでの支出額を評価します。ファイナンシャルモデリングは、定義された価格のサービスレベルに基づいて経費を割り当て、コストラインを生成します。

サービスオファリングの原価計算コストモデル



サービスオファリングの原価計算コストモデルの仕様は次のとおりです。

- IT シェアードサービスセグメントアカウントは、IT シェアードサービス [itfm_shared_service] テーブルから供給されます。
- サービスオファリングセグメントアカウントは、サービスオファリング [service_offering] テーブルから供給されます。
- IT シェアードサービスセグメントは、サービスオファリングセグメントにロールアップします。ただし、デフォルトのロールアップの上書きはありません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- すべてのサブバケットは、基本システムセットアップによって提供される IT シェアードサービスのすべてのアカウントに均等に割り当てられます。
- このコストモデルにはデータソースがありません。つまり、総勘定元帳から取得するのではなく、モデルに直接支出情報を入力する必要があります。支出情報のソースとして総勘定元帳を使用することは、構成可能なオプションの機能です。詳細については、「コストモデルのデータソースを変更するための前提条件」を参照してください。
- 経費は、基本システムの均等メソッドによって IT シェアードサービスセグメントからサービスオファリングセグメントに割り当てられます。デフォルトでは、[割り当てセットアップ] ステージで提供される割り当てセットアップは、均等ロールアップメソッドです。必要に応じて、特定の要件に合わせてロールアップメソッドを設定できます。

シードされた **IT** シェアードサービス


「シードされた IT シェアードサービス」のリストを参照してください。

ITFM で規定されたメトリクス

割り当てマップでサービスオファリングに割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたメトリクスに基づいて共有サービスコストをサービスオファリングに割り当てます。

割り当てマップでサービスオファリングに割り当てる




- サービスオファリング割り当てマップ [itfm_service_offering_allocation_map] は、すべてのサービスオファリング割り当てのリストを提供します。この中間テーブルは、IT シェアードサービス [itfm_shared_service] テーブルの IT シェアードサービスと、サービスオファリング [service_offering] テーブルのサービスオファリングを参照します。
- 所定のメトリクスは、シェアードサービスの合計を実行し、受けるサービスオファリングに応じてコストを重み付けします。

関連 CI のサービスオファリングに割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたメトリクスに基づいて共有サービスコストをサービスオファリングに割り当てます。

割り当てマップでサービスオファリングに割り当てる

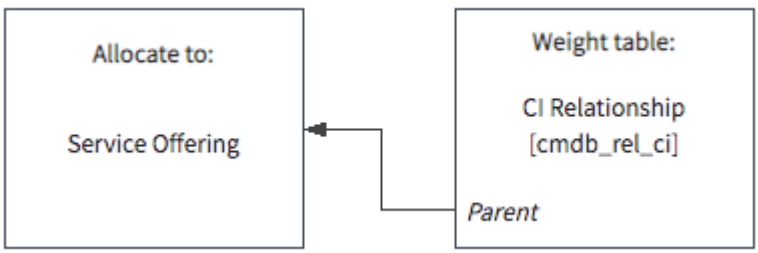


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルには、構成アイテム間のすべての関係のリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、構成アイテムのカウントを実行し、受けるサービスオファリングに応じてコストを重み付けします。

合計登録者でサービスオファリングに割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたメトリクスに基づいて共有サービスコストをサービスオファリングに割り当てます。

合計登録者でサービスオファリングに割り当てる

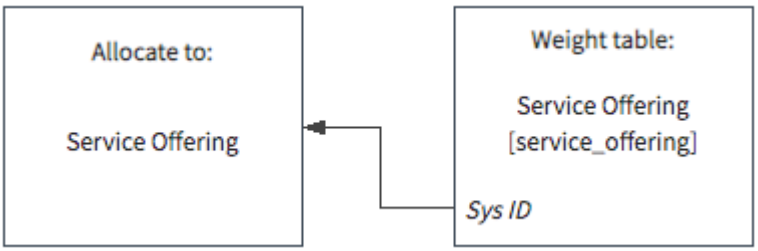

- サービスオファリング [service_offering] テーブルには、すべてのサービスオファリングのリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、すべての登録者の合計を実行し、**[SysID]** 別に受けるサービスオファリングに応じてコストを重み付けします。

サービスオファリングの原価計算コストモデルの構成 - 従来

経費を割り当て、各レベルで提供されるサービスのバケットコストラインを生成するように、サービスオファリングの原価計算コストモデルを構成します。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_analyst

手順

1. 移動先 すべて > **SPM** のファイナンシャルモデリング > サービスオファリングコストモデル.

   財務モデル - [サービスオファリング原価計算] フォームのフィールド値は事前に入力されています。サービスオファリング原価計算コストモデルのモデル所有者とユーザーグループを入力できます。このコストモデルのデータソースはありません。

2. フォームで、必須フィールドを更新します。

財務モデル – [サービスオファリング原価計算] フォーム

フィールド	説明
名前	コストモデルの名前。
説明	コストモデルの簡単な説明。
モデル所有者	コストモデルを所有するユーザー。
データソース	コストモデルのデータのソース。 このコストモデルにはデータソースがないため、このフィールドは編集できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ユーザーグループ	コストモデルにアクセスできるユーザーのグループ。
サブバケット情報を含める	サブバケット情報を表示するオプション。選択すると、生成されたコストラインとブレークダウンラインにサブバケット情報が保持されます。

3. **[Update** (更新)] をクリックします。
4. コスト割り当てを実行するには、[経費割り当て] ボタンをクリックします。

   注:
   アナリストのライセンスを受けていない顧客である場合は、各セグメントのアカウント数とコストモデルのアカウントの合計数がそれぞれ 4000 と 12000 のしきい値内にあることを確認してください。

   必ずしもワークベンチからではなく、コストモデルフォームからコスト割り当てを実行するには、このオプションを使用します。

   a. [経費割り当て] ダイアログボックスで会計期間を選択します。

   b. **[OK]** をクリックします。

   割り当てエンジンが実行され、選択した会計期間のコスト割り当てが生成されます。エンジンはクレンジングとバケットを実行します。経費を割り当て、割り当て明細を作成します。ただし、コストモデルにデータソースがない場合、エンジンはクレンジングステージとバケットステージを無視して、割り当て明細を作成します。

5. コストモデルに関連付けられたリーフバケットのコスト行を生成するには、[バケットコストを生成] ボタンをクリックします。

   データソースのないこのコストモデルのバケット金額行を生成するには、このオプションを使用します。それ以上サブバケットがないリーフバケットごとにコスト行が生成されます。バケットに金額がない場合でも、調整済みの総勘定元帳データ [itfm_gl_data_groomed] テーブルに金額行が生成され、[金額] 列にゼロが入力されます。テーブルには、選択した会計期間のコストモデルに関連付けられたバケット、サブバケット、および金額が表示されます。

   a. [バケットコストを生成] ダイアログボックスで会計期間を選択します。

   b. **[OK]** をクリックします。

   - バケットに金額がない場合でも、割り当てエンジンは、コストモデルの選択された会計期間に対して、経費ゼロの調整済み行を生成します。
   - その会計期間のバケットに金額がある調整済み行が既に存在する場合、エンジンはそれらのコスト行を上書きしません。

   [金額] 列を編集して、各サブバケットの金額を入力できます。

6. バケット金額を表示するには、次に移動します: **SPM** のファイナンシャルモデリング > バケット金額.
7. このコストモデルに関連付けられているバケットを表示するには、次に移動します: **SPM** のファイナンシャルモデリング > バケット.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

8. すべてのサービスオファリング割り当てのリストを表示するには、次に移動します: **SPM** のファイナンシャルモデリング > サービスオファリング割り当てマップ.
9. オプション: [割り当てマップでサービスオファリングに割り当てる] メトリクスを使用し、重み付けメソッドを使用して経費を割り当てます。

   (Optional) サービスオファリング割り当てマップテーブルに保存されている消費データに基づいて、サービスオファリングごとの支出を計算します。

   サービスオファリング割り当てマップテーブルを構成し、重み付けメソッドを使用して経費を割り当てるには、「サービスオファリング割り当てマップを使用して経費を割り当てる」を参照してください。

サービスオファリング割り当てマップを使用した経費の割り当て - 従来

重み付けメソッドを使用して、提供されるサービスの実際の消費量に基づいて経費を割り当てることができます。重み付けロールアップメソッドでは、メトリクスはアカウント値で金額を重み付けします。サービスオファリング割り当てマップテーブルを使用して、サービスオファリングのコストの実際の消費データを保存します。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_analyst

このタスクについて
ベースシステムには、IT シェアードサービスセグメントからサービスオファリングセグメントに経費をロールアップするためのデフォルトの [均等] メソッドが用意されていますが、[重み付け] ロールアップメソッドを選択することもできます。このメソッドでは、サービスオファリング割り当てマップ [itfm_service_offering_allocation_map] テーブルに保存または入力した消費データに基づいて、IT シェアードサービスセグメントの経費がサービスオファリングセグメントに割り当てられます。この場合、経費は消費の重み付けに基づいて割り当てられます。したがって、コストは [割り当てマップでサービスオファリングに割り当てる] メトリクスを使用して分割され、消費データを含むサービスオファリング割り当てマップテーブルがメトリクスの重み付けに使用されます。

手順
1. 移動先 すべて > **SPM** のファイナンシャルモデリング > サービスオファリング割り当てマップ.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

   [サービスオファリング割り当てマップ] フォーム

フィールド	説明
割り当ての重み付け	重み付け計算に基づいて割り当てられた経費。
IT シェアードサービス	資金が割り当てられるセグメント。
サービスオファリング	資金がロールアップされるセグメント。

4. [**Submit** (送信)] を選択します。

   オファリングごとの計算済み消費量の詳細と、推定消費量のオファリングコストソースの構成については、以下を参照してください。 ファイナンシャルマネジメント for Service Owner Workspace .

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ファイナンシャルモデリング - 従来

ファイナンシャルモデリングを使用すると、割り当てルールを決定し、将来のすべてのデータに対して自動的に実行することができます。ワークベンチを使用して経費を割り当てる前にセットアップする必要があるコンポーネントが他にもいくつかあります。

データソースをコストモデルに関連付けることから始めます。データソースを使用して、財務データソースフィールドマップレコードの [クレンジングで使用] オプションを選択し、クレンジングまたはバケット分割の列を追加します。

IT ファイナンシャルマネジメントの下にあった会計カレンダーが ServiceNow AI Platform エリアに移動されました。会計カレンダーのドキュメントは、こちら からアクセスできます。

財務データのインポート - 従来

財務データは、[ステージング済みの総勘定元帳データ] テーブルにあります。

次のいずれかのメソッドを使用して、ステージング済みの総勘定元帳データ [itfm_cl_data_staged] テーブルにインポートできます。

- インポートセット
- 簡単インポート

「インポートセット 」を参照してください。

重要:
会計カレンダーを財務データで使用できることを確認してください。

総勘定元帳 - 従来

総勘定元帳には、すべての会計期間における組織のすべての経費が含まれています。

総勘定元帳には、次のタイプの経費が含まれています。

- 外部ソースからインポートしたステージング済み経費。インポートされた経費は、総勘定元帳ステージング済みデータ [itfm_cl_data_staged] テーブルに保存されます。
- データクレンジングステージ中にワークベンチが使用する [クレンジング済み経費]。このステージでの経費への変更は、総勘定元帳クレンジング済みデータ [itfm_cl_data_cleansed] テーブルに保存されます。経費を [総勘定元帳ステージング済みデータ] テーブルに追加するたびに、対応する経費がこのテーブルに作成されます。
- バケット化ステージ中にワークベンチが使用する [調整済み経費]。このステージでの経費への変更は、調整済み総勘定元帳データ [itfm_gl_data_groomed] テーブルに保存されます。これは、ワークベンチから手動で入力した金額を保持するため、または金額を直接入力するための総勘定元帳以外の経費にも使用されます。

総勘定元帳での経費の表示 - 従来

任意の総勘定元帳テーブルのレコードを表示し、必要に応じて変更を加えることができます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin、cost_transparency_analyst

手順


1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > ワークベンチ をクリックし、ワークベンチのレビューステージに移動します。
2. [その他] セクションで生成された [調整済みライン] の番号のリンクを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. フォームのフィールドに入力します。

[調整済み総勘定元帳データ] フォーム

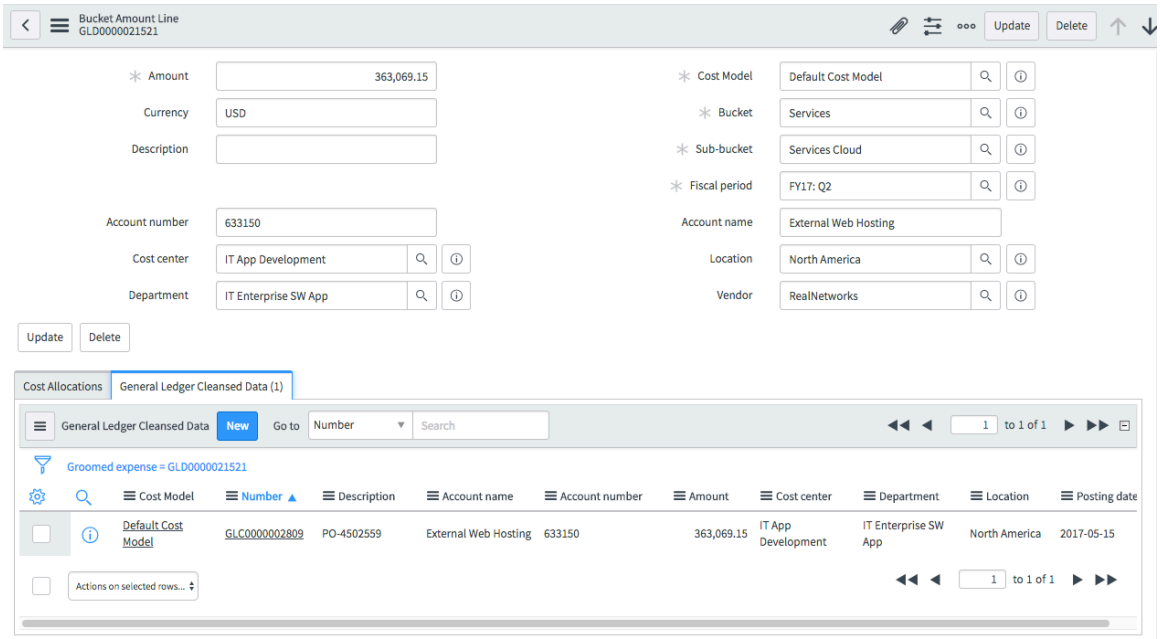

[調整済み総勘定元帳データ] フォーム

フィールド	説明
番号	総勘定元帳データレコードの自動生成された識別番号。
状況	レコードの現在のステータス： ○ 未割り当て：この経費の割り当ては割り当てられません。 ○ 割り当て済み：この経費は割り当て済みです。 ○ ロック済み：割り当て明細行を元に戻せないように、総勘定元帳経費がロックされています。
アカウント名	アカウントの名前。
アカウント番号	この経費が適用されるアカウント番号。クレンジング済みのすべての経費をワークベンチのバケット化ステージのアカウントに確実に表示されるようにするために、[クレンジング済みの総勘定元帳データ] フォームではこのフィールドが必須です。
説明	費用の詳細な説明。
総計	経費の金額。
クレンジング済み経費	[ステージング済みの総勘定元帳データフォーム] [総勘定元帳クレンジング済みデータ] テーブル内の対応するレコードへの参照。[総勘定元帳ステージング済みデータ] テーブルで経費を作成すると自動的に作成される [総勘定元帳クレンジング済みデータ] テーブルの経費。
ステージン	[総勘定元帳クレンジング済みデータフォーム] [総勘定元帳クレンジング済みデータ] テーブル内の対応するレコードへの参照。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
グ済み経費	
調整済み経費	[総勘定元帳クレンジング済みデータフォーム] 調整済み総勘定元帳データテーブル内の対応するレコードへの参照。
調整ルール	[総勘定元帳クレンジング済みデータフォーム] バケットに入れられる経費をフィルタリングするためにワークベンチが使用する条件。
通貨	経費が評価される通貨。通貨は、通貨 [px_currency] テーブルで定義された 3 文字のコードです。このフィールドの値が通貨テーブルのどのコードとも一致しない場合、すべての経費に対してデフォルトでドル記号が表示されます。すべての総勘定元帳フォームの経費がシステム通貨と同じ通貨であることを確認してください。
ドキュメント金額	元の経費ドキュメントの金額。
ドキュメント通貨	元の経費ドキュメントで使用される通貨。[通貨] フィールドと同様に、フィールドの値は通貨テーブルで定義された 3 文字のコードです。
バケット	[調整済み総勘定元帳データフォーム] この経費が関連付けられているバケット。
サブバケット	[調整済み総勘定元帳データフォーム] この経費が関連付けられているサブバケット。
コストセンター	この経費が適用されるコストセンター。
部門	この経費に関連する部門。
会計期間	[調整済み総勘定元帳データフォーム] この経費が発生した期間。
ドキュメント日付	元の経費ドキュメントが発行された日付。
インポートセッ	インスタンスにインポートしたデータを含むインポートセット。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ト番号	
ロケーション	経費が発生した場所。
ベンダー	会社 [core_company] テーブルから参照されるベンダーレコード。
転記日	この経費が発生した日付。
現地金額	現地通貨で表される金額。
現地通貨	アカウントに関連付けられている通貨。
セグメント	セグメントの階層で定義されているセグメントの経費額。

[調整済み総勘定元帳データ] フォームの [関連リスト] セクション

フィールド	説明
コスト割り当て	[調整済み総勘定元帳データフォーム] この経費から作成された割り当て明細。
クレンジング済みの総勘定元帳データ	[調整済み総勘定元帳データフォーム] 経費がバケットに入れられた後に調整済み経費レコードを作成した [クレンジング済みの総勘定元帳データ] テーブルのレコード。

自動翻訳

4. [送信] をクリックします。

財務データソースとフィールドマップ - 従来

ファイナンシャルデータソースは、ファイナンシャルモデリングおよび ファイナンシャルプランで使用される実際の生の経費データテーブルを指します。

ファイナンシャルマネジメントアプリケーションでは、データソースは生の経費データとそのフィールドをトランザクションテーブルフィールドにマッピングするのに役立ちます。

基本システム財務モデルアクティビティには、[ステージング済みの総勘定元帳データ] テーブルと [ステージング済みの一般予算データ] テーブルを使用できます。これらのテーブルを拡張して、財務モデルのカスタムソーステーブルを作成することもできます。財務アクティビティは、任意のデータソースを使用して、またはデータソースをまったく使用せずにモデル化できます。データソースがない場合は、金額が手動でコストモデルに直接入力されることが想定されます。必要に応じて、フィールドマップをさらに作成し、クレンジングまたはバケットの分割に使用するフィールドを設定できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ファイナンシャルプランでは、データソースを使用して実績を生成します。実績を予算に正確にマッピングするためには、予算モデル階層で使用されるセグメントがデータソースフィールドマップの必須部分である必要があります。また、予算キーの生成にも役立ちます。

アプリケーションで利用可能な次のデータソースで作業を開始します。


- GL ステージング済み
- コスト計画ブレークダウン (FM-PPS 財務計画データ連携)

次の表に、各データソースで提供されるデフォルトのフィールドマップを示します。デフォルトのマッピングを変更して、別のセグメントまたは列を指すようにすることができます。たとえば、デフォルトでは、[コストセンター] 列はコストセンター名 [cmn_cost_center] にマッピングされます。その列のデータがケースのコードである場合は、コストセンターコード[cmn_cost_center] に変更できます。必要に応じて、カスタムフィールドのフィールドマップをさらに作成できます。

デフォルトのデータソースフィールドマップ

セグメント名	トランザクションテーブル
コストセンター	コスト センター [cmn_cost_center]
ロケーション	場所 [cmn_location]
ベンダー	会社 [core_company]
部門	部門 [cmn_department]
プロジェクト	プロジェクト [pm_project]

財務データソースとそのフィールドマップ

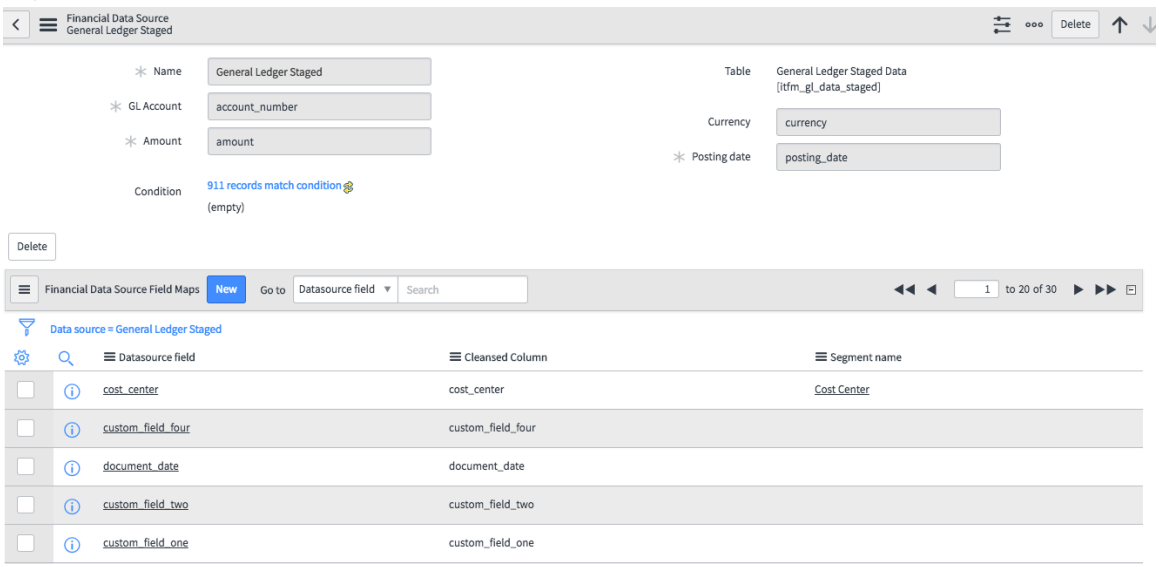

財務データソースの作成 - 従来

ファイナンシャルマネジメントで新しいデータソースを作成するには、生の経費の詳細を参照するデータベース列を特定する必要があります。

始める前に

必要なロール：itfm_plan_analyst、admin、cost_transparency_admin

このタスクについて

データソースは、ファイナンシャルモデリングアプリケーションと Financial Planning アプリケーションの両方で使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > データソース > セットアップ.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

[財務データソース] フォーム

フィールド	説明
名前	新しいデータソースレコードのわかりやすい名前を入力します。
GL アカウント	総勘定元帳アカウントの経費を参照するデータベース列を選択します。
総計	実際の経費額を参照するデータベース列を選択します。
テーブル	実際の生の経費データを含むデータベーステーブルを選択します。 [テーブル] フィールドには、財務データの取得元のソースが表示されます。ファイナンシャルモデリングアプリケーションのソースは、[総勘定元帳ステージング済み] テーブルのみに限定されることはなくなりましたが、財務トランザクション情報を含む任意のテーブルを指すことができます。金額、アカウント番号、および日付を表す必須の列要件が満たされている限り、プラットフォーム内の任意のテーブルを使用できます。
通貨	経費の通貨値を参照するデータベース列を選択します。
転記日	経費が発生した日付を参照するデータベース列を選択します。
条件	条件を適用してレコードをフィルタリングします。

4. [送信] をクリックします。

次のタスク
データソースのフィールドマップを作成します。

データソースフィールドマップの作成 従来

フィールドマップは、データソース列とトランザクション列の間に参照を作成します。

始める前に
必要なロール：itfm_plan_analyst または cost_transparency_admin

このタスクについて
トランザクションテーブルはセグメントに関連付けられています。データソースフィールドとトランザクションフィールドの関係を定義して、柔軟なデータクレンジングとバケット分割を有効にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > データソース > セットアップ.
2. クリックしてデータソースレコードを開きます。
3. [財務データソースフィールドマップ] タブで [新規] をクリックして、フィールドマップを作成します。
4. フォームのフィールドに入力します。

[財務データソースフィールドマップ] フォーム

フィールド	説明
データソース	フィールドマップが作成されるデータソースに自動入力します。
データソースフィールド	フィールドマッピング用のデータソーステーブルの列。
クレンジング済みの列	[データソーステーブル] 列と [クレンジング済みテーブル] 列の間のマッピングを定義します。 フィールドが [なし] の場合、[データソーステーブル] 列のデータはクレンジング中にコピーされません。既存の総勘定元帳では、ステージング済みデータソースマッピングが事前設定されています。
クレンジングで使用	このフィールドマップ参照をファイナンシャルモデリングのクレンジングに使用できるようにするには、チェックボックスをオンにします。
セグメント名	トランザクションテーブルをマッピングするセグメント。
トランザクションフィールドにマッピング	フィールドマッピング用のトランザクションテーブルの列。
バケット分割に使用	チェックボックスをオンにすると、ワークベンチの [割り当てセットアップ] タブを使用するときに、フィールドマップ参照をコストバケット分割で使用できるようになります。

5. [送信] をクリックします。

セグメント - 従来

セグメントは、コストモデル階層で使用されるトランザクションテーブルを定義します。

ファイナンシャルモデリングアプリケーションによって提供されるデフォルトのセグメントを変更できます。要件に基づいて新しいセグメントを作成することもできます。セグメントでコスト割り当てが有効になっている場合は、コストモデル階層のビルド中にセグメントを使用できます。

デフォルトセグメント

セグメント名	トランザクションテーブル
事業部門	事業部門 [business_unit]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

デフォルトセグメント (続く)

セグメント名	トランザクションテーブル
部門	部門 [cmn_department]
ビジネスサービス	サービス [cmdb_ci_service]
ビジネスケイパビリティ	ビジネスケイパビリティ [cmdb_ci_business_capability]
ビジネスアプリケーション	ビジネスアプリケーション [cmdb_ci_business_app]
サービスオファリング	サービス オファリング [service_offering]
サーバー	サーバー [cmdb_ci_server]
コストセンター	コスト センター [cmn_cost_center]
ロケーション	場所 [cmn_location]
ベンダー	会社 [core_company] 注: [ベンダー] チェックボックスがオンになっている会社のみが含まれます。
IT シェアードサービス	IT シェアードサービス [itfm_shared_service]

注:
コストモデルに割り当てられたセグメントは削除できません。

セグメント定義の作成 - 従来

コストおよび予算モデルで使用するセグメントを定義します。

始める前に
必要なロール：budget_admin または cost_transparency_admin

このタスクについて
同じトランザクションテーブルに、フィルター条件が異なる複数のセグメントを作成できます。たとえば、[ベンダー] フィールドが **[true]** の core_company テーブルにベンダー用に 1 つのセグメントを作成し、[ベンダー] フィールドが **[false]** になっている同じテーブルの顧客用に別のセグメントを作成します。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > アドミニストレーション > セグメント.
   ワークベンチの [セグメント定義] タブから新しいセグメントを作成することもできます。
2. [新規] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

[セグメント定義] フォーム

フィールド	説明
セグメント名	新しいセグメントのわかりやすい名前。
トランザクションテーブル	セグメントに関連付けるトランザクションデータのデータベーステーブル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
プライマリ フィールド	セグメントの主要な情報ソースとして機能するトランザクションテーブルのフィールド。
コスト割り当てで使用	セグメントをファイナンシャルモデリングに使用できるようにするには、チェックボックスをオンにします。
予算業務で使用	セグメントを Financial Planning に使用できるようにするには、チェックボックスをオンにします。
条件	レコードをフィルタリングするために設定できる条件。
会計有効期間の開始日	その会計期間の割り当てセットアップのレコードをフィルタリングする会計開始期間。ファイナンシャルモデリングで使用
会計有効期間の終了日	その会計期間の割り当てセットアップのレコードをフィルタリングする会計終了期間。ファイナンシャルモデリングで使用

4. オプション: 割り当てに有効なレコードのみを含めるようにセグメントの会計上の有効性を設定します。
すべての会計期間のすべてのアカウントを表示するには、会計の有効開始日と終了日を「なし」として指定します。

   a. 例 1：「サーバー」をセグメントと見なします。
   割り当てに対して有効なサーバーをフィルタリングするには、会計開始日をインストール日、会計終了日を廃止日として設定します。

   b. 例 2：会計期間のアクティブなプロジェクトのみを表示するには、プロジェクトテーブルでアクティブな開始日と終了日を使用します。

5. [送信] をクリックします。

IT シェアードサービス - 従来

IT シェアードサービスは、IT 関連でありながら、組織全体で共有および使用されているビジネスサービスです。

IT シェアードサービスの例としては、ヘルプデスクなどのユーザーサービスや、コールセンターなどの音声ネットワークサービスがあります。組織向けのビジネスサービスを作成し、IT 運用やセキュリティおよびコンプライアンスなど、より幅広いカスタマイズ可能なカテゴリに分類できます。

デフォルトでは、セグメントの階層には IT シェアードサービスのセグメントが含まれます。経費が IT シェアードサービスに関連付けられている場合、デフォルトではビジネスサービスにロールアップされます。これにより、任意の IT シェアードサービスに経費を割り当て、ビジネスサービス、最終的には組織を構成する事業部門に対する経費の影響を確認できます。

シードされた IT シェアードサービスのリストについては、「シェアードサービスとビジネスアプリケーションの規範的コストモデル」を参照してください。

IT シェアードサービスの作成 - 従来

IT シェアードサービスを作成して、セグメントの階層に IT シェアードサービスセグメントをセットアップします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin

このタスクについて
次に、これらのシェアードサービスに経費をロールアップするロールアップルールを作成できます。このシェアードサービスは、デフォルトでビジネスサービスにロールアップされます。次に、シェアードサービスで使用するサービスタイプを作成します。


手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > セグメントの階層 > **IT** シェアードサービス.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

IT シェアードサービスフォームフィールド

フィールド	説明
名前	共有サービスの名前。
所有者	共有サービスを所有するグループ内のユーザー。
説明	共有サービスの詳細な説明。
グループ	共有サービスを所有するグループ。
サービスタイプ	作成するサービスのタイプ。

IT シェアードサービスの例



4. [送信] をクリックします。

サービスタイプの作成 - 従来

IT シェアードサービスで使用されるサービスタイプを作成します。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin

手順

1. IT シェアードサービスレコードの 1 つを開きます。
2. [サービスタイプ] フィールドのルックアップアイコンをクリックします。
   [IT シェアードサービスタイプ] リストが表示されます。
3. [新規] をクリックします。
4. 名前を入力します。
5. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


ファイナンシャルマネジメントワークベンチ - 従来

ファイナンシャルマネジメントワークベンチは、経理アドミニストレーターに経費を割り当てるためのグラフィカルインターフェイスを提供します。

からワークベンチにアクセスする ファイナンシャルモデリング > ワークベンチ 移動します

ワークベンチを使用して経費を割り当てる場合、次のステージを通過します。

ワークベンチステージ



注:

財務モデルフォームでデータソースを選択しない場合、経費ラインをプルする財務データソースがないため、データクレンジングステージはワークベンチステージで使用できません。この場合、調整済みラインをサブバケットに直接入力できます。

[ワークベンチ] タブ

- データ定義：使用する会計期間とコストモデルを選択します。「データ定義ステージ - 従来」を参照してください。
- データクレンジング：不要な財務経費を削除し、同様の経費を同じセグメントに入れます。このクレンジングステージでは、総勘定元帳の経費を整理する機会があります。「データクレンジングステージ - 従来」を参照してください。
- バケット化：関連する経費をカスタマイズ可能なバケットにグループ化します。「バケット化ステージ - 従来」を参照してください。
- 割り当てセットアップ：アカウントの階層を構成するアカウントとセグメントにバケットを割り当て、セグメントの相互関係を管理するルールを作成します。「割り当てセットアップステージ - 従来」を参照してください。
- レビュー：経費の割り当てをレビューしてから、割り当てエンジンを実行して経費を割り当てます。「割り当てレビューステージ - 従来」を参照してください。

[コストモデル] タブ

アプリケーション内のすべてのコストモデル。このタブから基本コストモデルを作成し、既存のコストモデルを開いたり、変更したり、削除したりすることができます。「[コストモデル] タブ - 従来」を参照してください。

[構成] タブ

通貨、会計カレンダー、メインのファイナンシャルマネジメントレポート、財務データを削除できる詳細アクションなどの一般的な構成設定。「[構成] タブ - 従来」を参照してください。

アカウント数のしきい値

アナリストのライセンスを受けていない顧客の場合、セグメントまたはコストモデルのアカウント数がしきい値を超えると、[基本割り当てセットアップ] オプションが自動的に有効になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	しきい値
セグメントで許可されているアカウントの最大数	4000
コストモデルで許可されているアカウントの合計数	12000

注:
アカウント数がしきい値を超えると、割り当て経費の実行は機能しません。

ブラウザー要件

Internet Explorer を使用している場合、ワークベンチを使用するにはバージョン 11 以降を使用してください。他の一般的にサポートされている Web ブラウザーを使用することもできます。


データ定義ステージ - 従来

データ定義ステージでは、経費の割り当てを開始する前に、アプリケーションをセットアップするための設定が提供されます。

次のセクションが表示されます。

- 作業セット：作業する会計期間を選択します。会計期間は、インポートした財務データに基づいて自動的に作成されます。ワークベンチを進めると、ここで選択した会計期間中に発生した経費のみが利用可能になります。使用するコストモデルを選択し、選択したコストモデルからクローンを作成することもできます。
  - 既存のコストモデルからコストモデルをクローンを作成するには、[このコストモデルをクローン] ( ) アイコンを使用します。
  - [ダウンロード] ( ) アイコンを使用してコストモデルをダウンロードするか、別のインスタンスに展開して別の本番前環境でコストモデリングを実行します。後でコストモデルを他の本番環境に移動できます。
  - ワークベンチを開いたときに現在の会計期間で表示されない場合、または異なるコストモデルを切り替えたときに会計期間が更新されない場合は、[コストモデルの会計期間を更新] ( ) アイコンをクリックして現在の会計期間を表示します。
- セグメントの階層：セグメントの階層内のセグメントと、処理しているコストモデルの階層内の位置を表示します。
- 経費概要：ステージングおよび調整済みの総勘定元帳テーブルにレコードがあるかどうか、および割り当て明細があるかどうかを確認します。

ワークベンチでのデータ定義

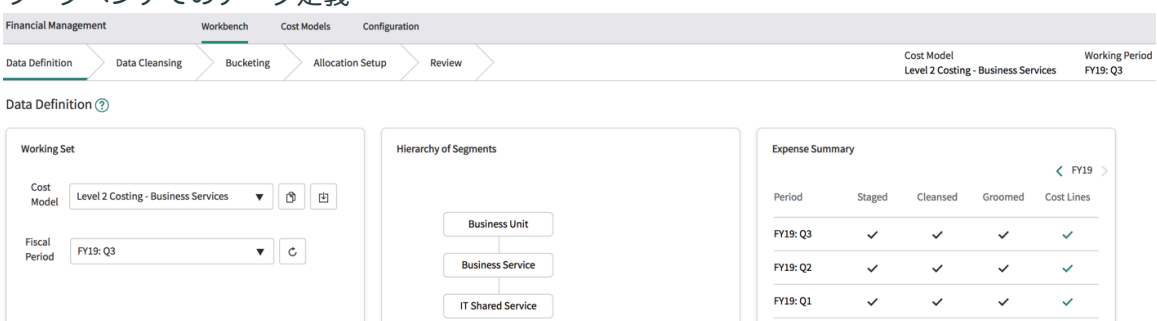

ワーキングセットを選択 - 従来

作業セットとは、すべてのステージを通過するときにワークベンチで使用する一連の経費を指します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

このタスクについて
作業セットは会計期間で構成されます。会計期間は、経費が発生した会計カレンダー上の時間ブロックです。正しい会計期間を選択していることを確認してください。ワークベンチのステージを進むにつれ、作業する経費は選択した会計期間中にのみ発生した経費であり、他の会計期間では発生しません。選択した会計期間は「作業期間」と呼ばれ、すべてのワークベンチページの右上に常に表示されます。

手順

[会計期間] 選択リストから、処理するデータの会計期間を選択します。

この選択リストのオプションは、会計カレンダーから取得されます。目的の会計期間が表示されない場合は、会計カレンダーを変更できます。

ワークベンチでのコストモデルのクローン作成 - 従来

事前設定されたコストモデルを使用するか、財務モデルアクティビティの基本コストモデルからクローンを作成します。クローンを作成することで、元のコストモデルに影響を与えることなく、財務データソースをビジネス要件に従ってコストモデルにマッピングできます。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

重要:

- この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。
- 以前のバージョンから Yokohama にアップグレードする場合、デフォルトでは、新しいモデルで [管理されたコスト明細を生成 **(Generate Controlled Cost Lines)]** オプションが有効になり、新しいモデルで **[GL** 経費ラインを生成] オプションが無効になります。ベースモデルでこれらのオプションが有効であったか無効であったかは関係ありません。これらのオプションは編集できず、[コストモデルビュー] ページのデフォルトビューには表示されません。

自動翻訳

このタスクについて
[ワークベンチ] の [データ定義] ステージまたは [コストモデル] タブから、事前設定された基本コストモデルを選択するか、コストモデルのクローンを作成できます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > ワークベンチ.
2. 基本コストモデルインターフェイスにアクセスするには、次のいずれかを実行します。
   - [データ定義] ステージの [作業セット] リージョンの [コストモデル] 選択リストからコストモデルを選択し、[このコストモデルをクローン] ( ) アイコンをクリックします。
   - [コストモデル] タブをクリックし、基本コストモデルを選択して、[コストモデルのクローン] ボタンまたは [このコストモデルをクローン] ( ) [アクション] アイコンをクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[コストモデルのクローン] フォーム

フィールド	説明
名前	選択したコストモデルの名前がフィールドに事前入力されます。
説明	コストモデルデフォルトの説明。
クローン元	新しいクローンを作成するコストモデル。
データソース	ファイナンシャルモデリングアクティビティに使用される実際の生の経費データテーブル。「財務データソースとフィールドマップ」を参照してください。基本システムオプションは次のとおりです。 ○ コスト計画ブレークダウン：生の経費データにマッピングします。ここで、コスト計画ブレークダウン [cost_plan_breakdown] テーブルの会計期間の実際のコストと割り当てられたコストが取得されます。 ○ ステージング済みの総勘定元帳：総勘定元帳ステージング済みデータ **[itfm_cl_data_staged]** テーブル内の総勘定元帳アカウント経費を参照するデータベース列にマッピングします。 ○ データソースなし：バケット化ステージでコストモデルに金額を手動で入力するオプション。

4. [コストモデルのクローン] ボタンをクリックします。

コストモデルフォームでコストモデルを作成することもできます。

経費サマリ - 従来

ワークベンチの [データ定義] ステージには、アプリケーションの経費の概要が表示されます。各経費タイプおよび各会計期間のアイコンは、割り当てレコードのステータスを示します。

経費サマリのアイコン

アイコン	説明
×	レコードが存在しません。
✓	レコード行が存在します。
ⓘ	割り当てが最後に生成されてから変更されたレコード。
❗	アプリケーションが割り当てを実行しているときにエラーが発生しました。このアイコンが表示された場合は、ワークベンチのすべての設定を確認し、割り当てを再実行してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[経費サマリ] セクション

ラベル	説明
期間	会計カレンダーの各期間。
ステージング済み	レコードが総勘定元帳ステージング済みデータ [itfm_gl_data_staged] テーブルにあるかどうか。
クレンジング済み	レコードが総勘定元帳クレンジング済みデータ [itfm_gl_data_cleansed] テーブルにあるかどうか。
調整済み	レコードが調整済み総勘定元帳データ [itfm_gl_data_groomed] テーブルにあるかどうか。
行	レコードがコスト割り当て [itfm_cost_allocation] テーブルにあるかどうか。

データクレンジングステージ - 従来


データクレンジングステージでは、アプリケーションにインポートした経費をクリーンアップできます。

[データクレンジング] ページで、インポートした経費は、ベンダー、コストセンター、部門、および場所のいずれかのセグメントでグループ化された経費ラインに表示されます。Istanbul 以降、カスタムフィールドでデータクレンジングを実行できるようになりました。カスタムフィールドクレンジングを有効にするには、[財務データソースフィールドマップ] の [クレンジングで使用] チェックボックスをオンにします。

右ペインの [サマリ] セクションには、各セグメントを構成する経費のブレークダウンが表示されます。次の操作を行うことができます。

- インポートされた経費を確認
- 経費ラインを結合
- 選択したセグメントのレコードに経費をマッピング

ワークベンチでのデータクレンジング

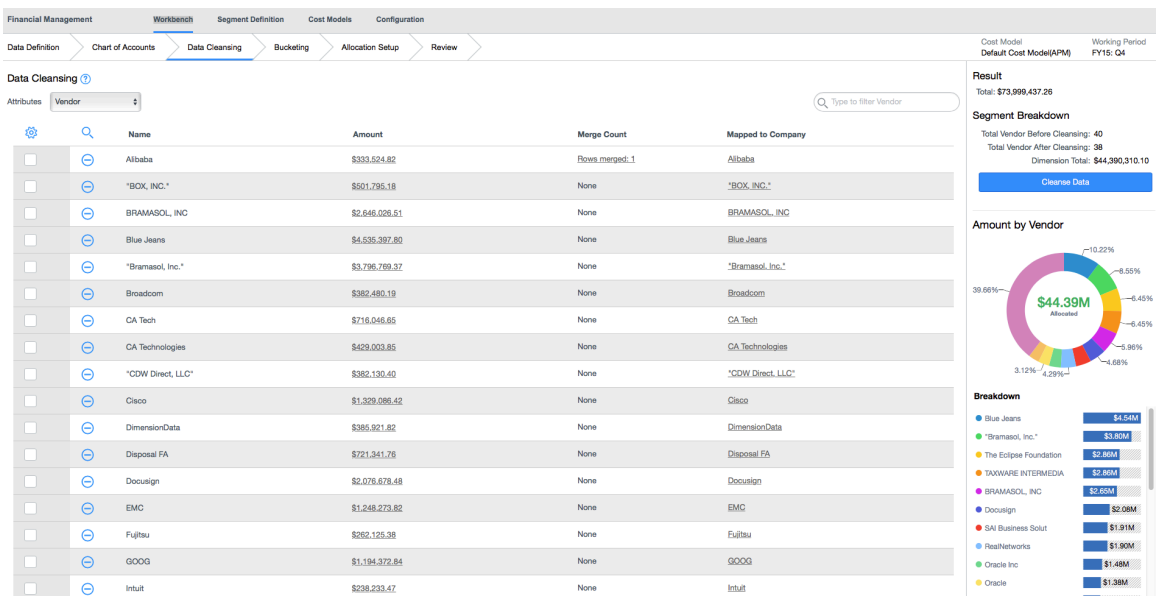

クレンジング前の経費の確認 - 従来

アプリケーションにインポートした経費に関する追加の詳細をいくつか表示できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順


1. [属性] 選択リストからセグメントを選択し、データを確認します (列の説明についてはテーブルを参照)。

データクレンジングテーブル

列	説明
名前	ベンダーの名前や場所など、選択したセグメント内の特定のアイテムの名前。
総計	セグメント内のアイテムに関連付けられているインポート済み経費の金額。
カウントを結合	他の経費の数は、その行の経費と結合されています。デフォルトでは、各レコードの値は [なし] です。経費を結合すると、値が変更され、結合された経費の数が表示されます。
マップ先：	アプリケーションが、既にインスタンスに存在する、選択したセグメント内の特定のアイテムの名前 (同じベンダーやコストセンターなど) 間で一致するものを見つけることができるかどうか。アプリケーションで一致するレコードが見つからない場合は、データをクレンジングしたときに新しいレコードが作成されます。

各経費ラインはシステム内のレコードではなく、選択したセグメントと同じ値を含む [総勘定元帳ステージング済みデータ] テーブルの経費の集計ビューです。たとえば、[コストセンター] セグメントを選択した場合、各経費ラインは実際には同じコストセンターを持つすべての総勘定元帳経費の合計になります。

データクレンジングテーブルの経費



2. 表示される経費のリストでは、次のいずれかを行うことができます。
   - リストの右上にある検索フィールドにテキストを入力して、経費ラインのリストをフィルタリングします。[名前] 列のテキストが検索されます。
   - [金額] 列の経費金額をクリックすると、その行を構成する経費レコードが [総勘定元帳ステージング済みデータ] テーブルに表示されます。
   - 経費の左側にある [削除] アイコン ( ) をクリックして、行を無視します。ここで無視した経費は、バケットに割り当てられる次のステージには持ち越されません。

セグメントごとに経費ラインを結合 - 従来

経費を結合することは、1 つのセグメントレコードに関連付けられている経費を取ることを意味します。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
たとえば、ベンダー ABC を取得し、このベンダーの経費をベンダー XYZ などの別のセグメントレコードに関連付けることができます。事実上、経費の [ベンダー] フィールドの値を ABC から XYZ に変更することになります。

手順

1. 1 行以上の経費ラインをクリックして選択します。
   これらの行は、ソース経費と呼ばれます。
2. それらを別の経費にドラッグします。

   この行は、宛先経費として参照できます。

   ソース経費の総勘定元帳経費レコードが変更されます。変更されるフィールドは、[ベンダー] など、現在作業しているセグメントです。フィールドの値は、そのフィールドが宛先経費に対して持っていた値に変更されます。

   注:
   経費を結合すると、ベンダーやコストセンターなどのセグメント値のみが変更されます。経費ラインを構成する総勘定元帳経費に関連付けられているアカウント番号は変更されません。

3. [結合数] 列のエントリ数をクリックします。
4. 結合された経費ラインを無視するには、[結合されたセグメント] ウィンドウのエントリーの横にある [削除] アイコン ( ) をクリックします。
   経費ラインがすべての経費のリストに再表示されます。

セグメントレコードの経費ラインへのマッピング - 従来

アプリケーションは、選択したセグメントの既存のレコードへの経費ラインのマッピングを試み、経費ラインのセグメントフィールドに値がある限り、セグメントのテーブルに新しいレコードを作成するオプションを提供します。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

このタスクについて
例を次に示します。

- ベンダーセグメントに基づいてデータをクレンジングしており、経費ラインのベンダーがすでに会社 [core_company] テーブルにある場合、[マッピング先] 列には [既存のベンダー] が表示されます。
- 経費のベンダーが会社テーブルに存在しない場合、[マッピング先] 列には [新しいベンダーが作成されます] が表示されます。このメッセージは、最終的にデータをクレンジングすると、アプリケーションが会社テーブルにベンダーのレコードを作成することを示しています。
- 経費 [ベンダー] フィールドが空の場合に [ベンダー] を選択すると、経費はどの経費ラインにも表示されません。

一致するものが見つかった場合は一致するレコードが表示され、編集アイコン ( ) をクリックしてフォームを変更することで変更を加えることができます。

一致するものが見つからず、システムでレコードを作成する場合は、フィールドをそのままにしておきます。後で [データのクレンジング] をクリックすると、レコードが自動的に作成されます。

一致するものが見つからず、レコードを作成しない場合は、既存のレコードを経費に手動で関連付けることができます。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. [マッピング先] 列の値の横にあるルックアップアイコンをクリックします。
2. 検索フィールドにキーワードを入力して、リストをフィルタリングします。
3. リストから既存のレコードを選択します。

ベンダーと経費の関連付け

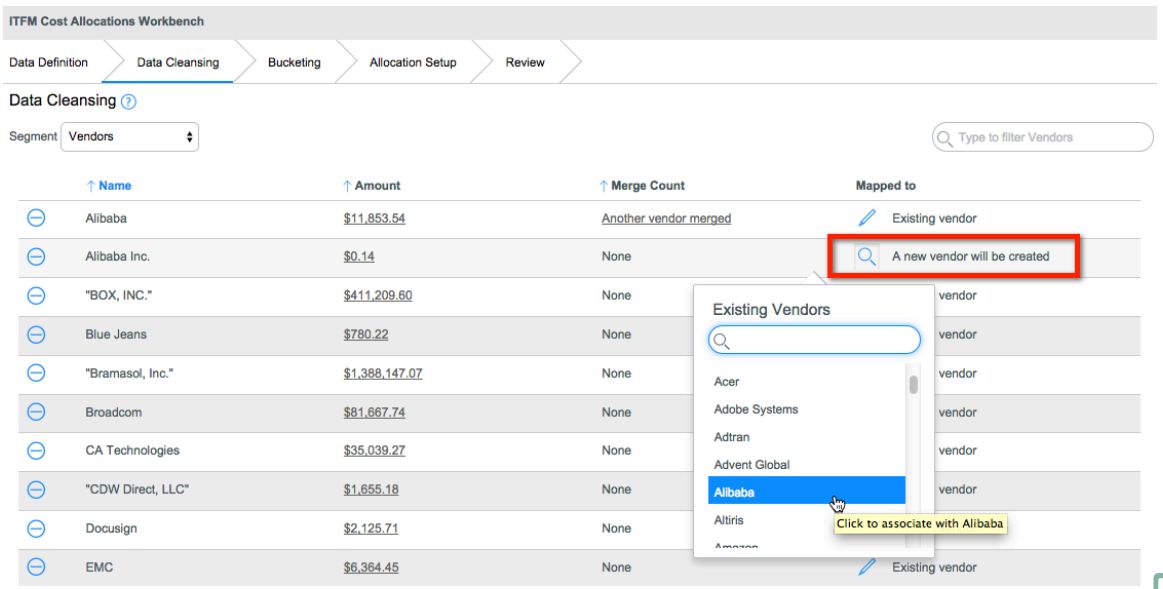

データのクレンジング - 従来

データクレンジングテーブルの経費をクリーンアップした後、クレンジングエンジンを実行します。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

右側のペインで [データのクレンジング] をクリックします。

データクレンジングステージで操作している実際の経費レコードは、[ステージング済みの総勘定元帳データ] テーブルにありますが、各経費レコードのレプリカが [総勘定元帳クレンジング済みデータ] テーブルにもあります。データをクレンジングした後、変更は [総勘定元帳ステージング済みデータ] テーブルではなく、[総勘定元帳クレンジング済みデータ] テーブルのレコードに保存されます。

バケット化ステージ - 従来

バケット化ステージでは、バケットと呼ばれるグループに経費を割り当てることができます。

バケットは、経費を整理するのに役立つ任意のタイプのカテゴリにすることができます。バケットとセグメントを混同しないでください。バケットは、割り当て前に経費を入れるカスタマイズ可能なグループです。階層で定義されているセグメントは、経費を割り当てることができる組織の一部です。

[バケット (Bucketing)] ページでは、クレンジングした経費がアカウント番号でグループ化されて左ペインに表示されます。経費をグループ化できるバケットが中央のペインに表示されます。右ペインの [サマリ] セクションは、経費がバケットにどのように割り当てられているかのブレークダウンを示しています。[アカウント] 列に正しいデータが表示されない場合は、クレンジングされた総勘定元帳を開き、レコードが正しいことを確認します。


バケット化ステージでは、次のことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- バケットの作成と変更
- フィルター条件の作成
- 詳細については、「データソースのないコストモデルの調整済みラインを作成する」を参照してください。
- 各アカウントの経費を適切なバケットに入れる
- バケット割り当ての確認とバケット化エンジンの実行

ワークベンチでのバケット化

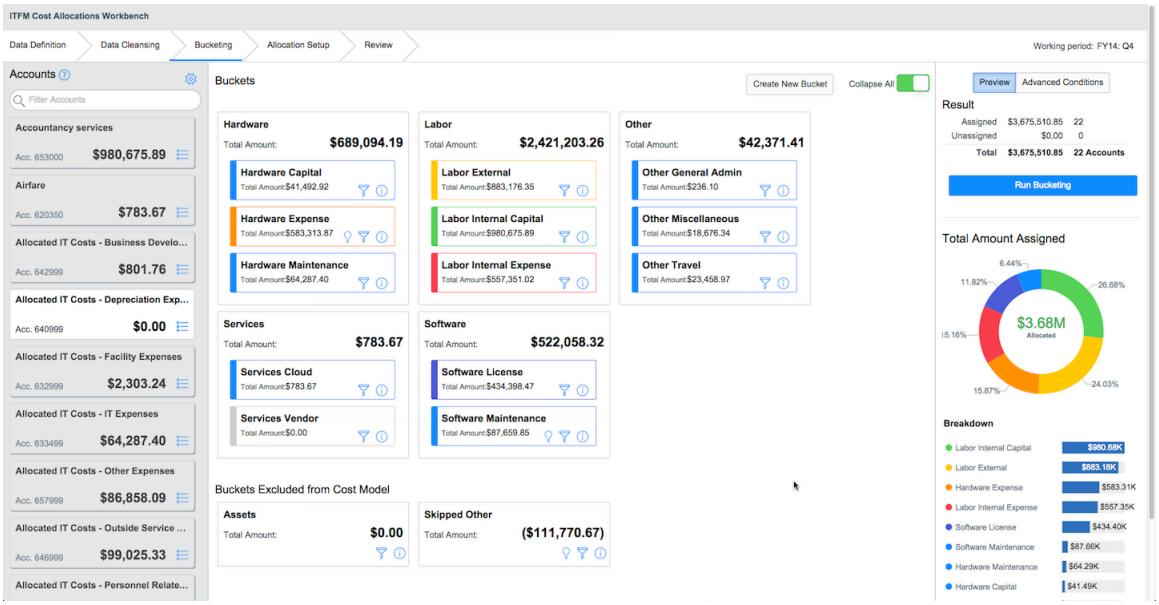

アカウントの詳細の表示 - 従来

バケット化ページには、左側のペインにアカウント別にグループ化されたクレンジング済みデータがすべて表示され、メインペインに既存のバケットが表示されます。バケットは、親バケット内でグループ化されたサブバケットとともに表示されます。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

1. [アカウント] の横にある歯車アイコン ( ) をクリックします。
2. [バケットに分類されたアカウントを表示] トグルをクリックして、既に割り当てられているアカウントを表示または非表示にします。
   経費は、割り当てられていないアカウントのバケットにのみ割り当てることができます。
3. [ソート基準] リストで [名前]、[アカウント]、または [金額] を選択してアカウントをソートします。
4. [ソート] リストから [昇順] または [降順] を選択して、アカウントをさらにソートします。
5. 線グラフアイコン ( ) をクリックして、アカウントに属する [総勘定元帳クレンジング済みデータ] テーブルのレコードを表示します。
   レコードは、新しいブラウザータブまたはブラウザーウィンドウのリストビューで開きます。

バケットの作成と変更 - 従来

標準のバケットフォームでバケットを作成していない場合は、ワークベンチの [バケット化] ステージでバケットを作成できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

中央ペインの右上にある [新規バケットを作成] をクリックします。

[バケット] フォームが表示されます。このフォームは、[バケット] フォームと同じで、 財務 > コストモデル > アカウントのバケット. 詳細については、「バケットの作成」を参照してください。

> **注:**
> コストモデルから除外されたバケットを作成することができます。つまり、次のステージである割り当てセットアップでアカウントとセグメントに割り当てることはできません。バケットフォームで [コストモデルから除外] オプションを選択すると、バケットが [バケット化] ページの下部の [コストモデルから除外されたバケット] の下に表示されます。

バケットフィルター条件の作成 - 従来


バケットに入るデータをフィルタリングする条件を作成することもできます。これらのバケットフィルター条件は、調整条件とも呼ばれ、[詳細クエリ条件] タイプです。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

1. バケットのフィルターアイコンをクリックします。
2. フォームフィールドに入力します (テーブルを参照)。
3. [送信] をクリックします。

バケットフィルタリング条件の例



バケットフィルター条件のフィールド

フィールド	説明
名前	条件のわかりやすい名前。
優先度	フィルターが他のフィルターと比較していつ適用されるかを決定する値。2 つのフィルターの設定が同じ場合は、優先度の高いフィルターが適用されます。
テーブル	バケットに入れるときにフィルタリングされる経費を含むテーブル。レコードが総勘定元帳クレンジング済みデータ [itfm_gl_data_cleansed] テーブルにあるかどうか。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
詳細バケット化条件	条件ビルダーを使用してフィルターを作成します。

バケットフィルターを作成すると、右ペインのドーナツグラフの上にある [詳細条件] タブに表示されます。

[詳細条件] タブ

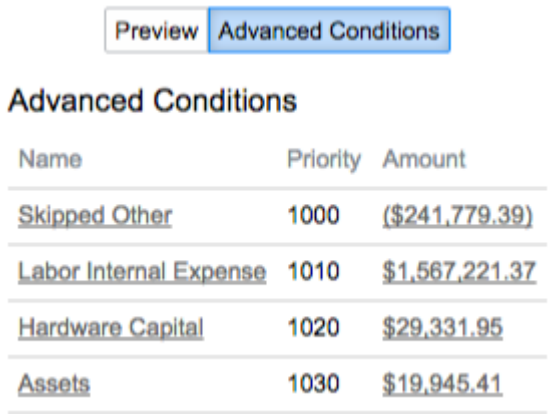


次のタスク
フィルター条件を確認したり、変更を加えたりすることができます。

- 条件の名前をクリックして、[詳細条件] フォームを開きます。
- 金額をクリックして、フィルターに一致する総勘定元帳経費のリストを開きます。

バケットにも詳細フィルター条件アイコンが表示されます。

バケットの詳細フィルター条件アイコン。



データソースのないコストモデルの調整済みラインを作成します - 従来

ファイナンシャルマネジメントワークベンチのデータ定義ステージで選択したコストモデルのデータソースがない場合は、クレンジングプロセスもありません。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

このタスクについて
バケット化ステージでは、アカウントを表示する左ペインはありません。このような場合、サブバケットで編集アイコンをクリックすると、[バケット金額行] フォームで調整済みラインを作成または編集できます。

注:
アプリケーションポートフォリオ管理 または サービスポートフォリオ管理 ユーザーの場合、ビジネスアプリケーション原価計算モデルコストモデルとサービスオファリング原価計算コストモデルにはデータソースがありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > ワークベンチ.
2. バケット化ステージで、調整済みラインを追加するサブバケットの編集アイコン ( ) をクリックします。
3. フォームで、フォームフィールドに入力します。

調整済みラインフォーム

フィールド	説明
総計	サブバケットの金額。
通貨	金額の通貨。
説明	バケット金額の説明。

事前設定されたカスタマーサービス管理 (CSM) コストモデルの場合、[アカウント番号]、[コストセンター]、[部門]、[アカウント名]、[場所]、および [ベンダー] フィールドは適用外です。

特定のサブバケットに複数の調整済みラインが存在する場合、調整済みラインのリストが表示されます。

4. [送信] をクリックします。

経費をバケットに入れる - 従来

バケットをセットアップしたら、経費をバケットにドラッグアンドドロップするだけです。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順


1. [アカウント] ペインで、フィルターボックスにアカウント名を入力するか、リストをスクロールして、バケットに割り当てるアカウントを見つけます。
2. [バケット] ペインで、[すべて折りたたむ] をクリックしてサブバケットを表示または非表示にすることができます。
3. 経費を [アカウント] ペインから関連するサブバケットにドラッグします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

バケットの [合計額] と右ペインのドーナツグラフの [割り当てられた合計額] は、割り当てに基づいて変更されます。

経費をバケットに入れる

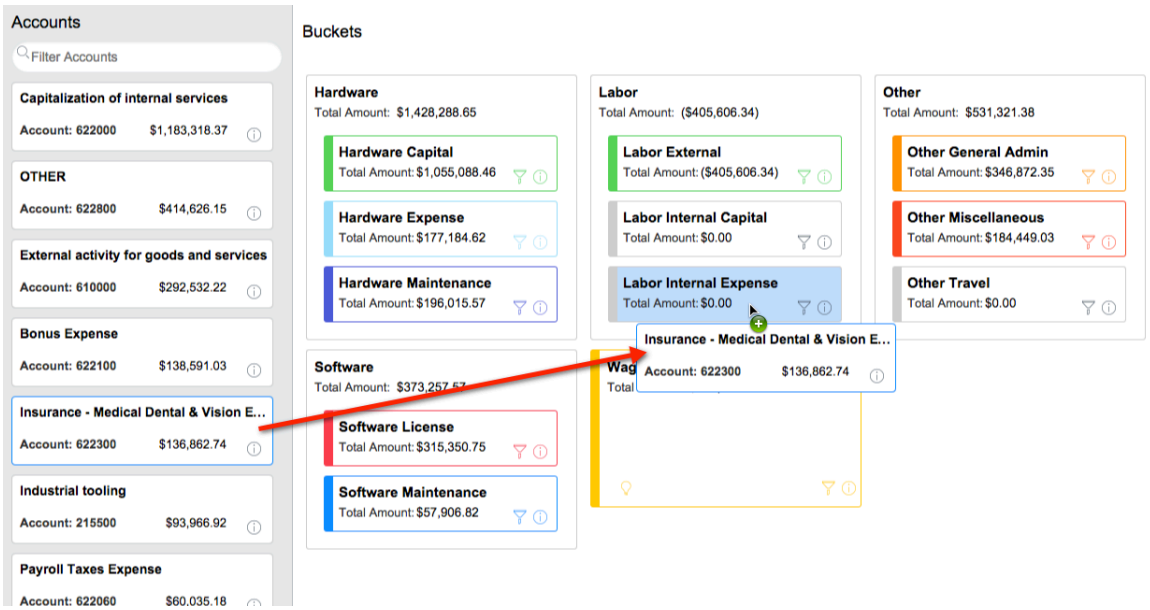

バケット割り当ての確認とバケット化の実行 - 従来

データがバケットに格納されると、各バケットの合計金額と各バケットの個々の総勘定元帳経費レコードを確認できます。

始める前に


必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

1. バケットの情報アイコン (ⓘ) をクリックすると、バケットに関するサマリ情報が表示されます。
2. [詳細条件] で、バケットフィルター条件が正しいことを確認します。
   a. 条件名をクリックしてバケットフィルター条件フォームを開き、必要に応じて変更します。
   b. [詳細な行] で [詳細を表示] をクリックして、バケットに割り当てられている経費レコードを表示します。この経費レコードは、総勘定元帳クレンジング済みデータ [itfm_cl_data_cleansed] テーブルに保存されています。
   c. バケットフィルター条件を削除するには、削除アイコン (⊖) をクリックします。
3. [割り当てられたアカウント] で、正しいアカウントとその中のすべての経費がバケットに表示されていることを確認します。
   a. アカウント名をクリックすると、バケットに割り当てられている [総勘定元帳クレンジング済みデータ] テーブルの経費レコードが表示されます。
   b. アカウントとそのアカウントに属するすべての経費をバケットから削除するには、削除アイコン (⊖) をクリックします。
4. [保持するフィールド] で、バケット内のレコードに保持するフィールドのチェックボックスを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

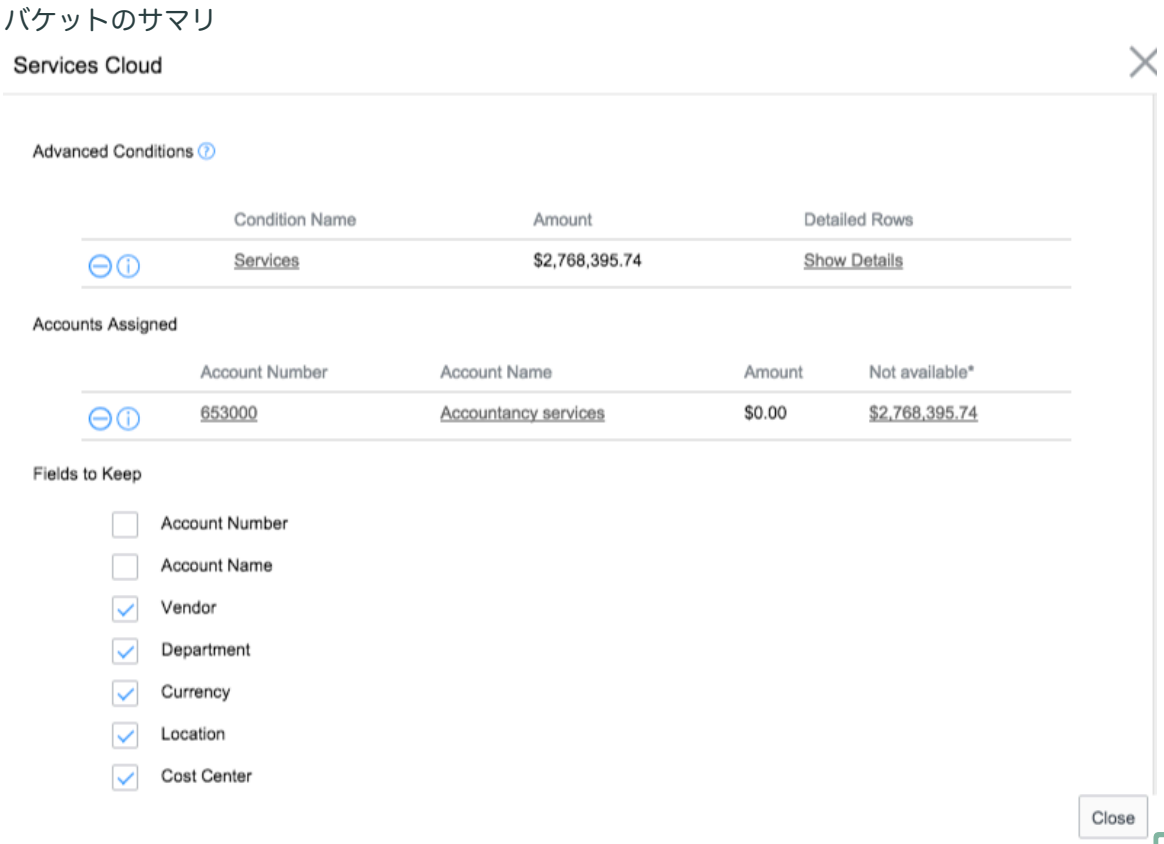

5. 終了したら、ウィンドウを閉じます。
6. データが正しい場合は、右ペインの [バケットを実行] をクリックします。
   - バケット化エンジンを実行すると、データは調整済み総勘定元帳データ [itfm_cl_data_groomed] テーブルに保存されます。
   - [バケットを実行] をクリックすると、作業している会計期間の既存の割り当て明細がすべて削除されます。

割り当てセットアップステージ - 従来

[割り当てセットアップ] ステージでは、アカウントとセグメントに経費を割り当てることができます。

[割り当てセットアップ] ページでは、作成したサブバケットが左ペインに表示されます。ただし、コストモデルから除外したサブバケットは除きます。セグメントとそのアカウントは、データ定義ステージで定義した階層の中央ペインに表示されます。右ペインのサマリは、経費が各セグメントのアカウントにどのように割り当てられているかのブレークダウンを示しています。

[割り当てセットアップ] ステージでは、次のことができます。


- バケットの内容を表示し、必要に応じてバケットを小さいバケットに分割します。
- ロールアップを作成および変更して、階層内の上位レベルのセグメントに経費を適用する方法を正確に指定します。
- 経費をアカウントに割り当てます。
- 割り当てられた経費を確認し、必要に応じてバケット割り当てを元に戻します。
- 特定の値以上の金額で割り当てセットアップセグメントアカウントをフィルタリングします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [構成] タブの [セグメントごとのレコードの表示 (Configure the Display Records per segment)] ページネーションオプションで、ページごとに同時に表示するオプションを 5、10、15、25、または 50 件に構成します。ページネーションオプションは、ページあたりのセグメント内のアカウントの合計数から選択したアカウント数を表示します。左右の矢印を使用すると、セグメント内のすべてのアカウントが表示されるまで、次のレコードセットに移動できます。
- 同様に、[構成] タブでページネーションオプションを設定することにより、表示するアカウントの数を選択して、ワークベンチページを軽量化できます。

ワークベンチでの割り当てのセットアップ

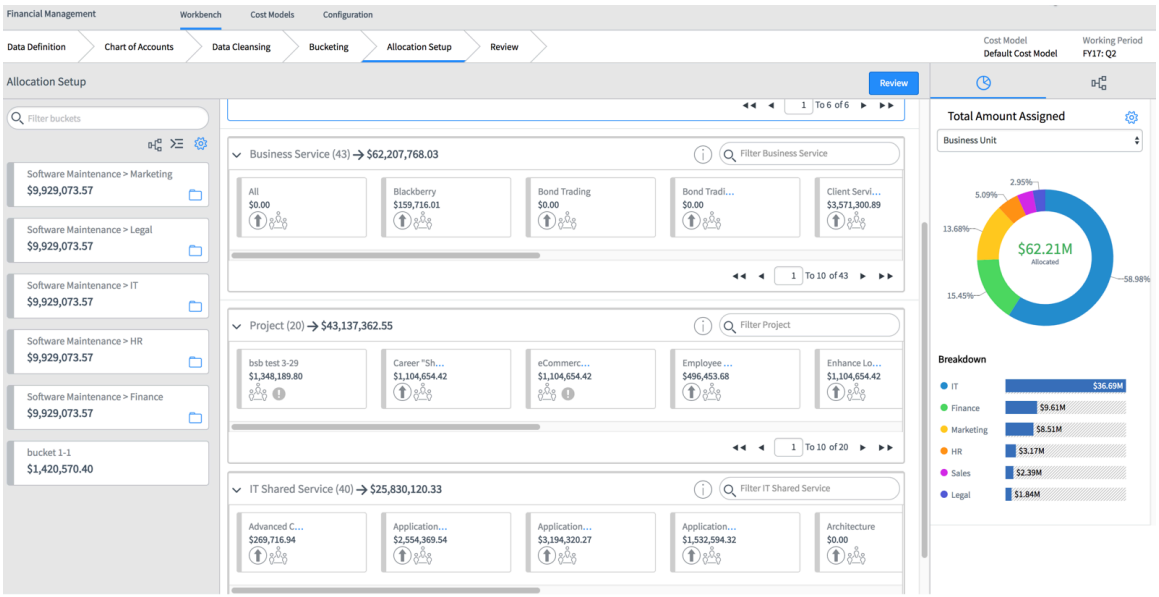

基本割り当てセットアップ

この機能を使用すると、特に大規模なアカウントや割り当てルールを扱う場合に、割り当てセットアップを簡単に行うことができます。

基本割り当てセットアップパラメーターを設定して、割り当てセットアップ UI をライターモードで開きます。基本割り当てセットアップを有効にすると、アカウントとともに金額プレビューとともに UI をロードしなくても、最小限の情報で割り当てセットアップページをすばやく開くことができます。基本割り当てセットアップの情報は、オンデマンドでのみフェッチされます。

機能的には、基本割り当てセットアップでは、通常の割り当てセットアップ UI と同様にすべての機能を実行できます。主な目的は、バケットアカウントの割り当てとロールアップ割り当てルールの定義です。バケットとロールアップのアイコンインジケーターは、基本割り当てセットアップでルールが定義されるときにガイドします。

注:
アナリストのライセンスを受けていない顧客の場合、[基本割り当てセットアップ] オプションは自動的に有効になりますが、次の場合にはこのオプションは無効になります。

- セグメント内のアカウント数がしきい値 (4000) を超えている場合
- コストモデルの合計アカウント数がしきい値 (12000) を超えている場合

このパラメーターを有効にすると、次の詳細は表示できません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 各アカウントに表示される金額プレビュー。
- 右ペインのサマリチャート。
- アカウントの [リレーションシップを表示] リンク。ただし、アカウントポップアップの [アカウントのロールアップ] タブでは、必要に応じて各アカウントのロールアップ先のアカウントを表示できます。

資金不足分析

注:

資金不足分析は、Madrid リリースより前に利用可能になった割り当てログ機能の拡張および改善されたバージョンです。

割り当てセットアップステージでは、金額が正しくロールアップされず、処理中に資金が不足する可能性があります。理由は、次のいずれかのステージのエラーが原因である可能性があります。

- バケット割り当て
- セグメントロールアップ
- アカウントロールアップ

資金不足ログには、金額の一部が不足し、設定された割り当てルールに従ってターゲットセグメントまたはアカウントに到達できない理由の詳細と、問題を解決するためのアクション可能なリンクが表示されます。

資金不足ログを構成するには、[構成] タブをクリックし、[資金不足分析] を切り替えてログを有効にします。このアクションにより、ワークベンチの割り当てセットアップステージで [資金不足ログ] ( ) アイコンが有効になります。

警告:
ログを有効にすると、割り当てセットアップページのロードが遅くなる場合があります。

資金不足ログは、選択リストにリストされているセグメントロールアップエラー、アカウントロールアップエラー、およびバケット割り当てエラーに分類され、割り当て中に不足している金額を識別し、誤ったルールと割り当ての問題を明確に示すのに役立ちます。分離は、割り当てとロールアップの問題を迅速に解決し、資金が目標に到達する代わりにどのように不足しているかを追跡するのに役立ちます。

[エラー/警告のトラブルシューティング] リンクをクリックすると、各エラーを解決するために従うことができる手順とともに必要なアクションを実行するためのガイドとなる Web ページが開きます。

バケットコンテンツの表示 - 従来

IT 財務ワークベンチのバケット化ステージで、バケットのリストに表示される内容を変更できます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

1. [割り当てセットアップ] の横にある歯車アイコン ( ) をクリックします。
2. [割り当てられたバケットを表示] トグルをクリックして、既に割り当てられているバケットを表示または非表示にします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

バケット内の経費は、割り当てられていないバケットのアカウントにのみ割り当てることができます。

3. [ソート基準] リストで [名前] または [金額] を選択してアカウントをソートします。
4. [ソート] リストから [昇順] または [降順] を選択して、アカウントをさらにソートします。

情報アイコンをクリックして、バケットに属する総勘定元帳クレンジング済みデータ [itfm_cl_data_cleansed] テーブルに保存されているレコードを表示します。レコードは、新しいブラウザータブまたはブラウザーウィンドウのリストビューで開きます。

バケットの分割 - 従来

バケットには、調整された総勘定元帳経費が含まれています。これらの経費は、コストセンター、ベンダー、部門、場所などのアイテムに関連付けることができます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst
分割できるのは、アカウントにまだ割り当てられていないバケットのみです。

このタスクについて

バケット内の経費は、コストセンター、ベンダー、部門、場所などの任意の属性で分割できます。Istanbul リリース以降は、任意のカスタム属性を使用してバケットを分割できます。財務データソースフィールドマップを使用して、[バケット分割に使用] オプションを有効にし、バケットを分割する追加の属性を取得します。

たとえば、バケットに 2 つの異なるベンダーの経費が含まれている場合、バケットをベンダーごとに 1 つずつ、合計 2 つのバケットに分割できます。各分割バケットには、そのベンダーに関連付けられた調整済みの総勘定元帳経費が含まれています。

手順

1. ワークベンチで [割り当てセットアップ] ステージを開きます。
2. [割り当てセットアップ] ペインで、分割するバケットのバケット分割アイコン ( ) をクリックします。
   [分割バケット] ウィンドウが表示され、バケット内の金額が示されます。
3. [分割] リストから、調整済みの総勘定元帳経費に関連付けられている属性を選択するか、[パーセンテージ] を選択します。
   - 属性を選択すると、新しいバケットが [元のバケット名] > [属性名] の形式でデフォルト名でウィンドウに表示されます。
   - [パーセンテージ] を選択した場合は、新しいバケットのパーセンテージを入力し、各バケットに名前を付けます。
   - [重み付け] 分割メソッドを選択した場合は、使用可能なメトリクスに基づいてバケット数を階層内の任意のセグメントに分割することができます。

     注:

     メトリクスが設定済みの重み付け合計の場合、その重み付けされたメトリクスを使用してバケットを分割することはできません。

     [重み付け] メソッドに基づいてバケットを分割した後は、それ以上分割することはできません。

   分割バケットのプレビューが、各バケットの経費金額とともにウィンドウに表示されます。
4. [バケットの分割] をクリックします。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. アプリケーションは新しいバケットを作成し、設定に従って経費をそれらの間で分割します。


   分割されたバケットは、フォルダーアイコンとともに表示されます。

バケットの分割

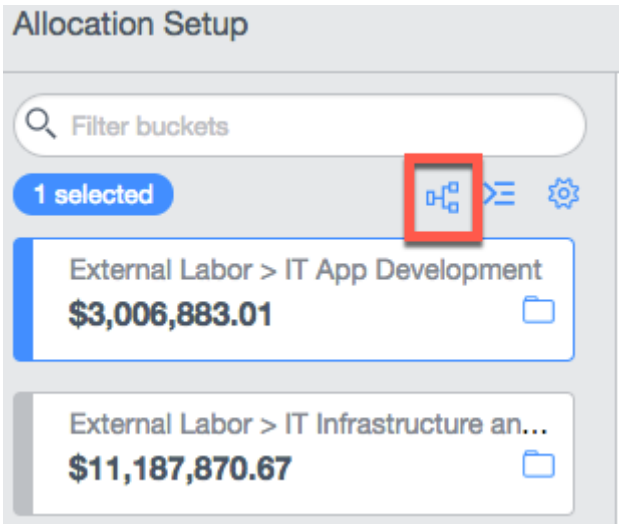

6. 新しく分割されたバケットと一緒に分割された他のバケットを表示するには、フォルダーアイコンをクリックします。
7. バケット分割を元に戻すには、[未分割のバケット] をクリックします。

ハードウェアバケットの分割

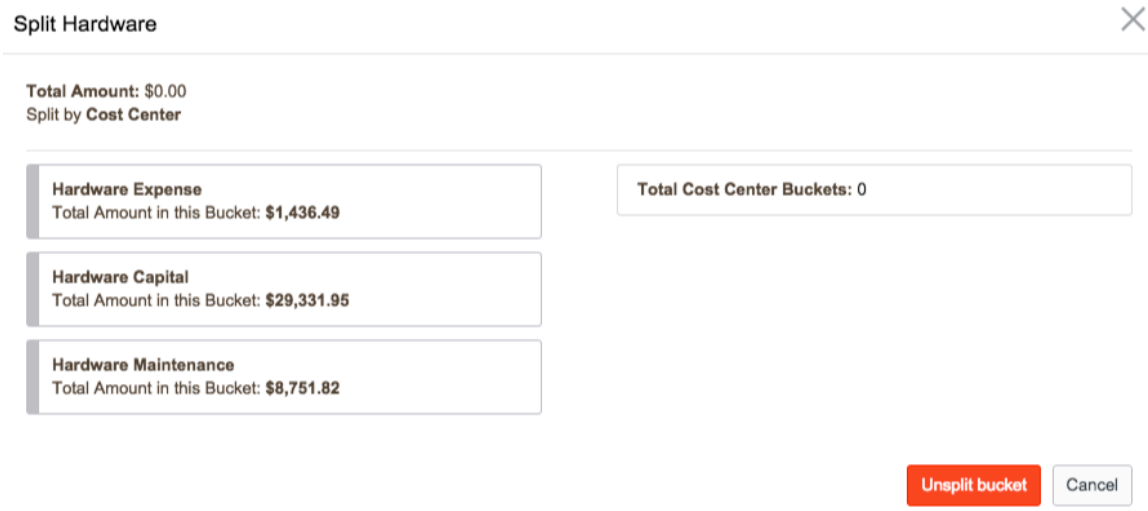

割り当てのロールアップ - 従来

ロールアップは、セグメント階層内の下位レベルのアカウントが、階層内で上位にある他のアカウントにどのように接続するかを指定する割り当てルールです。ロールアップを使用すると、経費を下位レベルのアカウントに割り当て、経費を上位レベルのアカウントに自動的に割り当てることができます。

ロールアップは、アカウント固有またはセグメント固有にすることができます。アカウント固有のロールアップでは、経費を特定の 1 つのアカウントからその上の 1 つ以上のアカウントにロールアップする方法を指定します。セグメント固有のロールアップでは、セグメントのすべてのアカウントの経費を、その上のセグメント、つまり親レベルのすべてのアカウントにロールアップする方法を指定します。階層内で先行する任意のセグメント、つまり祖父母レベルにセグメントをロールアップすることもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

個々のアカウントに指定されたロールアップは、セグメントに指定されたロールアップよりも優先されます。たとえば、次の 2 つのロールアップを作成する場合：

- ビジネスサービスセグメントのメールアカウントの経費を事業部門セグメントの IT アカウントに割り当てるアカウント固有のロールアップ。
- ビジネスサービスセグメントの経費を事業部門セグメントに割り当てるセグメント固有のロールアップ。

次に、アカウント固有のロールアップによって経費が割り当てられます。セグメント固有のロールアップでは経費は割り当てられません。

アカウント固有のレベルのロールアップでは、階層内の任意の親または祖父母のアカウントへのロールアップがサポートされています。経費は階層内の任意のアカウントにロールアップできますが、必ずしも階層内の直接の親にロールアップする必要はありません。

ロールアップは階層内で上になるだけでなく、兄弟セグメントのアカウントに金額をロールアップすることもできます。

[ロールアップ] ポップアップで [親セグメント] を選択し、アカウントレベルで階層内の任意の親セグメントへのロールアップを設定します。

重み付けされたメトリクスを使用した割り当ての重み付け合計サポート

重み付け合計サポートで有効になっている重み付けされたメトリクスを使用する場合、メトリクスは次の重み付け合計計算で割り当てパーセンテージを正確に計算します。

- メトリクスに [割り当て先] が使用され、アカウントにロールアップがないセグメントレベルのロールアップでは、セグメント内のすべてのアカウントの合計パーセンテージが 100% 未満になります。
- セグメントレベルのロールアップでは、[割り当て先] メトリクスが使用され、セグメント内の各アカウントのパーセンテージがアカウントの消費の重み付けに基づいて計算されます。
- アカウントレベルのロールアップでは、アカウントレベルのロールアップルールがセグメントレベルのロールアップルールよりも優先され、すべてのアカウントの合計パーセンテージが 100% 未満になります。
- アカウントレベルのロールアップでは、各アカウントのパーセンテージは、アカウントの消費の重み付けに基づいて計算されます。
- セグメントにバケット金額を割り当てる場合、セグメントに割り当てられる合計パーセンテージは合計で 100% 未満になります。
- バケット金額をセグメントに割り当てる場合、セグメント内の各アカウントに個別に割り当てられるパーセンテージは、アカウントの消費の重み付けに基づいて計算されます。

アカウントにロールアップするアカウントの表示

別のアカウントにロールアップするアカウントを表示できます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

1. アカウントの情報アイコン (ⓘ) をクリックします。

   アカウントのサマリウィンドウが表示され、次の情報が表示されます。

   - 現在このアカウントに割り当てられている合計金額。
   - このアカウントに経費を提供するバケット。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- このアカウントが親セグメントにロールアップするために使用するメソッド。
- このアカウントにロールアップするアカウント。
- このアカウントがロールアップするアカウント。


2. このアカウントに直接割り当てられているバケットを表示するには、[割り当てられたバケットを表示] をクリックします。
3. デフォルトのロールアップを上書きする特定のアカウントセグメントに (ステップ 2 で説明したように、このアカウントに割り当てられたすべてのバケットの中で) 1 つ以上のバケット金額を割り当てる場合は、[バケットロールアップ] タブをクリックします。

   このようなバケットベースのロールアップは、なし、均等、手動、重み付け、またはスクリプト化された方法を使用して実行できます。

   この方法でロールアップされない他の未定義のバケットは、デフォルトのロールアップメソッドに従います。

   移動先 ファイナンシャルモデリング > コストモデル > 割り当てロールアップの上書き をクリックして、 移動元アカウントセグメント、 移動先アカウントセグメント、ロールアップメトリクスを表示し、そのような割り当ての詳細を入力します。

   バケットベースのロールアップの例

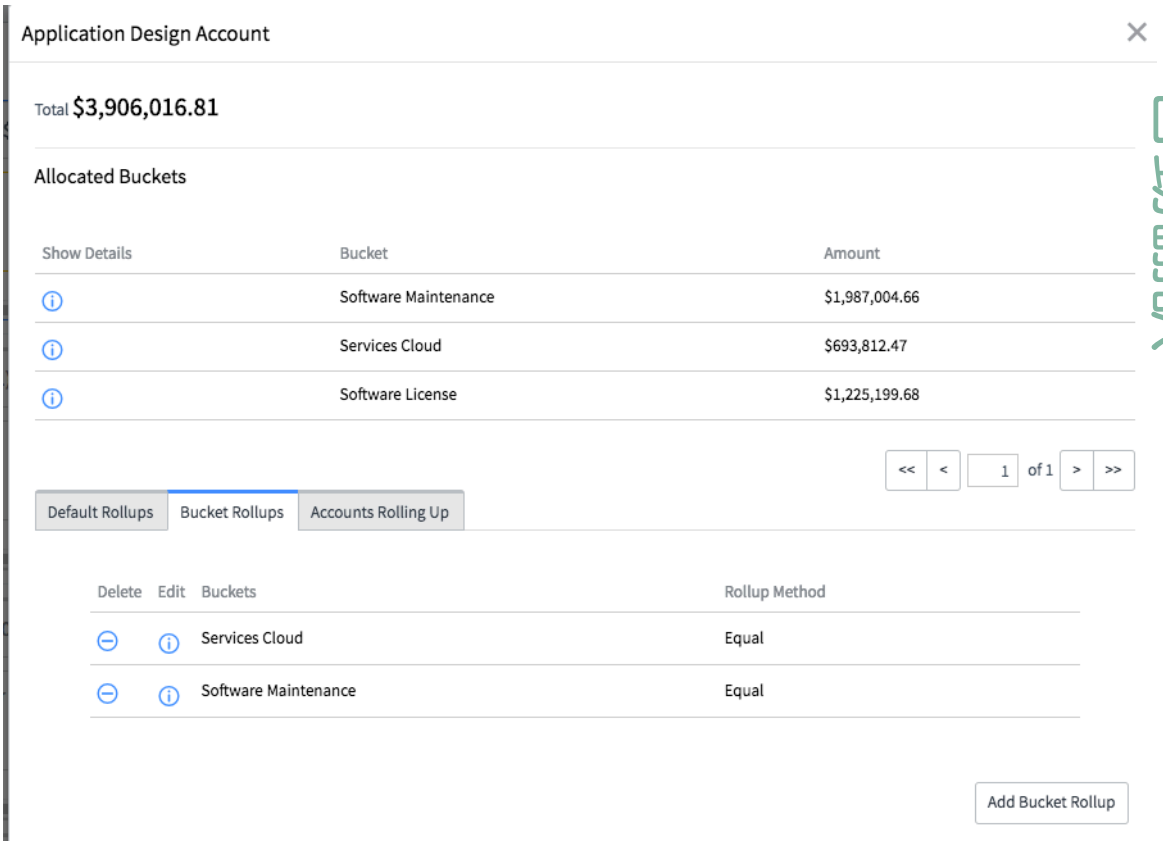

4. [アカウントのロールアップ] タブが選択されていない場合は、そのタブをクリックします。

   ロールアップするアカウントと、アカウントの [合計] 経費を構成するバケットを確認できます。

5. 情報アイコンをクリックすると、ロールアップするアカウントまたはバケットが表示されます。
6. リストをソートするには、歯車アイコンをクリックしてページあたりのアイテム数を選択し、アイテムのソート方法を指定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

あるアカウントから別のアカウントへのロールアップの作成

セグメント階層内のあるアカウントから、その上のセグメント内の別のアカウントへのロールアップを作成できます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

1. アカウント名のハイパーリンクをクリックします。

   [アカウントのサマリ] ポップアップが表示され、次の情報が表示されます。

   - 現在アカウントに割り当てられている合計金額。
   - アカウントに経費を提供するバケット。
   - アカウントが親セグメントにロールアップするために使用するメソッド。
   - アカウントにロールアップするアカウント。
   - アカウントからロールアップするアカウント。

2. このアカウントに直接割り当てられているバケットを表示するには、[合計] 値の横にある [割り当てられたバケットを表示]をクリックします。
3. [ロールアップ] タブが選択されていない場合は、それをクリックします。
4. [ロールアップメソッド] 選択リストからメソッドを選択します。

オプション	説明
セグメントのデフォルトメソッド	経費は、データ定義ステージで作成された CI 関係のデフォルトのロールアップルールに従います。これは、CMDB 内の他のアイテムにロールアップする CMDB 内のアイテムのデフォルトのオプションです。
なし	経費は親アカウントにロールアップされません。
均等	経費は同じパーセンテージで親アカウントにロールアップされます。親アカウントを指定します。
[手動]	経費は指定したパーセンテージで親アカウントにロールアップされます。[パーセンテージ] フィールドに金額を入力します。
重み付け	経費は、存在する重み付けされたメトリクスを使用して親アカウントにロールアップされます。使用可能なメトリクスは、親アカウントが属するセグメントへのロールアップを指定するメトリクスです。メトリクスで [関係を強制] オプションが選択されている場合、子アカウントが属するセグメントも考慮されます。メトリクスで [関係を強制] オプションが選択されていない場合、子アカウントのセグメントは無視されます。
スクリプト化	スクリプトがロールアップを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. アカウントをその上のアイテムにリンクするには、[ロールアップを追加] をクリックします。
6. [親セグメント] 選択リストで値を選択します。
7. [親アカウント] 選択リストからアカウントを選択します。
8. 手動ロールアップメソッドを選択した場合は、[パーセンテージ] フィールドに金額を入力します。
9. 必要な数のロールアップを入力します。
   パーセンテージの合計は 100% になる必要があります。アカウントを削除するには、削除アイコン ( ) をクリックします。
10. 変更を行った後、[変更を保存] をクリックします。
    ロールアップルールは、右ペインのドーナツグラフの下に表示されます。
11. 選択したアカウントがロールアップされているアカウントのみを表示するには、アカウントの関係アイコン ( ) をクリックします。

    リンクされたアカウントのみが表示されます。経費が割り当てられるアカウントの色は、ワークベンチによってランダムに割り当てられます。色は、ドーナツグラフのアカウントの色と一致します。

    上向き矢印アイコン ( ) は、セグメントまたはアカウントレベルで定義されたロールアップを示します。

12. セグメント階層内のすべてのアカウントを再度表示するには、 をクリックします。

    ロールアップを作成すると、階層内のセグメント関係を管理するために使用されるシステムメトリクスが自動的に更新されます。このメトリクスは、データ定義ステージ中にアプリケーションによって作成されます。

あるセグメントから別のセグメントへのロールアップの作成

セグメントは、重み付けされたメトリクスを使用して、階層内でその上のセグメントにロールアップできます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

1. セグメントの情報アイコン ( ) をクリックします。
2. [ロールアップメソッド] 選択リストで、[重み付け] を選択します。


   a. [メトリクスを使用して分割] 選択リストでメトリクスを選択します。
      このメトリクスは、[値] 列の値によって金額を自動的に重み付けします。

   b. 金額をさらに変更するには、[パーセンテージ] 列の値を変更します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールアップの例

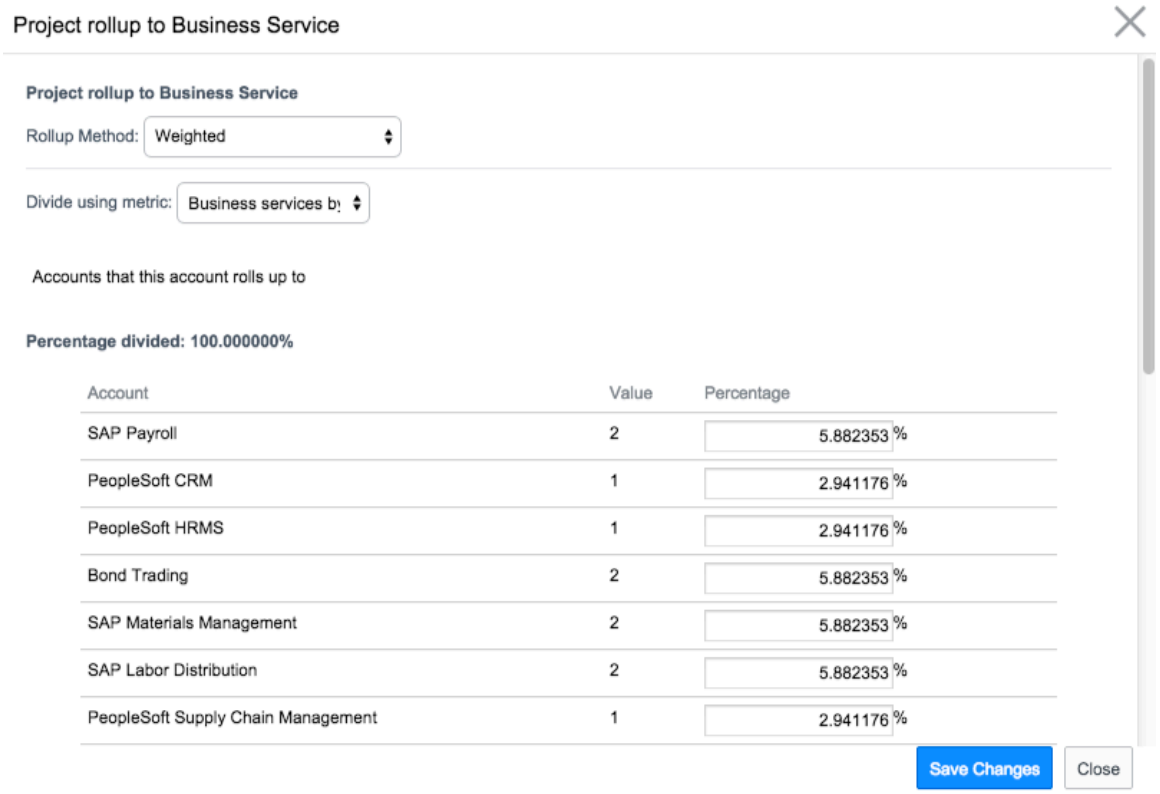

c. [変更を保存] をクリックします。

3. [ロールアップメソッド] 選択リストで、[スクリプト化] を選択します。

a. フォームのフィールドに入力します。

セグメントフォーム

フィールド	説明
アカウントスコープ	[アカウントスコープ] チェックボックスを有効にすると、セグメントレベルで各アカウントに対して定義されたロールアップスクリプトが実行されます。このチェックボックスを無効にすると、セグメントレベルで定義されたデフォルトのロールアップが実行され、sys_id (FromAccountID) で各アカウントに定義されたロールアップが上書きされます。 セグメントのアカウントに対して同様のロールアップスクリプトを繰り返す代わりに、各アカウントの FromAccountID を使用して個々のアカウントのロールアップスクリプトを提供することができます。FromAccountID を指定していない残りのすべてのアカウントに対して、デフォルトのロールアップを指定できます。これらすべてのロールアップを単一のスクリプトで提供して実行できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
スクリプト	アカウントをロールアップするスクリプト。

b. [更新] をクリックします。

属性別のセグメントグループ化：数千のセグメントアカウントがある場合は、属性によるグループを使用してセグメントアカウントを分類できます。アカウントは、グループ化されていないセグメントにロールアップされるのと同じように、グループ化されたセグメントにロールアップされ、割り当て明細が [itfm_allocation_breakdown] テーブルに生成されます。グループ化されたセグメントにロールアップすると、パフォーマンスが向上します。

ロールアップレコードの編集

必要に応じて、セグメントロールアップとアカウントロールアップのレコードを表示および編集できます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

このタスクについて

注:
ロールアップレコードのスクリプトを変更するのではなく、ワークベンチを使用してロールアップを作成、変更、および削除することをお勧めします。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > コストモデル > 割り当てロールアップ をクリックして、あるアカウントから別のアカウントに作成されたロールアップにアクセスします。
2. ロールアップ名をクリックして開きます。
3. 必要に応じて変更を加えます。

バケット割り当て - 従来

割り当てのセットアップとは、バケット内の経費をセグメント内のアカウントまたはセグメント内の複数のアカウントに割り当てることを意味します。

バケット内の経費は、ロールアップ用に作成した割り当てルールに基づいて自動的にロールアップされます。経費を割り当てると、アプリケーションは名前に BCK:ALLC: というプリフィックスが付いた割り当てルールを作成し、ロールアップ用に作成されたルールの値を含まない最高値よりも 10 多い順序値を指定します。アプリケーションがロールアップ用に作成するルールのデフォルト値は 1,000,000 です。アプリケーションは、アカウントに割り当てられるパーセンテージを指定するメソッドも作成します。

セグメントまたはアカウントにバケットを割り当てる

ワークベンチの [割り当てセットアップ] ステージでは、バケットから階層内のアカウントに経費を割り当てることができます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. バケットを特定のアカウントにドラッグします。

   複数のバケットを選択して特定のアカウントにドラッグすることもできます。バケットがアカウントに割り当てられている場合、割り当て方法は常に [100% 割り当て] になります。

   あるいは、1 つまたは複数のバケットを選択します。次の手順を実行して、単一のアカウントまたは複数のアカウントに割り当てる経費が含まれている [バケットの割り当て] アイコン ( ) をクリックします

   a. [割り当て方法] で、[アカウントに割り当て] を選択します。

   b. [セグメントに割り当て] で、セグメントを選択します。

   c. [アカウントに割り当て] で、選択したバケット内のすべての経費を割り当てるセグメントアカウントを選択します。

   d. 一方、選択したバケットを複数のアカウントに割り当てるには、[アカウントに割り当て] でデフォルトの [複数のアカウント] を選択した状態で [移動] をクリックします。

      [割り当てルールを作成] ウィンドウが表示され、[選択したバケット] のリストと、選択したセグメントのアカウントを選択するための選択したアカウントまたはオプションが表示されます。バケットを割り当てない場合は、バケットを選択して削除します。

2. バケットをセグメントにドラッグするか、[バケットの割り当て] アイコン ( ) をクリックして、セグメントにバケットを割り当てます。
   バケットはセグメントに一度に 1 つずつ割り当てることができます。複数バケットの選択は、セグメントの割り当てには適用されません。バケット割り当てがセグメントに対するものである場合は、選択リストから割り当て方法を選択する必要があります。

オプション	説明
均等	経費は同じパーセンテージでアカウントに割り当てられます。
[手動]	経費は指定されたパーセンテージでアカウントに割り当てられます。[パーセンテージ] フィールドに金額を入力します。
重み付け	経費は、重み付けされたメトリクスを使用してアカウントに割り当てられます。 メトリクスが重み付け合計で設定されている場合、その重み付けされたメトリクスを使用してバケットを分割することはできません。

3. [分割] 選択リストから、セグメントを選択します。
4. 重み付けメソッドを選択した場合は、[メトリクスを使用して分割] 選択リストから事前設定されたメトリクスを選択します。
   使用可能なメトリクスは、親セグメントと子セグメントを指定するメトリクスのみです。
5. [作成] をクリックします。
6. 以前にセグメントまたはアカウントにバケット金額がどのように割り当てられたかを知るには、バケット名をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

バケットがポップアップで開き、メッセージが上部に表示されます。メッセージには、バケット金額が割り当てられた割り当て方法と、金額が割り当てられたセグメントの名前が表示されます。割り当てが [アカウントに割り当て] メソッドによるものである場合、メッセージにはアカウント名と割り当てのパーセンテージも表示されます。

バケット割り当て情報のサンプルメッセージ

'Facilities Data Center' bucket is distributed equally to 'Business Unit' segment

アサインされた経費のレビュー - 従来


アカウントに割り当てられた経費を確認し、右ペインの [割り当てられた合計額] セクションで情報が正しいことを確認します。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

1. アカウントの情報アイコン (ⓘ) をクリックして、割り当てのサマリを表示します。
   次の情報が表示されます。
   - 割り当てられた合計額。
   - アカウントに割り当てられているバケット。
   - このアカウントへのロールアップ。
2. バケットの横にある情報アイコン (ⓘ) をクリックして、バケットのサマリを表示します。

[アカウントのサマリ] ウィンドウ

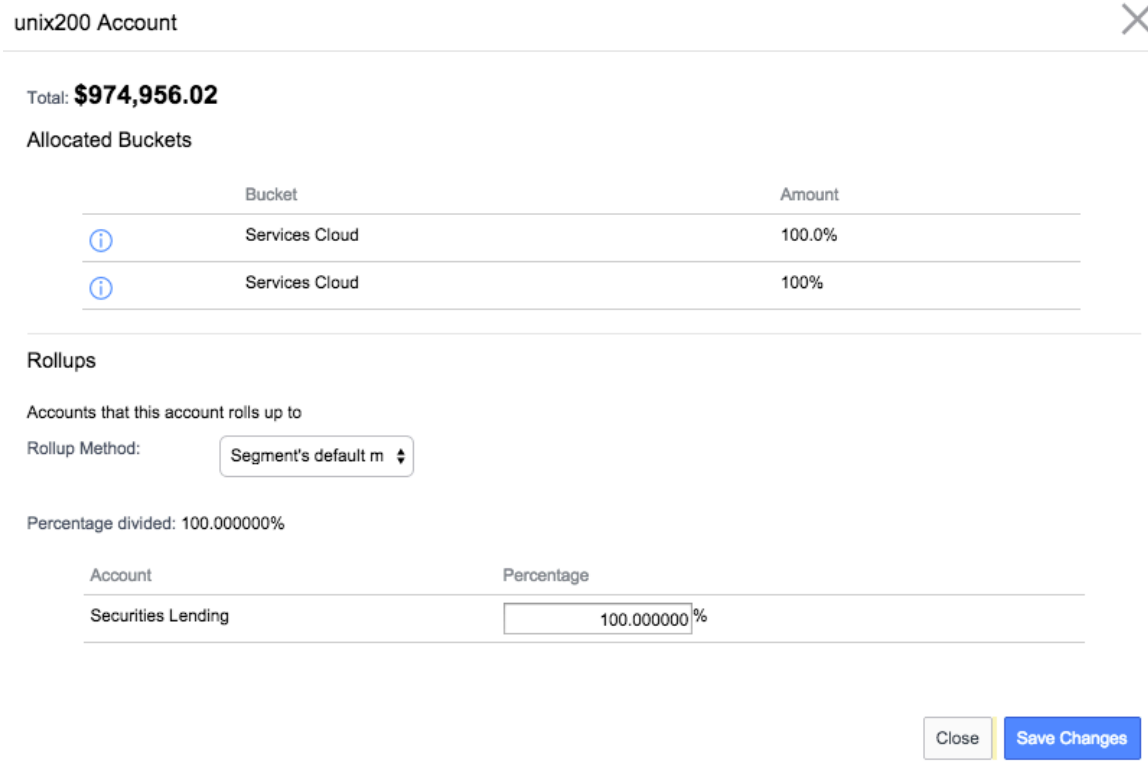

割り当てられた合計額を確認する - 従来

右側のドーナツグラフには、すべてのセグメントに割り当てられた経費が表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

このタスクについて
デフォルトでは、ドーナツグラフとセグメント階層の両方の計算には、ワークベンチで作成した新しいルールのデータと、以前に作成した既存のルールのデータが含まれます。[ユーザールール] と呼ばれる既存のルールをオフにして、新しく作成したルールからの計算のみが表示されるようにすることができます。

手順

1. [プレビュー] タブで、[割り当てられた合計額] リストからセグメントを選択して、そのセグメントの割り当てを表示します。
   各アカウントのブレークダウンは、ドーナツグラフの下に表示されます。
2. 変更時にドーナツグラフの情報が自動的に更新されるかどうかを変更するには、アカウントの歯車アイコン ( ) をクリックして割り当ての概要を表示し、[自動的に更新] トグルをクリックします。

   [プレビュー] タブ

3. [ユーザールール] タブをクリックして、ワークベンチの外部で手動でセットアップした割り当てルールとロールアップを表示します。
   このタブでは、次のアクションを実行できます。
   - ルール名をクリックして、そのルールの [コスト割り当てルール] フォームを開きます。
   - プレビューアイコン ( ) をクリックして、割り当てビューアーでそのルールの割り当てをプレビューします。
   - [表示] チェックボックスをクリックして、ユーザーが作成した既存のルールの割り当て明細を、割り当てられたバケットの計算に含めます。このチェックボックスをオンにすると、アプリケーションには、アカウントでアクティブな既存の割り当て明細が含まれます。これらの割り当て明細を含めると、セグメントとドーナツグラフに表示される金額が影響を受けます。計算された値にバケットから割り当てたもののみを表示する場合は、このオプションを選択しないでください。
   - [すべてのルールを表示] をクリックすると、アプリケーションのすべての割り当てルールのリストが表示されます。

   [ユーザールール] タブ

バケットからの割り当てのプレビュー - 従来

割り当てビューアーを開くと、ワークベンチがバケット内の経費をどのように割り当てるかをグラフでプレビューできます。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

ビューアーを開くには、バケットの割り当てプレビューアイコン ( ) をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

バケット割り当てを元に戻す:従来

バケット割り当てを元に戻すには、セグメントとアカウントから経費を取り出し、バケットに残しておく必要があります。バケットを元に戻すと、このバケットに関連付けられている作業会計期間の既存の割り当て明細も削除されます。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst


このタスクについて
単一のバケットまたはすべてのバケットのバケット割り当てを元に戻すことができます。

> **注:**
> ワークベンチ外の経費を元に戻すこともできます。

手順

1. 単一のバケットのバケット割り当てを元に戻すには、次のアクションを実行します。
   a. バケットの情報アイコンをクリックして、アカウントのサマリを開きます。
   b. [バケットを未割り当てにする] をクリックします。
2. 単一のバケットのバケット割り当てを元に戻し、その作業会計期間の既存の割り当て明細を削除するには、次のアクションを実行します。
   a. バケットの割り当て解除アイコン ( ) をクリックします。
   b. 確認ポップアップウィンドウで [はい] をクリックします。
   c. 確認ウィンドウで [ここをクリック] をクリックし、[削除] をクリックして、すべての会計期間の既存の割り当て明細を削除することもできます。

[バケットの割り当て解除] ウィンドウ

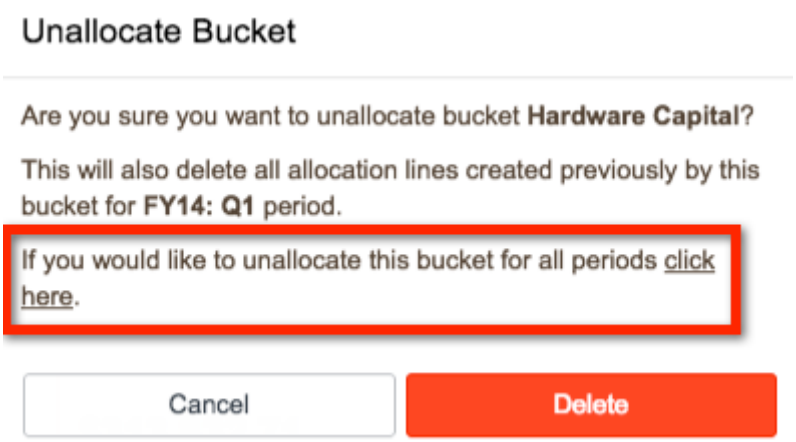

3. すべてのバケット割り当てを元に戻すには、次のアクションを実行します。
   a. [割り当てセットアップ] の横にある歯車アイコン ( ) をクリックします。
   a. [すべてのバケットを未割り当てにする] をクリックします。
   b. アクションを確認します。

割り当てレビューステージ - 従来

割り当てレビューステージでは、割り当てを処理する前に割り当てセットアップを確認できます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

割り当てセットアップのレビュー

[レビュー] ページでは、次のサマリを利用できます。

- バケット化：バケット化ステージでバケットに割り当てられた経費のパーセンテージ。
- 割り当てセットアップ：割り当てセットアップステージでセグメント階層内のアカウントに割り当てられているバケットのパーセンテージ。
- その他：セグメントに割り当てられる経費の金額、データクレンジングステージでクレンジングされた金額、未割り当てバケットと割り当て済みバケットの金額などの詳細な割り当て情報。

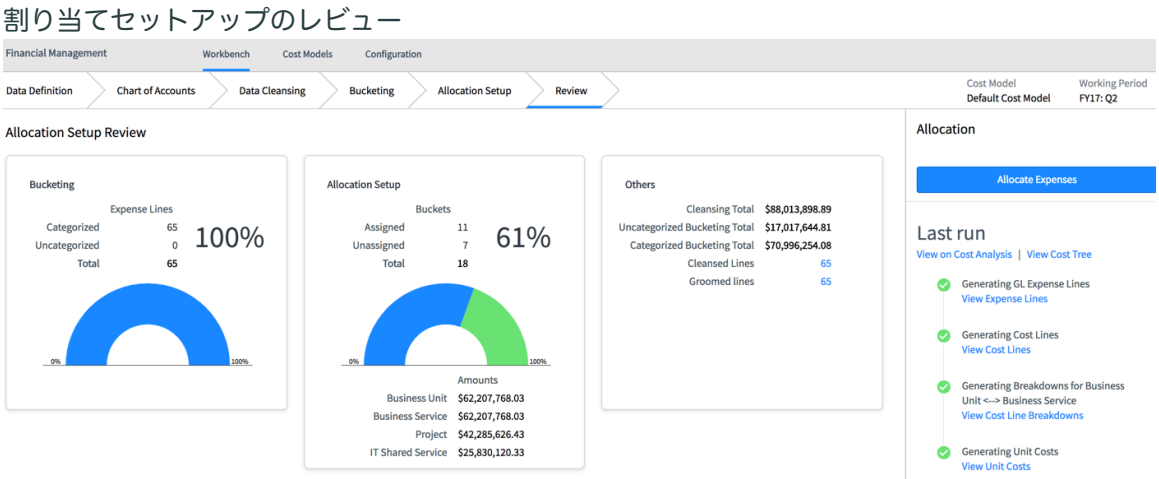

割り当て

割り当てエンジンへの割り当てジョブをキューに入れることで、さまざまな会計期間の複数のコストモデルの割り当て実行を同時にトリガーできます。これにより、同じインスタンス上の複数のユーザーが、要求された割り当て実行をキューに入れることもできます。割り当てエンジンが割り当ての実行を完了すると、確認メッセージが表示されます。

- 現在のジョブが完了すると、エンジンは自動的にキュー内の次のジョブを取得します。
- 複数のコストモデルと会計期間の割り当てジョブをいくつでもキューに入れることができます。
- ジョブの進行中にジョブをキャンセル (エンジンを停止) すると、キューにある次のジョブのエンジン実行時間を短縮できます。
- 実行しない場合は、キューから削除することで、キューに格納されたジョブの状態を取り消すこともできます。

この機能拡張では、コストモデルの前回の実行の詳細とそのブレークダウンの詳細を、割り当てと単位コストへのリンクとともに表示できます。

- コスト分析で表示：分析のためにコストラインを表示します。
- 経費ラインの表示：(顧客が前のバージョンから Yokohama にアップグレードする場合) 既存のコストモデルの財務モデルフォームで **[GL** 経費ラインを生成] チェックボックスをオンにしている場合は、割り当てエンジンの実行後にコストモデルの GL 経費ラインを表示できます。GL 経費ラインは、Yokohama にアップグレードした後に作成したコストモデルに対しては生成されません。

> **重要:**
> この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有しているお客様のみが利用できます。

- コスト行を表示：コスト割り当てアグリゲートを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コスト行ブレークダウンの表示：コストモデルのコスト割り当てブレークダウン集計。[オンデマンドのみ実行] フラグが [true] に設定されている場合、割り当てエンジンはブレークダウンラインを生成しません。ブレークダウンラインを明示的に生成するには、財務モデルフォームの [ブレークダウンの関係性] 関連リストでブレークダウン割り当てを生成します。
- 単位コストの表示：単位コストを表示します。

進行中の現在のコストモデルの詳細と、キュー内の割り当てジョブの合計数を表示することもできます。また、現在のジョブの進捗状況を、現在の割り当て実行のステータスとその詳細とともに表示します。

コストツリーの表示：選択したアカウントに貢献しているすべてのセグメントアカウントを階層ビューで表示します。各セグメントアカウントで、階層をさらにドリルダウンすることができます。

1. [コストツリーを表示] をクリックします。
2. [セグメント] 選択リストでセグメントを選択します。
3. [アカウント] 選択リストからアカウントを選択します。
4. [移動 **(Go)**] をクリックします。

ワークベンチで経費を割り当てる 従来

この情報のいずれかが間違っていると思われる場合は、前のステージに戻って必要な変更を行ってください。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

1. [構成] タブで割り当てセットアップを確認します。
2. ワークベンチの [レビュー] ステージに移動します。
3. 生成する割り当て明細の種類を選択します。
4. [経費割り当て] をクリックします。

> **注:**
> アナリストのライセンスを受けていない顧客である場合は、各セグメントのアカウント数とコストモデルのアカウントの合計数がそれぞれ 4000 と 12000 のしきい値内にあることを確認してください。

タスクの結果

システムは経費を割り当て、割り当て明細を作成し、総勘定元帳レコードの [ステータス] フィールドを [割り当て済み] に変更します。割り当てから作成されたすべての割り当て明細の値を合計すると、総勘定元帳経費の値になります。総勘定元帳経費にルールが適用されない場合、割り当て明細は作成されず、総勘定元帳レコードのステータスは [未割り当て] のままになります。

> **注:**
> 割り当て明細は小数点以下 2 桁に丸められます。合計 $100.495 の割り当ては、$100.50 に切り上げられます。合計 $100.494 の割り当ては、$100.49 に切り捨てられます。割り当てが $0.00 に切り捨てられた場合、システムは割り当て明細を作成しません。

[コストモデル] タブ - 従来

[コストモデル] タブでは、既存のすべてのコストモデルを表示したり、既存のコストモデルからコストモデルをクローンしたり、不要なコストモデルを削除したりすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

コストモデルのリストがこのタブに表示されます。ここからいくつかのアクションを実行できます。

- 既存のコストモデルからコストモデルをクローンします。
- 各コストモデルの設定を表示します。
- コストモデルを削除します。
- コストモデルをインポートおよびエクスポートします。
- コストモデルを比較します。

[コストモデル] タブ

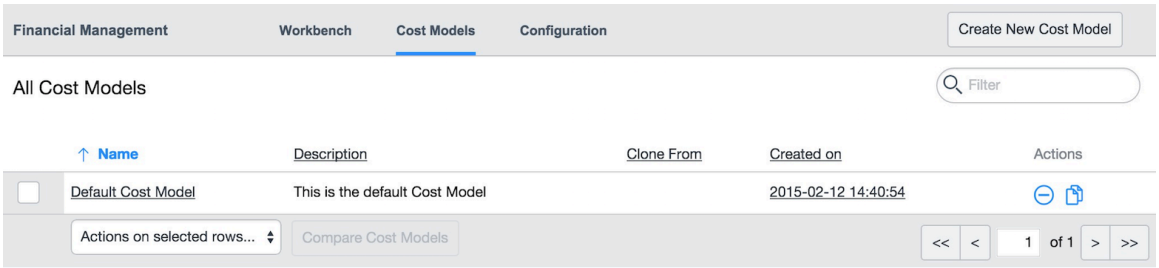

シェアードサービスとビジネスアプリケーションの規範的コストモデル - 従来

第 1 レベルの原価計算 – シェアードサービスは、完全にロードされた IT インフラストラクチャコスト、インフラストラクチャシェアードサービスのショーバックを完全に可視化し、将来の成長に向けた基盤を提供します。第 2 レベルの原価計算 – ビジネスアプリケーションは、アプリケーションとエンドユーザーのコストを提供し、アプリケーションを事業部門に合わせて調整し、ビジネス用語で各事業部門をサポートするためのコスト情報を提供します。


重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

第 1 レベルの原価計算 - シェアードサービス

第 1 レベルの原価計算 – シェアードサービスの仕様は次のとおりです。

第 1 レベルの原価計算 - シェアードサービス

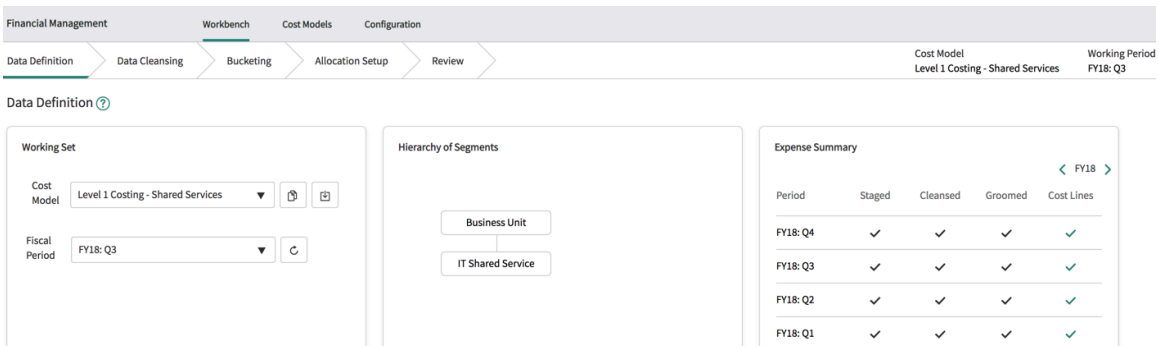


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コストバケットレイヤーは ITFM バケットテーブル [itfm_bucket] に関連付けられており、コストバケットはモデルに固有です。
- IT シェアードサービスセグメントアカウント (このモデルの中間レイヤー) は、IT シェアードサービステーブル [itfm_shared_service] から供給されます。
- 事業部門レイヤーは、プラットフォーム事業部門テーブル [business_unit] に関連付けられています。

第 2 レベルの原価計算 - ビジネスアプリケーション

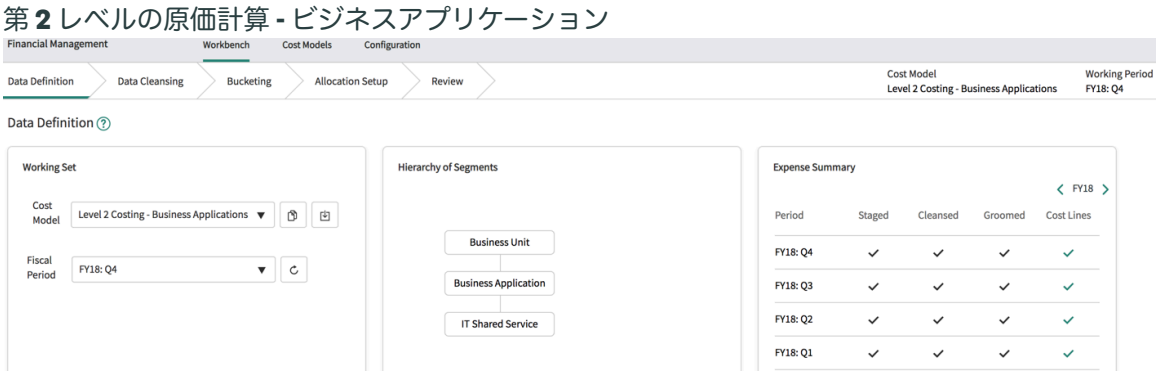

第 2 レベルの原価計算 – ビジネスアプリケーションの仕様は、第 1 レベルの原価計算 – シェアードサービスとほぼ同じです。ただし、アプリケーション用に追加のレイヤーがあります。エンタープライズアーキテクチャ (以前の APM) ビジネスアプリケーション [cmdb_ci_business_app] テーブルは、アプリケーションセグメントに対するアカウントのソースです。または、アプリケーション [cmdb_ci_appl] テーブルまたは他のカスタムテーブルにすることもできます。

シードされた IT シェアードサービス

IT シェアードサービス：エンドユーザーに装備

IT シェアードサービス：エンドユーザーに装備：パーソナル (共有ではない) デバイスをエンドユーザーに提供するために費やした資金、これらのデバイスで実行されるソフトウェア、およびこれらのデバイスの機能の作成と維持に関連するサポートを保持するコスト収集コンテナーです。このコンテナーには、進行中の変更の円滑化コンテナー内で取得される主要なデバイスのアップグレード、リースサイクルの売上高、およびその他の補充関連コストは含まれません。

IT シェアードサービス：構成変更の促進

IT シェアードサービス：構成変更の促進は、ITSM の変更、リリース、および構成管理プロセスのサポートに費やされた資金を保持するコスト収集コンテナーです。つまり、進行中、日次、共通、およびアドホックの構成変更の管理に費やされた金額です。これには、パッチ適用 (セキュリティ関連以外)、ファームウェアの更新、ハードウェア/ソフトウェア構成設定の変更、ハードウェアコンポーネントのインストール、アンインストール、アップグレード、および IT ランドスケープ全体での一般的な追加、移動、または変更要求などのアクティビティが含まれます。このコンテナーは、プロジェクト計画や資金を確保する必要がある環境の大部分での主要なアップグレードや変更を除外します。

IT シェアードサービス：Facilitate Connectivity

IT シェアードサービス：Facilitate Connectivity は、企業へのすべてのデバイスネットワーク接続、そのコンピューティングおよび/または知識資産、それを行うためのハードウェアとソフトウェア、およびアクセスの作成 (および維持) に関連するサポートの提供に費やされた費用を保持するコスト収集コンテナーです。これには、すべての個人用デバイスとエンタープライズデバイスが含まれます。このコンテナーには、「環境の監視」コンテナーに取り込まれた監視ハードウェア、ソフトウェア、および人件費は含まれません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

IT シェアードサービス：管理およびオーバーヘッド

IT シェアードサービス：管理およびオーバーヘッドは、IT 役員報酬に費やされた金額のほか、IT 運用、コンプライアンスまたは監査コスト、その他未分類のコストの存在に適用される 1 回限りの課金アイテムを保持するコスト収集コンテナーです。このコンテナーは、他の IT プロセス定義で取得または計上されたコストを除外します。

IT シェアードサービス：環境の監視

IT シェアードサービス：環境の監視は、ITOM イベント管理プロセスのサポートに費やされた資金を保持するコスト収集コンテナーです。つまり、IT 全体の監視に費やされた金額です。これには、エンドポイント接続速度、エンドポイントアプリケーションパフォーマンステスト、ハードウェア/ソフトウェア/ネットワーク/ストレージしきい値チェック、運用管理担当者が使用する障害およびイベント相関管理ツールが含まれます。このコンテナーは、他のプロセス領域で言及されているセキュリティ固有のサービスやクラウド監視サービスを除外します。

IT シェアードサービス：アップグレード/メインテナンスの実行

IT シェアードサービス：アップグレード/メインテナンスの実行は、ITSM の変更、リリース、および構成管理プロセスのサポートに費やされた資金を保持するコスト収集コンテナーです。つまり、計画されたプロジェクトおよび/または特別に資金提供された主要なアップグレードの管理に費やされたすべての金額です。これには、広範な OS アップグレード、ハードウェア交換サイクルアクティビティ、および IT ランドスケープ全体にわたる内部またはサードパーティのビジネスまたは IT 管理ソフトウェアパッケージのリリース更新などのアクティビティが含まれます。このコンテナーは、変更チケットの実行のみを必要とする進行中、日次、共通、およびアドホック構成の変更を除外します。

IT シェアードサービス：技術サポートの提供

IT シェアードサービス：技術サポートの提供は、ITSM インシデント、問題、およびナレッジ管理プロセスのサポートに費やされた資金を保持するコスト収集コンテナーです。つまり、組織全体のエンドユーザーにテクニカルサポートサービスを提供するために費やした費用です。これには、階層 1、2、および 3 の担当者、インシデントまたは問題管理ソフトウェア、根本原因分析時間、ルーチンまたはアドホック支援 (パスワードのリセット、Q&A の方法)、および/または標準運用手順ガイダンスが含まれます。このコンテナーは、文書化された変更チケットによって実行されたエンドユーザーや企業資産に対する実際の構成変更を除外します。

IT シェアードサービス：ビジネスアプリケーションの実行

IT シェアードサービス：ビジネスアプリケーションの実行は、ビジネスアプリケーションの運用を維持するために継続的な人事時間に費やされた金額を保持するコスト収集コンテナーです。これには、アプリケーション専用のリソースが含まれ、IT やインフラストラクチャの運用コストは含まれません。

IT シェアードサービス：Secure the Environment

IT シェアードサービス：Secure the Environment は、Security Operations のサポートに費やされた資金を保持するコスト収集コンテナーです。つまり、企業の IT ランドスケープ全体で情報セキュリティを提供するために費やされた金額です。これには、すべてのデスクトップ、ラップトップ、スマートフォン、ネットワーク機器、サーバー、データベース、およびアプリケーションに加えて、個々のユーザーエンドポイントデバイス、クラウドアプリケーション、クラウドコンピューティング、および/またはすべてのタイプのオンプレミスコンピューティングリソースが含まれます。これには、データセンターおよびオフィススペースカードリーダーに関連する物理的なセキュリティコストは含まれません。

IT シェアードサービス：データの保存と管理

IT シェアードサービス：データの保存と管理は、構造化データと非構造化データの管理に関連する基盤となるツールと基本的なアクティビティ (暗号化、バックアップ、パージ、アーカイブ、移行、DR レプリケーションなど) および/ またはストレージ容

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

量 (たとえば、再編成や過剰容量の取得) に費やされた金額を保持するコスト収集コンテナーです。これには、これらのタイプのアクティビティと、データおよびストレージ状況の健全性を確保するために使用されるすべての人員権限が含まれます。このコンテナーは、個人および特定のアクティビティによって使用されるエンドユーザーデバイスのローカルストレージに関連する要素と、特定のアプリケーションまたはシステムに関連する可能性のある割り当てられたストレージを除外します。

IT シェアードサービス：供給計算能力


IT シェアードサービス：供給計算能力は、既存の基本要素の提供に費やされた費用、維持に費用がかかるが、災害復旧施設や契約、ハードウェアの予備在庫、オンプレミス UPS システム、およびジェネレーターなど、実際には使用されない可能性のあるコスト収集コンテナーです。また、スペース、電力、冷却などに関連する毎日のアクティブなデータセンターのコストも含まれます。

ITFM で規定されたメトリクス

CI に基づく変更要求ボリュームに基づいて事業部門に割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたテーブルに基づいて共有サービスコストを事業部門に割り当てます。

CI に基づく変更要求ボリュームに基づいて事業部門に割り当てる

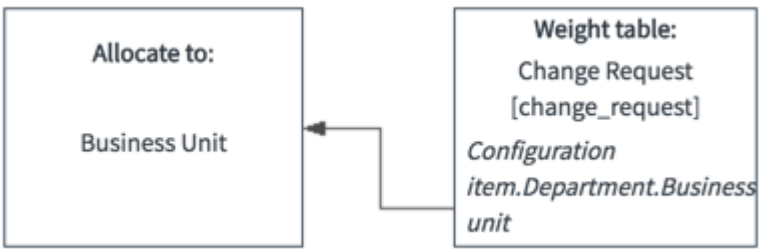

- 変更要求 [change_request] テーブルには、すべての変更要求とそれに関連する構成アイテムのリストが表示されます。
- CMDB [CMDB_ci] は、すべての構成アイテムとその関連部門のリストを提供します。
- 部門 [cmn_department] テーブルには、すべての部門とその事業部門のリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、事業部門あたりの (CI の) 変更要求をカウントし、それに応じてコストを重み付けします。関連する会計期間の BU によって要求されたものに関連する (割り当てマトリクスと一致しない) CR の数をカウントします。

  重み付けテーブルは、このメトリクスの有効期間を強制します。


  - 期間開始：実際の開始。
  - 期間終了：実際の終了。

CI 数に基づいて事業部門に割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたテーブルに基づいて共有サービスコストを事業部門に割り当てます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CI 数に基づいて事業部門に割り当てる




- CMDB [CMDB_ci] は、すべての構成アイテムとその関連部門のリストを提供します。
- 部門 [cmn_department] テーブルには、すべての部門とその関連事業部門のリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、事業部門あたりの構成アイテムをカウントし、それに応じてコストを重み付けします。

人数によって事業部門に割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたテーブルに基づいて共有サービスコストを事業部門に割り当てます。

人数によって事業部門に割り当てる

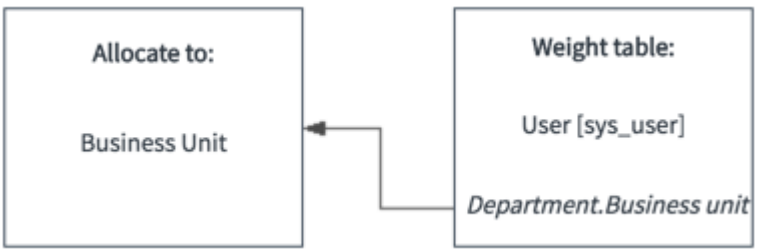

- ユーザー [sys_user] テーブルには、すべてのシステムユーザーとその関連部門のリストが表示されます。
- 部門 [cmn_department] テーブルには、すべての部門とその関連事業部門のリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、事業部門あたりのユーザー数をカウントし、それに応じてコストを重み付けします。

  フィルター基準：アクティブなユーザーのみをカウントします。


コンピューター数によって事業部門に割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたテーブルに基づいて共有サービスコストを事業部門に割り当てます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンピューター数によって事業部門に割り当てる




- コンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルには、すべてのコンピューター名とその関連部門のリストが表示されます。
- 部門 [cmn_department] テーブルには、すべての部門とその関連事業部門のリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、事業部門あたりのコンピューター数をカウントし、それに応じてコストを重み付けします。

変更要求ボリュームに基づいて事業部門に割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたテーブルに基づいて共有サービスコストを事業部門に割り当てます。

変更要求ボリュームに基づいて事業部門に割り当てる

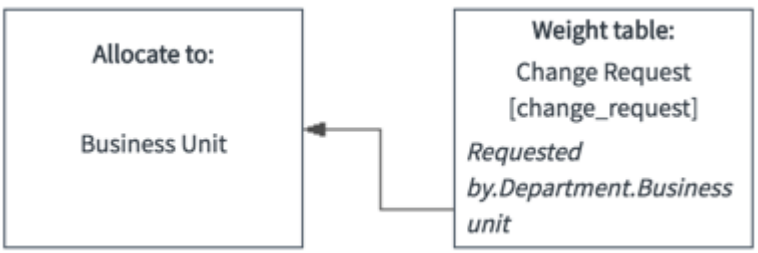

- 変更要求 [change_request] テーブルには、すべての変更要求とその要求者のリストが表示されます。
- 部門 [cmn_department] テーブルには、すべての部門とその関連事業部門のリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、事業部門あたりの変更要求をカウントし、それに応じてコストを重み付けします。
  - 重み付けテーブルは、このメトリクスの有効期間を強制します。
  - 期間開始：実際の開始。
  - 期間終了：実際の終了。


インシデントボリュームに基づいて事業部門に割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたテーブルに基づいて共有サービスコストを事業部門に割り当てます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インシデントボリュームに基づいて事業部門に割り当てる

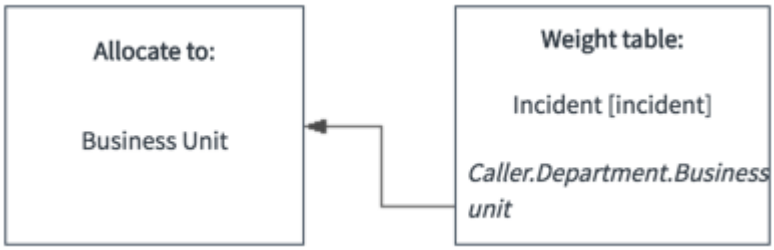


- インシデント [incident.list] テーブルには、すべてのインシデントとそれに関連する発信者のリストが表示されます。
- インシデント [users [ITIL view]] テーブルには、すべての部門とその関連事業部門のリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、事業部門 (期間内にオープンおよびクローズ) あたりのインシデントをカウントし、それに応じてコストを重み付けします。

計算能力に基づいてビジネスアプリケーションに割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたテーブルに基づいて共有サービスコストをアプリケーションに割り当てます。

計算能力に基づいてアプリケーションに割り当てる

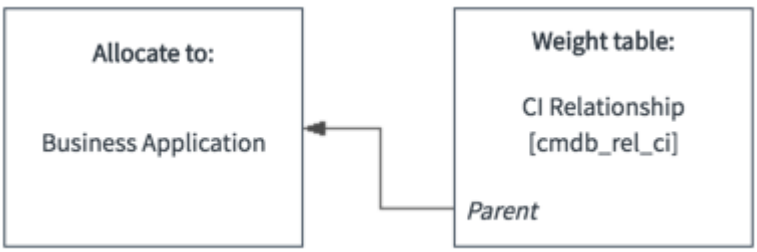

- CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルには、構成アイテム間のすべての関係のリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、Child.Class = Server の構成アイテムのカウントを実行し、受信アプリケーションに応じてコストを重み付けします。

ビジネスサービスとビジネス機能の規範的コストモデル - 従来

事前設定されたビジネスサービスとビジネス機能のコストモデルを、重み付けの割り当て用に規定されたメトリクスとともに使用します。各モデルがサポートするシステム要件、割り当て方法、およびそれらを効果的に使用するために必要なデータセットを理解します。

重要:


この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

第 2 レベルの原価計算 - ビジネスサービスコストモデル

第 2 レベルの原価計算 - ビジネスサービスコストモデル

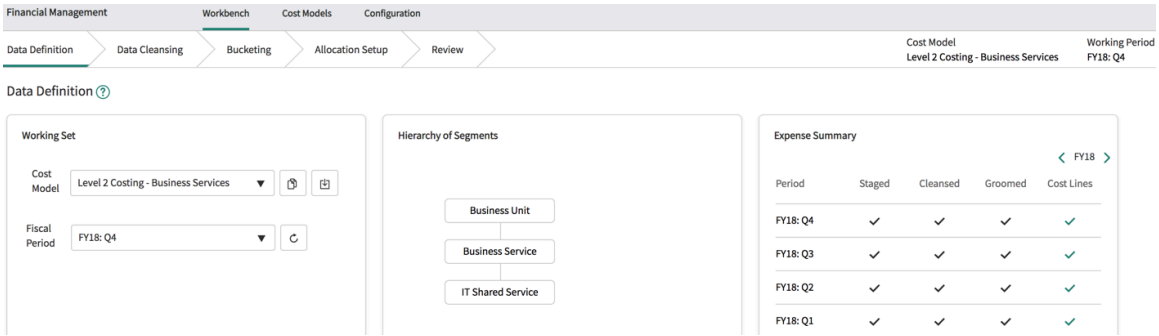

コストモデルは以下を提供します。


- ビジネスを実現するためのコスト：ビジネスを変革イニシアチブに確実に合わせるための IT のコスト。
- ビジネス用語で各ビジネスサービスをサポートするためのコスト：ビジネスサービスを提供するためのコスト。

次の場合に、コストモデルをお勧めします。

- フェーズ II の場合、または以前にファイナンシャルマネジメントで投資したことがある場合。
- コアビジネス機能またはビジネス機能との整合性に関するショーバック用。
- 運用コストの推進要因に関するインサイトを提供するため。

第 2 レベルの原価計算の仕様 - ビジネスサービスコストモデル

第 2 レベルの原価計算のモデルの複雑性 - ビジネスサービスコストモデル

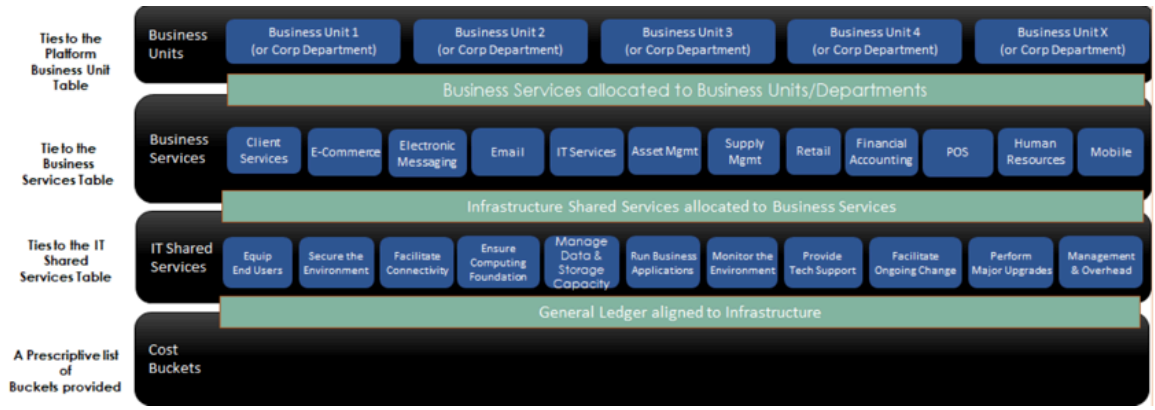


- コストバケットレイヤーは、ITFM バケットテーブル [itfm_bucket] に関連付けられています。コストバケットはモデル固有です。
- IT シェアードサービスセグメントアカウント (このモデルの 2 番目のレイヤー) は、IT シェアードサービステーブル [itfm_shared_service] から供給されます。
- ビジネスサービスセグメントアカウント (このモデルの 3 番目のレイヤー) は、サービステーブル [cmdb_ci_service] から供給されます。
- 事業部門レイヤーは、プラットフォーム事業部門テーブル [business_unit] に関連付けられています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

第 3 レベルの原価計算 - ビジネス機能コストモデル

第 3 レベルの原価計算 - ビジネス機能コストモデル

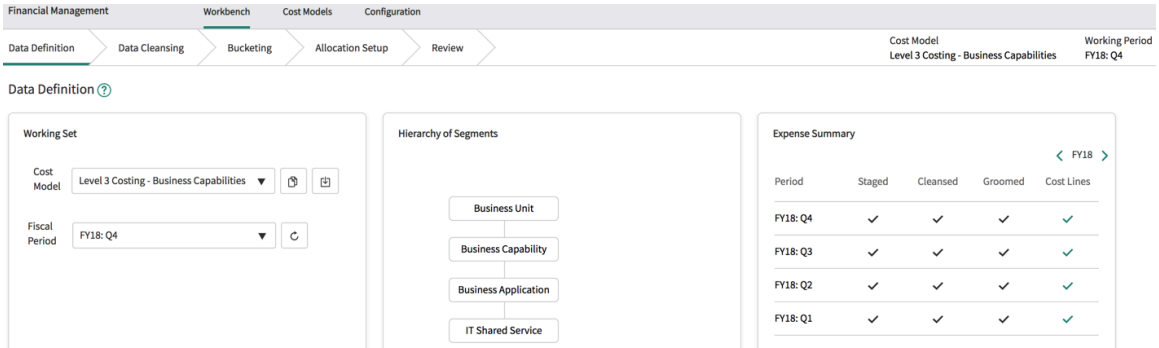

コストモデルは以下を提供します。


- ビジネスを実現するためのコスト：ビジネスを変革イニシアチブに確実に合わせるための IT のコスト。
- ビジネス用語で各ビジネスケイパビリティをサポートするためのコスト：イノベーションのコスト。

次の場合に、コストモデルをお勧めします。

- フェーズ II の場合、または以前にファイナンシャルマネジメントで投資したことがある場合。
- コアビジネス機能またはビジネス機能との整合性に関するショーバック用。

第 3 レベルの原価計算 - ビジネス機能コストモデルの仕様

第 3 レベルの原価計算 - ビジネスサービスコストモデルのモデルの複雑性

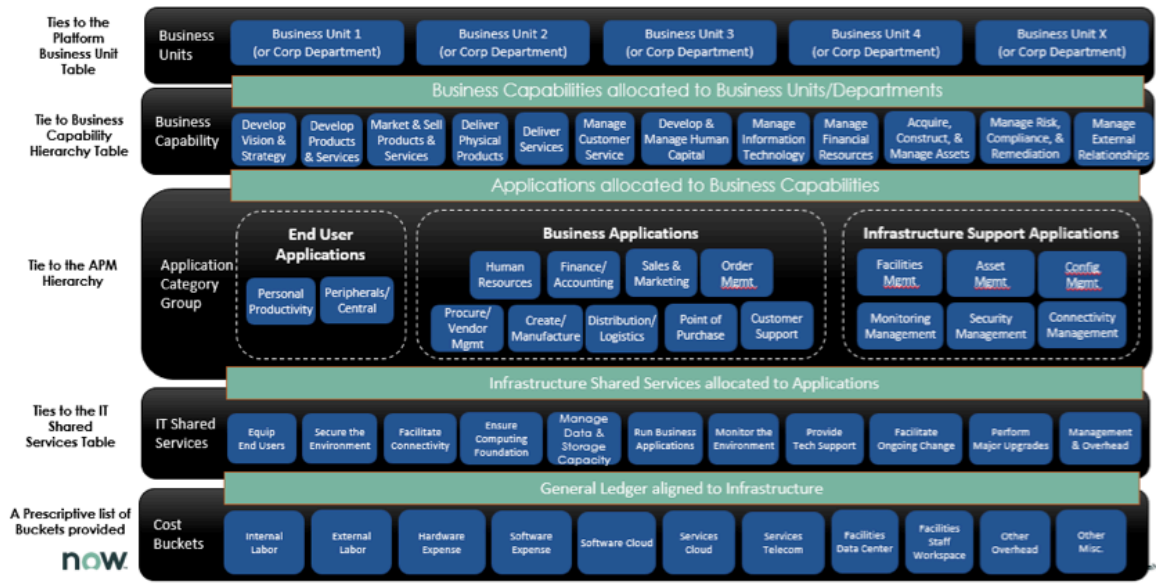

- 仕様は、ビジネスアプリケーションに合わせて、第 2 レベルの原価計算 - ビジネスサービスコストモデルの仕様と類似しています。ただし、ビジネス機能用に追加のレイヤーがあります。このセグメントのアカウントは、フラットリストであるビジネスケイパビリティ [cmdb_ci_business_capability] テーブルから供給されます。
- アプリケーションに関連付けられた実際のケイパビリティをテーブル内の高レベルのビジネスケイパビリティと整合させる、規定のスクリプト化済みメトリクスがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールアップメソッド

次の割り当て方法を使用して、コストをコストバケットからモデルの上位レイヤー (IT シェアードサービス、割り当て、または事業部門) に移動します。

ロールアップメソッド	説明
なし	次のレイヤーに割り当てません。
均等	コストを関連する各アイテムに均等に分割します。
[手動]	推定または事前計算済みの固定パーセンテージで割り当てられます。
重み付け	実際の使用状況に基づいて割り当てられます。たとえば、変更要求ボリューム、インシデントボリューム、または CI 数に基づいて、または割り当て先のオブジェクトのプロパティ (人員) に基づいて BU に割り当てます。

所定のメトリクスは、[重み付け] ロールアップメソッドをサポートし、ServiceNow プラットフォーム内のアプリケーションから直接データを調達します。例を次に示します。

- IT 組織構造：事業部門または部門レベル。
- PPM またはタイムカード：プロジェクトに課せられる労力。
- CMDB：関係、使用状況、および所有者の配置を含む CI インベントリ。
- 資産管理：資産所有者に合わせて調整された資産インベントリ (エンドユーザーとインフラストラクチャ)。
- IT Service Management：インシデント、問題、および変更に関連するボリューム。
- IT Operations Management（ITOM)：ハードウェアおよびアプリケーションとの関係および調整。
- エンタープライズアーキテクチャ (以前のアプリケーションポートフォリオ管理)：アプリケーション階層、関連するビジネスオーナー、およびテクノロジーマッピングのインベントリ。

規定のメトリクス - IT シェアードサービスからビジネスサービス

以下は、各メトリクスの説明と、ServiceNow システム内の重み付け方法および関連テーブルの説明です。

注:
関連するテーブルに不完全なデータがある場合、またはデータにギャップがある場合、計算された重み付けのパーセンテージが影響を受けます。

事前設定されたコストモデルは、次のセグメントに等しい重み付けで始まります。規範的なメトリクスは、より成熟したソリューションに利用できます。


CI 数に基づいてビジネスサービスに割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたテーブルに基づいて共有サービスコストをビジネスサービスに割り当てます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CI 数に基づいてビジネスサービスに割り当てる

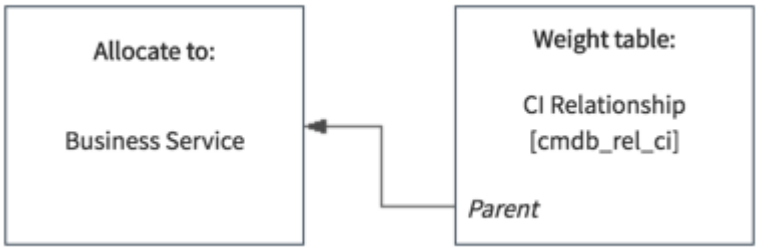

- CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルには、すべての CI と、それらの親 CI との関係 (依存関係、使用、実行、および包含など) のリストが表示されます。
- サービス [cmdb_ci_service] テーブルには、親 CI であるすべてのビジネスサービスのリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、親あたりの CI をカウントし、それに応じてビジネスサービスのコストを重み付けします。


  重み付けテーブルは、次のメトリクスの有効期間を強制します。

  - フィルター：Child.Class はビジネスサービスではなく、タイプは Depends on::Used by です。
  - 期間開始：実際の開始。
  - 期間終了：実際の終了。

計算能力に基づいてビジネスサービスに割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたテーブルに基づいて共有サービスコストをビジネスサービスに割り当てます。

計算能力に基づいてビジネスサービスに割り当てる

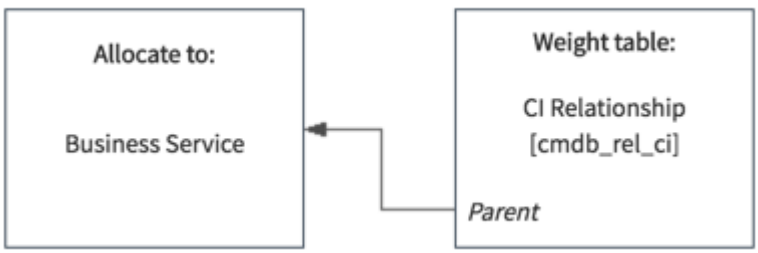

- CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルには、すべての CI と、それらの親 CI との関係 (依存関係、使用、実行、および包含など) のリストが表示されます。
- サービス [cmdb_ci_service] テーブルには、親 CI であるすべてのビジネスサービスのリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、サーバー (Child.Class) あたりの CI をカウントし、それに応じて (親) ビジネスサービスのコストを重み付けします。

  重み付けテーブルは、次のメトリクスの有効期間を強制します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- フィルター：Child.Class はサーバーであり、タイプは Depends on::Used by です。
- 期間開始：実際の開始。
- 期間終了：実際の終了。

データベース数に基づいてビジネスサービスに割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたテーブルに基づいて共有サービスコストをビジネスサービスに割り当てます。

データベース数に基づいてビジネスサービスに割り当てる

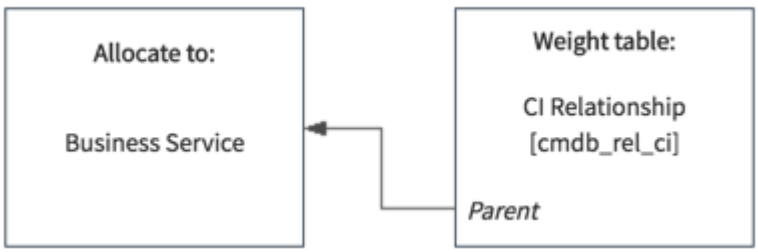

- CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルには、すべての CI と、それらの親 CI との関係 (依存関係、使用、実行、および包含など) のリストが表示されます。
- サービス [cmdb_ci_service] テーブルには、親 CI であるすべてのビジネスサービスのリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、データベース (Child.Class) あたりの CI をカウントし、それに応じて (親) ビジネスサービスのコストを重み付けします。


  重み付けテーブルは、次のメトリクスの有効期間を強制します。

  - フィルター：Child.Class はデータベースであり、タイプは Depends on::Used by です。
  - 期間開始：実際の開始。
  - 期間終了：実際の終了。

変更要求ボリュームに基づいてビジネスサービスに割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたテーブルに基づいて共有サービスコストを事業部門に割り当てます。

変更要求ボリュームに基づいてビジネスサービスに割り当てる

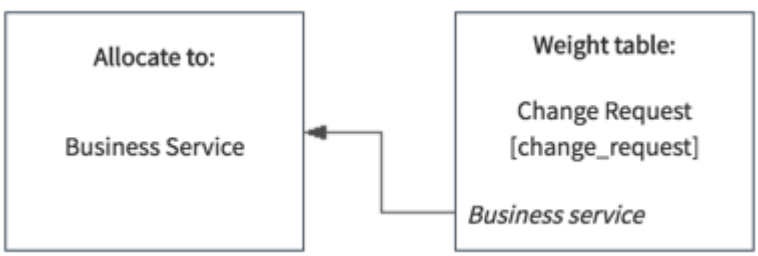

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 変更要求 [change_request] テーブルには、すべての変更要求と、関連するビジネスサービスを含むその要求者のリストが表示されます。
- サービス [cmdb_ci_service] テーブルには、すべてのビジネスサービスのリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、ビジネスサービスあたりの変更要求をカウントし、それに応じてコストを重み付けします。


  重み付けテーブルは、次のメトリクスの有効期間を強制します。

  - 期間開始：実際の開始。
  - 期間終了：実際の終了。
  - 重み付けテーブルで選択された有効期間を強制します。

インシデントボリュームに基づいてビジネスサービスに割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたテーブルに基づいて共有サービスコストを事業部門に割り当てます。

インシデントボリュームに基づいてビジネスサービスに割り当てる

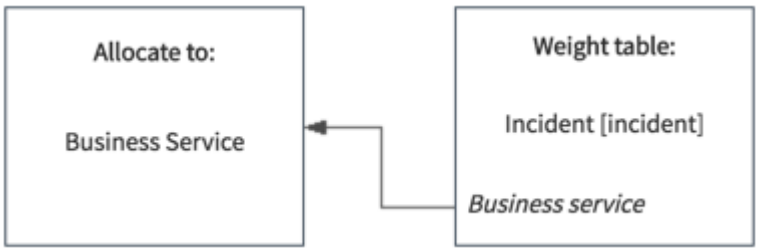

- インシデント [incident.list] テーブルには、すべてのインシデント、それらに関連する発信者、および関連するビジネスサービスのリストが表示されます。
- サービス [cmdb_ci_service] テーブルには、すべてのビジネスサービスのリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、ビジネスサービス (期間内にオープンおよびクローズ) あたりのインシデントをカウントし、それに応じてコストを重み付けします。
  - 期間開始：オープン
  - 期間終了：解決済み。
  - 重み付けテーブルで選択された有効期間を強制します。

規定のメトリクス - IT シェアードサービスからビジネスアプリケーション


アクティブユーザー数を使用してアプリケーションに割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたメトリクスに基づいて共有サービスコストをアプリケーションに割り当てます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクティブユーザー数を使用してアプリケーションに割り当てる

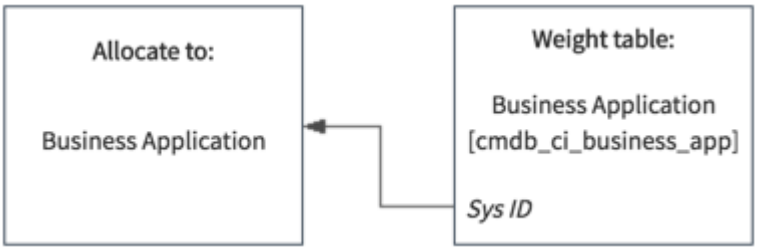


- ビジネスアプリケーション [cmdb_ci_business_app] テーブルには、すべてのビジネスアプリケーションのリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、アクティブなユーザーの合計を実行し、**[Sys ID]** による受信アプリケーションに応じてコストを重み付けします。

データベース数を使用してアプリケーションに割り当てる

このメトリクスは、次の重み付けされたメトリクスに基づいて共有サービスコストをアプリケーションに割り当てます。

データベース数を使用してアプリケーションに割り当てる

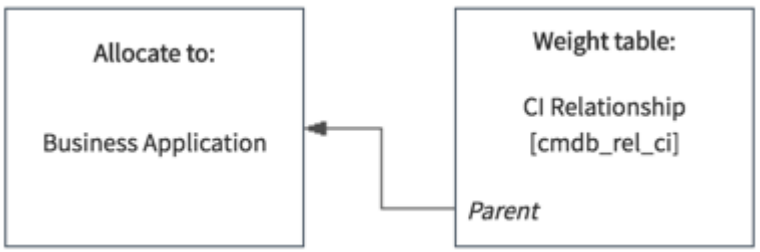

- CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルには、すべての CI と、それらの親 CI との関係 (依存関係、使用、実行、および包含など) のリストが表示されます。
- ビジネスアプリケーション [cmdb_ci_business_app] テーブルには、親 CI であるすべてのビジネスアプリケーションのリストが表示されます。
- 所定のメトリクスは、データベース (Child.Class) あたりの CI をカウントし、それに応じて (親) ビジネスアプリケーションのコストを重み付けします。
  - フィルター：Child.Class はデータベースであり、タイプは Depends on::Used by です。
  - 期間開始：実際の開始。
  - 期間終了：実際の終了。

規定のメトリクス - ビジネスアプリケーションからビジネス機能

ビジネス機能に割り当てるスクリプト化済みメトリクスは次のとおりです。

```
// Create a Scripted metric if you have complex logic to derive the weights for an Allocate to
 Segment.
//
// This Return Object is json:
// 1) key: The sys_id of the Allocate To segment's transaction table
// 2) value: the weight for the
//
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// The API is called for each fiscal period and stored in weight Maps table which is in turn used
 in allocation.
// 'inputObject'  is available in the script to have access to fiscal period and from Account id.
// The  from account id is applicable only for "Allocate From" is part of metric setup where each
 entity in Allocate From table have their own weight distribution
// An 'inputObject' is injected during the evaluation of the script.
// It is an object of 2 key value pairs for fiscal period and allocate from accountId.
function getTopCapability(capabilityId){
  var now_GR = new GlideRecord('cmdb_ci_business_capability');
  gr.get(capabilityId);
   if(gr.isValidRecord())
    return getParentCapabilityRecur(now_GR);
 }
 function getParentCapabilityRecur(capabilityGr){
   if(JSUtil.nil(capabilityGr.parent))
    return capabilityGr;
  else
    return getParentCapabilityRecur(capabilityGr.parent.getRefRecord());
}
getScriptedWeightedMetric();
function getScriptedWeightedMetric(){
var appId = inputObject.from_id; // where inputObject.from_id is one of the Business
 Applications Id from Allocate From segment(Business Applications)
var relGr= new GlideRecord('cmdb_rel_ci');
relGr.addEncodedQuery('parent.sys_class_name=cmdb_ci_business_capability^child.sys_class_
name=cmdb_ci_business_app');
relGr.addQuery('child',appId);
relGr.query();
var retObj={};
 while(relGr.next()){
   retObj[getTopCapability(relGr.parent).getUniqueValue()] = 1;
 }
 return retObj;
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ビジネスケイパビリティ [cmdb_ci_business_capability] テーブルは、すべてのビジネスケイパビリティのリストを提供し、エンタープライズアーキテクチャ (以前の アプリケーションポートフォリオ管理) の一部です。
- スクリプトは、本質的に、ビジネスケイパビリティリストをフラット化します。

> **注:**
> エンタープライズアーキテクチャ (以前の アプリケーションポートフォリオ管理) 内のアプリケーションはより低いレベルのケイパビリティに割り当てられている場合もありますが、すべてがファイナンシャルモデリングのレベル 0 ビジネスケイパビリティに関連している必要があります。

APM から **FM** へのスクリプト化済みメトリクスロジック

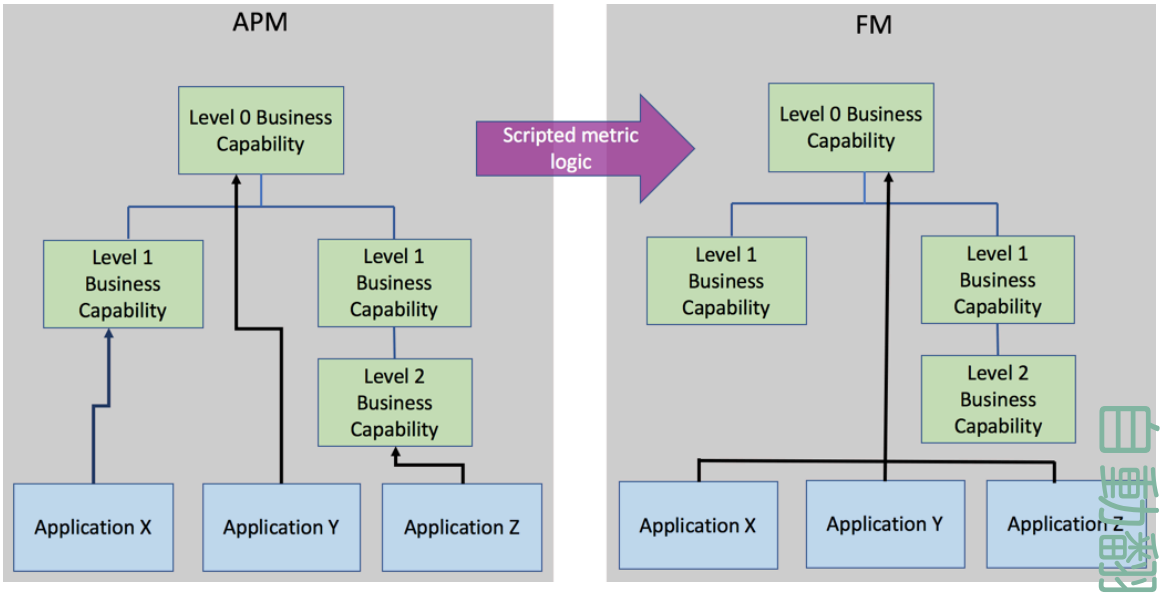

各コストモデルの設定を表示 - 従来

基本コストモデルは、ワークベンチの [データ定義] ステージまたは [コストモデル] タブから作成できます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

1. ワークベンチの [コストモデル] タブを開きます。
2. 確認するコストモデルの名前をクリックします。


   次のタブを含むウィンドウが表示されます。

   - バケット：現在コストモデルに関連付けられているアカウントのバケット。バケットは、1 つのコストモデルにのみ関連付けることができます。
   - セグメント：セグメント定義の階層からコストモデルが使用するセグメント。
   - セグメントの階層：コストモデルのセグメント階層。
   - 会計期間データ：すべての会計期間の経費サマリ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コストモデルサマリの例

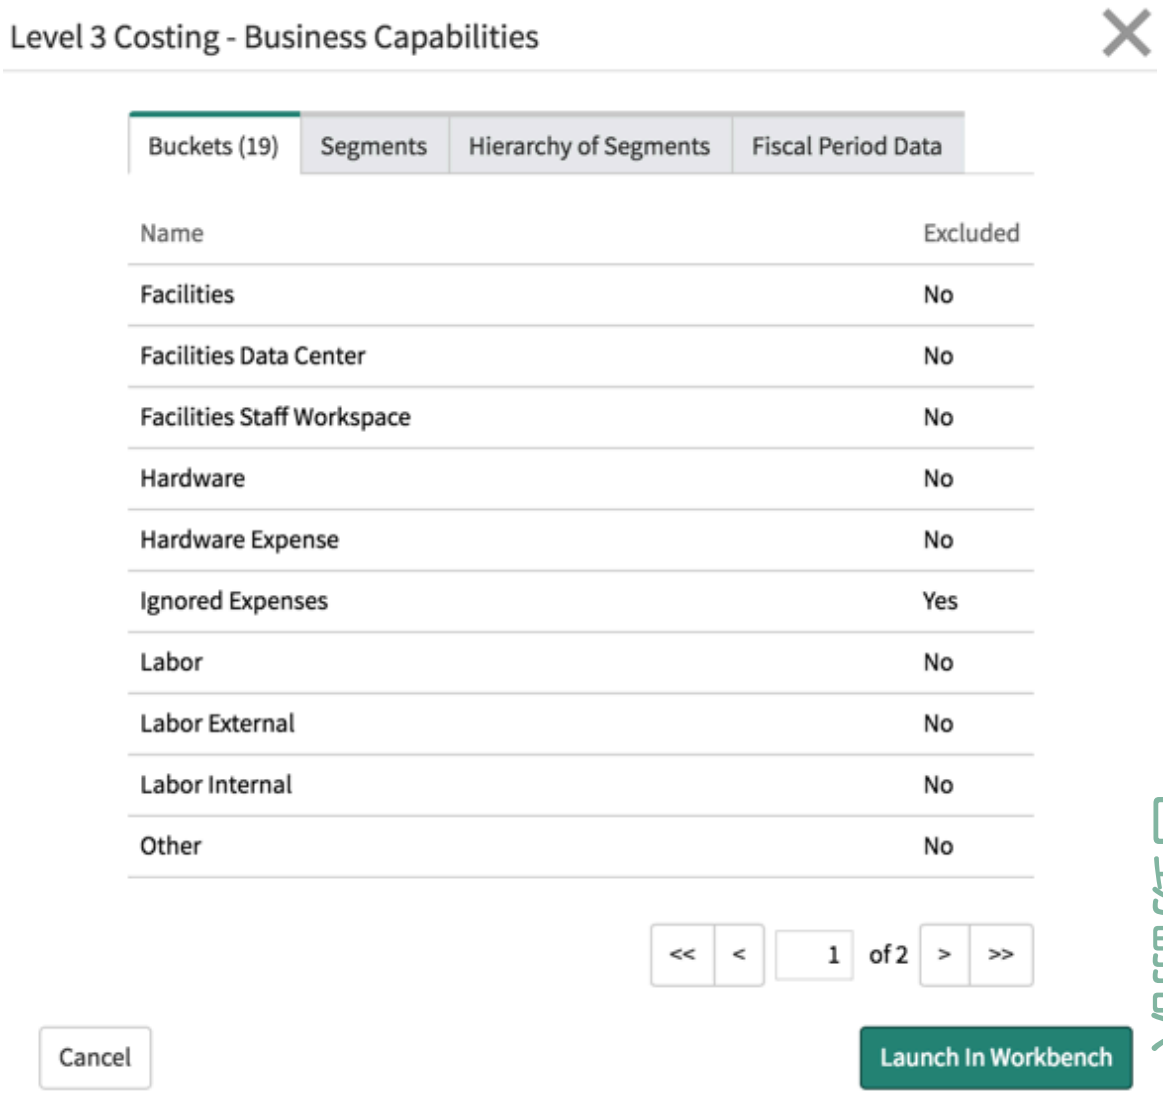

自動翻訳

3. [ワークベンチで起動] をクリックしてワークベンチの [データ定義] ステージでコストモデルを開くか、[キャンセル] をクリックしてウィンドウを閉じます。

コストモデルの削除 - 従来

コストモデルが不要になった場合は削除できます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

次のいずれかの手順を実行します。

- ワークベンチの [コストモデル] タブを開き、削除アイコンをクリックします。
- ワークベンチで [コストモデル] タブを開き、削除するモデルの横にあるチェックボックスをオンにして、選択リストから [削除] アクションを選択します。
- 移動先 財務 > コストモデルをクリックし、コストモデルレコードを開いて [削除] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コストモデルの比較 - 従来

任意の 2 つのコストモデルを比較して、バケット経費、セグメントの階層、および会計期間の割り当てデータの違いを確認できます。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

このタスクについて
新しい可能性があるコストモデルの経費が割り当てにどのように分類されるかを確認するには、コストモデルを比較します。コストモデルの比較に表示されるデータは、バケット化ステージの実際のデータと実際の割り当てデータです。ワークベンチでバケットと割り当てのステージをまだ完了していない場合、データは表示されません。

一度に比較できるコストモデルは 2 つだけです。

手順

1. ワークベンチの [コストモデル] タブを開きます。
2. 比較するコストモデルの横にあるチェックボックスを選択します。
3. [コストモデルの比較] をクリックします。
4. 会計期間を選択します。
5. 次のいずれかのアイテムをクリックします。

オプション	説明
バケット	各バケットおよびサブバケットの金額。すべてのバケットを表示または非表示にするには、[すべて折りたたむ] または [すべて表示] をクリックします。
階層	セグメントの階層。
データ	コストが割り当てられている各セグメントの割り当てデータ。

6. いずれかの側の [現在のコストモデル] または [提案されたコストモデル] リストから新しいモデルを選択して、コストモデルを変更することもできます。

コストモデルのクローン - 従来

既存のコストモデルに基づいてコストモデルを作成する場合は、コストモデルのクローンを作成できます。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

このタスクについて
コストモデルのクローンを作成すると、クレンジング条件、割り当て、バケット、セグメントの階層、およびロールアップに関連するすべてのデータが新しいコストモデルにコピーされます。割り当て明細のクローンは作成されません。割り当て明細を生成し、新しい割り当てデータについてレポートを実行するには、割り当てを実行する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ワークベンチの [コストモデル] タブを開きます。
2. クローンを作成するコストモデルのクローンアイコンをクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

[コストモデルのクローン] フォーム

フィールド	説明
名前	新しいコストモデルの名前。
説明	新しいコストモデルの説明。
クローン元	新しいコストモデルの基になっているコストモデル。

4. [作成] をクリックします。

ブレークダウンの関係性の作成 - 従来

セグメント間に生成されたコストラインを表示するには、必須セグメント間のブレークダウンの関係性を定義します。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > コストモデル > すべて.
2. [ブレークダウンの関係性] 関連リストで [新規] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

[ブレークダウンの関連性] フォーム

フィールド	説明
コストモデル	リストのコストモデル。
X セグメント	リストのセグメント名。 [セグメント定義] フォームを使用して、新しいセグメントを作成することもできます。
Y セグメント	リストのセグメント名。 [セグメント定義] フォームを使用して、新しいセグメントを作成することもできます。
オンデマンドでのみ実行	コストラインブレークダウンをオンデマンドで手動で生成するオプション。 デフォルトでは、フラグは [false] に設定されています。これは、割り当てエンジンがコストモデルの関連セグメントのブレークダウンを生成することを意味します。フラグが [true] の場合、割り当てエンジンはコストラインのブレークダウンを生成しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [送信] をクリックします。

   ブレークダウンの残りの計算

   ブレークダウンの残りとは、他のセグメントから間接的に得られた金額、セグメントとのブレークダウン関係の一部ではない金額、またはセグメントへの直接バケット割り当てによる金額に対して生成されたコストラインです。

   ブレークダウンの残りを計算する場合は、システムのプロパティ *com.glide.financial_management.generate_breakdown_leftovers* を [true] に設定します。

   オンデマンドでのみ実行

   オプションを使用して、オンデマンドでコストラインブレークダウンを生成します。このオプションは、割り当てエンジンのランタイムを最適に使用するのに役立ちます。

5. ブレークダウンコストラインを手動で生成するには、財務モデルフォームの [ブレークダウンの関連性] 関連リストに移動します。
   a. ブレークダウンの横にあるチェックボックスを選択し、[選択した行のアクション] リストから [ブレークダウン割り当ての生成] アクションをクリックします。
   b. [ブレークダウン割り当ての生成] ダイアログボックスに会計期間を入力します。
   c. [**OK**] をクリックします。
6. 手動で生成したブレークダウンのコストラインを表示するには、ファイナンシャルマネジメントワークベンチの [レビュー] ステージに移動します。
7. ブレークダウンの [コストラインブレークダウンの表示] リンクをクリックします。
   コストラインは [コスト割り当てブレークダウン] リストで確認できます。

[構成] タブ - 従来

[構成] タブには追加の設定があります。

次のセクションが表示されます。

- 一般設定：アプリケーションに使用されているシステム通貨を表示し、アプリケーションが作成する割り当て明細の詳細レベルを制御します。
- メインレポート構成：CIO ダッシュボード に表示されるメインのファイナンシャルマネジメントレポートの設定を構成します。
- 詳細アクション：経費の割り当てを元に戻すか、割り当て明細を削除します。

全般設定の構成 従来

ワークベンチの [構成] タブで割り当て明細の詳細レベルを構成します。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

このタスクについて

割り当てデータで利用可能な詳細レベルを変更できます。アプリケーションでは、割り当て明細テーブルのセグメント値の Sys_ID を追跡できます。これにより、割り当てレポートをドット連結することができます。これは、生成する割り当て明細の数によっては、アプリケーションのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ワークベンチで、[構成] タブをクリックします。

   基本システム通貨の通貨コードが [全般設定] ペインに表示されます。

   注:

   Kingston リリースまでは、*com.glide.financial_management.currency_code* プロパティを使用して通貨コードを取得できます。このプロパティは London リリースで削除されました。London でアップグレードされたお客様の場合でも、このプロパティを使用できます。現在、*glide.system.locale* は機能通貨です。

   通貨コードを取得するには、アップグレードされたお客様または新規のお客様であるかどうかに関係なく、スクリプト可能な新しい *SNC.FMCurrency().getGlobalCurrencyCode()* API を使用します。

2. [基本割り当てセットアップ] を有効にして、割り当てセットアップ UI をライターモードで開きます。

   注:
   アナリストのライセンスを受けていない顧客である場合は、セグメントのアカウント数またはコストモデルのアカウントの合計数がそれぞれ 4000 と 12000 のしきい値を超えない場合、このオプションは自動的に有効になります。

3. [資金不足分析] を有効にして、ワークベンチの [割り当てセットアップ] ページでログを有効にします。

   資金不足分析は、Madrid リリースより前に利用可能になった割り当てログ機能の拡張および改善されたバージョンです。

4. [セグメントごとにレコードの表示] は、ワークベンチの [割り当てセットアップ] ページ、ライターワークベンチの [割り当てセットアップ] ページ、および [コストライン分析] ページに表示するセグメントのアカウント数を 5、10、15、25、50 などに選択するための構成セットアップです。

メインレポート設定の構成 - 従来

表示するコストモデルや会計期間など、メインの財務レポートの設定を構成します。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

このタスクについて
メインの財務レポートは、CIO ダッシュボードおよびその他のレポート概要の財務レポートの基礎を提供します。メインレポートに対して構成できる主な設定は、アプリケーションが各会計期間のレポートを生成するために使用するコストモデルです。経理アドミニストレーターまたはアナリストロールがある場合は、デフォルトレポートのレポートパラメーターでコストモデルを選択できます。財務ユーザーロールがある場合、コストモデルはこれらの設定によって決定されます。

手順

1. ワークベンチで、[構成] タブをクリックします。
2. [メインコストモデル] リストからコストモデルを選択します。
   新しい会計期間が追加されると、メインの財務レポートにこのコストモデルが含まれます。
3. [構成の更新] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [コストモデルの選択] ウィンドウで、各会計期間のコストモデルを選択します。
   レポートでは、このコストモデルを使用して、メインの財務レポートに表示されるデータを計算して表示します。
5. [保存] をクリックします。

割り当て明細の削除 - 従来

ワークベンチの [構成] タブで、このデータが不要になった場合、または既に割り当て明細に関連付けられているセグメントまたは会計期間を変更する必要がある場合は、任意の会計期間の割り当て明細を削除できます。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順
1. ワークベンチを開き、[構成] タブに移動します。
2. [詳細アクション] で、[データの削除対象] の横にある会計期間を選択します。
3. [削除] をクリックします。
4. アクションを確認します。

資金不足ログファクタリングのヒント - 従来

エラータイプ、考えられる原因、および解決のヒントは、エラーのトラブルシューティングを簡単に行うのに役立ちます。

注:
資金不足分析は、Madrid より前に利用可能になった割り当てログ機能の拡張および改善されたバージョンです。

資金不足ログと解決策

カテゴリ	条件	原因	アクション
バケット割り当て	バケットデータ検証：「{0}」が除外されている：{1} ただしそのサブバケットの 1 つは除外されていない：{2}	親または子バケット ({テスト親バケット}/{テスト子バケット}) のいずれかが割り当てから除外されている	連絡先 カスタマーサービス & サポート
バケット割り当て	バケット割り当て：「{0}」が無効なセグメントに割り当てられている	バケット {Test Parent Bucket} に破損したターゲットセグメントがある	バケットを元に戻して再割り当てします。 1. エラーメッセージをクリックして、バケットをハイライト表示します。 2. バケット割り当てを元に戻すには、バケット割り当てを元に戻す ( ) アイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			コンをクリックします。 3. セグメントまたはアカウントにバケットを割り当てる
バケット割り当て	バケット割り当て：「{0}」が、現在のコストモデルに関連付けられていないセグメント {1} に割り当てられている	バケット {Test Parent Bucket} は、現在のコストモデルに関連付けられていないセグメントに割り当てられている	バケットを元に戻して再割り当てします。 1. エラーメッセージをクリックして、バケットをハイライト表示します。 2. バケット割り当てを元に戻すには、バケット割り当てを元に戻す ( ) アイコンをクリックします。 3. セグメントまたはアカウントにバケットを割り当てる
バケット割り当て	バケット割り当て：「{0}」は重み付け割り当て方法を使用しているが、メトリクスが指定されていない	{Test Bucket} は重み付け割り当て方法を使用しているが、メトリクスが指定されている	バケットを元に戻して再割り当てします。 1. エラーメッセージをクリックして、バケットをハイライト表示します。 2. バケット割り当てを元に戻すには、バケット割り当てを元に戻す ( ) アイコンをクリックします。 3. セグメントまたはアカウントにバケットを割り当てる
バケット割り当て	バケット割り当て：「{0}」が無効な配分評価指標を使用して割り当てられている	{Test Bucket} は重み付け割り当て方法を使用しているが、無効なメトリクスが使用されている	バケットを元に戻して再割り当てします。 1. エラーメッセージをクリックして、バケットをハイライト表示します。 2. バケット割り当てを元に戻すには、バ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			ケット割り当てを元に戻す ( ) アイコンをクリックします。 3. セグメントまたはアカウントにバケットを割り当てる
バケット割り当て	バケット割り当て：「{0}」が不特定のアカウントに割り当てられている	{Test Bucket} が不特定のアカウントに割り当てられている	バケットを元に戻して再割り当てします。 1. エラーメッセージをクリックして、バケットをハイライト表示します。 2. バケット割り当てを元に戻すには、バケット割り当てを元に戻す ( ) アイコンをクリックします。 3. セグメントまたはアカウントにバケットを割り当てる
バケット割り当て	バケット割り当て：「{0}」が無効なアカウントに割り当てられている	{Test Bucket} が無効なアカウントに割り当てられている	バケットを元に戻して再割り当てします。 1. エラーメッセージをクリックして、バケットをハイライト表示します。 2. バケット割り当てを元に戻すには、バケット割り当てを元に戻す ( ) アイコンをクリックします。 3. セグメントまたはアカウントにバケットを割り当てる
バケット割り当て	バケット割り当て：「{0}」に必須の手動割り当て情報がない	{Test Bucket} 割り当てで、手動で割り当てられたラインのいずれかに情報 (トランザクションアカウント、トランザクションセグメ	トランザクションアカウント、トランザクションセグメント、割り当てパーセンテージなど、不足している必須情報を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
		ント、またはパーセンテージ割り当て) がない	1. リンクをクリックして、[バケット割り当てアカウント] フォームに移動します。 2. トランザクション [セグメント]、トランザクション [アカウント]、[パーセンテージ] などの不足している必須情報をそれぞれのフィールドに入力します。 3. [更新] をクリックします。
バケット割り当て	バケット割り当て：「{0}」が無効なセグメントに手動で割り当てられている：「{1}」	{Test Bucket} が手動で割り当てられ、割り当てられたラインのいずれかに無効なセグメント {Test Segment} がある	バケット割り当てアカウントのセグメント情報を修正します。 1. リンクをクリックして、[バケット割り当てアカウント] フォームに移動します。 2. [セグメント] 選択リストからセグメントを選択します。 3. [更新] をクリックします。
バケット割り当て	バケット割り当て：「{0}」が、セグメント {2} の無効なアカウント {1} に手動で割り当てられている。金額の {3}% が失われる	{Test Bucket} がセグメント {Test Account} の無効なアカウント {Test Account} に手動で割り当てられています。金額の {Amount}% が失われる可能性がある	バケット割り当てアカウントのアカウント情報を修正します。 1. リンクをクリックして、[バケット割り当てアカウント] ページに移動します。 2. [アカウント] 選択リストからアカウントを選択します。 3. [更新] をクリックします。
バケット割り当て	バケット割り当て：「{0}」が手動で割り当てられ、パーセンテー	{Test Bucket} が手動で割り当てられ、パー	バケット割り当てアカウントのパーセンテージを修正します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
	ジ値が欠落しているか無効	センテージ値が欠落しているか無効	**1.** リンクをクリックして、[バケット割り当てアカウント] ページに移動します。 **2.** [パーセンテージ] フィールドに正しいパーセンテージを入力します。 **3.** [更新] をクリックします。
バケット割り当て	バケット割り当て：「{0}」：手動パーセンテージの合計が {1}% で、100% を超えている	{Test Bucket} の手動割り当てでは割り当てパーセンテージの合計が 120% である	バケット割り当てアカウントの割り当てパーセンテージを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[バケット割り当てアカウント] リストに移動します。 **2.** [パーセンテージ] 列に正しいパーセンテージを入力します。 **3.** [保存] () アイコンをクリックするか、各エントリの後に Enter を押します。
バケット割り当て	バケット割り当て：「{0}」：手動パーセンテージの合計が {1}% で、100% 未満である	{Test Bucket} の手動割り当てでは割り当てパーセンテージの合計が 70% である	バケット割り当てアカウントの割り当てパーセンテージを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[バケット割り当てアカウント] リストに移動します。 **2.** [パーセンテージ] 列に正しいパーセンテージを入力します。 **3.** [保存] () アイコンをクリックする

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			か、各エントリの後に Enter を押します。
バケット割り当て	バケット割り当て：「{0}」手動割り当てが選択されたが、アカウントが指定されていない	{Test Bucket} の手動割り当てで、アカウントが指定されていません。	バケットを元に戻して再割り当てします。 **1.** エラーメッセージをクリックして、バケットをハイライト表示します。 **2.** バケット割り当てを元に戻すには、バケット割り当てを元に戻す ( ) アイコンをクリックします。 **3.** セグメントまたはアカウントにバケットを割り当てる
バケット割り当て	「{0}」のバケット分割：分割パーセンテージの合計が {1} で、100 未満である	{Test Bucket} のバケット分割：分割パーセンテージの合計が 70% である	連絡先 カスタマーサービス & サポート
バケット割り当て	「{0}」のバケット分割：分割パーセンテージの合計が {1} で、100 を超えている	{Test Bucket} のバケット分割：分割パーセンテージの合計が 120% である	連絡先 カスタマーサービス & サポート
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」：ターゲットセグメントが階層にない：{1}	{Test Segment} のロールアップに、階層にない破損したターゲットセグメントがあります。	セグメントのロールアップを再定義します。 **1.** エラーメッセージをクリックして、セグメントをハイライト表示します。 **2.** セグメント名をクリックします。 **3.** セグメントロールアップポップアップの選択リストから適切なセグメントを選択します。 **4.** [ロールアップメソッド] 選択リストから

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			メソッドを選択します。 **5.** [変更を保存] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」：ターゲットセグメントが指定されていない：{1}	{Test Segment} のロールアップに、破損したターゲットセグメントがあります。	セグメントのロールアップを再定義します。 **1.** エラーメッセージをクリックして、セグメントをハイライト表示します。 **2.** セグメント名をクリックします。 **3.** セグメントロールアップポップアップの選択リストから適切なセグメントを選択します。 **4.** [ロールアップメソッド] 選択リストからメソッドを選択します。 **5.** [変更を保存] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」：ターゲットセグメントが指定されていない：{1}	{Test Segment} のロールアップに、破損したターゲットセグメントがあります。	セグメントのロールアップを再定義します。 **1.** エラーメッセージをクリックして、セグメントをハイライト表示します。 **2.** セグメント名をクリックします。 **3.** セグメントロールアップポップアップの選択リストから適切なセグメントを選択します。 **4.** [ロールアップメソッド] 選択リストから

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			メソッドを選択します。 **5.** [変更を保存] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」：ターゲットセグメントが無効：{1}	{Test Segment} のロールアップに、破損したターゲットセグメントがあります。	セグメントのロールアップを再定義します。 **1.** エラーメッセージをクリックして、セグメントをハイライト表示します。 **2.** セグメント名をクリックします。 **3.** セグメントロールアップポップアップの選択リストから適切なセグメントを選択します。 **4.** [ロールアップメソッド] 選択リストからメソッドを選択します。 **5.** [変更を保存] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」：重み付けされたロールアップが選択されているが、メトリクスが指定されていない	{Test Segment} のロールアップに、破損したメトリクスがあります。	セグメントのロールアップを再定義します。 **1.** エラーメッセージをクリックして、セグメントをハイライト表示します。 **2.** セグメント名をクリックします。 **3.** セグメントロールアップポップアップの選択リストから適切なセグメントを選択します。 **4.** [ロールアップメソッド] 選択リストから

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			[重み付け] を選択します。 **5.** [変更を保存] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」ロールアップで無効なメトリクスが使用されている：{1}	{Test Segment} のロールアップに、破損したメトリクスがあります。	セグメントのロールアップを再定義します。 **1.** エラーメッセージをクリックして、セグメントをハイライト表示します。 **2.** セグメント名をクリックします。 **3.** セグメントロールアップポップアップの選択リストから適切なセグメントを選択します。 **4.** [ロールアップメソッド] 選択リストから [重み付け] を選択します。 **5.** [変更を保存] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」：ロールアップスクリプトに構文エラーが含まれている	{Test Segment} に定義されたロールアップスクリプトに構文エラーがあります。	ロールアップスクリプトは、[セグメントロールアップ上書き] フォームで構文的に修正する必要があります。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ] フォームに移動します。 **2.** [スクリプト] フィールドのスクリプトの構文を修正します。 **3.** [更新] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」：ターゲットアカウント {2} のス	{Test Segment}：ターゲットアカウント {Test Account} の	ロールアップスクリプトを構文的に修正する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
	クリプトのロールアップに{1} 引数がない	ロールアップスクリプトに {Test Argument} がない	**1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ] フォームに移動します。 **2.** [スクリプト] フィールドのスクリプトの構文を修正します。 **3.** [更新] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」：トランザクションセグメントへ：アカウント {1} へのスクリプト化済みロールアップに対して空または null が指定されている	{テストセグメント} に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。JSON のロールアップ値の 1 つが Null です。	ロールアップスクリプトは、有効なロールアップ値になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[コスト割り当てロールアップ] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ] フォームに移動します。 **2.** [スクリプト] フィールドのスクリプトの構文を修正します。 **3.** [更新] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」：トランザクションセグメントへ：{1} がアカウント {1} へのスクリプト化済みロールアップでは無効	{テストセグメント} に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。JSON のロールアップ値の 1 つが無効です。	ロールアップスクリプトは、有効なロールアップ値になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[コスト割り当てロールアップ] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ] フォームに移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			2. [スクリプト] フィールドのスクリプトの構文を修正します。 **3.** [更新] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」：トランザクションセグメントへ：{1} がアカウント {1} へのスクリプト化済みロールアップの階層にない	{テストセグメント} に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。JSON のロールアップ値の 1 つが階層にありません。	ロールアップスクリプトは、有効なロールアップ値になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[コスト割り当てロールアップ] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ] フォームに移動します。 **2.** [スクリプト] フィールドのスクリプトの構文を修正します。 **3.** [更新] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」：トランザクションアカウントへ：スクリプト化済みロールアップに対してセグメント ({2}) の ({1}) が存在しない	{テストセグメント} に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。JSON のロールアップ値 (アカウント) のいずれかが存在しません。	ロールアップスクリプトは、有効なロールアップ値になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[コスト割り当てロールアップ] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ] フォームに移動します。 **2.** [スクリプト] フィールドのスクリプトの構文を修正します。 **3.** [更新] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」：トランザクションアカウントが null であり、スクリプト化済みロールアップに対してセグメント ({1}) が存在しない	{テストセグメント} に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。JSON のロールアップ値 (アカウント) の 1 つが Null です。	ロールアップスクリプトは、有効なロールアップ値になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[コスト割り当てロールアップ] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ] フォームに移動します。 **2.** [スクリプト] フィールドのスクリプトの構文を修正します。 **3.** [更新] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」：トランザクションアカウントへ：{1} ({2}) がアカウント {3} へのスクリプトロールアップでは無効	{テストセグメント} に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。JSON のロールアップ値 (アカウント) の 1 つが無効です。	ロールアップスクリプトは、有効なロールアップ値になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[コスト割り当てロールアップ] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ] フォームに移動します。 **2.** [スクリプト] フィールドのスクリプトの構文を修正します。 **3.** [更新] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」ロールアップが、アカウント {1} へのスクリプト化済みロールアップのパーセント値なし/無効なパーセント値で除算されている	{テストセグメント} に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。ロールアップパーセンテージ値の 1 つが無効です。	ロールアップスクリプトは、合計が 100% になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[コスト割り当てロールアップ] フォームのスクリプトを修正します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			1. リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ] フォームに移動します。 2. [スクリプト] フィールドのスクリプトの構文を修正します。 3. [更新] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」スクリプト化済みロールアップが、100% を超える {1}% で除算されている	{テストセグメント} に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。ロールアップ額の合計が 120% である	ロールアップスクリプトは、合計が 100% になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[コスト割り当てロールアップ] フォームのスクリプトを修正します。 1. リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ] フォームに移動します。 2. [スクリプト] フィールドのスクリプトの構文を修正します。 3. [更新] をクリックします。
セグメントロールアップ	セグメントロールアップ：「{0}」スクリプト化済みロールアップが、100% 未満の {1}% で除算されている	{テストセグメント} に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。ロールアップ額の合計が 70% である	ロールアップスクリプトは、合計が 100% になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[コスト割り当てロールアップ] フォームのスクリプトを修正します。 1. リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ] フォームに移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			2. [スクリプト] フィールドのスクリプトの構文を修正します。 **3.** [更新] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：ターゲットセグメントが指定されていない：{1}	「100 South Charles Street, Baltimore, MD」アカウントのロールアップに破損したターゲットセグメントがあります。	アカウントのロールアップを再定義します。 **1.** エラーメッセージをクリックして、アカウントをハイライト表示します。 **2.** アカウント名をクリックします。 **3.** アカウントロールアップポップアップのアクション ( ) アイコンをクリックして、既存の破損したターゲットセグメントを削除します。 **4.** [ロールアップを追加] ボタンをクリックし、[セグメントへ] 選択リストでターゲットセグメントを選択します。 **5.** [ロールアップメソッド] 選択リストからメソッドを選択します。 **6.** [変更を保存] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：ターゲットセグメントが無効：{1}	「100 South Charles Street, Baltimore, MD」アカウントのロールアップに破損したターゲットセグメントがあります。	アカウントのロールアップを再定義します。 **1.** エラーメッセージをクリックして、アカウントをハイライト表示します。 **2.** アカウント名をクリックします。 **3.** アカウントロールアップポップアップ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			のアクション ( ) アイコンをクリックして、既存の破損したターゲットセグメントを削除します。 **4.** [ロールアップを追加] ボタンをクリックし、[セグメントへ] 選択リストでターゲットセグメントを選択します **5.** [ロールアップメソッド] 選択リストからメソッドを選択します。 **6.** [変更を保存] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：ターゲットセグメントが階層にない：{1}	「100 South Charles Street, Baltimore, MD」アカウントのロールアップに、階層にないターゲットセグメントがあります。	アカウントのロールアップを再定義します。 **1.** エラーメッセージをクリックして、アカウントをハイライト表示します。 **2.** アカウント名をクリックします。 **3.** アカウントロールアップポップアップのアクション ( ) アイコンをクリックして、既存の破損したターゲットセグメントを削除します。 **4.** [ロールアップを追加] ボタンをクリックし、[セグメントへ] 選択リストで階層にあるターゲットセグメントを選択します。 **5.** [ロールアップメソッド] 選択リストから

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			メソッドを選択します。 **6.** [変更を保存] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：ターゲットセグメントが階層にない：{1}	「100 South Charles Street, Baltimore, MD」アカウントのロールアップに破損したターゲットアカウントがあります。	アカウントのロールアップを再定義します。 **1.** エラーメッセージをクリックして、アカウントをハイライト表示します。 **2.** アカウント名をクリックします。 **3.** アカウントロールアップポップアップのアクション ( ) アイコンをクリックして、既存の破損したターゲットセグメントを削除します。 **4.** [ロールアップを追加] ボタンをクリックし、[セグメントへ] 選択リストでターゲットセグメントを選択します。 **5.** [アカウントへ] 選択リストでターゲットアカウントを選択します。 **6.** [ロールアップメソッド] 選択リストからメソッドを選択します。 **7.** [変更を保存] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：トランザクションアカウントへ：{1} ({2}) が無効	「101 Broadway East, Seattle, WA」アカウントのロールアップは、無効なアカウントにロールアップされます。	アカウントのロールアップを再定義します。 **1.** エラーメッセージをクリックして、アカウントをハイライト表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			2. アカウント名をクリックします。 3. アカウントロールアップポップアップのアクション ( ) アイコンをクリックして、既存の破損したターゲットセグメントを削除します。 4. [ロールアップを追加] ボタンをクリックし、[セグメントへ] 選択リストでターゲットセグメントを選択します。 5. [アカウントへ] 選択リストで有効なアカウントを選択します。 6. [ロールアップメソッド] 選択リストからメソッドを選択します。 7. [変更を保存] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：重み付けされたロールアップが選択されているが、メトリクスが指定されていない	「開発」アカウントのロールアップに破損したメトリクスがあります。	アカウントのロールアップを再定義します。 1. エラーメッセージをクリックして、アカウントをハイライト表示します。 2. アカウント名をクリックします。 3. アカウントロールアップポップアップのアクション ( ) アイコンをクリックして、既存のターゲットセグメントを削除します。 4. [ロールアップを追加] ボタンをクリックし、[セグメントへ] 選択リストで

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			ターゲットセグメントを選択します。 **5.** [アカウントへ] 選択リストで有効なアカウントを選択します。 **6.** [ロールアップメソッド] 選択リストで [重み付け] メトリクスを選択します。 **7.** [メトリクスの選択] 選択リストで有効なメトリクスを選択します。 **8.** [変更を保存] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：重み付けされたロールアップが選択されているが、メトリクスが指定されていない	アカウントロールアップ：「開発」アカウントのロールアップに破損したメトリクスがあります。	アカウントのロールアップを再定義します。 **1.** エラーメッセージをクリックして、アカウントをハイライト表示します。 **2.** アカウント名をクリックします。 **3.** アカウントロールアップポップアップのアクション ( ) アイコンをクリックして、既存のターゲットセグメントを削除します。 **4.** [ロールアップを追加] ボタンをクリックし、[セグメントへ] 選択リストでターゲットセグメントを選択します。 **5.** [アカウントへ] 選択リストで有効なアカウントを選択します。 **6.** [ロールアップメソッド] 選択リストで [重

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			み付け] メトリクスを選択します。 **7.** [メトリクスの選択] 選択リストで有効なメトリクスを選択します。 **8.** [変更を保存] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：欠落しているか無効なパーセンテージ値により、「{0}」が手動で除算されている	「人事」の合計ロールアップパーセンテージは 70% です。	ロールアップの合計が 100% になるように再定義します **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] リストに移動します。 **2.** すべてのレコードのパーセンテージの合計が 100% になるように、各レコードのパーセンテージを [パーセント] 列に入力します。 **3.** [保存] () アイコンをクリックするか、各エントリの後に Enter を押します。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：手動パーセンテージの合計が {1}% で、100% を超えている	「人事」の合計ロールアップパーセンテージは 70% です。	ロールアップの合計が 100% になるように再定義します **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] リストに移動します。 **2.** すべてのレコードのパーセンテージの合計が 100% になるように、各レコードのパーセンテージを [パーセント] 列に入力します。 **3.** [保存] () アイコンをクリックする

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			か、各エントリの後に Enter を押します。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：手動パーセンテージの合計が {1}% で、100% 未満である	「人事」の合計ロールアップパーセンテージは 70% です。	ロールアップの合計が 100% になるように再定義します 1. リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] リストに移動します。 2. すべてのレコードのパーセンテージの合計が 100% になるように、各レコードのパーセンテージを [パーセント] 列に入力します。 3. [保存] () アイコンをクリックするか、各エントリの後に Enter を押します。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：欠落しているか無効なパーセンテージ値により、「{0}」が均等に除算されている	「{0}」ロールアップ上書きが、欠落/無効パーセント値で均等に除算されています。	ロールアップの合計が 100% になるように再定義します 1. リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] リストに移動します。 2. すべてのレコードのパーセンテージの合計が 100% になるように、各レコードのパーセンテージを [パーセント] 列に入力します。 3. [保存] () アイコンをクリックするか、各エントリの後に Enter を押します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：100% を超える {1}% により、「{0}」が均等に除算されている	「125 West South Street, Indianapolis, IN」アカウントのロールアップは 100% を超えており、金額が計上できない可能性があります。	[アカウントロールアップ上書き] フォームで、合計が 100% になるようにロールアップを再定義します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] リストに移動します。 **2.** すべてのレコードのパーセンテージの合計が 100% になるように、各レコードのパーセンテージを [パーセント] 列に入力します。 **3.** [保存] () アイコンをクリックするか、各エントリの後に Enter を押します。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：100% 未満の {1}% により、「{0}」が均等に除算されている	「125 West South Street, Indianapolis, IN」アカウントのロールアップは 100% を超えており、金額が計上できない可能性があります。	[アカウントロールアップ上書き] フォームで、合計が 100% になるようにロールアップを再定義します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] リストに移動します。 **2.** すべてのレコードのパーセンテージの合計が 100% になるように、各レコードのパーセンテージを [パーセント] 列に入力します。 **3.** [保存] () アイコンをクリックするか、各エントリの後に Enter を押します。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：ロール	Facilitate Connectivity アカウン	ロールアップスクリプトは、[アカウント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
	アップスクリプトに構文エラーが含まれている	ト用に定義されたロールアップスクリプトに構文エラーがあります。	ロールアップ上書き] フォームで構文的に修正する必要があります。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] フォームに移動します。 **2.** [スクリプト] フィールドのスクリプトの構文を修正します。 **3.** [更新] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：トランザクションセグメントへ：{1} がアカウント {2} へのスクリプト化済みロールアップ上書きに対して空または null が指定されている	Facilitate Connectivity アカウント用に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。JSON のロールアップ値の 1 つが null です。	ロールアップスクリプトは、有効なロールアップ値になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[アカウントロールアップ上書き] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] フォームに移動します。 **2.** [スクリプト] フィールドのロールアップ値を修正します。 **3.** [更新] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：トランザクションセグメントへ：{1} がアカウント {2} へのスクリプト化済みロールアップ上書きでは無効	Facilitate Connectivity アカウント用に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。ロールアップ値の 1 つがテストアカウントです。これは有効な事業部門ではありません。	ロールアップスクリプトは、有効なロールアップ値になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[アカウントロールアップ上書き] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			フォームに移動します。 **2.** [スクリプト] フィールドに有効な rollupValue を入力します。 **3.** [更新] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：トランザクションセグメントへ：{1} がアカウント {2} へのスクリプト化済みロールアップ上書きの階層にない	Facilitate Connectivity アカウント用に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。rollupToSegment の 1 つは、階層にないテストセグメントです。	ロールアップスクリプトは、有効な rollupToSegment になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[アカウントロールアップ上書き] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] フォームに移動します。 **2.** [スクリプト] フィールドに有効な rollupToSegment を入力します。 **3.** [更新] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：トランザクションセグメントへ：セグメント ({2}) の ({1}) がスクリプト化済みロールアップ上書きに対して空または null が指定されている	Facilitate Connectivity アカウント用に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。JSON のロールアップ値の 1 つが空/Null が指定されています。	ロールアップスクリプトは、有効なロールアップ値になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[アカウントロールアップ上書き] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] フォームに移動します。 **2.** [スクリプト] フィールドに有効な

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			rollupValue を入力します。 **3.** [更新] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：トランザクションアカウントが、スクリプト化済みロールアップ上書きに対して null である	Facilitate Connectivity アカウント用に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。JSON のロールアップ値の 1 つが空/Null が指定されています。	ロールアップスクリプトは、有効なロールアップ値になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[アカウントロールアップ上書き] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] フォームに移動します。 **2.** [スクリプト] フィールドに有効な rollupValue を入力します。 **3.** [更新] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」：トランザクションアカウントへ：{1} ({2}) がスクリプト化済みロールアップ上書きでは無効	スクリプトは無効な JSON を返します。ロールアップ値の 1 つが BlackBerry です。これは有効な事業部門ではありません。	ロールアップスクリプトは、有効なロールアップ値になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[アカウントロールアップ上書き] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] フォームに移動します。 **2.** [スクリプト] フィールドに有効な rollupValue を入力します。 **3.** [更新] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」ロールアップ上書きが、アカウント {1} へのスクリプト化済みロールアップ上書きのパーセント値なし/無効なパーセント値で除算されている	パーセンテージ値の 1 つであるロールアップ額に、ロールアップ値「テストアカウント」に対して Null または無効な値が指定されています。	[アカウントロールアップ上書き] フォームでスクリプトのロールアップ額を修正します。 [アカウントロールアップ上書き] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] フォームに移動します。 **2.** スクリプトの rollupAmount を修正します。 **3.** [スクリプト] フィールドに有効なパーセンテージ値を入力します。 **4.** [更新] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」ロールアップ上書きが、アカウント {1} へのスクリプト化済みロールアップ上書きのパーセント値なし/無効なパーセント値で除算されている	ロールアップ引数またはロールアップ値がない場合、パーセンテージ値のいずれかが Null または無効になります。	[アカウントロールアップ上書き] フォームでスクリプトのロールアップ額を修正します。 [アカウントロールアップ上書き] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] フォームに移動します。 **2.** スクリプトの rollupAmount を修正します。 **3.** [スクリプト] フィールドに有効なパーセ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			ンテージ値を入力します。 **4.** [更新] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」スクリプト化済みロールアップが、100% を超える {1}% で除算されている	Facilitate Connectivity アカウント用に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。ロールアップ額の合計が 120% です。	ロールアップスクリプトは、合計が 100% になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[アカウントロールアップ上書き] リストのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ] リストに移動します。 **2.** すべてのレコードのパーセンテージの合計が 100% になるように、各レコードのパーセンテージを [パーセント] 列に入力します。 **3.** [更新] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」スクリプト化済みロールアップが、100% 未満の {1}% で除算されている	Facilitate Connectivity アカウント用に定義されたロールアップスクリプトに、無効な JSON リターンがあります。rollupAmount の合計が 70% である	ロールアップスクリプトは、合計が 100% になるように修正する必要がある JSON 変数を返します。[アカウントロールアップ上書き] フォームのスクリプトを修正します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ] リストに移動します。 **2.** すべてのレコードのパーセンテージの合計が 100% になるように、各レコードのパーセンテージを

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			[パーセント] 列に入力します。 **3.** [更新] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」に、無効なバケットを含むバケットベースのロールアップがある	アカウントロールアップ：「{0}」に、無効なバケットを含むバケットベースのロールアップがある	アカウントのバケットロールアップを再定義します。 **1.** エラーメッセージをクリックして、アカウントをハイライト表示します。 **2.** アカウント名をクリックします。 **3.** [バケットロールアップ] タブをクリックします。 **4.** [削除] ( ) アイコンをクリックして、既存の無効なバケットレコードを削除します。 **5.** [バケットロールアップの追加] をクリックします。 **6.** バケットロールアップポップアップの [バケット] 選択リストからバケットを選択します。 **7.** [ロールアップメソッド] 選択リストからメソッドを選択します。 詳細については、「アカウントにロールアップするアカウントの表示」を参照してください。 **8.** [変更を保存] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」に、バケットに親がないバケット	アカウントロールアップ：「{0}」に、バケットに親がないバケット	連絡先 カスタマーサービス & サポート .

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
	ベースのロールアップがある	ベースのロールアップがある	
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」に、バケットが現在のコストモデルに含まれていないバケットベースのロールアップがある	アカウントロールアップ：「{0}」に、バケットが現在のコストモデルに含まれていないバケットベースのロールアップがある	アカウントのバケットロールアップを再定義します。 **1.** エラーメッセージをクリックして、アカウントをハイライト表示します。 **2.** アカウント名をクリックします。 **3.** [バケットロールアップ] タブをクリックします。 **4.** [削除] ( ) アイコンをクリックして、既存のバケットレコードを削除します。 **5.** [バケットロールアップの追加] をクリックします。 **6.** バケットロールアップポップアップの [バケット] 選択リストから、現在のコストモデルにあるバケットを選択します。 **7.** [ロールアップメソッド] 選択リストからメソッドを選択します。 詳細については、「アカウントにロールアップするアカウントの表示」を参照してください。 **8.** [変更を保存] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」に、バケットが最低の分割レベルではないバケットベー	アカウントロールアップ：「{0}」に、バケットが最低の分割レベルではないバケットベー	アカウントのバケットロールアップを再定義します

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
	スのロールアップがある	スのロールアップがある	**1.** エラーメッセージをクリックして、アカウントをハイライト表示します。 **2.** アカウント名をクリックします。 **3.** [バケットロールアップ] タブをクリックします。 **4.** [削除] ( ) アイコンをクリックして、既存のバケットレコードを削除します。 **5.** [バケットロールアップの追加] をクリックします。 **6.** バケットロールアップポップアップの [バケット] 選択リストから、分割レベルが最も低いバケットを選択します。 **7.** [ロールアップメソッド] 選択リストからメソッドを選択します。 詳細については、「アカウントにロールアップするアカウントの表示」を参照してください。 **8.** [変更を保存] をクリックします。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」には、欠落しているか無効なパーセンテージ値がある「{1}」に対して手動で除算されているバケットベースのロールアップがある	アカウント「{0}」ロールアップ上書きが、欠落/無効パーセント値で手動で分割されています。	ロールアップの合計が 100% になるように再定義します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] リストに移動します。 **2.** すべてのレコードのパーセンテージの合計が 100% になるように、各レコード

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			のパーセンテージを [パーセント] 列に入力します。 **3.** [保存] () アイコンをクリックするか、各エントリの後に Enter を押します。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」では、バケット「{1}」に対してバケットベースのロールアップが手動で除算され、{2}% が 100% を超えている	「人事」の合計ロールアップパーセンテージは 70% です。	ロールアップの合計が 100% になるように再定義します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] リストに移動します。 **2.** すべてのレコードのパーセンテージの合計が 100% になるように、各レコードのパーセンテージを [パーセント] 列に入力します。 **3.** [保存] () アイコンをクリックするか、各エントリの後に Enter を押します。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」では、バケット「{1}」に対してバケットベースのロールアップが手動で除算され、{2}% が 100% 未満	「人事」の合計ロールアップパーセンテージは 70% です。	ロールアップの合計が 100% になるように再定義します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] リストに移動します。 **2.** すべてのレコードのパーセンテージの合計が 100% になるように、各レコードのパーセンテージを [パーセント] 列に入力します。 **3.** [保存] () アイコンをクリックする

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			か、各エントリの後に Enter を押します。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」には、欠落しているか無効なパーセンテージ値がある「{1}」に対して均等に除算されているバケットベースのロールアップがある	「{0}」ロールアップ上書きが、欠落/無効パーセント値で均等に除算されている	ロールアップの合計が 100% になるように再定義します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] リストに移動します。 **2.** すべてのレコードのパーセンテージの合計が 100% になるように、各レコードのパーセンテージを [パーセント] 列に入力します。 **3.** [保存] () アイコンをクリックするか、各エントリの後に Enter を押します。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」では、バケット「{1}」に対してバケットベースのロールアップが均等に除算され、{2}% が 100% を超えている	「125 West South Street, Indianapolis, IN」アカウントのロールアップは 100% を超えており、金額が計上できない可能性があります。	[アカウントロールアップ上書き] フォームで、合計が 100% になるようにロールアップを再定義します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] リストに移動します。 **2.** すべてのレコードのパーセンテージの合計が 100% になるように、各レコードのパーセンテージを [パーセント] 列に入力します。 **3.** [保存] () アイコンをクリックする

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金不足ログと解決策 (続く)

カテゴリ	条件	原因	アクション
			か、各エントリの後に Enter を押します。
アカウントロールアップ	アカウントロールアップ：「{0}」では、バケット「{1}」に対してバケットベースのロールアップが均等に除算され、{2}% が 100% 未満	「125 West South Street, Indianapolis, IN」アカウントのロールアップは 100% 未満であり、金額が計上できない可能性があります。	[アカウントロールアップ上書き] フォームで、合計が 100% になるようにロールアップを再定義します。 **1.** リンクをクリックして、[コスト割り当てロールアップ上書き] リストに移動します。 **2.** すべてのレコードのパーセンテージの合計が 100% になるように、各レコードのパーセンテージを [パーセント] 列に入力します。 **3.** [保存] () アイコンをクリックするか、各エントリの後に Enter を押します。

自動翻訳

コストモデル 従来

コストモデルは、階層内のアカウントに経費を割り当てる方法をアプリケーションに指示するルール、メソッド、およびメトリクスのセットです。

コストモデルは、割り当てとレポートに関連付けられています。ITBM アナリストライセンスを所有している場合は、複数のコストモデルを作成し、割り当てエンジンを実行するモデルを選択できます。

コストモデルには、経費配賦をより詳細に制御できる次の属性があります。

- ユーザーグループ：コストモデルを ITFM タイプのユーザーグループに関連付けます。ユーザーがユーザーグループに含まれていれば、適切な財務モデルロールを持つユーザーは誰でも (関連するユーザーグループを使用して) コストモデルにアクセスできます。この関連付けでは、コストモデルにアクセスできるユーザーを制限できます。
- 会計期間：コストモデルを会計単位に関連付けます。ファイナンシャルモデリングの [データ定義] ステージの [会計期間] フィールドは、コストモデルで選択した会計単位に基づいて設定されます。したがって、さまざまな会計期間 (月、四半期、または期間) の財務モデルアクティビティを実行できます。
- データソース：コストモデルのステージング済み行ソースを定義します。必要に応じて、データソースを定義しないことを選択できます。その場合は、調整済みラインを直接作成するか、バケットに直接金額を入力できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ITBM アナリストのライセンスを所有している場合は、作成できるコストモデル以外に、基本システムが提供する所定のコストモデルを使用できます。次のコストモデルについては、「シェアードサービスとビジネスアプリケーションの規範的コストモデル」、および「ビジネスサービスとビジネス機能の規範的コストモデル」を参照してください。

- 第 1 レベルの原価計算 - シェアードサービス
- 第 2 レベルの原価計算 - ビジネスアプリケーション
- 第 2 レベルの原価計算 - ビジネスサービス
- 第 3 レベルの原価計算 - ビジネス機能

エンタープライズアーキテクチャ (以前のアプリケーションポートフォリオ管理) またはサービスポートフォリオ管理 (SPM) を使用している場合は、使用するアプリケーションに応じて、次のいずれかのコストモデルを使用できます。

- ビジネスアプリケーション原価計算
- サービスオファリングの原価計算

コストモデルフォームからのコストモデルの作成 - 従来

割り当てを処理する複数のコストモデルを作成できます。コストモデルフォームを使用して、コストモデルで利用可能なすべての設定を構成します。

始める前に

重要:
この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

必要なロール：cost_transparency_admin

このタスクについて

割り当てをセットアップするときにデータ定義ステージ - 従来でコストモデルを選択できます。ワークベンチでコストモデルのクローンを作成することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > コストモデル > すべて.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームフィールドに入力します (テーブルを参照)。

[財務モデル] フォーム

フィールド	説明
名前	説明に従ったコストモデルの名前。長さは最大 80 文字です。
説明	コストモデルの説明。
コスト割り当てで使用	モデルをコスト割り当てに使用するかどうかを指定するオプション。
モデル所有者	コストモデルを作成したユーザー。
データソース	データが取得されるソース。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	[データソース] フィールドは、財務モデルアクションが実行されなくなるまで編集可能です。 アプリケーションは、ITFM 予算ステージング済み経費にリンクされているため、デフォルト予算コストモデルのデータソースとして予算ステージング済みテーブルを指すように事前設定されています。 データソースを選択しないオプションもあります。このような場合、経費ラインをプルする財務データソースがないため、ワークベンチステージにはデータクレンジングステージがありません。金額は、バケット化ステージで手動で入力されます。
予算業務で使用	モデルが予算に使用されている場合は、チェックボックスをオンにします。

財務モデルフォームの [コストの透明性] セクション

フィールド	説明
会計単位	会計カレンダーに基づいて、会計単位を月、四半期、または期間として定義します。
サブバケット情報を含める	有効にすると、生成されたコストラインとブレークダウンラインにサブバケット情報が保持されます。
ユーザーグループ	選択したユーザーグループはコストモデルに関連付けられています。これにより、タイプ ITFM のユーザーグループに関連付けられていない他のユーザーグループによるコストモデルへのアクセスが制限されます。 cost_transparency_analyst ロールを持つユーザーは、デフォルトのコストモデルとユーザーグループに関連付けられたコストモデルにのみアクセスできます。 cost_transparency_admin およびシステムアドミニストレーターロールを持つユーザーは、デフォルトのコストモデルを含むすべてのコストモデルにアクセスできます。 コストモデルで [予算業務で使用] チェックボックスがオンになっている場合、適切な予算ロールを持つユーザーはすべての予算モデルを表示できます。 コストモデルが予算業務とコスト割り当て明細の生成の両方の目的で使用されている場合、つまり [コスト割り当てで使用] および [予算業務で使用] チェックボックスが有効になっている場合、すべてのユーザーがコストモデルにアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [送信] をクリックします。
5. コスト割り当てを実行するには、[経費割り当て] ボタンをクリックします。

   注:
   アナリストのライセンスを受けていない顧客である場合は、各セグメントのアカウント数とコストモデルのアカウントの合計数がそれぞれ 4000 と 12000 のしきい値内にあることを確認してください。

   必ずしもワークベンチからではなく、コストモデルフォームからコスト割り当てを実行するには、このオプションを使用します。

   a. [経費割り当て] ダイアログボックスで会計期間を選択します。

   b. **[OK]** をクリックします。

      割り当てエンジンが実行され、選択した会計期間のコスト割り当てが生成されます。エンジンはクレンジングとバケットを実行します。経費を割り当て、割り当て明細を作成します。ただし、コストモデルにデータソースがない場合、エンジンはクレンジングステージとバケットステージを無視して、割り当て明細を作成します。

6. コストモデルをダウンロードするには、[コストモデルのダウンロード] ボタンをクリックします。

   コストモデルをダウンロードしてアップロードしたり、別のインスタンスに展開して別の本番前環境でコストモデリングを実行したりできます。後でコストモデルを他の本番環境に移動できます。

   コストモデルをダウンロードする機能を使用すると、すべての関連テーブルと、セグメント定義と階層、バケット、クレンジングと調整条件、バケット割り当て、ロールアップとロールアップの上書き、消費メトリクスなどの関連要素をダウンロードすることもできます。

7. コストモデルに関連付けられたリーフバケットのコスト行を生成するには、[バケットコストを生成] ボタンをクリックします。

   データソースのないこのコストモデルのバケット金額行を生成するには、このオプションを使用します。それ以上サブバケットがないリーフバケットごとにコスト行が生成されます。バケットに金額がない場合でも、調整済みの総勘定元帳データ [itfm_gl_data_groomed] テーブルに金額行が生成され、[金額] 列にゼロが入力されます。テーブルには、選択した会計期間のコストモデルに関連付けられたバケット、サブバケット、および金額が表示されます。

   a. [バケットコストを生成] ダイアログボックスで会計期間を選択します。

   b. **[OK]** をクリックします。

      - バケットに金額がない場合でも、割り当てエンジンは、コストモデルの選択された会計期間に対して、経費ゼロの調整済み行を生成します。
      - その会計期間のバケットに金額がある調整済み行が既に存在する場合、エンジンはそれらのコスト行を上書きしません。

      [金額] 列を編集して、各サブバケットの金額を入力できます。

8. インタラクティブなユーザーインターフェイスを使用してモデル階層を作成するには、[セグメント階層をビルド] 関連リンクをクリックします。
   階層に新しいセグメントを追加するか、要件に従ってコストモデルからセグメントを削除します。
9. クローンを作成する選択済みのコストモデルで最上位セグメントを置き換えるには、次の手順に従います。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

a. [モデルのクローンおよびトップセグメントの置換] 関連リンクをクリックします。

b. [モデルのクローンおよびトップセグメントの置換] ポップアップの選択リストからセグメントを選択し、**[OK]** をクリックします。

コストモデルの一番上のセグメントを、選択した別のセグメントに置き換えることができます。コストモデルで使用されていないセグメントは、コストモデルの最上位セグメントを置き換えることを選択できます。置換セグメントは利用可能なセグメントで、現在のコストモデルセグメント階層ではまだ使用されていないものです。選択したセグメントは既存の最上位セグメントを置き換え、階層内の既存のセグメントレベルには追加されません。最上位のセグメントを置き換えることで、企業の組織構造に合わせてコストモデルを構成することができます。

> **注:**
> 元のセグメントに設定されたバケット割り当て、ロールアップ、ロールアップの上書き、ブレークダウンの関係、単位メトリクス、兄弟の関係、GL セグメントなどのルールは、置換されたセグメントでは無効になります。したがって、置換されたトップセグメントに対してこれらのルールを設定する必要があります。

次のタスク
このコストモデルを使用するバケットは、バケット関連リストに表示されます。

アカウントのバケットを作成することもできます。

単位コストメトリクスをコストモデルのセグメントにマッピングして、単位コストを生成します。

特定のセグメント間マッピングの itfm_allocation_breakdown テーブルにブレークダウンコストラインを明示的に生成するブレークダウン関係は、[ブレークダウンの関係性] 関連リストに表示されます。

兄弟関係を定義して、兄弟レベルでアカウントをロールアップすることもできます。

管理されたコスト明細の生成

管理されたコスト明細を生成すると、ビジネスニーズに必要な割り当て明細を制御するのに役立ちます。

新規顧客の場合、デフォルトでは、管理されたコスト明細が割り当てエンジンによって自動的に生成されます。

以前のバージョンから Yokohama リリースにアップグレードする場合、[管理されたコスト明細] および [GL 経費ライン] オプションに次の変更が加えられます。

- コストモデルをクローンすると、新しいモデルで [管理されたコスト明細を生成] オプションが有効になり、新しいモデルで **[GL** 経費ラインを生成] オプションが無効化されます。ベースモデルでこれらのオプションが有効であったか無効であったかは関係ありません。これらのオプションは編集できず、コストモデル表示ページのデフォルトビューには表示されません。
- コストモデルを作成すると、デフォルト値が設定されます。[管理されたコスト明細を生成] オプションのデフォルト値は **[true]** で、**[GL** 経費ラインを生成] オプションのデフォルト値は **false** です。これらのオプションは編集できず、コストモデル表示ページのデフォルトビューには表示されません。
- 既存のコストモデルの場合、既存の値は変わりません。[管理されたコスト明細を生成] オプションが無効になっている場合、このオプションは無効のままになります。**[GL** 経費ラインを生成] オプションが有効になっている場合、このオプションは有効のままになります。これらのオプションの値はデフォルト値に変更できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サブバケット情報を表示し、2 つのセグメント間の関係に関するレポートを表示するには、次の手順を実行します。

- 生成されたラインのサブバケット情報が必要な場合は、コストモデルビューページの [サブバケット情報を含める] オプションを選択します。

  生成された [管理されたコスト明細] は、バケットのある単一ディメンションチャートをプロットするのに十分です。

- ブレークダウン関係を明示的に定義して、2 つのセグメント間の関係に関するレポートを表示します。

  その後、エンジンはコスト割り当てブレークダウン集計 [itfm_allocation_breakdown] テーブルに追加のブレークダウン割り当て明細を生成します。これは、セグメント間に 2 ディメンションチャートをプロットするのに役立ちます。たとえば、事業部門への IT シェアードサービスの貢献などです。

単位コストの生成

単位コストメトリクスをコストモデル階層のセグメントに関連付けて、単位コストを生成します。マッピングは、ファイナンシャルモデリングアプリケーションから割り当て明細に基づいて単位コストを導出するのに役立ちます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

1. 移動先 ファイナンシャルモデリング > コストモデル > すべて.
2. コストメトリクスをコストモデルのセグメントまたはセグメントのアカウントに関連付けるには、コストモデルをクリックして開きます。
3. [コストメトリクス] 関連リストをクリックします。
4. [新規] をクリックします。
5. フォームのフィールドに入力します。

[単位コストメトリクス] フォーム

フィールド	説明
コストモデル	リストのコストモデル。
単位コストセグメント	単位コストを生成するコストモデルセグメント。
単位コストメトリクス	消費/重み付けテーブルで定義された単位コストメトリクス。
単位	単位コストの測定単位。
トランザクションテーブル	編集できないセグメントトランザクションテーブル。
バケット情報を含める	単位コストでバケット情報を有効にするオプション。 デフォルトでは、バケット情報を含めるフラグは [False] に設定されています。フラグが [true] の場合、バケット情報は単位コスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	[itfm_unit_cost] テーブルのバケット列に入力されます。
単位コストアカウントフィルター	基準に基づいてフィルタリングされたアカウント。 単位コストは、フィルタリングされたアカウントに対してのみ生成されます。

6. [送信] をクリックします。
7. 単位コストメトリクスを選択し、[単位コストのメトリクスを生成] をクリックします。
8. 表示される [単位コストのメトリクスを生成] ポップアップで会計期間を選択します。

   エンジンは、リストに表示されている会計期間の割り当てを既に実行しています。
9. **[OK]** をクリックします。
10. 単位コストを確認するには、次に移動します: ファイナンシャルモデリング > コストモデル明細 > 単価.

    単位コストが生成され、[単位コスト] テーブルに入力されます。単位コストは、単位コストテーブルの [単位コストアカウント] 列で、単位コストセグメントのフィルタリングされたすべてのアカウントに対して生成されます。

    [バケット情報を含める] チェックボックスを有効にすると、さまざまなバケットからの金額を表示できます。単位コストテーブルのバケットおよびサブバケット列で、バケットごとの単位コストを追跡できます。

    このテーブルには、総コストと数量も表示されます。メトリクスの強制された関係に基づいて、アカウントの単位コストからさらにドリルダウンすることができます。

自動翻訳

兄弟ロールアップ関係の定義

兄弟セグメントのアカウントに金額をロールアップする関係を定義します。階層内の直接の親または祖父母に限定されるのではなく、階層内の任意のアカウントに経費をロールアップできます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

手順

1. 移動先 ファイナンシャルモデリング > コストモデル > すべて.
2. [兄弟ロールアップ関係] タブをクリックします。
3. [新規] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。

[兄弟ロールアップ関係] フォーム

フィールド	説明
関係名	定義した兄弟関係に対して生成される名前。
始点セグメント	関係が作成されるセグメント。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
終点セグメント	関係が確立されるセグメント。

5. [送信] をクリックします。

コストモデルのデータソースを変更するための前提条件

既存のデータソースのコストモデルと、関連するテーブルで収集および蓄積されたすべてのデータを消去します。次の手順に従って、データソースをシームレスに変更します。

コストモデルのデータソースを変更する手順

1. 次のデータをそれぞれのテーブルから削除します。
   a. コスト割り当てブレークダウン集計 [itfm_allocation_breakdown] テーブルからのコストモデルの割り当てブレークダウン。
   b. コスト割り当て [itfm_allocation] テーブルからのコストモデルの割り当て。
   c. コスト割り当て集計 [itfm_allocation_aggregate] テーブルからのコストモデルの割り当て集計。
   d. 調整済み総勘定元帳データ [ltfm_gl_data_groomed] テーブルからのコストモデルの調整済みレコード。
   e. 総勘定元帳クレンジング済みデータ [itfm_cl_data_cleansed] テーブルからのコストモデルの調クレンジング済みコード。
   f. コストモデルのコスト割り当て実行ログ [itfm_ca_run_log] テーブルのレコード。
2. コストモデルのデータソースを変更します。

コストモデルを選択 - 従来

すべてのステージを通過するときに、ワークベンチで使用するコストモデルを 1 つ選択できます。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin

手順

[データ定義] ステージの [コストモデル] 選択リストから、処理するデータのコストモデルを選択します。

必要なコストモデルが表示されない場合は、コストモデルを作成できます。

コストモデル階層 - 従来

すべてのアカウントは、コストモデル階層で構造化されたセグメントに属しています。

コストモデル階層を使用すると、下位レベルのアカウントとセグメントから上位レベルのアカウントとセグメントに経費をロールアップできます。たとえば、事業部門セグメントの下にビジネスサービスセグメントがあるデフォルトの階層を使用するとします。このロールアップを使用すると、メールなどのビジネスサービスに割り当てられた経費を、メールサービスを使用する事業部門 (そのうちの 1 部門は一般的に IT) にも適用することができます。

> **注:**
> セグメント関係フォームを使用するのではなく、ワークベンチを使用して階層を変更することをお勧めします。ワークベンチを使用して階層を変更すると、すべてのルールとメソッドが自動的に作成されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

セグメント階層のビルド

重要:
この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

財務モデルフォームの [セグメント階層のビルド] リンクを使用すると、ファイナンシャルモデリングワークベンチのようにインタラクティブなユーザーインターフェイスを使用して簡単にモデル階層を作成できます。階層に新しいセグメントを追加するか、要件に従ってコストモデルからセグメントを削除します。

割り当て - 従来

ファイナンシャルマネジメントアプリケーションで経費を割り当てると、経費は割り当てと呼ばれる詳細な金額に分割されます。

割り当ては、セグメントの階層内の特定のセグメントとアカウントに関連付けられます。

経費を割り当てるために、アプリケーションはコストモデルを構成する次のアイテムを使用します。

バケット割り当て

均等ベース、手動、または重み付けのいずれかで、ルールを使用して経費のブレークダウンを計算する、割り当て方法を使用したセグメントまたはセグメント内のアカウントへの特定のバケット割り当て。

セグメントロールアップ

金額があるセグメントから別のセグメントにロールアップする方法を定義します。

ロールアップ上書き

セグメントの特定のアカウントからの金額は、階層内の任意のアカウントまたはセグメントにロールアップできます。

割り当て指標

アプリケーションが重み付け計算またはスクリプトに基づいて経費を割り当てるために使用する追加の指示が含まれています。1 つのメソッドは、1 つ以上のメトリクスを使用できます。

ワークベンチを使用して経費をアカウントとセグメントに割り当てると、すべてのルール、メソッド、および条件が自動的に作成されます。

ファイナンシャルマネジメントアドミニストレーターまたはファイナンスアナリストロールを持つユーザーは、ワークベンチ (推奨される方法) を使用するか、リストやフォームを使用してコスト割り当てを管理できます。

チャージバック

アプリケーションは、「チャージバック」、つまり共有コストのセグメント間でクレジットを転送するために使用できる総勘定元帳経費の負の金額をサポートしています。チャージバック経費は、他の経費とは逆の方法で固定金額方式を処理します。たとえば、$100 のチャージバックに $50 を割り当てる固定金額タイプのメソッドは、総勘定元帳の経費で「-100」と表示され、ルールで指定された $50 のクレジットを適用します。

割り当て例

アプリケーションで提供されるデモデータには、さまざまなタイプの割り当ての良い例が示されています。次のような割り当てを行うことができます。

- 消費量に基づくストレージコスト
- 仮想マシンの使用に基づくプライベートクラウドコスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コスト、CPU、場所などに基づくサーバー
- プロジェクト管理契約コスト

アカウントのバケット - 従来

アカウントのバケットは、経費をアカウントとセグメントに割り当てる前に、クレンジング済み経費を分類するのに役立ちます。

複数の子バケットが単一の親バケットを参照できるように、バケットを親子関係に置くことができます。

Geneva リリース以降は、バケットも 1 つのコストモデルに関連付ける必要があります。

アカウントのバケットの作成

アカウントのバケットはワークベンチで作成できますが、バケットフォームを使用して作成することもできます。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin

手順


1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > コストモデル > バケット.

2. [**New**] をクリックします。

3. フォームのフィールドに適宜入力します (テーブルを参照)。

4. [送信] をクリックします。

バケットフォーム

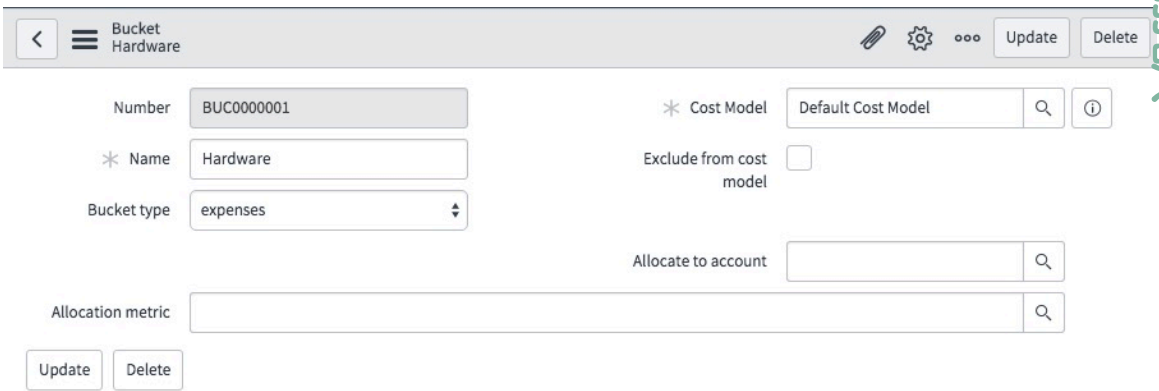

バケットフォームフィールド

フィールド	説明
番号	バケットの識別番号が自動生成されます。
名前	バケットのわかりやすい名前。
バケットタイプ	バケットのタイプ： ○ セレクター：分割バケット ○ 経費：標準バケット (非分割)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
コストモデル	このバケットに関連付けられたコストモデル。コストモデルを選択します。コストモデルレコードを開くと、それに関連付けられているバケットが [バケット] 関連リストに表示されます。これらは、経費をバケットに入れるときに、ワークベンチのそのコストモデルで使用できるバケットです。
コストモデルから除外	バケットが割り当てに使用されていない場合。
親バケット	このバケットが関連付けられている親バケット。

経費をバケットに入れるときに、新しいバケットを追加し、バケットに入るデータをフィルタリングするバケットの条件を作成することもできます。

調整およびクレンジング条件 - 従来

調整条件は、ワークベンチで変更を行った場合の経費の相互関係およびバケットとの関係を定義し、クレンジング条件は、セグメントごとの財務データのクレンジング方法を定義します。

調整条件

ワークベンチは、次の 3 つのタイプの調整条件を作成します。

- データクレンジング条件：クレンジングステージで行う経費の組み合わせを定義します。たとえば、Acme ベンダーの経費エントリを Acme Inc. ベンダーにドラッグすると、アプリケーションは、これらの経費すべてを Acme Inc. ベンダーに属するものとみなすようにワークベンチに指定する調整ルールを作成します。アプリケーションは、総勘定元帳クレンジング済みデータテーブル [itfm_cl_data_cleansed] の経費レコードの追加、削除、または変更を実際には行いません。
- バケット条件：バケット化ステージでバケットに追加した経費を定義します。
- 詳細クエリ条件：バケット化ステージでバケットに追加できる経費を定義します。ワークベンチを使用すると、アプリケーションによってデータクレンジングとバケット条件が自動的に作成されます。フォームビューまたはワークベンチから手動で作成する調整条件のタイプは、詳細クエリ条件のみです。

クレンジング条件

アプリケーションは、ワークベンチのクレンジングステージで経費を結合するときにクレンジング条件を作成します。これらのクレンジング条件を変更する必要はありません。

詳細クエリ条件の変更

経費をバケットに追加する方法を定義する既存の詳細クエリ条件を変更できます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin

このタスクについて

注:
調整条件は、ワークベンチで自動的に作成されます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > コストモデル > 調整条件.
   結果のレコードリストは、詳細クエリ条件のみを表示するようにフィルタリングされます。
2. 調整条件番号をクリックして開きます。
3. 必要に応じてフォームのフィールドを変更します (テーブルを参照)。
4. [更新] をクリックします。

調整条件の例

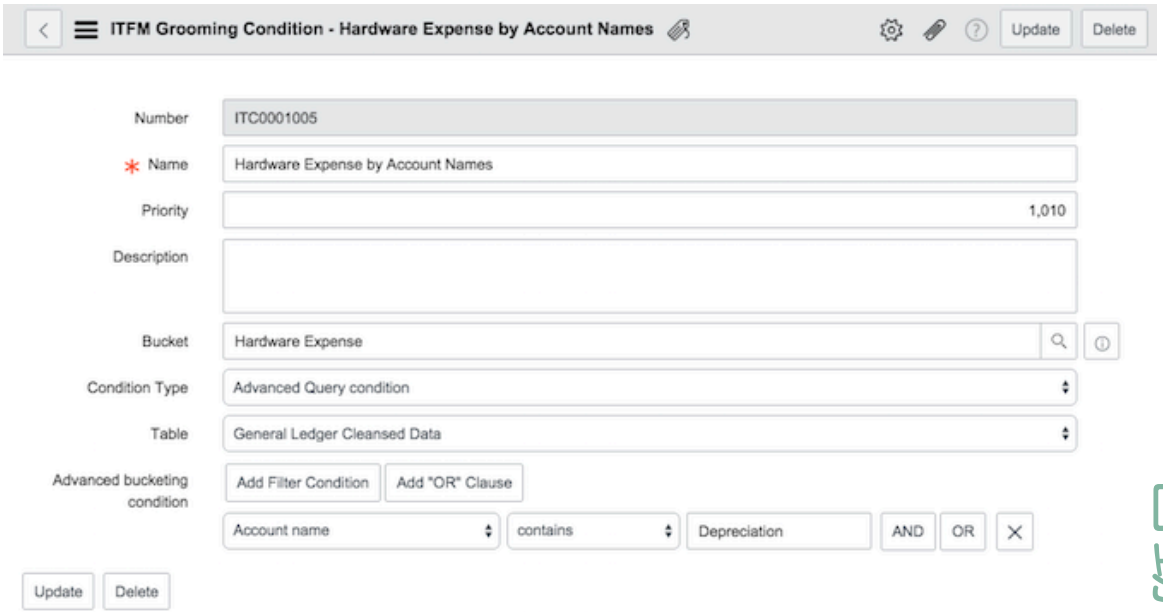

調整条件の例

フィールド	説明
番号	バケットの識別番号が自動生成されます。
名前	バケットのわかりやすい名前。
優先度	バケットを識別するためにシステムが使用するバケットのコード。任意の英数字コードを入力します。バケットコードを重複させることはできません。
説明	バケットが割り当てに使用されていない場合。
バケット	このバケットを親として使用するバケット。サブバケットを作成するには、[新規] をクリックし、フォームのフィールドに入力します。フィールドは、[親バケット] フィールドが表示される点を除いて、バケットフォームと同じです。
条件タイプ	調整条件のタイプ。[詳細クエリ条件] を選択します。
テーブル	バケットに入れるときにフィルタリングされる経費を含むテーブル。レコードが総勘定元帳クレンジング済みデータ [itfm_gl_data_cleansed] テーブルにあるかどうか。テーブルは変更しないでください。
詳細バケット化条件	詳細クエリ条件を満たす必要がある財務データを決定する条件。条件ビルダーを使用してフィルターを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

経費割り当て - 従来

経費割り当てとは、セグメントの階層内のアカウントに経費を割り当てることです。

総勘定元帳の調整済み経費にルールを適用することで、経費を割り当てることができます。ルールのメソッドとメトリクスは、経費の割り当て方法を指定します。ルール、メソッド、およびメトリクスの仕組みの詳細については、「割り当て」を参照してください。

復帰と再割り当て

総勘定元帳の調整済み経費が割り当てられた後は、元の割り当てを元に戻さない限り、再度割り当てることはできません。割り当てルール、メソッド、またはメトリクスが変更され、その変更に従って総勘定元帳経費を再割り当てする必要がある場合は、割り当てを元に戻す必要があります。さらに、セグメントの階層を変更する場合は、最初にすべての経費を元に戻す必要があります。

割り当て明細の表示

割り当てが完了したら、アプリケーションが作成した割り当て明細を表示できます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin


手順

1. 次のいずれかの方法で、変更する割り当て明細を開きます。
   - 割り当てを作成した総勘定元帳を介して割り当てにアクセスするには、次の手順を実行します。
     a. 移動先 ファイナンシャルモデリング > 総勘定元帳 > 調整済み経費.
     b. 探している割り当てを生成した経費を開きます。
     c. [コスト割り当て] 関連リストで、割り当て番号をクリックします。
   - すべての割り当てのリストから割り当てにアクセスするには、次の手順を実行します。
     a. 移動先 財務 > コストモデル > 割り当て明細.
     b. 割り当て番号をクリックします。
2. フォームの編集可能なフィールドのいずれかを確認または変更します (テーブルを参照)。
3. [更新] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

割り当て明細の例

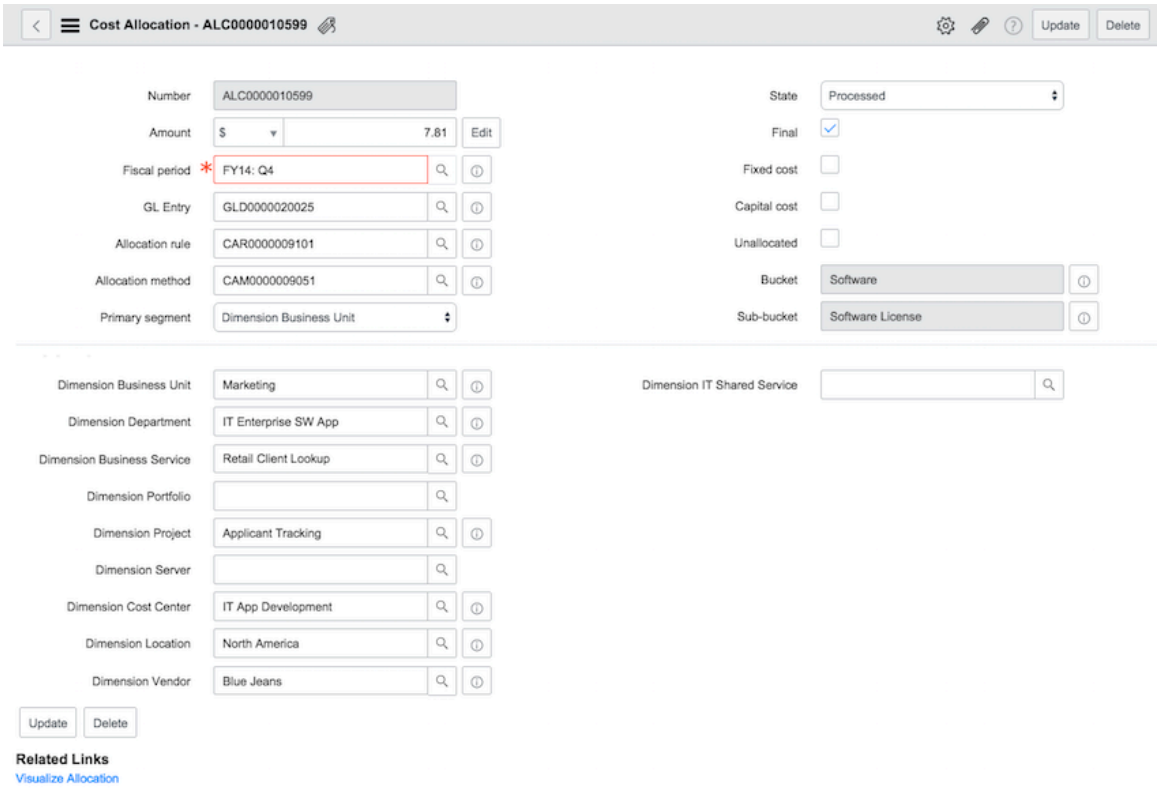

[コスト割り当て] フォームフィールド

フィールド	説明
総計	割り当ての額。
会計期間	この経費が属する会計期間会計期間。
GL エントリ	この割り当て明細の派生元である調整済み経費。
最終	最終とマークされたルールによって割り当て明細が処理された場合、または後続のルールがこの割り当てを処理できない場合。レポートは最終割り当て明細で実行されます。
バケット	割り当てが属するバケット。このバケットは、割り当て時に経費から取得されます。
サブバケット	割り当てが属するサブバケット。このサブバケットも、割り当て時に経費から取得されます。
[ディメンション]	セグメントの階層内のセグメント。値を含むセグメントフィールドは、割り当てを処理した割り当て方法で指定したセグメントです。複数のメソッドが割り当てを処理する場合、すべてのメソッドで指定されたすべての割り当て済みセグメントに値が含まれます。変更するには、各ディメンションの次にあるルックアップアイコンをクリックし、関連するレコードを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ファイナンシャルマネジメント割り当て例 - 従来

ファイナンシャルマネジメントアプリケーションで利用可能なデモデータには、割り当てルール、メソッド、およびメトリクスをモデル化するために使用できるコスト割り当ての例が示されています。

サーバーの数で割り当て


この重み付けされた配分評価指標は、サーバーコストに基づいてサーバーに割り当てます。

- メトリクス名：サーバーごとのサーバーコスト
- タイプ：重み付け

次のフィールド値に注意してください。

- [重み付けテーブル] は、CMDB のサーバーテーブルです。
- [割り当て先への参照] は、割り当て先の重み付けテーブルのフィールドです。この場合は、sys_id で識別される個々のサーバーに割り当てます。
- [集計] は、重み付けテーブルの [集計数 **(Aggregate count)]** フィールドの値を取得します。この場合は [コスト]です。
- [集計数 **(Aggregate count)]** は各サーバーのコストであり、サーバーレコードで識別されます。

サーバーごとのコスト割り当てを重み付けするメトリクス

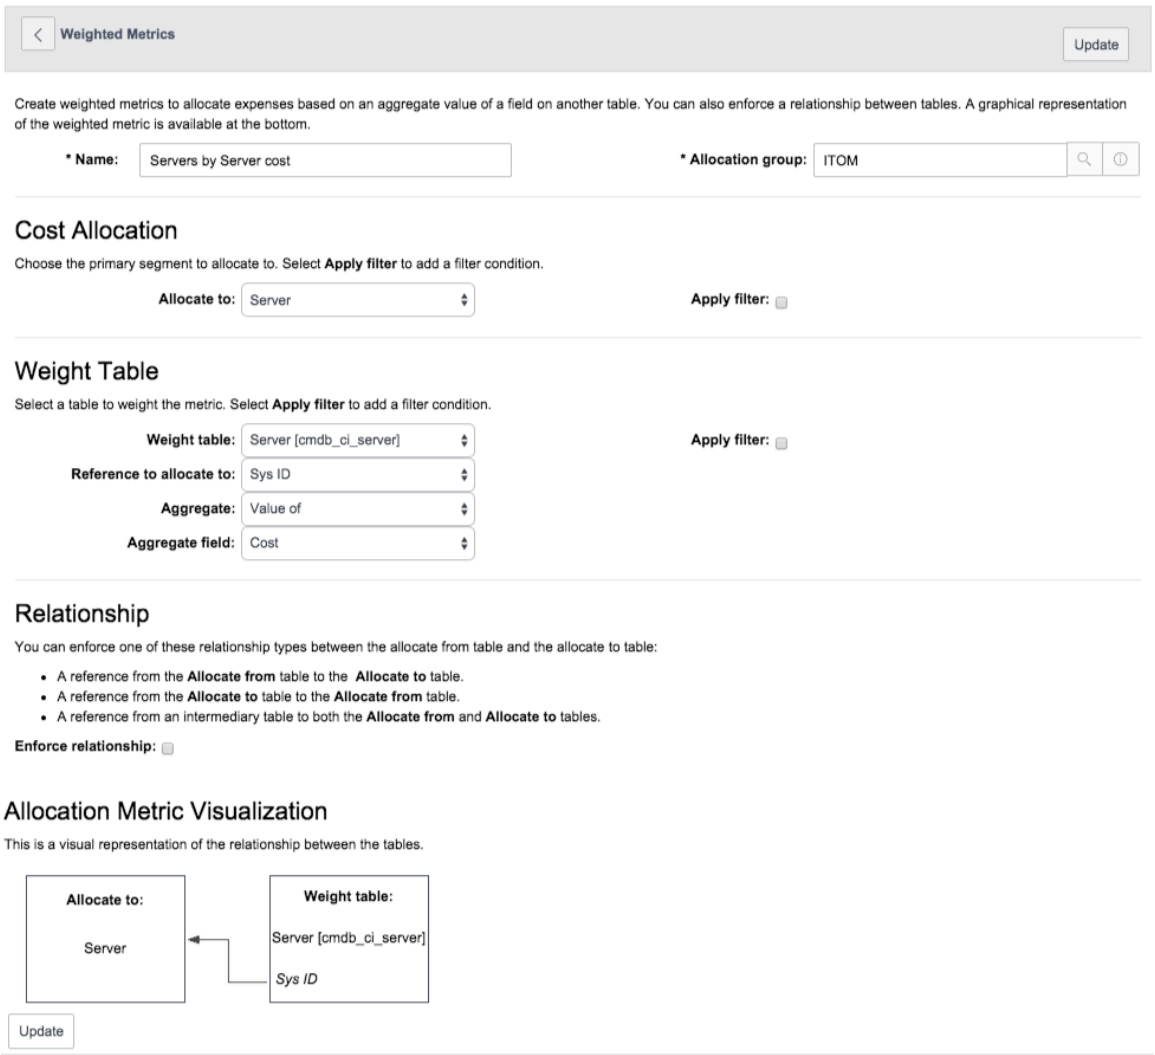

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メトリクスの重み付けマップ - 従来

重み付けマップは、com.glide.fiscal_calendar.fiscal_unit プロパティで設定されたすべての会計単位のメトリクスごとに生成されます。

重み付けマップは、メトリクスにアカウントを割り当てるための重み付けされた分割を保持する JSON です。重み付けされたメトリクスに基づく割り当てまたはロールアップは、特定の会計期間に対して正しい重み付けマップが生成された場合にのみ機能します。

重み付けされたメトリクスビルダーフォームの [重み付けマップをプレビュー] (アプリケーションナビゲーターからも利用可能) は、特定の会計期間のアカウント間で重み付けがどのように分割されるかを示します。重み付けマッププレビューリストビューには、重み付けの総数と、重み付けマップが最後に生成された日時が表示されます。現在の重み付けマップが正しくないか生成されていない場合は、各アカウントブレークダウンの分割パーセンテージを表示し、[重み付けマップをプレビュー] ユーザーインターフェイスで重み付けマップを生成または再生成することもできます。


会計期間に対して事前に生成された重み付けマップは、割り当てページがまだロード処理中である間に、重み付けマップが自発的に生成されないように、割り当てワークベンチのパフォーマンスにも役立ちます。

次に、メトリクスを使用する場合の重み付けマップとパーセンテージ割り当てを理解するための例を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重み付けマップとパーセンテージ割り当ての例

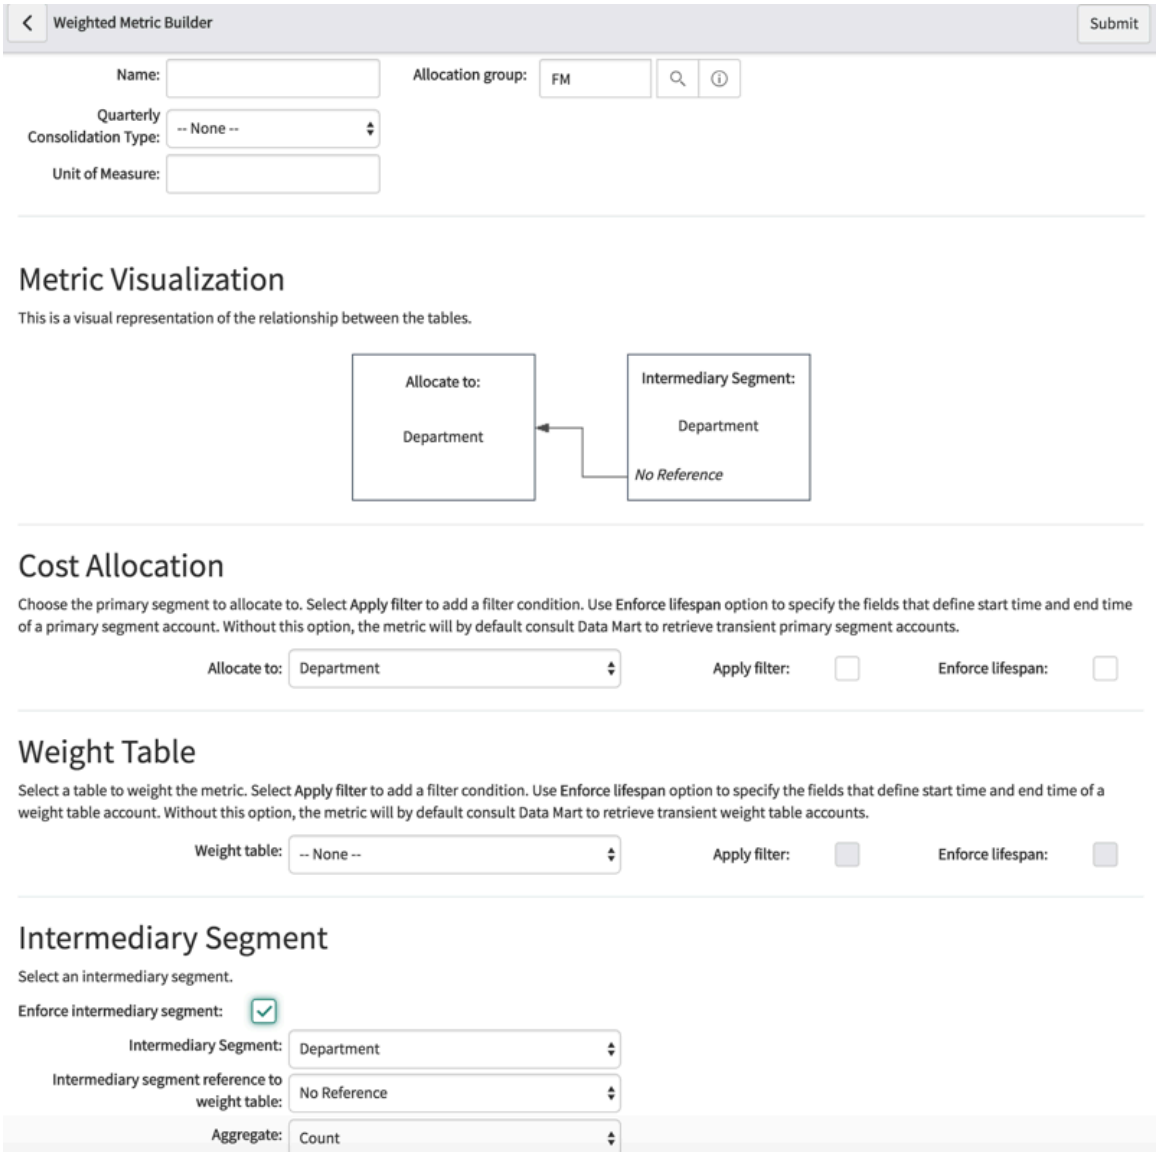

コスト分析を使用して金額の割り当てを表示する - 従来

会計期間の特定のコストモデルのコスト分析を使用し、割り当てワークベンチと同様の UI を使用してコストラインを表示します。コスト分析は、割り当てエンジンによって生成されたコストラインに基づいて、バケット金額、アカウントに割り当てられた金額、およびセグメントとアカウント全体のロールアップ金額を表示するのに役立ちます。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

このタスクについて
コスト分析は純粋にコスト割り当て明細に基づいているため、前の会計期間に行われた割り当てを、現在のコストモデルに定義された割り当てまたはロールアップルールに干渉することなく表示できます。

コスト分析は、割り当てられたコストを表示するために使用できる効果的なショーバックレポートツールです。割り当てエンジンを実行した後、アナリストはコスト分析を使用して、割り当てルールによって予想される金額が割り当てられているかどうかを検証できます。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

移動先 ファイナンシャルモデリング > ワークベンチ.

に移動することもできます ファイナンシャルモデリング > コスト分析.

[コストライン分析] ページ

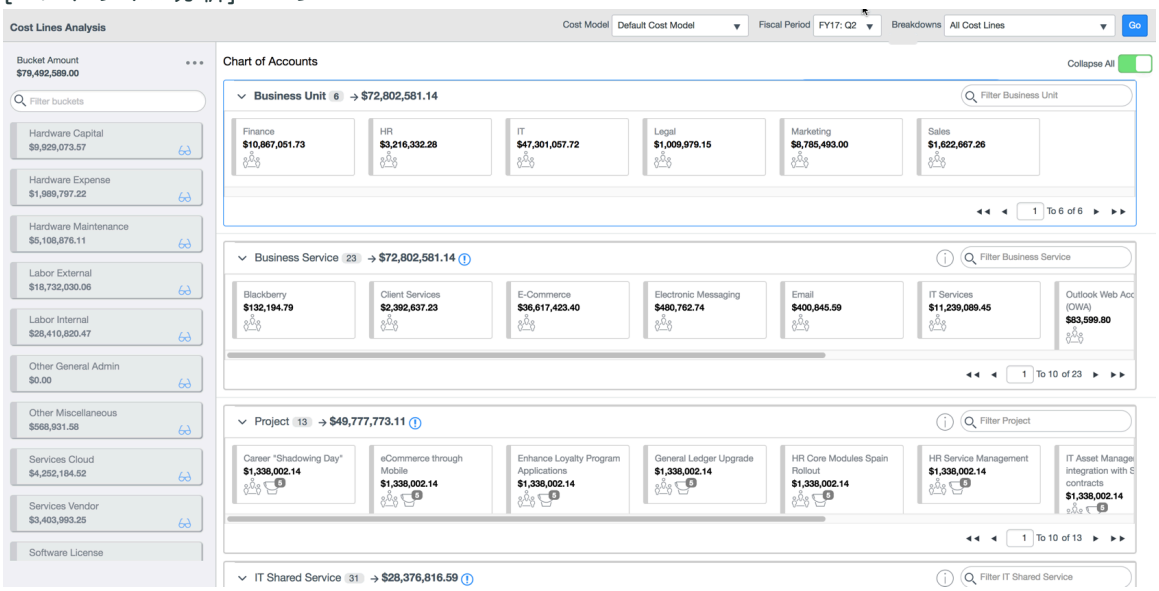

[コストライン分析] ページには、次の主要な機能があります。

- 生成されたコストラインに基づくバケット、アカウント、およびそれらの金額。
- アカウントに割り当てられた統合バケット金額。
- そのセグメント内のすべてのアカウントのセグメントレベルの統合金額。
- バケットアイコン ( ) とリレーションシップアイコン ( ) は、[ワークベンチ] ページと同じように機能しますが、生成されたコストラインに基づいて機能します。
- アカウントとバケットの割り当てビューアー ( ) は、金額がどのようにロールアップされたかを示します。
- セグメントあたりの合計アカウント数のうち、5、10、15、25、または 50 個のアカウントをページに表示するように構成します。[構成] タブで設定したページネーションオプションは、[コストライン分析] ページでセグメントの選択したアカウント数を表示します。左右の矢印を使用すると、セグメント内のすべてのアカウントが表示されるまで、次のレコードセットに移動できます。

割り当て指標 - 従来

配分評価指標には、アプリケーションが重み付け計算またはスクリプトに基づいて経費を割り当てるために使用する追加の指示が含まれています。割り当て方法は、メトリクスを使用して割り当てを実行します。

利用可能なメトリクスのタイプは次のとおりです。

- [重み付けされたメトリクス] は、セグメントの集計値に基づく計算です。重み付けされたメトリクスを使用して、セグメントで使用されるサーバーの数や資産の減価償却額など、インスタンス内の他のレコードに基づいてセグメントに割り当てられる経費の額に影響を与えます。経理アドミンロールを持つユーザーは、重み付けされたメトリクスを作成できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [スクリプト化され重み付けされたメトリクス] は、スクリプト形式の重み付けされたメトリクスです。
- スクリプト化された方法は、割り当て方法 API を使用するカスタマイズ可能なスクリプトに基づく計算です。これらのメトリクスは、以前はスクリプト化済みメトリクスと呼ばれていました。
- [システムメトリクス] は、ワークベンチを使用するときにアプリケーションによって自動的に作成されるメトリクスです。これらのメトリクスは読み取り専用であり、経理アドミンロールを持つユーザーがアクセスできます。詳細については、「ワークベンチの使用」トピックを参照してください。

注:
ワークベンチを使用して経費をアカウントとセグメントに割り当てると、すべてのルール、メソッド、および条件が自動的に作成されます。割り当てを設定するには、リストやフォームを使用するのではなく、ワークベンチを使用することをお勧めします。

Geneva リリース以降、会計期間がメトリクスでサポートされています。

会計期間の表示、変更、検証 - 従来

会計カレンダーを生成した後、会計期間レコードを表示し、開始日と終了日を変更し、必要に応じて会計期間を非アクティブ化し、検証することができます。

始める前に
必要なロール：fiscal_calendar_user

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > 会計期間.
2. いずれかの会計期間を開いて (フィールドの説明については表を参照)、表示、変更、または非アクティブ化します。

[会計期間] フォーム

フィールド	説明
名前	会計期間の名前。
開始日時	会計期間の開始日。
終了日時	会計期間の終了日。
会計タイプ	[読み取り専用] 期間のタイプ。[年] または [四半期] のいずれかです。

3. 会計期間を検証して、ギャップがなく、有効なカレンダーのスタイルと一致していることを確認します。
   a. 検証するには、会計期間のリストビューに戻り、[検証期間] をクリックします。

重み付けされた配分メトリクスの作成 - 従来

拡張フォームまたは標準フォームを使用して、重み付けされたメトリクスを作成できます。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin

このタスクについて
拡張フォームは、メトリクスのさまざまなコンポーネント間の関係を理解するのに役立つ視覚化を提供します。デフォルトで開く拡張フォームを使用します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > 消費メトリクス > 重み付けされたメトリクスの作成.
2. フォームで、フィールドに入力します。

   重み付けされた割り当てのグラフ表示が [評価指標の表示方法] セクションに表示されます。フォームに変更を加えると、グラフィックが動的に更新されます。

重み付けされたメトリクスビルダー

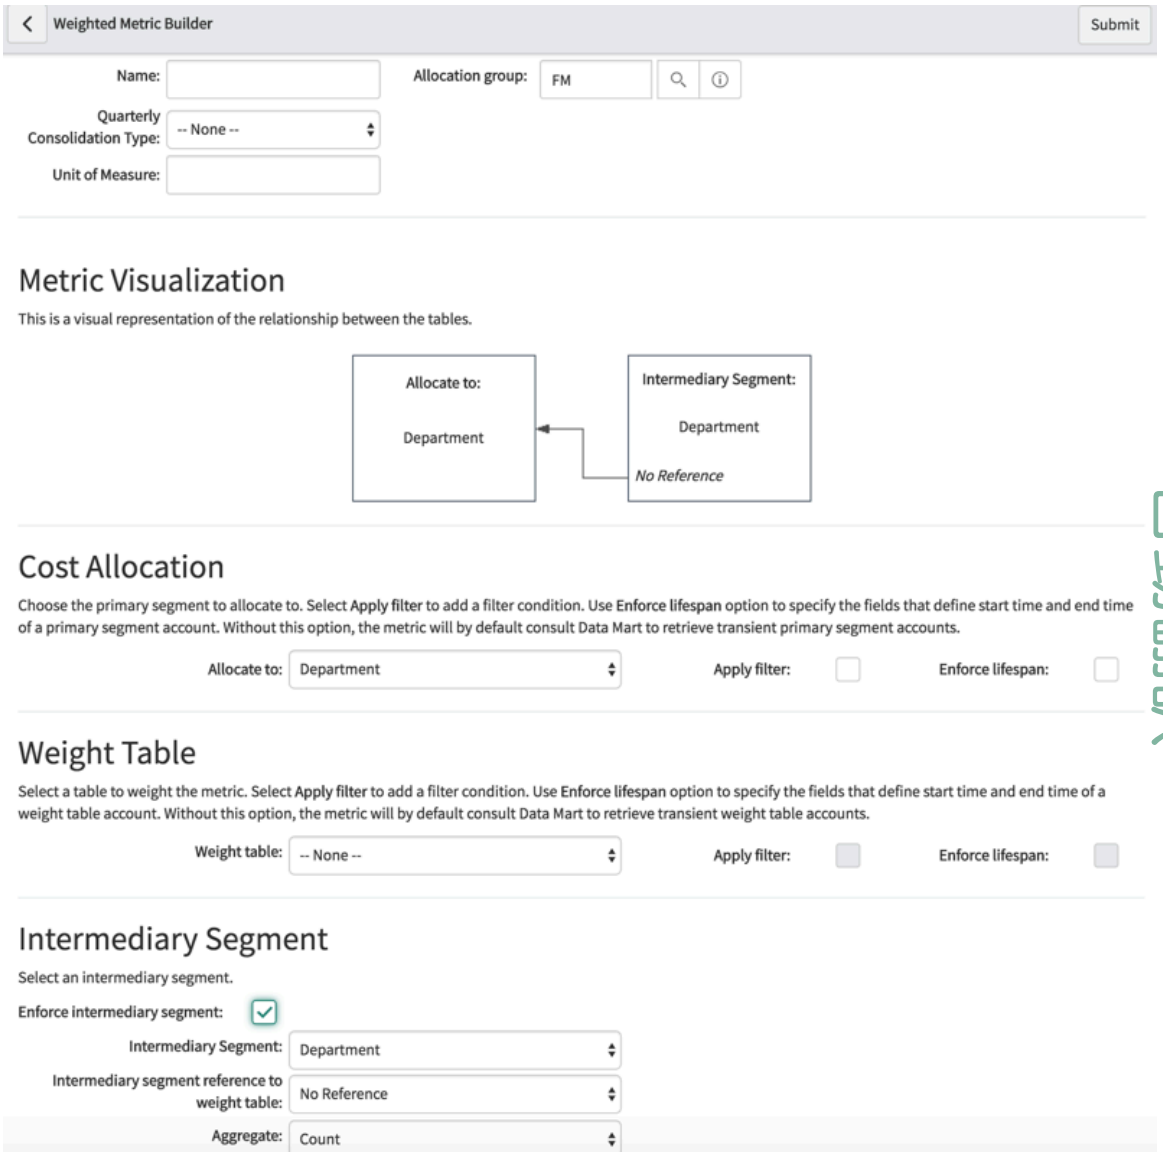

[重み付けされたメトリクス] フォーム

フィールド	説明
名前	メトリクスのわかりやすい名前。
割り当てグループ	このメトリクスに関連付けられたグループ。デフォルトのグループは ITSM です。
システムのメトリクス	アプリケーションによってワークベンチで作成されたメトリクス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
リフレッシュ頻度	データが更新される頻度。

[重み付けされたメトリクス] フォームの [コスト割り当て] セクション

フィールド	説明
割り当て先	割り当てが処理される階層内のセグメント。 関連するテーブルのフィールドにアクセスでき、ドットで区切られたフィールド名のチェーンへの参照は任意の数まで続けることができます。
フィルターの適用 (コスト割り当て)	条件ビルダーを表示するには、チェックボックスをオンにします。このメトリクスを適用するには、選択した [割り当て先] セグメントフィールドを満たす必要がある基準を指定します。 条件の最初の部分に使用できるフィールドは、[割り当て先] に選択したテーブルによって異なります。条件ビルダーはドット連結をサポートしているため、別のテーブルのフィールドを選択できます。

重み付けされたメトリクスフォームの [重み付けテーブル] セクション

フィールド	説明
重量テーブル	集計に基づいて割り当て金額を重み付けするために使用されるテーブル。
割り当て元への参照	[割り当て元] セグメントを参照する重み付けテーブルのフィールド。このフィールドは、[関係を強制] チェックボックスがオンの場合に利用可能です。 関連するテーブルのフィールドにアクセスでき、ドットで区切られたフィールド名のチェーンへの参照は任意の数まで続けることができます。
割り当て先への参照	[割り当て先] セグメントを参照する重み付けテーブルのフィールド。 関連するテーブルのフィールドにアクセスでき、ドットで区切られたフィールド名のチェーンへの参照は任意の数まで続けることができます。
集計	重み付けテーブルのレコードに対して実行する集計のタイプ。次のオプションのいずれかを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ カウント：重み付け条件を満たすレコードの数を重み付けテーブルでカウントします。 ○ 値：選択したフィールドの値。 ○ 合計：選択したフィールドのテーブルの値の合計。 ○ 平均：選択したフィールドのテーブルの値の平均。 ○ 最小：選択したフィールドのテーブルの値の最小値。 ○ 最大：選択したフィールドのテーブルの値の最大値。
集計フィールド	集計計算に使用される重み付けテーブルのフィールド。このフィールドは、 [カウント] 以外の集計が選択されている場合に使用できます。
フィルターを適用 (重み付けテーブル)	条件ビルダーを表示するには、チェックボックスをオンにします。アプリケーションが重み付けテーブルを使用して経費を割り当てる前に、この条件を満たす必要がある場合。

重み付けされたメトリクスフォームの [中間セグメント] セクション

フィールド	説明
中間セグメントを強制	中間セグメントを強制するオプション。
中間セグメント	コストモデル階層に含まれていない中間セグメントとして識別されるセグメント。
重み付けテーブルへの中間セグメント参照	中間セグメントと、重み付けテーブルで定義および参照される [割り当て先] セグメントとの関係。
集計	重み付けテーブルのレコードに対して実行される集計のタイプ。

重み付けされたメトリクスフォームの [関係] セクション

フィールド	説明
関係を強制	別のセグメントとの既存の関係に基づいて、このメトリクスが割り当てるセグメントを制限します。
割り当て元	割り当てが処理される元のテーブル。このフィールドは、[関係を強制] チェックボックスがオンの場合に利用可能です。 関連するテーブルのフィールドにアクセスでき、ドットで区切られたフィールド名のチェーンへの参照は任意の数まで続けることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
関係タイプ	[割り当て元] テーブルと [割り当て先] テーブルの間の関係のタイプ。 ○ 割り当て元：[割り当て元] テーブルから [割り当て先] テーブルへの参照。 ○ 割り当て先：[割り当て先] テーブルから [割り当て元] テーブルへの参照。 ○ 中間：[割り当て元] テーブルと [割り当て先] テーブルの両方への中間テーブルからの参照。
以下からの関係フィールド	割り当て元テーブルの [割り当て元] テーブルのフィールド。このフィールドは、[関係を強制] チェックボックスと [割り当て元] 関係タイプが選択されている場合に利用可能です。
以下への関係フィールド	割り当て元テーブルの [割り当て先] テーブルのフィールド。このフィールドは、[関係を強制] チェックボックスと [割り当て先] 関係タイプが選択されている場合に利用可能です。
フィルターを適用 (関係)	アプリケーションが次のいずれかのアクションを実行する前に、以下の条件を満たす必要があります。 ○ [割り当て元] 関係タイプを選択した場合は、[割り当て元] テーブルを使用して経費を割り当てます ○ [中間] 関係タイプを選択した場合は、[中間] テーブルを使用して経費を割り当てます 次に、このチェックボックスを選択して、条件ビルダーを表示します。
中間テーブル	[割り当て元] テーブルと [割り当て先] テーブルの間で接続するために使用されるテーブル。このフィールドは、[関係を強制] チェックボックスと [中間] 関係タイプが選択されている場合に利用可能です。
以下からの中間テーブルフィールド	[割り当て元] テーブルにマッピングする中間テーブルのフィールド。このフィールドは、[関係を強制] チェックボックスと [中間] 関係タイプが選択されている場合に利用可能です。 関連するテーブルのフィールドにアクセスでき、ドットで区切られたフィールド名のチェーンへの参照は任意の数まで続けることができます。
以下への中間テーブルフィールド	[割り当て先] テーブルにマッピングする中間テーブルのフィールド。このフィールドは、[関係を強制] チェックボックスと [中間] 関係タイプが選択されている場合に利用可能です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	関連するテーブルのフィールドにアクセスでき、ドットで区切られたフィールド名のチェーンへの参照は任意の数まで続けることができます。
テーブル条件フィルターから割り当て	このメトリクスを適用するのに、[割り当て元] テーブルのレコードが満たす必要がある基準。これらのフィールドは、[関係を強制] チェックボックス、[割り当て元] 関係タイプ、および [フィルターを適用] チェックボックスが選択されている場合に利用可能です。
中間テーブル条件のフィルター	このメトリクスを適用するのに、[中間] テーブルのレコードが満たす必要がある基準。このフィールドは、[関係を強制] チェックボックス、[中間] 関係タイプ、および [フィルターを適用] チェックボックスが選択されている場合に利用可能です。
重み付けマップをプレビュー	選択したメトリクスと会計期間の重み付けマップが生成されます。プレビューには、重み付けの総数と最後に生成された日時を含む重み付けマッププレビューが表示されます。
会計期間選択リスト	会計カレンダーからの会計期間。
セグメント選択リスト	ロールアップセグメントのアカウント。

重み付けされたメトリクスフォームの [重み付け合計テーブル] セクション

フィールド	説明
重み付け合計テーブルからの割り当てを強制	重み付け合計テーブルからの割り当てを強制を有効にするチェックボックス。
重み付け合計テーブル	実際の消費値を取得するテーブル。

重み付けされたメトリクスフォームの [関連リンク] セクション

フィールド	説明
標準フォームを表示	詳細フォームと標準フォームを切り替えます。

重み付けされたメトリクスフォームの [関連リスト] セクション

フィールド	説明
コスト割り当て方法	このルールが経費を分類するために使用する割り当て方法。
コスト割り当て	このルールによって作成された割り当て明細。

注:
ロックされた割り当て明細によって参照されているルールは削除できません。

[重み付け合計からの割り当てを強制] は、キャパシティに基づく配分評価指標です。IT ファイナンスアナリストは、サービスの総キャパシティが消費されたものの合計よりも大きいコストを割り

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

当てることもできます。このオプションを有効にするには、[重み付け合計テーブル] セクションの [重み付け合計からの割り当てを強制] チェックボックスを選択する必要があります。総消費量テーブルを選択し、総消費キャパシティに基づいてメトリクスの重み付け合計を計算します。重み付けされたメトリクスは、利用可能な消費単位の合計数に基づいてコストを割り当てます。

> **注:**
> 割り当て関係を強制するか、重み付け合計から割り当てを強制することができます。割り当て合計が消費された値の合計より大きい場合は、合計の重み付けを強制します。一方、強制割り当て関係は、重み付けテーブル内の (すべての個々のエンティティの) すべての消費値の合計が合計キャパシティ 100% になると機能します。詳細については、「重み付けされたメトリクスを使用した割り当ての重み付け合計サポート」を参照してください。

[中間セグメント] オプション：このオプションは、多数のアカウントを持つセグメントが多数の割り当て明細に追加される場合に使用します。この場合も中間セグメントは、適切な割り当てのためにロールアップする量として考慮されます。ただし、中間として識別されたセグメントはコストモデルの階層に含まれず、その割り当て明細は生成されません。

セグメントを中間セグメントとして識別するオプションは、複数のコストラインの生成でセグメントを除外することだけです。ただし、正確な金額ロールアップのためにセグメントを含めるには、中間セグメントと [割り当て先] セグメントの関係に基づいてメトリクスを作成する必要があります。関係に基づいて割り当てエンジンが重み付けを作成し、重み付けに基づいて中間セグメントの割り当て明細が生成されます。

重み付けテーブルで参照される中間セグメントの重み付けを処理するコスト配分評価指標を作成する必要があります。2 セットの重みマップが生成されます。1 つは中間セグメント用で、もう 1 つは割り当て先セグメント用です。

3. [送信] をクリックします。

次のタスク
作成した重み付けマップをプレビューするには、[重み付けマップをプレビュー] ボタンをクリックします。

重み付けマップのプレビュー - 従来

重み付けマップ をプレビューして、生成されたメトリクス重み付けマップを表示することができます。これは、選択したメトリクスと選択した会計期間のアカウントが、アカウントごとに分割されたパーセンテージで表示されるためです。

始める前に
必要なロール：cost_transparency_admin または cost_transparency_analyst

このタスクについて
割り当てワークベンチでは、割り当てを実行すると、すべての月、四半期、または期間の経費概要が表示され、ウィンドウがすべての四半期のデータで乱雑になります。UI ページの乱雑さを解消するために、独自のページで重み付けマップをプレビューできます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > 消費メトリクス > 重み付けマップのプレビュー.
   a. または、 ファイナンシャルモデリング > 消費メトリクス > すべてのメトリクス.
   b. コスト配分評価指標をクリックして、重み付けされたメトリクスビルダーを開きます。
   c. [重み付けマップのプレビュー] をクリックします。
2. 左ペインの [メトリクス] リストからメトリクスを選択します。
3. [会計期間] リストから会計期間を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [生成] をクリックします。
   右側のペインには、生成された日付と時刻の詳細、アカウント、それぞれの重み付け、合計の重み付け、および分割パーセンテージが表示されます。重み付けマップを再生成して、会計期間の毎月または四半期ごとに をプレビューすることができます。
5. 選択したメトリクスに基づいて [生成] または [すべて生成] をクリックします。

   - [生成] をクリックして、セグメントのアカウントを階層の上のセグメントにロールアップします。選択したメトリクスに基づいて、ロールアップされたセグメントのアカウント間で金額が分割されます。

   - [すべて生成] ボタンは、階層の上のセグメントの 1 つ以上のアカウントに対するメトリクス定義の [関係を強制] オプションを使用して、セグメント内のすべてのアカウントのロールアップを個別に定義するメトリクスを選択した場合に有効になります。

スクリプト化された配分評価指標の作成 - 従来

標準のコスト配分評価指標フォームを使用して、スクリプト化済みメトリクスとメソッドを作成できます。

始める前に

必要なロール：cost_transparency_admin


このタスクについて

スクリプト化されたフォームとスクリプト化された方法で重み付けされたメトリクスを作成できます。詳細については、「割り当て指標 - 従来」を参照して下さい。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルモデリング > 消費メトリクス > スクリプト化され重み付けされたメトリクスの作成.
2. **[New]** をクリックします。
3. [タイプ] フィールドで [スクリプト化され重み付けされたメトリクス] または [スクリプト化された方法 **(Scripted method)]** を選択します。
4. フォームのフィールドに適宜入力します (テーブルを参照)。
5. [送信] をクリックします。

スクリプト化済みメトリクスの例

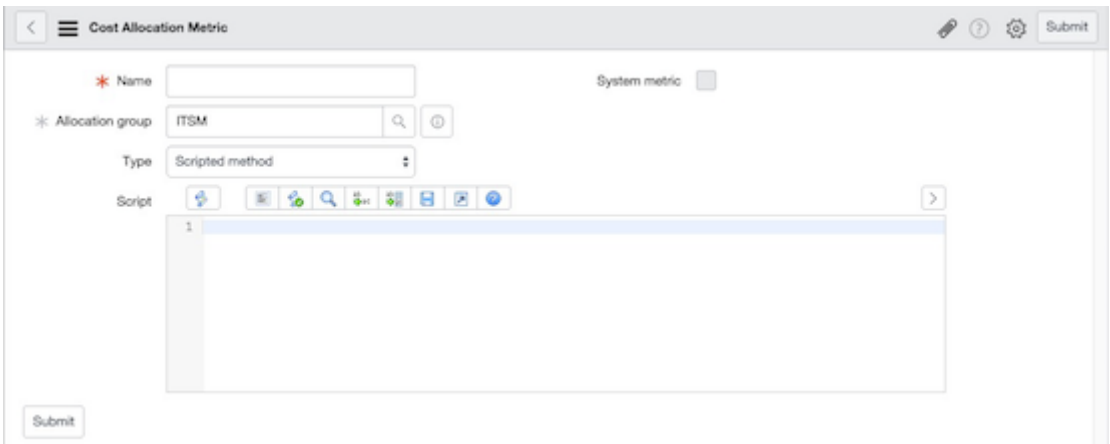

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[スクリプト化済みメトリクス] フォームのフィールド

フィールド	説明
名前	メトリクスのわかりやすい名前。
割り当てグループ	このメトリクスに関連付けられたグループ。[コスト割り当て方法] フォームでグループを選択すると、メトリクスの選択がグループを使用するメトリクスのみに制限されます。
システムのメトリクス	このメトリクスがアプリケーションによってワークベンチで作成された場合。
タイプ	スクリプトのタイプ。[スクリプト化された方法] または [スクリプト化済み重み付けメトリクス] を選択して、[スクリプト] フィールドを表示します。
スクリプト	割り当てを計算するスクリプト。

スクリプト化済みメトリクスフォームの [関連リスト] セクション

フィールド	説明
コスト割り当て方法	メトリクスを使用するメソッド。関連リストにメソッドを追加するか、メソッドフォームに移動して作成したメトリクスを選択することができます。

注:
ロックされた割り当て明細によって参照されているルールは削除できません。

ファイナンスチャージ - 従来

ファイナンスチャージはファイナンシャルマネジメントに欠かせない要素であり、事業部門長、部門長、アカウント責任者など、サービスを利用する組織内のさまざまなステークホルダーにビジネスサービスの財務面をレポートするのに役立ちます。

注:
この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

ServiceNow のファイナンスチャージの詳細については、この 4 分間のビデオをご覧ください。 このビデオでは、ファイナンスチャージ、ファイナンスチャージプロセスに関与するユーザー、ショーバックステートメント、およびファイナンシャルモデリングについて説明します。

ビジネスサービスは、組織内または組織にサービスを提供するように構成されている、相互接続された一連のアプリケーションとホストです。組織内で利用されたビジネスサービスと製品を追跡し、サービスのコストをショーバックステートメントとして表示します。ショーバックステートメントは、事業部門長にレポートするために、消費したサービスをコストの観点から報告します。

ショーバックステートメントは、消費の可視化を提供し、提供されるサービスの自動化を改善します。これらのステートメントは、サービスを処理するサービスオーナーが消費データを表示し、予算を作成する際にも役立ちます。

ショーバックステートメントは、サービス消費の詳細とサービスのコストのレコードであるステートメントアイテムを通じて消費されたサービスを報告します。これらのレコードの詳細はステートメントアイテムとして記述され、次のようなさまざまなソースから取得されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 消費テーブル：コストと消費ボリュームは、消費データを含む任意のプラットフォームテーブルから取得できます。
- コストモデル：コストデータのソースは、ファイナンスモデリングアプリケーションからのコスト割り当て明細です。
- サービスカタログ：コストと消費量は、特定のサービスカタログカテゴリまたはカタログアイテムに対して実行されたカタログ要求に基づくことができます。

次に行うこと

ユーザーにロールを割り当てます。ショーバック機能を使用するようにファイナンスチャージアプリケーションをセットアップします。

ファイナンスチャージアプリケーションのセットアップ - 従来

ファイナンスチャージアプリケーションには、ビジネスサービスのショーバック機能を使用する前にセットアップする必要があるコンポーネントがいくつかあります。

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

次に行うこと

最初のステップとして、サービスを定義する必要があります。提供するサービスとサービスの使用率に基づいて、サービスを使用した事業部門のレポートとして会計期間のショーバックステートメントが生成されます。

使用されているビジネスサービスと使用されているリソースをコストの観点から測定するために、ショーバックステートメントはステートメントアイテムを使用します。ステートメントアイテムは、コストの詳細を取得する必要があるソースをキャプチャします。ステートメントアイテムのタイプを決定します。これにより、コストデータの取得元のソースが決定されます。

ステートメントアイテムタイプの決定

ステートメントアイテムを作成する最初のステップとして、ステートメントアイテムのタイプを決定します。または、消費または使用の詳細と消費コストデータを取得するソースを決定する必要があります。

始める前に

必要なロール：service_charging_analyst

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

このタスクについて

消費ステートメントアイテム

消費ステートメントアイテムのコストは、消費データを含む任意のプラットフォームテーブルから会計期間ごとに生成されます。コスト情報は、同じテーブルから取得することも、レートカードから適用することもできます。

コストモデルステートメントアイテム

コストモデルステートメントアイテムは、ファイナンシャルモデリングアプリケーションから割り当てられた単位コストデータを取得します。

サービスカタログステートメントアイテム

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイテムのコスト、消費量、および消費の詳細は、サービスカタログの要求アイテム (sc_req_item) テーブルから取得できます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンスチャージ > アドミニストレーション > ステートメントアイテム.
2. ステートメントアイテムを作成するには、[新規] をクリックするか、[ステートメントアイテム] リストで編集する既存のステートメントアイテムの名前をクリックします。
3. 作成するステートメントアイテムのタイプを選択します。

次のタスク
消費データが利用可能なソースに応じて、ステートメントアイテムを定義します。

[ステートメントアイテムのタイプ] フォーム

フィールド	説明
消費ステートメントアイテム	消費ステートメントアイテムを作成するためのリンク。
コストモデルステートメントアイテム	コストモデルステートメントアイテムを作成するためのリンク。
サービスカタログステートメントアイテム	サービスカタログステートメントアイテムを作成するためのリンク。

消費ステートメントアイテムの定義

コストとビジネスサービス使用率の詳細が外部消費テーブルから調達されている場合は、ステートメントアイテムの消費テーブルの消費の詳細を調達できます。

始める前に
必要なロール：service_charging_analyst

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

このタスクについて
ビジネスサービス消費の詳細は、1 つまたは他のプラットフォームアプリケーションに属するテーブル、または外部消費テーブルから取得できます。その場合、消費の詳細をプラットフォームテーブルにロードできます。消費テーブルには、ビジネスサービスの日次または月次の消費の詳細が表示されます。サービスのコストは、使用状況に基づいて、会計期間の単位コストと消費数量を使用して計算されます。

たとえば、家庭用の電力消費量の月次料金請求書には、実行しているアプライアンスの詳細と、毎月および毎年計算される電力消費量 (ワット) が含まれています。単価と消費数量に基づいて、請求額が生成されます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンスチャージ > アドミニストレーション > ステートメントアイテム.
2. [ステートメント] リストで、[新規] をクリックします。
3. [ステートメントアイテムのタイプは？] クエリフォームで、[消費ステートメントアイテム] リンクをクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[消費ステートメントアイテム] フォーム

フィールド	説明
名前	消費ステートメントアイテムの名前。
消費テーブル	ステートメントアイテムとして設定された消費データを持つソーステーブル。
消費アイテム	消費テーブルで消費データが保持されるアイテム。
消費日	消費日の詳細がある消費テーブルの列。
有効	ステートメントアイテムをアクティブにするチェックボックス。
ビジネスサービス	ステートメントアイテムを構成済みアイテムとして使用するビジネスサービス。 サービスを定義する こともできます。
会計単位	会計単位は、消費データが生成される会計カレンダーに基づく月、四半期、または期間である必要があります。
集計	消費テーブルは、選択した集計関数に基づいて照会されます。
説明	ステートメントアイテムの簡単な説明
消費テーブルフィルター	条件を満たすアイテムを表示するためのフィルター。

[消費ステートメントアイテム] フォームの [金額] セクション

フィールド	説明
価格基準	価格を決定する基準を選択します。 ○ 金額は、消費テーブルの選択した [金額] フィールドからデータを取得します。 ○ レートカードクラスは、ステートメントアイテムに設定されている価格設定ポリシーに基づいています。 ○ 単価は、アイテムの単位あたりの原価です。
金額フィールド	[価格基準] が金額の場合、選択したフィールドから金額データが取得されます。
レートカードクラス	レートカードクラス。
消費テーブルレートカードマッピングフィールド	[価格基準] フィールドで [レートカードクラス] を選択した場合、金額は消費テーブルのレートカードをマッピングされるフィールドとレートカードアイテムをマッピングするフィールドに基づいて導出されます。
レートカードアイテムマッピングフィールド	[価格基準] フィールドで [レートカードクラス] を選択した場合、金額はレートカードアイテムマッピングフィールドと消費テーブルレート

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	カードマッピングフィールドに基づいて導出されます。

消費ステートメントアイテムフォームの [サービスの課金] セクション

フィールド	説明
サービスオーナー	ビジネスサービスを所有し、消費ステートメントアイテムを表示するユーザー。 サービスオーナーは、ショーバックアイテムを管理できます。単位コスト、消費量に基づくコスト回収を表示し、ショーバックアイテムの単価、割引、または追加料金を設定できます。
価格設定ポリシー	ステートメントアイテムの価格設定ポリシーを、ステートメントアイテムレベル、ステートメントアイテムブレークダウンレベル、またはアイテムレベルで設定します。 ステートメントアイテムレベルで価格設定ポリシーを設定した場合、サービスオーナーとして行う価格調整には、ステートメントアイテムレベルで調整された価格が反映されます。同様に、ステートメントアイテムのブレークダウンとアイテムレベルについては、価格調整がそれぞれのレベルで反映されます。
価格設定ポリシー手法	カタログアイテムの平均単位コストのパーセンテージに基づいて価格調整を設定します。または、アイテムの単価を設定して平均単位コストを上書きします。 **注:** 価格設定ポリシーがアイテムレベルの場合は、パーセンテージベースの価格設定ポリシー手法を選択できます。

5. [送信] をクリックします。
6. 消費ステートメントアイテムの課金ラインを生成するには、[課金ラインを生成] をクリックします。
   a. 課金ラインを生成するには、[課金ラインを生成] ダイアログボックスに会計期間を入力します。
   b. [**OK**] をクリックします。
7. 更新されたレコードを保存するには、[更新] をクリックします。
8. レコードを削除するには、[削除] をクリックします。

次のタスク
消費ステートメントアイテムのブレークダウンレコードを作成するには、[消費ブレークダウン] 関連リストで [新規] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

消費ブレークダウンの作成

消費ブレークダウンレコードを作成し、消費ステートメントアイテムを構成する経費ラインアカウントをレポートして、ショーバックレポートをより詳細にします。

始める前に
必要なロール：service_charging_analyst

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

このタスクについて
たとえば、ストレージサービスの請求書には、階層 I、階層 II、階層 III ストレージなどの個々のアイテムの消費量の詳細を記載できます。これらの各アイテムは、各アイテムの単位コストに基づいて計算された関連コストを提供します。

手順

1. 消費ステートメントアイテムのブレークダウンレコードを作成するには、[消費ブレークダウン] 関連リストで [新規] をクリックします。
2. フォームフィールドに記入します。

[消費ブレークダウン] フォーム

フィールド	説明
名前	消費ブレークダウンの名前。
テーブル	デフォルトは、データの取得元であるテーブルです。
条件	テーブルから条件を満たすデータをフィルタリングします。

3. [送信] をクリックしてレコードを保存します。

コストモデルステートメントアイテムの定義

アイテムまたはサービスのコストは、ファイナンシャルモデリングアプリケーションの割り当て明細から導出されます。ステートメントアイテムは、セグメントアカウント、セグメント内の特定のアカウント、またはアカウントのバケットからコストを取得し、会計期間のステートメントアイテムのコストを提供します。

始める前に
必要なロール：service_charging_analyst

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンスチャージ > アドミニストレーション > ステートメントアイテム.
2. [ステートメントアイテム] リストで、[新規] をクリックします。
3. [ステートメントアイテムのタイプは？] クエリフォームで、[コストモデルステートメントアイテム] リンクをクリックします。
4. フォームフィールドに記入します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[コストモデルステートメントアイテム] フォーム

フィールド	説明
名前	コストモデルステートメントアイテムの名前。
コストモデル	ステートメントアイテムのコストデータを取得するファイナンシャルモデリングアプリケーションで使用されるコストモデル。
単位コストメトリクス	重み付けされたメトリクスに基づいて単位コストを計算します。
セグメント	コストが報告されるセグメント。
有効	チェックボックスを有効にして、コストモデルステートメントアイテムをアクティブにします。
ビジネスサービス	ステートメントアイテムを構成済みアイテムとして使用するビジネスサービス。 サービスを定義する こともできます。
会計単位	会計単位を月、四半期、または期間として定義します。 デフォルトは、選択したコストモデルに基づいています。
トランザクションテーブル	セグメントが参照するトランザクションテーブルの名前。 選択したセグメントに基づくデフォルト。
説明	ステートメントアイテムの簡単な説明

コストモデルステートメントアイテムフォームの [フィルター基準] セクション

フィールド	説明
セグメントアカウントフィルター	条件を満たすセグメントアカウントについてレポートするフィルター条件。
バケットフィルター	セグメント内のアカウントに経費を割り当てるバケットへのフィルター条件。

コストモデルステートメントアイテムフォームの [サブセグメント] セクション

フィールド	説明
サブセグメント	選択したセグメントのセカンダリセグメント。 サブセグメントは、コストモデル階層で選択されたセグメントの下にあるセグメントです。
トランザクションテーブル	サブセグメントが参照するトランザクションテーブルの名前。 選択したサブセグメントに基づくデフォルト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
サブアカウントフィルター	条件を満たすセグメントアカウントについてレポートするフィルター条件。

コストモデルステートメントアイテムフォームの [サービスの課金] セクション

フィールド	説明
サービスオーナー	サービスを所有し、消費ステートメントアイテムを表示するユーザー。 サービスの課金オーナーは、ショーバックアイテムを管理できます。単位コスト、消費量に基づくコスト回収を表示し、ショーバックアイテムの単価、割引、または追加料金を設定できます。
価格設定ポリシー	価格設定ポリシーは、ステートメントアイテムに対して次のいずれかのレベルで設定できます。 ○ ステートメントアイテムレベル：コンソールで行う価格調整は、ステートメントアイテムレベルで反映されます。 ○ ステートメントアイテムのブレークダウンレベル：ステートメントアイテムのブレークダウンレベルで調整された価格を反映します。 ○ アカウントレベル：調整された価格は、アカウントレベルで経費ラインに反映されます。
価格設定ポリシー手法	セグメントアカウントの平均単位コストのパーセンテージに基づく価格調整。または、平均単位コストを単価価格設定ポリシー手法で上書きします。 **注:** 価格設定ポリシーがアカウントレベルの場合は、パーセンテージベースの価格設定ポリシー手法を選択できます。

5. [送信] をクリックします。
6. コストモデルステートメントアイテムの課金ラインを生成するには、[課金ラインを生成] をクリックします。

   a. 課金ラインを生成するには、[課金ラインを生成] ダイアログボックスに会計期間を入力します。

   b. [**OK**] をクリックします。

   ショーバック用に生成されたステートメントラインは、経費ラインの延長です。

7. 更新されたレコードを保存するには、[更新] をクリックします。
8. レコードを削除するには、[削除] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次のタスク
コストモデルステートメントアイテムのブレークダウンレコードを作成するには、[コストモデルブレークダウン] 関連リストで [新規] をクリックします。

コストモデルブレークダウンの作成

コストモデルステートメントアイテムのブレークダウンを作成し、コストモデルステートメントアイテムを構成するコンポーネントと、これらの各コンポーネントに関連付けられたコストをレポートすることで、より明確になります。

始める前に
必要なロール：service_charging_analyst

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

このタスクについて
たとえば、電子メッセージステートメントアイテムは、データネットワークやストレージなどのコンポーネントサービスのブレークダウンの詳細を提供できます。これらの各アイテムは、各アイテムの設定された単位コストによって計算された関連コストを提供します。

手順

1. 作成したコストモデルステートメントアイテムのブレークダウンレコードを作成するには、[コストモデルブレークダウン] 関連リストで [新規] をクリックします。
2. フォームのフィールドに入力します。

[コストモデルブレークダウン] フォーム

フィールド	説明
名前	コストモデルブレークダウンの名前。
ステートメントアイテム	ビジネスサービスの消費の詳細が表示されるヘッダー。
テーブル	セグメントが参照するトランザクションテーブルの名前。
単位コストメトリクス	単位コストの計算に使用される配分評価指標。
セグメントアカウントフィルター	セグメントアカウントのデータに適用されるフィルター。
バケットフィルター	セグメントアカウントに経費を割り当てるバケットに適用されるフィルター。
サブセグメント	サブセグメントとして追加されたセグメントで、サブセグメントのレコードに経費を割り当てます。
サブアカウントフィルター	条件を満たすアカウントのデータに適用されるフィルター。

3. [送信] をクリックします。

サービスカタログステートメントアイテムの定義

ビジネスサービスは、サービスカタログカテゴリまたはカタログアイテムで表すことができます。サービスカタログからのサービス要求が履行されると、サービスカタログアイテムに記載されているサービスの価格が、会計期間のステートメントアイテムのコストとして取得されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：service_charging_analyst

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンスチャージ > アドミニストレーション > ステートメントアイテム.
2. [**New**] をクリックします。
3. [サービスカタログステートメントアイテム] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。

[サービスカタログステートメントアイテム] フォーム

フィールド	説明
名前	サービスカタログステートメントアイテムの名前。
ビジネスサービス	ステートメントアイテムを構成済みアイテムとして使用するビジネスサービス。 サービスを作成 できます。
カタログ	ステートメントアイテムをレポートするカタログ。システム内のカタログのリストを表示します。
カテゴリ	消費の詳細をレポートするために使用される、選択したカテゴリのカタログアイテム。
カタログアイテム	消費が報告される、選択したカタログおよびカテゴリのカタログアイテム。
有効	サービスカタログステートメントアイテムをアクティブにするチェックボックス。
会計単位	会計単位は、ステートメントアイテムが生成される会計カレンダーに基づく月、四半期、または期間である必要があります。
説明	ステートメントアイテムの簡単な説明

[サービスカタログステートメントアイテム] フォームの [サービスの課金] セクション

フィールド	説明
サービスオーナー	ビジネスサービスを所有し、サービスカタログステートメントアイテムを表示するユーザー。 サービスオーナーは、ショーバックアイテムを管理し、単位コスト、消費量に基づくコスト回収を表示し、ショーバックアイテムの単価、割引、または追加料金を設定できます。
価格設定ポリシー	価格設定ポリシーは、ステートメントアイテムに対して次のいずれかのレベルで適用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ ステートメントアイテムレベル：調整された価格は、ステートメントアイテムレベルで反映されます。 ○ ステートメントアイテムのブレークダウンレベル：調整された価格は、ステートメントアイテムのブレークダウンレベルで反映されます。 ○ カタログアイテムレベル：調整された価格は、経費ラインの個々のカタログアイテムレベルで反映されます。
価格設定ポリシー手法	カタログアイテムの平均単位コストのパーセンテージに基づく価格調整。または、平均単位コストを単価価格設定ポリシー手法で上書きします。 **注:** 価格設定ポリシーがカタログアイテムレベルの場合は、パーセンテージベースの価格設定ポリシー手法を選択できます。

5. [送信] をクリックします。
6. サービスカタログステートメントアイテムの課金ラインを生成するには、[課金ラインを生成] をクリックします。

   a. 課金ラインを生成するには、会計期間を入力します。

   注:

   サービスカタログステートメントアイテムの課金ラインは、要求アイテムテーブルの事前設定されたオープン (システムプロパティ値は opened_at) 日付フィールドに基づいて生成されます。会計期間内の要求されたアイテムの日付は、課金ラインの生成に考慮されます。ただし、サービスの課金アナリストは、システムのプロパティ (com.snc.showback.catalog.consumed_date) の値を要求アイテム (sc_req_item) テーブルの任意の日付フィールドに設定できます。

   b. [**OK**] をクリックします。

7. 更新されたレコードを保存するには、[更新] をクリックします。
8. レコードを削除するには、[削除] をクリックします。

次のタスク
サービスカタログステートメントアイテムのブレークダウンレコードを作成するには、[サービスカタログブレークダウン] 関連リストで [新規] をクリックします。

サービスカタログブレークダウンの作成

ビジネスサービスのサービスカタログカテゴリをそのカタログアイテムコンポーネントに細分化して、より詳細なレベルにすることで、サービスカタログブレークダウンを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：service_charging_analyst

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

このタスクについて
たとえば、IT サービスの消耗品ステートメントアイテムは、タブレットやラップトップなどのコンポーネント消耗品のブレークダウンの詳細を提供できます。これらの各アイテムは、さらに詳細に分解することができます。タブレットは、Google Nexus や iPad など、アイテムの各単位に使用される関連価格にすることができます。

手順

1. 作成したサービスカタログステートメントアイテムのブレークダウンレコードを作成するには、[サービスカタログブレークダウン] 関連リストで [新規] をクリックします。
2. フォームフィールドに記入します。

[サービスカタログブレークダウン] フォーム

フィールド	説明
名前	サービスカタログブレークダウンのわかりやすい名前。
ステートメントアイテム	デフォルトはステートメントアイテムのタイプです。
カテゴリ	選択したカテゴリのカタログアイテムは、消費の詳細をレポートするために使用されます。
カタログアイテム	消費が報告される、選択したカタログおよびカテゴリのアイテム。

3. [送信] をクリックします。

ステートメントアイテム内でのドリルダウン

ステートメントアイテム内をドリルダウンして、そのデータのサブセットを視覚化することができます。

始める前に
必要なロール：service_charging_analyst

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

このタスクについて
ステートメントアイテム内をドリルダウンして、ソーステーブルから取得したデータを持つエンティティまたはキーフィールドを表示します。また、取得する関連データがある特定のフィールドへのマッピングの基準を確認することもできます。また、ドリルダウン方法を編集して変更し、重み付けメソッドを使用することもできます。このような場合、システムは重み付けされたメトリクスを使用してソーステーブルからデータを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンスチャージ > アドミニストレーション > ステートメントアイテムドリルダウン.
2. [新規] をクリックしてステートメントアイテムを作成するか、編集する既存のステートメントアイテムドリルダウンの名前をクリックします。
3. ドリルダウンするステートメントアイテムのタイプをクリックします。
4. 選択したステートメントアイテムドリルダウンのタイプに基づいて、関連するフォームフィールドに入力します。

[ステートメントアイテムドリルダウン] フォーム

フィールド	説明
名前	ステートメントアイテムドリルダウンの名前。
ドリルダウンの基準	マッピングされたフィールドまたは重み付けされたメトリクスの方法に基づく、アイテムの下位レベルのアクセス。 詳細については、「配分評価指標」を参照してください。
テーブル	ステートメントアイテム情報を含むソーステーブル。
タイプ	ステートメントアイテムのタイプ。情報の取得元のソースに基づいて決定されます。 実行するステートメントアイテムドリルダウンのタイプが既に選択されているため、フィールドを編集することはできません。
マッピングフィールド	ドリルダウンデータがあるテーブルのフィールドにマッピングします。
重み付けされたメトリクス	セグメントからの集計値に基づく計算のドリルダウン。
コストモデル	ドリルダウンを適用できるコストモデル。

5. レコードを入力する場合は [送信] をクリックし、既存のレコードを編集した場合は [更新] をクリックします。

次のタスク

ステートメントアイテムを定義したら、ステートメントアイテムをショーバックステートメントに関連付けます。ショーバックステートメントを使用して、消費したサービスを事業部門長にレポートすることができます。事業部門長には、事業部門がビジネスサービスの一部として利用した詳細なサービスの課金ラインが表示されます。たとえば、メールサービスはビジネスサービスです。事業部門がメールサービスを使用する場合、メールサービスを利用したサービスの課金がショーバックステートメントとして事業部門長または部門長に報告されます。

ショーバックステートメントの定義、生成、公開

ショーバックは、IT などのサービス組織が消費者にサービスを提供するためにかかるコストを消費者に示します。ショーバックステートメントを定義すると、ショーバックステートメントのレポート先となるレポートエンティティ (事業部門など) を把握するのに役立ちます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：service_charging_analyst

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

このタスクについて
ショーバックステートメントは、ステートメントアイテム (事業部門が消費するサービス) を表す課金の集まりで、会計期間に対して生成されます。

ショーバックステートメントは、消費されたサービスとこれらのサービスに関連する課金の可視化を事業部門に提供します。また、ビジネスサービスを慎重に使用し、それに関連するコスト要因を認識できるようになります。

最低レベルにドリルダウンすることで、同じステートメントアイテムに基づいて複数のショーバックステートメントを作成できます。ショーバックステートメントは、さまざまなレポートエンティティに対するものにすることができます。たとえば、ステートメントアイテムのソースデータを持つドリルダウンエンティティを使用して、コストセンター、事業部門、部門などのさまざまなレポートエンティティのショーバックステートメントを作成できます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンスチャージ > アドミニストレーション > ショーバックステートメント定義.
2. [新規] をクリックしてショーバックステートメント定義を作成するか、編集する既存のショーバックステートメント定義の名前をクリックします。
3. フォームフィールドに記入します。

[ショーバックステートメント定義] フォーム

フィールド	説明
名前	ショーバック ステートメント定義の名前。
説明	ショーバックステートメント定義の説明。
レポートエンティティ	消費の詳細のエンティティを表示するために生成されたレポート。
レポートユーザーフィールド	レポートを表示するレポートエンティティ責任者。
頻度	レポートが生成される会計頻度。
レポート ユーザー グループ フィールド	レポートを確認できるユーザー グループ。 ユーザーグループのすべてのメンバーがレポートを表示できます。

4. レコードを保存する場合は [送信] をクリックし、既存のレコードを編集した場合は [更新] をクリックします。
5. [生成] をクリックして、選択した会計期間のショーバックステートメントを生成します。

   生成されたレポートは、レポートエンティティ (事業部門) が閲覧できるようになります。ショーバックステートメントは、レポートエンティティがステートメントラインに記載されているサービスを使用したという情報を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ファイナンスアナリストは、ショーバックステートメントを生成して公開し、ショーバックユーザーが表示できるようにすることができます。

指定されたショーバックユーザー (通常は事業部門オーナーまたは事業部門経理リード) として、自分の部門に割り当てられた公開済みのショーバックステートメントを表示できます。それらをレビューして承認するか、不一致がある場合は異議申し立てを行い、タスクワークフローを通じてサービスオーナーまたはサービスの課金アナリストと解決することができます。

6. [公開] をクリックします。

   a. 表示される [ショーバックステートメントの公開] ポップアップの [会計期間] 選択リストで [会計期間] を選択します。

   b. [**OK**] をクリックします。

   注:

   ショーバックステートメントを生成し、まだ公開していない会計期間が選択リストに表示されます。公開することで、当該会計期間のショーバックステートメントが利用可能になり、ショーバックユーザーはアプリケーションナビゲーターの [自分のショーバックステートメント] メニューでそれを表示できます。

7. [削除] をクリックしてレコードを削除します。

[ショーバックステートメントライン定義] の [新規] ボタンをクリックして、ショーバックステートメントのステートメントラインを作成します。

次のタスク
サービスの価格設定コンソールでショーバックステートメントを監視します。

サービスの課金 - 従来

サービスオーナーは、サービスの価格設定コンソールを使用して、サービスの消費、各ステートメントアイテムのステータスを監視し、ステートメントアイテムの価格設定を行うことができます。

重要:
この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

サービスの課金アナリストは、ビジネスの経済的な傾向や状況を分析および調査し、ビジネスサービスに必要な課金の推奨事項を作成できます。

サービスの価格設定コンソールでサービスの課金を監視する

サービスオーナーは、サービスの価格設定コンソールを使用してサービスの課金ラインを生成し、サービスの課金ラインを表示し、価格設定ポリシーを設定します。価格設定ポリシーを設定すると、設定された価格、追加料金、または割引の詳細を取得するレートカードが生成されます。

始める前に
必要なロール：service_charging_owner

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンスチャージ > サービス課金 > コンソール.

   コンソールを開き、次のペインでステートメントアイテムに関連するすべての詳細を監視します。

   自分のステートメントアイテム：サービスオーナーが所有するすべてのステートメントアイテムのリストが左ペインに表示されます。

2. 詳細を表示する左ペインのステートメントアイテムをクリックします。
3. [会計期間] 選択リストをクリックして、会計期間を選択します。
4. [ラインを生成] をクリックして、指定した会計期間のステートメントアイテムの課金ラインを生成します。

   [課金ラインを生成] ポップアップが開きます。

   注:

   ステートメントアイテムに基づいて生成されたサービスの課金ラインのリストを表示するには、次に移動します: ファイナンスチャージ > サービス課金 > サービス課金ライン. これらのサービスの課金ラインは、コンソールで監視できるレコードです。

5. 課金ラインを生成する期間の会計期間を更新します。
6. [生成] をクリックします。

   課金ライン生成ジョブが正常にスケジュールされたことを確認するメッセージが表示されます。

   右側のステートメントアイテム詳細ペインには、ステートメントアイテムのすべての詳細が表示されます。

   [概要] タブ：

   - 価格設定、コスト、および課金：左側のペインには、ステートメントアイテムに採用された価格設定ポリシー手法と価格設定ポリシーの詳細が表示されます。また、ステートメントアイテムの総コストと、ステートメントアイテムに請求された課金合計も表示されます。
     - [コスト] は、サービス別の実際のコストです。これは、製品またはサービスを購入する際に発生する金額です。
     - [価格] は、本番、マーケティング、販売などに関連するコスト要因に基づいて、製品またはサービスに対して決定される金額です。
     - [課金] は、ビジネスサービスによって提供されたサービスまたは商品に対して請求される金額です。
   - コストの傾向：スプラインチャートには、さまざまな会計期間における価格に対するコストの傾向が表示されます。
   - 課金ライン：ステートメントアイテムに対してサービスの課金ラインが生成されます。各サービスの課金ラインには、使用された製品またはサービスの名前と、数量で計算されたアイテムの関連する単位コストが一覧表示され、総コストが示されます。

   課金ラインの列見出し

フィールド	説明
名前	ステートメントアイテムの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
平均単位コスト	ステートメントアイテムの 1 単位の平均コスト。
数量	ステートメントアイテムおよびステートメントアイテムブレークダウンレベルのアイテム数。
総コスト	単位コスト * 数量。
価格調整 (%)	価格調整は、ステートメントアイテム定義フォームで定義した価格設定ポリシー手法に基づきます。 平均単位コストのパーセンテージをインクリメントまたはデクリメントして、パーセンテージまたは単価で価格を調整します。調整後の価格は課金合計として反映されます。
単価	サービスの事前定義された単価を設定します。提供されるサービスの数量または単一のステートメントアイテムのコストによって決定されます。
課金合計	各ビジネスサービスに請求される合計金額。これは平均単位コストの調整後の価格です。

7. [価格設定ポリシーの設定] ボタンをクリックします。

   開いたコンソールの右ペインに、ステートメントアイテムの詳細が表示されます。

8. ステートメントアイテムレベルまたはステートメントアイテムラインレベルの価格調整ボックス (設定した価格設定ポリシーに基づく) をクリックして価格を調整し、課金合計を表示します。
9. [価格を設定] をクリックします。

   行った価格調整は、[課金合計] フィールドに反映されます。

10. [ドリルダウン] タブをクリックして、ステートメントアイテムのドリルダウンの詳細をドリルダウンエンティティレベルで表示します。

    ステートメントアイテムのブレークダウンを表示したり、それを他の課金品目のブレークダウンと比較したりして、ブレークダウンごとのコストの可視化を向上させることができます。

    [ドリルダウン] タブ：

    - ドリルダウン：[ドリルダウン] フィールドをクリックすると、ステートメントアイテムのコストの詳細データが、グラフの各ドリルダウンエンティティのブレークダウン別に表示されます。
    - 課金品目ブレークダウン：[課金品目ブレークダウン] フィールドをクリックして、各ステートメントアイテムブレークダウンのコスト別の課金品目ブレークダウンを表示します。
    - 請求品目ブレークダウンアカウント：[請求品目ブレークダウンアカウント] フィールドをクリックして、ステートメントアイテムブレークダウンの各サービスの課金ラインのアカウントを表示します。

次のタスク

定義した課金は、レートカードとしてステートメントアイテムに添付されます。サービスの課金アナリストおよびサービスの課金オーナーは、サービスの課金価格レートカードを定義することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レートカードを作成してビジネスサービスの価格を修正する

ビジネスサービスまたはビジネスサービスコンポーネントの価格を一覧表示するレートカードを作成します。サービスオーナーは、自分が所有するビジネスサービスを表すステートメントアイテムのレートカードを作成できます。レートカードは、会計期間のステートメントアイテムに添付されている価格設定ポリシー手法に基づいています。

始める前に

必要なロール：service_charging_analyst、service_charging_owner

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

このタスクについて

次の会計期間の課金が公開される前にステートメントアイテムに新しい価格設定ポリシーを設定しない場合、会計期間のレートカードはデフォルトで次の会計期間に設定されます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンスチャージ > サービス課金 > サービス課金レートカード.
2. [新規] をクリックしてサービスの課金価格レートカードを作成するか、編集するレコードをクリックします。
3. フォームフィールドに記入します。

[サービスの課金価格レートカード] フォーム

フィールド	説明
ステートメントアイテム	レートカードを作成するステートメントアイテムを選択します。
アイテムテーブル名	○ サービスカタログステートメントアイテムの場合、アイテムテーブル名はカタログアイテムです。 ○ コストモデルステートメントアイテムの場合、アイテムテーブル名はセグメントのトランザクションテーブル名です。 ○ 消費ステートメントアイテムの場合、アイテムテーブル名は消費テーブルです。
サービスの課金タイプ	デフォルトはステートメントアイテムです。パーセンテージベースまたは単価ベースにすることができます。
会計期間	レートカードが有効な期間。
ステートメントアイテムブレークダウン	ステートメントアイテムのブレークダウンラインの詳細。
アイテム名	アイテムテーブル内のレコードを参照します。
パーセンテージ	ステートメントアイテムレベル、ステートメントアイテムのブレークダウンレベル、または消費ベースのステートメントアイテムやカタログベースのステートメントアイテムのアイテムレベル、またはコストモデルベースのステートメントアイテムのアカウントレベルで設定できる平均単価のパーセンテージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
単価	アイテムレベルの価格設定ポリシーに対してのみ単価を設定します。単価は、ビジネスユーザーに表示される価格を表します。
簡単な説明	レートカードのわかりやすい簡単な説明。

4. [送信] または [更新] をクリックします。

次のタスク
サービスの課金アナリストは、生成されたすべてのショーバックステートメントを表示できます。ショーバックユーザーは、生成したショーバックステートメントを公開した場合にのみ、ショーバックステートメントを表示できます。

ショーバックステートメント - 従来

ショーバックは、ファイナンスチャージの情報技術戦略であり、IT ハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービス、または事業部門が使用するシェアードサービスのコストを追跡します。

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

コストは統合され、レポート請求書 (ショーバックステートメント) として事業部門に提示され、会計期間中に消費されたサービスと製品の量が示されます。

組織の人事事業部門は、従業員の出席を管理するために出席管理システムビジネスアプリケーションを要求する場合があります。HR 部門の出席を処理する人事スタッフのコンピューター 20 台で、このアプリケーションのライセンス取得、インストール、およびメインテナンスを行うには、コストがかかります。IT 部門はこのコストを追跡し、ショーバックステートメントの形で人事事業部門長に経費を報告します。

ショーバックステートメントの表示

サービスの課金アナリストは、生成されたすべてのショーバックステートメントのリストを表示できます。レポートの対象となるレポートエンティティまたはユーザーグループを決定できます。

始める前に
必要なロール：service_charging_analyst

このタスクについて
ショーバックステートメントを生成し、会計期間のステートメント経費ラインの総コストを再決定し、ショーバックユーザーが参照できるようにステートメントを公開します。ショーバックステートメントを作成することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンスチャージ > ショーバック > すべてのショーバックステートメント.
2. ショーバックステートメントを作成するには、[新規] をクリックします。
3. 既存のショーバックステートメントレコードを編集するには、[新規] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。

[ショーバックステートメント] フォーム

フィールド	説明
レポートエンティティ	ビジネスサービスを利用した事業体。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
会計期間	ショーバックステートメントが生成される期間。
担当者	ショーバックステートメントを表示する事業部門長または部門長。
状況	ショーバックステートメントのステータス。 ○ ドラフト：レポートはドラフトステージです。 ○ 公開済み：レポートが公開されました。これは、レポートユーザーとショーバックユーザーロールを持つレポートユーザーグループに属するユーザーがレポートを表示できることを意味します。 ○ 異議申し立て済み：ショーバックユーザーがレポートを確認し、ステートメント経費ラインの内容について意見の相違があるため異議申し立てを行いました。 ○ クローズ済み：ショーバックユーザーがステートメントアイテムを受け入れると、ステートメントアイテムは [クローズ済み] ステータスに移行します。
総コスト	すべてのステートメント経費ラインの総コスト。
アサイン先グループ	ステートメントアイテムが割り当てられているグループ。
簡単な説明	ショーバックステートメントのわかりやすい簡単な説明。
追加コメント (ユーザーに表示)	ユーザーがこれらのコメントを表示するため、完全な文および段落のコメントまたはメモ。ユーザーは、フィールドに保存されているすべての情報のコピーを取得します。
作業メモ	内部通信専用の作業メモ。

5. ショーバックステートメントを保存するには、[送信] をクリックします。

6. 編集したレコードを保存するには、[更新] をクリックします。

7. ショーバックステートメントで報告された経費を確認するには、[承認] をクリックします。

8. レコードを削除するには、[削除] をクリックします。

次のタスク

[ショーバックステートメント] 関連リストを使用して、ステートメント経費ラインとステートメント経費ラインの詳細をショーバックステートメントに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステートメント経費ラインの追加

ステートメントアイテムブレークダウンレベルで、消費された単位数、アイテムの単価、およびすべてのアイテムの総コストを追加します。請求書に経費リストの詳細を示す項目が記載されているのと同様に、ステートメントアイテムにはショーバックステートメントのステートメント経費ラインとして報告される経費詳細も含まれます。

始める前に
必要なロール：service_charging_analyst

手順

1. [ステートメント経費ライン] 関連リストで、[新規] をクリックします。
2. フォームで、フォームフィールドに入力します。

[ステートメント経費ライン] フォーム

フィールド	説明
ショーバックステートメント	デフォルトは、ショーバックステートメントレポートエンティティです。
ステートメントアイテム	ステートメント経費ラインとしてリストされるステートメントアイテムを選択リストから選択します。
ボリューム	消費されたアイテムの数 (単位)。
コスト	単位レート * ボリュームとして計算されます。
状況	ステートメント経費ラインのステータス。 ○ 処理待ち：ショーバックステートメントは公開されません。ステートメント経費ラインのステータスは「処理待ち」になります (ショーバックステートメントのステータスは「ドラフト」です)。 ○ 処理済み：ショーバックステートメントは公開され、ステートメント経費ラインのステータスは「処理済み」になります。(ショーバックステートメントは公開済みステータスです)。 ○ 異議申し立て済み：ステートメント経費ラインのボリュームまたは単価が誤っていると思われる場合、ステートメント受領者は異議申し立てを行うことができます (ステートメント経費ラインに異議が申し立てられると、ショーバックステートメントのステータスも「異議申し立て済み」になります)。 ○ 承認：ステートメント経費ラインは、ショーバックユーザーにより承認済みです (ショーバックステートメントは「クローズ済み」となります)。
ステートメントアイテムブレークダウン	ステートメントアイテムにリストするステートメントアイテムのブレークダウンを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
単位レート	レポートエンティティがアイテムの 1 単位に対して請求されるレート。

3. [送信] をクリックします。

次のタスク
ステートメントアイテムのステートメント経費ラインの経費ライン詳細を追加します。

ステートメント経費ラインの詳細の追加

経費ラインの詳細を追加すると、ステートメント経費ラインのもう 1 つのレベルにドリルダウンされます。消費された単位数、アイテムが請求される単価、経費ラインの合計額 (アイテムレベル、カタログアイテムレベル、アカウントレベル) を追加します。

始める前に
必要なロール：service_charging_analyst

手順

1. [ステートメント経費ライン] 関連リストをクリックします。
2. [新規] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

[ステートメント経費ラインの詳細] フォーム

フィールド	説明
ステートメント経費ライン	オプションリストからステートメント経費ラインを選択します。
単位レート	レポートエンティティがアイテムの 1 単位に対して請求されるレート。
ボリューム	消費されたアイテムの数 (単位)。
総計	ボリューム * 単位レート。

4. [送信] をクリックします。

次の会計期間のショーバックステートメントの生成

サービスの課金アナリストとして、ステートメントが生成された最新の会計期間のすべてのショーバックステートメントのステータスログと、ショーバックステートメントが公開された日付を確認します。

始める前に
必要なロール：service_charging_analyst

このタスクについて
ショーバックステートメントの最後に生成および公開された詳細のレコードまたはログを作成し、次の会計期間のステートメントを生成することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンスチャージ > ショーバック > ショーバックの生成.
2. [新規] をクリックしてショーバック実行ログを作成するか、編集する既存のショーバックログレコードの [ステータス] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

[ショーバック実行ログ] フォーム

フィールド	説明
会計期間	オプションリストからステートメント経費ラインを選択します。
ステータス	ショーバックステートメントのステータス。
ショーバック	ショーバックステートメントの定義。
前回生成日	ステートメントが最後に生成された日付。
公開	ステートメントが公開されているかどうかを示すチェックボックス。
公開日	ステートメントが最後に公開された日付。

4. ログを作成した場合は [送信] をクリックし、既存のログを編集した場合は [更新] をクリックします。
5. [削除] をクリックしてレコードを削除します。
6. [ステートメントを生成] をクリックして、会計期間のショーバックステートメントを生成します。

   a. 表示される [ショーバックステートメントを生成] ポップアップの [ショーバックステートメント定義] フィールドで、ショーバックステートメントを選択します。

   b. [会計期間] フィールドで会計期間を選択します。

   c. [生成] をクリックします。

   [ショーバック実行ログ] リストを更新して、ショーバックステートメントのステータスを [生成済み] に変更します。

   注:

   [公開済み] 列は、true または false ステータスによってショーバックステートメントが公開されたかどうかを示します。ステータスが false の場合は、ショーバックがまだ未公開であることを意味し、ショーバックユーザーは確認することができません。

   [ショーバックステートメント定義] に移動して、生成されたショーバックステートメントを確認し、ショーバックユーザーがレポートを表示できるようにステートメントを公開します。

次のタスク

ショーバックステートメントを公開すると、ショーバックユーザーは [自分のショーバックステートメント] でショーバックステートメントを表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ショーバックステートメントをショーバックユーザーとして表示 - 従来

ショーバックエンティティオーナーは、自分に割り当てられているすべてのショーバックステートメントを表示できます。ステートメントを確認し、不一致がある場合は異議申し立てを行うか、または受け入れることができます。

始める前に
必要なロール：showback_user

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンスチャージ > 自分のショーバックステートメント.
2. 自分に割り当てられているショーバックステートメントのリストを表示します。
   - 会計期間：ショーバックステートメントが生成される期間。
   - 総コスト：課金されているサービスのコスト。
   - ステータス：ショーバックステートメントのステータス。
   - 割り当て先：サービスを利用したレポートエンティティユーザー。

   ステートメントラインの一部またはすべてに不一致がある場合は、異議申し立てを行うことができます。
3. 異議申し立てを行うには、ショーバックステートメントのステートメント経費ラインから [異議申し立てを行う] UI アクションを使用するか、[オープンな異議申し立て] に移動します。

異議申し立てを行う - 従来

ショーバックユーザーとして、ステートメント経費ラインの情報のいずれかに同意しない場合は、異議申し立てを行うことができます。

始める前に
必要なロール：showback_user

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンスチャージ > 自分のオープン異議申し立て.
2. [ステートメントの異議申し立て] リストで、[新規] をクリックするか、[ステートメントの異議申し立て] リストの [番号] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

[ステートメントの異議申し立て] フォーム

フィールド	説明
番号	異議申し立ての連番。
ステートメント経費ライン	同意しない選択リストの経費ライン。
開始者	デフォルトは、異議申し立てを行っているユーザー名です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
担当者	価格設定ポリシー、単価、ボリューム、または総コストに関連する場合に、サービスの課金所有者に割り当てられた異議申し立て。 ショーバックステートメントに不一致がある場合は、サービスの課金ファイナンスアナリストに異議申し立てをアサインします。
理由コード	選択リストからの適切な理由コード。
状況	異議申し立てのステータス： ○ オープン：ショーバックユーザーが異議申し立てを行います。 ○ 対応中：サービスの課金オーナーまたはサービスの課金アナリストが異議申し立てに取り組んでいます。 ○ 完了してクローズ：異議申し立てが解決され、クローズされました。 ○ 未完了でクローズ：異議申し立てが解決されていませんが、クローズされました。 ○ スキップしてクローズ：異議申し立て中の経費ラインはスキップされ、クローズされました。
理由	異議申し立ての説明。
追加コメント (顧客に表示)	サービスの課金所有者とサービスの課金アナリストが論争を容易に理解して解決するための、完全な文章と段落でのコメントまたはメモ。
作業メモ	内部通信専用の作業メモ。
ステートメント経費ラインの詳細	異議申し立ての対象となったショーバックステートメント経費ライン。

4. 異議申し立ての送信を完了するには、[送信] をクリックします。または、編集した異議申し立てを更新するには、[更新] をクリックします。
5. 以前に提起した異議申し立ての解決を確認した場合は、[クローズ] をクリックします。
6. レコードを削除するには、[削除] をクリックします。

次のタスク

サービスの課金のオーナーは、[オープンな異議申し立て] に移動して、ショーバックユーザーが提起したステートメントの異議申し立てを表示し、異議申し立てを解決できます。

サービスの課金オーナーが問題を解決できない場合、サービスの課金アナリストは、特別な権限を持つスーパーユーザーとして、[自分のオープン異議申し立て] 内の未解決の異議申し立てを解決できます。

サービスオーナーとして自分のステートメントアイテムを表示する 従来

ビジネスサービスオーナーは、サービスの課金オーナーであるステートメントアイテムのリストを表示し、会計期間の課金ラインを生成することができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：service_charging_owner

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

このタスクについて
サービスの課金アナリストがショーバックステートメントを公開した後、ショーバックユーザーが提起した異議申し立てを確認し、ステートメント経費ラインを管理できます。単位コスト、消費量に基づくコスト回収を表示し、ステートメントアイテムの単価、割引、または追加料金を設定できます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンスチャージ > 自分のステートメントアイテム.
2. サービスの課金のオーナーであるステートメントアイテムのリストを表示します。
3. ステートメントアイテムサービスの課金の詳細を確認します。
4. [課金ラインを生成] をクリックします。
5. [課金ラインを生成] ポップアップの [会計期間] 選択リストで、会計期間を選択します。
6. [**OK**] をクリックします。

次のタスク
ステートメントアイテムは、事業部門オーナーのショーバックダッシュボードで表示できます。

ファイナンスアナリストのショーバックダッシュボード - 従来

ファイナンスアナリストは、Financial Analyst ショーバックダッシュボードの中央インターフェイスを使用して、生成されたすべてのショーバックステートメントを表示できます。ダッシュボードは、ビジネスにサービスを展開するコストと、そのコストの回収またはショーバックを分析するのに役立ちます。

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

に移動することもできます ファイナンスチャージ > ショーバック > ダッシュボード このダッシュボードにアクセスします。

データは ITFM_Charge_Expense_Line_Details テーブルから取得されます。

前回の期間の総コスト
: 前の期間にサービスを展開するための総コストを表示します。

前回の期間の課金合計
: 調整後の価格に基づいて、すべてのビジネスサービスの課金合計額を表示します。

前回の課金とコスト差異
: 前の期間の課金合計と総コストの差額を表示します。

YTD 課金とコスト差異
: 年度累計の課金合計と合計コストの差を表示します。

課金とコスト
: 完了した会計期間のコスト傾向に対する課金を棒グラフとして表示します。

前回の期間の合計コストブレークダウン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

前の期間のステートメントアイテムまたは事業部門の総コストブレークダウンの詳細をリストします。

事業部門オーナーショーバックダッシュボード - 従来

事業部門オーナーは、事業部門オーナーショーバックダッシュボードインターフェイスを使用して、事業部門オーナーに割り当てられたステートメントアイテムを表示し、価格設定ポリシーを設定し、前の期間のコストを表示できます。

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

に移動することもできます ファイナンスチャージ > 自分のショーバックダッシュボード このダッシュボードにアクセスします。

前回の期間のコスト

事業部門ごとにすべてのステートメントアイテムに表示されるコストの合計を表示します。

ステートメントアイテム別

会計期間のステートメントアイテムとコストを一覧表示します。

ショーバックステートメント

事業部門のオーナーが所有するすべてのショーバックステートメントを一覧表示します。

ファイナンシャルマネジメント - レガシーのクイックスタートテスト

アプリケーションの開発やアップグレードの適用などの構成変更を行った後も、ファイナンシャルマネジメント が変わらず正常に動作するかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。

ファイナンシャルマネジメント

ファイナンシャルマネジメント クイックスタートテストでは ファイナンシャルマネジメント Core - ATF テストプラグイン (com.snc.financial_management.atf) をアクティブ化する必要があります。

ITFM：ファイナンシャルモデリングフローテストスイート

テスト	説明	リリースバージョン
FM コスト割り当てフローの確認	ファイナンシャルモデリングにおけるコスト割り当てフローを確認します。	Madrid

ファイナンシャルマネジメントの詳細については、「ファイナンシャルマネジメント」を参照してください。

関連情報

クイックスタートテスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ファイナンシャルマネジメント プラットフォームアナリティクスソリューション - 従来

プラットフォームアナリティクスソリューション には事前構成済みのダッシュボードが含まれます。これらのダッシュボードには、アクション可能なデータ表示方法が豊富に用意されており、ビジネスプロセスとビジネスプラクティスの改善に役立ちます。

> **注:**
> ライセンス供与されたパフォーマンスアナリティクスのないインスタンスで、パフォーマンスアナリティクスソリューションおよびフォーム内分析を有効にして機能を評価できます。ただし、データの収集を開始するには、パフォーマンスアナリティクスをライセンスする必要があります。

プラットフォームアナリティクスソリューション

プラットフォームアナリティクス データの可視化では、 パフォーマンスアナリティクス インジケーター データを使用してデータを経時的に表示し、ビジネスプロセスを分析して改善が必要な領域を特定するのに役立ちます。プラットフォームアナリティクスソリューション を使用すると、最小限のセットアップで パフォーマンスアナリティクス からアプリケーションに関する値を取得できます。いつでも独自のオブジェクトを作成することもできます。

ファイナンシャルマネジメント ソリューションを有効にするには、管理者は パフォーマンスアナリティクス > ガイド付きセットアップ.[ようこそ] をクリックして、ファイナンシャルマネジメントのセクションにスクロールします。ガイド付きセットアップに従って、セットアップと構成のすべての手順を実行します。

ITFM の規範的ダッシュボードにアクセスするには、パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック – ファイナンシャルマネジメント (com.snc.pa.fm) プラグインが必要です。合計経費 YTD ウィジェットでコストデータを取得するには、パフォーマンスアナリティクス – Premium (com.snc.pa.premium) プラグインも必要です。

ITFM の規範的ダッシュボードは、企業の財務モデルアクティビティに対して選択した規範的コストモデルに基づいています。

移動先 ファイナンシャルモデリングアナリスト:ビジネスアプリケーションの総支出を追跡します > **ITFM** 規範ダッシュ ボード を使用して規範的ダッシュボードにアクセスします。

関連情報

パフォーマンスアナリティクスサブスクリプションのアクティブ化


ファイナンシャルマネジメント アプリケーション **TCO** ダッシュボード - 従来

アプリケーションの総所有コスト (TCO) ダッシュボードは、ビジネスアプリケーションのビューを提供するため、前の会計期間にアプリケーションに費やされた合計金額を知ることができます。また、現在の所有コストと過去の会計期間に発生したコストを比較して、将来の経費を予測することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーション **TCO** ダッシュボード

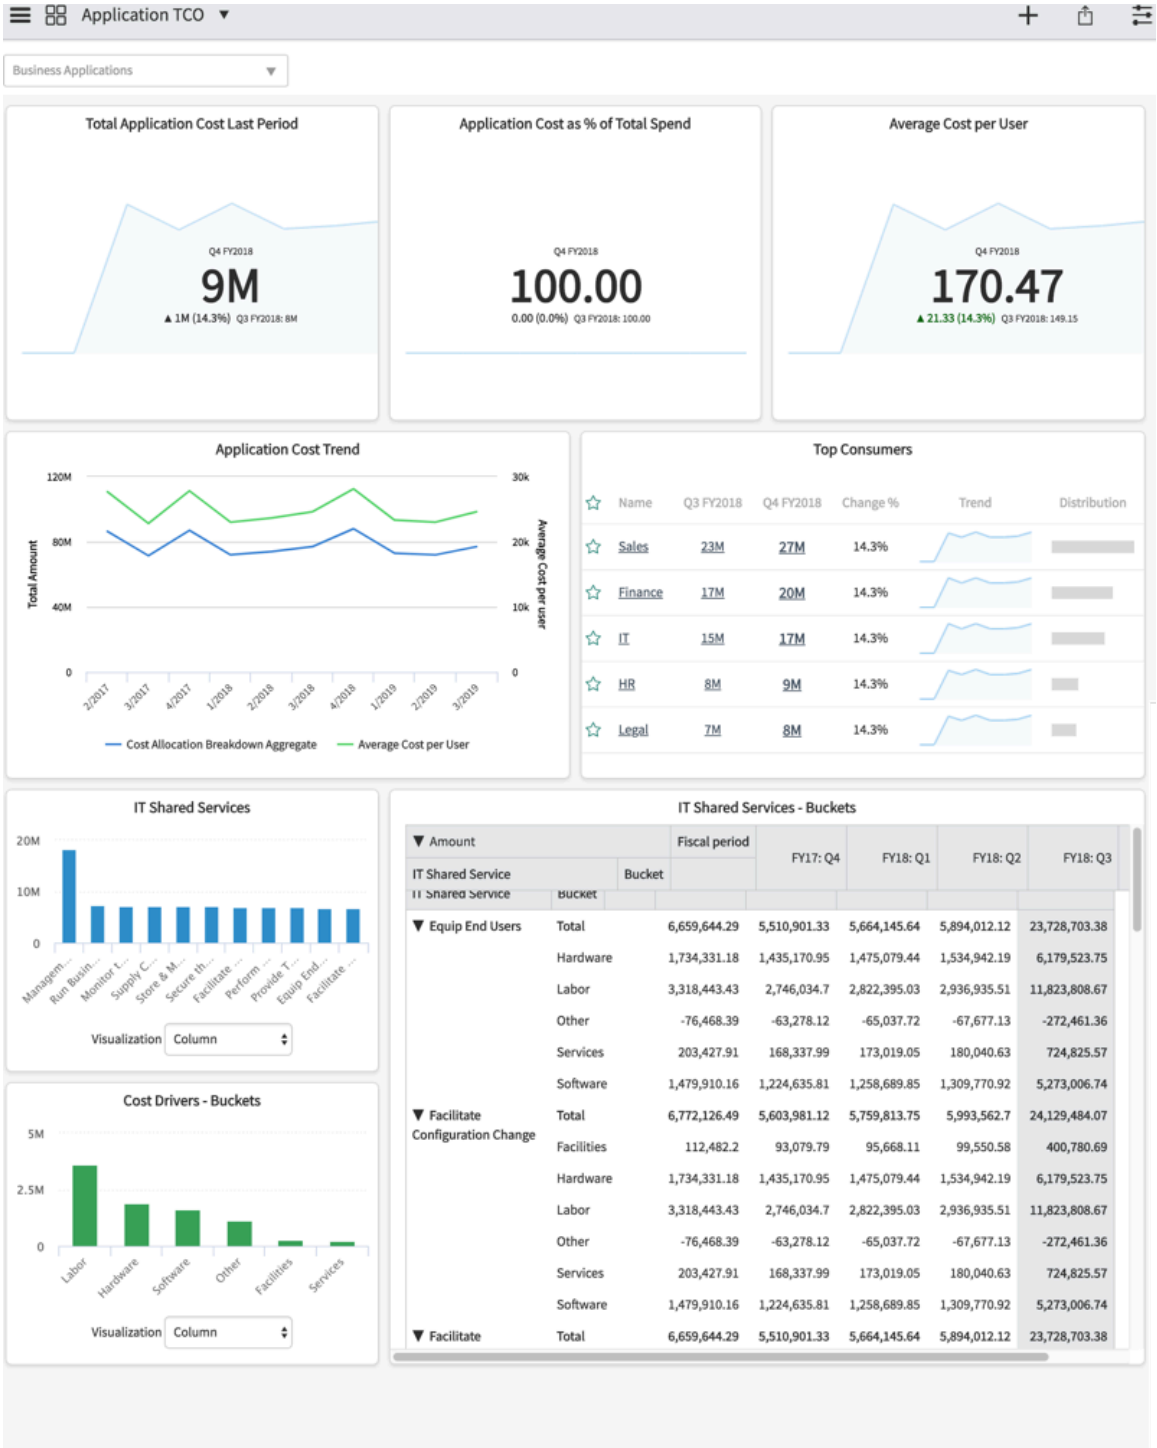

エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
ファイナンシャルモデリングアナリスト：ビジネスアプリケーションの総支出を追跡します。 アドミン：アプリケーションの使用および維持にかかるコストに加えて、アプリケーションのコストを追跡します。	cost_transparency_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

エンドユーザーと目標	必要なロール
ファイナンシャルモデリングアナリスト：ビジネスアプリケーションの総支出を追跡します。アナリスト：過去の傾向に基づいてアプリケーションの将来の総所有コストを予測し、その所有コストの手ごろな価格を判断します。	cost_transparency_analyst

インジケーター

会計四半期ごとの経費合計 - アプリケーションコストモデル

このインジケーターは、第 2 レベルの原価計算 - ビジネスアプリケーションコストモデルに基づいて、ビジネスアプリケーションと事業部門の会計四半期ごとの総コストデータを収集します。

総消費量のアプリケーションコストの割合 (%)

すべてのビジネスアプリケーションの総コストに対するアプリケーションコストのパーセンテージを計算するために使用される計算式。

ユーザーあたりの平均コスト - アプリケーション

ユーザーが消費するアプリケーションの平均コストを計算するために使用する計算式。

会計四半期ごとの経費合計のブレークダウン - アプリケーションコストモデル

このインジケーターは、第 2 レベルの原価計算 - ビジネスアプリケーションコストモデルのビジネスアプリケーションと事業部門の会計四半期ごとのブレークダウンデータを収集します。

会計四半期ごとの経費合計のブレークダウン - ITSS - アプリケーションコストモデル

このインジケーターは、IT シェアードサービスから第 2 レベルの原価計算 - ビジネスアプリケーションコストモデルのビジネスアプリケーションにロールアップされる、会計四半期ごとに集計されるデータを収集します。

会計四半期ごとの経費合計のブレークダウン - アプリケーションコストモデル


このインジケーターは、会計四半期ごとのコスト割り当てアグリゲートデータを収集します。データは、ビジネスアプリケーションから第 2 レベル原価計算 - ビジネスアプリケーションコストモデルの事業部門にロールアップされます。

ブレークダウン

ビジネスアプリケーション。


データの可視化

アプリケーション TCO ダッシュボードには、以下の可視化が含まれています。

タイトル	タイプ	説明
アプリケーションコストの傾向	線 	コスト割り当てブレークダウン集計の傾向とユーザーあたりの平均コストを四半期ごとの会計期間別に表示し、金額とパーセンテージを計算します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
IT シェアードサービス - バケット	ピボット 	過去 4 期の四半期に IT シェアードサービスセグメント内のすべてのアカウントに割り当てられたバケット金額を表形式で表示します。

ファイナンシャルマネジメント ビジネスアプリケーション原価計算ダッシュボード - 従来

ビジネスアプリケーション原価計算ダッシュボードは、四半期および年度累計で統合されたビジネスアプリケーションの総経費に対するエグゼクティブビューを提供します。ダッシュボードは、上位消費者のデータをアプリケーションコストに寄与するバケットとアプリケーションを使用する事業部門にドリルダウンできる範囲で、アプリケーションコストの可視化を提供します。

ダッシュボードは、ビジネスアプリケーション原価計算コストモデルに基づいています。このコストモデルは、ビジネスアプリケーションを事業部門に合わせて調整するため、各事業部門をサポートするアプリケーションのコストを知ることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスアプリケーション原価計算ダッシュボード



エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
ファイナンシャルモデリングアナリスト：ビジネスアプリケーションの総支出を追跡します。	cost_transparency_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

エンドユーザーと目標	必要なロール
アドミン：ビジネスアプリケーションに費やされた金額を追跡します。	
ファイナンシャルモデリングアナリスト：ビジネスアプリケーションの総支出を追跡します。アナリスト：過去の傾向に基づいてアプリケーションの将来のコストを予測し、アプリケーションを続行するかどうかを決定します。	cost_transparency_analyst

インジケーター

会計四半期ごとの経費合計 - アプリケーションコストモデル

このインジケーターは、ビジネスアプリケーションとビジネスアプリケーション原価計算コストモデルの事業部門の会計四半期ごとの総コストデータを収集します。

会計四半期ごとの経費合計のブレークダウン - アプリケーションコストモデル

このインジケーターは、ビジネスアプリケーションから第 2 レベルのコストモデルの事業部門にロールアップされる、会計四半期のコスト割り当てアグリゲートデータを収集します。



ユーザーあたりの平均コスト - アプリケーション

ユーザーが消費するアプリケーションの平均コスト。

ブレークダウン


- 事業部門。
- ビジネスアプリケーション。
- バケット - アプリケーションのコスト。

データの可視化

タイトル	タイプ	説明
ドライバーによるビジネスアプリケーションコスト	棒 	ビジネスアプリケーションの各アカウントが異なるバケット (コストプール) から消費する金額を表示します。
CPU あたりの平均エンタープライズコスト	スプライン 	CPU あたりの平均単位コストの傾向を表示します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
事業部門 - ビジネスアプリケーション	ピボット 	過去 4 期の四半期に事業部門がアプリケーションに費やした分割金額を表形式で表示します。

ファイナンシャルマネジメント ビジネスアプリケーション用の CIO ダッシュボード - 従来

CIO ダッシュボードは、ビジネスアプリケーションのリアルタイムパフォーマンスを測定し、すぐに表示できる形式で正確で最新のデータを提供して、意思決定をサポートします。

ビジネスアプリケーション用の CIO ダッシュボード

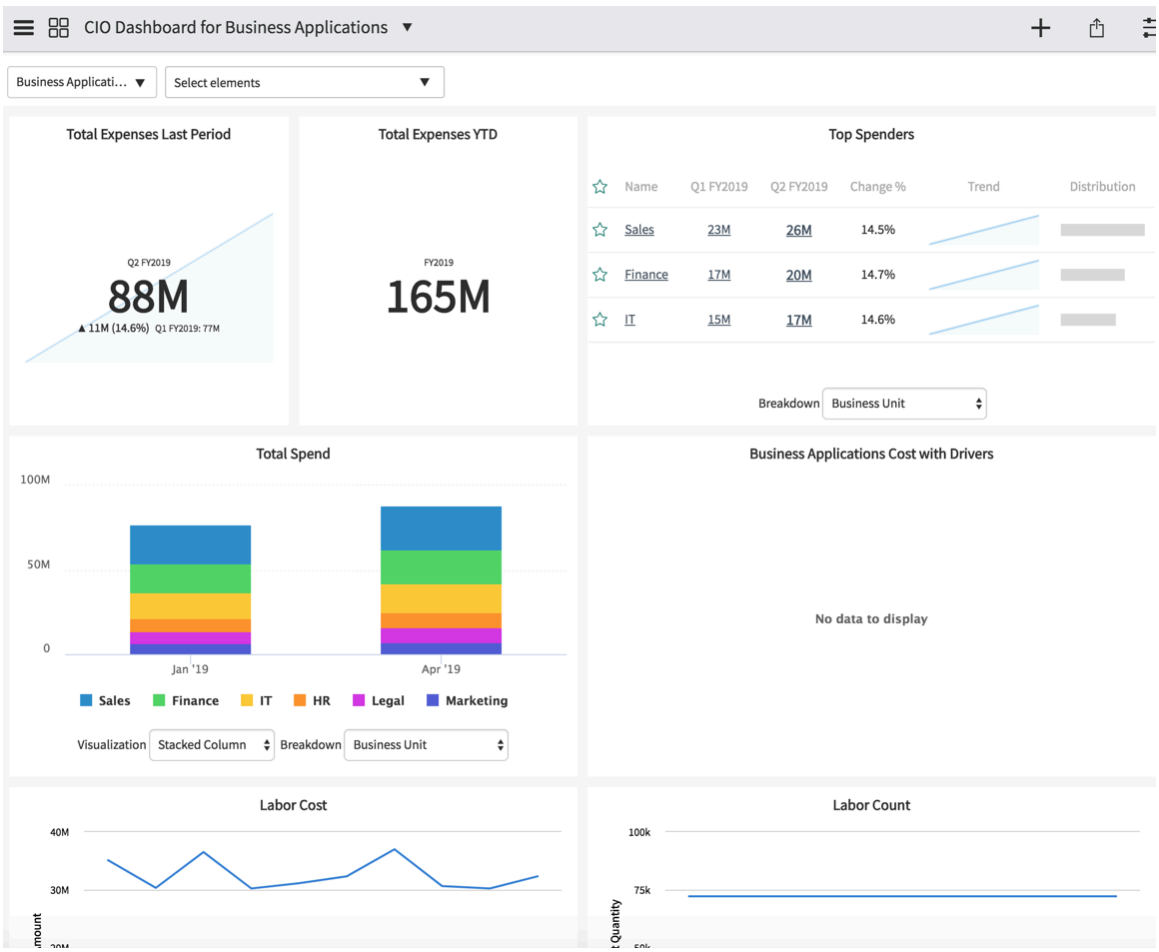

エンドユーザーとロール

必要なロールを持つエンドユーザー目標

エンドユーザーと目標	必要なロール
ファイナンシャルモデリングアナリスト：ビジネスアプリケーションの総支出を追跡します。	cost_transparency_analyst

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

必要なロールを持つエンドユーザー目標 (続く)

エンドユーザーと目標	必要なロール
ファイナンシャルマネジメントの読み取り専用ロール：ダッシュボードとそのレポートを表示します。	sn_itfm_read

インジケーター

会計四半期ごとの経費合計 - アプリケーションコストモデル

このインジケーターは、ビジネスアプリケーションとビジネスアプリケーション原価計算コストモデルの事業部門の会計四半期ごとの総コストデータを収集します。

会計四半期ごとの経費合計のブレークダウン - アプリケーションコストモデル

このインジケーターは、ビジネスアプリケーションからビジネスアプリケーション原価計算コストモデルの事業部門にロールアップされる、会計四半期のコスト割り当てアグリゲートデータを収集します。



ユーザーあたりの平均コスト - アプリケーション

ユーザーが消費するアプリケーションの平均コスト。

ブレークダウン




- 事業部門。
- ビジネスアプリケーション。

データの可視化

タイトル	タイプ	説明
ドライバーによるビジネスアプリケーションコスト	積み重ね棒グラフ 	ビジネスアプリケーションの各アカウントが異なるバケット (コストプール) から消費する金額を表示します。
人件費	線グラフ 	各会計期間のビジネスアプリケーションセグメントから事業部門セグメントに割り当てられた労務バケットからの金額を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
作業者数	線グラフ 	各会計期間の労務バケットの単位数量。
事業部門 - ビジネスアプリケーション	ピボットグラフ 	過去 4 期の四半期に事業部門がアプリケーションに費やした分割金額の表形式の表示。
CPU あたりの平均エンタープライズコスト	スプライングラフ 	CPU あたりの平均単位コストの傾向を表示します。

自動翻訳

ファイナンシャルマネジメント 第 **1** レベルの原価計算 **-** シェアードサービスダッシュボード **-** 従来

第 1 レベルの原価計算 - IT シェアードサービスダッシュボードは、上位消費者の四半期および年度累計の連結された総経費に対するエグゼクティブビューを提供します。事業部門またはシェアードサービスにドリルダウンできます。

重要:


この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

ダッシュボードは、IT インフラストラクチャのコストを可視化し、シェアードサービスのコストをビジネスに伝えるのに役立ち、将来の成長傾向の分析を容易にします。

第 1 レベルの原価計算 – シェアードサービスダッシュボードは、すべての経費を単一のビューで表示するシンプルなダッシュボードです。これは、第 1 レベルの原価計算 – シェアードサービスコストモデルでモデル化されています。これには、特定のコスト情報を取得するためにドリルダウンできる 2 つのブレークダウンが用意されています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

第 1 レベルの原価計算 - シェアードサービスダッシュボード

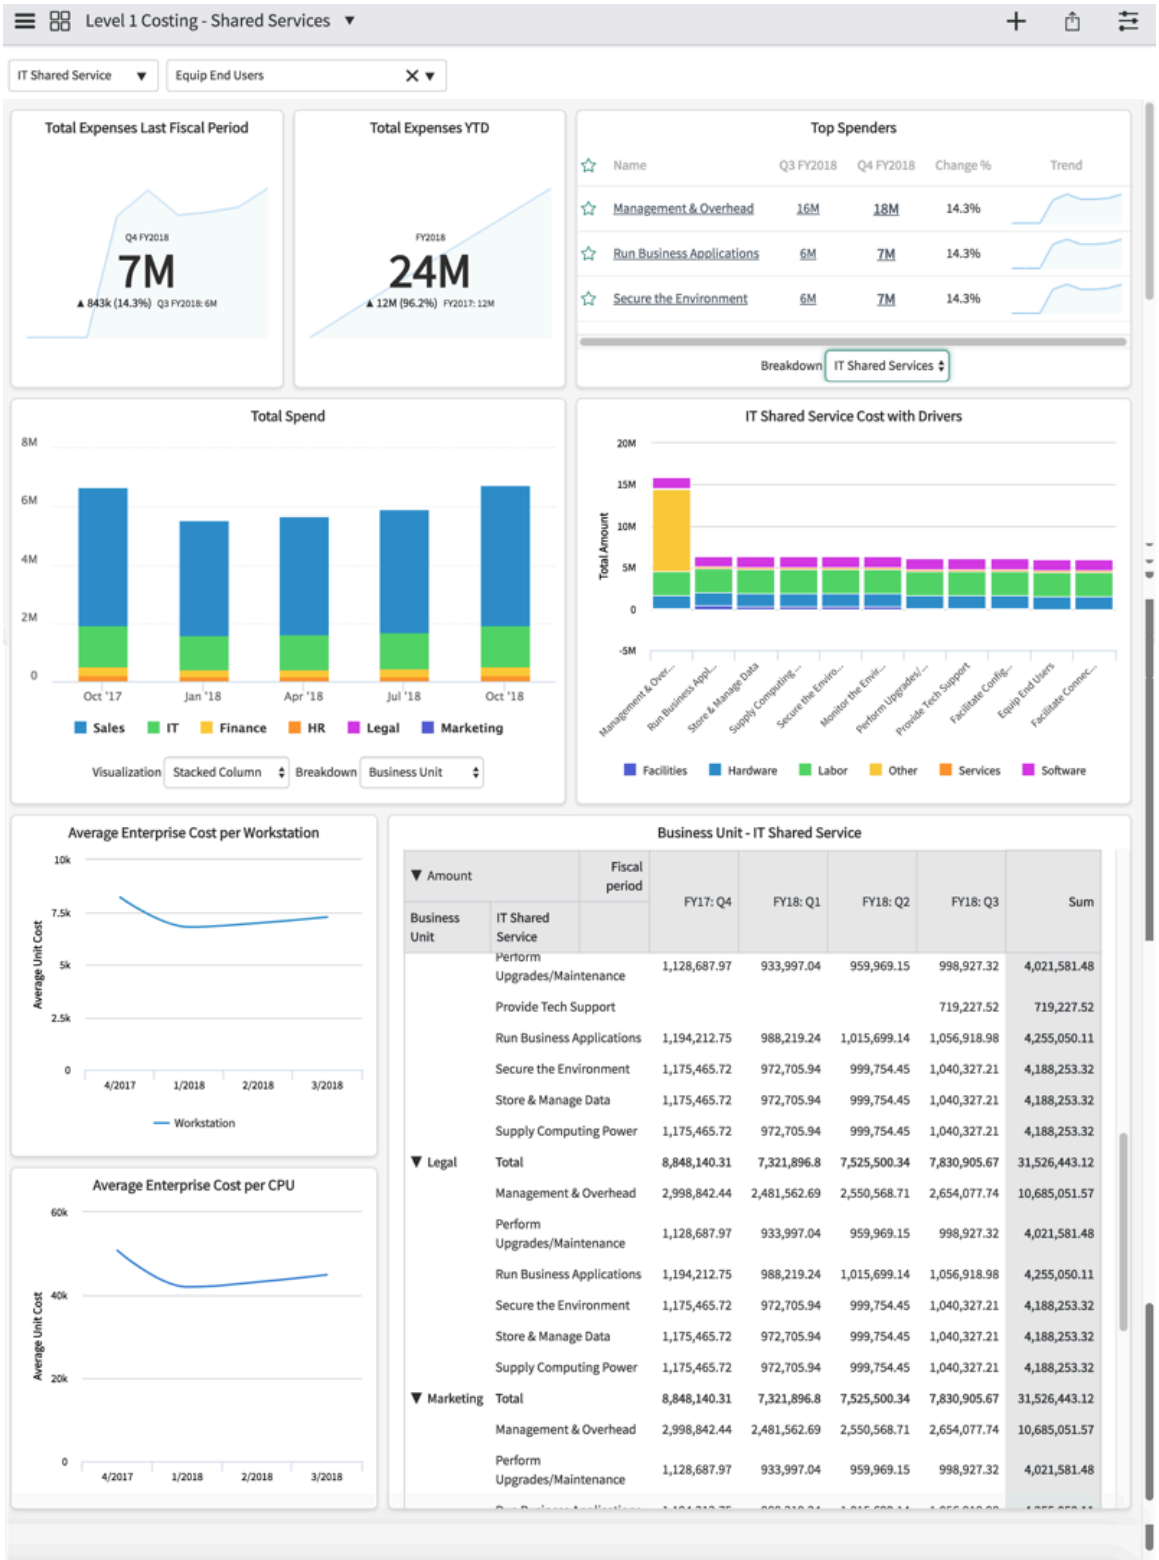

エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
ファイナンシャルモデリングアナリスト：ビジネスアプリケーションの総支出を追跡します。アドミン：IT インフラストラクチャのコストを	cost_transparency_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

エンドユーザーと目標	必要なロール
追跡します。事業部門内の各 IT シェアードサービスの支出額を示すレポートを生成します。	
ファイナンシャルモデリングアナリスト：ビジネスアプリケーションの総支出を追跡します。アナリスト：IT インフラストラクチャコストの総支出レポートに基づいて、重要なビジネス上の意思決定を行います。	cost_transparency_analyst

インジケーター

会計四半期ごとの経費合計 - サービスコストモデル

このインジケーターは、第 1 レベルの原価計算 - シェアードサービスのコストモデルの IT シェアードサービスと事業部門の会計四半期ごとのブレークダウンデータを収集します。

集計からの会計四半期ごとの経費合計 - シェアードサービス



このインジケーターは、IT シェアードサービスから第 1 レベルのコストモデルの事業部門にロールアップされる、会計四半期ごとに集計された会計データを収集します。

ブレークダウン

- 事業部門。
- IT シェアードサービス。



データの可視化

第 1 レベルの原価計算 – シェアードサービスダッシュボードには、以下の可視化が含まれています。

タイトル	タイプ	説明
ドライバーによる IT シェアードサービスコスト	棒 	IT シェアードサービスの各アカウントが異なるバケット (コストドライバー) から受け取る金額を表示します。
ワークステーションあたりの平均エンタープライズコスト	スプライン 	過去 4 期の四半期のワークステーションあたりの平均単位コストの傾向を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
CPU あたりの平均エンタープライズコスト	スプライン 	CPU あたりの平均単位コストの傾向を表示します。
事業部門 - IT シェアードサービス	ピボット 	過去 4 期の四半期に各事業部門内のすべての IT シェアードサービスによって費やされた金額を表形式で表示します。

ファイナンシャルマネジメント 第 2 レベルの原価計算 - ビジネスアプリケーションダッシュボード - 従来

第 2 レベルの原価計算 - ビジネスアプリケーションダッシュボードは、四半期および年度累計で統合されたビジネスアプリケーションの総経費に対するエグゼクティブビューを提供します。

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

ダッシュボードは、上位消費者のデータをアプリケーションコストに寄与するバケットとアプリケーションを使用する事業部門にドリルダウンできる範囲で、アプリケーションコストの可視化を提供します。

ダッシュボードは、第 2 レベルの原価計算 - ビジネスアプリケーションコストモデルに基づいています。このコストモデルは、ビジネスアプリケーションを事業部門に合わせて調整するため、各事業部門をサポートするアプリケーションのコストを知ることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

第 **2** レベルの原価計算 **-** ビジネスアプリケーションダッシュボード



エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
ファイナンシャルモデリングアナリスト：ビジネスアプリケーションの総支出を追跡します。	cost_transparency_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

エンドユーザーと目標	必要なロール
アドミン：ビジネスアプリケーションに費やされた金額を追跡します。	
ファイナンシャルモデリングアナリスト：ビジネスアプリケーションの総支出を追跡します。アナリスト：過去の傾向に基づいてアプリケーションの将来のコストを予測し、アプリケーションを続行するかどうかを決定します。	cost_transparency_analyst

インジケーター

会計四半期ごとの経費合計 - アプリケーションコストモデル

このインジケーターは、ビジネスアプリケーションと第 2 レベルの原価計算 - ビジネスアプリケーションコストモデルの事業部門の会計四半期ごとの総コストデータを収集します。

会計四半期ごとの経費合計のブレークダウン - アプリケーションコストモデル

このインジケーターは、ビジネスアプリケーションから第 2 レベルのコストモデルの事業部門にロールアップされる、会計四半期のコスト割り当てアグリゲートデータを収集します。


ユーザーあたりの平均コスト - アプリケーション

ユーザーが消費するアプリケーションの平均コスト。

ブレークダウン



- 事業部門。
- ビジネスアプリケーション。
- バケット - アプリケーションのコスト。

データの可視化

タイトル	タイプ	説明
ドライバーによるビジネスアプリケーションコスト	棒 	ビジネスアプリケーションの各アカウントが異なるバケット (コストプール) から消費する金額を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
CPU あたりの平均エンタープライズコスト	スプライン 	CPU あたりの平均単位コストの傾向を表示します。
事業部門 - ビジネスアプリケーション	ピボット 	過去 4 期の四半期に事業部門がアプリケーションに費やした分割金額を表形式で表示します。

ファイナンシャルマネジメント 第 **2** レベルの原価計算 **-** ビジネスサービスダッシュボード **-** 従来

第 2 レベルの原価計算 – ビジネスサービスダッシュボードは、ビジネスサービスを有効にし、企業のビジネス機能に合わせて調整するためのコストに関するエグゼクティブビューを提供します。ダッシュボードは、ビジネスサービスをサポートするコストを可視化し、事業部門によって推進されるビジネスサービスのコストを把握するのに役立ちます。

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

ダッシュボードは、ビジネスサービスを事業部門に合わせて調整する第 2 レベルの原価計算 - ビジネスサービスコストモデルに基づいています。したがって、各事業部門のサービスコストを追跡できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

第 2 レベルの原価計算 - ビジネスサービスダッシュボード



エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
ファイナンシャルモデリングアナリスト：ビジネスアプリケーションの総支出を追跡します。	cost_transparency_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

エンドユーザーと目標	必要なロール
アドミン：各事業部門に合わせてビジネスサービスに費やされた金額を追跡します。	
ファイナンシャルモデリングアナリスト：ビジネスアプリケーションの総支出を追跡します。アナリスト：過去の傾向に基づいて、ビジネスサービスの将来の総コストを予測します。ビジネスサービスを顧客のニーズや組織の目標に合わせて絶えず再調整する必要があります。	cost_transparency_analyst

インジケーター

会計四半期ごとの経費合計 - ビジネスサービスコストモデル

このインジケーターは、ビジネスサービスと第 2 レベルの原価計算 - ビジネスサービスコストモデルの事業部門の会計四半期ごとの総コストデータを収集します。



会計四半期ごとの経費合計ブレークダウン - ビジネスサービスコストモデル

このインジケーターは、ビジネスサービスから第 2 レベルのコストモデルの事業部門にロールアップされる、会計四半期のコスト割り当てアグリゲートデータを収集します。

ブレークダウン



- 事業部門。
- ビジネスサービス。

データの可視化

タイトル	タイプ	説明
ドライバーによるビジネスサービス	棒 	割り当て元のバケットごとに積み重ねられたビジネスサービスに費やされた合計金額を表示します。
ワークステーションあたりの平均エンタープライズコスト	スプライン 	過去 4 期の四半期のワークステーションあたりの平均単位コストの傾向を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
CPU あたりの平均エンタープライズコスト	スプライン 	CPU あたりの平均単位コストの傾向を表示します。
事業部門 - ビジネスサービス	ピボット 	過去 4 期の四半期に事業部門がビジネスサービスに費やした分割金額を表形式で表示します。

ファイナンシャルマネジメント 第 **3** レベルの原価計算 **-** ビジネス機能ダッシュボード **-** 従来

第 3 レベルの原価計算 – ビジネス機能ダッシュボードは、四半期および年度累計の事業部門またはビジネス機能にドリルダウンされた総支出に対するエグゼクティブビューを提供します。ダッシュボードは、ビジネス機能をサポートするコストの可視化を提供し、ビジネスケイパビリティに合わせたビジネスケイパビリティの観点から価値を伝えるのに役立ちます。

重要:

この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

ダッシュボードは、第 3 レベルの原価計算 - ビジネス機能コストモデルに基づいています。このモデルは、ビジネスアプリケーションに関連付けられた実際のケイパビリティを高レベルのビジネスケイパビリティと整合させます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

第 3 レベルの原価計算 - ビジネス機能ダッシュボード



エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
ファイナンシャルモデリングアナリスト：ビジネスアプリケーションの総支出を追跡します。	cost_transparency_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

エンドユーザーと目標	必要なロール
アドミン：各事業部門に合わせてビジネスケイパビリティに費やされた金額を追跡します。	
ファイナンシャルモデリングアナリスト：ビジネスアプリケーションの総支出を追跡します。アナリスト：過去の傾向に基づいて、ビジネスケイパビリティの将来の総コストを予測します。変化するビジネストレンドや要件に合わせてビジネスケイパビリティを常に再調整する必要があります。	cost_transparency_analyst

インジケーター

会計四半期ごとの経費合計 - ビジネスケイパビリティコストモデル

このインジケーターは、ビジネス機能と第 3 レベルの原価計算 - ビジネスケイパビリティコストモデルの事業部門の会計四半期ごとの総コストデータを収集します。

会計四半期ごとの経費合計ブレークダウン - ビジネスケイパビリティコストモデル

このインジケーターは、ビジネスケイパビリティから第 3 レベルのコストモデルの事業部門にロールアップされる、会計四半期のコスト割り当てアグリゲートデータを収集します。


ユーザーごとのコスト平均

ユーザーあたりの平均ビジネス機能コストの計算に使用される計算式。

ブレークダウン



- 事業部門。
- ビジネスケイパビリティ。

データの可視化

タイトル	タイプ	説明
ドライバーによるビジネス機能	棒 	割り当て元のバケット (コストプール) ごとに積み重ねられたビジネス機能に費やされた合計金額を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
CPU あたりの平均エンタープライズコスト	スプライン 	CPU あたりの平均単位コストの傾向を表示します。
事業部門 - ビジネス機能	ピボット 	過去 4 期の四半期に事業部門がビジネス機能に費やした金額を表形式で表示します。

金銭的利益計画と金銭以外の利益計画

利益計画は、作業アイテムの実行時に作業アイテムによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。利益計画を作成して、会計期間のカテゴリの推定利益を指定できます。

金銭的利益計画と非金銭的利益計画は、それぞれ予定利益と非予定利益をキャプチャします。金銭的利益計画と非金銭的利益計画をお互いに関連付けて、ハイブリッド利益計画の作業アイテムによって発生する潜在的な利益 (財務的および非財務的) をキャプチャできます。

プロジェクト管理 **(PM)** の利益計画

- プロジェクトの金銭的利益計画の作成
- プロジェクトの金銭以外の利益計画の作成
- プロジェクトの金銭的利益計画と非金銭的利益計画の関連付け

デマンド管理 の利益計画

- デマンドの金銭的利益計画の作成
- デマンドの金銭以外の利益計画の作成
- デマンドの金銭的利益計画と非金銭的利益計画の関連付け

アジャイル開発 **2.0** の利益計画

- アジャイル開発エピックの金銭的利益計画を作成する
- アジャイル開発エピックの非金銭的利益計画を作成する
- アジャイル開発エピックの金銭的利益計画と非金銭的利益計画の関連付け

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) の利益計画

- SAFe エピックの金銭的利益計画を作成する
- SAFe エピックの非金銭的利益計画を作成する
- SAFe エピックの金銭的利益計画と非金銭利益計画の関連付け

PPM 向け戦略的支出トラッキング

プロジェクトマネージャーまたはデマンドマネージャーは、PPM 向け戦略的支出トラッキング を使用して、組織のプロジェクトとデマンドの戦略的価値を評価できます。デマンドとプロジェクトを実行する目的とメリット、およびそれらが会社の戦略と目標の達成にどのように貢献しているかを特定できます。

PPM 向け戦略的支出トラッキング を使用して、デマンドマネージャーとプロジェクトマネージャーは、デマンドまたはプロジェクトの実行中に資金が、どこでどのように費やされているかを判別できます。

組織は通常、目標達成のために割り当てられる資金である投資予算を決定し、承認します。PPM 向け戦略的支出トラッキング は、デマンドとプロジェクトを通じて投資予算を割り当て、組織の目標を達成するための支出をトラッキングすることに重点を置いています。

各デマンドとプロジェクトは、1 つまたは複数の組織目標の達成に貢献します。PPM 向け戦略的支出トラッキング を使用して、次のタスクを実行できます。

- 複数の戦略と目標をデマンドまたはプロジェクトに関連付けます。
- 1 つ以上の戦略と目標の達成に向けて、デマンドまたはプロジェクトの総コストと利益の割合を割り当てます。
- 会計年度におけるデマンドまたはプロジェクトについて、戦略と目標の割り当てのブレークダウンを生成します。
- 戦略および目標レコードのさまざまなデマンドとプロジェクトから、戦略と目標のブレークダウンのロールアップを表示します。
- 組織の財務実績を正確に把握するために、PPM 向け戦略的支出トラッキング ダッシュボードを使用して、組織の目標と戦略に沿ったプロジェクトの計画コスト、実際のコスト、および利益の経時的な傾向を表示できます。

PPM 向け戦略的支出トラッキング のインストール

ServiceNow Store アプリケーションから PPM 向け戦略的支出トラッキング アプリケーションをインストールします。 ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

始める前に

インストールと設定をスムーズに行うには、次のセットアップチェックリストを完了してください。

設定チェックリスト

セットアップタスク	説明
PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) が有効化されていることを確認します。	移動先 サブスクリプション管理 > サブスクリプション インスタンス内にありますリストには、組織で購入したサブスクリプションが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

必要なロール：admin

このタスクについて
PPM 向け戦略的支出トラッキング をインストールする前に、ServiceNow インスタンスの PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) をアクティブ化します。詳細については、「PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理) の有効化」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してアプリケーションを検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることもあります。

   ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

3. リストからバージョンを選択し、[インストール] を選択します。

   表示される [インストールの詳細を確認] ダイアログボックスに、アプリケーションとともにインストールされている依存関係が一覧表示されます。

4. プロンプトが表示された場合は、ServiceNow Store へのリンクに従って、依存関係のエンタイトルメントを取得します。
5. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。
   デモデータは、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードです。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。
6. **[Install** (インストール)] を選択します。

関連情報

プラグインのリスト (Yokohama)

Strategic Spend Tracking for PPM とともにインストールされるコンポーネント

Strategic Spend Tracking for PPM が有効になると、いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、スケジュール済みジョブなど) がインストールされます。

> **注:**
> アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

この機能ではデモデータを利用できます。

インストールされたスケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
Strategic Spend Tracking - プロジェクトとデマンドの戦略/目標割り当てブレークダウンを生成 (PPM Strategic Spend Tracking	関連付けられたプロジェクトとデマンドの戦略と目標の割

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スケジュール済みジョブ	説明
- Generate Strategy/Goal Allocation Breakdowns for Projects and Demands)	り当てブレークダウンを生成します。
Strategic Spend Tracking - 戦略と目標の割り当てによるプロジェクトとデマンドの更新 (PPM Strategic Spend Tracking - Update projects and Demands with strategy and goal allocations)	関連付けられたプロジェクトとデマンドの戦略と目標の割り当てを更新します。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
BO ジョブ実行ログ [sn_ppm_sst_run_log]	実行時間や含まれているタスクなど、スケジュール済みジョブの実行に関する情報を保存します。
目標割り当て [sn_ppm_sst_task_goal]	プロジェクトまたはデマンドの目標割り当ての詳細を保存します。詳細には、プロジェクトまたはデマンド番号、戦略名、戦略に割り当てられた割合、予算、計画コスト、実際のコスト、および利益合計が含まれます。
目標割り当てブレークダウン [sn_ppm_sst_goal_allocation_breakdown]	プロジェクトまたはデマンドの目標ブレークダウンの詳細を保存します。詳細には、会計年度、戦略割り当て金額、コストの詳細 (計画と実績)、投資と経費の金額 (計画と実績) が含まれます。
戦略割り当て [sn_ppm_sst_task_strategy]	プロジェクトまたはデマンドの戦略割り当ての詳細を保存します。詳細には、プロジェクトまたはデマンド番号、戦略名、戦略に割り当てられた割合、予算、計画コスト、実際のコスト、および利益合計が含まれます。
戦略割り当てブレークダウン [sn_ppm_sst_strategy_allocation_breakdown]	プロジェクトまたはデマンドの戦略ブレークダウンの詳細を保存します。詳細には、会計年度、戦略割り当て金額、コストの詳細 (計画と実績)、投資と経費の金額 (計画と実績) が含まれます。

プロジェクトの戦略と目標の割合の割り当てまたは変更

プロジェクトの総コスト、利益、および予算の割合を割り当てて、プロジェクトが達成する戦略的目標の達成に役立てます。割り当てられた割合に基づいて、プロジェクトの財務データのブレークダウンを表示することもできます。

始める前に
既存のプロジェクトが必要です。

次のスケジュール済みジョブを実行します。

- *PPM Strategic Spend Tracking - Update projects and demands with strategy and goal allocations*
- *PPM Strategic Spend Tracking - Generate Strategy/Goal Allocation Breakdowns for Projects and Demands*

必要なロール：it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 プロジェクト管理 > プロジェクト > すべて.
2. 割り当て率の追加や更新の対象にするプロジェクトを選択します。
3. [ビジネスケース] タブで、プロジェクトが関連付けられている戦略と目標を追加または更新します。
   詳細については、「プロジェクトの作成 」ドキュメントトピックの [ビジネスケース] フィールドの説明を参照してください。
4. [保存] をクリックします。
   選択した戦略と目標が、[戦略割り当て] 関連リストと [目標割り当て] 関連リストに表示されます。
5. 戦略と目標の割り当てを更新します。
   a. [戦略割り当て] 関連リストで、[割り当て率 **(% Allocation)**] フィールドをクリックし、このプロジェクトが選択した組織戦略に貢献する割合を入力します。
   b. [目標割り当て] 関連リストで、[割り当て率 **(% Allocation)**] フィールドをクリックし、このプロジェクトが選択した組織目標に貢献する割合を入力します。

   注:
   プロジェクトの戦略または目標の割り当ての合計は 100% を超えないようにする必要があります。
6. [戦略と目標の割り当てを再計算] 関連リンクをクリックして、割り当てタブのコストフィールドの値を更新します。
7. [更新] をクリックします。
8. オプション: [戦略割り当て] または [目標割り当て] 関連リストで、[プレビュー] アイコン ( ) をクリックし、[レコードを開く] をクリックして戦略または目標の割り当てブレークダウンを表示します。
9. オプション: PPM 向け戦略的支出トラッキング ダッシュボード を使用して、計画コスト、実際のコスト、および利益の経時的な傾向を表示します。

デマンドに対する戦略および目標の割合の割り当てまたは変更

デマンドに対して総コスト、利益、および予算の割合を割り当てて、デマンドによる戦略的目標の達成に役立てます。割り当てられた割合に基づいて、デマンドの財務データのブレークダウンを表示することもできます。

始める前に

既存のデマンドが必要です。

次のスケジュール済みジョブを実行します。

- *PPM Strategic Spend Tracking - Update projects and demands with strategy and goal allocations*
- *PPM Strategic Spend Tracking - Generate Strategy/Goal Allocation Breakdowns for Projects and Demands*

必要なロール：it_demand_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 デマンド > デマンド > すべて.
2. 割り当て率の追加や更新の対象にするデマンドを選択します。
3. [ビジネスケース] タブで、デマンドが関連付けられている戦略と目標を追加または更新します。詳細については、「デマンドフォーム」ドキュメントトピックの [ビジネスケース] フィールドの説明を参照してください。
4. [保存] をクリックします。
   選択した戦略と目標が、[戦略割り当て] 関連リストと [目標割り当て] 関連リストに表示されます。
5. 戦略と目標の割り当てを更新します。
   a. [戦略割り当て] 関連リストで、[割り当て率 **(% Allocation)**] フィールドをクリックし、このデマンドが選択した組織戦略に貢献する割合を入力します。
   b. [目標割り当て] 関連リストで、[割り当て率 **(% Allocation)**] フィールドをクリックし、このデマンドが選択した組織目標に貢献する割合を入力します。

   注:
   デマンドの戦略または目標の割り当ての合計は 100% を超えないようにする必要があります。
6. [戦略と目標の割り当てを再計算] 関連リンクをクリックして、割り当てタブのコストフィールドの値を更新します。
7. [更新] をクリックします。
8. オプション: [戦略割り当て] または [目標割り当て] 関連リストで、[プレビュー] アイコン (ⓘ) をクリックし、[レコードを開く] をクリックして戦略または目標の割り当てブレークダウンを表示します。
9. オプション: PPM 向け戦略的支出トラッキング ダッシュボード を使用して、計画コスト、実際のコスト、および利益の経時的な傾向を表示します。

PPM 向け戦略的支出トラッキング ダッシュボード

PPM 向け戦略的支出トラッキング ダッシュボードは、ビジネスプランナーに包括的な視覚化を提供します。これにより、プロジェクトの計画コスト、実際のコスト、および利益が組織の目標と戦略にどの程度適合しているかについて、経時的な傾向を把握できます。組織の財務実績の正確な把握に役立ちます。


注:
バージョン 1.1.0 以降、 PPM 向け戦略的支出トラッキング ダッシュボードはネクストエクスペリエンス UI フレームワークで使用でき、次の場所に移動してアクセスできます。 すべて > **PPM** 向け戦略的支出トラッキング > 分析.

総経費を分析し、何がコストに寄与しているのか、どの部門および事業部門が支出しているのかをドリルダウンすることができます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[戦略の概要] タブ

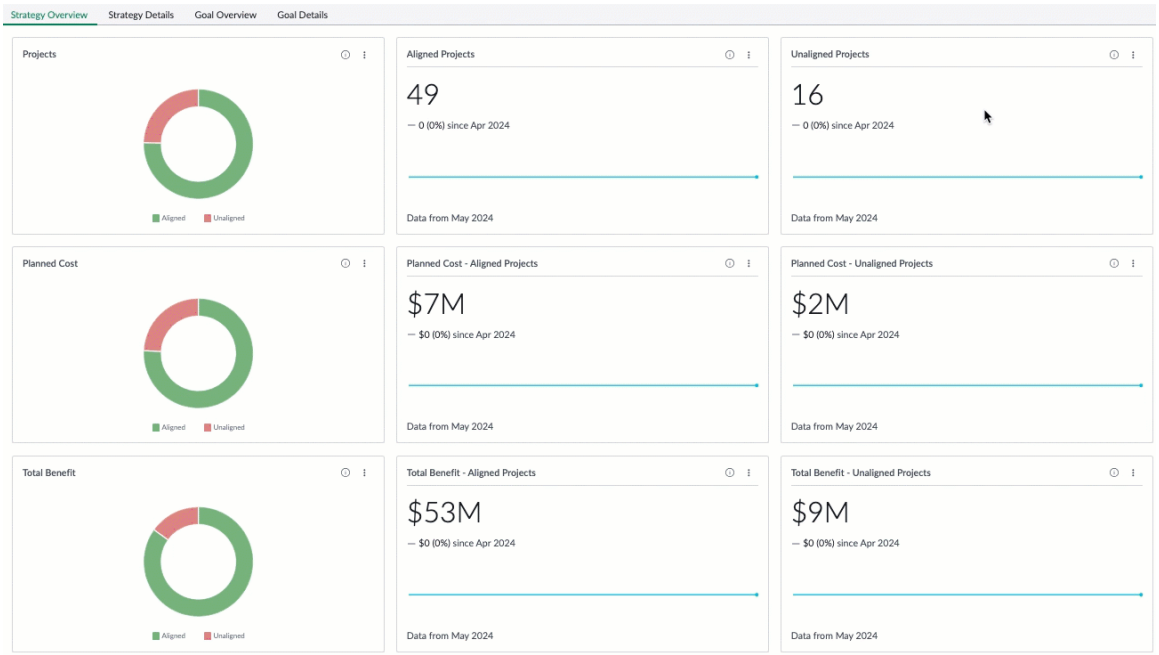


[戦略の詳細] タブ

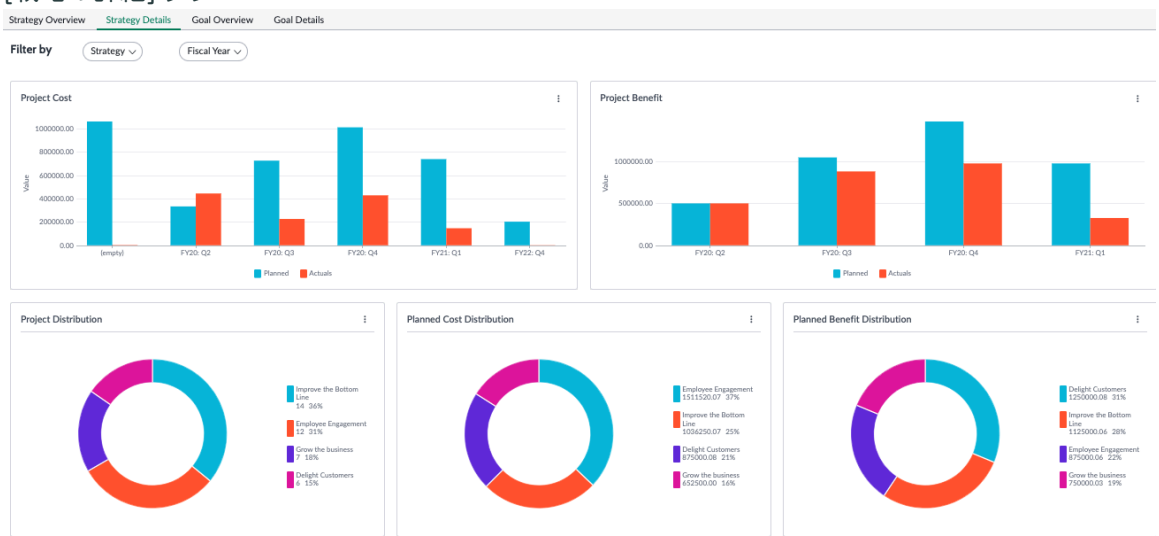


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[目標の概要] タブ

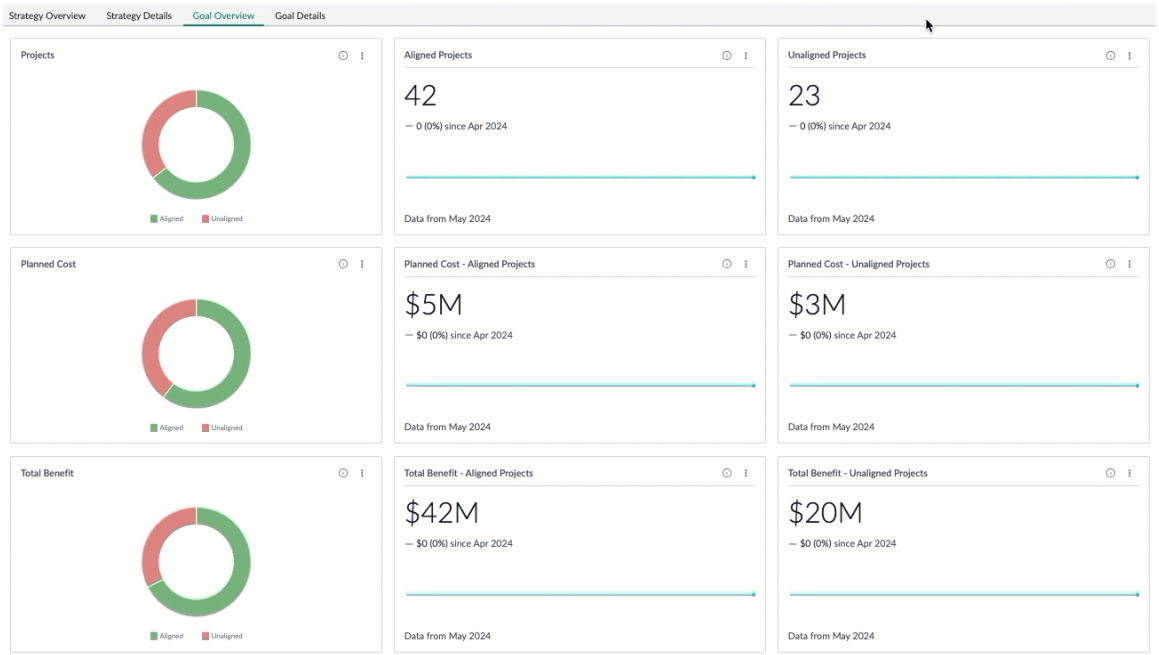

[目標の詳細] タブ

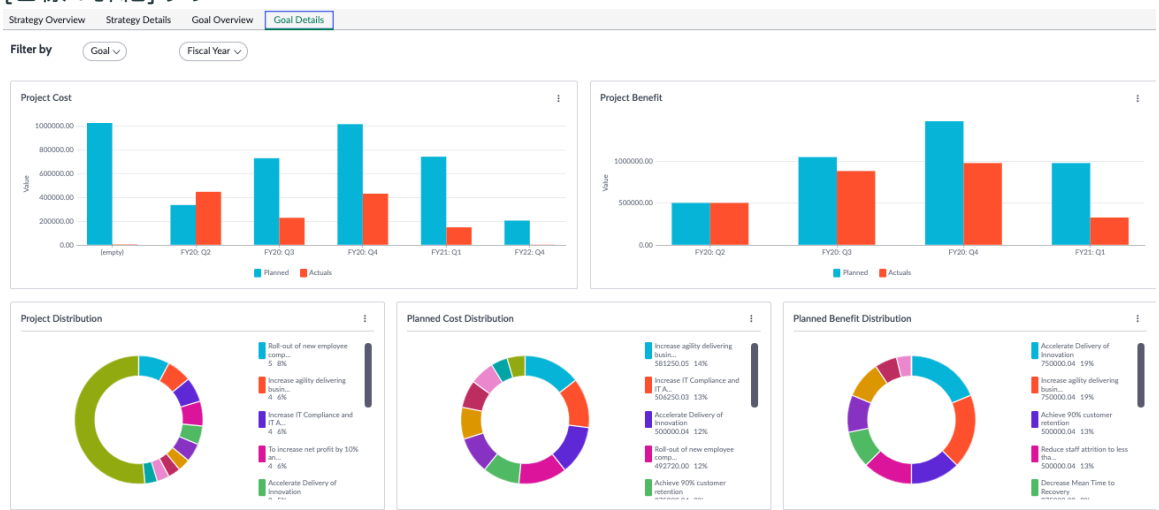

エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
事業計画者：組織内のプロジェクトとデマンドの戦略と目標に対する可視化が必要です。	business_planner

インジケーター

ダッシュボードには、戦略に関する次のインジケーターが含まれています。

プロジェクト

戦略に対して調整済みのプロジェクトと未調整のプロジェクトの比較。

調整済みプロジェクト

戦略に対して調整済みのプロジェクトの数。

未調整プロジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略に対して未調整のプロジェクトの数。

計画コスト

戦略にたいして調整済みの計画コストと未調整の計画コストの比較。

計画コスト：調整済みプロジェクト

戦略対して調整済みのすべてのプロジェクトの合計計画コスト。

計画コスト：未調整プロジェクト

戦略に対して未調整のすべてのプロジェクトの合計計画コスト。

合計メリット

戦略に対して調整済みの利益合計と未調整の利益合計の比較。

合計メリット：調整済みプロジェクト

戦略に対して調整済みのプロジェクトの利益合計。

合計メリット：未調整プロジェクト

戦略に対して調整済みのすべてのプロジェクトの利益合計。

実績

戦略に対して調整済みの実際のコストと未調整の実際のコストの比較。

実績：調整済みプロジェクト

戦略に対して調整済みのすべてのプロジェクトの実際のコストの合計。

実績：未調整プロジェクト

戦略に対して未調整のすべてのプロジェクトの実際のコストの合計。

ダッシュボードには、目標に関する次のインジケーターが含まれています。

プロジェクト

目標に対して調整済みのプロジェクトと未調整のプロジェクトの比較。

調整済みプロジェクト

目標に対して調整済みのプロジェクトの数。

未調整プロジェクト

目標に対して未調整のプロジェクトの数。

計画コスト

目標に対して調整済みの計画コストと未調整の計画コストの比較。

計画コスト：調整済みプロジェクト

目標に対して調整済みのすべてのプロジェクトの合計計画コスト。

計画コスト：未調整プロジェクト

目標に対して未調整のすべてのプロジェクトの合計計画コスト。

合計メリット

目標に対して調整済みの利益合計と未調整の利益合計の比較。

合計メリット：調整済みプロジェクト

目標に対して調整済みのすべてのプロジェクトの利益合計。

合計メリット：未調整プロジェクト

目標に対して未調整のすべてのプロジェクトの利益合計。

実績

目標に対して調整済みの実際のコストと未調整の実際のコストの比較。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

実績：調整済みプロジェクト

目標に対して調整済みのすべてのプロジェクトの実際のコストの合計。

実績：未調整プロジェクト

目標に対して未調整のすべてのプロジェクトの実際のコストの合計。



ブレークダウン

ダッシュボードには、次のブレークダウンが含まれています。

- 戦略
- 目標
- プロジェクトコスト
- プロジェクトのメリット
- 実績

データの可視化

ダッシュボードには、戦略の以下の可視化が含まれています。



タイトル	タイプ	説明
プロジェクトコスト	棒グラフ 	会計期間別にグループ化されたすべてのプロジェクトの戦略に関する、計画コストの合計と実際のコストの合計の比較。
プロジェクトのメリット	棒グラフ 	会計期間別にグループ化されたすべてのプロジェクトの戦略に関する、計画利益の合計と実際の利益の合計の比較。
プロジェクト配分	円グラフ 	戦略別のプロジェクト配分のブレークダウン。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
計画コスト配分	円グラフ 	戦略別のプロジェクト計画コスト配分のブレークダウン。
計画利益配分	円グラフ 	戦略別のプロジェクト計画利益配分のブレークダウン。

ダッシュボードには、目標の以下の可視化が含まれています。

タイトル	タイプ	説明
プロジェクトコスト	棒グラフ 	会計期間別にグループ化されたすべてのプロジェクトの目標に関する、計画コストの合計と実際のコストの合計の比較。
プロジェクトのメリット	棒グラフ 	会計期間別にグループ化されたすべてのプロジェクトの目標に関する、計画利益の合計と実際の利益の合計の比較。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
プロジェクト配分	円グラフ 	目標別のプロジェクト配分のブレークダウン。
計画コスト配分	円グラフ 	目標別のプロジェクト計画コスト配分のブレークダウン。
計画利益配分	円グラフ 	目標別のプロジェクト計画利益配分のブレークダウン。

自動翻訳

プロジェクトポートフォリオ管理 プラットフォームアナリティクスソリューション

プラットフォームアナリティクスソリューション には事前構成済みのダッシュボードが含まれます。これらのダッシュボードには、アクション可能なデータ表示方法が豊富に用意されており、ビジネスプロセスとビジネスプラクティスの改善に役立ちます。

プラットフォームアナリティクス データの可視化では、 パフォーマンスアナリティクス インジケーター データを使用してデータを経時的に表示し、ビジネスプロセスを分析して改善が必要な領域を特定するのに役立ちます。プラットフォームアナリティクスソリューション を使用すると、最小限のセットアップで パフォーマンスアナリティクス からアプリケーションに関する値を取得できます。いつでも独自のオブジェクトを作成することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ソリューションで プロジェクトポートフォリオ管理を有効にするには、アドミニストレーターとしてログインし、 パフォーマンスアナリティクス > ガイド付きセットアップ.[開始する **(Get Started)**] をクリックして、PPM Standard ダッシュボードのセクションにスクロールします。ガイド付きセットアップに従って、セットアップと構成のすべての手順を実行します。

または、パフォーマンスアナリティクス – コンテンツパック – PPM Standard プラグイン (com.snc.pa.pmo_dashboards) を有効化します。

com.snc.pa.pmo_dashboards プラグインを有効化すると、次のプラグインも有効化されます。

- PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo)
- パフォーマンスアナリティクス – コンテンツパック – Project Portfolio Suite ダッシュボード (com.snc.pps_dashboards)

次のいずれかのナビゲーションリンクを使用して、PMO ダッシュボードにアクセスします。

- プロジェクト管理 > ポートフォリオ > ポートフォリオダッシュボード.
- プロジェクト管理 > プログラム > プログラムダッシュボード.
- セルフサービス > ダッシュボード. 検索フィールドを使用して、「**PMO** ダッシュボード」を検索します。
- タイムシート > タイムシートポータル > タイムシートダッシュボード.

ダッシュボードを開く際に使用したナビゲーションリンクに応じたデータが、ダッシュボードに表示されます。

ドメインセパレーションと「別のユーザーとして実行」ユーザー

一部のソリューションでは、システムアドミニストレーターは、プラットフォームアナリティクス ソリューション のデータコレクションジョブの [別のユーザーとして実行] ユーザーです。他のソリューションでは、データコレクションジョブの [別のユーザーとして実行] ユーザーは空白のままです。[別のユーザーとして実行] ユーザーがインスタンスに存在すること、およびこのユーザーが適切なレベルのアクセス権を持っているかどうかを確認してください。不適切な別のユーザーとして実行ユーザーでは、エラーが発生したり、収集されるデータが制限されたりすることがあります。この設定は、ドメインセパレーションが有効になっている場合のみ効果があります。

このソリューションの古いバージョン

このソリューションは、Project Portfolio Suite (com.snc.pa.ppm) ソリューションに取って代わるものです。前バージョンのソリューションを有効化してからインスタンスをアップグレードした場合は、以前のソリューションが残り、それを引き続き使用できます。既存のインジケーターやブレークダウンからデータを失うことなく、新しいバージョンを有効化することもできます。新しいバージョンを有効化する場合は、履歴データコレクションジョブを実行して、タイムシートダッシュボードに新しいインジケーターとブレークダウンを設定します。

関連情報

パフォーマンスアナリティクスサブスクリプションのアクティブ化

PMO ダッシュボード

PMO ダッシュボードは、ポートフォリオマネージャーとプログラムマネージャーに包括的なレポートを提供します。このダッシュボードは プラットフォームアナリティクス を使用して、履歴データの傾向と定期的なレポートを提供します。投資の概要を示し、今後取り込み予定のパイプラインビューと今後の日付のカレンダービューを提供します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
PMO ダッシュボードは、ネクストエクスペリエンス UI フレームワークで利用でき、[アナリティクスポートフォリオ] からアクセスできます。ネクストエクスペリエンスでは、次の機能はサポートされていません。

- [パイプライン] タブの [パイプラインの詳細] ペイン。
- [カレンダー] タブの [に基づくハイライト] リストと [すべてのレコードを表示] リンク。

ネクストエクスペリエンス UI の PMO ダッシュボード

このアニメーションは、PMO ダッシュボードのすべてのデータ可視化をタブごとに表示します。これらは、このトピックの「データの可視化」セクションで説明されています。

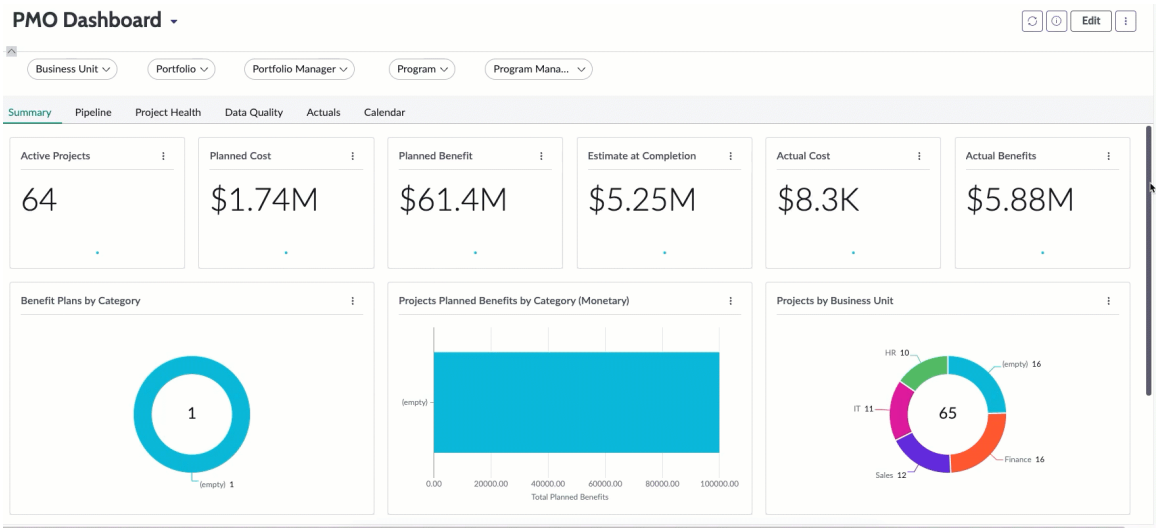

エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
ポートフォリオマネージャー：ポートフォリオ内のプログラム、プロジェクト、デマンド、および実行する必要があるアクションに対する可視化が必要です。	it_portfolio_manager
プログラムマネージャー：プログラム内のプロジェクトとデマンド、および実行する必要があるアクションに対する可視化が必要です。	it_program_manager
プロジェクトマネージャー：ダッシュボードにアクセスできます。	it_project_manager

インジケーター

ダッシュボードの [サマリー]、[パイプライン]、[プロジェクトの健全性] タブには、次のインジケーターを持つウィジェットが含まれます。プロジェクトのデータは [pm_project] テーブルから、デマンドのデータは [dmn_demand] テーブルから、アイデアのデータは [idea] テーブルから収集されます。

PPM – アクティブなプロジェクトの数

アクティブなプロジェクトの数。プロジェクトは、実際の終了日が <after today> または <empty> の場合にアクティブとみなされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> プロジェクトの [実際の終了日 (Actual End Date)] が将来の日付で、かつプロジェクトが [クローズ済み] ステータスの場合、そのプロジェクトはレポートでアクティブとして扱われます。

PPM – 予定時間数よりも少ない割り当て済み時間

割り当てられた時間数が予定時間数よりも少ないリソース計画のあるアクティブなプロジェクトの数

PPM – 進行ステータスが [オープン]、[処理待ち]、[対応中] のアクティブなプロジェクト

進行ステータスが [オープン]、[処理待ち]、[対応中] のアクティブなプロジェクトの数。

PPM – アクティブな赤いプロジェクトの数

全体的に赤のステータスであるアクティブなプロジェクトの数。

PPM – オープンプロジェクトの合計経過時間

すべてのアクティブなプロジェクトの合計経過時間 (日数)。これは、アクティブなプロジェクトの開始予定日とインジケータースコアが収集された日付との差です。このインジケーターは、オープンプロジェクトの平均経過時間を計算するために使用されます。

PPM – 計画コスト

すべてのアクティブなプロジェクトの合計計画コスト。

PPM – 実際のコスト

すべてのアクティブなプロジェクトの実際のコストの合計。

PPM – 負の ROI のあるアクティブなプロジェクトの数

投資利益率がマイナスになっているアクティブなプロジェクトの数。

PPM – Estimate at Completion

すべてのアクティブなプロジェクトの完了時の合計コスト概算。

PPM – 高リスクのプロジェクトの数

[処理待ち] ステータスで、確率が [絶対 (Absolute)] または [高] であるリスクのあるアクティブなプロジェクトの数。

PPM – 最重要の問題のあるプロジェクトの数

ステータスが [オープン] または [対応中] で、[最重要] の問題があるアクティブなプロジェクトの数。

PPM – 実行されなかったマイルストーンを含むプロジェクトの数

本日より前の終了予定日が指定されたマイルストーンがあるアクティブなプロジェクトの数。

PPM – アクティブな期限切れプロジェクトの数

本日より前の終了予定日があるアクティブなプロジェクトの数。

PPM – 未割り当てリソース

[計画]、[要求済み]、または [確認済み] ステータスのリソース計画がある、[対応中] ステータスのプロジェクトの数。

PPM – 実際の時間よりも少ない割り当て済時間

実際の時間が割り当てられた時間よりも長いリソース計画のあるアクティブなプロジェクトの数。

PPM – 計画利益

すべてのアクティブなプロジェクトの合計計画利益。

PPM – 実際の利益

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

すべてのアクティブなプロジェクトの実際の利益の合計。

PPM – 最重要の変更要求があるプロジェクトの数

ステータスが [オープン] で優先度が [最重要] のプロジェクト変更要求があるアクティブなプロジェクトの数。

PPM – 今月の合計デマンドの数

指定された月の [ドラフト] 以外のステータスのデマンドの数。

PPM – 今月のプロジェクトでのデマンドの数

指定された月にプロジェクトに変換されたデマンドの数。

PPM – 送信済み、スクリーニング、認定済み、または承認済みのオープンデマンド

[送信済み]、[スクリーニング]、[認定済み]、または [承認済み] ステータスのデマンドの数。

PPM – 送信済み、スクリーニング、認定済み、承認済みステータスのオープンデマンドの合計経過時間

[送信済み]、[スクリーニング]、[認定済み]、または [承認済み] ステータスのアクティブなデマンドの合計経過時間 (日数)。これは、デマンドの作成日とインジケータースコアの収集日との差です。このインジケーターは、オープンデマンドの平均経過時間を計算するために使用されます。

PPM – 今月のプロジェクトのデマンドの合計経過時間

指定された月にプロジェクトに変換されたすべてのデマンドの合計経過時間 (日数)。これは、デマンドの作成日と対応するプロジェクトの作成日の差の合計です。このインジケーターは、デマンドがプロジェクトになるまでの平均経過時間の計算に使用されます。

PPM – オープンなアイデアの数

[送信済み] ステータスでデマンドが関連付けられていないアイデアの数。

PPM – オープンなアイデアの合計経過時間

アイデアがデマンドに変換される前に、[送信済み] ステータスであった合計日数。

PPM – 今月の合計アイデア数

指定された月に作成された、[ドラフト] ステータス以外のアイデアの数。

PPM – 今月のデマンドありのアイデアの数

指定された月にデマンドに変換されたアイデアの数。

ダッシュボードでは、次の式インジケーターも使用されます。式インジケーターは、前述のいくつかのインジケーターに基づいています。

PPM – オープンプロジェクトの平均経過時間

プロジェクトが [処理待ち]、[オープン]、[対応中] ステータスである平均日数。このインジケーターは、**[PPM – オープンプロジェクトの合計経過時間]** と **[PPM – アクティブプロジェクトの数]** インジケーターを使用して計算されます。

PPM – 過去 12 か月のアイデアからデマンドへの割合

過去 12 か月にデマンドに変換されたアイデアの割合。

PPM – 過去 12 か月のデマンドからプロジェクトへの平均経過時間

デマンドがプロジェクトに変換されるまでの平均日数。

PPM – 過去 12 か月のデマンドからプロジェクトへの割合

過去 12 か月にプロジェクトに変換されたデマンドの割合。

PPM – オープンデマンドの平均経過時間

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デマンドが [送信済み]、[スクリーニング]、[認定済み]、または [承認済み] ステータスで、プロジェクトに変換されていない状態の平均日数。

PPM – オープンなアイデアの平均経過時間

アイデアがデマンドに変換される前に、[送信済み] ステータスであった平均日数。

PPM – ポートフォリオの健全性

全体的に赤のステータスのアクティブなプロジェクト、期限切れのアクティブなプロジェクト、および最重要な問題のあるアクティブなプロジェクトに基づく、ポートフォリオ健全性の割合。

ブレークダウン


- 事業部門
- デマンドのカテゴリ
- デマンドマネージャー
- デマンドのステータス
- デマンドタイプ
- 部門
- 影響
- ポートフォリオ
- ポートフォリオマネージャー
- 優先度
- プログラム
- プログラムマネージャー
- T シャツサイズ
- 実行タイプ
- 投資クラス
- 投資タイプ
- プロジェクトマネージャー
- プロジェクトフェーズ
- プロジェクトのステータス
- プロジェクトステータス
- 総合健全性

データの可視化

ダッシュボードには、以下の可視化が含まれています。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
カテゴリ別の利益計画	円グラフ 	アクティブなプロジェクトの各カテゴリにおける、利益計画数のブレークダウン。
カテゴリ別のプロジェクトの計画利益 (金銭的)	水平棒グラフ 	アクティブなプロジェクトの各カテゴリにおける、計画予定利益の合計。
事業部門別のプロジェクト	円グラフ 	各事業部門のアクティブなプロジェクト数のブレークダウン。
投資タイプ別のプロジェクト	円グラフ 	投資タイプ別にグループ化されたアクティブなプロジェクト数のブレークダウン。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
投資クラス別のプロジェクト	円グラフ 	投資クラス別にグループ化されたアクティブなプロジェクト数のブレークダウン。
優先度別のプロジェクト	水平棒グラフ 	優先度別にグループ化されたアクティブなプロジェクト数のブレークダウン。
プロジェクト時間カテゴリ別の時間	線グラフ 	各プロジェクト時間カテゴリのタイムカードで報告された合計時間の傾向。傾向は、前四半期の初めから次の四半期の終わりまで表示されます。
アクティブなデマンド	単一スコア 	プロジェクトが関連付けられていない、[送信済み]、[スクリーニング済み (Screened)]、[認定済み]、および [承認済み] ステータスのデマンドの数。
デマンド – マネージャーなし	単一スコア 	デマンドマネージャーが関連付けられていないアクティブなデマンドの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
デマンド – ビジネスケースなし	単一スコア 	ビジネスケースのないアクティブなデマンドの数。
デマンド – 計画コストなし	単一スコア 	合計計画コストがゼロのアクティブなデマンドの数。
デマンド – 開始日なし	単一スコア 	開始日のないアクティブなデマンドの数。
デマンド – 投資クラスなし	単一スコア 	投資クラスが関連付けられていないアクティブなデマンドの数。
デマンド – 予算コストなし	単一スコア 	資本がゼロかつ経費予算がゼロのアクティブなデマンドの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
デマンド – 期日なし	単一スコア 	期日のないアクティブなデマンドの数。
デマンド – 投資タイプなし	単一スコア 	投資タイプが関連付けられていないアクティブなデマンドの数。
デマンド – 予定利益なし	単一スコア 	予定利益がないアクティブなデマンドの数。
デマンド – ポートフォリオなし	単一スコア 	ポートフォリオが関連付けられていないアクティブなデマンドの数。
デマンド – プログラムなし	単一スコア 	プログラムが関連付けられていないアクティブなデマンドの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
デマンド – ROI なし	単一スコア 	投資利益率がないアクティブなデマンドの数。
アクティブなプロジェクト	単一スコア 	実際の終了日が <after today> または <empty> のプロジェクトの数。
プロジェクト – マネージャーなし	単一スコア 	プロジェクトマネージャーが関連付けられていないアクティブなプロジェクトの数。
プロジェクト – ビジネスケースなし	単一スコア 	ビジネスケースのないアクティブなプロジェクトの数。
プロジェクト – 計画コストなし	単一スコア 	合計計画コストがゼロのアクティブなプロジェクトの数。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
プロジェクト – タスクなし	単一スコア 	プロジェクトタスクが関連付けられていないアクティブなプロジェクトの数。
プロジェクト – 投資クラスなし	単一スコア 	投資クラスが関連付けられていないアクティブなプロジェクトの数。
プロジェクト – 予算コストなし	単一スコア 	予算コストがゼロのアクティブなプロジェクトの数。
プロジェクト – 説明なし	単一スコア 	説明のないアクティブなプロジェクトの数。
プロジェクト – 投資タイプなし	単一スコア 	投資タイプが関連付けられていないアクティブなプロジェクトの数。






自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
プロジェクト – 計画利益なし	単一スコア 	計画利益がゼロのアクティブなプロジェクトの数。
プロジェクト – ポートフォリオなし	単一スコア 	ポートフォリオが関連付けられていないアクティブなプロジェクトの数。
プロジェクト – プログラムなし	単一スコア 	プログラムが関連付けられていないアクティブなプロジェクトの数。
プロジェクト – ROI なし	単一スコア 	計画された投資利益率がないアクティブなデマンドの数。
計画コスト、予算、実際のコストの比較	棒グラフ 	会計期間別にグループ化されたアクティブなプロジェクトの計画コスト、予算、実際のコストのそれぞれの合計の比較。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
割り当てられた時間と実際の時間	ステップライングラフ 	アクティブなプロジェクトに関連付けられているリソース計画に対して、割り当てられた時間の合計と実際の時間の合計の月次傾向。
計画利益と実績利益	棒グラフ 	会計期間別にグループ化されたアクティブなプロジェクトにおける、計画財務利益の合計と実際の財務利益の合計の比較。
金銭以外の計画利益と実績利益	棒グラフ 	会計期間別にグループ化されたアクティブなプロジェクトの財務以外の合計計画利益と実際利益の比較。
カテゴリ別の計画利益と実績利益	棒グラフ 	アクティブなプロジェクトの各利益計画カテゴリにおける、計画財務利益の合計と実際の財務利益の合計の比較。
プロジェクトの完了カレンダー	カレンダー 	プロジェクト、プロジェクトタスク、およびマイルストーンの終了予定日のカレンダービュー。

アナリティクスタイムシート

アナリティクスタイムシートは、タイムカード承認者とタイムカードユーザーに、包括的なタイムシートアクティビティとレポートを提供します。ダッシュボードはパフォーマンスアナリティクスを使用して、履歴データの傾向と定期的なレポートを提供します。リソースのタイムシートアクティビ


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


ティの概要、タイムシートの承認と却下率、割り当て超過および割り当て不足のリソース数を示します。

重要:
Yokohama リリース以降、タイムシートダッシュボードは、新規顧客向けにアナリティクスタイムシートに名前が変更されています。

[概要] タブ

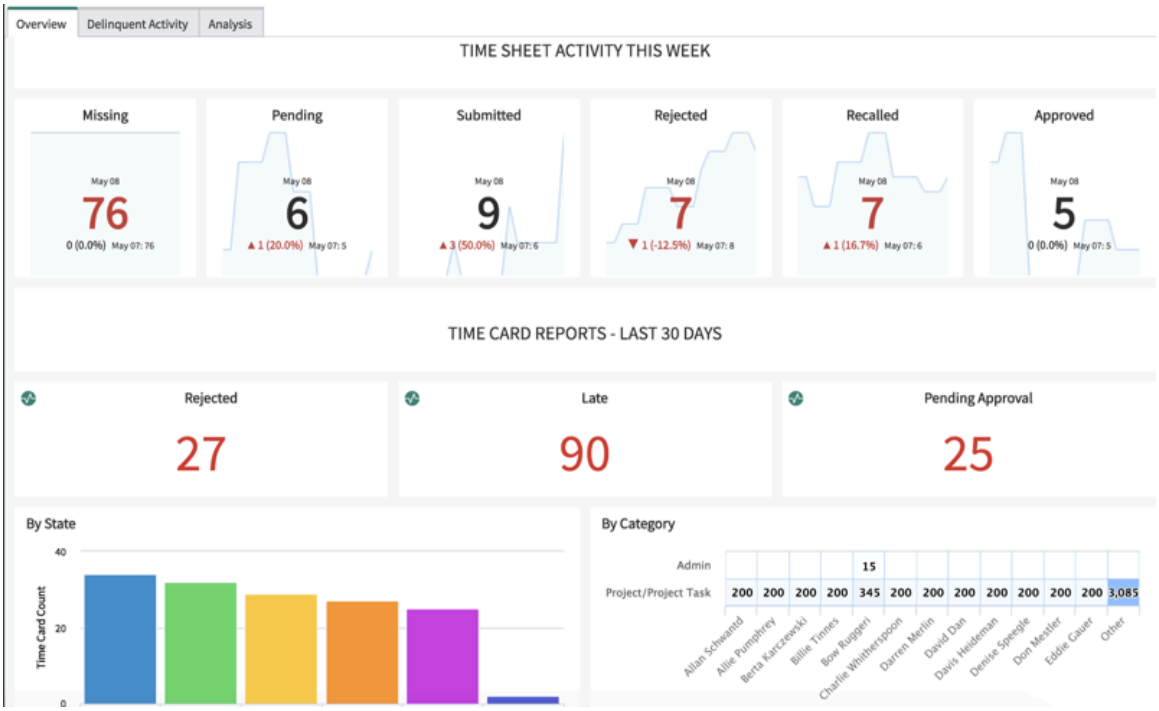


[延滞アクティビティ] タブ

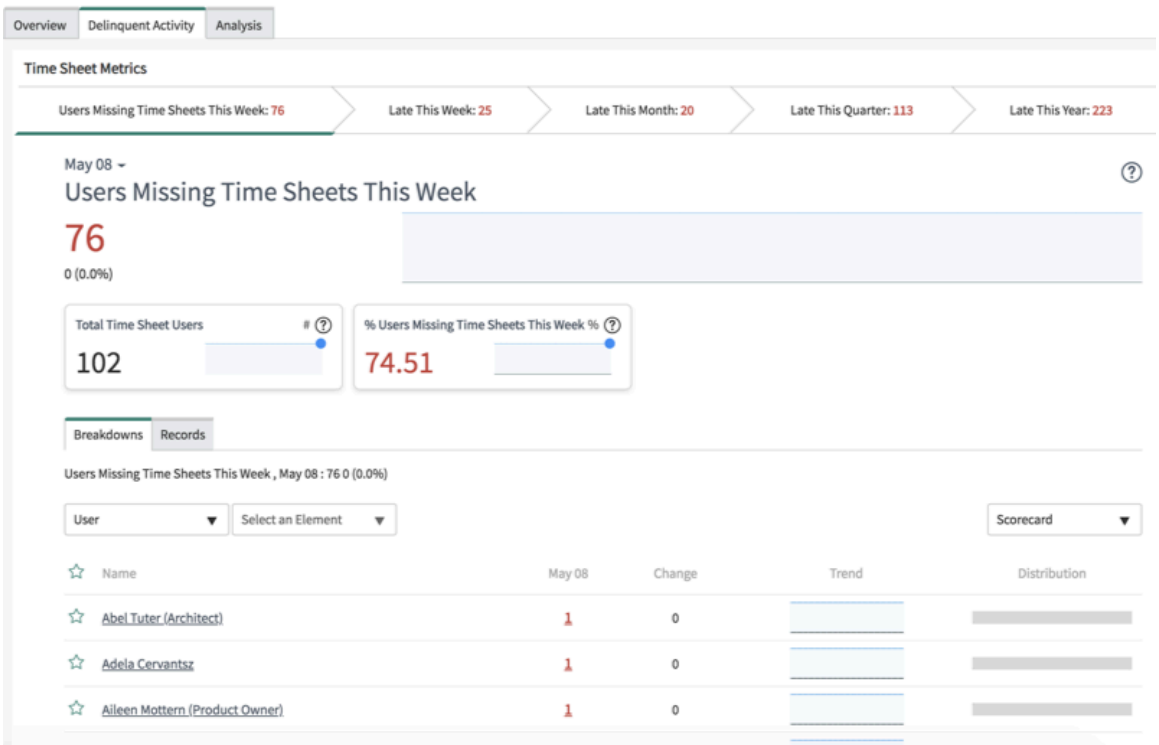

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[分析] タブ

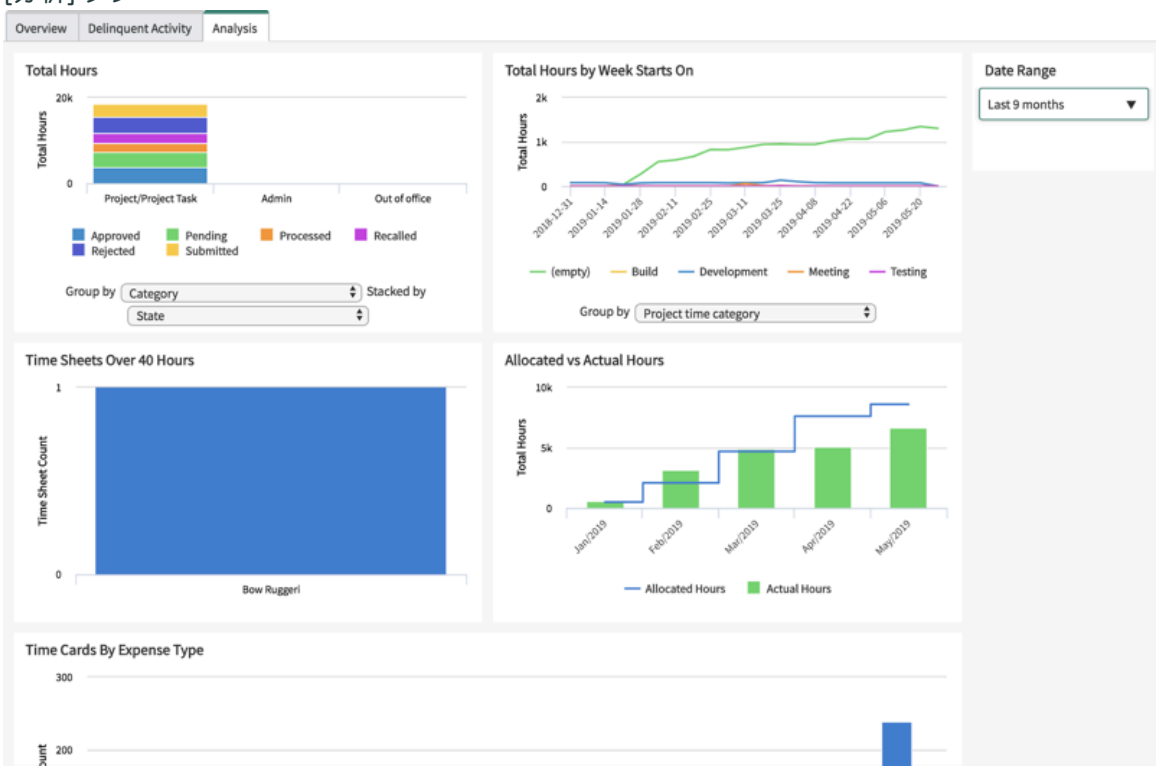

エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
ポートフォリオマネージャー：リソースのタイムシートアクティビティと実行する必要があるアクションに対する可視化が必要です。	it_portfolio_manager
プログラムマネージャー：リソースのタイムシートアクティビティと実行する必要があるアクションに対する可視化が必要です。	it_program_manager
プロジェクトマネージャー：ダッシュボードにアクセスできます。	it_project_manager
タイムカード承認者：リソースのタイムシートアクティビティと実行する必要があるアクションに対する可視化が必要です。	timecard_approver
PPM のビジネスステークホルダー：リソースのタイムシートアクティビティと実行する必要があるアクションに対する可視化が必要です。	sn_ppm_read

インジケーター

ダッシュボードの [概要]、[延滞アクティビティ]、[分析] タブには、以下のインジケーターを持つウィジェットが含まれます。タイムシートとタイムカードのデータは [time_sheet] テーブルから収集され、ユーザーのデータは [users] テーブルから収集されます。

PPM – アクティブなタイムシートユーザー

timecard_user ロールを持つアクティブなユーザーの数。

PPM – 今年遅れた割合

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

今年遅れたタイムシートの割合。

PPM – 今週遅れた割合

今週遅れたタイムシートの割合。

PPM – 今四半期遅れた割合

今四半期に遅れたタイムシートの割合。

PPM – 今月遅れた割合

今月遅れたタイムシートの割合。

PPM – 今月遅れたタイムシート

今月遅れたタイムシートの数。インジケーターには、[承認済み] または [処理済み] ステータス以外の、先週までの当月のタイムシートが含まれます。

PPM – 今四半期遅れたタイムシート

今四半期遅れたタイムシートの数。インジケーターには、[承認済み] または [処理済み] ステータス以外の、先週までの現在の四半期のタイムシートが含まれます。

PPM – 今週遅れたタイムシート

今週遅れたタイムシートの数。インジケーターには、[承認済み] または [処理済み] ステータス以外の、先週のタイムシートが含まれます。

PPM – 今年遅れたタイムシート

今年遅れたタイムシートの数。インジケーターには、[承認済み] または [処理済み] ステータス以外の、先週までの今年のタイムシートが含まれます。

PPM – 先週の合計タイムシート

先週のタイムシートの合計数。

PPM – 今月の合計タイムシート

今月の週のタイムシートの合計数。

PPM – 今四半期の合計タイムシート

今四半期の週のタイムシートの合計数。

PPM – 今年の合計タイムシート

今年の週のタイムシートの合計数。

PPM – 今週承認されたタイムシート

今週承認されたタイムシートの数。インジケーターには、[承認済み] または [処理済み] ステータス以外のタイムシートが含まれます。

PPM – 今週欠落しているタイムシート

今週のタイムシートを送信しなかった、timecard_user ロールを持つユーザーの数。

PPM – 今週処理待ちのタイムシート

今週の処理待ちになっているタイムシートの数。インジケーターには、[処理待ち] ステータスの今週のタイムシートが含まれます。

PPM – 今週取り消されたタイムシート

今週取り消されたタイムシートの数。インジケーターには、[取り消し済み] ステータスの今週のタイムシートが含まれます。

PPM – 今週却下されたタイムシート

今週却下されたタイムシートの数。インジケーターには、[却下] ステータスの今週のタイムシートが含まれます。

PPM – 今週送信されたタイムシート

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

今週送信されたタイムシートの数。インジケーターには、[送信済み] ステータスの今週のタイムシートが含まれます。

ブレークダウン






- ユーザー
- マネージャー
- 部門
- コストセンター
- ポートフォリオ
- プログラム
- プロジェクト

データの可視化

タイトル	タイプ	説明
却下	単一スコア 	過去 30 日間に [却下] ステータスになっているタイムカードの数。
遅延	単一スコア 	過去 30 日間に遅れて送信されたタイムカードの数。
承認待ち	単一スコア 	過去 30 日間に承認待ちになったタイムカードの数。




自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
ステータス別	棒グラフ 	ステータス別にグループ化された、過去 30 日間のタイムカードの数。
カテゴリ別	ヒートマップ 	過去 30 日間にさまざまなプロジェクト時間カテゴリにわたってリソースが費やした時間 (時間数) のブレークダウン。
リソース別	リスト 	30 日間にリソースによって送信されたタイムカードのリスト。
合計時間	棒グラフ 	さまざまなカテゴリで費やされた合計時間 (時間数)。
週の開始日別の合計時間	時系列線 	一定期間におけるさまざまなカテゴリに費やされた合計時間 (時間数) の週次傾向。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

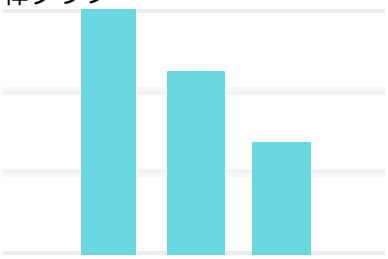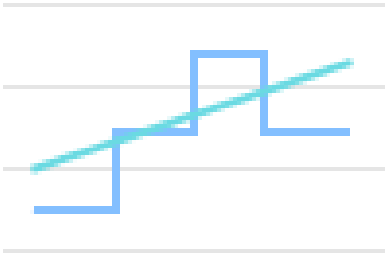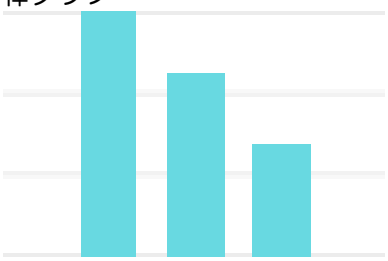タイトル	タイプ	説明
40 時間を超えるタイムシート	棒グラフ 	過剰割り当てされたリソースを示す 40 時間を超えるタイムシートの数。 ポートフォリオ、プログラム、またはプロジェクトを選択しても、このレポートは更新されません。
割り当てられた時間と実際の時間	時系列ステップ 	すべてのタイムカードユーザーの割り当てられた合計時間と実際の時間とを比較した月次傾向。
経費タイプ別のタイムカード	棒グラフ 	経費タイプ別にグループ化されたタイムカード：資本経費 (投資) と運用経費 (経費)。

プロジェクトポートフォリオ管理の参照

参照トピックでは、プロジェクトポートフォリオ管理について、ドメインセパレーション、クイックスタートテスト、ビジネスステークホルダーロールのアクセス権、および関連するその他の情報を提供します。

プロジェクトポートフォリオ管理 **(PPM) Standard** とともにインストールされるコンポーネント

PPM Standard プラグインを有効化すると、いくつかのコンポーネントがインストールされます。

デモデータは PPM Standard とともに入手できます。デモデータは、サンプルプロジェクト、デマンド、プログラム、ポートフォリオ、経費ライン行を提供します。デモデータは、サンプルプロジェクトおよびデマンドのコスト計画と予算計画のサンプルも提供します。

PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理**)** とともにインストールされるプラグイン

PPM Standard プラグインが有効化されると、複数のプラグインがインストールされます (まだインストールされていない場合)。

PPM Standard プラグイン

PPM Standard は、次のプラグインを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プラグイン名	説明
Project Portfolio Suite [com.snc.project_portfolio_suite]	プロジェクトポートフォリオ管理と IT ソフトウェア開発のための、データ連携されたアプリケーションセットを有効化します。
ファイナンシャルプラン [com.snc.financial_planning]	ファイナンスアナリストが、支出データを組み合わせて、コストモデルをビルドし、資金の割り当て状況を示すレポートを生成できるようにします。
レートモデル [com.snc.rate_model]	処理中のプロジェクト、デマンド、またはタイムカードから得られる特定の条件セットに基づいて、日付ごとに時給を提供します。
PPM による観念化 [com.snc.ppm_innovation_management]	組織が新しいアイデアを収集して、アイデアについてコラボレーションし、実装に適したアイデアを特定できるようにします。選択したアイデアをデマンド、ストーリー、プロジェクト、およびエピックに変換します。

Project Portfolio Suite プラグイン

Project Portfolio Suite は、次のプラグインを追加します。

プラグイン名	説明
デマンド管理 [com.snc.demand_management]	デマンドをキャプチャし、それらをスクリーニング、評価、および優先順位付けするためのツールを提供できるようにします。
プロジェクト管理 (PM) [com.snc.project_management_v3]	プロジェクトとリソースの計画、整理、および管理を可能にし、プロジェクトをより迅速かつ簡単にセットアップ、実行、完了できるようにします。
リソース管理 [com.snc.resource_management]	リソース要求者とリソースマネージャーが、計画された作業と運用上の作業の両方のリソースを計画、整理、および管理できるようにします。

デマンド管理プラグイン

デマンド管理は、次のプラグインを追加します。

プラグイン名	説明
プロセスフローフォーマッター [com.snc.process_flow_formatter]	プロセスに関する複数の情報を要約し、フォームの上部にステージをグラフィカルに表示します。
アセスメント [com.snc.assessment_core]	システム内のテーブルのレコードを評価、スコア付け、およびランク付けします。主要なパフォーマンス情報が強調されるように設計された、独自のグラフィカルビューを使用して結果を評価します。
タイムラインのビジュアライズ [com.snc.timeline_visualization]	インシデント、問題、変更、プロジェクトなど、組織の戦略的および運用上のアクティビティを概括的にグラフィカルに表現します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクト管理プラグイン

プロジェクト管理は、次のプラグインを追加します。

プラグイン名	説明
チェックリスト [com.glide.ui.checklist]	タスクのチェックリスト。
コスト管理 [com.snc.cost_management]	構成アイテムのコストを定義およびトラッキングできるようにします。CI、契約、およびプロジェクトでレートカードを使用します。
プロセスフローフォーマッター [com.snc.process_flow_formatter]	レコードの上部にある線形プロセスフローにさまざまなステージを表示します。
スキル管理 [com.snc.skills_management]	アドミニストレーターは、スキルと呼ばれる構成済みのコンピテンシーを、グループまたは個々のユーザーにアサインできます。
タイムラインのビジュアライズ [com.snc.timeline_visualization]	時間の経過に伴うアクティビティをグラフィカルに表現できるようにします。
タイムカード管理 [com.snc.time_card]	プロジェクトタスクの実際の開始日と終了日など、2 つの日付で区切られた任意のアクティビティの線形タイムラインを作成できるようにします。

リソース管理プラグイン

プロジェクト管理は、次のプラグインを追加します。

プラグイン名	説明
コスト管理 [com.snc.cost_management]	構成アイテムのコストを定義およびトラッキングできるようにします。CI、契約、およびプロジェクトでレートカードを使用します。
プロセスフローフォーマッター [com.snc.process_flow_formatter]	レコードの上部にある線形プロセスフローにさまざまなステージを表示します。

PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理) とともにインストールされるテーブル

PPM Standard プラグインを有効にするとテーブルが追加されます。

PPM Standard のテーブル

PPM Standard は、次のテーブルを追加します。

テーブル	説明
コスト計画	プロジェクトに必要なリソースのコスト計画。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
[cost_plan]	
コスト計画ブレークダウン [cost_plan_breakdown]	プロジェクト、プログラム、またはポートフォリオに基づくリソースのコストブレークダウン。これらのレコードは、すべてのコストのロールアップです。プロジェクトタスクコスト計画は、プロジェクトにロールアップされません。
原価費目の定義 [resource_type_definition]	原価費目の定義。運用経費または資本経費のいずれかを指定し、総勘定元帳 [itfm_cl_accounts] テーブル内のアカウントをリンクできます。総勘定元帳テーブルは、ファイナンシャルマネジメントアプリケーションとともにインストールされます。
プロジェクト資金調達 [project_funding]	プロジェクトまたはデマンドにおける、資本経費と運用経費の両方に関するターゲット経費値と予算経費値。このテーブルのレコードは単一会計年度向けです。
利益計画 [benefit_plan]	プロジェクトまたはデマンドがもたらす可能性のある潜在的利益についての利益計画。
利益のブレークダウン [benefit_plan_breakdown]	プロジェクトまたはデマンドの利益のブレークダウン。これらのレコードは、すべての利益のロールアップです。
予算参照レート [itfm_fx_rate]	予算で使用される為替レート。
受信実績の構成 [sn_invst_pln_inbound_actuals_config]	ERP システムから SPM にプロジェクトコードをインポートしてマッピングします。
受信経費ライン [sn_invst_pln_inbound_actuals]	ERP システムから SPM に経費ラインをインポートします。

Project Portfolio Suite テーブル

Project Portfolio Suite は、次のテーブルを追加します。

テーブル	説明
プロジェクトステークホルダー [pm_m2m_project_stakeholder]	1 つ以上のプロジェクトに関連付けられているすべてのステークホルダーを保存します。
プロジェクトタイムカードの例外 [project_timecard_exception]	週の開始日、ユーザー、プロジェクト、タイムカードのステータスなどのタイムカード情報を保存します。
プロジェクト時間カテゴリ [project_time_category]	タイムカード用に作成されたプロジェクトサブカテゴリを保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
タイムシートの例外 [time_sheet_exception]	週の開始日、ユーザー、タイムシートのステータスなどのタイムシート情報を保存します。

デマンド管理のテーブル

デマンド管理は、次のテーブルを追加します。

テーブル	説明
デマンド [dmn_demand]	すべてのデマンドを保存します。
決定 [dmn_decision]	すべての意思決定を保存します。
ステークホルダー登録 [dmn_stakeholder_register]	すべてのステークホルダーを保存します。
要件 [dmn_requirement]	すべての要件を保存します。
デマンドのステークホルダー [dmn_m2m_demand_stakeholder]	1 つ以上のデマンドに関連付けられている、すべてのステークホルダーを保存します。
デマンドのステージ構成 [dmn_stage_config]	デマンドステージのポップアップウィンドウに表示される画像を保存します。
アイデア [idea]	すべてのアイデアを保存します。

プロジェクト管理のテーブル

プロジェクト管理は、次のテーブルを追加します。

テーブル	説明
目標 [goal]	プロジェクトの目標。
問題 [issue]	プロジェクトの問題。
ワークベンチのカスタマイズ	ワークベンチを利用する各ユーザーの構成設定。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
[workbench_config_user]	
ポートフォリオ [pm_portfolio]	ポートフォリオ。
ポートフォリオプロジェクト [pm_portfolio_project]	ポートフォリオプロジェクト。
ポートフォリオプロジェクトの目標 [pm_portfolio_goal]	ポートフォリオプロジェクトの目標。
ポートフォリオプロジェクトの問題 [pm_portfolio_issue]	ポートフォリオプロジェクトの問題。
ポートフォリオプロジェクトリレーションシップ [pm_m2m_portfolio_project]	ポートフォリオとポートフォリオ内の各プロジェクト間のすべての関係。
ポートフォリオプロジェクトリスク [pm_portfolio_risk]	ポートフォリオプロジェクトのリスク。
プロジェクト [pm_project]	すべてのプロジェクト。
プロジェクトタスク [pm_project_task]	プロジェクトで使用されるすべてのタスク。
プロジェクトタスクリンク [pm_project_task_link]	リンクされた変更のすべてのレコード (v3 プラグインとともにインストールされます)。
プロジェクトテンプレート [project_template]	プロジェクトテンプレート。
プロジェクトテンプレート構成 [project_template_config]	プロジェクトテンプレートの構成設定。
プロジェクトテンプレートタスク [project_template_task]	プロジェクトテンプレート内のタスク。
リスク [risk]	プロジェクトのリスク。
プロジェクト変更要求	プロジェクトの変更要求。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
[project_change_request]	
ステータスレポート [project_status]	プロジェクトのステータスレポート。
チームスペース [pm_app_config]	すべてのチームスペース。チームスペース用に作成されたテーブルを参照します。チームスペーステーブルのリストについては、「チームスペースと一緒のインストール」を参照してください。
計画されているタスクリレーションシップ [planned_task_rel_planned_task]	依存関係にある先行タスクと後続タスク (タスク遅延値を含む)。
ベースライン [planned_task_baseline]	すべてのベースライン。
ベースラインアイテム [planned_task_baseline_item]	ベースラインの一部であるすべてのタスク。
タスクリレーションシップ [task_rel_task]	依存関係にある先行タスクと後続タスク。
予定タスク再計算から除外 [planned_task_recalculation_exclusions]	再計算から除外されるテーブルを定義します (開始日と終了日)。たとえば、このテーブルは、再計算からテーブルを除外するために、planned_task の下のすべてのサブテーブルで使用されます。 このテーブルを使用して、再計算を実行しないテーブルを構成できます。

プログラム管理のテーブル

プログラム管理は、次のテーブルを追加します。

テーブル	説明
プログラムタスク [pm_program_task]	プログラム内のすべてのタスク
プログラム [pm_program]	すべてのプログラム

リソース管理のテーブル

Resource Management は、次のテーブルを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
グループリソースロール group_has_resource_role	pps_resource_role を持つグループのリソースロールを保存します。このテーブル内のロールは、グループに属するユーザーのユーザーリソースロール [user_has_resource_role] テーブルから入力されます。 テーブルは読み取り専用です。
1 日に要求された配分 [requested_allocation_daily]	要求された割り当ての日レベルのブレークダウンを保存します。 テーブルは読み取り専用です。
リソース配分 [resource_allocation]	リソースの割り当て。
日次リソース配分 [resource_allocation_daily]	毎日、リソース計画を通じて作成されるイベントを保存します。以下も保存されます。 • ユーザーがレコードとして作成したカレンダーイベント。 • ユーザーがタスク、プロジェクト、またはその他のタイプのアクティビティ (会議や管理作業など) に費やした実際の時間。
日次リソース集計 [resource_aggregate_daily]	毎日、キャパシティ、プロジェクトに割り当てられた時間、プロジェクトで確定された時間、プロジェクト以外の時間、実際の時間、すべてのユーザーの稼働状況などの集計値を保存します。 このテーブルは、デフォルトでは無効になっています。日次集計を生成してこのテーブルに保存するには、*com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates* プロパティを作成し、値を true に設定します。
週次リソース集計 [resource_aggregate_weekly]	毎週、キャパシティ、プロジェクトに割り当てられた時間、プロジェクトで確定された時間、プロジェクト以外の時間、実際の時間、すべてのユーザーの稼働状況などの集計値を保存します。テーブルの値は、日次リソース配分 [resource_allocation_daily] テーブルへの挿入/更新/削除のたびに非同期に更新されます。
月次リソース集計 [resource_aggregate_monthly]	毎月、キャパシティ、プロジェクトに割り当てられた時間、プロジェクトで確定された時間、プロジェクト以外の時間、実際の時間、すべてのユーザーの稼働状況などの集計値を保存します。テーブルの値は、日次リソース配分 [resource_allocation_daily] テーブルへの挿入/更新/削除のたびに非同期に更新されます。
要求された配分 [requested_allocation]	リソース計画用の割り当て。
リソースイベント [resource_event]	ユーザー用に作成されたイベントを保存します。
リソースイベントの色 [resource_event_color]	各イベントタイプに対してアプリケーションが表示する色。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
リソースプラン [resource_plan]	すべてのリソース計画。Helsinki で次の列が追加されました：top_task、program、portfolio。
リソースプランのログ [resource_plan_logs]	リソース計画のリソース割り当て中に発生したエラーと警告を保存します。
リソースレポート [resource_report]	生成して保存できるリソースレポート。
リソースレポートグラフ [resource_report_chart]	このテーブルは使用されません。
日次リソースレポート [resource_report_daily]	生成して保存できる日次リソースレポート。
リソースレポートのエクスポート [resource_report_export]	リソース管理レポートを JPG および PNG でエクスポートしたものを保存します。
月次リソースレポート [resource_report_monthly]	生成して保存できる月次リソースレポート。
リソースロール [resource_role]	プロジェクト固有のロールを保存します。
ユーザーリソースロール [user_has_resource_role]	ユーザーのリソースロールを保存します。
ユーザーカレンダーイベント [user_calendar_event]	ユーザーのカレンダーに作成されたイベントを保存します。
ユーザースケジュール [user_has_schedule]	ユーザーのスケジュールを保存します。

Innovation Management のテーブル

イノベーション管理 は、次のテーブルを追加します。

テーブル	説明
アイデア [im_idea_core]	アイデアポータルに関連するすべての情報を保存する、デフォルトのテーブル。タスクテーブルを拡張します。
アイデアカテゴリ	静的なアイデアカテゴリのリストを保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
[im_category]	
アイデアカテゴリ構成 [im_category_config]	使用するテーブル、フィールド名、アイデアカテゴリの階層などのアイデアカテゴリ定義情報を保存します。また、アイデアカテゴリテーブルとアイデアモジュールの間のマッピング情報も保存します。
アイデアカテゴリ [im_m2m_idea_category]	アイデアカテゴリとアイデアの間のマッピング情報も保存します。
アイデアモジュール [im_module]	モジュール名、モジュール ID、使用するアイデアテーブルなどのアイデアポータルの構成。アイデアモジュールごとに個別のテーブルを作成します。

タイムカード管理のテーブル

タイムカード管理は、次のテーブルを追加します。

テーブル	説明
タイムカード [time_card]	タスク、会議、トレーニングなどのカテゴリに対してユーザーが記録した時間を保存します。
タイムシート [time_sheet]	ユーザーの 1 週間分のタイムカードをグループ化します。
タイムシートポリシー time_sheet_policy	すべてのタイムシートポリシーを保存します。
日次タイムカード [time_card_daily]	タイムカードに記録された時間を毎日保存します。

レートモデルのテーブル

レートモデルは、次のテーブルを追加します。

テーブル	説明
レートモデル [rate_model]	レートモデル定義を保存します。
レートモデルエンティティ [rate_model_entity]	属性を選択できるエンティティのリスト。
レートモデルエンティティ属性	エンティティ内の属性のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
[rate_model_entity_attribute]	
レートモデルライン [rate_model_line]	レートラインの値を保存します。
レートモデルライン属性 [rate_model_line_attribute]	エンティティから追加されたレートライン属性を保存します。
レートラインインポート セット [imp_rate_model_line]	インスタンスにインポートしたインポートセットを保存します。

PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理) とともにインストールされるロール

PPM Standard プラグインを有効にするとロールが追加されます。

Project Portfolio Suite のロール

Project Portfolio Suite は、次のロールを追加します。

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
ポートフォリオマネージャー [it_portfolio_manager]	すべてのポートフォリオにアクセスできます。プロジェクトユーザーおよびデマンドユーザーと同じアクセス権限があります。また、ファイナンシャルマネジメントの一部として予算オーナーロールも追加されます。	• it_demand_user • it_project_manager • it_project_user • portfolio_manager • it_demand_manager • it_project_portfolio_user
PPS アドミン [it_pps_admin]	プロジェクト、デマンド、プログラム、ポートフォリオ、リソース、タイムカード、アジャイル開発、およびタイムラインの視覚化の初期設定、構成、および設定を表示および変更できます。	• it_program_manager • it_portfolio_manager • it_project_manager • it_demand_manager • pps_admin • timeline_admin • rate_model_admin

デマンド管理のロール

デマンド管理は、次のロールを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
デマンドマネージャー [it_demand_manager]	デマンド管理アプリケーションのすべてのモジュールにアクセスできます。	• it_project_user • resource_user • timeline_user • demand_manager • it_demand_user • rate_model_user
デマンドユーザー [it_demand_user]	デマンド管理アプリケーションのデマンドおよびステークホルダーモジュールにアクセスできます。	• demand_user • pps_resource

プロジェクト管理のロール

プロジェクト管理は、次のロールを追加します。

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
ポートフォリオユーザー [it_project_portfolio_user]	IT ポートフォリオプロジェクトレコードを表示できるユーザー。	project_portfolio_user
プロジェクトユーザー [it_project_user]	プロジェクトフォームフィールドのみを表示できます。[時間の制約] や [ステータス] など、プロジェクトタスクフォームの追加フィールドを変更できます。	• it_project_portfolio_user • project_user
プロジェクトマネージャー [it_project_manager]	すべての プロジェクト管理 (PM) アプリケーション機能に対する構成アクセス権があります。	• resource_user • it_demand_manager • it_project_user • project_manager project_manager ロールには、timecard_approver ロールも含まれます。 • timeline_user • rate_model_user

プログラム管理のロール

プログラム管理は、次のロールを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
プログラムマネージャー [it_program_manager]	プログラムマネージャーは、すべてのプログラムにアクセスできます。	• resource_user • it_project user • program_manager • it_demand_user

リソース管理のロール

Resource Management は、次のロールを追加します。

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
リソースマネージャー [resource_manager]	このロールを持つユーザーは、次のことができます。 • リソース計画をレビューして確認し、リソースをタスクに割り当てます。 • スキルを作成し、[ユーザースキル] リストに表示します。 • スケジュールを読み取ります。 • pps_resource タイプのグループを作成します。 • グループにユーザーを追加または削除します。 • グループ名、グループメール、親、説明、マネージャー、平均日次 FTE 時間/人日あたりの時間、および時給を更新します。	• resource_user • timecard_approver • skill_admin • rate_model_user
リソースユーザー [resource_user]	このロールを持つユーザーは、リソース計画を作成し、リソースを要求できます。プロジェクトマネージャーには通常、このロールが付与されます。リソースユーザーは、[確認済み] または [割り当て済み] ステータスの計画を変更できません。	なし
PPS リソース [pps_resource]	PPS リソースロールを持つユーザーのみがリソース計画の対象となり、PPS リソースロールを持つユーザーまたはグループのみがリソース計画に表示されます。	なし

Innovation Management のロール

イノベーション管理 は、次のロールを追加します。

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
アイデアアドミン [idea_admin]	• アイデアモジュールを作成します。 • アイデアカテゴリを定義します。	idea_manager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
	• アイデアモジュールを使用してアイデアカテゴリのマッピングを構成します。 • アイデアを管理し、アイデアからストーリー、エピック、機能、プロジェクト、またはデマンドなどのタスクを作成します。	
アイデアマネージャー [idea_manager]	アイデアを管理し、アイデアからプロジェクトまたはデマンドなどのタスクを作成します。	なし
アイデアマネージャープロフェッショナル [idea_manager_professional]	アイデアを管理し、アイデアからストーリー、エピック、機能、プロジェクト、またはデマンドなどのタスクを作成します。	なし

タイムカード管理のロール

タイムカード管理は、次のロールを追加します。

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
タイムカードアドミン [timecard_admin]	すべてのタイムカードへの書き込みアクセス権があります。	• timecard_user • timecard_approver
タイムカード承認者 [timecard_approver]	タイムカードユーザーのタイムカードを承認または却下します。	timecard_user
タイムカードユーザー [timecard_user]	自分のタイムカードを作成します。	なし

レートモデルのロール

ロールタイトル [名前]	説明	ロールを含む
レートモデルアドミン [it_rate_model_admin]	レートモデルとレートラインを管理します。属性の設定、レートラインのエクスポートとインポート、管理をはじめとする、レートモデル内のすべての権限を持ちます。	• rate_model_user • import_set_loader • import_transformer • import_admin
レートモデルユーザー [rate_model_user]	レートモデルとレートラインを表示します。	なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PPM のビジネスステークホルダーロール

PPM ユーザーの場合、ビジネスステークホルダー (com.snc.business_stakeholder) プラグインには エンタープライズアーキテクチャ (以前の APM)、ITFM、および PPM のビジネスステークホルダーロールが含まれます。このロールを持つユーザーは、レポートとダッシュボードのデータ取得に使用されるテーブルのレコードを読み取ることができ、さらに、デマンドとタイムカードを承認できます。ビジネスステークホルダーであるすべてのユーザーに、このロールをアサインできます。

アップグレード情報

アップグレードした場合、PPM のビジネスステークホルダーロールは、PPM Standard の読み取り専用ロール (com.snc.pmo_read_roles) プラグインを有効化した場合にのみ使用できます。

新規顧客の場合、PPM Standard の読み取り専用ロール (com.snc.pmo_read_roles) プラグインは zBoot で有効化されます。ただし、PPM のビジネスステークホルダーロールは、PPM Standard プラグインをインストールした場合にのみ使用できます。

デマンドおよびタイムカード承認者のロール

PPM Standard の読み取り専用ロール (com.snc.pmo_read_roles) プラグインは、sn_ppm_read ロールをインストールします。sn_ppm_read ロールは、アサインされたユーザーに、リソースレポートとともにポートフォリオ、プログラム、およびタイムカードダッシュボードへの読み取り専用アクセスを提供します。sn_ppm_read ロールには、timecard_approver ロールと demand_approver ロールも含まれています。これらのロールをアサインされたユーザーは、デマンドとタイムカードを承認できます。ビジネスステークホルダーロールがデマンドの協力者として追加されると、コメントが有効になります。

ビジネスステークホルダーロールを持つユーザーがアクセス可能な PPM テーブル

PPM のビジネスステークホルダーロールを持つユーザーは、データを保存する次のテーブルにアクセスして、ポートフォリオダッシュボード、プログラムダッシュボード、タイムシートダッシュボード、およびリソースレポートに、ウィジェットをロードできます。

PPM テーブル

ラベル	テーブル名
アクション	project_action
決定	dmn_decision
デマンド	dmn_demand
デマンドタスク	dmn_demand_task
会計期間	fiscal_period
アイデア	im_idea_core
問題	issue
プログラム	pm_program
プロジェクト	pm_project
プロジェクトタスク	pm_project_task
プログラムタスク	pm_program_task
プロジェクトタイムカードの例外	project_timecard_exception
要件	dmn_requirement

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PPM テーブル (続く)

ラベル	テーブル名
日次リソース集計	resource_aggregate_daily
月次リソース集計	resource_aggregate_monthly
週次リソース集計	resource_aggregate_weekly
リソースプラン	resource_plan
リスク	risk
ステータスレポート	project_status
タイムカード	time_card
タイムシート	time_sheet
タイムシートの例外	time_sheet_exception

ドメインセパレーションとプロジェクトポートフォリオ管理

ドメインセパレーションは プロジェクトポートフォリオ管理 でサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル - ベーシック*

- アプリケーションのサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックがあります。
- アプリケーションでは、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、集計など、すべてにおいて、実行時にドメインが考慮されます。
- インスタンスの所有者は、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションを設定できる必要があります。

ユースケース： サービスプロバイダーである私は、チャットを使用してテナント顧客のメッセージに私が応答する時に、クライアントが私の応答を確認できるようにする必要があります。

プロジェクトポートフォリオ管理におけるドメインセパレーションの仕組み

プロジェクトポートフォリオ管理はドメインセパレーションに準拠しており、次の制限があります。

- アイデア、プロジェクト、デマンド、リソース計画、割り当てなどのすべての PPM エンティティは、同じドメイン内にあることが想定されています。複数のドメインのタスクまたはリソースを持つプロジェクトエンティティはサポートされていません。
- 親エンティティと、プロジェクトレコードとそのプロジェクトタスクなどのすべての子エンティティは、同じドメインにあることが想定されています。
- たとえばプロジェクトレコードなど、親レコードのドメインを変更しても、子レコードのドメインは変更されません。
- 同じドメイン、親ドメイン、または最上位のドメインに属するユーザーのみが、ドメインの PPM エンティティを表示できます。
- すべてのシステムプロパティはグローバルドメインにあり、ドメインに固有のものではありません。ただし、計画立案コンソールの設定は依然としてドメイン固有です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

プロジェクトポートフォリオ管理のクイックスタートテスト

アップグレードの適用やアプリケーションの開発などの構成変更を行った後も、プロジェクトポートフォリオ管理 が変わらず正常に動作するかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。

プロジェクトポートフォリオ管理 クイックスタートテストでは、PPM 標準 - ATF テストプラグイン (com.snc.financial_planning_pmo.atf) をアクティブ化する必要があります。

PMO：コストロールアップとプロジェクト変換テストスイートに対するデマンドを確認するための財務テスト

テスト	説明	リリースバージョン
PMO：プロジェクト/デマンドおよびプログラムへのコスト計画のロールアップを確認	プロジェクトからの総計画コストのロールアップとプログラムへのデマンドを検証します。	Madrid
PMO：プロジェクト/デマンド、プログラム、ポートフォリオへのコスト計画のロールアップを確認	プロジェクトからの総計画コストのロールアップとポートフォリオへのデマンドを検証します。	Madrid
PMO：デマンドから作成されたプロジェクトの財務を確認 - 単純な財務	デマンドから作成されたプロジェクトの財務タブフィールドを検証します。	Madrid
PMO：デマンドから作成されたプロジェクトの財務を確認 - 予算、コスト計画、利益計画を使用	デマンドから作成されたプロジェクトの予算、コスト計画、利益計画を検証します。	Madrid
PMO：コスト計画ブレークダウンとプロジェクトレベルで ETC/EAC を確認	コスト計画ブレークダウンとプロジェクトレベルで EAC と ETC の値を確認します。	Tokyo

PMO：アイデアのライフサイクルを検証するための **Innovation Management** テスト

テスト	説明	リリースバージョン
アイデアのステータス変更を検証	アイデアが承認、却下、またはその他のタスクがアイデアから作成されたときに、アイデアのステータスが変更されることを検証します。	San Diego

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PMO：基本的なライフサイクルとプロジェクトロールアップテストスイートを検証するためのプロジェクト管理テスト

テスト	説明	リリースバージョン
アイデアから、デマンド、プロジェクト終了までの PPM サイクルを検証する	アイデアを作成し、そのアイデアをデマンドに変換してから、そのデマンドをプロジェクトに変換するまでのフローを検証します。 **注:** PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効である場合、このテストは失敗します。	Madrid
自動プロジェクトのためのステータスおよび日付のロールアップの検証	自動タイプのプロジェクトのタスクから日付とステータスのロールアップを検証します。	Madrid
手動プロジェクトのためのステータスおよび日付のロールアップの検証	手動タイプのプロジェクトのタスクから日付とステータスのロールアップを検証します。	Madrid
すべてのタスクが未完了でクローズされた場合のプロジェクト完了率の検証	すべてのタスクが「未完了でクローズ」としてクローズされた場合に、プロジェクトの完了率を検証します。	Orlando
少なくとも 1 つのタスクが未完了でクローズされた場合にプロジェクトの完了率が 100% でないことを検証	少なくとも 1 つのタスクが「未完了でクローズ」またはタスク完了率が 100% でない「スキップしてクローズ」としてクローズされた場合に、タスクの完了率が 100% でないことを検証します。	Orlando
ウォーターフォールプロジェクトにアジャイル計画ボードが表示されないことを検証	ウォーターフォールプロジェクトが以下を使用できないことを検証します。 • ストーリーまたはエピックを追加 • アジャイルフェーズの追加 • プロジェクトからアジャイルボードにアクセス	Orlando
検証日は既存のプロジェクトからプログラムにロールアップされます。	プロジェクトの開始日と終了日が、プロジェクトが属するプログラムにロールアップされていることを検証します。	Paris
検証日は新しいプロジェクトからプログラムにロールアップされます。	新しいプロジェクトの開始日と終了日が、プロジェクトが属するプログラムにロールアップされていることを検証します。	Paris
リスクまたは問題のあるプロジェクトとデマンドをプログラムに追加	リスクまたは問題レコードが関連付けられているプロジェクトとデマンドがプログラムに追加されていることを検証します。	Paris
給付制度を含むプロジェクトとデマンドのプログラムへの追加	給付制度が関連付けられているプロジェクトとデマンドがプログラムに追加されていることを検証します。	Paris

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PMO：基本的なライフサイクルとプロジェクトロールアップテストスイートを検証するためのプロジェクト管理テスト (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
コスト計画を含むプロジェクトとデマンドのプログラムへの追加	コスト計画が関連付けられているプロジェクトとデマンドがプログラムに追加されていることを検証します。	Paris
既存のデマンドの追加時に、プログラムの日付を検証	既存のデマンドの追加時に、プログラムの開始日と終了日が調整されていることを検証します。	Paris
新しいデマンドの追加時に、プログラムの日付を検証する	新しいデマンドの追加時に、プログラムの開始日と終了日が調整されていることを検証します。	Paris
プログラムのステータスのロールアップを検証	プログラムのステータスが、プログラムにあるすべてのプロジェクトのステータスからロールアップされていることを検証します。	Paris
デマンドタスクの期日列フィールド値が空であることを検証	新しいデマンドタスクの [期日] フィールドが空であることを検証します。	Rome
デマンドがプロジェクトに変換されるときに、プロジェクトとデマンドにベースラインが作成されることを検証	デマンドがプロジェクトに変換されるときに、プロジェクトとデマンドのベースラインが作成されることを検証します。	Rome
タイムカードがデマンドタスクに対して送信されたときに、タイムカード財務情報がオンデマンドで表示されることを検証	デマンドタスクのタイムカードが処理されるときに、デマンドの実際のコストが更新されることを検証します。	Rome
デマンド承認日の検証	デマンドとそのデマンドから作成されたプロジェクトの承認日が同じであることを検証します。	Tokyo
プロジェクト設定「作業ステータスに移行したら、プロジェクトマイルストーンタスクを閉じる」を検証	プロジェクト設定「作業ステータスに移行したら、プロジェクトマイルストーンタスクを閉じる」を設定した後に、ステータスが [対応中] に変更されたときにマイルストーンタスクが閉じることを検証します。	Tokyo
プロジェクト設定「WIP プロジェクトのプロジェクトの移動を有効にする」を検証	プロジェクト設定「WIP プロジェクトのプロジェクトの移動を有効にする」を設定した後に、プロジェクト開始日が変更されたときに、WIP ステータスのプロジェクトのプロジェクト開始日が適切に変更されることを検証します。	Tokyo
プロジェクト設定「タスクに基づくプロジェクト開始日のロールアップ」を検証	プロジェクト設定「タスクからプロジェクト開始日をロールアップ」を選択解除した後、プロジェクト予定日がプロジェクトタスク開始日と異なる場合に、プロジェクトタスクの開始日がプロジェクトにロールアップされないことを検証します。	Tokyo

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

子テストスイート：プロジェクト移動アクションの検証

テスト	説明	リリースバージョン
プロジェクト移動アクションを使用してプロジェクトの開始予定日をシフトできることを検証	[プロジェクト移動] 関連リンクを使用して、ステータスが [計画] または [オープン] のプロジェクトの開始予定日を現在の開始予定日より前または後の日付に更新できることを検証します。	Orlando
プロジェクトの実行が選択されているときに [プロジェクト移動] が無効であることを検証	プロジェクトが実行フェーズである場合は、[プロジェクト移動] オプションが使用できないことを検証します。	Orlando
アジャイルフェーズ用に入力されたスプリント日付で、プロジェクト移動機能を検証	[プロジェクト移動] 関連リンクを使用してプロジェクトを移動したときに、スプリントの開始日と終了日がクリアされることを検証します。 **注:** このテストは、アジャイル開発 2.0 プラグイン (com.snc.sdlc.agile.2.0) がアクティブな場合にのみ利用できます。	Orlando
外部依存関係と関連エンティティを使用してプロジェクト移動機能を検証	[プロジェクト移動] 関連リンクを使用してプロジェクトを移動した場合に、外部依存関係と関連するエンティティもシフトされ、再描画されることを検証します。	Orlando
さまざまなプロジェクト状況を使用して、プロジェクト移動機能を検証	プロジェクトが [対応中] または [完了してクローズ] ステータスのときに、[プロジェクト移動] が動作しないことを検証します。	Orlando

子テストスイート：プロジェクトの **RIDAC** フローを検証

テスト	説明	リリースバージョン
リスクの RIDAC フローの確認	プロジェクトに関連付けられたリスクの RIDAC フローを検証します。	Quebec
問題の RIDAC フローの確認	プロジェクトに関連付けられた問題の RIDAC フローを検証します。	Quebec
決定の RIDAC フローの確認	プロジェクトに関連付けられた決定の RIDAC フローを検証します。	Quebec

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

子テストスイート：プロジェクトの **RIDAC** フローを検証 (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
アクションの RIDAC フローの確認	プロジェクトに関連付けられたアクションの RIDAC フローを検証します。	Quebec
リスクフォームのフィールドの変更を検証	リスクのランク、リスク値、および可能性などのリスクフォームフィールドが送信時に正常に更新されているかどうかを検証します。	Quebec

子テストスイート：デマンドの **RIDAC** フローを確認する

テスト	説明	リリースバージョン
リスクの RIDAC フローの確認	デマンドに関連付けられたリスクの RIDAC フローを検証します。	Quebec
問題の RIDAC フローの確認	デマンドに関連付けられた問題の RIDAC フローを検証します。	Quebec
決定の RIDAC フローの確認	デマンドに関連付けられた決定の RIDAC フローを検証します。	Quebec
アクションの RIDAC フローの確認	デマンドに関連付けられたアクションの RIDAC フローを検証します。	Quebec
リスクフォームのフィールドの変更を検証	リスクのランク、リスク値、および可能性などのリスクフォームフィールドが送信時に正常に更新されているかどうかを検証します。	Quebec

PMO：リソース計画フローテストスイートを確認するための **Resource Management** テスト

テスト	説明	リリースバージョン
計画済みからキャンセル済みステータスへのユーザーのリソース計画のフローを確認する	プロジェクトのリソース計画を計画済みステータスからキャンセル済みステータスに移行できることを確認します。	Madrid
計画済みから完了ステータスへのグループのリソース計画のフローを確認する	プロジェクトのリソース計画を計画済みステータスから完了ステータスに移行できることを確認します。	Madrid
計画済みから割り当て済みステータスへの	プロジェクトのリソース計画を計画済みステータスから割り当て済みステータスに移行できることを確認します。	Madrid

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PMO：リソース計画フローテストスイートを確認するための **Resource Management** テスト (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
ロールのリソース計画のフローを確認する		
対応するプロジェクトまたはデマンドフィールドにロールアップするすべてのリソース計画の集計コストを確認	プロジェクトまたは需要のすべてのリソース計画の集計コストが、[予定コスト] および [割り当てられたコスト] フィールド、それぞれプロジェクトおよびデマンドの [リソースコスト] セクションにロールアップされることを検証します。	Orlando
[リソースプランをコピー] オプションの確認	[リソース計画をコピー] オプションで、元のリソース計画の正確なコピーが [計画] ステータスで作成できることを検証します	Orlando
プロジェクト/デマンドからプログラムにリソース計画の集計がロールアップすることの確認	プロジェクトまたはデマンドのすべてのリソース計画の集計コストが、関連するプログラムの総計画コストにロールアップされていることを検証します。	Orlando
リソース計画の完了時のレコードを確認	完了時にリソース計画の以下の変更を検証します。 • リソース計画の状況が [完了] に更新されます。 • 完了日がリソースプランの終了日よりも前の日付である場合、リソース計画の終了日が完了日で更新されます。入力された完了日がリソース計画の終了日より後の場合、リソース計画の終了日が保持されます。 • 完了日より後の期間のリソース計画の要求されたレコードと割り当てレコードは、すべて削除されます。割り当てに対して実際の時間が記録されている場合、その割り当ては削除されません。これらの割り当てレコードについては、割り当てられた時間はゼロになり、実際の時間は保持されます。 • リソースの利用可能な時間と割り当てられた時間がアグリゲートテーブルで更新されます。	Orlando
割り当てタイプが [計画された期間] のリソース計画の完了時にレコードを検証	割り当てタイプが [計画された期間] のリソース計画の完了時に以下を検証します。 • リソース計画の状況が [完了] に更新されます。 • 割り当ては削除されません。 • 割り当ての終了日が完了日に更新されます。	Orlando
RP 再計画機能の確認	キャンセルされたリソース計画が再計画されたときに、リソース計画の状態が [計画] に変更されることを検証します。	Orlando
リソース計画の変更が対応するコスト計画に反映されているかどうかを検証	リソース計画が更新されると、対応するコスト計画がそれに応じて更新されることを検証します。たとえば、予定コストの合計が 500 USD で、予定時間が 10 の場合、予定時間を 20 に変更すると、予定コストの合計が 1000 USD に更新されます。	Paris

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PMO：リソース計画フローテストスイートを確認するための **Resource Management** テスト (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
リソース - リソース計画の開始日と終了日のデフォルト入力をテスト	デマンドの関連リストからユーザーまたはグループのリソース計画を作成するときに、以下を検証します。 • 開始日と終了日がないデマンドが作成された場合は、ユーザーまたはグループのリソース計画にはタスクがデマンドとしてあり、開始日と終了日はありません。 • 開始日と終了日を含むデマンドが作成された場合は、ユーザーのリソース計画にはタスクがデマンドとしてあり、開始日と終了日がデマンドに追加されます。	Paris
運用リソース計画とタイムカードの実際の時間が等しいことを検証	タイムカードカテゴリが運用作業タイプにマップされている場合、その作業タイプに関連付けられた運用リソースプランのタイムカードを送信するときに、リソース計画の実際の時間とタイムカードが同じであることを検証します。	Quebec
運用リソースプランのリソースプラン自動入力を検証	タイムカードに関連付けられた運用リソース計画が、時間が記録されたときにタイムカードで自動的に取得されることを検証します。	Rome
非運用リソース計画のリソースプラン自動入力を検証	プロジェクト、プロジェクトタスク、またはタイムカードのデマンドに関連付けられたリソース計画が、時間が記録されたときにタイムカードで自動的に取得されることを検証します。	Rome

関連情報


クイックスタートテスト

財務向けに追加される関連リスト

PPM Standard では、プロジェクトフォームとポートフォリオフォームの両方にいくつかの関連リストが追加されます。

ポートフォリオ関連リスト

財務向けのポートフォリオ関連リスト



この表では、関連リストと、これらのリスト内のレコードをポートフォリオワークベンチで作成または使用する方法について説明します。


ポートフォリオフォームの関連リスト	説明
コスト計画	ポートフォリオに属するプロジェクトとデマンドのコスト計画を一覧表示します。
利益計画	ポートフォリオに属するプロジェクトとデマンドの財務面の利益計画を一覧表示します。
ポートフォリオターゲット	さまざまな会計年度について、ポートフォリオの資本経費と運用経費のターゲットを一覧表示

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポートフォリオフォームの関連リスト	説明
	します。値は、project_finding テーブルから表示されます。これらの値は、ポートフォリオワークベンチの [ターゲットを設定] ステージで設定します。さまざまな会計期間のターゲットを作成できます。
予算計画と予算策定	プロジェクトの計画と予算業務。詳細については、「プロジェクトフォーム」を参照してください。

財務向けのプロジェクト関連リスト



この表では、プロジェクトレコード内の財務向けの関連リストについて説明します。

プロジェクトフォームの関連リスト	説明
コスト計画	特定の会計期間におけるプロジェクトのコスト。コスト計画には、関連付けられた経費ラインを含めることもできます。
利益計画	プロジェクトが実行された場合に、1 つ以上の会計期間にまたがるプロジェクトによって発生する可能性のある、財務面での潜在的な利益。
プロジェクト予算	プロジェクトの予算。詳細については、「プロジェクトフォーム」を参照してください。
経費明細	ユーザー、固定資産、CI などの特定のソースに関連付けられた実際のコストの集計。

自動翻訳

SPM® ベンチマーク

ServiceNow® SPM ベンチマーク アプリケーションは、同業者の業界平均に関するインサイトを提供します。重要業績評価指標 (KPI) を使用して、パフォーマンスをグローバルベンチマークと比較します。これは、組織のパフォーマンス向上に寄与します。

「Getting started with SPM Benchmarking (SPM Benchmarking の概要)」 このビデオでは、SPM ベンチマーク の使用を開始するための概要について説明します。

SPM® ベンチマーク の詳細

SPM ベンチマーク アプリケーションを使用すると、重要業績評価指標 (KPI) や傾向の明確な可視化が得られ、同業者の業界平均に対する比較分析インサイトが得られます。業界、規模、地域に基づいてパフォーマンスを同業者と比較することで、より深いインサイトを得ることができます。

主な機能

- 利用可能な 15 の KPI (戦略的 6、配置 5、および実行 4)
- カスタマイズ®に合わせて KPI 定義を変更する機能
- ServiceNow® サービスポータル 内の ServiceNow® ベンチマーク ダッシュボード (モバイルデバイス対応)


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- KPI レポートをダウンロードする機能
- 新しい集計月データが利用可能になるとメールで通知
- 業界別、ユーザー数別、地理的地域別にデータをフィルタリング
- 参加している同業者グループ内での順位を示すパーセンタイルランク
- データアクセスを制限する製品カテゴリベースのロール
- 日次データ収集と KPI データのドリルダウンのための ServiceNow® パフォーマンスアナリティクス との統合

SPM ベンチマーク ダッシュボード

SPM ベンチマーク ダッシュボード機能を表示して学習します。

SPM ベンチマーク ダッシュボード

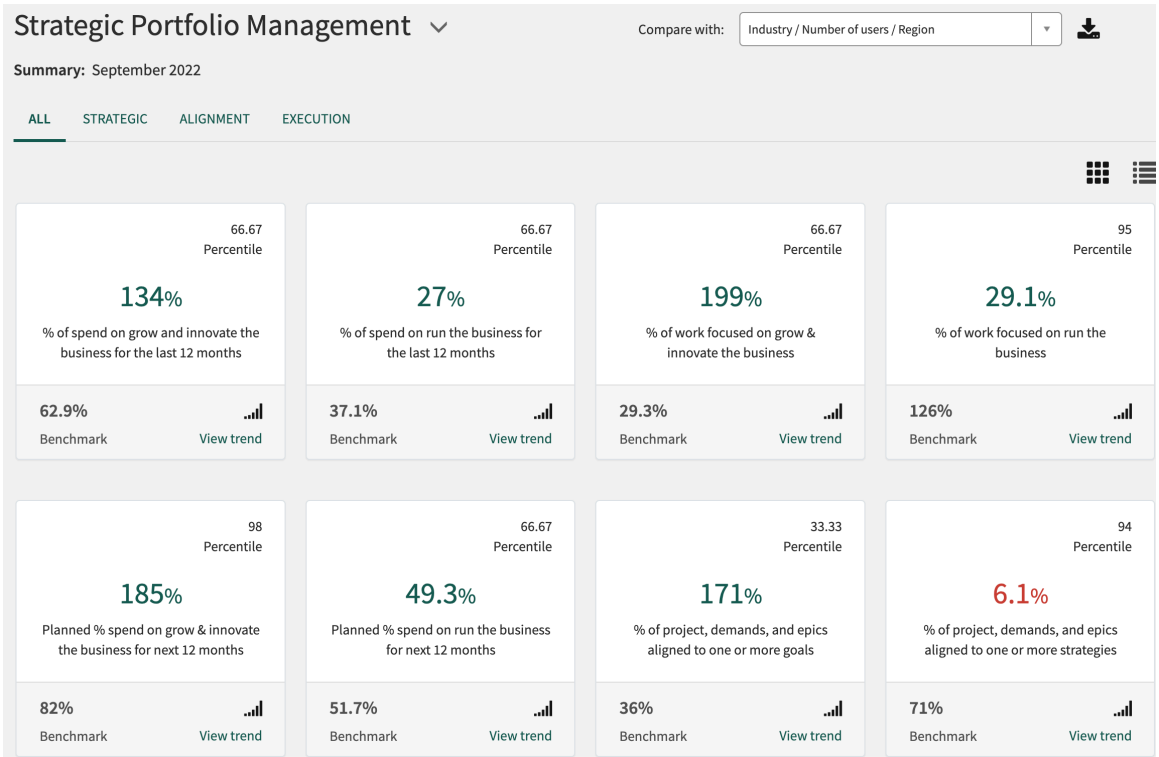

SPM ベンチマーク ダッシュボードでは、以下を実行できます。

KPI を表示

次のカテゴリの KPI を表示できます。

- [すべて] タブには、オプトインしたすべての KPI のリストが表示されます。
- **[Strategic]** タブには、オプトインしたすべての戦略的 KPI のリストが表示されます。
- [配置] タブには、オプトインしたすべての配置 KPI のリストが表示されます。
- [実行] タブには、オプトインしたすべての実行 KPI のリストが表示されます。

KPI ビューを変更

KPI のダッシュボードでの表示方法を変更できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [カードビュー] アイコン () をクリックして、カードビューで KPI を表示します。
- [リストビュー] アイコン () をクリックして、リストビューで KPI を表示します。

比較データを選択

[比較対象] ドロップダウンリストを使用して、データを比較するエリアを選択できます。

- [業界]：業界に基づいてデータを比較するには、このオプションを選択します。
- [ユーザー数]：ユーザー数に基づいてデータを比較するには、このオプションを選択します。
- [地域]：地域に基づいてデータを比較するには、このオプションを選択します。

SPM ベンチマーク のメリット

SPM ベンチマーク アプリケーションにより、同業者と比較したパフォーマンスを全体的に理解できます。

グローバルな匿名性

組織内の閲覧者は、組織の SPM ベンチマーク にアクセスできます。ただし、グローバルベンチマークは匿名であり、会社情報は一切含まれません。

業界比較

SPM ベンチマーク ダッシュボードの [比較対象] ドロップダウンを使用すると、ベンチマーク結果を業界、ServiceNow ユーザーサイズ、または地域別にフィルターして、結果を組織に関連性の高いものにします。

- 会社のアカウント レコード内に記載の標準業界コードに基づいて業界を決定します。
- ユーザー数は、会社内の ServiceNow アクティブユーザーの数によって決まります。会社を同規模の ServiceNow 実装と比較して、会社について理解することができます。
- 会社テーブルの [地域] フィールドに基づいて地域を決定します。

フィルターカテゴリの参加者が 20 人未満の場合、対応するデータは [その他] カテゴリに表示されます。

傾向

公開された全 KPI の結果と過去 6 か月間の履歴が閲覧可能です。

傾向データを使用して、順調に機能しているものと改善が必要なものを判断します。

レポート

SPM ベンチマーク レポートは毎月更新され、PDF 形式でダウンロードできます。新しいデータが利用可能になると、顧客にメール通知を送信します。

SPM ベンチマーク の構成

重要業績評価指標 (KPI) の比較理解を表示するために SPM ベンチマーク を設定するのに必要なプロセスについて説明します。

SPM ベンチマーク セットアッププロセスの指針として、次のステップを使用してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. SPM ベンチマーク をインストールします。詳細については、「SPM ベンチマーク のインストール」を参照してください。
2. SPM ベンチマークを有効にします。詳細については、「SPM ベンチマーク の有効化」を参照してください。

SPM ベンチマーク のインストール

アドミニストレーターは、SPM ベンチマーク アプリケーション (sn_spm_bm) を ServiceNow Store からインストールできます。このアプリケーションには、デモデータが含まれています。まだインストールされていない場合は、関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインをインストールします。

始める前に

- アプリケーションとその関連するすべての ServiceNow Store アプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得する ServiceNow 製品またはアプリケーション.
- 依存関係、ライセンスやサブスクリプションの要件、およびリリースの互換性については、ServiceNow Store の SPM Benchmarking アプリケーションリストを確認してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

SPM ベンチマーク とともに次のアイテムがインストールされます。

- ロール
- スケジュール済みジョブ

詳細については、「SPM Benchmarking とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して、SPM ベンチマーク アプリケーション () を検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることがあります。

   [インストール] ボタンの横のリストに、使用可能なバージョンが表示されます。

3. リストからバージョンを選択し、[インストール] を選択します。

   表示される [インストールの詳細を確認] ダイアログボックスに、アプリケーションとともにインストールされている依存関係が一覧表示されます。

4. プロンプトが表示された場合は、ServiceNow Store へのリンクに従って、依存関係のエンタイトルメントを取得します。
5. **[Install** (インストール)] を選択します。

SPM ベンチマーク の有効化

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) KPI の SPM ベンチマーク データ収集に参加するには、SPM ベンチマーク にオプトインする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：sn_bm_client.benchmark_admin

このタスクについて
いつでも SPM ベンチマーク からオプトアウトできます。

手順

1. 移動先 すべて > ベンチマーク > セットアップ.
2. [オプト イン契約] をクリックし、内容を読みます。
3. [完了] をクリックします。
4. 「オプトイン契約を読んだうえで同意します」のチェックボックスをオンにして、[オプトイン] をクリックします。
   いつでも SPM ベンチマーク からのオプトアウトを選択できます。SPM ベンチマークを含むがこれに限定されないベンチマーク全体からオプトアウトするには、次の場所に移動します すべて > ベンチマーク > セットアップ をクリックし、[**ServiceNow** ベンチマークからオプトアウト] をクリックします。

SPM ベンチマーク KPI をカスタマイズ

SPM ベンチマーク ダッシュボードに表示する KPI 情報をカスタマイズできます。

SPM ベンチマーク アプリケーションを使用して、次の操作を実行できます。

- 組織の要件に基づいて、利用可能な KPI のリストから KPI を選択。
- 組織のニーズに関連する詳細を調整するために KPI 計算式を変更。

KPI を選択

要件に基づいて、SPM ベンチマーク アプリケーションで使用する重要業績評価指標 (KPI) を選択できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > ベンチマーク > アドミニストレーション > セットアップ.
2. [戦略的ポートフォリオ管理 **(SPM)]** を選択して SPM ベンチマーク KPI のリストを表示します。
3. 組織に必要な KPI を選択します。

KPI 計算式を変更

要件と分析基準に従って、重要業績評価指標 (KPI) 計算式を表示および変更します。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > ベンチマーク > アドミニストレーション > カテゴリ.
2. [ベンチマークインジケーターカテゴリ] リストから、[戦略的ポートフォリオ管理 **(SPM)]** を選択します。
3. [ベンチマークインジケーターグループ] から編集する KPI を含むグループを選択します。
4. 編集する KPI をクリックして開きます。
5. インジケーターフィールドをクリックして開き、式を表示して編集します。

SPM ベンチマーク の参照

フィールド、ユーザーロール、スケジュール済みジョブの情報など、SPM ベンチマーク に関する追加の詳細を提供する参照情報。

SPM Benchmarking とともにインストールされるコンポーネント

SPM ベンチマーク プラグインが有効になると、いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロール、スケジュール済みジョブなど) がインストールされます。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	含まれるロール
ベンチマーキングアドミン [sn_bm_client.benchmark_admin]	• インスタンスから Benchmarks を設定する • Benchmarks プログラムのオプトインまたはオプトアウト • インジケーターのアクティブ化、無効化、変更 (アプリケーション固有のロールを必要としない KPI のパフォーマンスアナリティクスインジケーターソース、スクリプト、条件の変更を含む) • 新しい月次アグリゲートデータが利用可能になるとメール通知を受信 • Benchmarks ビューアーのすべての機能と Benchmarks の推奨ロール	なし
ベンチマーキングデータビューアー [sn_bm_client.benchmark_data_viewer]	• サービスポータルで全ベンチマークレポートを表示 • 傾向分析のためのデータ可視化とデータのドリル ダウンの表示 (PA スコアカードではない) • 視覚化したデータのダウンロード	なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロール タイトル [名前]	説明	含まれるロール
	• 業界カテゴリやサイズ比較の表示 • 新しい月次集計ベンチマークスコアが利用可能になるとメール通知を受信	

インストールされたスケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
SPM Benchmark Agile データコレクション	[開始日 (相対)] および [終了日 (相対)] フィールドで指定される、アジャイル開発 2.0 に関連するインジケーターのスコアを収集します。収集時間は GMT タイムゾーンに基づく 1 か月です。
SPM Benchmark データコレクション	[開始日 (相対)] および [終了日 (相対)] フィールドで指定される、APW および PPM に関連するインジケーターのスコアを収集します。収集時間は GMT タイムゾーンに基づく 1 か月です。

SPM ベンチマーク の KPI

戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) KPI は、使用回数データを収集するパフォーマンスアナリティクスインジケーターです。戦略的、配置、および実行 KPI は、SPM ベンチマーク アプリケーションでデフォルトで使用できます。

戦略的 KPI

KPI	計算式
過去 12 か月間のビジネスの成長と革新に費やされた割合	(過去 12 か月間に成長と革新に属するプロジェクトとデマンドで支出された実績コストの合計 / 過去 12 か月間にすべてのプロジェクトとデマンドで支出された実績コストの合計) * 100
過去 12 か月間のビジネスの運営に費やされた割合	(過去 12 か月間に実行に属するプロジェクトとデマンドで支出された実績コストの合計 / 過去 12 か月間にすべてのプロジェクトとデマンドで支出された実績コストの合計) * 100
ビジネスの成長と革新に重点を置いた作業の割合	(成長と革新に属するすべてのプロジェクト、デマンド、およびエピックの数 / すべてのプロジェクト、デマンド、およびエピックの数) * 100
ビジネスの運営に重点を置いた作業の割合	(実行に属するすべてのプロジェクト、デマンド、およびエピックの数 / すべてのプロジェクト、デマンド、およびエピックの数) * 100
今後 12 か月間のビジネスの成長と革新に費やされる予定割合	(今後 12 か月間の成長と革新に属するプロジェクトとデマンドの予定コストの合計 / 今後 12

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的 **KPI** (続く)

KPI	計算式
	か月間のすべてのプロジェクトとデマンドの予定コストの合計) * 100
今後 12 か月間のビジネスの運営に費やされる予定割合	(今後 12 か月間の実行に属するプロジェクトとデマンドの予定コストの合計 / 今後 12 か月間のすべてのプロジェクトとデマンドの予定コストの合計) * 100

配置 **KPI**

KPI	計算式
1 つ以上の目標に一致するプロジェクト、デマンド、およびエピックの割合	(1 つ以上の目標に対応するプロジェクト、デマンド、およびエピックの数 / すべてのプロジェクト、デマンド、およびエピックの数) * 100
1 つ以上の戦略に一致するプロジェクト、デマンド、およびエピックの割合	(1 つ以上の戦略に対応するプロジェクト、デマンド、およびエピックの数 / すべてのプロジェクト、デマンド、およびエピックの数) * 100
従来のプロジェクトを使用して提供された作業の割合	(実行タイプがウォーターフォールであるオープンなプロジェクト計画立案アイテムの合計数 / オープンなプロジェクト計画立案アイテムとエピック計画立案アイテムの合計数) * 100
アジャイルを使用して提供された作業の割合	(オープンなエピック計画立案アイテムの合計数 / オープンなプロジェクト計画立案アイテムとエピック計画立案アイテムの合計数) * 100
ハイブリッドプロジェクトを使用して提供された作業の割合	(実行タイプがハイブリッドまたはアジャイルであるオープンなプロジェクト計画立案アイテムの合計数 / オープンなプロジェクト計画立案アイテムとエピック計画立案アイテムの合計数) * 100

実行 **KPI**

KPI	計算式
プロジェクトまたはエピックに変換されたデマンドの割合	(過去 12 か月間にプロジェクトまたはエピックに変換されたデマンドの数 / 過去 12 か月間に作成されたデマンドの数) * 100
過去 12 か月間に、スプリントで完了したストーリーポイントと計画済みのストーリーポイントの割合	(過去 12 か月間に該当するスプリントで完了した合計ストーリーポイント / 過去 12 か月間に該当するスプリントで計画された合計ストーリーポイント) * 100
ART あたりのスクラムチームの平均数	ART 内のチームの合計数 / ART の合計数
平均スクラムチームサイズ	スクラムチームのメンバーの合計数/スクラムチームの合計数

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

投資枠管理

ServiceNow® 投資枠管理を使用すると、事業部門、製品、チームなどの投資エンティティに資金を割り当てることで、投資を計画および管理できます。組織のビジネスニーズと戦略的目標に基づいて投資に優先順位を付けます。

投資枠管理 (sn_invst_pln) アプリケーションを使用すると、次のことができます。

- エンティティの投資を作成します。
- ビジネス要件または戦略的目標を満たす投資に資金を割り当てます。
- ビジネスゴールを達成するために、1 つ以上の資金調達元に資金を要求します。

注:
Rome リリース以降、投資枠管理 は ServiceNow Store で見つかります。従来のプラグイン (com.snc.investment_planning、com.snc.investment_planning_pmo) については、2022 年 9 月の廃止予定に向けて準備が進められています。これらのプラグインは非表示になり、新しいインスタンスでは有効化されなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184] の記事を参照してください。

投資エンティティと投資

投資には、資金、コスト、メリット、ビジネスケース、および目標に関する情報が含まれます。投資を使用して、定義されたビジネスゴールを達成するための資金を割り当てるか、または要求します。投資は投資エンティティに関連付けられています。

投資エンティティは、資金調達のためのトランザクションテーブルです。たとえば、プロジェクト、チーム、事業部門、エピック、ポートフォリオなどのレコードの投資エンティティを作成できます。

投資と投資エンティティを分離しておくと、次のような利点があります。

- 作業アクティビティは資金調達とは異なります。
- 投資目標が達成されるまで、異なる期間にわたって同じエンティティに資金を提供できます。

一般投資

一般投資は、エンティティに関連付けられていない所有者に関連付けられている投資です。一般投資から何らかのエンティティまたは他の一般投資に資金を提供できます。

たとえば、会社の CEO として、トレーニングまたは調査のイニシアチブのために資金を確保する必要があり、そのようなエンティティを有効にするためのトランザクションテーブルがない場合が考えられます。このような場合に、投資に資金を提供する汎用エンティティを作成できます。

トップダウンおよびボトムアップの資金調達

トップダウン資金調達では、ビジネスゴールに基づいて、またはビジネス戦略の一環として、投資に資金を分配します。

ボトムアップ資金調達では、1 つ以上の資金源に対して、投資のための資金を要求します。

投資枠管理 を使用すると、両方の資金調達アプローチで資金を管理できます。

場合ごとのドメインセパレーション 投資枠管理

ドメインセパレーションは、ドメイン固有のユーザーに対して完全なデータ分離を提供します。投資枠管理 は、ドメインセパレーションに対してデータのみのレベルで準拠しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

投資枠管理 のインストール

admin ロールを持っている場合は、ServiceNow Store から 投資枠管理 アプリケーション (sn_invst_pln_v2) をインストールできます。

始める前に

アプリケーションとその関連するすべてのストアアプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得 ServiceNow 製品またはアプリケーション.

必要なロール：admin

このタスクについて

投資枠管理 は、以下の関連するプラグインが依然として有効でない場合は、それらを有効にします。

プラグイン 投資枠管理

プラグイン	説明
会計カレンダー [com.snc.fiscal_calendar]	さまざまな財務アプリケーションで使用されるさまざまな種類の会計カレンダーを作成および管理できます。
ウィジェット [com.snc.app.widgets]	ダッシュボードページでウィジェットを有効にします。
Ag-Grid コンポーネントプラグイン [com.snc.app.grid]	グリッドビューを有効にします。
予定されているタスク v2 [com.snc.planned_task_v2]	タスクエンティティを有効にします。

PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) プラグインもインストールされている場合は、投資枠管理 機能を使用して、プロジェクトおよびデマンドの資金を要求するか、または割り当てることができます。

手順

1. 移動先 システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して 投資枠管理 アプリケーションを検索します。
   名前または ID (sn_invst_pln_v2) でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow へのリクエストが必要になることもあります。アクセスしてください ServiceNow Store Web サイトでは、利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアに要求を送信する方法を確認できます。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、 ServiceNow Store バージョン履歴リリースノート.
3. [インストール] をクリックします。
4. アプリケーションのインストールダイアログボックスで、アプリケーションの依存関係を確認します。

   使用中のアプリケーションが他のアプリケーションを必要とし、それがまだインストールされていない場合は、先にインストールしておいてください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーションをインストールする時点で、依存アプリケーションまたはプラグインがインストールされていない場合は、それらも自動的にインストールされます。

5. [インストール] をクリックします。

タスクの結果

以下のコンポーネントは、投資枠管理 アプリケーションのインストール時にインストールされます 。

- ロール
- テーブル

詳細については、「投資枠管理 とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

投資枠管理 とともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、投資枠管理 (sn_invst_pln) プラグインの有効化とともにインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

この機能ではデモデータを利用できます。

投資枠管理 と一緒にインストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
投資アドミン [sn_invst_pln_v2.investment_admin]	投資エンティティを作成し、環境設定と会計カレンダーを設定します。	fiscal_calendar_admin
投資計画者 [sn_invst_pln_v2.investment_planner]	上位投資、投資エンティティ、および投資エンティティに関連付けられたレコードを管理します。	Investment_user
投資ユーザー [sn_invst_pln_v2.investment_user]	投資と資金を管理します。 **注:** このロールを持つユーザーは、すべてのコストおよび利益計画に対して作成、読み込み、更新、および削除操作を実行できます。	fiscal_calendar_user

投資枠管理 とともにインストールされるテーブル

テーブル	説明
ビジネスケース	投資のビジネスケースを保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
[business_case]	
ファンド要求 [sn_invst_pln_invst_funding_base_request]	資金要求の詳細を保存します。
資金調達 [sn_invst_pln_invst_funding_base_fund]	資金の詳細を保存します。
資金調達ベース [sn_invst_pln_invst_funding_base]	資金調達と要求のベーステーブル。
資金調達ベースの明細 [sn_invst_pln_invst_funding_base_breakdown]	資金調達ベースレコードのブレークダウンを保存します。
資金調達構成 [sn_invst_pln_invst_funding_configuration]	資金調達構成の詳細を保存します。
投資エンティティ [sn_invst_pln_invst_funding_entity]	投資エンティティタイプを格納します。
資金調達ステータス [sn_invst_pln_invst_funding_state]	資金調達のさまざまな状況を保存します。
Investment (投資) [sn_invst_pln_invst_investment]	投資の詳細を保存します。

自動翻訳

従来の 投資枠管理 をストアアプリケーションにアップグレード

従来の 投資枠管理 からアップグレードする場合は、投資枠管理 アプリケーションのインストール後に、既存のデータを ServiceNow Store アプリケーションテーブルに移行できます。また、[投資] および [資金調達エンティティ] フィールドの参照テーブルを ServiceNow Store アプリケーションテーブルに更新する必要があります。

従来の 投資枠管理 からストアアプリケーションにデータを移行する

admin ロールを使用すると、スケジュール済みジョブを実行して、既存のデータを従来の 投資枠管理 テーブルから新しい ServiceNow Store アプリケーションテーブルに移行できます。

始める前に
必要なロール：admin

注:
ServiceNow Store アプリケーションテーブルへのデータの移行は 1 回限りの作業であり、スケジュールどおりに行われることを意図したものではありません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [投資枠管理をストアに移行] スケジュール済みジョブを検索してクリックします。
3. スケジュール済みスクリプト実行フォームで、[実行] フィールドで頻度が [オンデマンド] に選択されていることを確認します。
4. [今すぐ実行する] をクリックします。

従来の投資枠管理テーブルからストアテーブルへの参照の更新

従来の投資枠管理データを移行後に、[投資] および [資金調達エンティティ] フィールドの参照テーブルを従来の投資枠管理テーブルから ServiceNow Store アプリケーションテーブルの必要なテーブルに更新する必要があります。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. 以下のテーブルの [投資] および [資金調達エンティティ] フィールドの参照テーブルを、従来の投資枠管理テーブルからストアアプリケーションテーブルに更新する必要があります。

テーブル	列ラベル (フィールド)	従来の投資枠管理プラグインの参照テーブル	ストアアプリケーションの参照テーブル
コスト計画	Investment (投資)	invst_investment	sn_invst_pln_invst_investment
コスト計画	資金調達エンティティ	invst_investment_entity	sn_invst_pln_invst_investment_entity
利益計画	Investment (投資)	invst_investment	sn_invst_pln_invst_investment
目標	投資	invst_investment	sn_invst_pln_invst_investment

投資枠管理 管理

投資枠管理 アプリケーションを完全に機能させるには、初期管理タスクを実行する必要があります。

投資枠管理 用の会計カレンダーのセットアップ

選択した会計カレンダー設定により、組織が資金を要求または配分するために使用する会計期間が決まります。

会計カレンダーの設定に基づいて、組織が資金要求と配分に使用する資金調達サイクル (月次や四半期など) に合わせて 資金調達頻度 を設定できます。

注:
会計期間の投資に対して資金の割り当てを要求した後、別の会計カレンダータイプに変更することはできません。

会計カレンダーの詳細については、「会計カレンダーの定義」を参照してください。

会計カレンダーの生成方法については、「会計カレンダーの生成」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

投資枠管理 の環境設定

アドミニストレーターは、投資枠管理 環境設定のグローバルデフォルトを設定できます。これは資金調達機能の動作に影響します。

始める前に

必要なロール: sn_invst_pln_investment_admin

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > セットアップ > 設定.
2. [資金調達頻度] リストで、投資に資金を要求または割り当て可能な期間頻度を選択します。

   このリストには、設定された会計カレンダーに基づくオプションが表示されます。

   たとえば、標準会計カレンダーを設定し、四半期ごとに投資資金を調達する場合は、[四半期] を選択します。

   デフォルト値は、標準会計カレンダーセットアップの場合は [四半期]、その他の会計カレンダーセットアップの場合は [期間] です。

3. オプション: **[** 過去の編集可能な期間の数] フィールドに数値を入力して、割り当て済みまたは要求済みの資金を変更できる過去の期間数を指定します。

   (Optional) たとえば、資金調達頻度が四半期で、フィールドに 2 と入力すると、前の 2 四半期の資金を編集できます。

   デフォルト値は 0 です (過去の期間の資金調達の編集は無効です)。

4. オプション: ツリービューカードで投資の実際の金額を非表示にするには、[ツリービューで実績を非表示] チェックボックスをオンにします。
5. オプション: 受領した資金に加えて資金の割り当てを有効にするには、[資金の過剰割り当てを許可] チェックボックスをオンにします。
   [資金の過剰割り当て率 (%)] フィールドと [投資レベルでの資金の過剰割り当て上書きを許可] フィールドが有効になります。
6. オプション: [資金の過剰割り当て率 **(%)]** フィールドに、受領した資金に加えて、資金を割り当てることができる割合を入力します。

   (Optional) たとえば、受領した資金の金額が $200,000 で、[資金の過剰割り当て率 **(%)]** フィールドに 10 % を入力した場合、合計 $220,000 を資金調達に使用できます。

7. オプション: [投資レベルでの資金の過剰割り当てを許可] チェックボックスをオンにすると、投資に資金を提供し、割り当てから除外されていないソース投資オーナーが、投資レベルで資金の過剰割り当て率を上書きできるようになります。
8. [保存] をクリックします。
9. 表示される確認ウィンドウからオプションを選択します。
   - 既存のすべての投資について、投資レベルで過剰割り当て設定を更新します
   - 過剰割り当て率を上書きしていない既存の投資について、投資レベルで過剰割り当て設定を更新します
   - 新規の投資についてのみ、投資レベルで過剰割り当て設定を更新します
10. [確認] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

投資エンティティの作成

資金の受領または割り当てが可能な投資のエンティティを作成します。

始める前に

必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_admin

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > セットアップ > 投資エンティティ.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

> **注:**
> [汎用] オプションが選択されている場合、フォームの [エンティティ] タブは [オーナー] タブに置き換えられます。

投資エンティティフォーム

フィールド	説明
名前	投資エンティティの一意の名前。
有効	投資エンティティのステータスを示すためのオプション。 アクティブな投資エンティティに対してのみ投資を作成できます。
説明	投資エンティティの簡単な説明。

[汎用] オプションが選択されていない場合：

[エンティティ] タブ

フィールド	説明
テーブル	資金調達が有効なトランザクションテーブル。
条件	資金調達が有効になっているテーブルのデータをフィルターするための条件。 たとえば、プロジェクトテーブルの資金調達を有効にし、準備完了ステータスのプロジェクトのみをリストするフィルター条件を追加できます。
オーナーフィールド	投資のオーナーフィールドにマッピングされたトランザクションテーブル内の任意のユーザーフィールド。 投資を作成している場合、マップされたフィールドのユーザーが投資のオーナーとして自動的にアサインされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	たとえば、プロジェクト投資エンティティの場合、[プロジェクトマネージャー] フィールドを投資のオーナーフィールドとしてマッピングできます。

[汎用] オプションが選択されている場合：

[オーナー] タブ

フィールド	説明
オーナーテーブル	投資のオーナーフィールドとしてマッピングされたユーザーテーブル。
オーナーフィルター	投資フォームの [オーナー] フィールドにリストされているユーザーをフィルタリングして投資オーナーを選択するための条件。 たとえば、プロジェクト投資エンティティの場合、プロジェクトマネージャーロールを持つユーザーのみを表示するフィルターを作成できます。 デフォルトでは、[アクティブ **= true]** フィルターが設定されています。この場合、アクティブなユーザーのみが選択対象として表示されます。

4. オプション: [資金調達可能なエンティティのロックを解除] アイコンをクリックして、現在のエンティティから資金を調達できるエンティティを選択できるようにします。

   (Optional) たとえば、ポートフォリオエンティティはプログラムに資金を提供でき、プログラムはプロジェクトに資金を提供できます。そして、プロジェクトはプログラムに要求でき、プログラムはポートフォリオに要求できます。

5. オプション: エンティティを [資金調達可能エンティティ] リストに追加します。

   (Optional) 値が選択されていない場合、すべてのエンティティが資金調達可能であると見なされます。

6. [送信] をクリックします。

次のタスク

- 資金調達アーティファクトを作成して、投資と投資エンティティオーナーを同期するビジネスルールを作成するか、投資ターゲットフォームに関連リンクを追加します。
- トップレベルの投資または投資エンティティの投資を作成します。

投資と投資エンティティのオーナーの同期を有効にします

投資オーナーと投資エンティティオーナーを同期する投資エンティティのビジネスルールを作成します。投資エンティティオーナーの名前を更新すると、対応する投資のオーナーとその投資の [表示可能] フィールドが自動的に更新されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_admin

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > セットアップ > 投資エンティティ.
2. オーナーの同期を有効にするエンティティを開きます。
3. フォームで、[資金調達アーティファクトを作成] 関連リンクをクリックします。
4. ダイアログボックスで、[投資オーナーを投資エンティティオーナーに同期するためのビジネスルールを作成] オプションを選択し、**[OK]** をクリックします。

タスクの結果
投資エンティティオーナーを更新したときに、投資オーナーと関連する投資エンティティオーナーを同期する投資エンティティのビジネスルールが作成されます。

投資ターゲットから投資に直接アクセスする

投資ターゲットから [自分の資金] ページに直接移動するための関連リンクを作成します。

始める前に
必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_admin

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > セットアップ > 投資エンティティ.
2. 関連リンクを作成する投資エンティティを開きます。
3. フォームで、[資金調達アーティファクトを作成] 関連リンクをクリックします。
4. ダイアログボックスで、[フォームで要求/資金調達するための関連リンクを作成する] オプションを選択し、**[OK]** をクリックします。
5. [**OK**] をクリックします。

タスクの結果
[投資の追加/表示] 関連リンクが投資ターゲットのフォームに表示され、[自分の資金] ページに直接移動できます。

トップレベルの投資の作成

資金を受け取り、割り当てる投資エンティティレコードのトップレベルの投資を作成します。

始める前に
必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_planner

このタスクについて
トップレベルの投資には、ソース投資またはソース投資エンティティがありません。一度作成されたトップレベルの投資は、後で通常の投資に変換することはできません。

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > トップレベルの投資.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

新しいトップレベルの投資フォーム

フィールド	説明
対象	投資に関連付ける投資エンティティレコード。エンティティに関連付けられたレコードにアクセスするには、左側のリストで投資エンティティを選択します。右側のリストには、選択したエンティティに関連付けられたレコードが表示されます。 投資エンティティタイプと投資エンティティの値ペアに対して作成できるトップレベルの投資は 1 つだけです。 **注:** [汎用バケットエンティティ] オプションを選択すると、関連するエンティティレコードを選択するためのリストが無効になります。
所有者	トップレベルの投資を所有するユーザー。 このフィールドは、選択した投資エンティティの作成時に決定された [オーナーフィールド] 値に設定されます。
名前	投資の一意の名前。
トップ投資	トップレベルの投資であることを示すオプション。この設定は変更できません。

自動翻訳

4. [作成] をクリックします。

次のタスク

- ビジネスゴールを達成するための トップレベルの投資の資金調達。
- 投資のビジネスニーズを定義するビジネスケースを作成します。

トップレベルの投資の資金調達

投資オーナーがさらに資金を分配できるように、トップレベルの投資に資金を割り当てます。

始める前に

必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_planner

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > トップレベルの投資.
2. 資金を割り当てる投資を開きます。
3. [詳細] タブで、[資金を追加] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

資金フォームの追加

フィールド	説明
会計期間	資金が投資に割り当てられる会計期間。
資金調達済みの投資	投資コストとして資金調達された金額。
資金調達済みの経費	経費として資金調達された金額。

5. [送信] をクリックします。

タスクの結果
トップレベルの投資は、選択した期間、指定した金額で資金調達されます。

投資の作成

ターゲットに資金調達するための投資の作成

始める前に
必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_user

手順
1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > 自分の資金.

2. [**New**] をクリックします。

3. フォームのフィールドに入力します。

投資フォーム

フィールド	説明
対象	投資に関連付ける投資エンティティレコード。エンティティに関連付けられたレコードにアクセスするには、左側のリストで投資エンティティを選択します。右側のリストには、選択したエンティティに関連付けられたレコードが表示されます。 **注:** 投資エンティティタイプと投資エンティティの値ペアに対して作成できるトップレベルの投資は 1 つだけです。
名前	投資の一意の名前。

4. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- 投資のビジネスニーズを定義するビジネスケースを追加します。
- 資金源から資金を要求します。
- 利用可能な資金から資金を割り当てます。

投資のビジネスケースの追加

ビジネスニーズとビジネスゴールを定義するビジネスケースを追加します。

始める前に

必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_user

このタスクについて

投資に含めることができるビジネスケースは 1 つだけです。

デマンドレコードまたはプロジェクトレコードでビジネスケースが作成されると、対応する投資レコードに同じビジネスケースがマッピングされます。また、投資レコードでビジネスケースが作成されると、対応するデマンドレコードまたはプロジェクトレコードに同じビジネスケースがマッピングされます。プロジェクトレコードまたはデマンドレコードに関連付けられたコスト計画と利益計画も投資レコードにマッピングされます。

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > 自分の資金.
2. 投資を開き、ビジネスケースを追加します。
3. [詳細] タブで、[ビジネスケースを作成] 関連リンクをクリックします。
   この関連リンクは、投資するビジネスケースが存在しない場合にのみ使用できます。
4. [ビジネスケースを追加] ダイアログボックスで、投資のビジネスニーズと目標に基づいてフィールドに情報を入力します。

ビジネスケースフォームの追加

フィールド	説明
名前	ビジネスケースの一意の名前。
投資タイプ	投資のタイプ。
投資クラス	投資に割り当てられた投資クラスカテゴリ： ○ 実行：既存のビジネスを維持するために行われた投資。 ○ 変更：ビジネスの変更を実装するために行われた投資。

[ビジネスケースを追加] フォームの [ビジネスケース] タブセクション

フィールド	説明
説明	投資をサポートするビジネスケースの説明。
実現要因	投資を実現する主な要因。
バリア	投資に対する主なバリア。
仮定	スコープとリスクを決定し、時間とコストの予測を微調整するのに役立つ、投資に対する前提です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ビジネスケースを追加] フォームの [スコープ] セクション

スコープ内	投資の範囲。これには、投資の範囲を定義する一連の境界が含まれます。
スコープの範囲外	投資のスコープの範囲外のアクティビティ。
実行リスク	投資が実行された場合に投資に関連するリスク。
不実行リスク	投資が実行されない場合に投資に関連するリスク。

5. [送信] をクリックします。

投資の共同オーナー

投資の共同オーナーは、投資オーナーの代理で投資資金の管理、要求、割り当てを行います。共同オーナーは、オーナーと同じ権利や権限を有します。

- 共同オーナーは、投資オーナーと同じ権限やアクセス権を有しているため、次のことが可能です。
  - トップレベルの投資に対する資金追加。
  - 子投資の追加や資金提供。
  - トップレベルの投資からの資金源や資金提供の追加および要求。
  - 子投資への投入資金の確認、要求、割り当て。
  - 共同オーナーの追加。
  - 資金提供されていない投資の削除。
  - 資金提供した投資者の確認。
- 共同オーナーは、すべての子投資の [表示可能] フィールドに追加されます。
- 投資には複数の共同オーナーを含めることができます。投資の共同オーナー数に上限はありません。
- [アクティブな投資] ページで、投資のアクセスレベルを確認することができます。
  - 所有する投資は、所有アイコン ( ) でマークされます。
  - 共同で所有する投資は、共同オーナーアイコン ( ) でマークされます。
  - 表示可能な投資は、表示のみアイコン ( ) でマークされます。

投資の共同オーナーの管理

投資の共同オーナーを追加して、代理で資金の要求、承認、管理を行ってもらいます。投資を管理してもらう必要がなくなった場合、既存の共同オーナーを削除できます。

始める前に
必要なロール：

- トップレベルの投資で共同オーナーを管理する場合：sn_invst_pln_v2.investment_planner
- [自分の資金] で共同オーナーを管理する場合：sn_invst_pln_v2.investment_user、sn_invst_pln_v2.investment_planner

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. トップレベルの投資または [自分の資金] を開きます。
2. [詳細] タブをクリックします。
3. 共同オーナーのロック解除アイコン () をクリックします。
   - ユーザーを共同オーナーとして追加するには、[ターゲットレコードを選択] 検索フィールドを使用してユーザーを検索し、選択します。
   - 既存の共同オーナーを削除するには、名前を選択し、選択したアイテムの削除アイコン () をクリックします。
4. [更新] をクリックします。

投資のための資金を要求

投資のために資金源から資金を要求します。

始める前に
必要なロール： sn_invst_pln_v2.investment_user

このタスクについて
他の一般投資から一般投資の資金を要求することはできません。

過去に投資に資金を割り当てた一般ソース投資からのみ資金を要求できます。

資金を要求できるのは、[投資枠管理の設定] で構成された資金調達頻度のみです。

資金を要求できるのは、エンティティの作成時に [資金調達可能なエンティティ] フィールドで追加したエンティティからのみです。

要求済みおよび計画ステータスで、過去の資金調達期間または編集不可能な資金調達期間の資金調達要求を取り消すことができます。

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > 自分の資金.
2. 投資カードをクリックして、資金が必要な投資を開きます。

   別の投資を開く場合は、現在表示されている投資の名前の横にあるドロップダウンメニューにアクセスします。[自分の投資を検索] フィールドに名前を入力して別の投資を検索するか、最近アクセスした 5 つの投資から選択します。
3. [資金を表示/要求] タブをクリックします。
4. 作業期間を選択し、[適用] をクリックします。
   [予算を要求] リストには、以前に投資のために資金を要求した資金源のみが表示されます。
5. [新しいソースを追加] リンクをクリックして、資金源を選択します。
6. [ソースを選択] ペインで、リストから 1 つ以上のソース投資を選択し、[選択項目を追加] をクリックします。
   指定した資金源が [予算を要求] グリッドに追加されます。
7. [予算を要求] グリッドで、資金を要求する資金源の [新規/変更要求] の [投資] 列および [経費] 列で金額を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

更新されたすべての資金源のステータスが [ドラフト] または [計画] に変更され、セルが強調表示されます。

8. [要求] をクリックします。
9. [要求を確認] ダイアログボックスで、要求を確認し、必要に応じてコメントを追加します。
10. [要求] をクリックします。
11. オプション: [新規/変更要求] フィールドの列を右クリックし、[取り消し] を選択して資金調達要求を取り消します。

タスクの結果

- 指定された期間、ソース投資ソースから資金が要求されます。
- 資金要求レコードのステータスが [要求済み] に変更されます。

投資のための資金配分を計画する

資金配分を確定する準備がまだ整っていない場合は、資金配分を計画します。

始める前に

必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_user

このタスクについて

資金を割り当てる準備がまだ整っていない場合は、投資を計画段階にしておきます。たとえば、すべての投資のニーズを満たすために追加資金が必要かどうかを判断できるまで待ってもかまいません。

受領した資金に加えて投資に資金を割り当てる場合は、過剰割り当てであることを示す警告メッセージが [合計] 行に表示され、資金調達設定で指定されたバッファー金額から追加資金金額が差し引かれます。資金の過剰割り当ての設定の詳細については、「投資枠管理の設定」トピックを参照してください。利用可能な資金にバッファー金額を加えた額を超えて割り当てを行った場合は、割り当てのために新しい資金を送信できない旨のエラーメッセージが表示されます。

資金の割り当て計画は、[投資枠管理 の設定] で構成された資金調達頻度に従った計画のみ可能です。

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > 自分の資金.
2. 投資カードをクリックして、他の投資に割り当てる予定資金があるアクティブな投資を開きます。

   別の投資を開く場合は、現在表示されている投資の名前の横にあるドロップダウンメニューにアクセスします。[自分の投資を検索] フィールドに名前を入力して別の投資を検索するか、最近アクセスした 5 つの投資から選択します。

3. [資金を割り当て] タブをクリックします。
4. 作業期間を選択し、[適用] をクリックします。
   - 以前に資金を割り当てた場合、または受信した資金要求がある場合、そうした投資は [資金を割り当て] リストに表示されます。
   - フィルターアイコン ( ) をクリックすると、処理待ちの (計画中および要求された) 投資をフィルタリングできます。
5. [資金を割り当て] リストで、資金を割り当てる予定の受信要求を選択します。
6. [計画] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果

- 資金の割り当ては、指定された期間に、選択された投資に対して計画されます。
- 更新されたすべての投資のステータスが [計画] に変更され、セルが強調表示されます。
- 割り当ての計画後に残る金額は、[計画立案後に移動] 行に表示されます。

次のタスク

計画された投資に資金を割り当てる

投資への資金の割り当て

ビジネスゴールと利用可能な資金に基づいて、投資に資金を割り当てます。

始める前に

必要なロール： sn_invst_pln_v2.investment_user

このタスクについて

資金を割り当てることができるのは、[投資枠管理の設定] で構成された資金調達頻度のみです。

以前に投資に資金を割り当てた場合は、既存の金額より多いか、または少ない金額を入力することで、資金調達金額を増減できます。小さい値を入力すると、差額の投資資金が回収されます。

受領した資金に加えて投資に資金を割り当てる場合は、過剰割り当てであることを示す警告メッセージが [合計] 行に表示され、資金調達設定で指定されたバッファー金額から追加資金金額が差し引かれます。資金の過剰割り当ての設定の詳細については、「投資枠管理の設定」トピックを参照してください。利用可能な資金にバッファー金額を加えた額を超えて割り当てを行う場合は、割り当てのために新しい資金を送信できない旨のエラーメッセージが表示されます。

資金を割り当てることができるのは、エンティティの作成時に [資金調達可能なエンティティ] フィールドで追加したエンティティに対してのみです。

注:
一般投資の場合、所有する投資に資金を割り当てることができます。

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > 自分の資金.
2. 投資カードをクリックして、他の投資に割り当てる十分な資金があるアクティブな投資を開きます。

   別の投資を開く場合は、現在表示されている投資の名前の横にあるドロップダウンメニューにアクセスします。[自分の投資を検索] フィールドに名前を入力して別の投資を検索するか、最近アクセスした 5 つの投資から選択します。
3. [資金を割り当て] タブをクリックします。
4. 作業期間を選択し、[適用] をクリックします。
   - 以前に資金を割り当てた場合、または受信した資金要求がある場合、そうした投資は [資金を割り当て] リストに表示されます。
   - フィルターアイコン ( ) をクリックすると、処理待ちの (計画中および要求された) 投資をフィルタリングできます。
5. オプション: 資金を割り当てるために、[資金を割り当て] リストにさらに投資を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [追加] をクリックします。

b. オプション: ソースエンティティに対して十分な権限がある場合は、[新規] をクリックして新しいエンティティレコードを作成します。

c. [追加] ペインで、リストから 1 つ以上の投資を選択し、[選択項目を追加] をクリックします。

(Optional) 表示されているすべての投資を含めるには、[すべて追加] をクリックします。

6. [資金を割り当て] リストで、資金を割り当てるすべての投資について、[新しい資金] で [投資] 列と [経費] 列に金額を入力します。

> **注:**
> 受信要求の場合は、[新しい資金] の [投資] 列および [経費] 列に金額を入力する際に、[新しい要求] 列の金額を考慮に入れます。

更新されたすべての投資のステータスが [計画] に変更され、セルが強調表示されます。

7. [資金] をクリックします。

8. [資金の割り当てを確認] ダイアログボックスで割り当てを確認し、[資金] をクリックします。

資金の割り当てを確認しながら、あるセクションで資金調達に資金が利用可能な四半期のすべての詳細を表示し、別のセクションで資金調達に資金が利用できない四半期の詳細を表示できます。

9. オプション: グリッドの列を右クリックし、[過去の資金調達の詳細の表示] を選択して、過去の会計期間の子投資について資金調達の詳細を表示します。

(Optional) 詳細については、「過去の資金調達の詳細を表示」トピックを参照してください。

タスクの結果

- 資金は、指定された期間に、選択された投資に対して割り当てられます。
- 資金調達済み投資のステータスが [資金調達済み] に変更されます。

投資の実際の支出の入力

投資の実際の支出を入力して、資金の使用状況を追跡します。

始める前に

必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_user

このタスクについて

投資の資金を使用してビジネスアクティビティを実行したり、ビジネスゴールを達成するために他の投資に資金を割り当てたりすることができます。支出金額を実際の支出 (「実績」) として、それぞれの投資に記録できます。実績を追跡すると、次のことができます。

- 資金をどこでどのように使用したかを追跡する。
- 親投資実績を合計する。

単一の資金調達元がある場合、プロジェクトまたは需要に対して発生した実際のコストが合計され、投資枠管理のグリッドに自動的に表示されます。複数のソースがある場合は、次の手順を実行して実績を手動で入力する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- (従来の投資枠管理プラグインから ServiceNow Store アプリケーションにアップグレードした場合) アップグレード前に実績を手動入力した場合、アップグレード後にプロジェクトに投稿された実績とは一致しません。
- プロジェクトまたはデマンドのコスト計画ブレークダウンの [予算] フィールドが資金調達後に編集された場合、投資および経費予算は投資枠管理フローから資金調達された金額と一致しません。

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > 自分の資金.
2. 実績を入力する投資を開きます。

   別の投資を開く場合は、現在表示されている投資の名前の横にあるドロップダウンメニューにアクセスします。[自分の投資を検索] フィールドに名前を入力して別の投資を検索するか、最近アクセスした 5 つの投資から選択します。
3. [資金を表示/要求] タブをクリックします。
4. 作業期間を選択し、[適用] をクリックします。
5. [予算を要求] リストで、投資の [実績投資] 列と [実績経費] 列で、実際に費やした金額を指定します。

   注:

   リストに [実績投資] 列と [実績経費] 列が表示されない場合は、構成アイコン ( ) をクリックし、各列を選択します。

タスクの結果

- 入力した金額は、投資を通じて使用された実績資金として更新されます。
- この金額は親投資にロールアップされ、さらに親投資はトップレベルの投資に至るまでロールアップされます。

資金要求を却下

ビジネスの優先順位に基づいて、または十分な資金がない場合は、受信した資金の要求を却下することができます。

始める前に
必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_user

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > 自分の資金.
2. アクティブな投資を開きます。

   別の投資を開く場合は、現在表示されている投資の名前の横にあるドロップダウンメニューにアクセスします。[自分の投資を検索] フィールドに名前を入力して別の投資を検索するか、最近アクセスした 5 つの投資から選択します。
3. [資金を割り当て] タブをクリックします。
4. 作業期間を選択し、[適用] をクリックします。
5. [資金を割り当て] グリッドから投資を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. [資金を割り当て] ドロップダウンリストをクリックし、[却下] を選択します。
7. オプション: 投資を選択し、[資金を割り当て] ドロップダウンリストから [クリア] をクリックして、過去の資金調達期間または編集不可能な資金調達期間に対する計画ステータスの資金調達要求をリストから削除します。

資金の使用状況の確認

資金を割り当てるか、または要求するときに、ある投資から他の投資への資金の流れを確認し、情報に基づいた意思決定を行います。

始める前に
必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_user

このタスクについて
資金の使用状況を確認することで、投資が資金がいつ使用されたか、また資金がビジネスゴールの優先度を依然として満たしているかどうかを確認できます。

注:
投資の実績金額は、入力した直接支出と、資金を割り当てたすべての投資の合計です。正しい実績金額は、投資のオーナーが実際の支出を投資に入力した場合にのみ反映されます。

ツリービューカードで、受領した資金と実績の差額 (支出不足額または支出超過額) を確認できます。資金の受領金額が資金の金額を上回っている場合は、支出不足の金額が緑色で表示されます。資金の受領金額が資金の金額を下回っている場合は、支出超過の金額が赤色で表示されます。

[資金を割り当て] または [資金を表示/要求] のリストビューで、カードに表示する情報を設定できます。たとえば、合計実績金額のみを表示するようにリストビューを設定できます。

投資オーナーが [表示可能] フィールドに追加したユーザーは、投資の詳細を確認することもできます。特定の投資に資金を提供する投資オーナーは、その投資のフィールドリストに自動的に追加されます。たとえば、プログラム投資がポートフォリオ投資から資金を受け取った場合、ポートフォリオ投資のオーナーがプログラム投資の [表示可能] フィールドに追加されます。

手順
1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > 自分の資金.
2. 投資カードをクリックしてアクティブな投資を開き、資金の割り当てを確認します。

   別の投資を開く場合は、現在表示されている投資の名前の横にあるドロップダウンメニューにアクセスします。[自分の投資を検索] フィールドに名前を入力して別の投資を検索するか、最近アクセスした 5 つの投資から選択します。

3. [資金を割り当て] タブのツリービューアイコン ( ) をクリックします。
   投資と資金調達した投資は、階層ビューにカードとして直接表示されます。子投資の数は、親投資カードに表示されます。10 を超える投資カードがある場合は、コンパクトカードビューを使用できます。
4. 投資をクリックすると、他の投資への資金配分が表示されます。

   子投資カードにドリルダウンすると、右上隅のクリック可能なメニューに現レベルの階層が表示されます。

5. オプション: [アクション] メニューをクリックし、[投資の表示] を選択して投資グリッドに移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

過去の資金調達の詳細の表示

投資の過去の資金調達の詳細を表示します。

始める前に

必要なロール： sn_invst_pln_v2.investment_user

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > 自分の資金.
2. 投資カードをクリックして、過去の資金調達の詳細を表示する投資を開きます。

   別の投資を開く場合は、現在表示されている投資の名前の横にあるドロップダウンメニューにアクセスします。[自分の投資を検索] フィールドに名前を入力して別の投資を検索するか、最近アクセスした 5 つの投資から選択します。
3. [資金を割り当て] タブをクリックします。
4. グリッドの列を右クリックし、[過去の資金調達の詳細の表示] を選択して、過去の会計期間の投資について資金調達の詳細を表示します。

   投資のオーナーではなくても、投資の [表示可能] フィールドに追加されている場合は、投資を読み取り専用モードで表示できます。

   グラフには、受領した資金合計と、過去 1 年間の会計期間の実績合計との比較が表示されます。

ドメインセパレーションと 投資枠管理

ドメインセパレーションは 投資枠管理 でサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略的ポートフォリオ管理の **PowerPoint** エクスポート

ServiceNow® 戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート アドインを使用すると、インスタンスからプロジェクトステータスレポートを Microsoft PowerPoint ファイルとして生成してダウンロードできます。このファイルを使用して、ステークホルダーまたはチーム間で共有してコラボレーションを行うことができます。

PowerPoint へのエクスポート の概要

PowerPoint エクスポートの概要ビデオ。所要時間は約 2 分です。

開始

探索



PowerPoint へのエクスポートアドイン機能について説明します。

構成



PowerPoint へのエクスポート アドインをインストールして構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用方法	参照
 PowerPoint へのエクスポートを使用して、プロジェクトステータスレポートを生成してダウンロードします。	 インストールされたコンポーネント、フォームフィールド、テーブル、ロール、一般的なガイドラインに関する詳細を確認します。

自動翻訳

重要:

- 場所に基づいて ServiceNow サーバー内でプロジェクトステータスレポートを生成するために必要なデータ処理の詳細については、Now Support ナレッジベース の記事 KB1170323 を参照してください。
- PowerPoint へのエクスポートは現在、FedRAMP、NSC DOD IL5、オーストラリアの IRAP で保護されたデータセンターのお客様、セルフホスト型のお客様、またはその他の制限された環境のお客様は利用できません。将来のリリースで可用性の更新を確認してください。

トラブルシューティングとサポート

- で質問や回答をする 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) フォーラム ServiceNow コミュニティ
- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

PowerPoint へのエクスポート の探索

PowerPoint へのエクスポート アプリケーションは、プロジェクトステータスレポートを生成してダウンロードするのに役立ちます。このファイルを使用して、ステークホルダーまたは共同作業のチームにプロジェクトステータスレポートを提示し、次のステップを特定します。

Microsoft PowerPoint テンプレートを作成するには、次のデータタイプを使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レポートテンプレートタイプ

レポートタイプ	説明
テキスト	テキスト形式のレポートを生成します。
テーブル	テーブル形式のレポートを生成します。
線グラフ	線グラフレポートを生成します。
棒グラフ	棒グラフレポートを生成します。
リピーター	テンプレート形式を保持することによって、レコード内のすべてのエントリのデータを生成するために使用されるトークン。

PowerPoint へのエクスポートの構成

PowerPoint へのエクスポート アプリケーションをインスタンスにインストールし、Microsoft PowerPoint で構成するために使用するプロセスと前提条件について説明します。

構成ワークフロー

ServiceNow Store から PowerPoint へのエクスポート アプリケーションをダウンロードした後、次の手順を指針として Microsoft PowerPoint の ServiceNow アドインを設定してインストールします。

1. ServiceNow Store から 戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート をインストールします。詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート のインストール」を参照してください。
2. 関連するテーブルとスクリプト要素コンポーネントを管理します。詳細については、「[関連テーブル] フォームと [スクリプト要素] フォームの管理」を参照してください。
3. インスタンスからマニフェストファイルをダウンロードし、Microsoft Office 365 アカウントマネージャーと共有します。詳細については、「Download the manifest file from your instance (インスタンスからマニフェストファイルをダウンロード)」を参照してください。
4. Microsoft PowerPoint の PowerPoint へのエクスポート アドインを構成します。詳細については、「Microsoft PowerPoint 用 PowerPoint へのエクスポート アドインの構成」を参照してください。

戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート のインストール

admin ロールがある場合は、戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート アプリケーション (sn_ppt) をインストールできます。このアプリケーションには、デモデータが含まれています。まだインストールされていない場合は、関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインをインストールします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- 依存関係、ライセンスやサブスクリプションの要件、およびリリースの互換性については、ServiceNow Store のアプリケーションリストを確認してください。
- 必要なロール：admin
- **重要:**
  場所に基づいて ServiceNow サーバー内でプロジェクトステータスレポートを生成するために必要なデータ処理の詳細については、Now Support ナレッジベース の記事 KB1170323 を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して、 戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート アプリケーション (sn_ppm_ppt_export) を検索します。

   名前または ID でアプリケーションを検索できます。アプリケーションが見つからない場合は、ServiceNow Store へのリクエストが必要になることがあります。

   [インストール] ボタンの横のリストに、使用可能なバージョンが表示されます。
3. リストからバージョンを選択し、[インストール] を選択します。

   表示される [インストールの詳細を確認] ダイアログボックスに、アプリケーションとともにインストールされている依存関係が一覧表示されます。
4. プロンプトが表示された場合は、ServiceNow Store へのリンクに従って、依存関係のエンタイトルメントを取得します。
5. オプション: 利用できるデモデータをインストールするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。
   デモデータは、一般的なユースケース向けのアプリケーション機能を説明するサンプルレコードです。開発またはテストインスタンスで初めてアプリケーションをインストールする場合は、デモデータを読み込みます。
6. **[Install** (インストール)] を選択します。

タスクの結果
以下のコンポーネントは、戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート アプリケーションのインストール時にインストールされます。

- ロール
- テーブル

詳細については、「戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

[関連テーブル] フォームと [スクリプト要素] フォームの管理

Microsoft PowerPoint テンプレートを作成するために必要な [関連テーブル] と [スクリプト要素] コンポーネントを管理します。

始める前に
必要なロール：sn_ppt_export.ppt_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **PowerPoint** 管理 > **PowerPoint** レポートタイプ.
2. レポート名を選択します。

オプション	説明
[関連テーブル] を管理するには	親テーブルからカスタムリモートテーブルまたは子を追加できます。 **a.** [関連テーブル] コンポーネントで、[新規] を選択します。 [関連テーブル] フォームのフィールドに記入します。フィールド値の説明については、「関連テーブルフォーム」を参照して ください。 **b.** カスタムリモートテーブルを追加するには： **i.** Create a remote table 。 **ii.** リストから必要なリモートテーブルを選択します。 **iii.** [カスタムスクリプトを有効にする] オプションを選択します。 **iv.** [カスタムスクリプト] ボックスに、リモートテーブルとメインテーブル間の接続を確立するコードを記述します。 **c.** メインテーブルから子テーブルを選択するには： **i.** リストから子テーブルを選択します。 **ii.** リストから親関係列を選択します。 **d.** [送信] を選択します。 選択したテーブルとその親テーブルとの関係が [関連テーブル] セクションに表示されます。
[スクリプト要素] を管理するには	**a.** [スクリプト要素] コンポーネントで、[新規] を選択します。 **b.** [スクリプト要素] フォームで、フィールドに入力します。フィールド値の説明については、「スクリプト要素フォーム」を参照してください。 **c.** [送信] を選択します。

3. [更新] を選択します。

マニフェストファイルのダウンロード

ユーザーロールを設定し、Microsoft PowerPoint 用 PowerPoint へのエクスポート アドインを使用するアドインマニフェストファイルをダウンロードします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：sn_ppt_export.ppt_admin

手順

1. 移動先 すべて > **Office** 用 **ServiceNow** アドイン > **Office** アドインマニフェスト.
2. **[ServiceNow** のテンプレート **(Templates for ServiceNow)]** をクリックします。

   注:
   [ServiceNow のテンプレート **(Templates for ServiceNow)]** の説明を **ServiceNow** 用 **PowerPoint** プラグインと照合して、正しいマニフェストファイルが選択されていることを確認してください。

3. [マニフェストをダウンロードします] をクリックして、アドインファイルをダウンロードします。

次のタスク

- manifest.xml ファイルを Microsoft Office 365 ユーザーのマニフェストファイルをアップロード する Microsoft Office 365 アカウントマネージャーと共有して、Microsoft PowerPoint 用 PowerPoint へのエクスポート アドインを有効にします。

  または、次のいずれかのプロセスを使用して、テスト用のアドインをサイドローディングできます。

  - Windows マシンの場合：https://learn.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/testing/create-a-network-shared-folder-catalog-for-task-pane-and-content-add-ins
  - macOS マシンの場合：https://learn.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/testing/sideload-an-office-add-in-on-mac

- ブラウザーバージョンの Microsoft PowerPoint で PowerPoint へのエクスポート アドインを有効にするために必要な追加の構成手順の詳細については、Now Support ナレッジベース の記事 KB1171422 を参照してください。

Microsoft PowerPoint 用 **PowerPoint** へのエクスポート アドインの構成

Microsoft PowerPoint の PowerPoint へのエクスポート アドインを構成して、インスタンスとやり取りし、プロジェクトステータスレポートの生成とダウンロードに必要なデータをフェッチします。


始める前に

- PowerPoint へのエクスポートアドインが Microsoft PowerPoint に対して有効になっていることを確認します。なっていない場合は、マニフェストファイルのダウンロードして、Microsoft Office 365 アカウントマネージャーにお問い合わせください。
- 必要なロール：sn_ppt_export.ppt_admin or sn_ppt_export.ppt_user

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. Microsoft PowerPoint アプリケーションを開き、[ホーム] タブの ServiceNow アドインアイコン (

) をクリックします。
ServiceNow インスタンスにアクセスするためのログインオプションがあるパネルが表示されます。
2. **[Log in** (ログイン)] をクリックします。
3. ServiceNow インスタンス認証情報を入力し、[ログイン] を選択します。
インスタンス名などの詳細とともに、インスタンスへのアクセスを要求するプロンプトが表示されます。
4. インスタンスの詳細を確認し、[許可] を選択します。

タスクの結果
アドインのランディングページが右側のパネルとして表示されます。



注:
ブラウザーバージョンの Microsoft PowerPoint で PowerPoint へのエクスポートアドインを有効にするために必要な追加の構成手順の詳細については、Now Support ナレッジベースの記事 KB1171422 を参照してください。

次のタスク
Microsoft PowerPoint テンプレートの作成。

PowerPoint へのエクスポート の使用

Microsoft PowerPoint 用の PowerPoint へのエクスポート アドインを使用して、レポートを生成するテンプレートを作成します。

注:
テンプレートの作成中、フォントスタイル、フォントサイズ、背景色など、使用した書式設定オプションはレポートの生成時に保持されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. Microsoft PowerPoint テンプレートを作成します。詳細については、「Microsoft PowerPoint テンプレートの作成」を参照してください。
2. Microsoft PowerPoint テンプレートを ServiceNow インスタンスにアップロードします。詳細については、「Microsoft PowerPoint テンプレートのアップロード」を参照してください。
3. 作成したテンプレートを使用してプロジェクトステータスレポートをダウンロードします。詳細については、「プロジェクトステータスレポートのダウンロード」を参照してください。


Microsoft PowerPoint テンプレートの作成

Microsoft PowerPoint の PowerPoint へのエクスポート アドインを構成して、インスタンスとやり取りし、ステータスレポートの生成とダウンロードに必要なデータをフェッチします。組織のレポートニーズに基づいて、レポートの生成に必要なデータを使用して独自のカスタムテンプレートを作成します。


始める前に

- アドインのログインを使用してインスタンスを Microsoft PowerPoint に接続し、エピックの詳細のレポートを生成するためのテンプレート ポートフォリオ計画 を作成しましょう。
- 必要なロール：sn_ppt_export.ppt_user

手順

1. Microsoft PowerPoint アプリケーションを開き、[ホーム] タブの ServiceNow アドインアイコン (

) をクリックします。
ServiceNow インスタンスにアクセスするためのログインオプションがあるサイドパネルが表示されます。
2. [ログイン] を選択します。
3. ServiceNow インスタンス認証情報を入力し、[ログイン] を選択します。
インスタンスの詳細を示すプロンプトが表示されます。
4. インスタンスの詳細を確認し、[許可] を選択します。
アドインのランディングページが右側のパネルに表示されます。



5. [タイプ] リストから [個人ポートフォリオ] レポートを選択します。

入力するデータタイプを選択します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- テキスト：親テーブルのテキストエントリ。例：ポートフォリオ名、所有者名など。
- テーブル：関連テーブルを使用してマッピングされたテーブルエントリ。
- リピーター：選択した各レコードの追加の詳細を入力。
- 線グラフと棒グラフ： スクリプト要素を使用してマッピングされたグラフエントリ。

> **注:**
> テンプレートの作成中に、次のことができます。
> - トークン値のフォントサイズと色を変更して、ステータスレポートに反映させます。
> - トークン内を移動して、必要な形式で配置します。
> - スライドにカスタムロゴまたは組織ロゴを追加します。
> - 要件に従ってチャートトークンのサイズを変更します。

6. 最初のスライドでポートフォリオ名を入力するには：
   a. データタイプから [テキスト] を選択します。
   b. [列] リストをフィルタリングして名前を見つけ、選択します。ポートフォリオ名を表すトークン値が、後続の空のテキストボックスに生成されます。
   c. [テキストをコピー] ボタンを選択して、トークンをコピーします。
   d. スライドにトークンを貼り付けます。

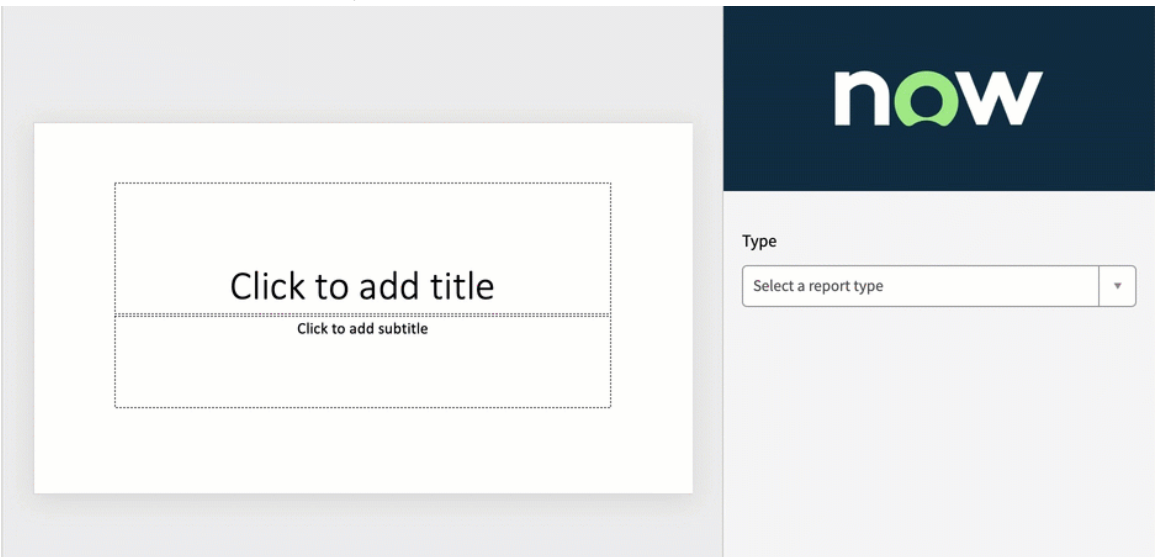

新しいスライドを Microsoft PowerPoint に追加し、3 列 2 行のテーブルを挿入して、番号、ステータス、および期日を含むエピックを生成します。

7. 番号、ステータス、期日などのエピックの詳細を入力するには：
   a. アドインのランディングページで、[データ] リストから [テーブル] を選択します。

      [戻る] (← Back) ボタンを使用して、アドインのランディングページに戻ります。

   b. [関連テーブル] リストから [エピック] を選択します。
   c. [関連テーブル (オプション)] リストから、エピックに関連するテーブルを選択します。
   d. 入力する行数を選択します。デフォルトでは、5 行が選択されています。

      1 行～10 行まで選択できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

e. フィルターアイコンを使用して、既存のフィルターを表示したり、データを入力するための条件を定義したりします。


ここでは、期限が 4 月 30 日で、[準備完了] または [対応中] ステータスのエピックを選択しています。

f. [次へ] を選択します。

g. [列] リストから [番号] を選択します。

h. トークン値をコピーしてテーブルに貼り付けます。

i. 同様に、[列] リストから [ステータス] フィールドと [アサイン先] フィールドのトークン値をコピーして貼り付けます。

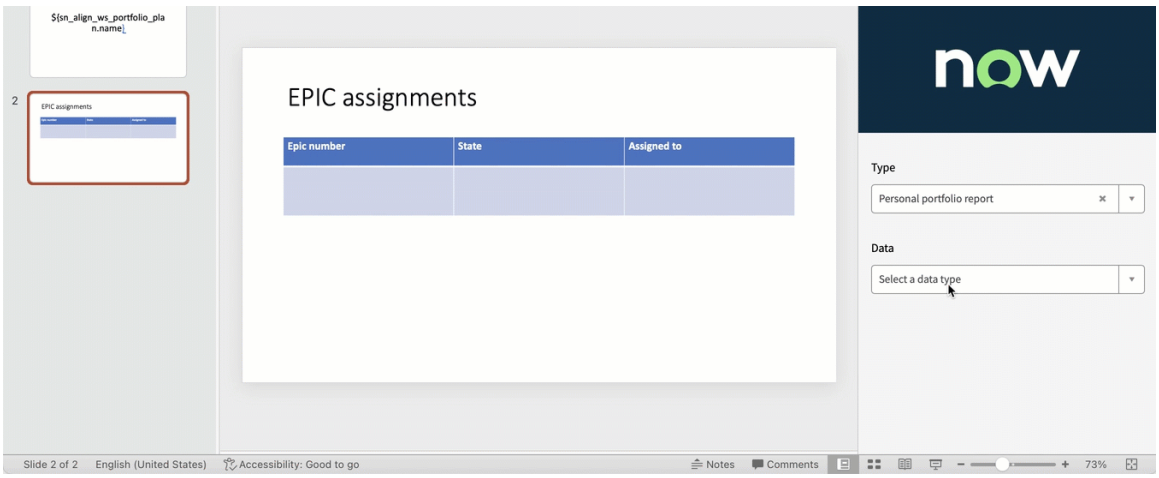

新しいスライドを Microsoft PowerPoint に追加します。

8. 選択した各レコードに必要な詳細を入力するには：

a. アドインのランディングページで、[データ] リストから [テーブル] を選択します。

[戻る] (← Back) ボタンを使用して、アドインのランディングページに戻ります。

b. [データ] リストから [リピーター] を選択します。

c. [関連テーブル] リストから [エピック] を選択します。

d. フィルターオプションを使用して必要なフィルターを追加し、[次へ] を選択します。


e. 必要なフィールドを選択して、トークンをコピーしてスライドに貼り付けます。

f. リピータートークンをコピーしてスライドに貼り付ける

> **注:**
> リピータートークンはステータスレポートに値を生成しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

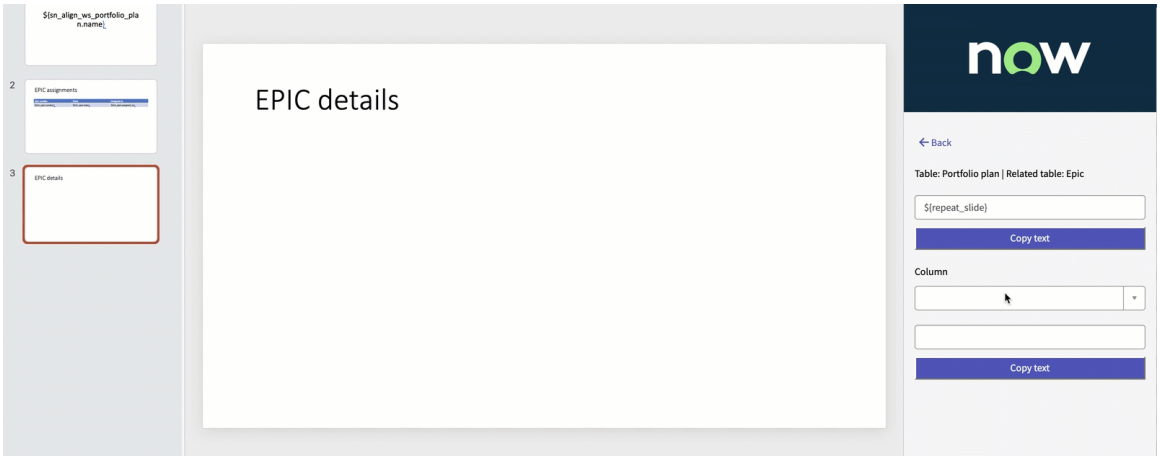


新しいスライドを Microsoft PowerPoint に追加します。

9. 線グラフまたは棒グラフに入力するには：
   a. アドインのランディングページで、[データ] リストから [線グラフ] または [棒グラフ] を選択します。

      [戻る] (Back) ボタンを使用して、アドインのランディングページに戻ります。

   b. [チャートを選択 (スクリプト要素を使用して定義) (Select a chart (defined using scripted elements))] リストから、レポートに入力するチャートを選択し、[次へ] を選択します。
   c. [クリップボードにコピー] ボタンを選択して、グラフトークンをコピーします。
   d. スライドにトークンを貼り付けます。

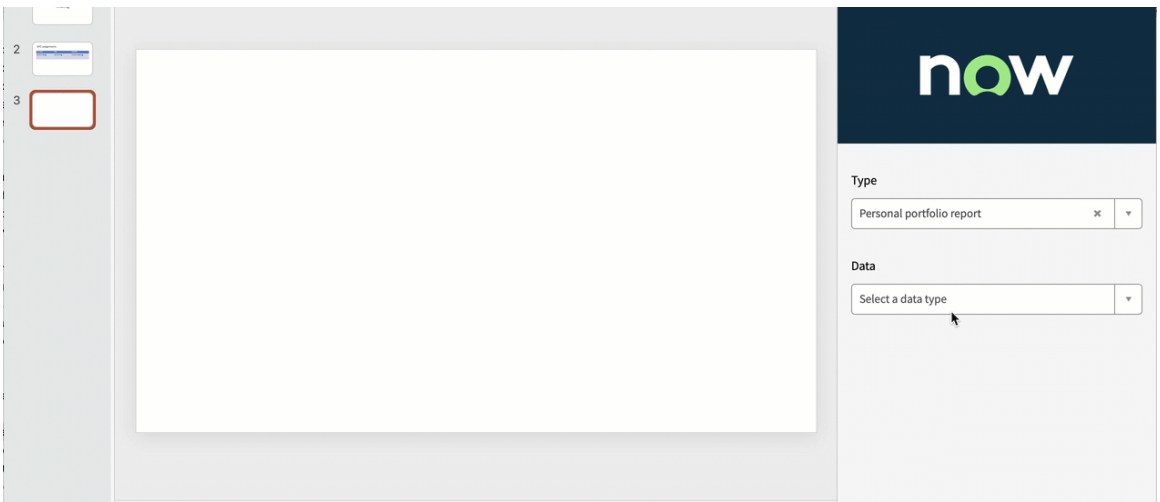

10. Microsoft PowerPointファイルを、最大 50 枚のスライドとファイルサイズが 15 MB 以下の.pptx形式で保存します。

> **注:**
> 戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート アプリケーションには、レポート生成に使用したり、テンプレート作成の参考にしたりできるデフォルトのテンプレートが付属しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft PowerPoint テンプレートのアップロード

最新のテンプレートをインスタンスにアップロードして、ステータスレポートを生成し、 Microsoft PowerPoint ファイルとしてダウンロードします。

始める前に
必要なロール：sn_ppt_export.ppt_user

手順

1. 移動先 すべて > **PowerPoint** 管理 > **PowerPoint** テンプレート.
2. 最新のテンプレートを添付するレコードを選択します。
3. [添付ファイルを管理] アイコン (
4. [ファイルを選択] を選択して、テンプレートを参照してアップロードします。

   注:
   一度に使用できるテンプレート (.pptx) は 1 つのみで、最大ファイルサイズは 15 MB です。既存のテンプレートを削除して、新しいテンプレートをアップロードしてください。

5. ダイアログボックスを閉じ、フォームで [更新] を選択します。

次のタスク
プロジェクトステータスレポートのダウンロード。

プロジェクトステータスレポートのダウンロード

プロジェクトとプロジェクトステータスレポートを Microsoft PowerPoint ファイルとしてダウンロードして、ステークホルダーと共有します。

始める前に
必要なロール：sn_ppt_export.ppt_user

重要:
PowerPoint へのエクスポートは現在、FedRAMP、NSC DOD IL5、オーストラリアの IRAP で保護されたデータセンターのお客様、セルフホスト型のお客様、またはその他の制限された環境のお客様は利用できません。将来のリリースで可用性の更新を確認してください。

手順

1. エンタープライズアーキテクチャ (以前のアプリケーションポートフォリオ管理) のステータスレポートをダウンロードするには、「Export data to Microsoft PowerPoint - Legacy」を参照してください。
2. プロジェクトワークスペース のステータスレポートをダウンロードするには、「プロジェクトステータスレポートのプロジェクトワークスペースから Microsoft PowerPoint へのエクスポート」を参照してください。
3. プロジェクトワークスペースからプロジェクトをダウンロードするには、「プロジェクトワークスペースのプロジェクトのエクスポート」を参照してください。
4. 戦略的計画 のステータスレポートをダウンロードするには、「ポートフォリオ計画ステータスまたはロードマップのエクスポート先 Microsoft PowerPoint」を参照してください。
5. ポートフォリオ計画 のステータスレポートをダウンロードするには、「ポートフォリオ計画ステータスまたはロードマップのエクスポート先 Microsoft PowerPoint」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクの結果
レポートは、プロジェクト番号とステータスレポートの日付をファイル名として Microsoft PowerPoint ファイルとしてダウンロードされます。

PowerPoint へのエクスポート に関する参照情報

参照トピックでは、フィールド、テーブル、ロールなど、PowerPoint へのエクスポート に関する追加の詳細と、いくつかのガイドラインが提供されます。

戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート とともにインストールされるコンポーネント

ユーザーロールおよびテーブルを含むいくつかのタイプのコンポーネントが、戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート (sn_ppt) アドインを有効にすることでインストールされます。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート admin [sn_ppt_export.ppt_admin]	• Microsoft PowerPoint テンプレートを生成するために必要な属性を作成、編集、および管理します。 • このロールは、スクリプト要素のソースコードを変更するためのアクセス権がある PowerPoint へのエクスポート アプリケーション用の高セキュリティロールであるため、割り当てに信頼性があります。	sn_ppt_export.ppt_user
戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート ユーザー [sn_ppt_export.ppt_user]	• テンプレートを作成し、ServiceNow インスタンスにアップロードして、プロジェクトステータスレポートを生成し、ダウンロードします。 • デフォルトでは、project_user ロールを持つユーザーにこのロールが割り当てられます。	なし

インストールされるテーブル

テーブル	説明
PowerPoint セルフォーマッター [sn_ppt_export_ppt_cell_formatter]	テキスト、テキストの背景、テーブルのセル、および図形の塗りつぶしの色プロパティを保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
PowerPoint 要素 [sn_ppt_export_ppt_element]	Microsoft PowerPoint テンプレートを生成するために必要な要素を保存します。
PowerPoint フォーマッター [sn_ppt_export_ppt_formatter]	テキストの書式設定オプションを保存します。
PowerPoint フォーマッターマッピング [sn_ppt_export_ppt_formatter_mapping]	トークンの形式マッピングを保存します。
PowerPoint レポートタイプ [sn_ppt_export_ppt_report_type]	レポートの生成に使用できるレポートタイプを保存します。
PowerPoint テンプレート [sn_ppt_export_ppt_template]	テンプレートに必要なメタデータを保存します。
PPT サービス要求ログ [sn_ppt_export_ppt_poi_service_request_log]	サービス要求ログを保存します。
関連テーブル [sn_ppt_export_ppt_related_table]	レポートの関連テーブルを保存します。
スクリプト要素 [sn_ppt_export_ppt_scripted_element]	線グラフや棒グラフなど、サポートされているグラフのタイプを保存します。

自動翻訳

関連テーブルフォーム

関連テーブルフォームを使用して、構成された親テーブルの子テーブルを定義します。この関連テーブルは、プロジェクトステータスレポートを Microsoft PowerPoint としてエクスポートするデータをフェッチするのに役立ちます。

関連テーブルフォーム

フィールド	説明
名前	子テーブルの名前。
親関係列	親テーブルと子テーブルの間の関係。 関連テーブルを管理する方法の詳細については、「[関連テーブル] フォームと [スクリプト要素] フォームの管理」を参照してください。

スクリプト要素フォーム

[スクリプト要素] フォームを使用して、線グラフや棒グラフなどの複雑なレポートタイプのデータをフェッチするデータスクリプトを定義します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプト要素フォーム

フィールド	説明
名前	要素の名前。
タイプ	生成するグラフのタイプ (線グラフまたは棒グラフ)。 必要なグラフタイプを選択すると、スクリプト要素のコード形式の提案された形式が [データスクリプト] フィールドに表示されます。
説明	レポートの説明。(例：計画と実績コストの比較。)
データスクリプト	レポートのデータをフェッチするために使用されるスクリプト。 スクリプト要素の管理方法の詳細については、「[関連テーブル] フォームと [スクリプト要素] フォームの管理」を参照してください。

線グラフパラメーター

線グラフのプロパティと書式設定を定義するために使用される基本的なパラメーターは次のとおりです。

線グラフパラメーター

パラメーター	説明	参照値
@property {文字列} seriesArray.properties.color：線の色	線の色。	16 進数コード値を使用して、線の色を定義します。 たとえば、赤色には 16 進数コード #FF0000 を使用します。
@property {文字列} seriesArray.properties.type：線のタイプ。	線のタイプ。	参照線の書式設定の詳細については、「https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/PresetLineDash.html#DASH」を参照してください。
@property {文字列} seriesArray.properties.markerStyle：マーカーのスタイル	グラフ上の重要なポイントを識別するマーカーのスタイル。	参照マーカーの書式設定の詳細については、「https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/MarkerStyle.html」を参照してください。
@property {Number} seriesArray.properties.markerSize：スタイルのサイズ	グラフ上でのマーカーのサイズ。	最小値：2、最大値：72 (それぞれの数を含む)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

線グラフパラメーター (続く)

パラメーター	説明	参照値
@property {String} legendPosition：グラフでの凡例の位置。これはオプションです	グラフの凡例の位置。	凡例の位置の詳細については、https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/LegendPosition.html を参照してください。

棒グラフパラメーター

棒グラフのプロパティと書式設定を定義するために使用される基本的なパラメーターは次のとおりです。

棒グラフパラメーター

パラメーター	説明	参照値
@property {文字列} barProperties.direction	グラフ内の棒をプロットする方向。	棒の方向の定義の詳細については、https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/BarDirection.html を参照してください。
@property {String} barProperties.grouping：棒のグループ化	グラフ内の棒のグループ化スタイル。	標準、クラスター、スタックなどのオプションを使用します。棒のグループ化プロパティの詳細については、https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/BarGrouping.html を参照してください。
@property {数字} barProperties.overlay	グラフ内の棒の間で重複するサイズ。	許容される数値の範囲は 0 ～ 100 です。

アジャイル開発 2.0

ServiceNow アジャイル開発 2.0 では、スクラムフレームワークを使用して、製品ベースまたはプロジェクトベースの作業のためのアジャイルソフトウェア開発環境を提供します。製品のライフサイクル全体での純粋なアジャイルアプローチや、従来のプロジェクト構造内でアジャイル手法を使用するハイブリッドアプローチを実装します。


この動画では、ストーリーの作成、バックログとスプリントの計画、進捗状況の追跡など、ServiceNow SPM Agile 2.0 アプリケーションでの開発について紹介しています

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


開始

探索




アジャイル開発 2.0が提供する主な機能とビジネス価値について説明します

設定



必要なプラグインを有効にし、 アジャイル開発 1.0 からデータを移行して、カスタム構成設定を確認します

統合




Agile Development とサードパーティの実行システムとの統合

使用方法



で製品開発を管理する方法を学ぶ アジャイル開発 2.0

参照



コンポーネント、フォームフィールド、一般的なガイドラインに関する詳細を取得します

トラブルシューティングとサポート

- で質問や回答をする 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) フォーラム ServiceNow コミュニティ
- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート
- 開発者トレーニング のコースで学習を強化
- 開発者ドキュメント を参照
- 検索 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 最適なパッケージ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 2.0 の探索

ServiceNow® アジャイル開発 2.0 で使用されるスクラム方法論フレームワーク、一般的なアクティビティ、アーティファクトについて説明します。

Agile Development 2.0 における製品ベースおよびプロジェクトベースのアプローチの概要。所要時間は約 3 分です。

アジャイル開発 2.0 は、製品ベースおよびプロジェクトベースの開発作業をサポートします。これらのアプローチに関する大まかな概要については、動画をご覧ください。

アジャイル開発 の基本、そのプロセス、アジャイル開発 が使用されるシナリオについて理解を深めるには、以下のセクションの情報をご覧ください。また、アジャイル開発 2.0 アプリケーションの機能についても説明します。

アジャイル開発 の基本

スクラムは、アジャイル開発 の一般的な方法論の 1 つで、固定スプリントスケジュールや定期的な要件テストなどが挙げられます。これらのアクティビティは、プロダクトオーナー、スクラムマスター、グループメンバーなどの一般的なロールにより実施されます。アジャイル開発 プロセスの基本について説明します。

スクラムフレームワーク

アジャイル開発 で使用される用語とアーティファクトについて理解してください。

アサイン先グループまたはアジャイルチーム

アジャイル製品の開発に携わるユーザーグループアジャイル開発 2.0 では、このチームをアサイン先グループと称します。

アサイン先グループでは、ユーザーがスクラムマスターとして指定され、リリースに向けすべてのスクラムアクティビティが適切に実行されるようにする役割を担います。詳細については、「アジャイル開発 2.0 のアサイン先グループ」を参照してください。

Epic

新しい機能や重要な拡張など、ビジネスに価値をもたらす要件に関する大まかな定義です。エピックは Agile ストーリーに分類され、単独または複数のチームで作業が行われます。

ストーリー

エピックに関連する作業を簡潔かつ管理しやすく細分化したものです。ストーリーにより、要件に関する人物、対象、理由をシンプルかつ簡潔に取得できます。ストーリーで示されている説明や基準を活用することにより、チームは作業を実装するのに必要な労力を正確に見積もることができるようになります。

スクラムタスク

ストーリーを完了させるのに必要な個別のタスクです。タスクの完了には、4 ～ 12 時間かかる場合があります。

バックログ

特定の成果を達成するうえで実装が必要な作業のリストです。バックログには、新機能、既存機能の拡張、その他の製品開発アクティビティが含まれます。

バックログは、製品やチームの作業における唯一の起点と見なされます。バックログに含まれていないものは、開発において優先されません。

個人のバックログ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロダクトオーナーは、関連するフィルター基準を適用して、パーソナルバックログと呼ばれるカスタマイズされた作業パイプラインを定義します。アジャイル開発 2.0 では、プロダクトオーナーは、カスタマイズされたバックログを必要な数だけ定義することができます。カスタマイズされたバックログを作成する際に使用される基準は、柔軟性があり、いつでも変更が可能です。

スプリント

短く固定された期間で、チームメンバーが所定の数のストーリーを選択して遂行します。こうした短い時間枠で区切られたサイクルにより、チームは優先度の変化に柔軟に対応できるようになります。

スプリントの反復頻度は、開発チームやプロダクトオーナーによって決定されます。たとえば、10 日間のスプリントや 1 週間のスプリントといった具合です。

スプリントバックログ

スプリントの作業スコープです。プロダクトオーナーや開発チームは、スプリント計画アクティビティを使用してバックログをレビューし、スプリントに含めるストーリーを決定します。

テーマ

関連するビジネス価値のある重点領域です。テーマは、複数の会社目標に関連しています。テーマにより、大まかに作業の優先順位付けを行うことができ、複数のエピックに関連付けることができるようになります。

製品

類似した機能のテーマ、エピック、ストーリーを単一のコンテキストに体系化するエンティティです。製品は、開発されて市場にリリースされるアイテムまたは機能を表します。

リリース

リリースには開始日と終了日があり、その期間内でいくつかの開発反復が完了します。リリースはプロダクトオーナーによって作成され、複数の製品からのユーザーストーリーが含まれたり、複数のチームが関与したりすることもあります。リリースに関連付けられたストーリーにより、リリースバックログが形成されます。

> **注:**
> アジャイル開発 2.0 では、製品を作成してからテーマ、エピック、ストーリーを作成してください。これらのレコードを送信する場合、レコードを製品に添付する必要があります。

製品のストーリーやスクラムタスクを作成した後、カスタマイズされたバックログを作成することで、製品 (複数可) のストーリーを含めることができるようになります。

Defects (欠陥)

欠陥は、新しい機能の開発中に発見された問題の解決策を報告および追跡する際に使用したり、既存機能に関するフィードバックとして使用したりできます。プロダクトオーナーは、こうした欠陥をレビューし、関連するアサイン先グループにアサインされるストーリーの作成を決定します。

アジャイル開発 — 統合バックログを使用すると、トリアージボードを設定して、欠陥、ストーリー、拡張などのさまざまなタスクタイプのレコードの一元化されたバックログを維持できます。詳細については、「アジャイル開発 — 統合バックログ」を参照してください。

Enhancements (拡張)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

拡張要求を使用して、製品の機能拡張を記録することができます。こうした要求は、内部要件や顧客からのフィードバックにより生じる可能性があります。プロダクトオーナーは、ログに記録された要求をレビューし、優先度に基づいて要求に対するストーリーを作成します。こうしたストーリーは、開発向けに関連のアサイン先グループにアサインされます。

アジャイル開発 — 統合バックログを使用すると、トリアージボードを設定して、欠陥、ストーリー、拡張などのさまざまなタスクタイプのレコードの一元化されたバックログを維持できます。詳細については、「アジャイル開発 — 統合バックログ」を参照してください。

スクラムアクティビティ

スクラムプロセスを通常構成するアクティビティは、次のとおりです。

スプリント計画立案

アサイン先グループのメンバーがミーティングを開き、スプリントでの展開をコミットできるストーリーを決定します。通常、トップランクのストーリーが最初にコミットされます。グループは、各ストーリーに必要なスクラムタスクを決定します。質問に回答するには、製品オーナーが立ち会う必要があります。

デイリースタンドアップ

アサイン先グループのメンバーがミーティングを開き、前日の作業進捗、当日に予定されている作業、問題点について話し合います。デイリースタンドアップでは、グループメンバーが現在のスプリントでストーリーを遂行することに重きを置き、あらゆる問題点をスクラムマスターに報告します。

スプリント終了の時点ですべてのストーリーが完了していなければなりません。完了できなかったストーリーは、バックログに戻されたり、今後のスプリントに持ち越されます。

スプリントのレビュー

スプリントのレビューミーティングは、各スプリントの最後に行われます。このミーティングでは、アサイン先グループが完了した作業をレビューし、新たに開発された機能をプロダクトオーナーに実演します。

スプリントの振り返り

振り返りミーティングは各スプリントの最後に行われ、うまくいったことやうまくいかなかったことをグループメンバー間で話し合うことができます。スプリントの振り返りの目的は、今後のスプリントの実行を改善する方法について議論することです。

アジャイル開発 2.0 が製品開発の取り組みの管理にどのように役立つかについての詳細は、アジャイル開発 プロセスフローを参照してください。

スクラムレポート

スクラムレポートにより、アジャイルチームのパフォーマンスや進捗状況を分析することができるようになります。このレポートでは、エピック、スプリント、リリースと関連付けて、チームの作業速度に関する履歴データを提供することができます。パフォーマンスアナリティクス Content Pack for Agile 2.0 は、Agile プラクティスの改善に役立つデータを視覚化した事前構成済みのダッシュボードを提供します。

詳細については、「パフォーマンスアナリティクス Agile 2.0 のコンテンツパック」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 プロセスフロー

製品の作成をはじめ、スプリントやリリースの追跡など、アジャイル開発 2.0 において製品開発作業を管理する際に使用されるプロセスについて説明します。

注:
ここで説明するフローは、アジャイル開発 2.0 アプリケーションで利用可能な機能を活用してアジャイル開発作業を管理する一般的な方法になります。使用可能なプロセスはこれだけではありません。

製品の定義

製品は、ユーザーに提供される一連の機能と考えられます。各製品には、エピックやストーリーなど、製品の作業パイプラインを管理するオーナーがいます。これらの作業アイテムはテーマと関連付けて、ビジネスゴールに結び付けることができます。

「アジャイル開発 2.0 での製品の作成」を参照してください。

エピックとストーリーの作成

エピックには、製品に関する大まかな要件が含まれるので、これを管理可能なストーリーに分類することができます。アジャイル開発 2.0 でエピックやストーリーを作成するときに、これらを製品に関連付けることができます。

「アジャイル開発 2.0 でエピックを作成」および「アジャイル開発 2.0 でのストーリー作成」を参照してください。

リリースの作成

組織の中には、時間枠を固定して製品を市場に投入しているところもあります。これをリリースと呼びます。リリースには開始日と終了日があり、その期間内で何度か開発が繰り返されます。たとえば、四半期ごとや半年ごとのスケジュールで、新しいアプリケーションや既存アプリケーションの拡張機能をリリースする場合があります。

アジャイル開発 2.0 でリリースを作成したら、それに製品、エピック、ストーリーを関連付けることができます。「アジャイル開発 2.0 でのリリースの作成」を参照してください。

カスタマイズされたバックログの作成

フィルター基準を定義することで、カスタマイズされたバックログを作成できます。たとえば、カスタマイズされたバックログには、ストーリー、欠陥、インシデントを組み合わせて作成されるものもあれば、ストーリーとインシデントを組み合わせて作成されるものもあります。このように、カスタマイズされたバックログは必要なだけ作成することができます。

「アジャイル開発 2.0 でのカスタマイズされたバックログの作成」を参照してください。

アサイン先グループを作成

アサイン先グループを作成し、そこにメンバーを追加します。グループメンバーごとに、メンバーがスプリントで完了できるストーリーポイント数を定義します。グループレベルでは、グループメンバー全員のストーリーポイントの合計によってグループのキャパシティが決まります。

「アジャイル開発 2.0 でのアサイン先グループの作成」を参照してください。

スプリントを作成する

スプリントは時間枠です。この時間枠において、開発チームが 1 つ以上のストーリーを展開します。スプリントの長さは任意ですが、完了するまでに通常 1〜4 週間かかり

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ます。スクラムマスターは、グループに必要な数のスプリントを作成し、グループメンバーはこれらのスプリントを使用して、今後のリリースに必要な作業を遂行します。ただし、リリース内のスプリントはすべて、リリースの開始日から終了日の範囲内に収める必要があります。

スプリントアクティビティの計画

スプリントを開始する前に、グループとスクラムマスターは、スプリント内での完了をコミットできるバックログのストーリーを決定します。スプリントのストーリーは、優先度に基づいて選択できます。スクラムマスターは、ストーリーを完了するために必要な作業 (ストーリーポイントの合計) がグループのキャパシティと一致していることを確認する必要があります。

スプリントを計画する際、速度レポートをガイダンスとして使用すると、次のスプリントでグループが遂行できる作業量を見積もることができます。Agile 2.0 チームダッシュボードでは、速度履歴レポートとタイプ別の速度レポートが提供されます。

- 速度履歴：過去 10 回のスプリントより、チームの全体的な速度に関するインサイトが得られます。チームが安定的かつ予測可能な速度を達成し、コミットメントを満たしているかどうか分析します。
- タイプ別の速度：チームの速度推移を経時的に分析し、チームの戦略的な作業負荷を運用または他のタイプの作業負荷と比較します。

スプリントの計画方法の詳細については、「アジャイル開発 2.0 でのスプリントアクティビティの計画」を参照してください。

スプリントにおける進捗状況の追跡

スクラムマスターは、スプリントチームの作業を管理し、進捗状況レポートを提供して、チームが遭遇した障害をすべて解消します。チームメンバーは、ストーリーレコードを更新し、デイリースタンドアップミーティングを開いて進捗状況について話し合ったり、懸念事項をスクラムマスターやプロダクトオーナーに報告したりします。

チームは、スプリントにおいてコミットされているストーリーをすべて完了することが求められます。スクラムマスターからは、受け入れ条件に従って、ストーリーが全面的にテストされ、リリースの準備が整っていることが求められます。

コミットされたストーリーと特定のスプリントのスコープにおいては、スプリントの実行中に変更を行わないのが理想です。しかし、アジャイル開発 2.0 は、必要に応じて更新を行ったり、優先順位の変更に対応したりする柔軟性を発揮します。ただし、スプリントでのストーリーの追加や削除については、グループ、スクラムマスター、プロダクトオーナーへの相談が必要です。

バーンアップチャートやバーンダウンチャートなどのレポートを備えた Agile 2.0 スプリントダッシュボードを使用すると、チームにおけるスプリントの進捗状況を追跡することができます。

リリースの進捗状況の追跡

プロダクトオーナーはリリースの進捗状況を追跡して、チームがリリース目標の達成に必要なペースでストーリーを遂行できているかどうかを確認することができます。

バーンアップチャート、バーンダウンチャート、サイクルタイムチャートなどのレポートを備えた Agile 2.0 リリースダッシュボードを使用すると、チームにおけるリリースの進捗状況を追跡することができます。

注:
Agile 2.0 ダッシュボードはすべて パフォーマンスアナリティクス Agile 2.0 のコンテンツパック で利用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 のユースケース

バックログを計画したりストーリーを展開したりするために、組織が利用できるさまざまな手法について説明します。


一般的な展開手法は次のとおりです。

- リリースベースの展開
- プロジェクトベースの展開
- スタンドアロンプロジェクト開発

アジャイル開発 2.0 では、柔軟性がもたらされることによりバックログの管理が一元化され、リリースベースとプロジェクトベースの両方のタイプの展開に利用できるようになります。すべてのバックログを 1 か所で管理して、ストーリーを製品、プロジェクト、あるいはその両方に関連付けることができるようになります。バックログからストーリーを選択し、スタンドアロンプロジェクト開発のプロジェクトとして実行することもできます。

次の例では、プロジェクトベースとリリースベースの両方のタイプの展開において一元化されたバックログが アジャイル開発 2.0 でどのようにサポートされているかを示しています。

Agile Development ワークフローのユースケース

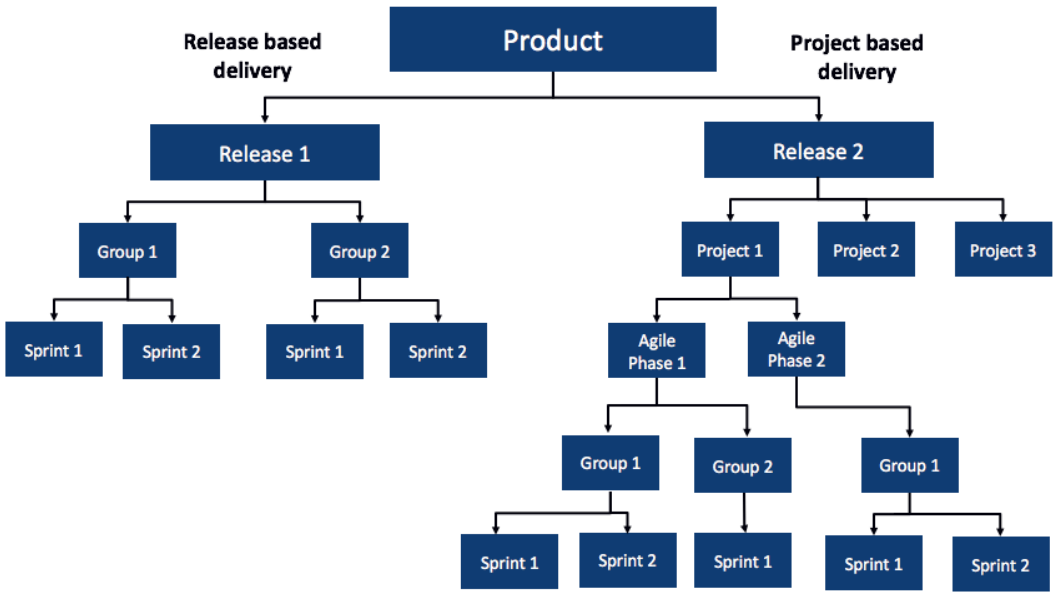

アジャイル開発 におけるリリースベースの開発のユースケース

アジャイル開発 を利用したリリースベースのアジャイル開発および展開モデルの例

リリースベースのアジャイル開発に関連する通常のアクティビティには、次のものがあります。

- 製品バックログの管理：プロダクトオーナーが製品バックログを管理します。また、ストーリーを追加し、優先順位付けし、推定することで、バックログを継続的に調整することができます。

  [アジャイル開発 2.0] で、次に移動します。 アジャイル開発 > バックログ > すべてのストーリー すべてのストーリーのリスト。特定の製品についてリストをフィルタリングすることができます。

- リリース計画：組織には、四半期ごとのリリース、隔年のリリース、毎年のリリースなど、明確なリリースサイクルがあります。製品オーナーは、製品バックログから優先順位付けされたストーリーを選択します。製品バックログは、 リリースバックログを形成するために特定のリリースで完了することが必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


自動翻訳

- ストーリーのアサイン: アジャイル開発 2.0で、 アジャイル開発 > ストーリー. リリースにアサインするストーリーを選択し、[リリース/グループにアサイン] を選択します。こうしたストーリーを関連付けるチームを指定します。
- スプリント計画立案：スクラムチームは、2 週間または 3 週間のスプリントなど、スプリントのスケジュールを定義します。プロダクトオーナーと協力し、各スプリントで完了する必要があるストーリーをリリースバックログから選択して、スプリントバックログを作成します。プロダクトオーナーやスクラムマスターとともにグループメンバーが、スプリント計画立案を使用して各スプリントのストーリーを決定します。

  [アジャイル開発 2.0] で、次に移動します。 アジャイル開発 > アジャイルボード > スプリント計画立案.

次の図は、リリースベースの アジャイル開発 環境におけるワークフローの大まかな概要を示しています。

リリースベースのアジャイル開発ワークフローの例

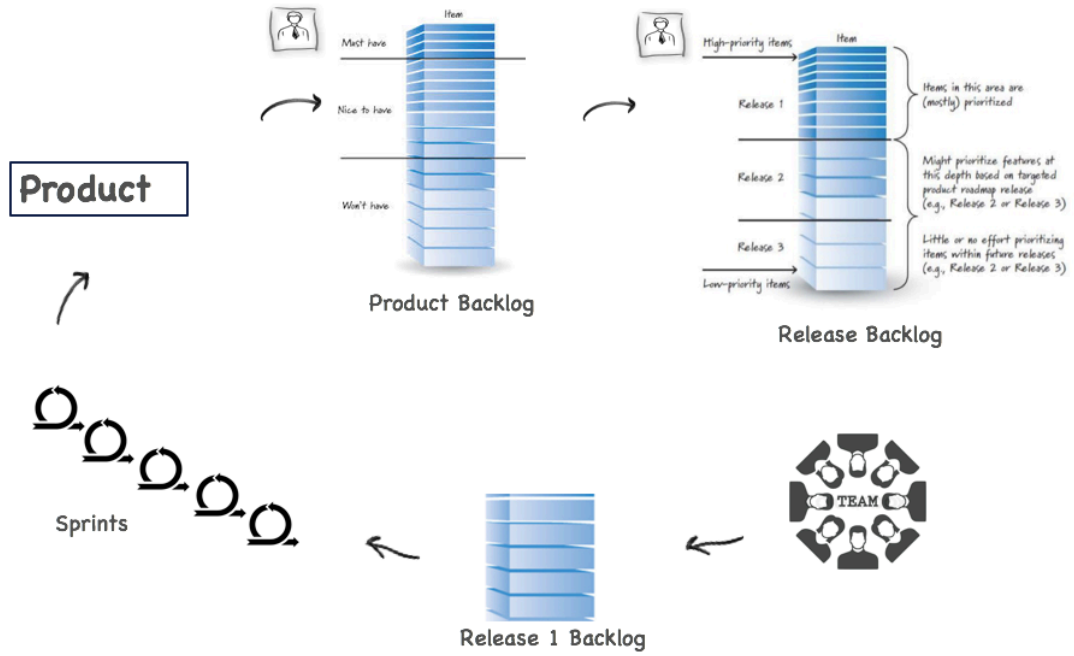

アジャイル開発 におけるプロジェクトベースの開発のユースケース

アジャイル開発 におけるプロジェクトベースの開発および展開モデルの例

プロジェクトベースの アジャイル開発 に関連する通常のアクティビティには、次のものがあります。

- 製品バックログ：プロダクトオーナーが製品バックログを管理します。ストーリーを追加し、優先順位を付けて推定することで、バックログを継続的に調整します。

  [アジャイル開発 2.0] で、次に移動します。 アジャイル開発 > バックログ > すべてのストーリー すべてのストーリーのリスト。

- プロジェクトバックログ：プロダクトオーナーが、優先するストーリーを選択し、1 つ以上のプロジェクトにアサインします。これにより、プロジェクトバックログが作成されます。プロダクトオーナーは、1 つ以上のプロジェクトを作成し、必要なリソース、コスト、リスク、戦略的調整などの詳細情報を取り込むことができます。これらのすべてのプロジェクトで、ポートフォリオの優先順位付けのプロセスが実施され、選択したプロジェクトがプロジェクトチームによって実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
また一部の組織では、四半期ごとのリリース、隔年のリリース、年ごとのリリースなど、明確なリリースサイクルを定義します。次に、ストーリーを製品バックログからリリースバックログに移動します。このような場合、ストーリーはリリースバックログからプロジェクトにアサインされます。

[アジャイル開発 2.0] で、次に移動します。 アジャイル開発 > ストーリー をクリックし、[プロジェクトにアサイン] を選択して、ストーリーを新規または既存のプロジェクトにアサインします。

既存のプロジェクトを開き、バックログからストーリーをプロジェクトに関連付けることもできます。これらのストーリーは、プロジェクトの一部として実行されます。

- ストーリーのアサイン：プロジェクトのストーリーをアサイン先グループにアサインして、チームが今後のスプリントで取得できるようにします。


  アジャイル開発 2.0 で、リリースにアサインするストーリーを選択し、[リリース/グループにアサイン] を選択します。

- スプリント計画立案：スクラムチームは、2 週間または 3 週間のスプリントなど、スプリントのスケジュールを定義します。プロダクトオーナーと協力し、各スプリントで完了する必要があるストーリーをリリースバックログから選択して、スプリントバックログを作成します。プロダクトオーナーやスクラムマスターとともにグループメンバーが、スプリント計画立案を使用して各スプリントのストーリーを決定します。

  [アジャイル開発 2.0] で、次に移動します。 アジャイル開発 > アジャイルボード > スプリント計画立案.

次の図は、プロジェクトベースの アジャイル開発 環境におけるワークフローの大まかな概要を示しています。

プロジェクトベースの アジャイル開発 ワークフローの例

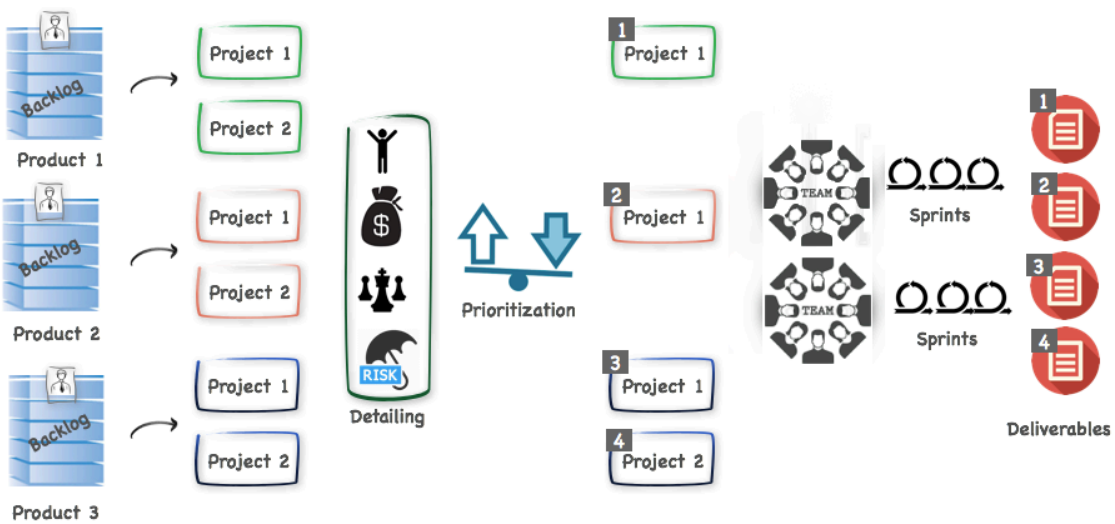

アジャイル開発 におけるスタンドアロンプロジェクト開発のユースケース

アジャイル開発 におけるスタンドアロンプロジェクト開発および展開モデルの例

このケースでは、新しい製品、機能、またはシステムに対する要求 (デマンド) が発生します。デマンドマネージャーは、ストーリーの観点から要件を把握します。また、必要なリソース、コスト、リスク、戦略的方向性など、デマンドに関するその他の詳細も取り込みます。そうしたデマンドは、承


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

認後にプロジェクトに変換されます。プロジェクトマネージャーは、プロジェクト実行について純粋なアジャイルモードまたはハイブリッドモードを選択できます。ハイブリッドモードでは、計画立案や分析などの初期フェーズがウォーターフォールタスクとして取り上げられ、アジャイルフェーズとして実行されます。アジャイルフェーズはアジャイルグループにアサインされます。その後、アジャイルグループはスプリントの実行によって作業を完了します。

次の図は、スタンドアロンプロジェクト開発を実行するためのワークフローの概要を示しています。

プロジェクトベースのアジャイル開発ワークフローの例

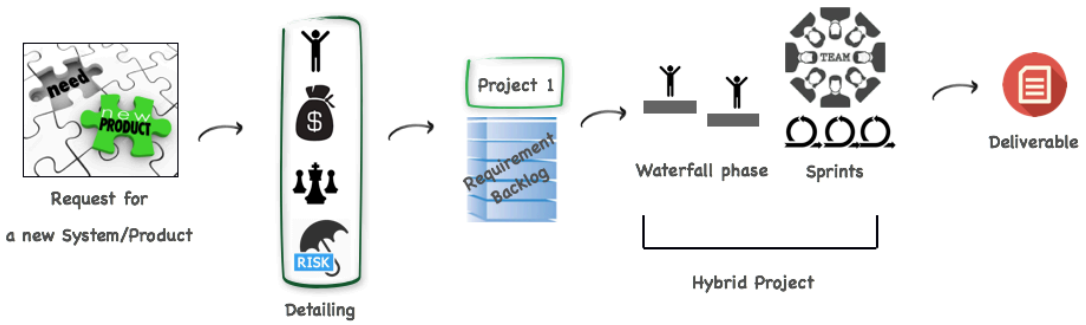

スタンドアロンのハイブリッドプロジェクト開発のための **Agile Development 2.0** の使用

スタンドアロンハイブリッドプロジェクトを実行するステップ：

1. デマンドの作成：ユーザーストーリーの観点からデマンドステータスの要件キャプチャを行います。デマンドフォームのストーリー関連リストを使用して、ストーリーを作成します。
2. デマンドからプロジェクトへの変換：デマンドがプロジェクトに変換されると、デマンドのストーリーがプロジェクトに移動し、プロジェクトチーム (アサイン先グループ) がストーリーを実行できるようになります。変換中に、アジャイルフェーズも作成され、ストーリーがアジャイルフェーズにアサインされます。
3. スプリント計画立案：アジャイルグループメンバーに加えて、プロジェクトマネージャー、スクラムマスターがスプリント計画を実行します。移動先 アジャイル開発 > アジャイルボード > スプリント計画立案 スプリントを計画します。

アジャイル開発 **2.0** のアジャイルボード

アジャイルボードは、バックログの管理、スプリントの計画、スプリントの進捗状況の追跡など、スクラムプロセスの主要なアクションを実行できるランディングページです。

アジャイルボードは、これらのアクティビティの管理に役立つ次のタブで構成されています。1 つ以上の scrum_admin, scrum_master、scrum_product_owner、または scrum_sprint_planner ユーザーロールが必要になります。

バックログ

[バックログ] タブは、カスタマイズされたバックログを管理するのに役立ちます。[バックログ] タブでは、次のことができます。

- ストーリー、エピック、テーマを作成。
- チームにアサインされているものの、どのスプリントにもアサインされていないアクティブなストーリーをすべて表示。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- バックログ内のストーリーの総数、ストーリーポイントがないストーリーの総数、および受け入れ条件がないストーリーの総数を示すカードを表示。

  これらのカードのいずれかをクリックすると、そのカテゴリのストーリーのリストが表示されます。

- バックログ内のストーリーを複数のページに並べ替えます。
- [エピック別のレコード] セクションを使用して、エピックでストーリーをフィルタリングします。


  このセクションには、選択したバックログのストーリーに属するエピックのみが一覧表示されます。

  - バックログのストーリーのエピックがこのセクションに一覧表示されます。
  - エピックの完了は、進捗状況バーとパーセンテージで示されます。
  - このセクションを表示するか、または非表示にするには、構成アイコン ( ) を選択します。

- カスタマイズアイコン (アイコン) を使用して列をカスタマイズします。
- 検索オプションを使用して、キーワードによりストーリーをフィルタリングします。

バックログを管理する方法の詳細については、「アジャイル開発 2.0 での製品バックログの管理」を参照してください。

アジャイルボードの [バックログ] タブ

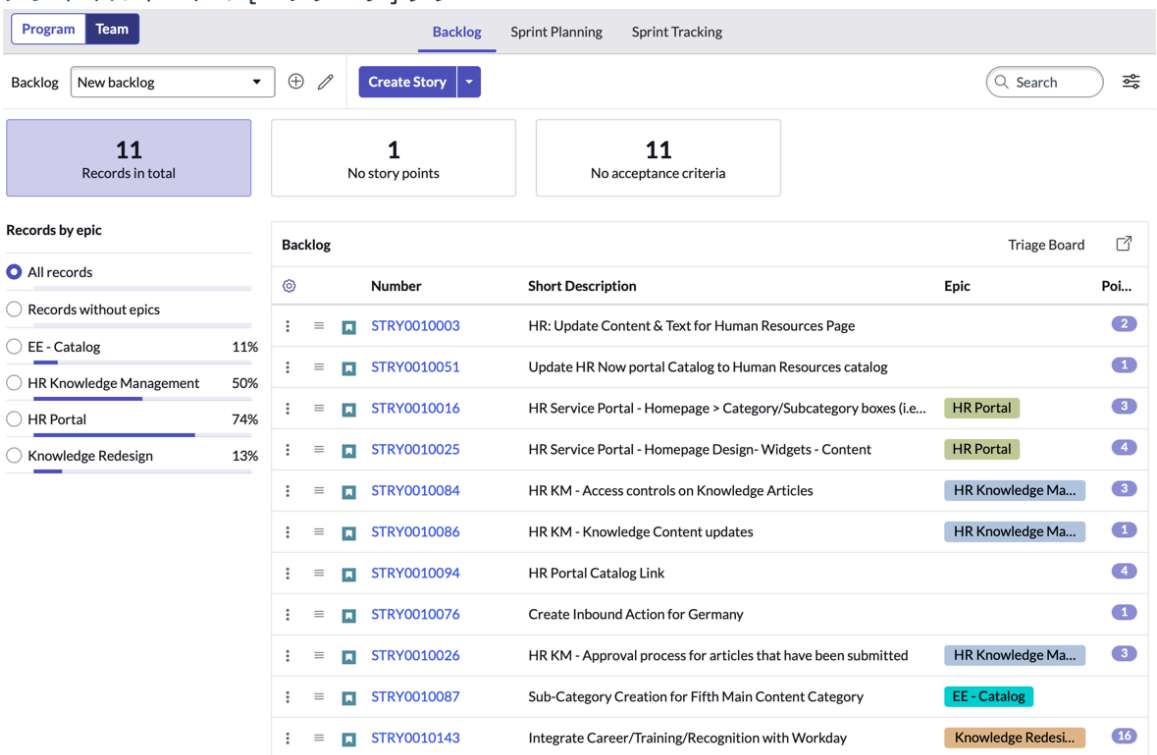

スプリント計画立案


アジャイルボードの [スプリント計画立案] タブでは、チームのバックログやスプリントがセクションとして表示され、ストーリーのリストも確認することができます。このタブで利用可能なオプションを使用して、スプリントを作成、編集、計画することができます。

[スプリント計画立案] タブでは、次のことができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- スプリントを作成、整理、監視、開始、および完了します。
- 現在および将来のスプリントを時系列で表示します。
- 現在のスプリントの開始予定日と終了予定日、ストーリーポイント、グループ速度のパーセンテージ、およびストーリーポイント数 (合計、完了、処理待ち) を表示します。
- バックログのストーリーを評価し、スプリントにドラッグします。
- バックログにストーリーを追加し、実装順序を設定します。
- 未完了のストーリーを完了済みスプリントからバックログまたは将来のスプリントに移動します。

アジャイルボードの [スプリント計画立案] タブ

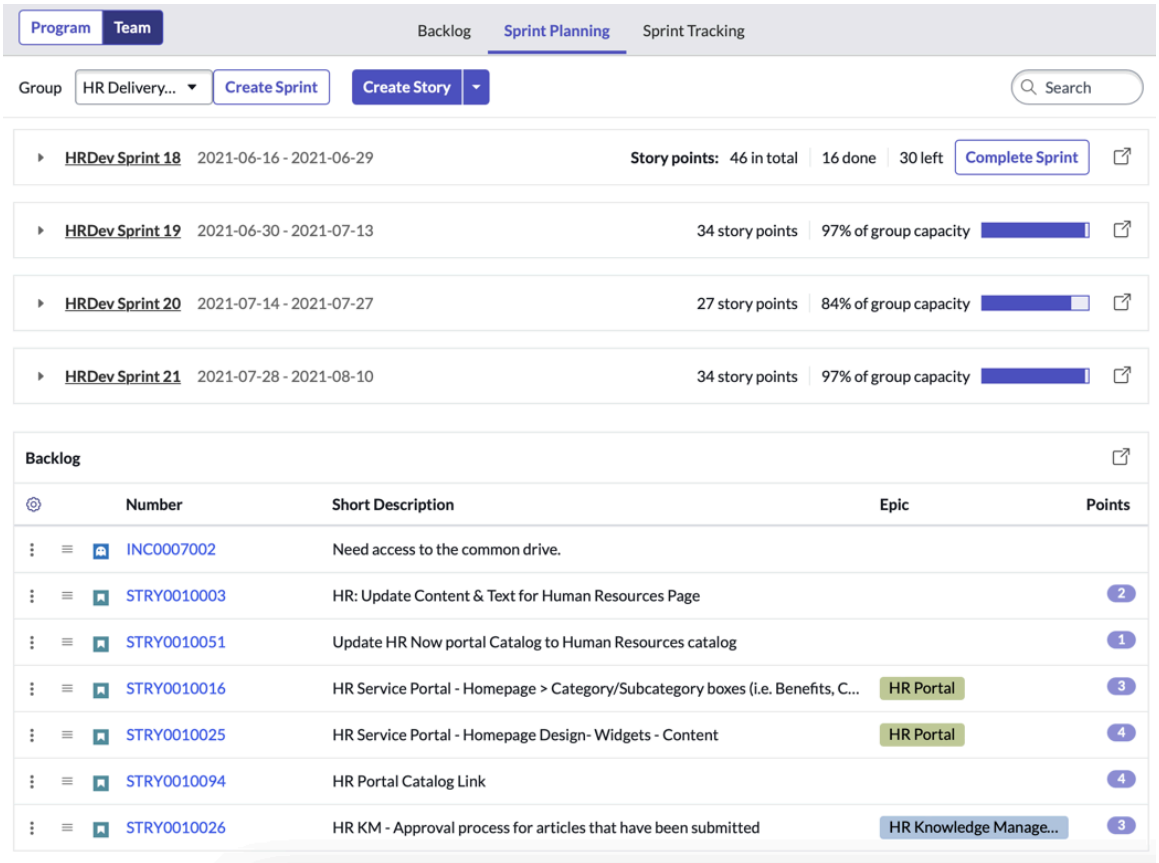

スプリント追跡

[スプリント追跡] タブでは、ストーリーボード、タスクボード、リストビューで現在のスプリントの進行状況を追跡できます。

ストーリーボード


- レーン全体で現在のスプリントのすべてのストーリーを追跡します。
- ストーリーをあるレーンから別のレーンに移動すると、ストーリーのステータスが更新されます。
- 検索条件でストーリーをフィルタリングします。

詳細については、「アジャイル開発 2.0 でのスプリントに対するストーリーの進捗状況の追跡」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ストーリーボードビューでのスプリントの追跡

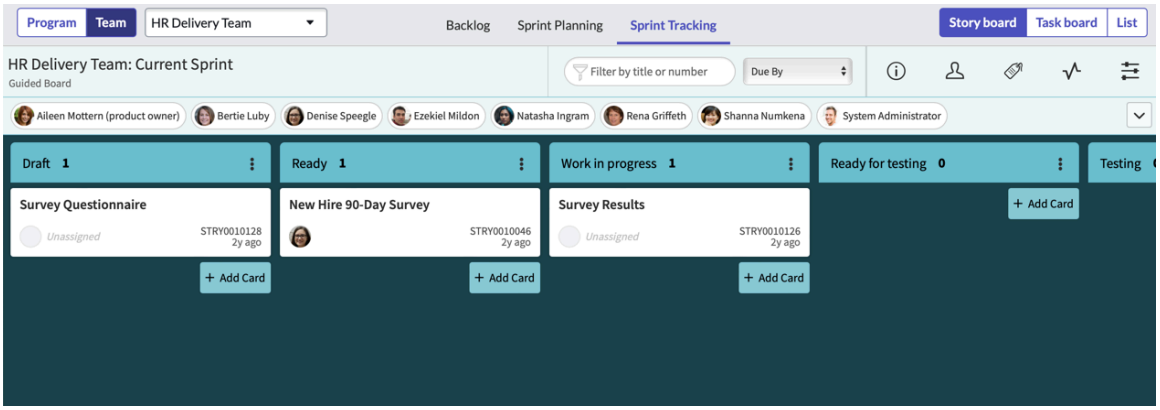


タスクボード

タスクボードを使用すると、レーン全体で現在のスプリントのストーリーに対するすべてのスクラムタスクを追跡できます。以下のことを行うことができます。

- スクラムタスクをあるレーンから別のレーンに移動すると、ストーリーのステータスが更新されます。
- 検索条件でスクラムタスクをフィルタリングします。

ボードビューを使用してスクラムタスクを追跡する方法について詳細は、アジャイル開発 2.0 でのスプリントに対するスクラムタスクの進捗状況の追跡を参照してください。

タスクボードビューでのスプリントの追跡

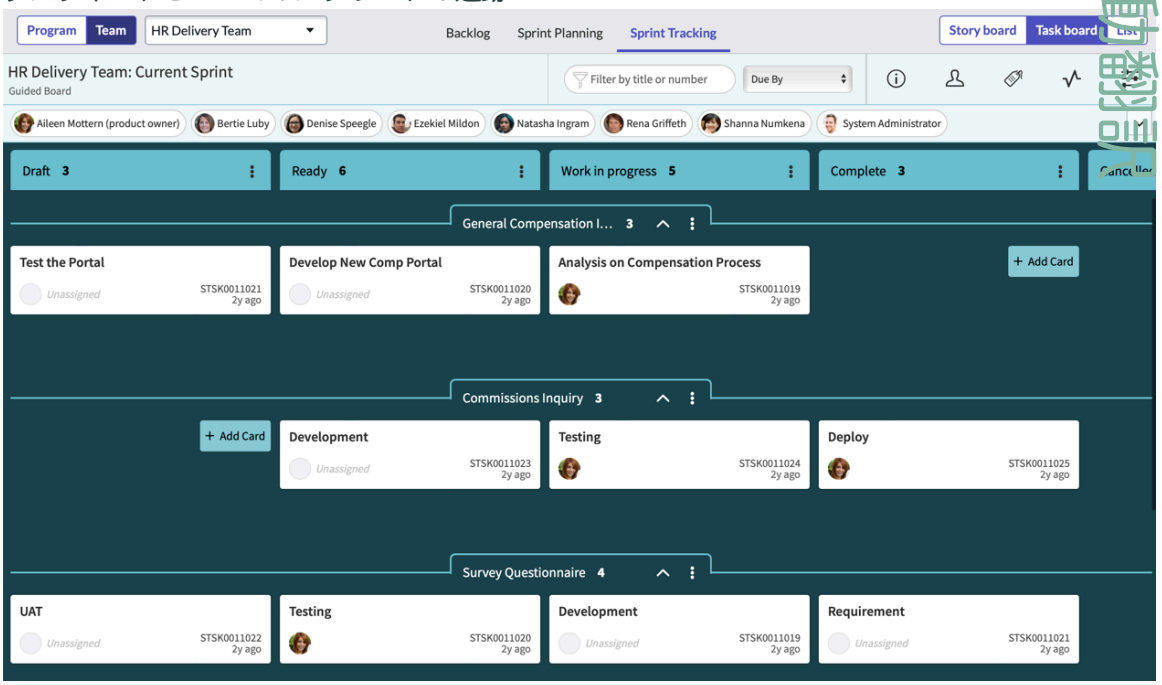

リスト

リストビューには、現在のスプリントのストーリーに対するスクラムタスクとテストが表示されます。リストビューでは、次のことができます。


- レコードのコンテキストを離れずにスクラムタスクとテストを追加します。
- スクラムタスクのステータス、簡単な説明、および担当者を表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- テストの簡単な説明と結果を表示します。
- 現在のスプリントがクローズする前にまだ処理待ちのスクラムタスクとテストを評価します。

リストビューを使用してスプリントの進捗状況を追跡する方法の詳細については、「アジャイル開発 2.0 でのスプリントの進捗状況の追跡」を参照してください。

リストビューでのスプリントの追跡

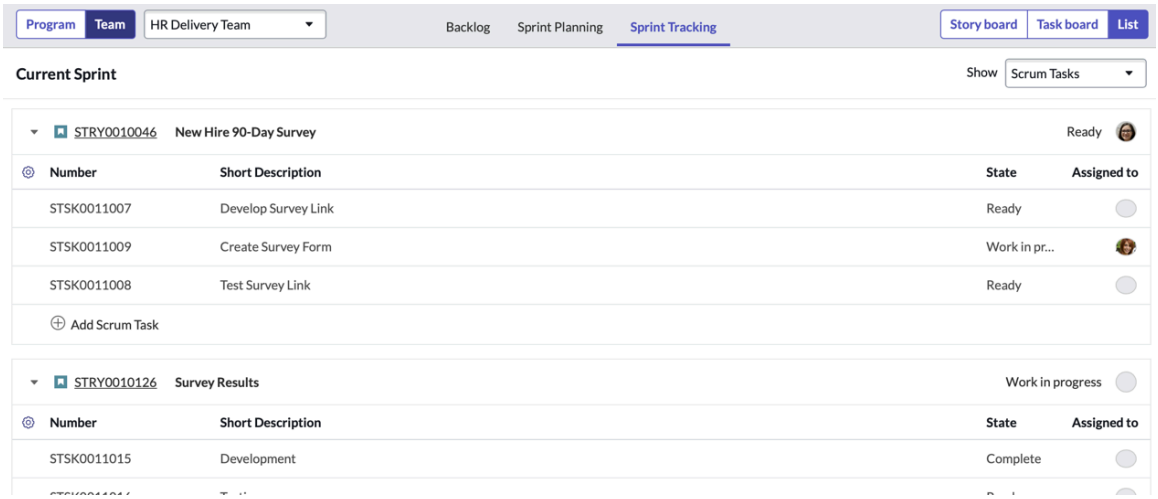

関連情報

ビジュアルタスクボード

アジャイル開発 2.0 での欠陥のレポート

アジャイル開発 2.0 を使用して、製品について報告された問題に関する欠陥を作成します。その後、こうした欠陥のストーリーを作成すると、チームが欠陥の解決に取り組むことができるようになります。

欠陥は、新しい機能の開発中に発見された問題の解決策を報告および追跡する際に使用したり、既存機能に関するフィードバックとして使用したりできます。プロダクトオーナーは、こうした欠陥をレビューし、関連するアサイン先グループにアサインされるストーリーの作成を決定します。

欠陥を作成するためのユーザーロール

アジャイル開発 2.0 において、欠陥を作成することになるユーザーには、次のいずれかのロールが必要です。

- feature_user
- scrum_story_creator
- scrum_admin

ただし、feature_user ロールしかないユーザーは、アジャイル開発 アプリケーションの [欠陥] モジュールからしか欠陥を表示できません。欠陥レコードのストーリー関連リストにある欠陥に関連付けられたストーリーは表示できません。

欠陥の作成方法については、「 アジャイル開発 2.0 での欠陥のレポート」を参照してください。

Agile Development 2.0 の拡張要求

アジャイル開発 2.0 において、製品のさまざまな領域に対する拡張要求を作成します。その後、こうした要求のストーリーを作成すると、チームが開発に取り組むことができるようになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

拡張要求を使用して、製品の機能拡張を記録することができます。こうした要求は、内部要件や顧客からのフィードバックにより生じる可能性があります。プロダクトオーナーは、ログに記録された要求をレビューし、優先度に基づいて要求に対するストーリーを作成します。こうしたストーリーは、開発向けに関連のアサイン先グループにアサインされます。

拡張要求を作成するためのユーザーロール

拡張要求を作成したり編集したりするには、次のいずれかのロールが必要です。

- feature_user
- scrum_story_creator
- scrum_admin
- rm_enhancement_admin

ただし、スクラムロールしかないユーザーは、アジャイル開発 アプリケーションの拡張要求モジュールからの要求にしかアクセスできず、この要求に対して作成されたストーリーにはアクセスできません。

注:
アドミニストレーターは、アジャイル開発 アプリケーションで拡張要求を作成することになるすべてのユーザーに feature_user ロールを付与する必要があります。

拡張要求の作成方法については、「Agile Development 2.0 での拡張要求の作成」を参照してください。

拡張要求が作成されると、scrum_story_creator または scrum_admin ロールを有するユーザーは次のことができます。

- 拡張要求をレビューし、そのストーリーを作成します。
- 拡張フォームの [ストーリー] 関連リストからストーリーを管理。

アジャイル開発 ® – 統合バックログ

ServiceNow アジャイル開発 — 統合バックログ アプリケーションにより、欠陥、問題、拡張機能など、さまざまなタスクタイプのレコードに対するバックログを一元的に管理できるようになります。さまざまなタスクタイプの優先順位付けが 1 か所で行われ、こうしたレコードに対するストーリーが自動的に作成されるので、時間の節約になります。

ここで説明するフローは、アジャイル開発 2.0 とともに アジャイル開発 — 統合バックログ を使用してレコードを作成したり管理したりするための一般的な方法を示しています。

トリアージボードを設定

フィルター基準を定義して、トリアージボードを作成します。トリアージボードにより、特定のタスクタイプのレコードを表示できるようになり、可視化が向上します。たとえば、欠陥に対して 1 つのトリアージボードを作成し、インシデントに対して別のトリアージボードを作成することができます。定義されたフィルター基準に一致する新しいレコードがある場合、トリアージボードは自動的に更新されます。


「アジャイル開発 2.0 でのトリアージボードの設定」を参照してください。

トリアージレコード

アジャイルボードの [バックログ] タブから、次のことができます。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- すべてのタスクタイプのトリアージボードにレコード総数を表示
- 特定のタスクタイプのトリアージボードを開く
- 既存のトリアージボードのフィルター定義を編集

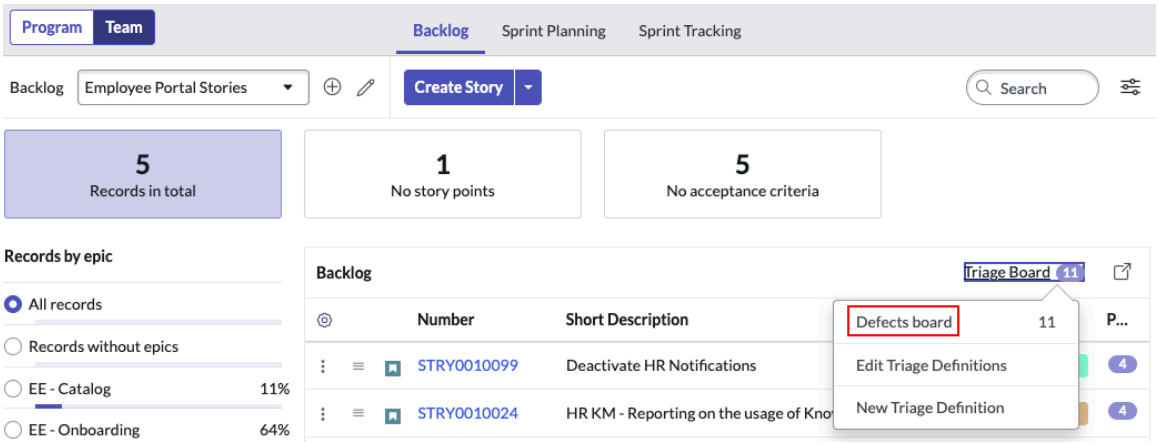

レコードをトリアージして、製品やチームのバックログに追加することができます。また、トリアージボードからバックログに追加されたアイテムには、自動的にストーリーが作成されます。「アイテムのトリアージおよび アジャイル開発 2.0 のバックログへの追加」を参照してください。

トリアージボードから追加された欠陥に関連したストーリー。

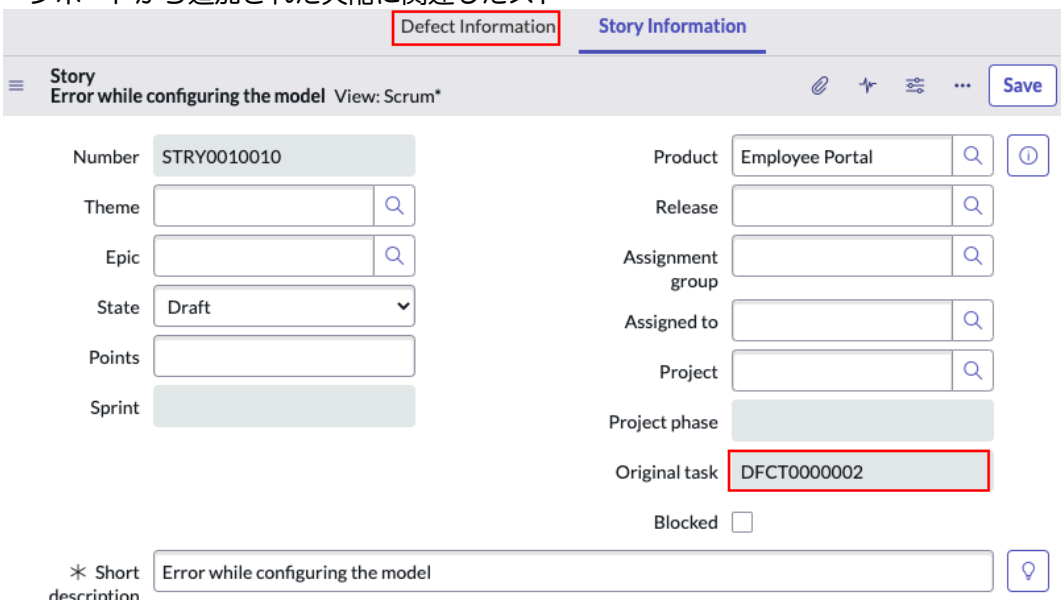

レコードの割り当て

レコードがトリアージボードからバックログに追加されると、通常のストーリーと同じように処理することができます。そのレコードを関連する製品チームにアサインして、今後のスプリントにスケジュール設定することができます。「アジャイル開発 2.0 でのスプリントアクティビティの計画」を参照してください。

ボードビューでのアサイン済みレコードの操作

トリアージボードからのレコードは、アジャイルボードのストーリーで表されます。こうしたストーリーのステータスは、[スプリント追跡] タブのストーリーボードビューから追跡できます。「アジャイル開発 2.0 でのスプリントに対するストーリーの進捗状況の追跡」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらのストーリーをストーリーボードの別のレーンに移動してステータスを更新すると、関連するストーリーのステータスは更新されますが、トリアージされた元のレコードのステータスは変わりません。元のレコードのステータスを変更するには、ストーリーを開いて元のレコードタブに切り替えます。

アジャイル開発 2.0の構成

アジャイル開発 2.0 をアクティブ化し、アジャイル開発 1.0 から移行し、他の関連タスクを実行して アジャイル開発 2.0 をセットアップします。

ガイド付きセットアップを使用して アジャイル開発 2.0 を実装するブラウザーサポート

アジャイル開発 2.0 ガイド付きセットアップで一連のタスクが提供されるので、ServiceNow インスタンスでアプリケーションを構成することができます。

ガイド付きセットアップを開くにはアジャイル開発 2.0 すべて > アジャイル開発 > **Agile** 開発のガイド付きセットアップ.

ガイド付きセットアップインターフェイスの使用に関する詳細については、「ガイド付きセットアップの使用」を参照してください。

アジャイル開発 2.0 のアクティブ化

admin ロールを持っている場合は、アジャイル開発 2.0 プラグイン (com.snc.sdlc.agile.2.0) を有効化します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

- 以前の ServiceNow リリースバージョンを アジャイル開発 から アジャイル開発 2.0 にアップグレードする場合は、プラグインを有効化する前にアップグレード情報をお読みください。
- 必要な場合、アジャイル開発 2.0 のダッシュボードは、パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - Project Portfolio Suite Dashboards プラグイン (com.snc.pps_dashboards) を使用して個別に有効化する必要があります。このダッシュボードを使用するには、パフォーマンスアナリティクスライセンスが必要です。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

アジャイル開発 **1.0** から アジャイル開発 **2.0** への移行

アジャイル開発 1.0 から アジャイル開発 2.0 に移行することで、アジャイル機能が強化されます。

非本番インスタンスで次の移行手順を実行し、移行が意図したとおりに完了するかどうかを確認してから、本番インスタンスで移行手順を実行します。

- アジャイル開発 2.0 にアップグレードする前のカスタマイズの管理。
- カスタマイズを削除します。
- アジャイル開発 2.0 のアクティブ化。
- チームを アジャイル開発 2.0 グループに変換するための前提条件への適応
- アジャイル開発 2.0 グループへの アジャイル開発 1.0 チームの変換
- アジャイル開発 1.0 チームから アジャイル開発 2.0 グループへの変換の検証

関連情報

移行ガイド - Agile Development 1.0 から Agile Development 2.0

アジャイル開発 **2.0** にアップグレードする前のカスタマイズの管理

アジャイル開発 2.0 にアップグレードする前にカスタマイズを管理することで、拡張されたアジャイル機能を十分に活用できます。

通常のアップグレードの時点で、フォームレイアウト、フィールドの追加、事前設定されたフィールドの削除、リストレイアウト、ビジネスルール、クライアントスクリプトなどのコアプラットフォームアーティファクトが環境内でカスタマイズされている場合、これらのアーティファクトのいずれかに アジャイル開発 2.0 の機能拡張の一部として加えられた変更は、お使いの環境には適用されません。アジャイル開発 2.0 にアップグレードする前にすべてのカスタマイズを削除し、アップグレード後に必要に応じて選択的にカスタマイズを再適用する必要があります。

考えられる 3 つのシナリオは次のとおりです。

カスタマイズが適用されていない

アジャイル開発 実装にカスタマイズを適用しておらず、 アジャイル開発 2.0 機能を使用したいと考えている。このような場合は、 アジャイル開発 2.0 プラグイン (com.snc.sdlc.agile.2.0) をインストールします。

小さなカスタマイズ

小さなカスタマイズが適用されているが、 アジャイル開発 2.0 機能を使用したいと考えている。このような場合は、すべてのカスタマイズを削除します。

カスタマイズにはレビューが必要

アジャイル開発 の実装には、ビジネスプロセスにマッピングされるカスタマイズがいくつか含まれます。アジャイル開発 2.0 機能を使用したい場合でも、カスタマイズを

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

確認し、すべてのカスタマイズを削除するか、または一部のカスタマイズを保持するかを決定できます。このような場合：

- アジャイル開発 2.0 拡張の一部として強化された、リストレイアウト、フォームレイアウト、ビジネスルールなどのカスタマイズされたプラットフォームアーティファクトを自動的に検出するユーティリティが提供されています。このユーティリティの詳細と アジャイル開発 2.0 で拡張されたすべてのプラットフォームアーティファクトのリストについては、アジャイル開発 2.0 におけるユーティリティのカスタマイズのレビュー を参照してください。
- 分析後、カスタマイズを保持しない場合は、カスタマイズを削除します。一部を保持したい場合は、カスタマイズを削除し、アップグレード後に再度適用します。
- ビジネスルールや UI ポリシーなどの独自のアーティファクトを作成した場合は、アップグレード後にアーティファクトが意図したとおりに機能するかどうかを確認します。

アジャイル開発 2.0 にアップグレードする前のカスタマイズの削除

アジャイル開発 2.0 にアップグレードする前にすべてのカスタマイズを削除することで、拡張されたアジャイル機能を十分に活用できます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力します。
   システム プロパティ [sys_properties] テーブル内のプロパティの全リストが表示されます。
2. [新規] をクリックします。
3. フォームの以下のフィールドに入力します。

フィールド	値
名前	com.snc.sdlc.scrum.pp.delete_customer_updates
説明	顧客アップデートの [sys_update_xml] テーブルから アジャイル開発 アプリケーションのカスタマイズを削除します。
タイプ	true | false
値	true

4. [送信] をクリックします。

   すべてのカスタマイズが削除され、プロパティも自動的に削除されます。

次のタスク

カスタマイズを削除する前に アジャイル開発 2.0 プラグイン (com.snc.sdlc.agile.2.0) がインストールされている場合は、プラグインを再インストールして更新します。

関連情報

システムプロパティを追加する

アジャイル開発 2.0 グループへの アジャイル開発 1.0 チームの変換

アジャイル開発 1.0 のチームを アジャイル開発 2.0 のグループに変換すれば、ほとんどの移行手順は完了します。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
チームを アジャイル開発 2.0 グループに変換するための前提条件への適応に記載されている手順を完了します。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > グループ.

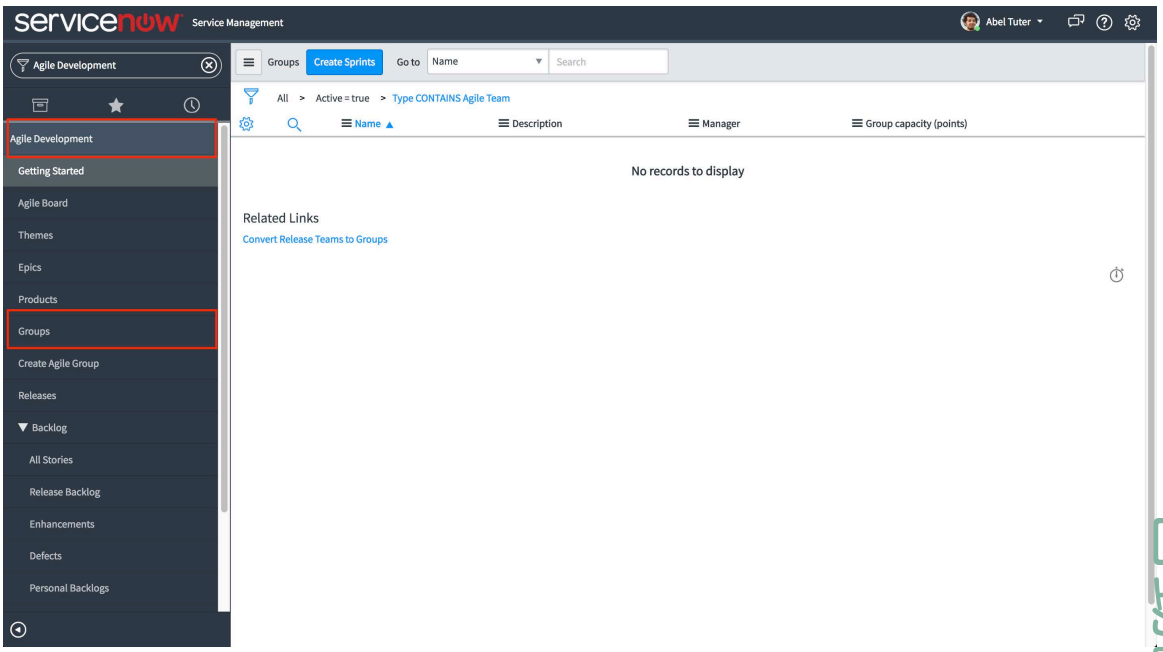

アジャイルチームタイプのアサイン先グループがないため、空のリストが表示されます。アジャイルチームタイプのグループがある場合は、グループのリストが表示されます。

2. [リリースチームをグループに変換] 関連リンクをクリックします。
アジャイル開発 プラグインで定義したすべてのリリースチーム (scrum_pp_team) テーブルのリストが表示されます。リリースごとにチームを定義している場合は、リリースごとに 1 つずつ、チーム (同じ名前のチーム) の複数のレコードが表示されます。次のスクリーンショットでは、各リリースに 1 つずつ、チーム施設ソフトウェアチームの 4 つのレコードが表示されています。



3. チームをグループに変換するための必須条件をすべて満たします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

移行は最初に非本番インスタンスで実行されるため、1 つのチームをグループに変換し、そのチームに対して移行が正常に行われたかどうかを確認してから、残りのチームに対しても同じ手順を実行します。

前の例では、施設ソフトウェアチームの 4 つのレコードすべてを一度に選択できます。施設ソフトウェアチームをサンプルチームとして考えます。

4. サンプルチームのすべてのレコードを選択し、[グループへ変換] をクリックします。
すべてのチームがアサイン先グループに変換されます。同じ名前のアサイン先グループが存在する場合、新しいグループは作成されませんが、スプリントおよびストーリーテーブルへのグループ参照の更新など、グループに対して他の移行アクティビティが実行されます。次の手順を手動で実行します。
   - グループタイプをアジャイルチームに更新します。
   - リリースチームメンバーとグループメンバーが異なる場合は、グループとチーム間でメンバーを同期します。

チームを アジャイル開発 **2.0** グループに変換するための前提条件への適応

チームから アジャイル開発 2.0 グループへの変換が正常に行われるように、前提条件の手順を実行しておきます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
選択中のチームには、現在のスプリントが少なくとも 1 つ必要です。現在のスプリントには、いくつかの完了したストーリーと WIP ストーリーが必要です。これは、変換後にスプリントバーンダウンが正しく更新されたことを確認するためです。そのようなチームがない場合は、変換するチームを任意に選択できます。

手順


1. すべてのリリースでチームに割り当てられたスプリントを確認します。

   注:
   この手順を使用して、すべてのスプリントでアサイン先グループが正常に更新されたかどうかを確認します。

   a. ナビゲーターの検索パネルで「rm_sprint.list」と入力すると、すべてのスプリントのリストが表示されます。
   b. まだ表示されていない場合は、[チーム] フィールドと [アサイン先グループ] フィールドを表示します。
   c. チーム名フィルターを適用します。[アサイン先グループ] には何も表示されません。
   d. 画面をキャプチャするか、すべてのスプリントのリストをエクスポートします。このサンプルの例では、スプリント 5 は変換中のチームの現在のスプリントです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

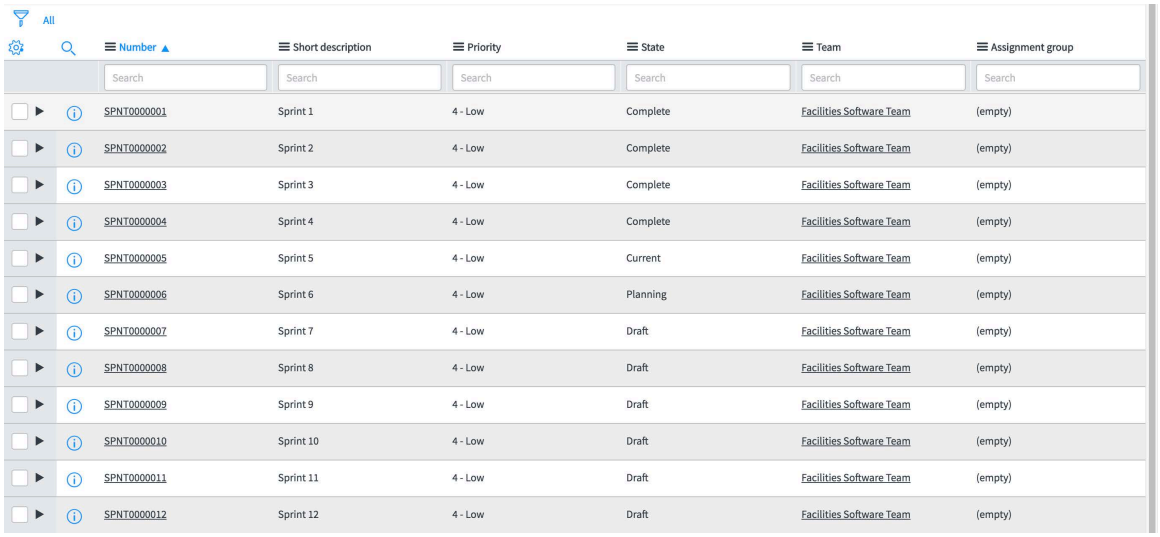

All

Number ▲	Short description	Priority	State	Team	Assignment group
Search	Search	Search	Search	Search	Search
SPNT0000001	Sprint 1	4 - Low	Complete	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000002	Sprint 2	4 - Low	Complete	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000003	Sprint 3	4 - Low	Complete	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000004	Sprint 4	4 - Low	Complete	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000005	Sprint 5	4 - Low	Current	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000006	Sprint 6	4 - Low	Planning	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000007	Sprint 7	4 - Low	Draft	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000008	Sprint 8	4 - Low	Draft	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000009	Sprint 9	4 - Low	Draft	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000010	Sprint 10	4 - Low	Draft	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000011	Sprint 11	4 - Low	Draft	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000012	Sprint 12	4 - Low	Draft	Facilities Software Team	(empty)

2. 変換中のチームのスプリントに関連付けられているストーリーを見つけます。

> **注:**
> この手順を使用して、すべてのストーリーでアサイン先グループが正常に更新されたことを確認します。

a. ナビゲーターの検索パネルで「rm_story.list」と入力すると、すべてのストーリーのリストが表示されます。


b. 前の手順でメモしたスプリントに属するストーリーをフィルターで除外します。

c. リストレイアウトで **[Sprint.Team]** フィールドおよび [アサイン先グループ] フィールドを表示します。[アサイン先グループ] には何も表示されません。

d. 画面をキャプチャするか、このリストをエクスポートします。

e. ストーリーテーブルをフィルターして、変換中のチームのスプリントに属するすべてのストーリーのリストをフェッチします。次のフィルターを適用します。

sprint.release_teamSTARTSWITH<name of the team>

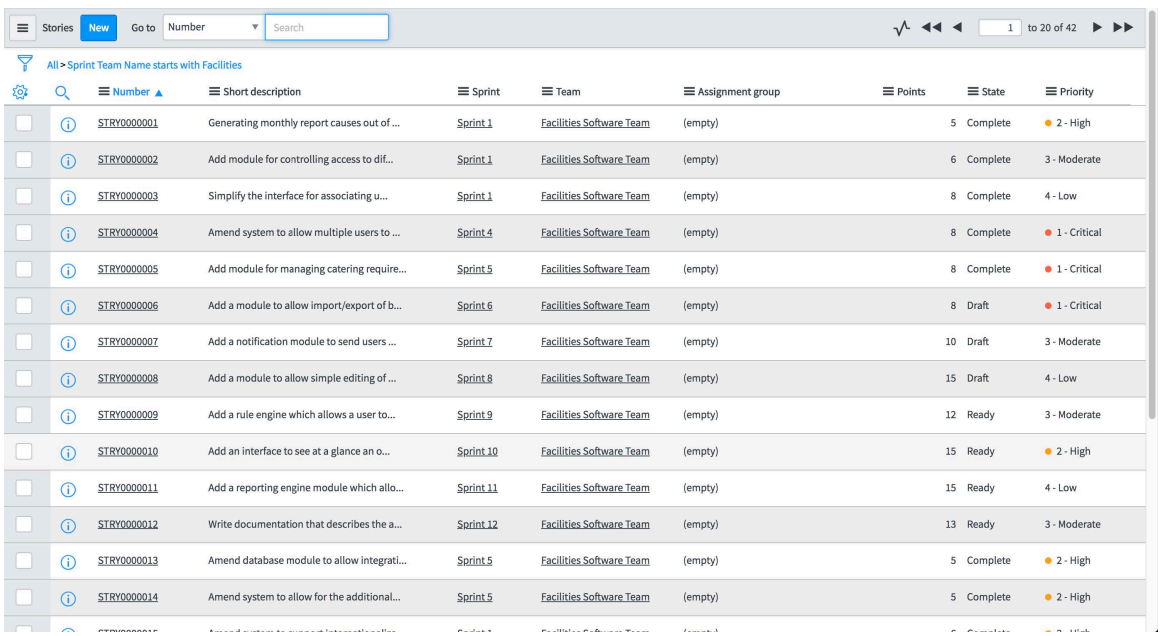

Stories | New | Go to Number | Search | 1 to 20 of 42

All > Sprint Team Name starts with Facilities

Number ▲	Short description	Sprint	Team	Assignment group	Points	State	Priority
STRY0000001	Generating monthly report causes out of ...	Sprint 1	Facilities Software Team	(empty)	5	Complete	2 - High
STRY0000002	Add module for controlling access to dif...	Sprint 1	Facilities Software Team	(empty)	6	Complete	3 - Moderate
STRY0000003	Simplify the interface for associating u...	Sprint 1	Facilities Software Team	(empty)	8	Complete	4 - Low
STRY0000004	Amend system to allow multiple users to ...	Sprint 4	Facilities Software Team	(empty)	8	Complete	1 - Critical
STRY0000005	Add module for managing catering require...	Sprint 5	Facilities Software Team	(empty)	8	Complete	1 - Critical
STRY0000006	Add a module to allow import/export of b...	Sprint 6	Facilities Software Team	(empty)	8	Draft	1 - Critical
STRY0000007	Add a notification module to send users ...	Sprint 7	Facilities Software Team	(empty)	10	Draft	3 - Moderate
STRY0000008	Add a module to allow simple editing of ...	Sprint 8	Facilities Software Team	(empty)	15	Draft	4 - Low
STRY0000009	Add a rule engine which allows a user to...	Sprint 9	Facilities Software Team	(empty)	12	Ready	3 - Moderate
STRY0000010	Add an interface to see at a glance an o...	Sprint 10	Facilities Software Team	(empty)	15	Ready	2 - High
STRY0000011	Add a reporting engine module which allo...	Sprint 11	Facilities Software Team	(empty)	15	Ready	4 - Low
STRY0000012	Write documentation that describes the a...	Sprint 12	Facilities Software Team	(empty)	13	Ready	3 - Moderate
STRY0000013	Amend database module to allow integrati...	Sprint 5	Facilities Software Team	(empty)	5	Complete	2 - High
STRY0000014	Amend system to allow for the additional...	Sprint 5	Facilities Software Team	(empty)	5	Complete	2 - High

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 1.0 チームから アジャイル開発 2.0 グループへの変換の検証


検証手順を実行して、チームからアサイン先グループへの変換が成功したことを確認します。

始める前に
必要なロール：admin


手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > グループ.
2. チームがアサイン先グループに変換されたことを確認します。

   ここにグループが表示されている場合は、アジャイルチームにグループタイプが既に設定されています。

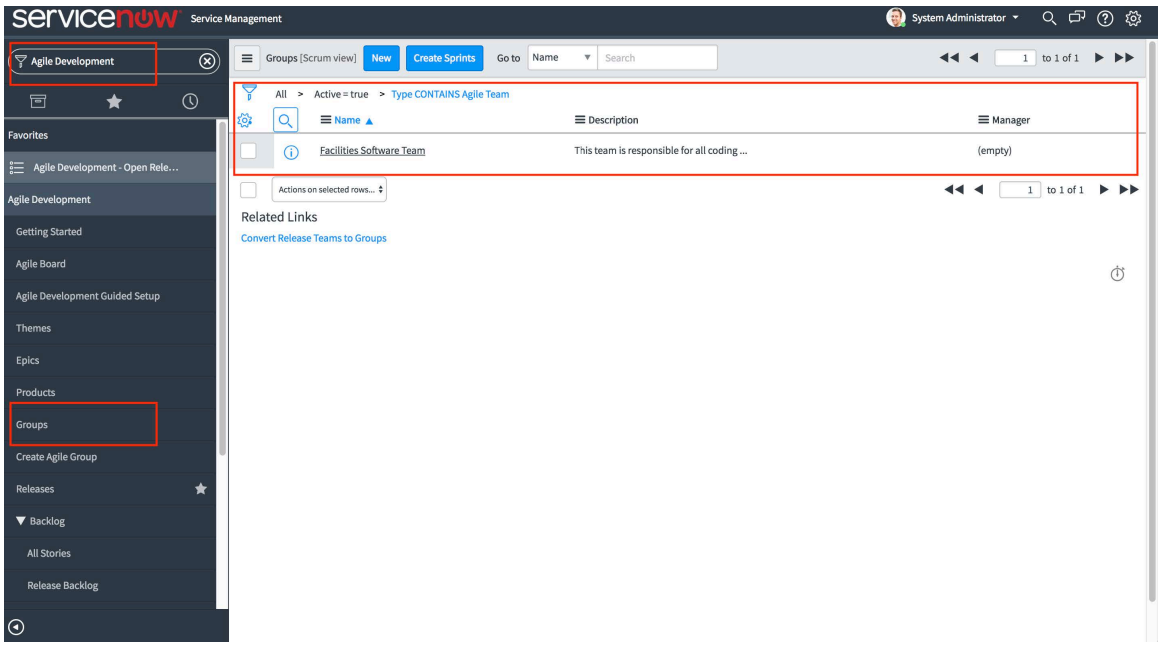

3. チームのすべてのスプリントでアサイン先グループが更新されていることを確認します。
   これは、変換前にメモしたものと同じスプリントリストです。このリストでは、変換後にアサイン先グループが更新されているはずです。

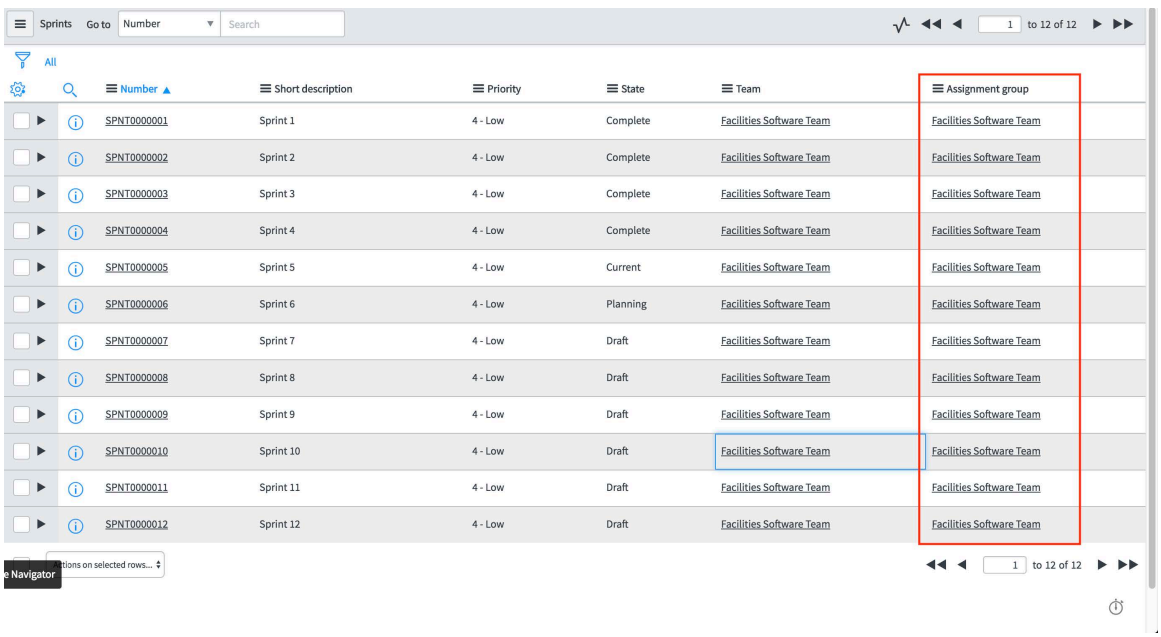


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. チームのスプリントに関連付けられたストーリーがアサイン先グループで更新されていることを確認します。

   以下に、グループに変換する前にメモしたストーリーのリストを示します。

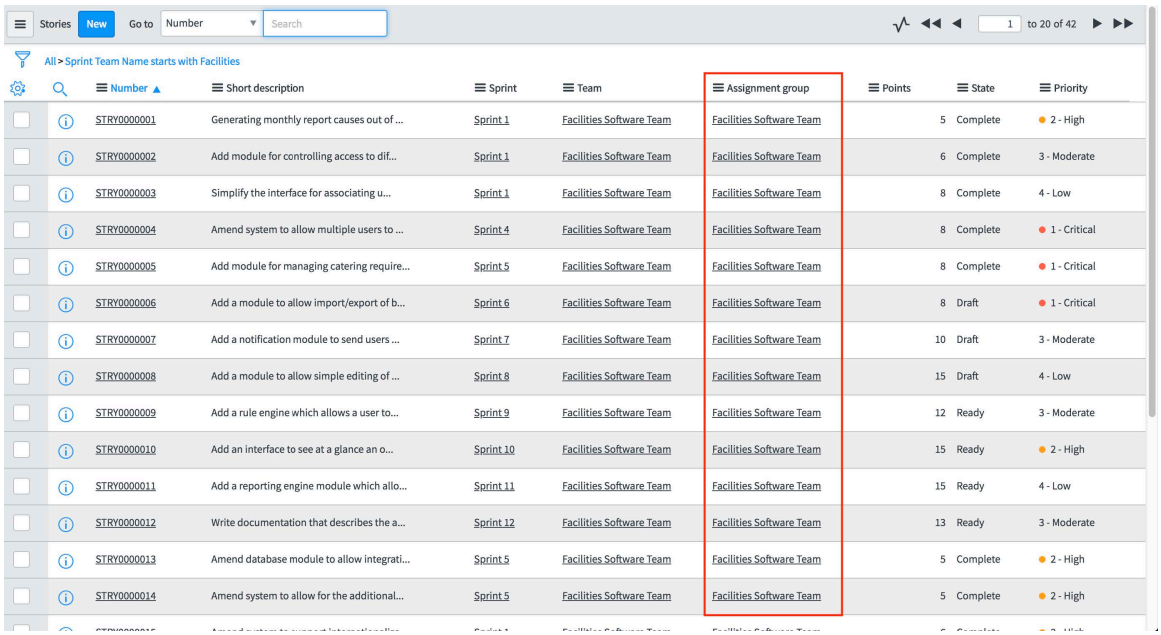

Stories | New | Go to Number | Search | 1 to 20 of 42

All > Sprint Team Name starts with Facilities

Number ▲	Short description	Sprint	Team	Assignment group	Points	State	Priority
STRY0000001	Generating monthly report causes out of ...	Sprint 1	Facilities Software Team	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High
STRY0000002	Add module for controlling access to dif...	Sprint 1	Facilities Software Team	Facilities Software Team	6	Complete	3 - Moderate
STRY0000003	Simplify the interface for associating u...	Sprint 1	Facilities Software Team	Facilities Software Team	8	Complete	4 - Low
STRY0000004	Amend system to allow multiple users to ...	Sprint 4	Facilities Software Team	Facilities Software Team	8	Complete	1 - Critical
STRY0000005	Add module for managing catering require...	Sprint 5	Facilities Software Team	Facilities Software Team	8	Complete	1 - Critical
STRY0000006	Add a module to allow import/export of b...	Sprint 6	Facilities Software Team	Facilities Software Team	8	Draft	1 - Critical
STRY0000007	Add a notification module to send users ...	Sprint 7	Facilities Software Team	Facilities Software Team	10	Draft	3 - Moderate
STRY0000008	Add a module to allow simple editing of ...	Sprint 8	Facilities Software Team	Facilities Software Team	15	Draft	4 - Low
STRY0000009	Add a rule engine which allows a user to...	Sprint 9	Facilities Software Team	Facilities Software Team	12	Ready	3 - Moderate
STRY0000010	Add an interface to see at a glance an o...	Sprint 10	Facilities Software Team	Facilities Software Team	15	Ready	2 - High
STRY0000011	Add a reporting engine module which allo...	Sprint 11	Facilities Software Team	Facilities Software Team	15	Ready	4 - Low
STRY0000012	Write documentation that describes the a...	Sprint 12	Facilities Software Team	Facilities Software Team	13	Ready	3 - Moderate
STRY0000013	Amend database module to allow integrati...	Sprint 5	Facilities Software Team	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High
STRY0000014	Amend system to allow for the additional...	Sprint 5	Facilities Software Team	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High

5. 変換前にメモしたスプリントのスプリントバーンダウンを確認します。

   これは、変換前と同じであることが必要です。

   a. rm_srpint テーブル (rm_sprint.list) を開くか、アサイン先グループを開きます。


   b. 現在のスプリントをクリックします。

   c. すべての WIP ストーリーを完了済みとしてマークします。

   d. 完了済みストーリーで更新するスプリントバーンダウンを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

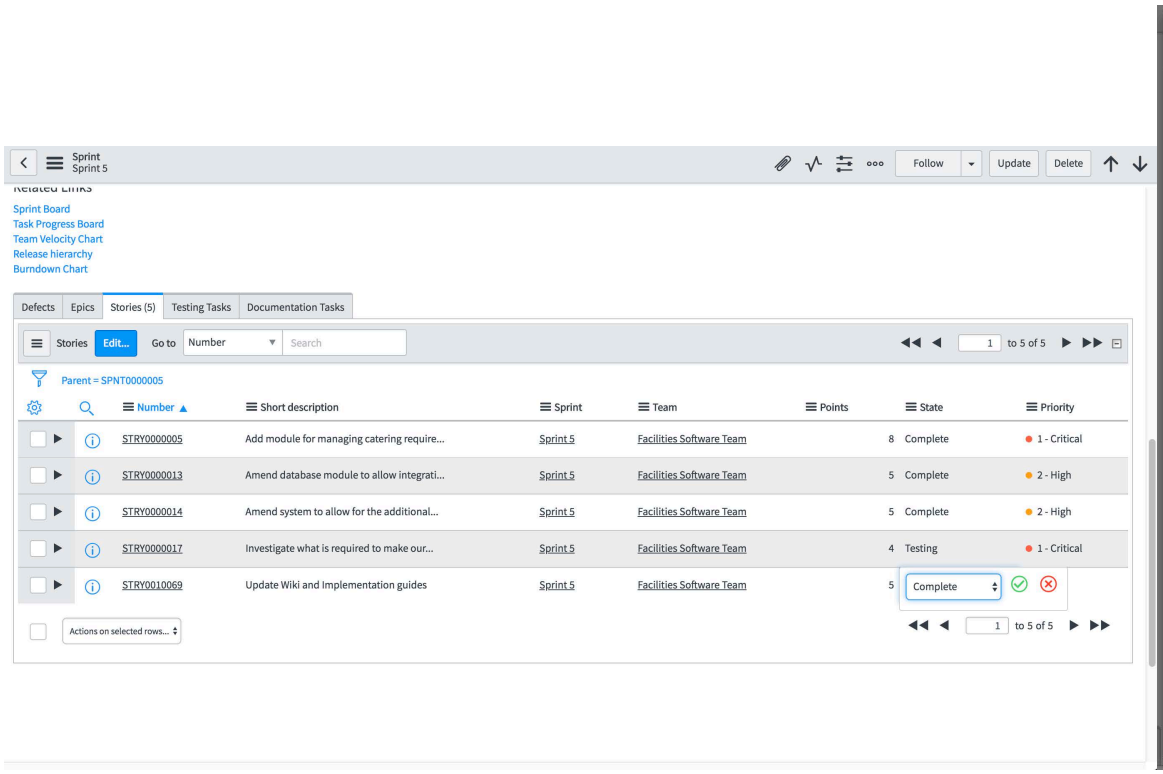



6. ストーリーが完了したら、リリースバーンダウンも正しく更新する必要があります。


たとえば、次のスクリーンショットでは、現在のリリースのバーンダウンが正しく更新されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

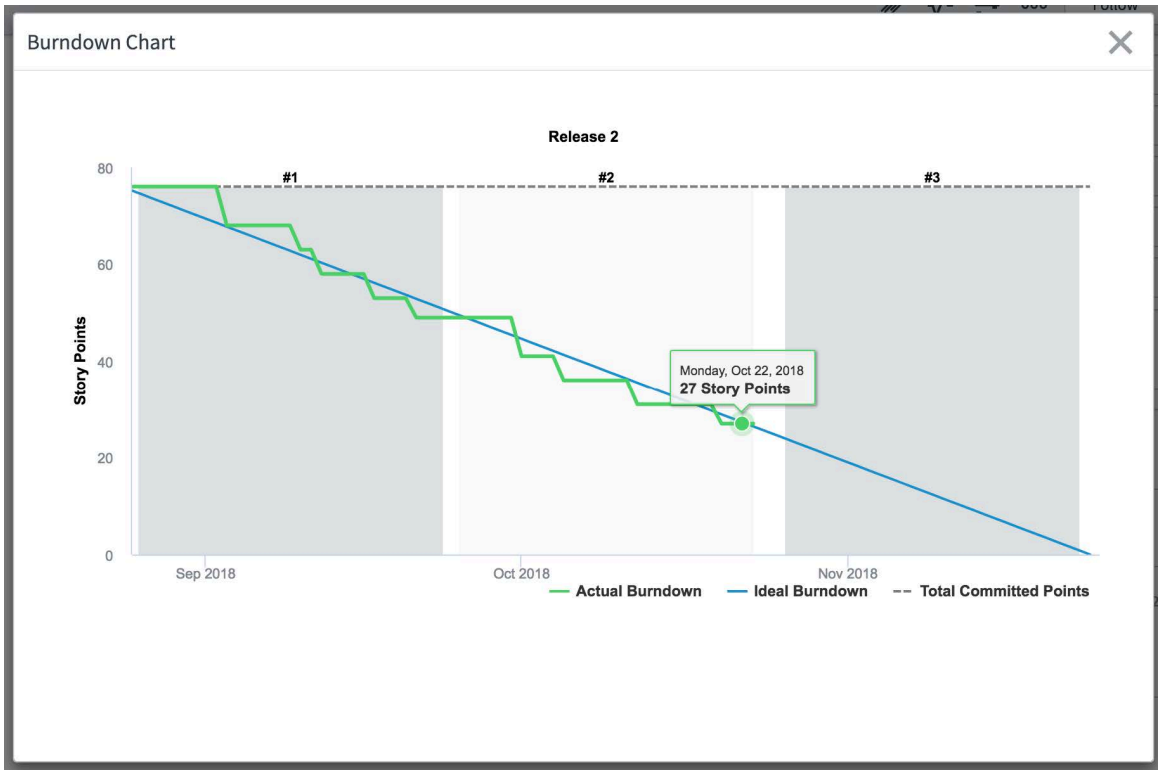

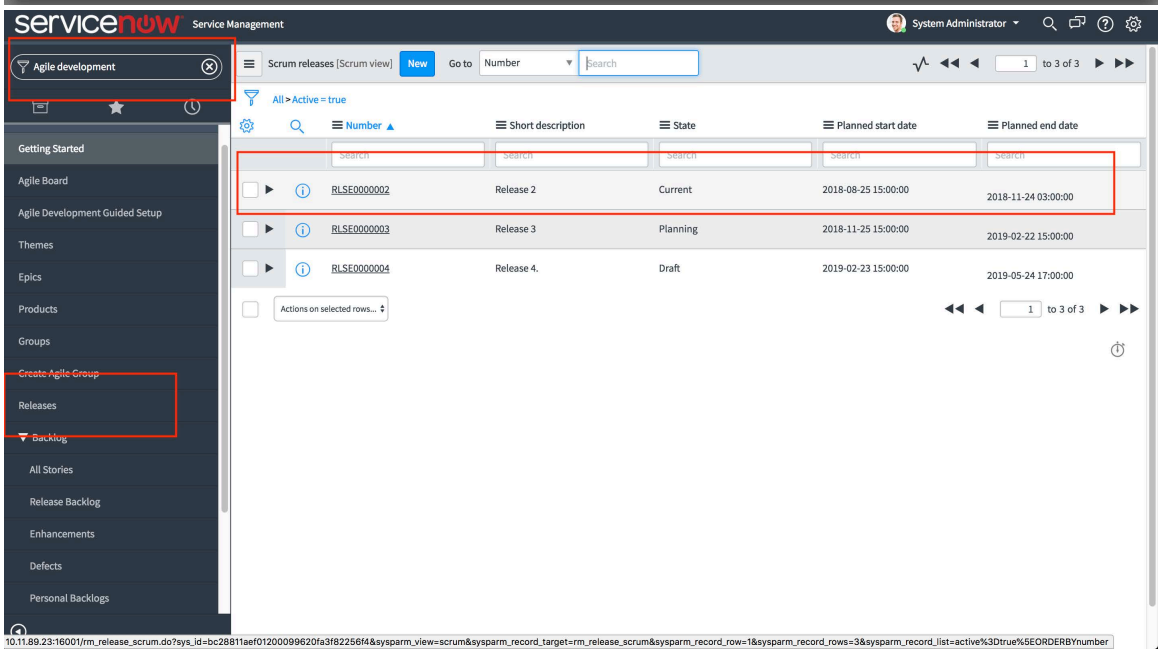

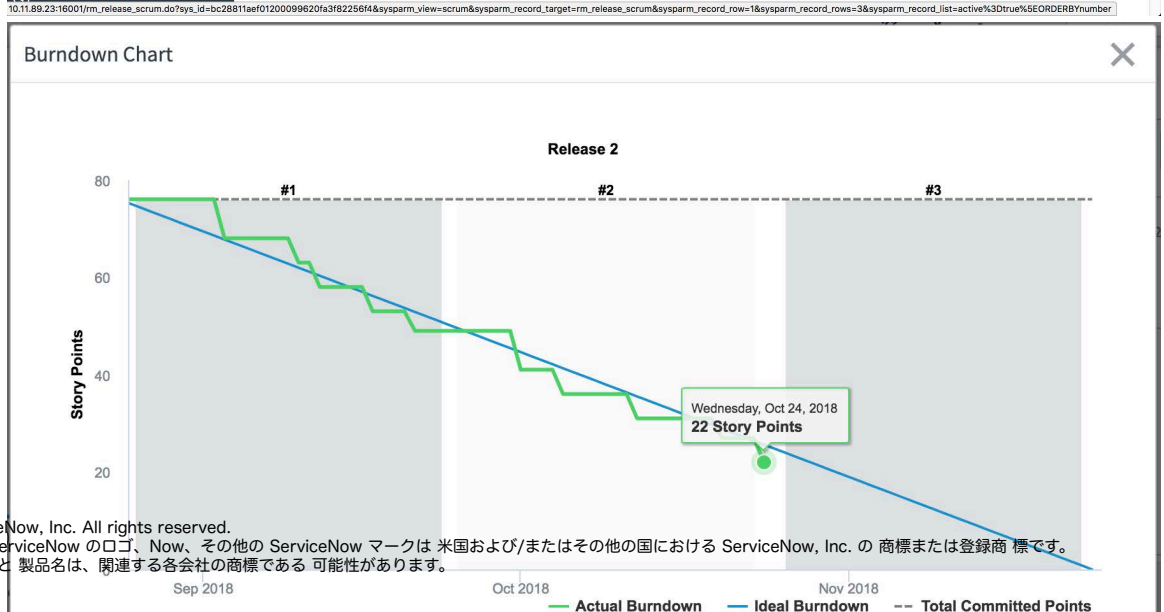

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


7. グループ速度の場合：

   a. 移動先 アジャイル開発 > グループ.

   b. グループの速度を確認します。これは、変換前と同じであることが必要です。

   c. 現在のスプリントを完了します。変換前に完了したスプリントに加えて、完了したスプリントのグループの速度も表示する必要があります。

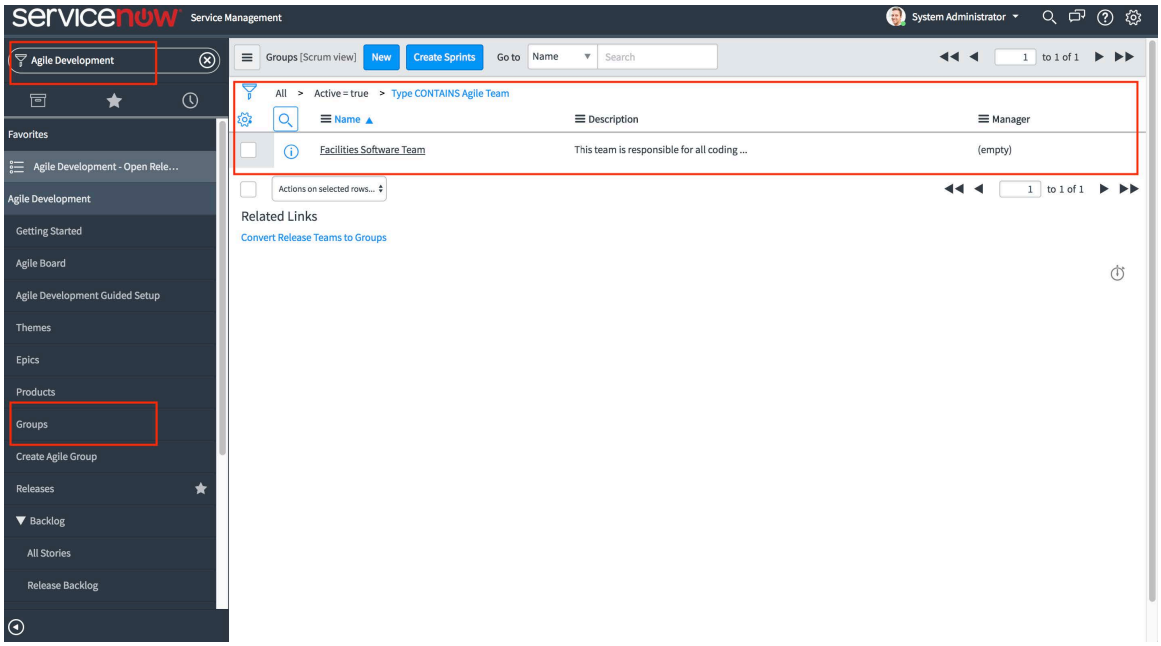

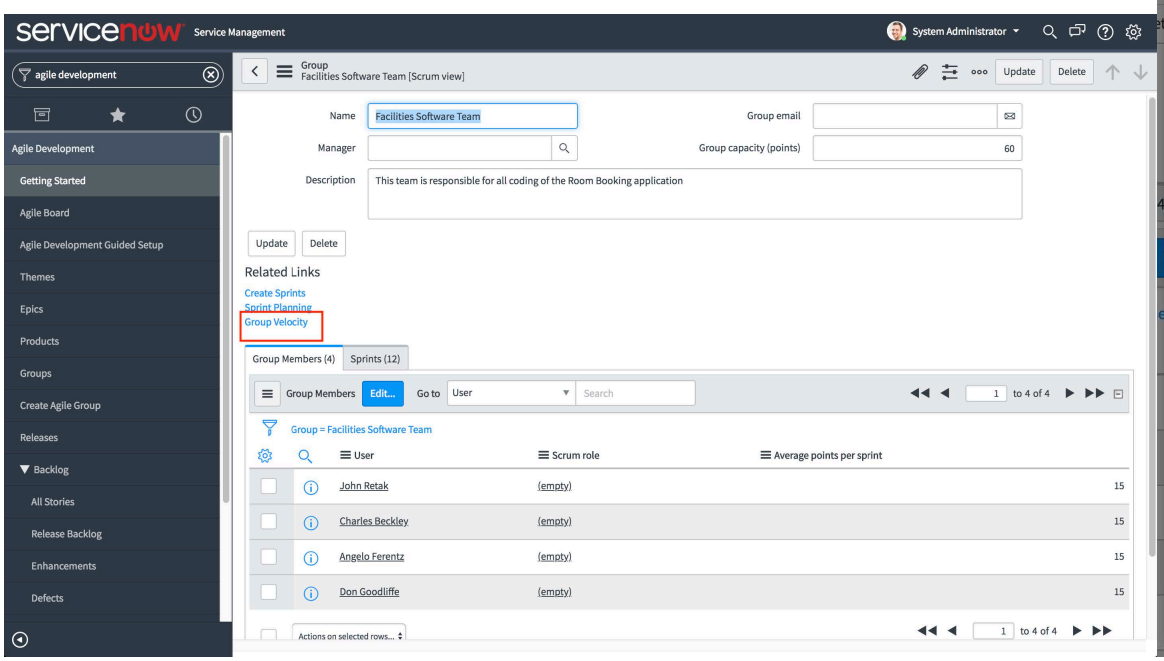

8. 1 つのグループのステップを確認すると、移行が正常に完了したことが確認されます。
   他のすべてのチームに対してこの手順を 1 つずつ繰り返すことができます。これは同期プロセスであるため、一度に 1 つのチームでこの手順を実行する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 **1.0** に対する アジャイル開発 **2.0** の機能拡張

アジャイル開発 2.0 は、 アジャイル開発 1.0 に対していくつかの機能拡張を提供します。

こうした機能拡張は、次のカテゴリに分類できます。

- アジャイル開発 1.0 から アジャイル開発 2.0 へのデータモデルの機能拡張
- アジャイル開発 1.0 から アジャイル開発 2.0 へのユーザビリティの機能拡張
- アジャイル開発 1.0 から アジャイル開発 2.0 への機能拡張


アジャイル開発 **1.0** から アジャイル開発 **2.0** へのデータモデルの機能拡張

アジャイル開発 2.0 は、 アジャイル開発 1.0 に対していくつかのデータモデルの拡張を提供します。

共通プラットフォーム構成の使用：アサイン先グループ

アジャイルチーム (スクラムチーム) をマッピングするために、アジャイル開発 1.0 ではリリースチームテーブル (scrum_pp_team) と呼ばれる個別のエンティティを使用します。このエンティティは、次のスクリーンショットに示すように、リリースエンティティに関連付けられています。

スクラムリリース

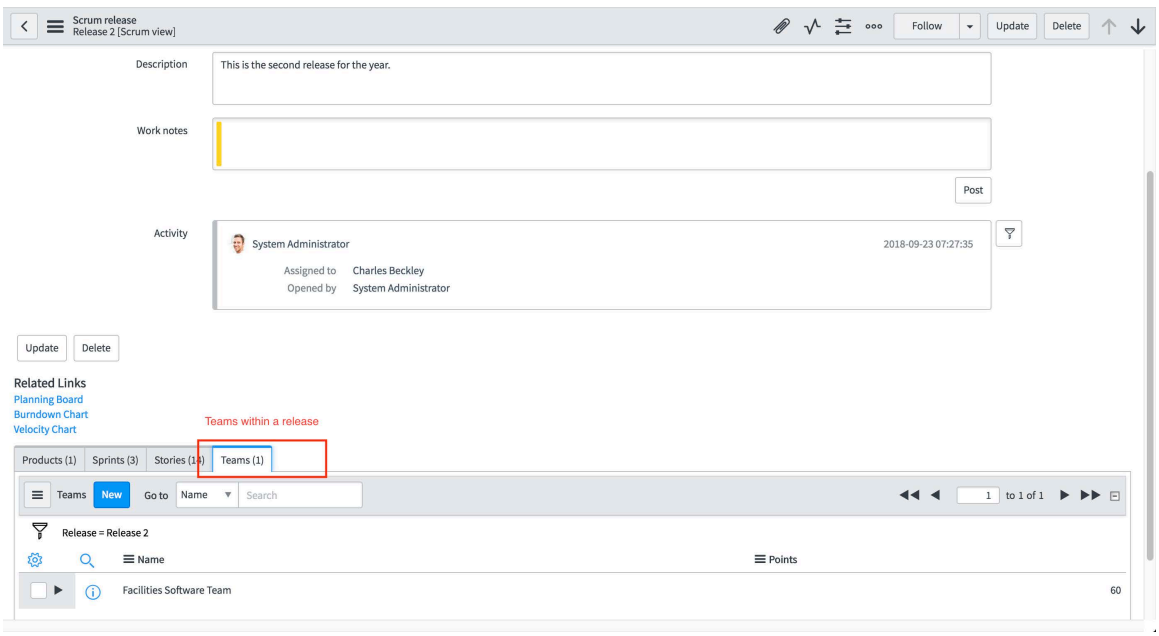


インシデント、問題、変更、プロジェクトなど、プラットフォーム上の他のすべてのタスクは、アサイン先グループエンティティに基づいてグループにアサインされます。グループマネージャーは、アサイン先グループに関するレポートを実行して、グループにアサインされた作業に関するインサイトを得ることができます。

ストーリーやタスクなどのスクラム作業であっても、プラットフォーム全体でグループの使用を標準化するために、スタンドアロンエンティティのリリースチームではなく、標準構成のアサイン先グループが使用されます。 アジャイル開発 2.0 ではアサイン先グループを使用してアジャイルチームをマッピングします。アジャイルチームタイプのアサイン先グループは、アジャイルチームを定義するために使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グループ

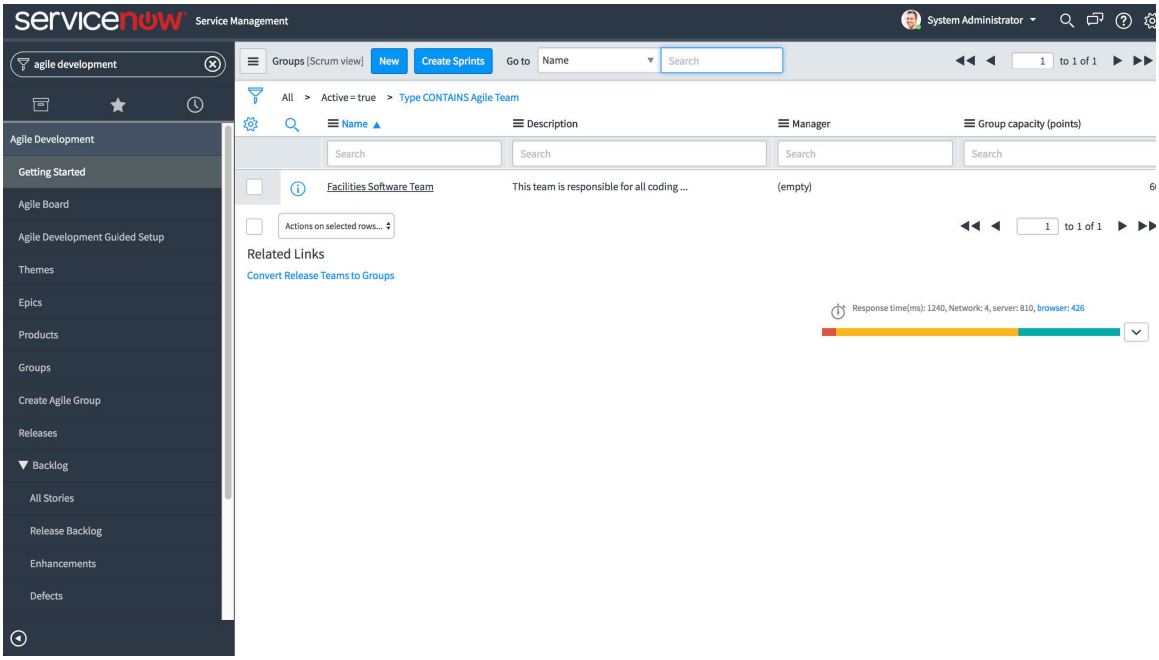


リリースごとにアジャイルチーム (グループ) を作成する必要はありません

アジャイル開発 1.0 では、リリースごとにチームが作成され、各リリースにチームが関連付けられます。たとえば、Team — Alpha というスクラムチームが複数回の四半期リリースで作業している場合を考えます。チームを 1 回だけ作成して、任意のリリースまたは繰り越したリリースにチームを関連付けることはできません。新しいリリースを作成するたびに、同じ名前のチームを作成し、チームをリリースに関連付ける必要があります。

アジャイル開発 2.0 を使用すると、リリースからは独立してグループを作成でき、リリースごとにグループを再作成することなく、複数のリリースのストーリーで作業できます。

スクラムリリース

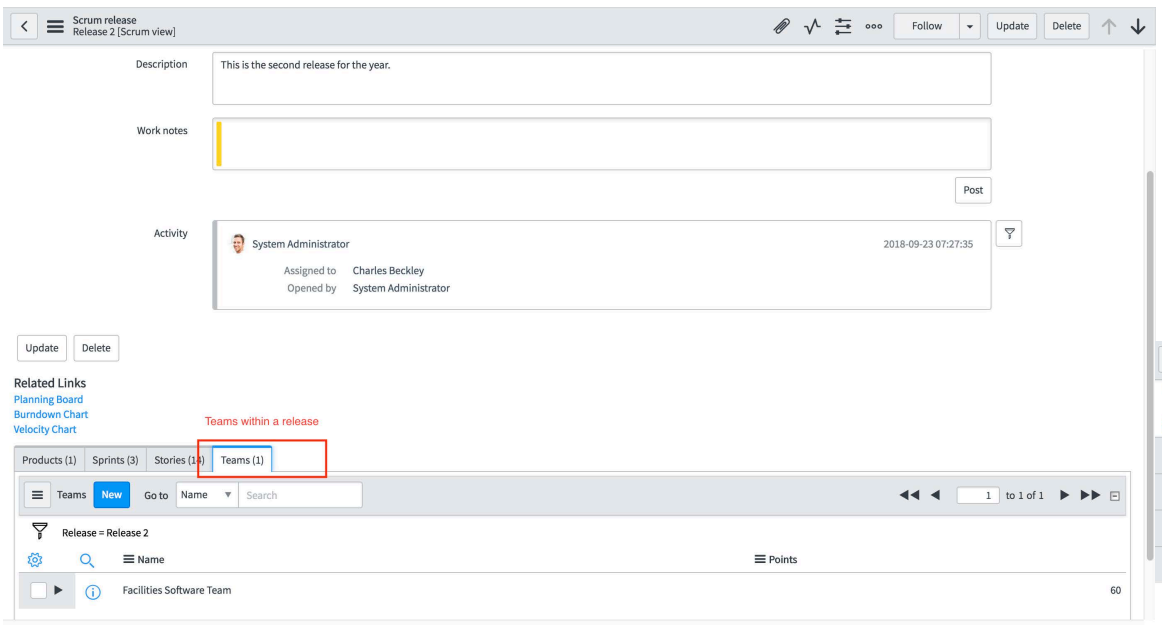


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


スプリントはリリースなしで作成できる

アジャイル開発 1.0 では、スプリントを作成するためにリリースを必ず作成する必要があります。チームに対してスプリントを別個に作成することはできません。アジャイル開発 1.0 では、スプリントを介してストーリーを実行するためのリリースを作成することが義務付けられています。リリースがない場合、ストーリーレコードにスプリントを入力できません。

スプリント

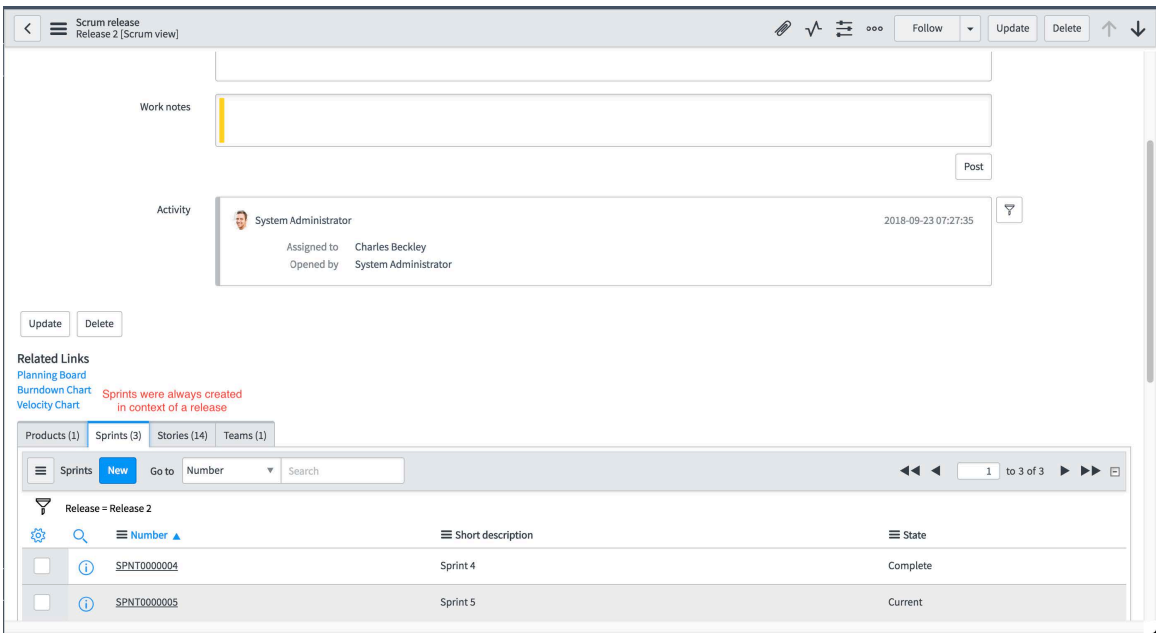

アジャイル開発 2.0 では、スプリントがアサイン先グループに関連付けられていま

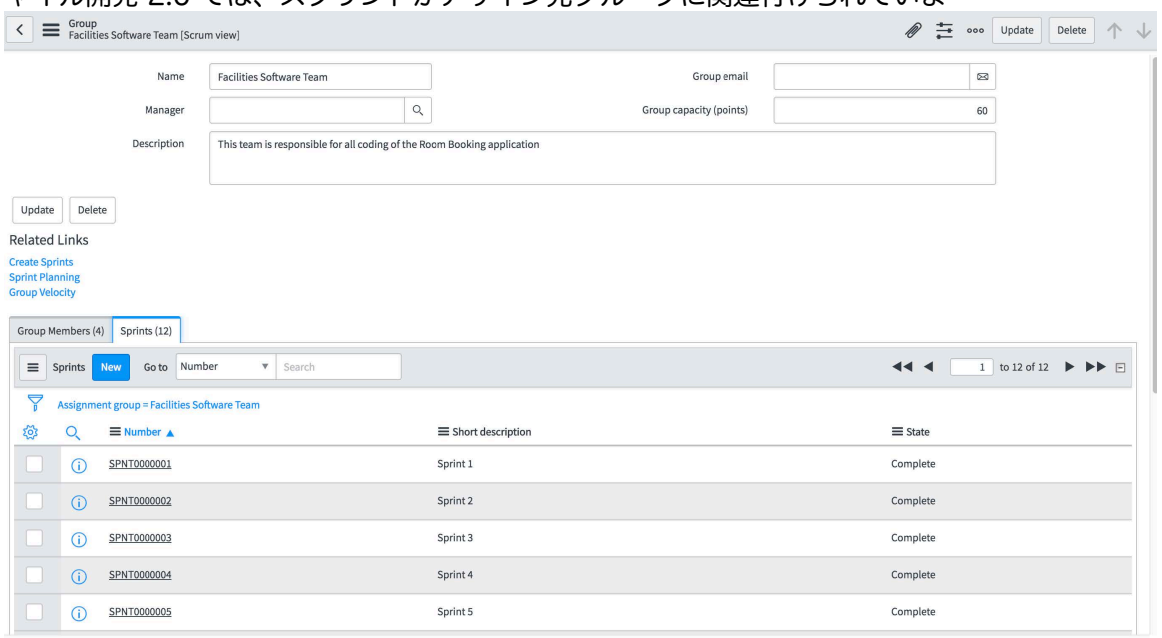

す。

チームバックログは、リリースとは無関係に維持できる


通常、チームはリリース後に進行中のチームバックログリリースを保持し、バックログからストーリーを抽出して、リリースのスプリントを通じてストーリーを実行できます。

アジャイル開発 1.0 では、リリースを定義せずにチームを定義することはできません。したがって、チームバックログは、リリースと無関係に維持することはできません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 2.0 では、リリース内にアサイン先グループが作成されません。リリースに関連付けることはできますが、リリース内で作成することはできません。したがって、アサイン先グループは独自のバックログを維持できます。

アジャイル開発 **2.0** によるグループバックログ

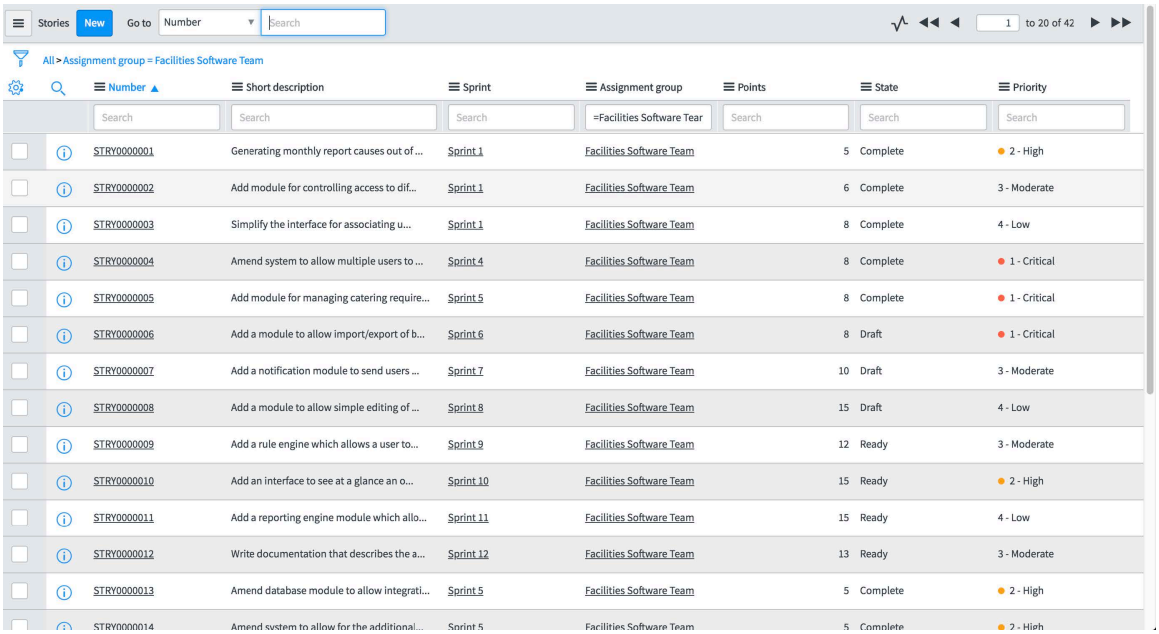

Number	Short description	Sprint	Assignment group	Points	State	Priority
STRY0000001	Generating monthly report causes out of ...	Sprint 1	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High
STRY0000002	Add module for controlling access to dif...	Sprint 1	Facilities Software Team	6	Complete	3 - Moderate
STRY0000003	Simplify the interface for associating u...	Sprint 1	Facilities Software Team	8	Complete	4 - Low
STRY0000004	Amend system to allow multiple users to ...	Sprint 4	Facilities Software Team	8	Complete	1 - Critical
STRY0000005	Add module for managing catering require...	Sprint 5	Facilities Software Team	8	Complete	1 - Critical
STRY0000006	Add a module to allow import/export of b...	Sprint 6	Facilities Software Team	8	Draft	1 - Critical
STRY0000007	Add a notification module to send users ...	Sprint 7	Facilities Software Team	10	Draft	3 - Moderate
STRY0000008	Add a module to allow simple editing of ...	Sprint 8	Facilities Software Team	15	Draft	4 - Low
STRY0000009	Add a rule engine which allows a user to...	Sprint 9	Facilities Software Team	12	Ready	3 - Moderate
STRY0000010	Add an interface to see at a glance an o...	Sprint 10	Facilities Software Team	15	Ready	2 - High
STRY0000011	Add a reporting engine module which allo...	Sprint 11	Facilities Software Team	15	Ready	4 - Low
STRY0000012	Write documentation that describes the a...	Sprint 12	Facilities Software Team	13	Ready	3 - Moderate
STRY0000013	Amend database module to allow integrati...	Sprint 5	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High
STRY0000014	Amend system to allow for the additional...	Sprint 5	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High

リリースとグループの関連性

アジャイル開発 2.0 のリリースとグループの間に直接的な関係はないため (グループは独立しており、リリースごとにグループを作成する必要はありません)、m2m_release_group_list テーブルが導入されました。このテーブルには、グループとリリースの関連付けが格納されます。この関連付けは、スプリントの生成には使用されませんが、リリースのキャパシティを導出するために使用されます。

リリース内でグループが作業するスプリントの数を指定します。チームのキャパシティから、リリースのキャパシティが導出されます。


m2m_release_group

チーム	スプリントの開始	スプリントの終了	ポイント (各スプリント)	リリースの合計グループキャパシティ
A	A_Sprint 1	A_Sprint 3	30	90 (3*30)
B	B_Sprint 1	B_Sprint 4	40	160 (4*40)

合計リリースキャパシティ = 90 + 160 = 250 ポイント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

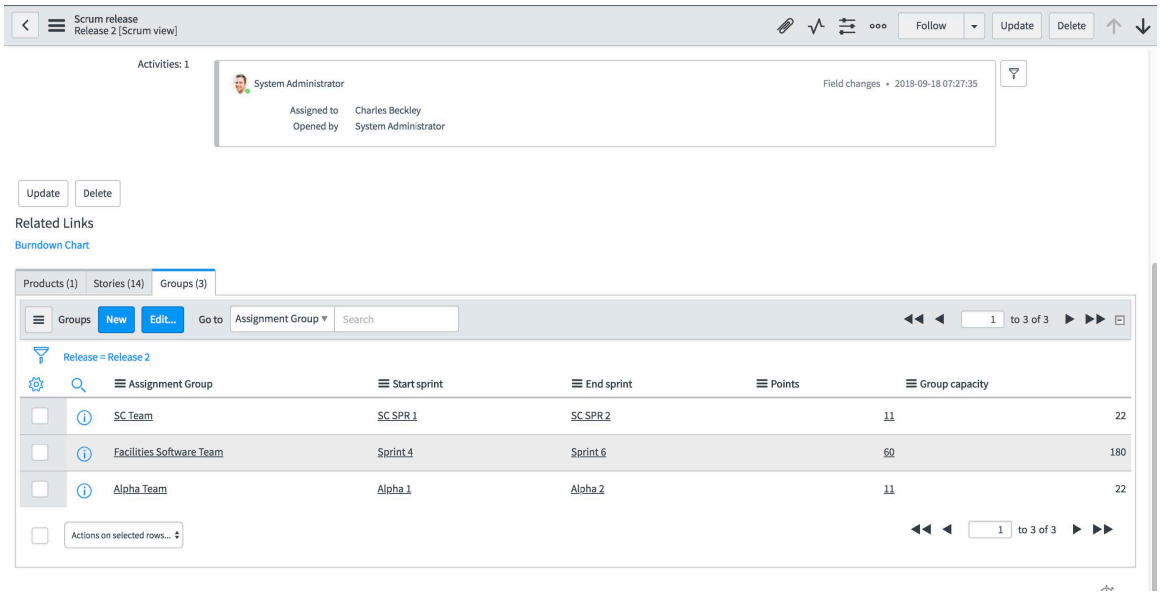

のグループの関連付け

アジャイル開発 **1.0** から アジャイル開発 **2.0** への機能拡張

アジャイル開発 2.0 は、 アジャイル開発 1.0 に対していくつかの機能拡張を提供します。

テスト管理 **2.0** との統合

アジャイル開発 2.0 は、テスト管理 2.0 と統合されています。この統合により、ストーリーのテストを定義し、ストーリーが完了としてマークされる前にテストを実行できます。

注:
この統合は London リリースから利用可能です。

統合： アジャイル開発 ― 統合バックログ

アジャイル開発 — 統合バックログ は、アジャイル開発 2.0 と統合されています。この統合により、欠陥、問題、インシデントタスク、ストーリーなど、さまざまなタスクタイプのレコードを含む一元化されたバックログを維持できます。これにより、1 つの場所でさまざまなタスクタイプレコードの優先順位付けと順序付けが容易になり、ステップを節約できます。レコードをストーリーに変換するオーバーヘッドがなくなります。

注:
この統合は London リリースから利用可能です。

アジャイル開発 **1.0** から アジャイル開発 **2.0** へのユーザビリティの機能拡張

アジャイル開発 2.0 は、 アジャイル開発 1.0 に対していくつかの機能拡張を提供します。


バックログの管理と調整

柔軟なバックログ定義

アジャイル開発 2.0 を使用すると、バックログを定義できます。たとえば、製品またはチームごとに異なるバックログを作成したり、1 つ以上のエピックのバックログを組み合わせたりすることができます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

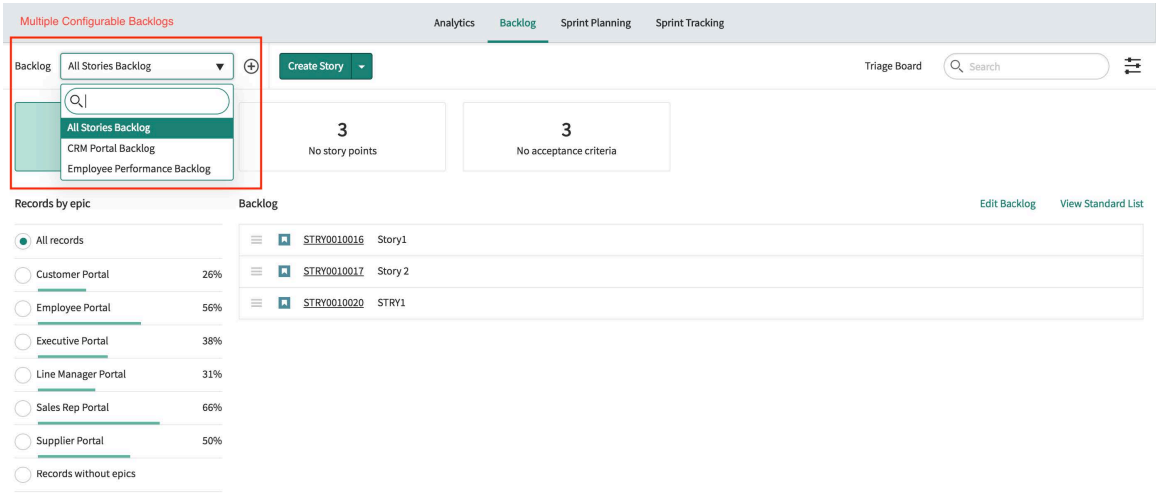

バックログの調整

アジャイル開発 2.0 はバックログの詳細ビューを提供します。このビューでは、ストーリーをドラッグしてランク付けできます。また、エピックごとにバックログを表示し、全体的なバックログの状況に関するアナリティクスを得ることもできます。たとえば、受け入れ条件のないストーリー分析などです。

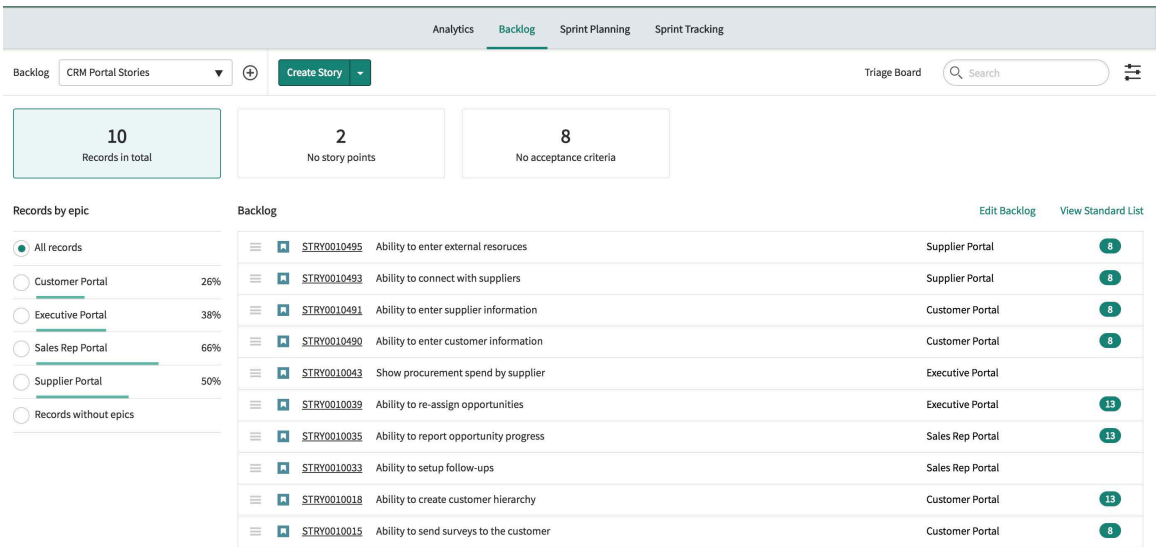


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

強化されたスプリント計画立案エクスペリエンス

アジャイル開発 2.0 は、バックログとスプリントに対して単一のビューを提供します。ストーリーをバックログからスプリントにドラッグして、インタラクティブな方法でスプリント計画を実行します。

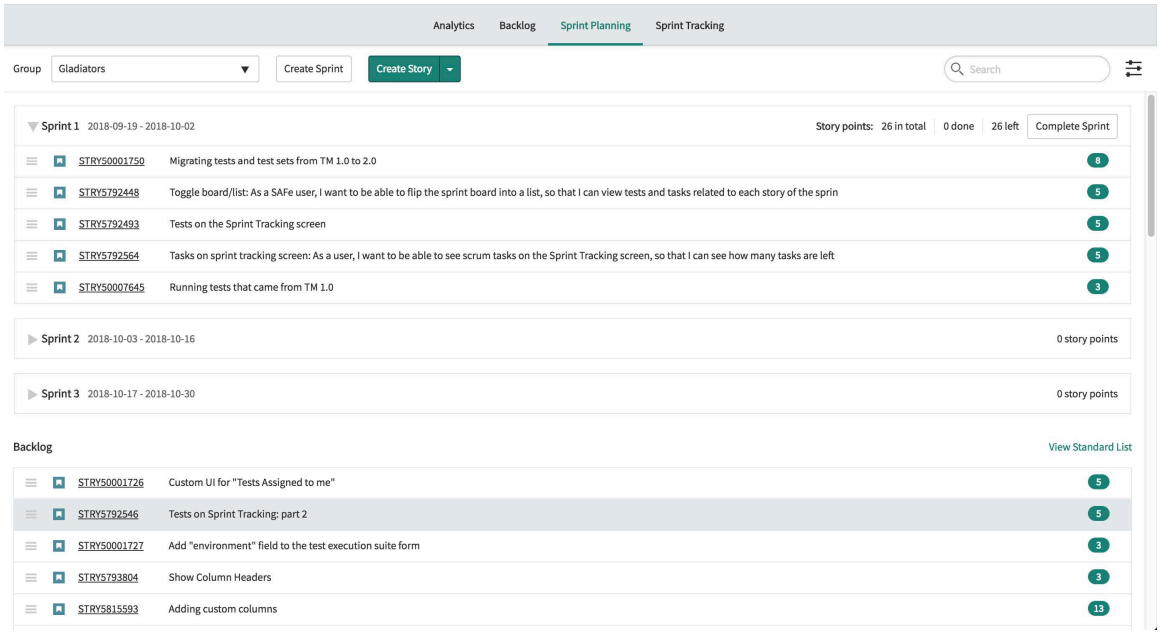


自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
アジャイル開発 1.0 の計画ボードは廃止されていませんが、アジャイル開発 2.0 では [スプリント計画立案] タブを使用できます。リリース計画立案では、ストーリーを複数選択してリリースに割り当てることができる [バックログ] タブを使用します。

Agile Development の [計画ボード] タブの例

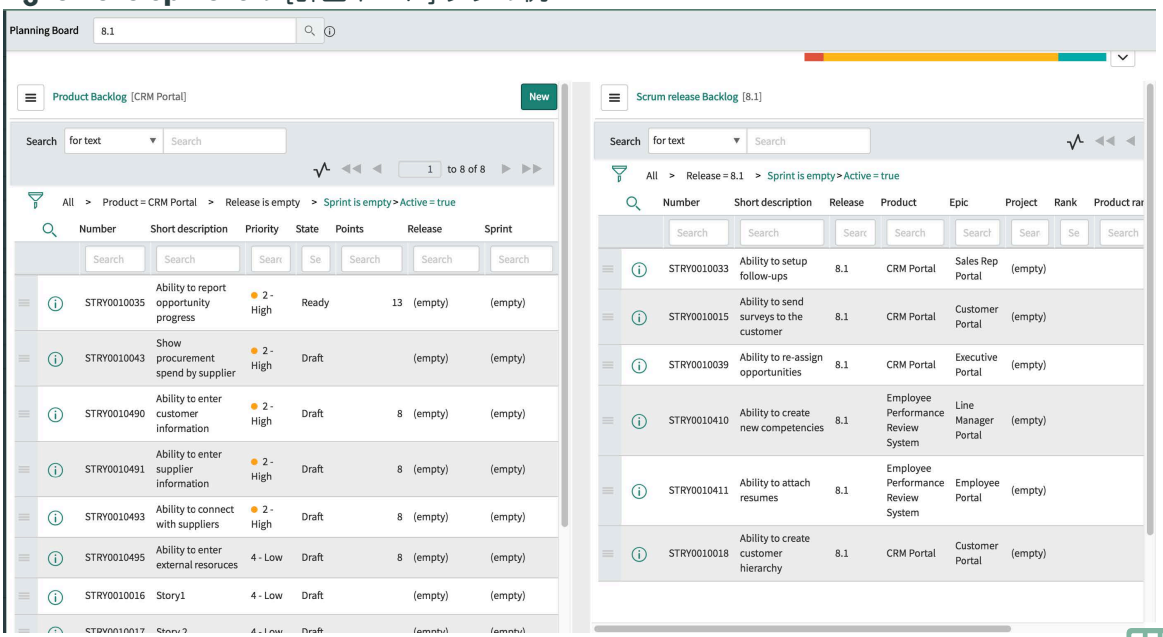


Agile Development 2.0 のリリースに複数のストーリーを割り当てる

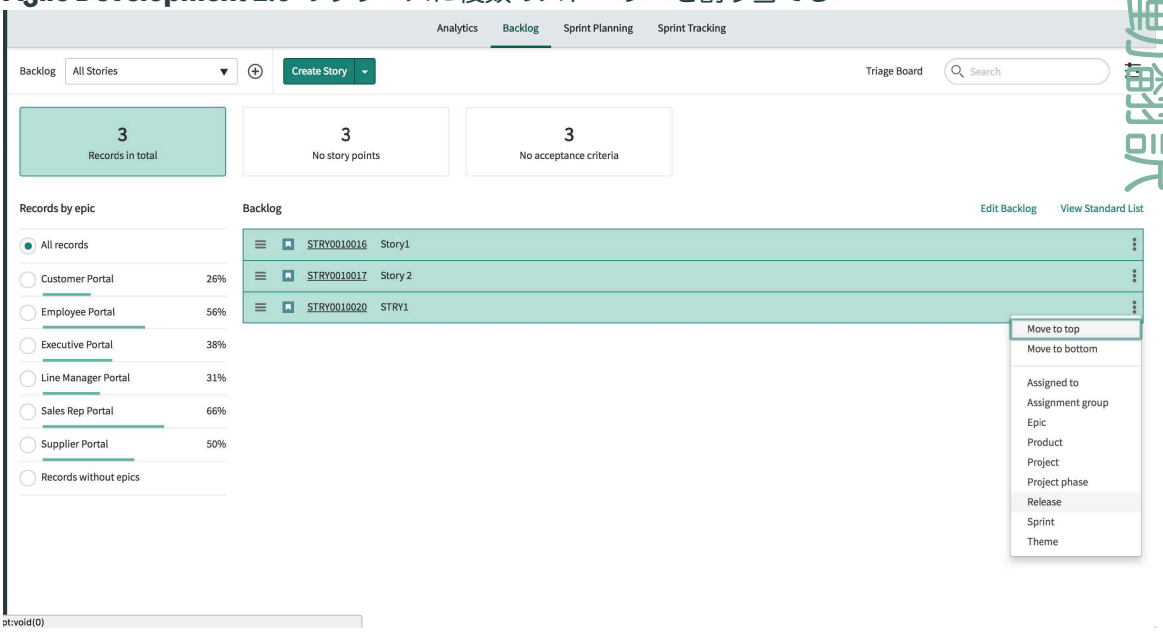


スプリント追跡

アジャイル開発 2.0 では、ビジュアルタスクボード機能を活用して、スプリント内のストーリーの進行状況を追跡します。また、追跡ビューからスクラムタスクを作成できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

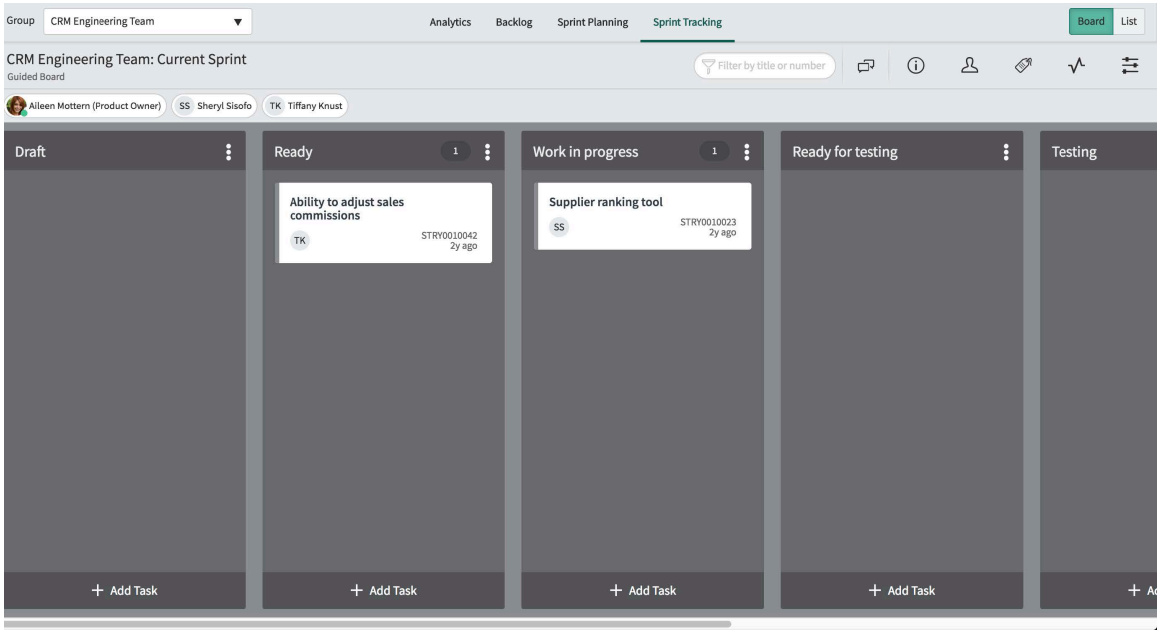

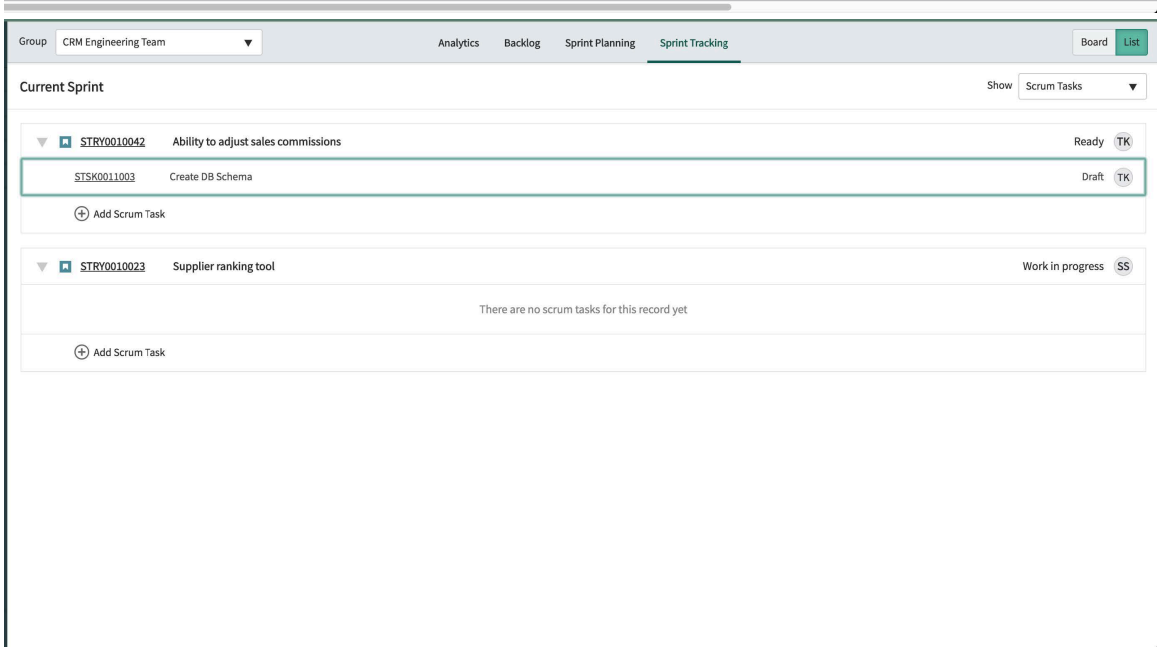

自動翻訳

注:
Agile Development 2.0 では、タスク進捗ボード UI は、タブとしては表示されません。ナビゲーターの検索パネルに「タスク進捗状況バー」と入力して、スクラムタスクの進捗状況を追跡するための UI を呼び出すことができます。

アジャイル開発 **2.0** におけるユーティリティのカスタマイズのレビュー

Agile_2.0_Upgrade_Diagnostics 更新セットを使用して、 アジャイル開発 2.0 の拡張の一部として変更されたプラットフォームアーティファクト (フォームレイアウト、リストレイアウト、ビジネスルール、クライアントスクリプトなど) のカスタマイズを分析します。アップグレード前にカスタマイズを削除してください。

始める前に

- 必要なロール：admin
- Agile_2.0_Upgrade_Diagnostics 更新セット をダウンロードします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 同僚と連携して仕事を進めるには、上の 取得済み更新セット 移動します
2. **[XML** から更新セットをインポート] をクリックします。
3. 更新セットを選択してアップロードします。
4. 更新セットをプレビューしてコミットします。
5. 移動先 **Agile Development 2.0** > アップグレード診断 > 診断を表示.
   インスタンスおよび Agile Development 2.0 で変更された Agile Development 1.0 のすべてのアーティファクトを表示します。
6. アーティファクトのファイル名をクリックするか、 [更新を表示] リンクをクリックしてファイルの最新の更新を確認します。

   たとえば、次のスクリーンショットでは、システムスクリプトがカスタマイズされています。したがって、アップグレード後にカスタマイズを削除、復元、または再適用するには、さらに分析が必要です。

   カスタマイズされたシステムスクリプトの例

アジャイル開発 **2.0** へのアップグレード後に変更されたプラットフォームアーティファクトのリスト

移行後、アジャイル開発 2.0 で変更されたアーティファクトのリストを確認できます。

- sys_ui_list_control_3f85b6907f00000135a05e41c7547354、
- sys_ui_list_control_3f8607b47f0000012aaff213c654be45、
- sys_ui_list_control_6daa4a777f000001007607d32a0b44f0、
- sys_ui_list_control_7d3d1f917f000001798fc58141419300、
- sys_ui_list_control_aa8a1aae7f000001432d0e1142a85c2d、
- sys_ui_list_control_aa8a4bbe7f00000139552678204587f7、
- sys_ui_list_control_aa8ace2f7f000001514936314eb4c441、
- sys_ui_list_control_aa8b47f57f000001024db35639e9239d、
- sys_ui_list_control_aa8b87c57f0000014da26c6926295c45、
- sys_ui_list_control_aa8bb1fe7f000001566e2efad03b5d1d、
- sys_ui_list_control_f2e3f8447f0000010e16b6f2131e4c51、
- sys_ui_list_control_f2e421e97f0000015fecc4e84539ca3f、
- sys_ui_list_control_f31a7ea37f00000111797ad94bfc17a7、
- sys_ui_form_sections_6dd15dd77f00000146435a3f9ec1b5c2、
- sys_ui_form_sections_6dd2cbb17f0000016bc846fa867d9527、
- sys_ui_form_sections_6dd47d6f7f0000011b43299d37b79da0、
- sys_ui_section_09c7f68d0a0a2c39447a64370c6851bb、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- sys_ui_section_09c9c4eb0a0a2c390ca461bae347c0c8、
- sys_ui_section_6da8bbff7f00000119f52f9d2ba74f7e、
- sys_ui_section_6dc344847f0000017a3badab86eae0f4、
- sys_ui_section_6dc409c57f0000016dd1fbecc461c7b9、
- sys_ui_section_6dd15e0a7f00000104ddce3e4fec5457、
- sys_ui_section_6dd2cbc97f0000016b6662d744a1766c、
- sys_ui_section_6dd47d857f000001783b95cc64af46a4、
- sys_ui_section_8756880b7f00000147213f08234c9a57、
- sys_ui_section_87569f2d7f00000116c556f5821ae434、
- sys_ui_section_8757b94d7f0000011c1ae8aa30062c20、
- sys_ui_section_87580cdb7f00000145cff7762bcac315、
- sys_ui_section_a19b5086c1252a7b3632553861b5440c、
- sys_ui_section_a7ee48bfc1252a7b377ac0507a9a6dc8、
- sys_ui_section_aa8a5d967f0000010d9bd63883019d20、
- sys_ui_list_rm_epic_rm_epic_scrum、
- sys_ui_list_rm_epic_scrum_theme_scrum、
- sys_ui_list_rm_scrum_task_rm_story_scrum、
- sys_ui_list_rm_sprint_rm_release_scrum_scrum、
- sys_ui_list_rm_story_rm_epic_scrum、
- sys_ui_list_rm_story_rm_release_scrum_scrum、
- sys_ui_list_rm_story_rm_sprint_scrum、
- sys_ui_list_rm_story_scrum_theme_scrum、
- sys_ui_list_scrum_group_permissions_scrum_theme_scrum、
- sys_ui_list_scrum_user_permissions_scrum_theme_scrum、
- sys_ui_list_rm_release_scrum_scrum、
- sys_ui_list_rm_sprint_scrum、
- sys_ui_list_rm_epic_scrum、
- sys_ui_list_rm_story_scrum、
- sys_ui_list_rm_release_scrum_null、
- sys_ui_list_rm_sprint_null、
- sys_ui_list_rm_epic_null、
- sys_ui_list_rm_story_null、
- sys_ui_related_rm_defect_scrum、
- sys_ui_related_rm_doc_scrum、
- sys_ui_related_rm_epic_scrum、
- sys_ui_related_rm_release_scrum_scrum、
- sys_ui_related_rm_release_scrum、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- sys_ui_related_rm_sprint_scrum、
- sys_ui_related_rm_story_scrum、
- sys_ui_related_rm_test_scrum、
- sys_ui_related_rm_defect_null、
- sys_ui_related_rm_doc_null、
- sys_ui_related_rm_epic_null、
- sys_ui_related_rm_release_scrum_null、
- sys_ui_related_rm_release_null、
- sys_ui_related_rm_sprint_null、
- sys_ui_related_rm_story_null、
- sys_ui_related_rm_test_null、
- sys_ui_list_control_3f85b6907f00000135a05e41c7547354、
- sys_ui_section_87569f2d7f00000116c556f5821ae434、
- sys_ui_section_8757b94d7f0000011c1ae8aa30062c20、
- sys_ui_section_87580cdb7f00000145cff7762bcac315、
- sys_ui_section_a7ee48bfc1252a7b377ac0507a9a6dc8、
- sys_ui_section_aa8a5d967f0000010d9bd63883019d20、
- sys_ui_list_rm_story_null、
- sys_ui_list_rm_sprint_scrum、
- sys_ui_list_rm_story_scrum、
- sys_ui_related_rm_release_scrum_scrum、
- sys_ui_related_rm_sprint_scrum、
- sys_ui_section_0ffe390037412000dadaa3549dbe5d0d、
- sys_ui_list_rm_story_project、
- sys_ui_list_rm_story_sprint_planning、
- sys_ui_list_rm_epic_sys_ref_list、
- sys_ui_list_rm_story_release_backlog、
- sys_ui_ list_control_0b28c540ef301000a7450fa3f82256a4、
- sys_app_module_0e28cb14ef941000a7450fa3f8225643、
- sys_app_module_0b57e8009f503100598a5bb0657fcfae、
- sys_app_module_b5b5b092871031003706db5eb2e3ec5b、
- sys_app_module_d5d3212593320200ea933007f67ffb36、
- sys_app_module_f0ca98ca874321003706db5eb2e3ecdd、
- sys_app_module_f1e8dc8a874321003706db5eb2e3ecfa、
- sys_app_module_2117c480ef012000a7450fa3f82256fc、
- sys_app_module_30154714ef941000a7450fa3f82256ef、
- sys_app_module_437d1419ef41200099620fa3f822560c、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- sys_app_module_6d691477efb42000a7450fa3f8225612、
- sys_app_module_5697aaa0efd41000a7450fa3f8225682、
- sys_app_module_876add92ef931000a7450fa3f82256c9、
- sys_app_module_97fd7218ef541000a7450fa3f8225648、
- sys_app_module_ae802859ef41200099620fa3f8225656、
- sys_app_module_b47c5091ef41200099620fa3f8225688、
- sys_app_module_0a68918e37031000dadaa3549dbe5dd4、
- sys_app_module_237c98d5ef41200099620fa3f82256e5、
- sys_app_module_297d5419ef41200099620fa3f82256e9、
- sys_app_module_2b80e819ef41200099620fa3f82256a6、
- sys_app_module_487f9459ef41200099620fa3f82256db、
- sys_app_module_4c836231ef002000a7450fa3f8225612、
- sys_app_module_5600c718ef541000a7450fa3f8225636、
- sys_app_module_717d1419ef41200099620fa3f82256ed、
- sys_app_module_7580e499ef41200099620fa3f8225675、
- sys_app_module_b17e9819ef41200099620fa3f8225692、
- sys_app_module_db7f1099ef41200099620fa3f822564e、
- sys_app_module_eb7dd019ef41200099620fa3f8225611、
- sys_ui_policy_6c5665c293030200ea933007f67ffb18、
- sys_ui_policy_823c84a6ef271000a7450fa3f8225653、
- sys_ui_policy_128dc58293030200ea933007f67ffbb3、
- sys_ui_policy_49dc0ca093030200ea933007f67ffb0c、
- sys_ui_policy_830b62d6877121003706db5eb2e3ec6d、
- sys_ ui_policy_cb2b8826ef271000a7450fa3f82256b3、
- sys_ui_policy_d8476e96877121003706db5eb2e3eca3、
- sys_ui_policy_267d5c2aef271000a7450fa3f8225636、
- sys_ui_policy_63a823ecefb31000a7450fa3f8225627、
- sys_ui_action_22ada00a93330200ea933007f67ffbd5、
- sys_ui_action_e89e773593330200ea933007f67ffbb7、
- sys_ui_action_f6ea06e2870321003706db5eb2e3ec7d、
- sys_ui_action_view_f9e0ee3393330200ea933007f67ffb38、
- sys_ui_action_96bd90b28f1321001a83cfd827bdee4a、
- sys_ui_action_c4ac45a147332100846e7eaecb9a7150、
- sys_ ui_action_c5c37126ef202000a7450fa3f8225650、
- sys_ui_action_dd4398b937301000dadaa3549dbe5db8、
- sys_ui_action_eaaae247873321003706db5eb2e3ec61、
- sys_ui_action_706b5e96ef301000a7450fa3f82256a2、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- sys_ui_action_7c972317ff231000dadaefff0efe1e62、
- sys_ui_action_8aba60e6ef96200099620fa3f8225645、
- sys_ui_action_93d4b3423701200054b6a3549dbe5d25、
- sys_ ui_action_d07eddaa37202000dadaa3549dbe5d46、
- sys_ui_action_d67cdea1c32030003d2ae219cdba8f60、
- sys_ui_action_db07e836c320310028d7d56bc3d3ae2c、
- sys_ui_action_e2018d4237502000dadaa3549dbe5d32、
- sys_ui_action_ee01494237502000dadaa3549dbe5dec、
- sysrule_view_203b7ce58f3221001a83cfd827bdee67、
- sysrule_view_43bdcd758f3221001a83cfd827bdee78、
- sysrule_view_522cfce58f3221001a83cfd827bdeeb6、
- sysrule_view_6b8dcd758f3221001a83cfd827bdee3b、
- sysrule_view_9c4c79709f203100598a5bb0657fcf7d、
- sys_script_client_3d260d71873221003706db5eb2e3ec47、
- sys_script_client_f086b853873121003706db5eb2e3ec11、
- sys_script_client_cdf24c2493030200ea933007f67ffb90、
- sys_script_client_e1ea25e193002200ea933007f67ffbff、
- sys_script_2cc257b0373321001a8326877e41f1d0、
- sys_script_235ccb809f203100598a5bb0657fcfea、
- sys_script_3a06ffd59f322100598a5bb0657fcf40、
- sys_script_6940d94fef902000a7450fa3f8225689、
- sys_script_b0490d9047103100846e7eaecb9a7165、
- sys_script_c5dcb4f09f203100598a5bb0657fcffb、
- sys_script_21d6b274ef202000a7450fa3f822565d、
- sys_script_8cd24091ef52200099620fa3f8225619、
- sys_script_9f298c85efa1200099620fa3f82256ba

Agile Development - 統一されたバックログの有効化

admin ロールを持つ場合は、Agile Development - 統一されたバックログプラグイン (com.snc.sdlc.agile.multi_task) を有効化できます。

始める前に

アジャイル開発 2.0 のアクティブ化。

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。

3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

> **注:**
> ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

関連情報

アジャイル開発 — 統合バックログ

アジャイル開発 2.0のクイックスタートテスト

アプリケーションの開発やアップグレードの適用などの構成変更を行った後も、アジャイル開発 2.0 が変わらず正常に動作するかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。

> **危険:**
> デフォルトでは、自動テストを実行するためのシステムプロパティは、実稼働システムでは実行できないように非有効化されています。データの破損や機能停止を避けるため、開発、テスト、および他の非本番インスタンスでのみテストを実行してください。「自動テストフレームワーク (ATF) テストの実行を有効または無効にする 」を参照してください。

アジャイル開発 2.0 クイックスタートテストには、アジャイル開発 2.0 プラグイン (com.snc.sdlc.agile.2.0) および Agile Development 2.0 - ATF テストプラグイン (com.snc.sdlc.agile.2.0.atf) を有効にする必要があります。

アジャイル開発 2.0 クイックスタートテストスイート

テスト	説明	リリースバージョン
ストーリーの作成時にグローバルランクが追加されていることの確認	作成後にストーリーのグローバルランクを確認します。	Madrid
アクティブなストーリーでスプリントの終結が防止されていることの確認	アクティブなストーリーを含むスプリントを閉じることができないことを確認します。	Madrid
スプリントが同じグループ内で重ならないことの確認	同じグループ内のスプリントが重ならないことを確認します。	Madrid
スプリントポイントが更新されることの確認	ストーリーへの変更が正確なスプリントポイント合計を生成することを確認します。	Madrid
現在のステータスを保持できるのはグループ内の 1 スプリントのみであることの確認	スプリントのステータスを確認します。	Madrid

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 **2.0** クイックスタートテストスイート (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
スプリント終了日がスプリント開始日より後であることの確認	スプリントの開始日と終了日を確認します。	Madrid
ストーリーの更新がエピックにロールアップしていることの確認	ストーリーの追加、推定、削除、消去、更新、またはキャンセルによって、エピックレベルのロールアップが正しく更新されることを確認します。	Orlando
現在のスプリントのスコープを変更しても、コミットポイント合計の値が変わらないことの確認	スプリントのスコープの状態が [現在] に変更されても、[コミットポイント合計] の値が変わらないことを確認します。	Orlando
Agile ストーリーの状態が [完了]/[キャンセル] に変更されたときに、アクティブフラグが false に設定されることの確認	Agile ストーリーのアクティブフラグが次のように設定されることを確認します。 • ステータスが [完了] または [キャンセル] に変更された場合は false • その他すべての状況の場合は true	Orlando
チーム/グループキャパシティを更新すると、将来のすべてのスプリントのキャパシティが上書きされることを確認する	アサイン先グループの [グループキャパシティ] フィールドが更新されると、このアサイン先グループに関連付けられているさまざまなスプリントの [グループキャパシティ] フィールドに以下の変更があることを確認してください。 • ドラフトおよび計画ステータスのスプリントの場合: ○ グループキャパシティが新しい値に更新されます。 ○ [グループキャパシティ] フィールドは編集可能です。 • 現在、完了、またはキャンセル済みの各ステータスのスプリントの場合: ○ グループキャパシティは古い値のままです。 ○ [グループキャパシティ] フィールドは読み取り専用です。	Paris

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 **2.0** クイックスタートテストスイート (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
	[ドラフト] または [計画] ステータスのスプリントについては、後でいつでもスプリントのグループキャパシティを個別に編集できます。これにより、このスプリントに関連付けられているアサイン先グループのグループキャパシティが変更されることはありません。	
スクラムプログラムのバックログのエピックの作成および編集機能を確認する	• Agile ボードの [バックログ] タブでスクラムプログラムのバックログのエピックを作成できることを確認します。 • Agile ボードの [バックログ] タブから、スクラムプログラムの既存のバックログのエピックを更新できることを確認します。 • バックログにリストされているエピックは、選択したバックログのエピックに属している必要があります。	Quebec
デマンドがスクラムストーリーに変換されていることを確認する	PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) が有効である場合は、デマンドフォームの [ストーリーの作成] 関連リンクを使用して、デマンドを Agile 2.0 ストーリーに変換できることを確認してください。 Agile 2.0 ストーリーをデマンドから作成する方法の詳細については、「デマンドからアーティファクトを作成する」を参照してください。	Quebec
デマンドがスクラムエピックに変換されていることを確認する	PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) が有効である場合は、デマンドフォームの [エピックの作成] 関連リンクを使用して、デマンドを Agile 2.0 エピックに変換できることを確認してください。 Agile 2.0 エピックをデマンドから作成する方法の詳細については、「デマンドからアーティ	Quebec

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 **2.0** クイックスタートテストスイート (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
	ファクトを作成する」を参照してください。	

関連情報

クイックスタートテスト

アジャイル開発 **2.0** の使用

アジャイル開発 2.0 の機能を使用して、製品開発ライフサイクルを効率的に管理する方法について説明します。

アジャイル開発 **2.0** でのリリースの作成

アジャイル開発 2.0 でリリースを作成して、製品開発のストーリーやスクラムタスクをリリースに関連付けます。

始める前に
必要なロール：scrum_release_planner、scrum_admin

このタスクについて
リリースモジュールを使用してリリースレコードを作成し、今後のリリースに関する計画を立案を開始します。

リリースには開始日と終了日があり、その期間内でいくつかの開発反復が完了します。リリースはプロダクトオーナーによって作成され、複数の製品からのユーザーストーリーが含まれたり、複数のチームが関与したりすることもあります。リリースに関連付けられたストーリーにより、リリースバックログが形成されます。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > リリース.
2. レコードリストで [新規] を選択します。
   または、アジャイル開発 2.0 に製品レコードを既に作成している場合、[リリース] 関連リストを使用して新規のリリースフォームを開くことができます。
3. フォームのフィールドに入力します。

新規のリリースフォーム

フィールド	説明
番号	リリースに関する一意のシステム生成番号
状況	リリースの現在のステータス。デフォルトは [ドラフト] です。
コミットポイント合計	リリースに関連付けられたストーリーのすべてのストーリーポイント合計
リリースキャパシティ	リリースに関連付けられたすべてのアサイン先グループのグループキャパシティの合計。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	リリースのアサイン先グループのグループキャパシティは、次のように計算されます： グループキャパシティ * そのグループのリリース内のスプリント数 リリースキャパシティは、リリースレコード内の [グループ] 関連リストのグループにおいて、[開始スプリント] および [終了スプリント]フィールド が入力されている場合にのみ更新されます。
開始予定日	リリースの予定開始日
終了予定日	リリースの予定終了日
担当者	リリースにアサインされたユーザー リリースがアサインされるのは、リリース計画者やプロダクトオーナーなど、リリースの作成や編集の権限が付与されているロールを有するスクラムユーザーである必要があります。
簡単な説明	リリースの簡単な説明。
説明	リリースの詳細な説明
作業メモ	リリースで実行されている作業に関する更新情報。このフィールドは、リリースの作業進捗に応じてアサイン先ユーザーにより更新されます。

4. [送信] を選択します。

次のタスク

リリースの計画立案は、製品、ストーリー、アサイン先グループをリリースレコードに関連付けることから始まります。これらのアクションにおいては、リリースレコードで利用可能な関連リストを使用します。

リリースの関連リストについては、「アジャイル開発 2.0 におけるリリースの関連リスト」を参照してください。

アジャイル開発 **2.0** でのテーマの作成

目標が抽象的な場合、アジャイル開発 2.0 でテーマを作成して、さまざまな製品のストーリーをグループ化します。

始める前に

必要なロール：scrum_product_owner、scrum_release_planner、scrum_admin

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > テーマ.
2. **[New** (新規)] を選択します。
   または、以下を使用して新しいテーマフォームを開くこともできます。
   - アジャイルボードの [バックログ計画立案] または [スプリント計画立案] タブ
   - 製品レコードの [テーマ] 関連リスト
3. フォームのフィールドに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

新規テーマフォーム

フィールド	説明
番号	テーマに関する一意のシステム生成番号
名前	高レベルのビジネスケースを示すテーマの名前。
製品	このテーマが関連付けられている製品。 テーマは、一度に 1 つの製品にのみ関連付けることができます。
簡単な説明	テーマの簡単な説明
説明	テーマに関する詳細な説明

4. [送信] を選択します。

次のタスク
テーマレコードで利用可能な関連リストを使用して、エピックやストーリーをテーマに追加します。詳細については、「Agile Development 2.0 におけるテーマの関連リスト」を参照してください。

アジャイル開発 2.0 での製品の作成

顧客にとって重要な機能を体現する製品を作成します。製品には、ユーザーの視点からこうした機能拡張を記述するテーマ、エピック、およびストーリーを含めることができます。

始める前に
必要なロール：scrum_product_owner、scrum_release_planner、scrum_admin

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > 製品.
2. **[New** (新規)] を選択します。

   または、リリースレコードの [製品] 関連リストを使用して、新しい製品のフォームを開くこともできます。

3. フォームのフィールドに入力します。

製品フォーム

フィールド	説明
名前	製品の名前。
簡単な説明	製品の説明。機能を簡単に説明し、関連するテーマやグループについても言及
プロダクトオーナー	製品の開発やリリースの管理を担うユーザー

4. [送信] を選択します。

次のタスク
製品レコードの関連リストを使用して、リリース、テーマ、エピック、ストーリー、アサイン先グループをレコードに関連付けます。詳細については、「アジャイル開発 2.0 における製品の関連リスト」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 2.0 のアサイン先グループ

アジャイル開発 2.0 でアサイン先グループを作成したり管理したりする要件について説明します。

アサイン先グループを作成

https://player.vimeo.com/video/1070078725?h=f04196c519&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

admin ロールを持つユーザーは、[アジャイルチーム] タイプのアサイン先グループを作成することができます。スクラムチームはこれらのアジャイルグループで表され、ストーリーやエピックなどの作業アイテムにアサインするために使用できます。詳細については、「アジャイル開発 2.0 でのアサイン先グループの作成」を参照してください。

アサイン先グループにメンバーを追加

- 新規顧客：アジャイルグループが作成されたら、アドミニストレーターにグループへのメンバーの追加を要求できます。
- 既存の顧客：Yokohama リリースにアップグレードした場合、scrum_admin ロールまたは scrum_master ロールを持つユーザーは、アジャイルグループにメンバーを追加できます。

> **注:**
> *scrum.disallow_scrum_add_group_member* プロパティを作成して **true** に設定することで、この機能をアドミンのみに制限できます。プロパティの作成方法については、「システムのプロパティの追加」を参照してください。

グループにメンバーを追加する手順については、「アジャイル開発 2.0 でのアサイン先グループへのメンバーの追加」を参照してください。

アサイン先グループのキャパシティ

グループメンバーごとに、デフォルトのストーリーポイント数を定義できます。グループレベルでは、ストーリーポイントの合計によってグループのキャパシティが決まります。

アジャイル開発 2.0 でのアサイン先グループの作成

これらのグループを製品またはリリースにアサインできるように、アジャイルチームタイプのアサイン先グループを作成します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

https://player.vimeo.com/video/1070078725?h=f04196c519&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルグループの作成.
2. フォームで、フィールドに入力します。

アジャイルグループフォーム

フィールド	説明
名前	アサイン先グループの名前

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
説明	アサイン先グループの簡単な説明。グループが携わる製品やリリースを示すことができます。

3. [送信] を選択します。
   アサイン先グループが作成され、フォームが再度開いて、追加のフィールド、関連リンク、および関連リストが表示されます。
4. オプション: 追加のフィールドに入力します。

   グループフォーム

フィールド	説明
マネージャー	グループのマネージャー
グループキャパシティ (ポイント)	グループが各スプリントに収容できるポイント数
グループ メール	グループのメールアドレス。

タスクの結果
アジャイルアサイン先グループは、グループ [sys_user_group] テーブルに作成および保存されます。これらのグループの [タイプ] は [アジャイルチーム] に設定されます。

次のタスク
- アジャイル開発 2.0 でのアサイン先グループへのメンバーの追加。
- 関連リンクや関連リストを使用してスプリントを作成し、グループのスプリントアクティビティを計画します。詳細については、「アジャイル開発 2.0 におけるアサイン先グループの関連リンクと関連リスト」を参照してください。

リリースチームをグループに変換する (リリースチームを持つ既存の顧客のみ)

既存のリリースチームをアジャイルチームタイプのアサイン先グループに変換し、そのグループを製品またはリリースにアサインできるようにします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
アジャイル開発 2.0 ではリリースチームを使用しません。リリースチームを作成した既存のユーザーは、既存のチームをアサイン先グループに変換する必要があります。

手順
1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > グループ.
2. [リリースチームをグループに変換] 関連リンクをクリックします。
3. アサイン先グループに変換するチームを選択します。
4. [グループへ変換] をクリックします。

タスクの結果
- リリースチームは、次からアサイン先グループとして利用できます。 アジャイル開発 > グループ.
- リリースチームのメンバーがアサイン先グループにコピーされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 2.0 でのアサイン先グループへのメンバーの追加

スクラムストーリーやタスクに携わるチームメンバーを追加します。

始める前に
必要なロール：admin
アサイン先グループに追加するユーザーには、scrum_user ロールが必要です。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > グループ.
2. メンバーの追加先のグループを開きます。
3. [グループメンバー] 関連リストから、[編集] を選択します。
4. 必要なスクラムユーザーを追加します。

タスクの結果
選択したスクラムユーザーが、[グループメンバー] 関連リストに表示されます。

アジャイル開発 2.0 でエピックを作成

アジャイル開発 2.0 でエピックを作成して、開発する機能に関する大まかな要件を定義します。

始める前に
必要なロール：scrum_story_creator、scrum_admin

このタスクについて
アジャイル開発 2.0 でエピックを作成して、それを親と子の階層内で整理します。エピックは、 製品、 テーマ、または構成アイテム (影響を受けるアイテムまたはサービス) に関連付けることができます。

手順

1. 移動先 アジャイル開発 > エピック.
2. **[New** (新規)] を選択します。

   または、アジャイルボードを使用して、テーマレコードや製品レコードから新規のエピックフォームを開くこともできます。

   既存のアクティブなストーリーをエピックに変換することもできます。詳細については、「アジャイル開発 2.0 におけるストーリーの関連リンクと関連リスト」を参照してください。

3. フォームのフィールドに入力します。

エピックフォーム

フィールド	説明
番号	エピックのシステム生成番号。
製品	このエピックに関連付けられた製品。 エピックは、一度に 1 つの製品にのみ関連付けることができます。
優先度	エピックの優先度
状況	エピックのステータス。次のいずれかを選択します。 ドラフト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	詳細な説明などのエピック要件は、まだドラフト段階です。 準備完了 エピックは製品チームによるピックアップの準備ができています。プロダクトマネージャーとスクラムチームは、エピックをストーリーに分割できます。 対応中 開発チームはエピックのストーリーに取り組み、作業メモフィールドに変更を記録しています。 完了 エピックのすべてのストーリーと子エピックの開発とテストが完了しました。 キャンセル エピックがキャンセルされました。 このフィールドは自動的に [ドラフト] に設定されます。
簡単な説明	エピックの簡単な説明。
説明	エピックの詳細な説明。
作業メモ	エピックで行われた作業に関するメモ。
合計ストーリー数	エピックのストーリーの数。
完了数	エピック内の完了したストーリーの数。
数による完了率 (%)	エピック内で完了した作業のパーセンテージ。ストーリー数は、この値の計算に使用されます。
推定合計	エピック内のすべてのストーリーの推定合計値。
完了推定	エピック内のすべての完了したストーリーの推定合計値。
エピック別の完了率 (%)	エピック内で完了した作業のパーセンテージ。ストーリーの推定値は、この値の計算に使用されます。
推定値なし	推定値が欠落しているエピック内のストーリー数。
トッププログラム	プログラムがスクラム作業にマッピングされ、トップダウンのハイブリッド計画が有効になります。 このフィールドは、PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) が有効化されている場合に、エピックフォームのスクラムビューに表示されます。

エピックの福利厚生計画を作成する場合は、[計画] セクションに入力します。このセクションは、エピックフォームの [福利厚生] ビューで使用できます。

4. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- 子エピックまたはストーリーをエピックに追加します。
  - [子エピック] 関連リストから [新規] を選択して、このエピックに対する子エピックを作成します。
  - [ストーリー] 関連リストから [新規] を選択して、このエピックにストーリーを追加します。詳細については、「アジャイル開発 2.0 でのストーリー作成」を参照してください。

    エピックには 1 つ以上のストーリーを含めることができますが、ストーリーは一度に 1 つのエピックにのみ所属できます。
- [エピック] 関連リストから、 プロジェクトポートフォリオ管理 のプロジェクトにエピックを関連付けることもできます。

  この関連リストは、[実行タイプ] フィールドの値として [アジャイル **(Agile)]** が選択され、アジャイル開発 2.0 プラグインがインストールされている場合にのみ表示されます。

エピックの金銭的利益計画を作成する

エピックの利益計画は、エピックの実行時にエピックによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。金銭的利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。

始める前に

必要なロール：scrum_master、scrum_product_owner、または scrum_admin

このタスクについて

利益計画を保存すると、金銭的利益計画明細レコードが自動的に作成されます。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > エピック.
2. 必要なエピックを開きます。
3. 選択 表示 > 利益 [他のアクション] メニュー (≡) から
4. フォームの [計画] セクションの必須フィールドに入力します。
   このセクションは、[福利厚生] ビューが選択されている場合に利用できます。

エピックフォームの計画セクション

フィールド	説明
開始予定日	エピックの予測開始日。開始予定日は、現在の日付または将来の日付にすることができます。
終了予定日	エピックの予測終了日。終了予定日は開始予定日より後にする必要があります。
計画利益	利益ブレークダウンからロールアップされた利益値。
実開始日	エピックの実際の開始日。開始実績日時は、開始予定日以前にすることができます。
終了実績日時	エピックの実際の終了日。終了実績日時は、開始予定日より前にすることはできますが、開始実績日時より前にすることはできません。
実績利益	実績利益値は、利益ブレークダウンの実績利益からロールアップされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. レコードを保存します。
6. [金銭的な利益計画] 関連リストで、[新規] をクリックします。
7. フォームのフィールドに入力します。

[利益計画] フォーム

フィールド	説明
名前	利益計画の内容を表す名前。
作業	利益計画が属するエピック。
スポンサー	エピックのスポンサー。
カテゴリ	利益のタイプ： ○ ハード：収益の観点から測定できる利益。 ○ ソフト：価値の観点から測定される利益。
サブカテゴリ	ハードおよびソフトの利益のサブカテゴリ。 [カテゴリ] フィールドの選択により、このフィールドで利用可能な選択肢が決まります。
利益タイプ	利益のタイプ。[金銭的な利益] を選択します。
オフセットタイプ (Offset type)	利益がいつ実現し始めるかを示すフィールド。次のオプションのいずれかを選択します。 ○ なし：デフォルト値は [なし] です。[なし] を選択した場合は、利益計画の会計期間の開始および終了を手動で入力する必要があります。 ○ マイルストーン：マイルストーンの完了後。 ○ 開始日：エピックの開始時。 ○ 終了日：エピックの終了後。 選択したオフセットタイプの値が変更されると、それに応じて利益計画の開始日がシフトします。たとえば、オフセットタイプが [終了日] に設定されていて、エピックの終了日が変更された場合、利益計画の開始日はエピックの新しい終了日に合わせてシフトされます。
マイルストーン	利益計画が属するエピックマイルストーン。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [マイルストーン] を選択した場合に表示されます。
マイルストーンの開始日	選択したマイルストーンの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [マイルストーン] を選択した場合に表示されます。
作業開始日	エピックの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [開始日] を選択した場合に表示されます。
作業終了日	エピックの終了日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [終了日] を選択した場合に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
オフセット (OffSet)	利益計画の開始時点のオフセットタイプの前または後の期間の数。たとえば、オフセットタイプが [終了日] として選択され、オフセットが「-2」である場合、利益計画はエピック終了日の 2 期間前になります。エピックの終了日がシフトされると、利益計画の開始日が新しいエピック期日の 2 期間前にシフトされます。
期間	利益計画の長さ (期間)。
会計期間の開始	会計期間の開始。選択した [マイルストーン]、[作業開始日]、または [作業終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] の値に基づいて設定されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。 会計期間の開始を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
会計期間の終了	会計期間の終了。選択した [マイルストーン]、[作業開始日]、または [作業終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] の値に基づいて設定されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。 会計期間の終了を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
関連利益	この金銭的利益計画に関連付けられている金銭以外の利益。

利益計画フォーム - 財務の詳細

フィールド	説明
入力通貨での利益	入力通貨で表される、指定のエピックから発生する利益。
入力通貨 (Entered currency)	利益計画の作成に使用する通貨。
機能通貨	**glide.system.locale** プロパティ から取得される通貨。
合計計画利益	エピックの潜在的利益の推定額。
機能通貨での利益	機能通貨で表される、エピックから発生する利益。[入力通貨] が機能通貨と異なる場合、このフィールドの値が変わります。
実績利益	エピックから発生する実績利益。この値は、すべての利益計画ブレークダウンの [実績利益] フィールドからロールアップされます。
繰り返し	利益計画のすべての会計期間で利益が繰り返し発生することを示すオプション。

8. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
[利益計画] フォームの [金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdowns)] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。

エピックの金銭的利益計画ブレークダウンの更新

特定の会計期間の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定する、金銭的利益計画ブレークダウンレコードを更新します。

始める前に
必要なロール：scrum_master、scrum_product_owner、または scrum_admin

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > エピック.
2. 必要なエピックを開きます。
3. 選択 表示 > 利益 [他のアクション] メニュー ( ) から
4. [金銭的な利益計画] 関連リストをクリックします。
5. 必要な金銭的利益計画を開きます。
6. [金銭的利益計画明細 (Monetary Benefit Plan Breakdowns)] 関連リストで、金銭的利益計画明細の情報アイコン ( ) をクリックします。
7. [レコードを開く] をクリックします。
8. 金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdown) フォームで、有効なフィールドを表示して更新します。
9. [更新] をクリックします。

エピックの金銭以外の利益計画の作成

エピックの利益計画は、エピックの実行時にエピックによって発生する潜在的な非予定利益をキャプチャします。金銭以外の利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。

始める前に
必要なロール：scrum_master、scrum_product_owner、または scrum_admin

このタスクについて
[ブレークダウンタイプ] フィールドで [自動] または [手動] を選択して利益計画を保存すると、金銭以外の利益計画ブレークダウンレコードが自動的に作成されます。金銭以外の利益計画ブレークダウンレコードは、特定の会計期間 (FY16 の 4 月および FY16 の 5 月など) の財務以外の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定します。[金銭以外の利益計画ブレークダウン] 関連リストには、エピックの各会計期間における推定非予定利益と実績非予定利益の集計利益が表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > エピック.
2. 必要なエピックを開きます。
3. 選択 表示 > 利益 [他のアクション] メニュー ( ) から
4. フォームの [計画] セクションの必須フィールドに入力します。
   このセクションは、[福利厚生] ビューが選択されている場合に利用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エピックフォームの計画セクション

フィールド	説明
開始予定日	エピックの予測開始日。開始予定日は、現在の日付または将来の日付にすることができます。
終了予定日	エピックの予測終了日。終了予定日は開始予定日より後にする必要があります。
計画利益	利益ブレークダウンからロールアップされた利益値。
実開始日	エピックの実際の開始日。開始実績日時は、開始予定日以前にすることができます。
終了実績日時	エピックの実際の終了日。終了実績日時は、開始予定日より前にすることはできますが、開始実績日時より前にすることはできません。
実績利益	実績利益値は、利益ブレークダウンの実績利益からロールアップされます。

5. レコードを保存します。
6. [金銭以外の利益計画] 関連リストをクリックします。
7. 金銭以外の利益計画を作成するには、[新規] をクリックします。
8. フォームのフィールドに入力します。

[利益計画] フォーム

フィールド	説明
名前	利益計画の内容を表す名前。
作業	利益計画が属するエピック。
スポンサー	エピックのスポンサー。
カテゴリ	利益のタイプ： ○ ハード：収益の観点から測定できる利益。 ○ ソフト：価値の観点から測定される利益。
サブカテゴリ	ハードおよびソフトの利益のサブカテゴリ。 [カテゴリ] フィールドの値により、このフィールドで利用可能な選択肢が決まります。
福利厚生タイプ	利益のタイプ。[金銭以外の利益] を選択します。
オフセットタイプ	利益がいつ実現し始めるかを示すフィールド。次のオプションのいずれかを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
(Offset type)	○ なし：デフォルト値は [なし] です。[なし] を選択した場合は、利益計画の会計期間の開始および終了を手動で入力する必要があります。 ○ マイルストーン：マイルストーンの完了後。 ○ 開始日：エピックの開始時。 ○ 終了日：エピックの終了後。 [オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドの値が変更されると、それに応じて利益計画の開始日がシフトします。たとえば、[オフセットタイプ] フィールドが [終了日] に設定されていて、エピックの終了日が変更された場合、利益計画の開始日はエピックの新しい終了日に合わせてシフトされます。
マイルストーン	利益計画が属するエピックマイルストーン。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [マイルストーン] を選択した場合にのみ表示されます。
マイルストーンの開始日	選択したマイルストーンの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [マイルストーン] を選択した場合にのみ表示されます。
作業開始日	エピックの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [開始日] を選択した場合にのみ表示されます。
作業終了日	エピックの終了日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [終了日] を選択した場合にのみ表示されます。
オフセット (OffSet)	利益計画の開始時点のオフセットタイプの前または後の期間の数。たとえば、オフセットタイプが [終了日] として選択され、オフセットが「-2」である場合、利益計画はエピック終了日の 2 期間前になります。エピックの終了日が変更されると、利益計画の開始日が新しいエピック期日の 2 期間前にシフトされます。
期間	利益計画の長さ (期間)。
会計期間の開始	会計期間の開始。このフィールドは、選択した [マイルストーン]、[作業開始日]、または [作業終了日] に対する [オフセット] フィールド値、および [期間] の値に基づいて入力されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。 会計期間の開始を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
会計期間の終了	会計期間の終了。このフィールドは、選択した [マイルストーン]、[プロジェクト/デマンドの開始日]、または [プロジェクト/デマンドの終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] の値に基づいて入力されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。 会計期間の終了を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
関連利益	この金銭以外の利益計画に関連付けられている金銭的利益。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

福利厚生フォームの金銭以外の [詳細] セクション

フィールド	説明
測定	金銭以外の利益計画の測定のタイプ。測定タイプは、カウント、パーセンテージ、時間、日、スコアです。 定量化できない利益を追跡するには、[はい/いいえ] オプションを選択します。このオプションを選択した場合、利用できるフィールドは [利益の達成] のみです。チェックボックスをオンにして、利益が達成されたことを示すことができます。
金銭以外の入力通貨での利益	潜在的利益の推定値。 利益計画の計画利益に変更があると、将来の会計期間についてのみ、関連する利益ブレークダウン値が更新されます。
金銭以外の計画利益	利益ブレークダウンからロールアップされた利益値。
利益の達成	利益が達成されたかどうかを示すオプション。
ブレークダウンタイプ	利益計画を保存するときのブレークダウン作成のタイプ。 ○ なし：明細は作成されません。 ○ 自動：金銭以外の利益計画明細レコードがデータとともに自動的に作成されます。明細は線形的に計算されます。 ○ 手動：金銭以外の利益計画明細レコードが自動的に作成されますが、[入力通貨での利益] 列にはデータがありません。
アグリゲーションモード	ブレークダウンから利益計画へのロールアップをどのように行うかを決定し、[金銭以外の計画利益] および [金銭以外の実績利益] フィールドの値を更新します。 ○ 合計：すべてのブレークダウンのデータを集計します。 ○ 平均：すべてのブレークダウンの平均値。 ○ 最新：最新のブレークダウン値。 ○ 最大：ブレークダウンの最大値。 ○ 最小：ブレークダウンの最小値。
金銭以外の実績利益	金銭以外の利益計画明細の実績利益からロールアップされる実績利益値。

9. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- 利益計画フォームの [金銭以外の利益計画ブレークダウン] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。
- 金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連付け、ハイブリッド利益計画のエピックによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。

エピックの非金銭的利益計画ブレークダウンの更新

特定の会計期間の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定する、金銭以外の利益計画ブレークダウンレコードを更新します。

始める前に
必要なロール：scrum_master、scrum_product_owner、または scrum_admin

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > エピック.
2. 必要なエピックを開きます。
3. 選択 表示 > 利益 [他のアクション] メニュー ( ) から
4. [金銭以外の利益計画] 関連リストをクリックします。
5. 必要な金銭以外の利益計画を開きます。
6. [金銭以外の利益計画明細] 関連リストで、金銭以外の利益計画明細の情報アイコン ( ) をクリックします。
7. [レコードを開く] をクリックします。
8. 金銭以外の利益計画ブレークダウンフォームで、有効なフィールドを表示して更新します。
9. [更新] をクリックします。

金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連付け

金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を関連付けて、ハイブリッド利益計画のエピックによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。

始める前に
必要なロール：scrum_master、scrum_product_owner、または scrum_admin

このタスクについて
金銭的利益計画を金銭以外の利益計画に関連付けることも、その逆も可能です。

> **注:**
> 利益計画を削除すると、関連する利益計画とのいかなる関係も削除されます。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > エピック.
2. 必要なエピックを開きます。
3. 選択 表示 > 利益 [他のアクション] メニュー ( ) から
4. [金銭的な利益計画] または [金銭以外の利益計画] 関連リストをクリックします。
5. 関連付ける利益計画の情報アイコン ( ) をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. [レコードを開く] をクリックします。
7. 金銭的利益計画または金銭以外の利益計画を関連付けます。
8. [保存] をクリックします。

タスクの結果
選択した利益計画は別の計画に関連付けられます。

次のタスク
[関連する利益計画を表示] 関連リンクをクリックして、関連付けられている利益計画を表示します。

エピックの人件費の生成

エピックのリソースのアサインに基づく人件費を表示します。

始める前に

- エピックにリソースのアサインが含まれている必要があります。
- 必要なロール：sn_spm_financial_user

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > エピック.
2. 必要なエピックを選択します。
3. [人件費の生成] 関連リンクを選択します。
   ページを更新して、[コスト計画] 関連リストに生成された人件費を表示します。

アジャイル開発 2.0 でのストーリー作成

アジャイル開発 2.0 で高レベルの要件定義をストーリーの形式で作成します。ストーリーを製品、プロジェクト、リリースに関連付け、アサイン先グループにアサインして、ストーリーを管理したり追跡したりします。

始める前に
必要なロール：scrum_story_creator、scrum_admin

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > ストーリー.
2. **[New** (新規)] を選択します。
   または、次のいずれかからストーリーを作成することもできます。
   - アジャイルボードの [バックログ計画立案] または [スプリント計画立案] タブ
   - 製品、リリース、スプリント、テーマ、エピックの [ストーリー] 関連リスト
   - 欠陥レコードまたは拡張レコード
3. フォームのフィールドに入力します。

   注:
   ストーリーの作成に使用したオプションによっては、ストーリーフォームの一部のフィールドが入力済みで表示される場合があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ストーリーフォーム

フィールド	説明
番号	ストーリーのシステム生成番号。
テーマ	ストーリーに関連付けられたテーマ。 テーマには 1 つ以上のストーリーを含めることができますが、ストーリーは一度に 1 つのテーマにのみ所属できます。 [製品] フィールドに関連付けられているテーマのリストから、このストーリーのテーマを選択します。
Epic	ストーリーに関連付けられたエピック。 エピックには 1 つ以上のストーリーを含めることができますが、ストーリーは一度に 1 つのエピックにのみ所属できます。 [製品] フィールドに関連付けられているエピックから、このストーリーのエピックを選択します。
タイプ	ストーリーのタイプ。 開発、ドキュメント、スパイクなどのオプションから選択します。
分類	ストーリーが関与する開発のタイプ。このフィールドは自動的に [機能] に設定されます。 このフィールドは、[関連レコード] タブの [欠陥] フィールドおよび [拡張] フィールドとは関連しません。
状況	ストーリーのステータス。次のいずれかを選択します。 ○ ドラフト：説明や受け入れ条件などのストーリー要件は、依然としてドラフト段階です。 ○ 準備完了：ストーリーは開発チームによるピックアップの準備が整っています。 ○ 対応中：開発チームはストーリーに取り組み中で、変更内容を [作業メモ] フィールドに記録しています。 ○ テストの準備完了：ストーリーはテスターによるピックアップの準備が整っています。 ○ テスト中：テスターが、ストーリーで指定された要件に基づいてストーリーをテストしています。 ○ 完了：ストーリーの開発とテストが完了しました。 ○ キャンセル：ストーリーはキャンセルされました。 このフィールドは自動的に [ドラフト] に設定されます。
ポイント	ストーリーを完了するために必要な工数概算を示すポイント数。 このポイント値が大きいほど、ストーリーに多くの工数が必要であることを示します。
優先度	ストーリーに割り当てられた優先度。 製品オーナーは、優先度を使用して計画ボードでストーリーをランク付けできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
製品	このストーリーが関連付けられている製品。
リリース	このストーリーが関連付けられているリリース。 このリリースは、選択した製品に関連付けられたリリースから取得できます。
アサイン先グループ	ストーリーが属するアジャイルチーム。
スプリント	このストーリーが関連付けられているスプリント。 このフィールドは、[アサイン先グループ] フィールドから値が選択されている場合にのみ使用できます。
担当者	ストーリーで作業しているユーザー。このリストのユーザーには、適切なスクラムロールがあります。
デマンド	このストーリーが関連付けられているデマンド。 デマンドがプロジェクトに変換されると、デマンドのストーリーはデマンドからプロジェクトに移動します。 デマンドがストーリーに変換されると、デマンドの参照がここに表示されます。
プロジェクト	このストーリーが関連付けられているプロジェクト。
プロジェクトフェーズ	このストーリーが関連付けられているアジャイルプロジェクトフェーズの名前。このフィールドは、[プロジェクト] フィールドから値が選択されている場合にのみ使用できます。 プロジェクトに 1 つのフェーズしかない場合には、ストーリーは自動的に該当フェーズにタグ付けされます。 **注:** アジャイルフェーズには、複数のグループに属するストーリーを含めることができます。
ブロック済み	ストーリーの進行を妨げる問題があることを示すインジケーター
簡単な説明	ストーリーの簡単な説明。
説明	ストーリーの詳細な説明。
受け入れ条件	このストーリーを [完了] ステータスに移行するために必要な機能の条件またはテスト結果。
作業メモ	このストーリーに対して行われた作業に関するメモ。

ストーリーフォームの [関連レコード] セクション

フィールド	説明
欠陥	ストーリーに関連付けられた欠陥。このフィールドは、欠陥の [rm_defect] テーブルからの参照フィールドです。ストーリーが欠陥に対し

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	て作成された場合、このフィールドは必須です。 このフィールドの検索アイコン ( ) をクリックして、既存の欠陥を表示するか、新しい欠陥を開きます。 feature_user ユーザーロールを持つユーザーのみが欠陥を開くことができます。アドミニストレーターは、Agile Development アプリケーションで欠陥を開くことが想定されるすべてのユーザーに feature_user ロールを付与する必要があります。このフィールドは、Agile Development アプリケーションにおいて、欠陥の [rm_defect] テーブルのレコードが表示される唯一の場所です。 欠陥の詳細については、「アジャイル開発 2.0 での欠陥のレポート」を参照してください。
拡張	ストーリーに関連付けられた拡張。このフィールドは、拡張の [rm_enhancement] テーブルからの参照フィールドです。拡張に対してストーリーが作成されている場合、このフィールドは必須です。 このフィールドの検索アイコン ( ) をクリックして、既存の拡張要求を表示するか、新しい拡張要求を開きます。 feature_user ロールを持つユーザーのみが欠陥を開くことができます。アドミニストレーターは、Agile Development アプリケーションで拡張要求を開くことが想定されるすべてのユーザーに feature_user ロールを付与する必要があります。このフィールドは、Agile Development アプリケーションにおいて、拡張の [rm_enhancement] テーブルのレコードが表示される唯一の場所です。 拡張の詳細については、「Agile Development 2.0 の拡張要求」を参照してください。

4. [送信] を選択します。

タスクの結果

- ストーリーが作成され、関連リンクおよびリストとともにフォームが再度開きます。
- ストーリーは、ストーリーフォームに入力されたフィールドに応じて、バックログに一覧表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- ストーリーの関連リンクや関連リストを使用して、ストーリーのスクラムタスクを作成したり、ストーリーをエピックに変換したり、ストーリーを 2 つのストーリーに分割したりします。詳細については、「アジャイル開発 2.0 におけるストーリーの関連リンクと関連リスト」を参照してください。
- アジャイル開発 2.0 ストーリーに関する依存関係の追加
- ストーリーの追加アクション (☰) の [挿入] または [挿入と維持] オプションを使用して、このストーリーと同じ詳細を含むストーリーを作成できます。

  [挿入と維持] を使用すると、新しく作成したストーリーのフォームは開いたままになります。ストーリーの詳細を変更したり、こうした詳細を含むストーリーをさらに作成したりできます。アジャイルボードでは、新しいストーリーは元のストーリーのすぐ下に示されます。それに応じて、新しいストーリーのグローバルランクが設定されます。

  注:
  こうしたアクションにアクセスするには、 *glide.ui.task.insert* プロパティおよび *glide.ui.advance* プロパティを **true** に設定します。これらのアクションは、トリアージボードから追加されたストーリーでは許可されません。

アジャイル開発 2.0 ストーリーに関する依存関係の追加

アジャイル開発 2.0 において、ストーリーの前提条件アイテムと依存関係アイテムを追加して、スクラム計画ボードで依存関係を視覚化し、スプリントを適切に計画できるようにします。

始める前に
必要なロール：scrum_story_creator、scrum_story_editor

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > ストーリー.
2. 依存関係を追加するストーリーを開きます。
   または、アジャイルボードからスクラムプログラムボードを使用して、ストーリーを開いたり、依存関係を追加したりすることもできます。
3. [前提条件ストーリー] 関連リストや [依存ストーリー] 関連リストを使用して、依存関係をストーリーに追加します。
   - [前提条件ストーリー] は、現在のストーリーの前に完了する必要があるすべてのストーリーのリストです。
   - [依存ストーリー] は、現在のストーリーの完了に依存するすべてのストーリーのリストです。
4. [保存] を選択し、[更新] を選択します。

次のタスク
スクラムプログラムボードを使用すると、ストーリーの依存関係を視覚的に分析できるようになり、スプリント計画立案にも役立ちます。

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード > プログラム > 計画
2. 依存関係アイコン (⇄) を使用して、ストーリー間の依存関係を表示したり非表示にしたりします。

注:
スクラムプログラムボードへのアクセスは、スクラムプログラムプラグイン (com.snc.sdlc.scrum_program) でのみ可能です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 2.0 ストーリーに対するスクラムタスクの作成

アジャイル開発 2.0 でスクラムタスクを作成し、チームが作業しやすくなるようにストーリーを管理しやすいサイズに細分化します。一度に 1 つのスクラムタスクを作成することも、一度に複数のスクラムタスクを作成することもできます。

始める前に

必要なロール：scrum_story_creator、scrum_admin

このタスクについて

チームメンバーは、自分のスキルに基づいてタスクを自発的に行い、残り時間を毎日追跡します。タスクが予定時間内に完了しない場合、タスクをさらに分割することができます。すべてのタスクが完了してはじめてストーリーが完了となります。

このタスクでは、一度に 1 つのスクラムタスクを作成する方法を説明しています。しかし、時間を節約するために、一度に複数のスクラムタスクを作成することもできます。「アジャイル開発 2.0 でのストーリーに対する複数のスクラムタスクの作成」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > ストーリー
2. タスクを作成する対象のストーリーを開きます。
3. [スクラムタスク] 関連リストから [新規] を選択します。
   または、アジャイルボードにある [スプリント追跡] タブのタスクボードビューを使用して、スクラムタスクを作成することもできます。
4. フォームの各フィールドに入力します。

スクラムタスクフォーム

フィールド	説明
番号	ストーリーのシステム生成番号。
ストーリー	スクラムタスクに関連付けられたストーリーを表示します。
優先度	タスクの優先度。
計画時間数	タスクを完了するための推定時間数。 一般的なスクラムタスクには、4 時間から 12 時間かかります。タスクに 12 時間以上かかる場合は、複数のタスクに分割することを検討してください。
残り時間	スクラムタスク完了までの推定残り時間数。アサイン先グループのメンバーは、タスクの作業の進行中にこの値を更新します。
実績時間	タスクが完了したら、タスクに実際にかかった時間数を入力します。
タイプ	関連する作業のタイプ。
状況	スクラムタスクの現在のステータス。新しいタスクのデフォルトは [ドラフト] です。
アサイン先グループ	このタスクに携わるグループ。 このフィールドは、タスクの作成元であるストーリーのアサイン先グループから自動的に入力されます。
担当者	スクラムタスクを実行しているユーザー。このフィールドは、デフォルトでストーリーオーナーに設定されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ブロック済み	スクラムタスクの進行を妨げる問題があることを示すインジケーター
簡単な説明	スクラムタスクの簡単な説明。
説明	スクラムタスクの詳細な概要
作業メモ	スクラムタスクの進捗状況またはそれを妨げている問題を示すメモ。

5. **[Submit** (送信)] を選択します。

> **重要:**
> スクラムタスクがストーリーの下に作成されると、ストーリーの日付フィールドは読み取り専用になります。

アジャイル開発 **2.0** でのストーリーに対する複数のスクラムタスクの作成

アジャイル開発 2.0 ストーリーにおいて、さまざまなタイプのスクラムタスクのバッチを作成し、時間を節約します。

始める前に
必要なロール：scrum_story_creator、scrum_admin

このタスクについて
スクラムタスクが必要なストーリーを選択し、これらすべてのタスクをまとめて作成します。テストや分析などのさまざまなタイプのタスクを作成できます。これらのタスクはすべて、簡単な説明 **ToDo...** で作成されます。後でタスクレコードを開いて、タスクの詳細情報を入力します。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > ストーリー
2. ストーリー番号を右クリックし、[スクラムタスクを追加] を選択します。
3. 各タスクタイプで作成するスクラムタスクの数をフォームに入力します。
   - 分析
   - コーディング
   - ドキュメント
   - テスト中
4. **[OK]** を選択します。

タスクの結果
選択したタイプのタスクのバッチが、 **To Do** の簡単な説明とともに作成され、ストーリーレコードの [スクラムタスク] 関連リストに一覧表示されます。

次のタスク
各スクラムタスクレコードを開き、説明や優先度などの詳細情報を入力します。スクラムタスクフォームのフィールド情報については、「スクラムタスクフォーム」を参照してください。

アジャイル開発 **2.0** でのカスタマイズされたバックログの作成

アジャイル開発 2.0 において、フィルターを作成して、バックログに表示するストーリーを定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：scrum_product_owner


このタスクについて
バックログは、特定の製品、エピック、リリースなどに関連するストーリーの優先順位付けされたリストです。バックログの定義には柔軟性があり、製品オーナーにより設定されます。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > 個人のバックログ.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームで、フィールドに入力します。

バックログ定義フォーム

名前	バックログの名前。
テーブル	バックログのレコードの取得元テーブル。 このフィールドのデフォルト値は [ストーリー **[rm_story]] (Story [rm_story])**です。
表示対象	バックログを共有するユーザー。[非表示解除 (Unlock Visible)] アイコン ( ) を使用して、ユーザーを追加します。
グループに表示	バックログを共有するユーザーグループ。[非表示解除 (Unlock Visible)] アイコン ( ) を使用して、グループを追加します。
フィルター	バックログのストーリーに適用されるフィルター基準。 デフォルトのフィルター基準は、[アクティブ **= true]** および [スプリント空] です。

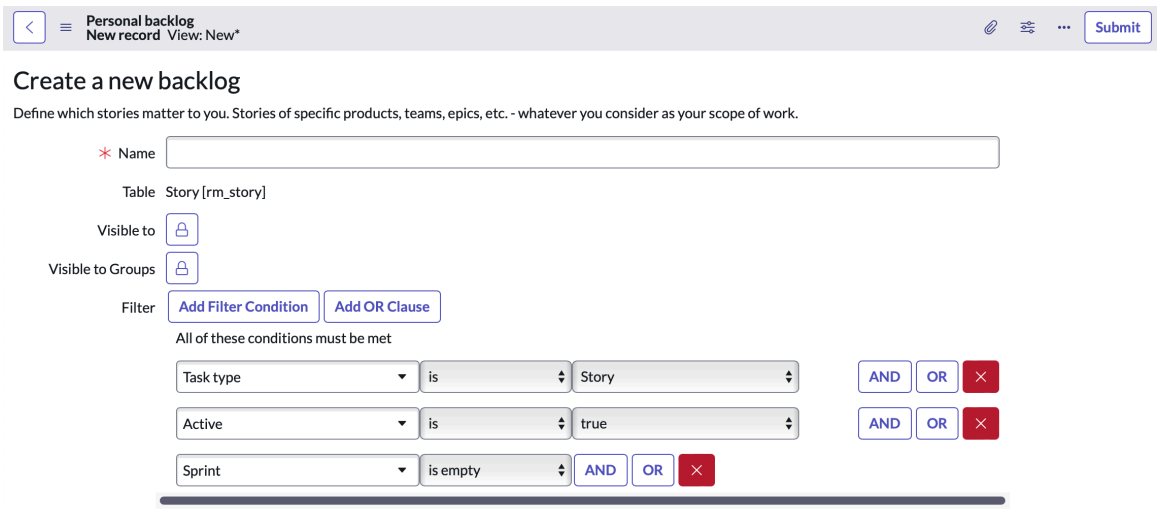

4. **[Submit** (送信)] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
さまざまな優先度に一致する個人のバックログはいくつでも作成できます。に移動すると、すべての個人のバックログにアクセスできます アジャイル開発 > 個人のバックログ また、アジャイルボードの [バックログ] タブにも表示されます。

アジャイル開発 2.0 での製品バックログの管理

アジャイル開発 2.0 において、一元化されたアジャイルボードで製品バックログを管理します。カスタマイズされたバックログにストーリーを追加し、必要に応じて優先順位を付けます。

始める前に
必要なロール：scrum_product_owner

このタスクについて
バックログのストーリーに優先順位を付けます。ストーリーの追加、リリースまたは製品へのストーリーの割り当て、トリアージされたレコードの追加などを行うことができます。

- ステップ 1 および 2 により、スクラムバックログを管理できます。
- ステップ 3 ～ 12 では、バックログで実行できるさまざまなアクションに関するガイダンスを提供しています。要件に基づいてアクションを選択します。
- トリアージボードに関連するすべてのアクションへのアクセスは、アジャイル開発 — 統合バックログ プラグイン (com.snc.sdlc.agile.multi_task) が有効化されている場合のみ可能です。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード > バックログ.

   カスタマイズされたバックログを既に作成している場合は、このタブに自動的に表示されます。カスタマイズされたバックログを作成していない場合は、バックログを作成するためのリンクを示す、ようこそページが表示されます。

2. 左上隅のリストから必要なバックログを選択するか、[バックログの作成] アイコン ( ) を使用してバックログを作成します。

3. [バックログの編集] アイコン (アイコン) を使用して、選択したバックログの既存のフィルター基準を更新します。

4. カスタマイズアイコン ( ) を選択して、リストの列をカスタマイズします。

5. バックログにストーリーを追加します。

   a. [ストーリーの作成] をクリックします。

   b. ストーリーフォームで必要な詳細を指定します。

   c. [送信] をクリックします。
   ストーリーが、最後のページのバックログの一番下にリストされます。

   バックログの特定の位置にストーリーを追加する場合は、該当する位置のすぐ上にあるストーリーを選択し、[ストーリーの作成] をクリックします。新しいストーリーが、選択したストーリーの下に表示されます。

6. バックログからストーリーを更新します。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 更新するストーリーのストーリー番号をクリックします。

b. ストーリーの詳細を編集し、[更新] をクリックします。
読み取り専用アクセス権がある場合は、ストーリーフォームを開くことはできますが、ストーリーの詳細を編集することはできません。

7. エピックまたはテーマを [バックログ] タブから直接作成します。

a. [ストーリーを作成] オプションの横にあるオプションアイコン ( ) を選択します。



b. リストから [エピックの作成] または [テーマの作成] を選択します。

c. フォームのフィールドに入力して、送信します。

新しいエピックは、ストーリーが選択したバックログのフィルターの条件を満たしている場合にのみ、エピックフィルターでリストに含まれます。

8. 次のいずれかのオプションを使用して、バックログページ内にストーリーを配置します。
   - マウスデバイスを使用してストーリーを選択して保持し、必要な位置にドラッグアンドドロップします。
   - キーボードを使用します。詳細については、「キーボードによるアジャイルボードでの アジャイル開発 2.0 ストーリーの配置」を参照してください。

バックログのストーリーを並べ替えると、ストーリーの [rm_story] テーブルの global_rank 列でストーリーのランキングが調整されます。バックログ内でストーリーを移動すると、同じバックログ内で相対的にそのストーリーのランクが変更されます。したがって、バックログリストの先頭のストーリーはランク値が小さく優先度が高くなり、バックログリストの末尾のストーリーはランク値が大きく優先度が低くなることが想定されます。

9. 必要なストーリーを選択し、オプションアイコン ( ) をクリックして、単一のストーリーまたは一連のストーリーに対して次のいずれかのアクションを実行します。

10. [トリアージボード] オプションを使用して、トリアージボードのレコードを表示および編集します。
[トリアージボード] オプションを使用して、次のアクションを実行できます。
    - すべてのタスクタイプのトリアージボードの合計レコード数 (問題や欠陥など) を表示および編集します
    - 特定のタスクタイプのリストを開きます
    - 既存のトリアージフィルターの定義を編集します
11. 欠陥などのトリアージ済みレコードをバックログの最後に追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [トリアージボード] をクリックします。

b. トリアージフィルター定義を選択します。
たとえば、すべての欠陥の定義などです。

c. バックログに追加するレコードを選択します。

d. [バックログに追加] をクリックします。

12. トリアージしたレコードをバックログからトリアージボードに戻します。

a. 番号をクリックして、トリアージされたレコードを開きます。

b. [トリアージボードに戻る] 関連リンクをクリックします。
バックログ内のトリアージされたレコードへのアクセスを提供する特定のロールが必要です。たとえば、バックログの問題を表示するには、itil ロールが必要です。どのレコードにもアクセスできない場合は、エラーメッセージが表示されます。

関連情報

アジャイル開発 2.0 のアジャイルボード

アジャイル開発 2.0 でのカスタマイズされたバックログの作成

キーボードによるアジャイルボードでの アジャイル開発 2.0 ストーリーの配置

キーボードを使用して、アジャイルボードの [バックログ] タブおよび [スプリント計画立案] タブにある アジャイル開発 2.0 ストーリーを移動したり再配置したりする方法について説明します。

始める前に

必要なロール：scrum_admin、scrum_master、scrum_product_owner、または scrum_sprint_planner

手順

1. 1 つのストーリーの並べ替え：

a. Tab キーを押して、目的のストーリーをハイライト表示します。

b. もう一度 Tab キーを押して、ストーリーのコンテキストメニュー ( ) アイコンをハイライト表示します。

c. Enter キーを押してストーリーを選択します。

d. 上下の矢印キーを使用して、ストーリーを目的の位置に移動します。

e. Enter キーを押してストーリーの位置を固定します。

2. 複数のストーリーの並べ替え：

a. Tab キーを押して、目的のストーリーをハイライト表示します。

b. Enter キーを押してストーリーを選択します。

c. 上向き矢印キーと下向き矢印キー、および Shift キーまたは Control キーを使用して、複数のストーリーを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


- 連続するストーリーを選択するには、下矢印キーを使用して最後に選択するストーリーをハイライト表示し、Shift キーと Enter キーを押します。
- ページ上のさまざまな位置にあるストーリーを選択するには、下矢印キーで次に選択するストーリーに移動します。移動したら、Control キーと Enter キーを押します。

  このステップを繰り返して、他のストーリーを選択します。

d. もう一度 Tab キーを押して、ストーリーのコンテキストメニュー ( ) アイコンをハイライト表示します。

e. Enter キーを押して、選択したすべてのストーリーをグループ化します。

選択した複数のストーリーがグループ化されて表示されます。

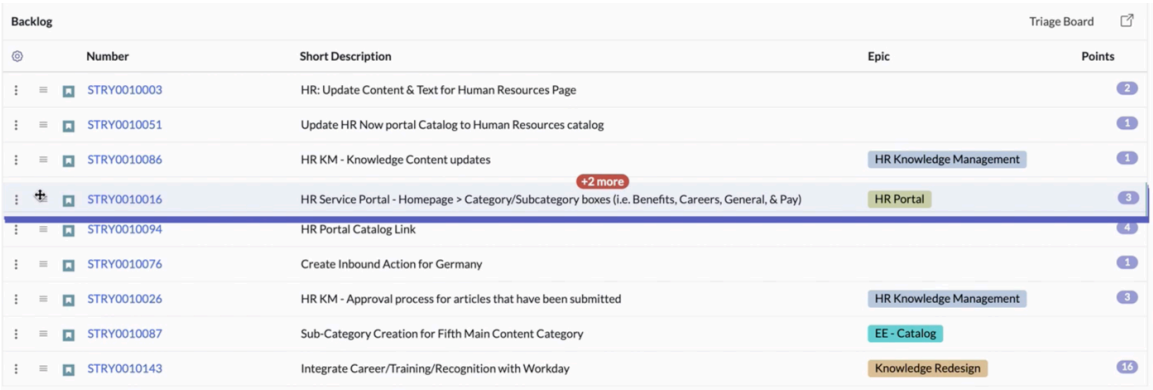

f. 上下の矢印キーを使用して、ストーリーを目的の位置に移動します。

g. Enter キーを押してストーリーの位置を固定します。

アジャイル開発 2.0 でのスプリントアクティビティの計画

アジャイルボードの [スプリント計画立案] タブを使用して、スプリントの作成、編集、完了、スプリントへのストーリーの追加などのスプリントアクティビティを簡素化します。

始める前に

- [スプリント計画立案] タブにアクセスするには、アジャイルグループのメンバーであることが必要です。
- 割り当てられたロールに基づき、[スプリント計画立案] タブで一連のアクションのみを実行することができます。詳細については、「アジャイル開発 2.0 とともにインストールされるコンポーネント」のロールを参照してください。
- 必要なロール：scrum_admin、scrum_master、または scrum_sprint_planner

このタスクについて

- ステップ 1 ～ 3 では、スプリントアクティビティを計画します。
- ステップ 4 ～ 11 では、スプリントを計画するためのさまざまなアクションを実行します。要件に合ったものを選択してください。

アジャイルボードの詳細については、「アジャイル開発 2.0 のアジャイルボード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード.
2. [スプリント計画立案] タブを選択します。
3. [グループ **(Group)]** フィールドから、スプリントアクティビティを計画するアサイン先グループを選択します。

   リストには、グループメンバーとして追加されたすべてのチームが表示されます。デフォルトのアサイン先グループは、以前に選択したチーム、または自身がグループメンバーとして追加された最初のチームになります。

4. スプリントを作成します。
   a. [スプリントの作成] を選択します。
   b. フォームのフィールドに入力または更新します。
   c. [送信] を選択します。
   または、アサイン先グループのスプリントを一括作成し、計画のタブに戻ってスプリントの計画を続行することもできます。「アジャイル開発 2.0 でのスプリントの一括作成」を参照してください。
5. スプリントを編集します。
   a. 名前を選択してスプリントフォームを開きます。
   b. スプリントフォームで、詳細情報を更新します。
   スプリントが始まる前であれば、チーム構成、休日、休暇の変更を考慮して、[グループキャパシティ] フィールドでアサイン先グループのキャパシティを更新することもできます。
   c. [更新] を選択します。
6. 新規ストーリーをバックログに追加します。
   a. [ストーリーを作成] を選択します。
   b. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「アジャイル開発 2.0 でのストーリー作成」を参照してください。
   c. [送信] を選択します。

      ストーリーはバックログの一番下に表示されます。ストーリーの詳細情報を編集するには、その番号を選択します。読み取り専用アクセス権がある場合は、ストーリーフォームを表示することはできますが、ストーリーの詳細を編集することはできません。
7. ストーリーをバックログやスプリントに追加し、同時に実装順序を決定します。
   a. バックログやスプリントから、新規ストーリーを追加するストーリーの行を選択します。
   b. ステップ 6a ～ 6c を繰り返します。
   新しいストーリーは、最初に選択したストーリーの下に配置されます。
8. カスタマイズオプション ( ) を使用してリストの列をカスタマイズします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

9. バックログや任意のスプリントセクションでストーリーを並べ替えて、優先度に従ってストーリーを配置します。
10. 一番上のスプリントのセクションで [スプリントの開始] を選択して、スプリントを開始します。[スプリント追跡] タブが表示されます。
11. 一番上のスプリントのセクションで [スプリントの完了] を選択して、スプリントに完了マークを付けます。
    a. [スプリントの完了] ダイアログボックスに未完了のストーリーがある場合は、これらをバックログや今後のスプリントに移動します。
    b. [完了] を選択します。
    スプリントが完了とマークされると、[スプリント計画立案] タブに表示されなくなります。

関連情報

アジャイル開発 2.0 のアジャイルボード

アジャイル開発 2.0 でのスプリントの一括作成

複数の アジャイル開発 2.0 アサイン先グループに対して複数のスプリントを一括で作成して、時間を節約します。

始める前に

必要なロール：scrum_admin、scrum_master、または scrum_sprint_planner

このタスクについて

1 つのアサイン先グループに対して複数のスプリントを一括で作成します。複数のアサイン先グループが同じスプリント周期に従う場合は、これらのグループのスプリントをすべて一括で作成することができます。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > グループ.
2. スプリントを作成するアサイン先グループを選択し、[スプリントの作成] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

スプリントフォームの作成

フィールド	説明
名前	選択したすべてのアサイン先グループに適用されるスプリントの名前 たとえば、選択したすべてのアサイン先グループが今後のリリースに携わる場合、**<Release name> sprint** のようなリリース名でスプリントに名前を付けておくことができます。
開始番号	スプリントの開始番号 選択したアサイン先グループに対して作成されたスプリントは、**<Name> <Starting Number>** という名前になります。
開始日	スプリントの開始日
期間 (日数)	スプリントの日数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
スプリント数	選択したアサイン先グループに対して作成するスプリントの数

4. **[OK]** を選択します。

タスクの結果
選択したアサイン先グループのスプリントが作成され、そうしたグループの [スプリント] 関連リストに表示されます。

アジャイル開発 2.0 でのスプリントに対するストーリーの進捗状況の追跡

アジャイル開発 2.0 において、アジャイルボードの [スプリント追跡] タブを使用して、現在のスプリントからのストーリーの展開を追跡します。

始める前に
ボードにアクセスするには、アサイン先グループのメンバーである必要があります。

必要なロール：scrum_user または scrum_admin

このタスクについて
[スプリント追跡] タブのストーリーボードビューを使用すると、現在のスプリントに対するストーリーのステータスを確認することができます。ボードでは、ストーリーはカードとして表示され、状況はレーンとして表示されます。

ストーリーカードを別のレーンに移動したり、チームに対するストーリーを新たに追加したりして、スクラム会議や他のステータス会議中にリアルタイムで更新することができます。

手順


1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード.
2. [スプリント追跡] タブを選択します。
3. ストーリーボードビューから、ステータスレーンを使用して現在のスプリントに対するストーリーをレビューします。
4. オプション: ストーリーをあるレーンから別のレーンに移動すると、ストーリーのステータスが変わります。

   (Optional) トリアージボードを使用してそうしたレコードをバックログに追加すると、トリアージされたレコードに関連付けられたストーリーがボードに表示されます。これらのストーリーをストーリーボードの別のレーンに移動してステータスを更新すると、関連するストーリーのステータスは更新されますが、トリアージされた元のレコードのステータスは変わりません。元のレコードのステータスを変更するには、ストーリーを開いて元のレコードタブに切り替えます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トリアージボードから追加された欠陥に関連したストーリー。

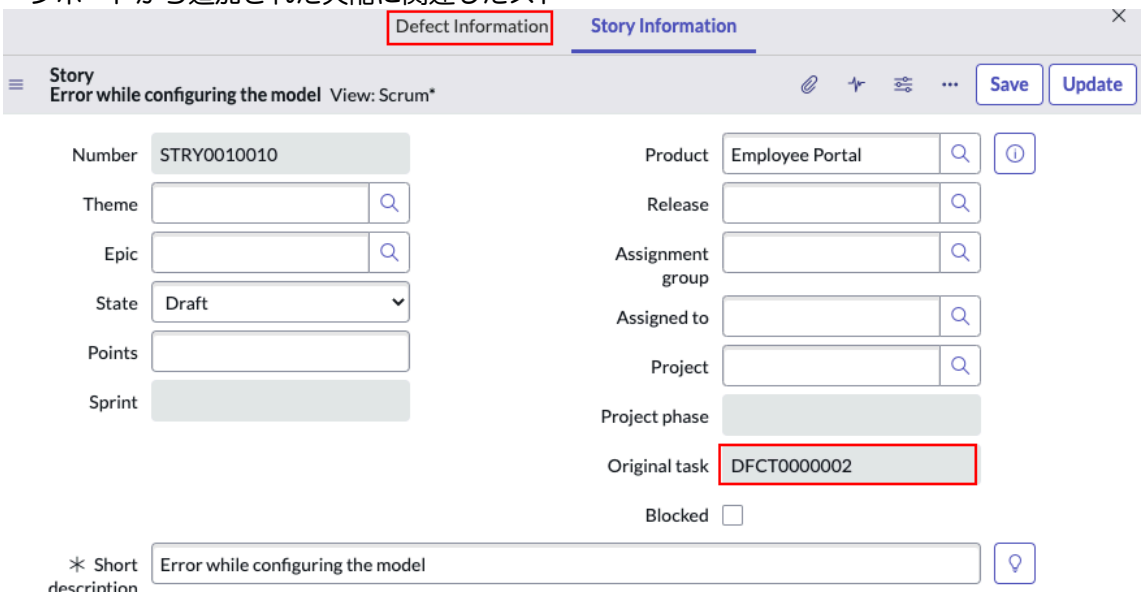

5. オプション: 垂直レーンメニュー ( ) から [レーンを非表示 **(Hide Lane)**] を選択して、表示しないレーンを非表示にします。
6. オプション: 非表示のレーンを表示し、ボードのテーマを変更します。


   a. [構成] ( )

   b. [詳細設定] を選択します。

   c. 表示するレーンを選択します。
   [レーン構成] セクションでレーンの表示順序を並べ替えて、レーン表示の順序を変更することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

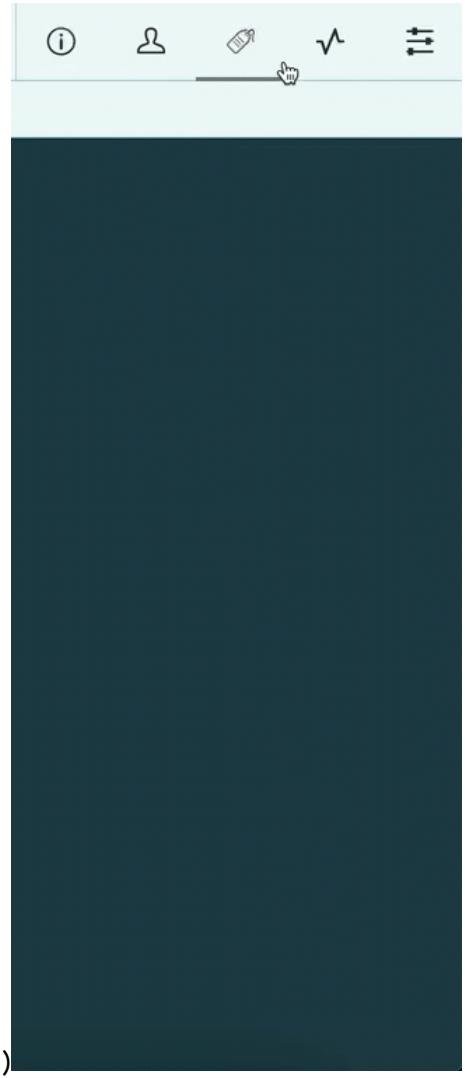

(Optional)

d. ボードのテーマを変更するには、別の色を選択します。

7. オプション: 特定のレーンにストーリーを追加します。

a. **[+** カードを追加 **(+ Add Card)]** を選択します。

b. フォームでフィールドに入力し、[送信] をクリックします。
フィールドの詳細については、「アジャイル開発 2.0 でのストーリー作成」を参照してください。

アジャイル開発 **2.0** でのスプリントに対するスクラムタスクの進捗状況の追跡

アジャイル開発 2.0 において、アジャイルボードの [スプリント追跡] タブを使用して、現在のスプリントからのストーリーに対するスクラムタスクの進捗状況を追跡します。

始める前に

このボードにアクセスするには、アジャイルグループのメンバーであることが必要です。

必要なロール：scrum_user または scrum_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
[スプリント追跡] タブのタスクボードビューを使用すると、現在のスプリントに対するスクラムタスクのステータスを確認することができます。ボードでは、各ストーリーが折りたたみ可能なセクションになっています。こうしたセクションで、各ストーリーに対するタスクはカードとして表示され、状況はレーンとして表示されます。

タスクカードを別のレーンに移動したり、ストーリーに対するタスクを新たに追加したりして、スクラム会議や他のステータス会議中にリアルタイムで更新することができます。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード.
2. [スプリント追跡] タブをクリックします。
3. タスクボードビューから、現在のスプリントにスケジュール設定されているすべてのストーリーのスクラムタスクに関する状況をレビューします。
4. スクラムタスクをあるレーンから別のレーンに移動することで、スクラムタスクのステータスを変更します。
5. 特定のレーンにスクラムタスクを追加します。

   a. **[+** カードを追加 **(+ Add Card)]** をクリックします。

   b. フォームでフィールドに入力し、[送信] をクリックします。
   フィールドの詳細については、「アジャイル開発 2.0 ストーリーに対するスクラムタスクの作成」を参照してください。

アジャイル開発 **2.0** でのスプリントの進捗状況の追跡

アジャイル開発 2.0 において、アジャイルボードの単一の統合ビューから、現在のスプリントに対するストーリー、スクラムタスク、テストの進捗状況を追跡します。

始める前に

- スプリント追跡ボードにアクセスするには、Agile 2.0 のアサイン先グループのメンバーである必要があります。
- ストーリーに対するテストを表示、追加、更新するには、テスト管理 2.0 プラグイン (com.snc.test_management.2.0) をアクティブ化する必要があります。

必要なロール：scrum_user または scrum_admin

このタスクについて
[スプリント追跡] タブのリストビューを使用すると、現在のスプリントのストーリーに対して作成されたスクラムタスクやテストの進捗状況をレビューすることができます。

各ストーリーは展開可能なセクションとして一覧化され、作成されたタスクやテストが表示されます。ストーリーにタスクやテストを新たに追加したり、[準備完了] ステータスのテストを実行したりすることができます。

ステップ 3 ～ 8 では、スプリント追跡ボードでさまざまなアクションを実行します。要件に合ったものを選択してください。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード.
2. [スプリント追跡] タブから、[リスト] ビューを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

現在のスプリントにスケジュール設定されているストーリーはすべて、展開や折りたたみが可能なセクションとして一覧表示されます。現在のステータス、簡単な説明、アサイン担当ユーザーなど、ストーリーに関する詳細情報を確認することができます。

3. [表示] フィールドから、ステータスを確認するアイテムを選択します。
   - スクラムタスク
   - テスト
4. 各ストーリーセクションを展開すると、追加されたタスクやテストの詳細情報が表示されます。
   カスタマイズオプション( )を使用して、これらのアイテムに表示される情報をカスタマイズできます。
5. ストーリーにスクラムタスクを新たに追加します。
   a. ステップ 3 で、[スクラムタスク] を選択します。
   b. タスクを追加する対象のストーリーのセクションから、[スクラムタスクを追加] を選択します。
   c. フォームのフィールドに入力します。
   フィールドの詳細については、「アジャイル開発 2.0 ストーリーに対するスクラムタスクの作成」を参照してください。
   d. [送信] を選択します。
6. ストーリーに対するテストを新たに追加します。
   a. ステップ 3 で、[テスト] を選択します。
   b. テストを追加する対象のストーリーから、[テストを追加] を選択します。
   c. 簡単な説明を入力し、[送信] を選択します。
   テストが作成され、ストーリーセクションに一覧表示されます。テストフォームを開くと、テストステップを追加したり検証したり、実行準備が完了したテストにマークを付けたりすることができます。テストフォームについては、「アジャイル開発 2.0 におけるテストバージョンフォーム」を参照してください。

   注:
   ストーリーにテストを追加するには、テスト管理 2.0 プラグインを有効にする必要があります。「テスト管理 2.0 のアクティブ化」を参照してください。

7. ストーリーに対する [準備完了] ステータスのテストがある場合は、テストを実行することができます。
   詳細については、「アジャイル開発 2.0 でのストーリーのテストの実行」を参照してください。

アジャイル開発 2.0 でのストーリーのテストの実行

アジャイル開発 2.0 において、ストーリーのテストが [準備完了] とマークされ実行可能になった場合、アジャイルボードにある [スプリント追跡] タブを使用して、そうしたテストを実行したり、テストステップをすべて実施したりすることができます。

始める前に
必要なロール：scrum_user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

アジャイルボードから、[スプリント追跡] タブのリストビューを使用して、実行可能なテストバージョンがあるストーリーを確認します。こうしたストーリーには、ステータスの横に [実行] オプションがあります。各テストステップを実施および検証して、テストを実行します。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード.
2. [スプリント追跡] タブから、[リスト] ビューを選択します。

   現在のスプリントにスケジュール設定されているストーリーはすべて、展開や折りたたみが可能なセクションとして一覧表示されます。
3. [表示] フィールドから、 [テスト]を選択します。
4. テストを実行するストーリーで、[実行] を選択します。
5. テストを実行する環境を選択し、[実行] を選択して確定します。
6. [テスト実行] ウィンドウで各テストステップを実施し、結果は [合格]、[失敗]、[ブロック済み] でそれぞれマークします。
   - 合格 ( )
   - 失敗 ( )
   - ブロック済み ( )

   テストステップで [失敗] または [ブロック済み] を選択した場合は、コメント入力やファイル添付を利用して選択内容をサポートすることができます。
7. ストーリーに対して複数のテストを実行している場合、[次のテスト] オプション ( ) を使用すると、現在のテストを検証した後に次のテストに進むことができます。
8. すべてのテストステップを実施および検証し終えるまで、ステップ 6 と 7 を繰り返します。
9. オプション: [一時停止] を選択すると、テストを一時停止できます

   (Optional) テストを一時停止した場合、ステップ 10 をスキップします。

   一時停止したテストの実行を後で再開する場合は、次の場所にあります。 テスト管理 > 実行.
10. すべてのテストステップをマークしたら、[完了] を選択します。

タスクの結果

各テストの結果は、次の条件に従って、アジャイルボードに [合格]、[失敗]、[ブロック済み]、[未完了] と表示されます。

- すべてのテストステップに合格した場合、ステータスは [合格] になります。
- テストの少なくとも 1 つのステップが実行されていない場合、テストのステータスは「未完了」になります。
- テストの少なくとも 1 つのステップが不合格の場合、テストの全体的なステータスは 「不合格」になります。このルールは、前のルールよりも優先されます。
- テストの少なくとも 1 つのステップがブロックされている場合、テストの全体的なステータスは「ブロック」になります。このルールは、前の 2 つのルールよりも優先されます。

次のタスク

アジャイル開発 2.0 でのストーリーに対するテスト結果の表示

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アジャイル開発 2.0 でのストーリーに対するテスト結果の表示

アジャイル開発 2.0 ストーリーで実行するテストの結果を分析します。エラーをトラブルシューティングして、ストーリーを完了できるようにします。

始める前に

必要なロール：scrum_user

このタスクについて

Agile ボードの [スプリント追跡] タブを使用して、ストーリーに対して実行されたテストをレビューします。実行されたテストの結果は、各テストフォームの [テスト結果] 関連リストに一覧表示されます。こうした結果から、テストがブロック済みまたは失敗となった理由に関するコメントや、コメントを裏付ける添付ファイルなどの詳細情報を確認することができます。このような詳細情報を活用して、製品や機能の問題に対するトラブルシューティングや修正を行います。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード.
2. [スプリント追跡] タブから、[リスト] ビューを選択します。

   現在のスプリントにスケジュール設定されているストーリーはすべて、展開や折りたたみが可能なセクションとして一覧表示されます。
3. [表示] フィールドから、 [テスト]を選択します。
4. ストーリーセクションから、結果を分析するテストを選択します。
5. [テスト結果] 関連リストからテスト結果を選択して、詳細情報をフォームに表示します。

   テスト結果フォーム

フィールド	説明
番号	テスト結果に対して自動的に生成される番号。
テスト	実行中のテスト。
結果	テストの実行状況：合格、不合格、またはブロック。
バージョン	実行されるテストのバージョン。
実行環境	テストが実行される環境。
更新日時	テスト結果が記録された日時
実行者	テスト計画を実行したテスターの名前。
テスト実行	テスト実行の名前。

   これらのフィールドの下には、テストで実行および検証されたテストステップが実行状況と併せて一覧表示されます。こうしたステップに追加されたコメントや添付ファイルも参照用に表示されます。

関連情報

アジャイル開発 2.0 でのスプリントの進捗状況の追跡

アジャイル開発 2.0 での欠陥のレポート

アジャイル開発 2.0 では、欠陥をレポートすることで、製品や機能に関連する問題を追跡することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：feature_user、scrum_story_creator、または scrum_admin

アドミニストレーターは、アジャイル開発 2.0 アプリケーションで欠陥をレポートすることになるすべてのユーザーに feature_user ロールを付与する必要があります。

このタスクについて
欠陥モジュールを使用して欠陥レコードを作成します。この欠陥に対するストーリーは後で作成して、関連するアサイン先グループが問題の解決に取り組めるようにすることができます。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > 欠陥.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

欠陥フォームフィールド

フィールド	説明
番号	システムによって欠陥に生成された一意の識別子。
優先度	欠陥に割り当てられた優先度。製品オーナーは、ストーリーを作成するときに優先度を使用できます。
状況	欠陥のステータス。次のいずれかを選択します。 ◦ ドラフト:欠陥の詳細はまだドラフト中です。 ◦ スコーピング:欠陥がトリアージされ、欠陥の範囲とその修正が分析されています。 ◦ 承認待ち:欠陥の範囲が確定し、チームは作業を開始するための承認を待っています。 ◦ 対応中:チームは欠陥の修正に取り組んでいます。 ◦ テスト/QA:テスターは、指定されたスコープに基づいて欠陥修正をテストしています。 ◦ 展開/起動:チームは欠陥の修正を開始する準備ができています。 ◦ 完了してクローズ:欠陥の修正が製品に展開されます。 ◦ 保留中:欠陥はブロッカーのため、さらにレビューされるまで保留されています。 ◦ キャンセル:チームはこの欠陥の作業をキャンセルします。 このフィールドは自動的に [ドラフト] に設定されます。
アサイン先グループ	欠陥が属するグループ。
担当者	欠陥に割り当てられたユーザー。
製品	この欠陥が関連付けられている製品。欠陥が製品の一部である場合、このフィールドは必須です。
報告先	欠陥がレポートされている問題、変更、またはその他のタスクレコード
簡単な説明	欠陥の簡単な説明
説明	欠陥の詳細な説明

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
作業メモ	欠陥で実行されている作業に関するメモ。作業メモは、欠陥に対する作業進捗に応じて更新されます。

4. [送信] を選択します。

タスクの結果
欠陥が作成され、[ストーリー] 関連リストとともにフォームが再度開きます。ストーリーのリストは、スクラムロールを有するユーザーにのみ表示されます。

次のタスク
スクラムのプロダクトオーナーは欠陥をレビューし、ストーリーの作成が必要かどうかを判断します。「アジャイル開発 2.0 でのストーリー作成」を参照してください。

Agile Development 2.0 での拡張要求の作成

機能や製品に関する拡張のアイデアを拡張要求として アジャイル開発 2.0 に取り込み、後でレビューしたり優先順位付けしたりできるようにします。

始める前に
必要なロール：feature_user、scrum_story_creator、scrum_admin、rm_enhancement_admin のいずれか

アドミニストレーターは、アジャイル開発 アプリケーションで拡張要求を作成することになるすべてのユーザーに feature_user ロールを付与する必要があります。

このタスクについて
拡張モジュールを使用して拡張レコードを作成します。今後のリリースに向け優先順位付けを行う場合、後でこのレコードをレビューしたり、開発ストーリーを作成したりすることができます。

手順
1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > 機能拡張.
2. [**New**] をクリックします。
3. 必要に応じてフィールドに入力します。

拡張フォーム

フィールド	説明
番号	拡張のシステム生成番号
優先度	拡張に割り当てられた優先度。 プロダクトオーナーはこの値を参照して、ストーリーを作成したり、今後のリリースにスコーピングしたりすることができます。
状況	拡張の現在のステータス。デフォルトは [ドラフト] です。
アサイン先グループ	この拡張に携わるグループ
担当者	拡張にアサインされたユーザー
製品	この拡張が関連付けられている製品。拡張が製品の一部である場合、このフィールドは必須です。
簡単な説明	拡張の簡単な説明

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
説明	拡張の詳細な説明
作業メモ	拡張で実行されている作業に関するメモ。

4. [送信] をクリックします。

タスクの結果
拡張要求が作成され、[ストーリー] 関連リストとともにフォームが再読み込みされます。ストーリーのリストは、スクラムロールを有するユーザーにのみ表示されます。

次のタスク
スクラムのプロダクトオーナーは要求をレビューし、ストーリーの作成が必要かどうかを判断します。

アジャイル開発 2.0 でのトリアージボードの設定

独自のトリアージボードを設定すると、問題、インシデントタスク、欠陥、変更要求など、製品にとって重要なレコードが一元化され、表示や管理が簡単になります。

始める前に

- Agile Development - 統一されたバックログの有効化。
- バックログを所有していることを確認してください。「アジャイル開発 2.0 でのカスタマイズされたバックログの作成」を参照してください。

必要なロール：scrum_product_owner

このタスクについて
フィルターを定義してトリアージボードを作成しておくと、必要なレコードに簡単にアクセスしたりレコードを管理したりできるようになります。

トリアージボードは必要なだけ作成することができます。たとえば、欠陥に対してトリアージボードを 1 つ作成し、拡張に対しては別のトリアージボードを作成することができます。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード > バックログ.
2. 新しいトリアージボードを設定します。
   - これが最初のトリアージボードである場合は、 トリアージボード > トリアージボードを設定.
   - トリアージボードが既にある場合は、 トリアージボード > 新しいトリアージ定義
3. フォーム上で、以下のフィールドに記入します。

フィールド	説明
名前	トリアージボードの名前
テーブル	トリアージボード用にレコードをフィルタリングするテーブル
フィルター	トリアージボードに入力するために、選択したテーブルに適用するフィルター基準

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	重要: デフォルトの条件 ([アクティブ = true (Active is true)]、[アジャイルストーリーが空]) は削除しないでください。 ○ [アクティブ = true (Active is true)] では、トリアージボードにアクティブかつ未完了や未キャンセルのタスクのみが表示されます。 ○ [アジャイルストーリーが空] では、もうタスクにストーリーが関連付けられておらず、他のバックログにもタスクが存在しないことを確認します。
バックログ定義	トリアージボードで作成されたストーリーが追加されるバックログ

4. [送信] を選択します。

タスクの結果

トリアージボードが作成され、アジャイルボードの [バックログ] セクションからトリアージボードにアクセスできるようになります。

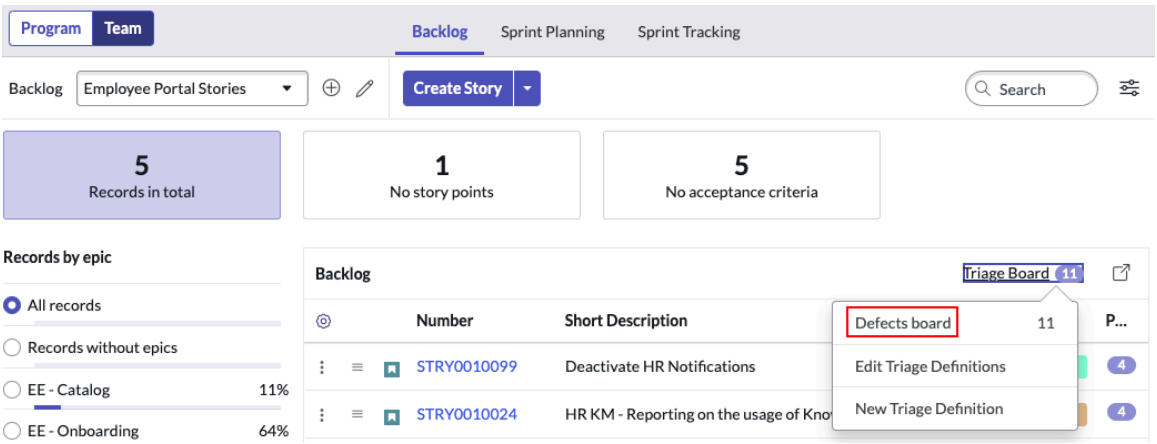

次のタスク

- 既存のトリアージボードのフィルター基準を編集します。

  [トリアージボード] を選択し、[トリアージ定義を編集] を選択します。

- 新しいトリアージボードを開いて内容を表示します。

  [トリアージボード] を選択し、作成したボードを選択します。

- アイテムのトリアージおよび アジャイル開発 2.0 のバックログへの追加

関連情報

アジャイル開発 2.0 での製品バックログの管理

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アイテムのトリアージおよびアジャイル開発 2.0 のバックログへの追加

トリアージボードでアイテムのリストをレビューして、アジャイル開発 2.0 のバックログに追加します。優先度に基づき、そうしたアイテムを今後のスプリントにスケジュール設定し、製品チームが作業できるようにします。

始める前に

- Agile Development - 統一されたバックログの有効化
- アジャイル開発 2.0 でのトリアージボードの設定

必要なロール：scrum_product_owner

このタスクについて


トリアージボードからアイテムを選択し、製品の優先度に基づいてバックログに追加します。トリアージボードからバックログに追加されたアイテムにはすべて、ストーリーが関連付けられています。詳細情報については、アジャイルボードで、元のアイテムの [情報] タブと [ストーリー情報] タブを切り替えて確認することができます。

こうしたストーリーは、後で製品チームにアサインしたり、スプリントにスケジュール設定したりすることができます。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード.
2. アジャイルボードの [バックログ] セクションで、[バックログ] フィールドから製品またはチームのバックログを選択します。
3. [トリアージボード] を選択し、アイテムをレビューするトリアージボードを選択します。

   このスクリーンショットの例では、[欠陥ボード (Defects board)] を選択することができます。

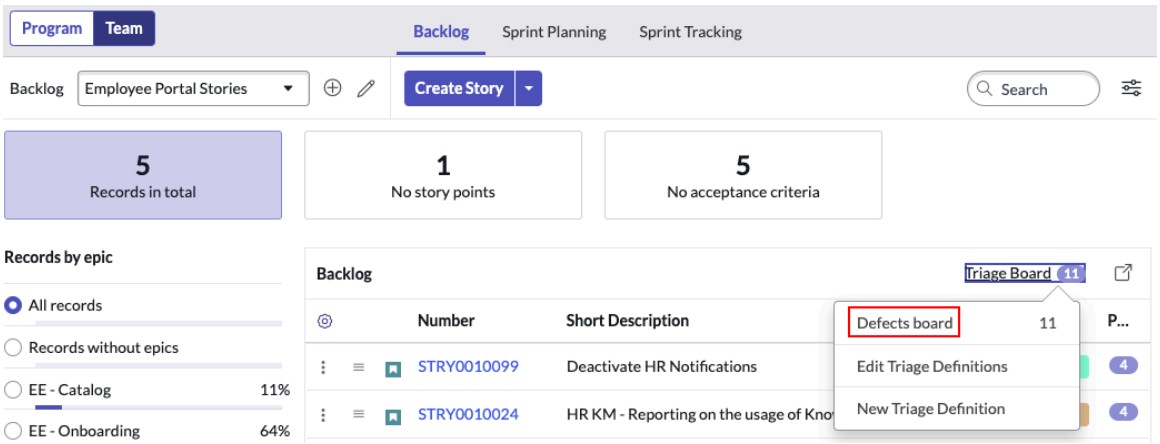

4. リストをレビューし、バックログに追加するアイテムを選択します。
5. [バックログに追加] を選択します。


タスクの結果

トリアージボードから選択されたアイテムリストがストーリーとしてバックログに追加されます。アジャイルボードの [スプリント計画立案] タブを使用して、こうしたストーリーを今後のスプリントにスケジュール設定することができます。

この例では、バックログに追加された欠陥に関連するストーリーの作成方法が示されています。ストーリーの [元のタスク] フィールドには、この欠陥への参照があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

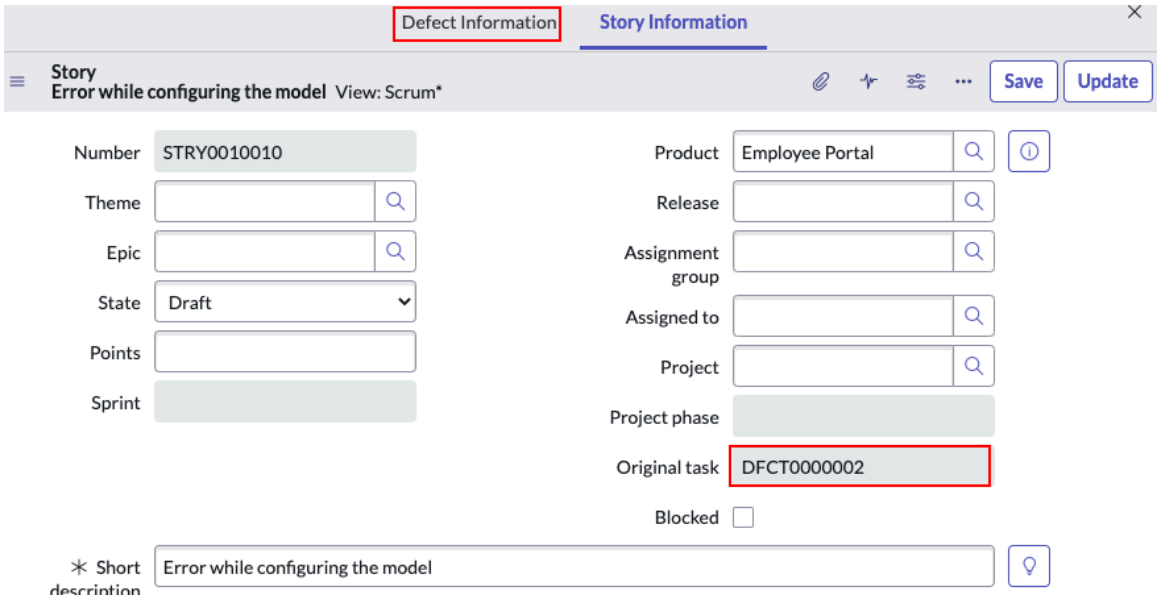

アジャイル開発 2.0 のスクラムプログラム

共通の短期的な成果に向けてまたは継続的に連携する複数のチームの作業を計画および追跡します。

このビデオでは、Agile Development 2.0 のスクラムプログラムの概要を説明します。

短期的な成果の例としては、デマンド、プロジェクト、エピック、リリースなどがあります。スクラムプログラムで連携して作業するチームは、次のことができます。

- 同期して、またはさまざまなスプリント周期で作業します。
- この一般的なスクラムプログラムの外部での作業に貢献します。

ServiceNow® Agile Development 2.0 のスクラムプログラムの一元化された計画ページでは、次のことができます。

- 作業をアサインし、スプリント全体で複数のチームの作業負荷を比較します。
- 複数のチームにまたがるストーリー間の依存関係を設定、表示、および調整します。

スクラムプログラムの有効化

スクラムプログラム (com.snc.sdlc.scrum_program) プラグインを有効化して、アジャイル開発 2.0 でスクラムプログラムの計画を開始します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

スクラムプログラムとともにインストールされるコンポーネント

スクラムプログラムプラグインを有効化するときにインストールされるロール、テーブル、ビジネスルール、および UI マクロについて理解します。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

スクラムプログラムとともにインストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
プログラムマネージャー [it_program_manager]	このロールを持つユーザーは、すべてのスクラムプログラムを完全に制御できます。	• program_manager • scrum_product_owner • scrum_master

注:
it_program_manager ロールは、 プロジェクトポートフォリオ管理 プラグインを介してまだインストールされていない場合にのみ、スクラムプログラムを有効するとインストールされます。

スクラムプログラムとともにインストールされるテーブル

テーブル	説明
epic_backlog_definition	エピックバックログの作成に使用されるフィルター基準を保存します。
scrum_program_m2m_group	スクラムプログラムとチームとの関係を保存します。

スクラムプログラムとともにインストールされるビジネスルール

名前	テーブル	説明
エピックのグローバルランクの設定	rank_configuration	既存のエピックのグローバルランクを設定するための修正スクリプトが含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクラムプログラムとともにインストールされる UI マクロ

名前	説明
program_planning_constants	カスタマイズ可能な TEAM_LIMIT プロパティおよび STORY_LIMIT プロパティが含まれています。 これらのプロパティは、スクラムプログラムの計画ボードに表示できるチームとストーリーの数を制限します。

TEAM_LIMIT プロパティのデフォルト値は 15、STORY_LIMIT プロパティのデフォルト値は 1000 です。これらの値は、必要に応じて変更できます。

注:
値を大きくすると、ロード時間が長くなり、スクラムプログラムの計画ボードのパフォーマンスが低下する可能性があります。

エピックバックログの作成

設定に従って一連のフィルターを定義して、エピックをエピックバックログに分類します。スクラムプログラムの計画中に、これらのエピックバックログを使用して、このバックログ内のエピックに属するストーリーのみを計画できます。

始める前に
必要なロール：it_program_manager

このタスクについて
エピックバックログを使用すると、計画ボードでストーリーをフィルターして、特定のエピックのストーリーのみを表示できます。たとえば、[優先度] を [高] に設定してエピックのバックログを作成できます。計画ボードの後半では、これらの優先度の高いエピックに属するストーリーにのみ焦点を当て、それに応じてスプリントを計画できます。

手順

1. 次のいずれかの方法でエピックバックログフォームに移動します。

オプション	アクション
エピックバックログモジュールから	**a.** 移動先 アジャイル開発 > バックログのエピック. **b.** [**New**] をクリックします。
アジャイルボードから	移動先 アジャイル開発 > アジャイルボード > プログラム > バックログ をクリックし、次のいずれかを実行します。 ○ 初めてエピックバックログを作成する場合は、[バックログの作成] をクリックします。 ○ 作成するこのバックログを既存のエピックバックログに追加する場合は、作成アイコン (⊕) をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

2. [名前] フィールドに、エピックバックログの名前を入力します。
3. 目的のフィルター条件を設定するには、[フィルター条件の追加] または [「OR」節を追加] をクリックします。

   たとえば、エピックに設定された優先度でエピックをフィルタリングすることを選択できます。

   > **注:**
   > デフォルトのフィルター条件は [タスクタイプ] **[is]** [エピック] および [アクティブ] **[is]** **[true]** です。

4. [送信] をクリックします。

関連情報

エピックバックログの管理

エピックバックログの管理

アジャイルボード上のエピックバックログの一元化されたビューを使用して、エピックを作成、更新、および再配置します。

始める前に

必要なロール：it_program_manager、scrum_user

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード.
2. [プログラム] タブから、[バックログ] を選択します。
   - エピックバックログが存在する場合、このバックログの基準に一致するエピックのリストがページに提示されます。
   - 既存のエピックバックログがない場合は、エピックバックログの作成を参照してください。
3. 利用可能なエピックバックログを切り替えるには、バックログリストからバックログを選択します。
4. 選択したバックログを編集するには、編集アイコン ( ) をクリックします。

   > **注:**
   > このステップを実行するには、it_program_manager のロールが必要です。

5. 選択したバックログに新しいエピックを追加するには、[エピックを作成] をクリックします。
6. エピックのリストを製品別にフィルタリングするには、[製品別エピック] から製品カテゴリを選択します。

   製品別エピックフィルターで表示または非表示にできます。構成アイコン ( ) をクリックし、[製品フィルターを表示] のオン/オフを切り替えます。
7. 簡単な説明またはエピック番号によりバックログからエピックを見つけるには、検索バーを使用します。
8. エピックの詳細を編集するには、エピック番号をクリックします。
9. 優先度に基づいてエピックを再配置するには、次のいずれかを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アクション	説明
マウスデバイスを使用してエピックを並べ替える	**a.** 必要なエピックを選択します。 **b.** 選択項目を目的の位置にドラッグアンドドロップします。
キーボードを使用して単一のエピックを再配置する	**a.** 目的のエピックのコンテキストメニューアイコン (☰) を強調表示するには、**Tab** キーを押して **Enter** キーを押します。 **b.** 上下の矢印キーを使用して、エピックを目的の位置に移動します。 **c. Enter** キーを押してエピックの位置を固定します。
キーボードを使用してエピックのグループを再配置する	**a.** エピックを強調表示するには、**Tab** キーを押します。 **b.** エピックを選択するには、Enter キーを押します。 **c.** 上向き矢印キーと下向き矢印キーを使用して移動し、次の操作を行います。 **i.** 連続するエピックを選択するには、**Shift** キーと **Enter** キーを同時に押します。 **ii.** 無作為にエピックを選択するには、**Ctrl** キー (Windows の場合) または **Command** キー (Mac の場合) キーと **Enter** キーを同時に押します。 **d.** エピックのコンテキストメニューアイコン (☰) を強調表示するには、**Tab** キーを押して **Enter** キーを押します。 **e.** 上下の矢印キーを使用して、エピックを目的の位置に移動します。 **f. Enter** キーを押してエピックの位置を固定します。

単一のエピックまたはエピックのグループに対して、次のアクションを実行することもできます。

a. 必要なエピックを選択します。

b. エピックの [その他のオプション] アイコン (···) をクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。

オプション	アクション
一番上に移動	エピックをバックログリストの一番上に移動します。
下に移動	エピックをバックログリストの一番下に移動します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

オプション	アクション
製品	製品リストを開きます。エピックが属する製品を選択します。

10. 標準プラットフォームリストでバックログを表示するには、標準リストビューアイコン ( ) をクリックします。

スクラムプログラムを作成する

スプリントを計画し、共同で作業している複数のスクラムチームの進捗状況を追跡するスクラムプログラムを作成します。

始める前に
プログラムに含めるチームの情報があることを確認してください。

必要なロール：it_program_manager

手順

1. 次のいずれかの方法でプログラムフォームに移動します。

オプション	アクション
スクラムプログラムモジュールから	**a.** 移動先 アジャイル開発 > スクラムプログラム. **b.** [**New**] をクリックします。
アジャイルボードから	**a.** 移動先 アジャイル開発 > アジャイルボード. **b.** [プログラム] タブから、[プログラミング] を選択します。 **c.** [プログラムを作成] をクリックします。 注: 自身の最初のスクラムプログラムである場合に限り、アジャイルボードの [計画] ページからスクラムプログラムを作成できます。

2. フォームのフィールドに入力します。

プログラムフォーム

フィールド	説明
開始予定日	プログラムの開始日。手動で日付を入力するか、カレンダーから選択します。 デフォルトの日付は現在の日付です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
終了予定日	プログラムの終了日。手動で日付を入力するか、カレンダーから選択します。
計画された期間	プログラムの期間 (日単位および時間単位)。このフィールドは、開始予定日と終了予定日に基づいて自動入力されます。 スクラムプログラムのデフォルトの期間は 1 日です。
プログラムマネージャー	プログラムのマネージャー。
デフォルトのエピックバックログ	このスクラムプログラムを選択すると、計画ページに適用される最初のエピックバックログ。 現在計画ページでは、エピックバックログはプログラムに自動的に適用されません。そのため、計画立案時に必要なバックログを手動で選択することをお勧めします。
プログラム名	プログラムの簡単な説明。

3. [送信] をクリックします。
   ロール scrum_user を持つすべてのユーザーが、作成されたスクラムプログラムを表示できます。

次のタスク

- チームをスクラムプログラムにアサインする。
- スクラムプログラムを計画するには、[スクラムプログラムボード]関連リンクをクリックします。

チームをスクラムプログラムにアサインする

チームをスクラムプログラムに追加して、作業をアサインし、作業の進捗状況を追跡します。

始める前に

このスクラムプログラムで作業するチームがアジャイルグループとして作成されていることを確認します。アジャイルグループを作成してメンバーを割り当てる手順については、「Agile Development 2.0 でアジャイルグループを作成する」を参照してください。

必要なロール：it_program_manager

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > スクラムプログラム.
2. スクラムプログラムレコードを開きます。
3. [チーム] 関連リストで、[編集] をクリックします。
4. 目的のチームをコレクションからチームリストに移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [保存] をクリックします。

同じ手順に従って、複数のスクラムプログラムにチームを追加できます。スクラムプログラムに追加したチームは、該当する [チーム] 関連リストに表示されます。

次のタスク
スクラムプログラムを計画する。

スクラムプログラム計画立案ボード

アジャイルボードの一元化されたビューを使用して、スクラムプログラムに対するチームの作業を計画します。

スクラムプログラム計画ボードの UI コンポーネントのクイックビュー。

アジャイルボードには、スクラムチームの作業を計画、スケジュール、およびレビューできるプログラム計画ボードがあります。計画ページには、計画立案プロセスをガイドする次のコンポーネントが含まれています。

プログラムセレクター

計画またはレビューするプログラムを選択します。プログラムを選択した後、編集アイコン ( ) をクリックして、チームを追加したり、他の情報を更新したりすることができます。

プログラムのタイムライン

水平方向にスクロールするか、進むアイコン ( ) と戻るアイコン ( ) を使用して、プログラムのタイムラインを移動します。

エピックバックログフィルター

スクラムプログラムに関連付けられているエピックバックログを選択します。プログラム計画ボードとエピックバックログペインでストーリーをフィルタリングできます。これらの選択したエピックのみの作業負荷を分析することで、スプリント全体で作業負荷がどのようにスケジュールされているかを理解できます。

構成パネル

構成パネルアイコン ( ) を使用して、計画ボード上の次のコンポーネントのオン/オフを切り替えます。

チームのバックログ

チームのバックログレーンを表示または非表示にできます。

ストーリーの依存関係

ストーリーの依存関係線を使用して、異なるスプリントおよびチームのストーリー間の依存関係を視覚的に分析できます。依存関係オプションを使用して、こうした依存関係線を表示または非表示にできます。依存関係を非表示にすることを選択した場合、またはボード上に存在しないストーリーが依存関係に含まれている場合は、ストーリーカードに色付きの境界線が表示されます。

依存関係の色は、ストーリーをスケジュールした方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 緑：前提条件ストーリーが最初のスプリントでスケジュールされています。次に、依存ストーリーが後のスプリントでスケジュールされます。
- 赤：依存ストーリーが最初のスプリントでスケジュールされています。次に、依存ストーリーが後のスプリントでスケジュールされます。依存関係を確認し、必要に応じてストーリーを再スケジュールします。

前提条件ストーリーまたは依存ストーリーに関連付けられているストーリーがない場合、依存関係オプションは表示されません。

ストーリーの依存関係を追加する方法については、アジャイル開発 2.0 ストーリーに関する依存関係の追加を参照してください。

[エピックバックログ] ペイン

エピックバックログ定義のフィルター条件に基づくすべてのエピックのリストを表示できます。詳細については、「エピックバックログの作成」を参照してください。

バックログペインでは、エピックに対して次のアクションを実行できます。

- エピックの説明を表示します。
- エピックの未アサインおよび未スケジュールのストーリーを、簡単な説明とストーリーポイントを示すカードとして表示します。
- エピック名をクリックしてエピックの情報を編集します。
- [ストーリーを作成] をクリックして、エピックに新しいストーリーを追加します。

スクラムチーム

選択したスクラムプログラムに関係するすべてのチームを計画ボードの左側に表示します。

チームの名前をクリックすると、チームメンバー、グループキャパシティ、説明などのチームの情報を更新できます。

チームにスプリントが追加されていない場合、またはスプリントをさらに追加する場合は、直接プログラム計画ボードからスプリントを追加することができます。

チームのバックログレーン

チームにアサインされていても、まだスプリントにスケジュールされていないストーリーが表示されます。

スクラムプログラムの計画中に、チームにアサインする必要があるストーリーがわかっていても、使用すべきスプリントがわからない場合は、こうしたストーリーをチームのバックログレーンに移動できます。これによって、今後のスプリントに対するチームの作業負荷を明確に把握し、最終的にこうしたストーリーを正しいスプリントに追加することができます。

ストーリーカードをチームのバックログにドラッグして戻すことで、すでにスプリントにスケジュールされているストーリーの計画を解除することもできます。計画ボードのバックログレーンを使用して、どのチームにストーリーがあるかを確認します。次に、どのスプリントでスケジュールするかを決定します。

チームからストーリーのアサインを解除する場合は、ストーリーカードをドラッグしてエピックバックログレーンに戻すことができます。

チームのスプリントレーン

チームのスプリント周期を確認できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スプリントの名前にカーソルを合わせると、期間、合計ストーリーポイント、最大キャパシティなどのスプリントの詳細を確認できます。スプリント名をクリックすると、グループキャパシティ、開始予定日、終了日などの詳細を編集できます。

スクラムプログラムの計画中に、ストーリーが処理されるスプリントがわかっている場合は、ストーリーカードをそのスプリントに移動できます。


ストーリーカード

スクラムプログラムのエピックのストーリーをカード形式で表示できます。これらのカードを移動してチームに割り当てたり、スプリントで計画したりすることができます。

アジャイル開発 — 統合バックログ プラグイン (com.snc.sdlc.safe.multi_task) を有効化している場合は、トリアージボードから統合バックログに追加されたストーリーも表示されます。計画ボードから、ストーリーカードをダブルクリックすることで、ポップアップウィンドウで開き、詳細を編集できます。欠陥などのトリアージボード上のレコードからストーリーが作成された場合は、ストーリー情報と欠陥情報の両方が並べて表示されます。

ストーリーカードでは、次のインジケーターを使用します。

スクラムプログラムボードのストーリーカードの凡例

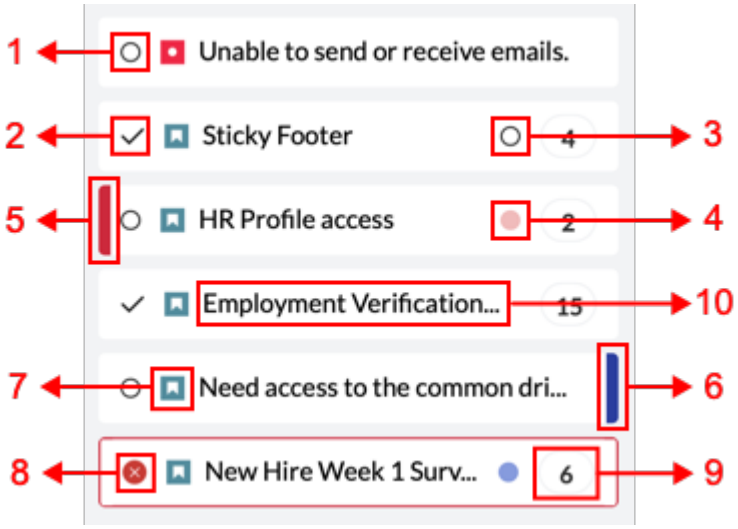

スクラムプログラムボードのストーリーカードのインジケーター

番号	インジケーターの説明
1	完了していないストーリーのインジケーター。
2	完了しているストーリーのインジケーター。
3	色が関連付けられていないエピックに属するストーリーのインジケーター。ドットにカーソルを合わせると、エピックの名前が表示されます。
4	色が関連付けられているエピックに属するストーリーのインジケーター。ドットにカーソルを合わせると、エピックの名前が表示されます。
5	関連する前提条件ストーリーのインジケーター。このバンドが赤で表示されている場合、依存関係が正しく設定されていないことを示し、確認する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクラムプログラムボードのストーリーカードのインジケーター (続く)

番号	インジケーターの説明
6	関連する依存ストーリーのインジケーター。このバンドが赤で表示されている場合、依存関係が正しく設定されていないことを示し、確認する必要があります。
7	通常のストーリーのインジケーター。このアイコンは、レコードのタイプによって変わります。たとえば、チームの有するストーリーが、問題、機能拡張、欠陥などのレコードから作成されることもあります。
8	ブロックされているストーリーのインジケーター。
9	ストーリーポイント。
10	ストーリーの短い説明。

注:
拡張機能、欠陥、インシデントなどのレコードからストーリーを作成できるのは、 アジャイル開発 — 統合バックログ プラグイン (com.snc.sdlc.agile.multi_task) がアクティブ化されている場合のみです。

スプリント作業負荷キャパシティバー

スプリントを効率的に計画します。スプリントの下にあるこのバーは、チームに計画されている作業負荷と、該当するスプリントに対するチームのキャパシティを比較して示します。スプリント名にカーソルを合わせると、詳細が表示されます。

ズームインとズームアウト

ズームインアイコン ( ) とズームアウトアイコン (アイコン) を使用してボードビューを調整します。

検索

検索用語を使用して、計画ボード上のストーリーをフィルタリングします。たとえば、簡単な説明からストーリー番号やフレーズを入力できます。

ストーリーリスト

標準リストビューアイコン ( ) を使用して、プログラムのすべてのストーリーのリストを表示します。

スクラムプログラムを計画する

アジャイルボードの一元化されたビューを使用して、スクラムプログラムで連携して作業する複数のスクラムチームのスプリントについて計画します。

始める前に

- エピックバックログの作成。
- スクラムプログラムを作成する。
- 必要なロール：scrum_sprint_planner

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード.
2. [プログラム] タブから、[プログラミング] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. [プログラム] リストから、計画するスクラムプログラムを選択します。

   計画ボードには、選択したプログラムで作業しているすべてのチーム、該当するスプリントの周期、およびスプリントのキャパシティが表示されます。

4. [バックログ] リストからエピックバックログを選択し、バックログアイコン ( ) をクリックして、選択したバックログのエピックを表示します。
5. バックログからエピックを選択して、エピックのストーリーを表示します。
6. ストーリーカードをバックログからドラッグし、スプリントまたはチームのバックログレーンにドロップして、スクラムチームにストーリーをアサインします。

   ストーリーカードを再配置することで、チーム間およびスプリント間でストーリーを再スケジュールすることができます。

   - ストーリーカードをチームのバックログに移動すると、それに応じて [アサイン先グループ] フィールドが更新されます。
   - ストーリーカードをスプリントに計画すると、それに応じてストーリーの [アサイン先グループ] フィールドと [スプリント] フィールドが更新されます。

     スプリント名の下にあるスプリントキャパシティバーには、スケジュールされているストーリーに応じて入力されます。

7. オプション: スプリント名をクリックすることで、チームのスプリントのグループキャパシティを更新します。
8. オプション: 計画ボードからストーリーをドラッグし、エピックバックログペインまたはチームのバックログレーンにドロップして、ストーリーの計画を解除します。
   - ストーリーを元のエピックバックログペインにドロップすると、スプリントとアサイン先グループの参照がストーリーからクリアされます。
   - ストーリーをチームのバックログレーンに移動すると、スプリント参照のみがクリアされ、アサイン先グループは保持されます。

関連情報

スクラムプログラム計画立案ボード

プログラム計画ボードからスプリントを追加する

別のモジュールに移動することなく、スクラムプログラム計画ボードから直接スクラムチームにスプリントを追加します。

始める前に

必要なロール：scrum_sprint_planner

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード.
2. [プログラム] タブから、[プログラミング] を選択します。
3. [プログラム] リストから、計画するスクラムプログラムを選択します。
4. チーム名の下にある [スプリントを追加] をクリックします。
5. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スプリントフォームの作成

フィールド	説明
名前	チームのスプリントの名前。
開始番号	スプリントを開始する番号。 たとえば、チームの最初のスプリントである場合は、「**1**」と入力します。
開始日時	チームのスプリントの開始日。
期間 (日数)	チームのスプリント期間。
スプリント数	チームに追加するスプリントの数。 たとえば、チームに 4 つのスプリントを追加する場合は、「 **4**」と入力します。

6. [**OK**] をクリックします。

プログラム計画ボードで、チームの新しいスプリントを確認できます。

アジャイルチームの作業進捗ステータス

アジャイルチームの作業進捗ステータスアプリケーションは、すべての アジャイル開発 2.0 エピックの完了予定日や進捗状況 (緑、黄、赤) などのインジケーターを提供します。

製品オーナーまたはチームリーダーとして、こうしたインジケーターは、アジャイルチームがエピックの作業を終了予定日までに完了できるかどうかを把握し、それに応じて計画を調整するために役立ちます。エピックのストーリーに取り組むチームメンバーとして、これらのステータスインジケーターは、必要に応じて作業戦略をレビューできるように、作業全体への貢献度と進捗状況を理解するのに役立ちます。

注:
これらの作業進捗ステータスインジケーターを設定するには、 アジャイル開発 2.0 エピックの [終了予定日] フィールドに値を入力する必要があります。

アジャイルチームの作業進捗ステータスのインストール

ServiceNow Store からアジャイルチームの作業進捗ステータス (sn_scrum_progress) アプリケーションをインストールします。

始める前に

- アジャイル開発 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) プラグインを有効にします。
- Agile 2.0 のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパックのインストール。

プラグインとアプリケーションがアクティブ化され、インストールされていることを確認するには、次の場所に移動します サブスクリプション管理 > サブスクリプション インスタンス内にありますリストには、組織で購入したサブスクリプションが表示されます。本番インスタンスで アジャイル開発 2.0 および Agile 2.0 のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパックを有効化するには、別のライセンスが必要になる場合があります。詳細については、ServiceNow のサポートにお問い合わせください。

必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 ServiceNow® Store.
2. アジャイルチームの作業進捗ステータスを検索します。
3. アプリケーションタイルをクリックします。
   インストールしているアプリケーションに関する詳細情報を表示できます。

   注:
   該当する場合は、[他の要件] および [依存関係] セクションを読むことを検討してください。

4. [取得] をクリックし、Now Support ログイン認証情報を入力します。
5. [インストールを要求] をクリックします。
6. [インスタンス名] フィールドに詳細を入力し、[インスタンスを検証] をクリックします。
7. [インスタンスの理由] フィールドに詳細を入力し、[要求] をクリックします。
   詳細なインストール手順が記載されたメールが届きます。
8. アジャイルチームの作業進捗ステータスをインストールしたいインスタンスにログインします。
9. 移動先 システムアプリケーション > アプリケーション.
10. Epic Progress Status for Agile 2.0 アプリケーションを見つけて選択し、[インストール] をクリックします。

次のタスク
まだ行っていない場合は、[Scrum] 日次データ収集ジョブを開始します。詳細については、「Agile 2.0 ダッシュボードの日次データ収集の有効化」を参照してください。

アジャイル開発 2.0 エピックの進捗状況の確認

アジャイル開発 2.0 エピックの進捗状況を確認して、作業が終了予定日までに完了するかどうかを判断します。

移動先 **Agile Development 2.0** > エピック をクリックし、チームのエピックをフィルタリングします。

エピックリストの [ステータス] 列には、各エピックの緑、黄、または赤のインジケーターが表示され、各色で次のことが示されます。


- 緑：エピックは終了予定日までに完了する見込みです。
- 黄：エピックの進行が予定どおりではなく、実行計画をレビューする必要があります。
- 赤：エピックの進行が順調ではなく、終了予定日までに完了しない可能性があります。

完了予定日には、エピックが完了する可能性がある日付が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エピックの作業進捗状況

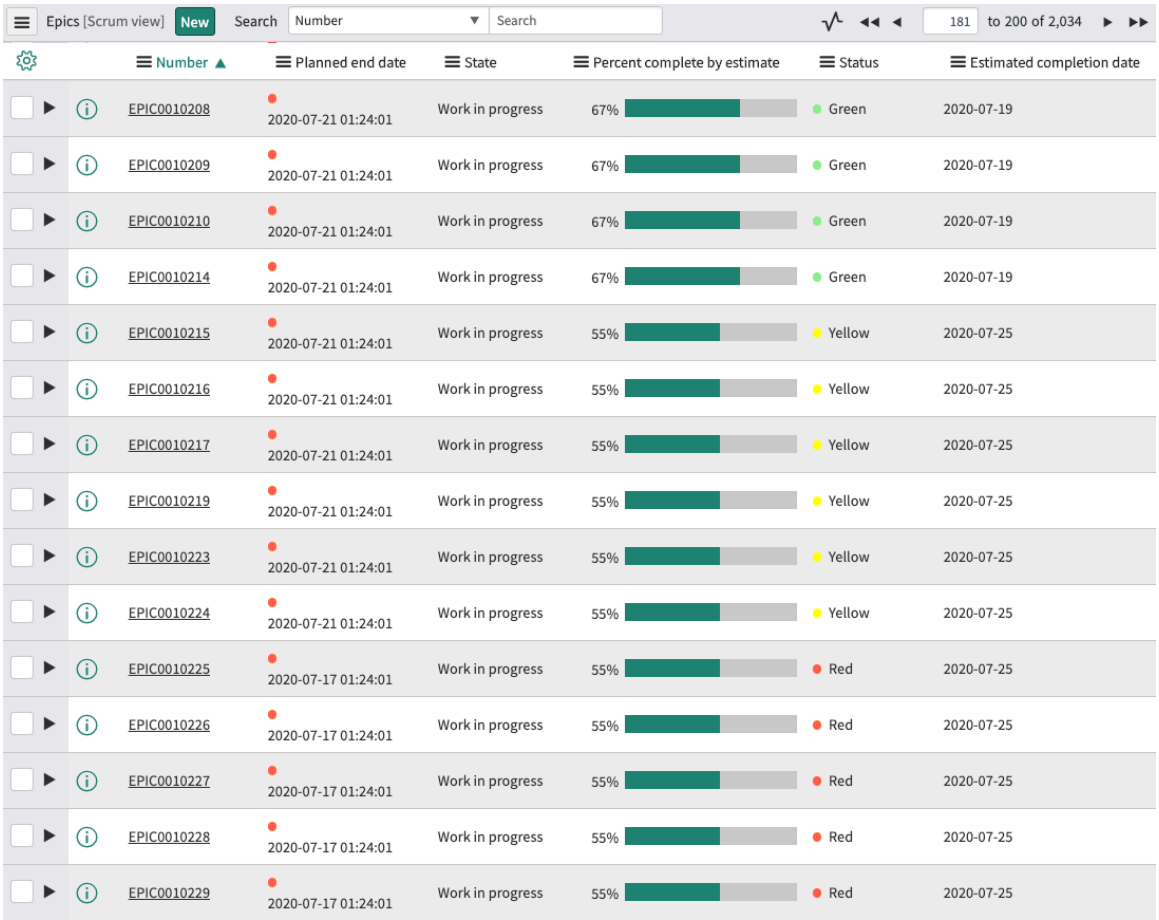

Number ▲	Planned end date	State	Percent complete by estimate	Status	Estimated completion date
EPIC0010208	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	67%	Green	2020-07-19
EPIC0010209	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	67%	Green	2020-07-19
EPIC0010210	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	67%	Green	2020-07-19
EPIC0010214	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	67%	Green	2020-07-19
EPIC0010215	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	55%	Yellow	2020-07-25
EPIC0010216	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	55%	Yellow	2020-07-25
EPIC0010217	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	55%	Yellow	2020-07-25
EPIC0010219	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	55%	Yellow	2020-07-25
EPIC0010223	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	55%	Yellow	2020-07-25
EPIC0010224	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	55%	Yellow	2020-07-25
EPIC0010225	2020-07-17 01:24:01	Work in progress	55%	Red	2020-07-25
EPIC0010226	2020-07-17 01:24:01	Work in progress	55%	Red	2020-07-25
EPIC0010227	2020-07-17 01:24:01	Work in progress	55%	Red	2020-07-25
EPIC0010228	2020-07-17 01:24:01	Work in progress	55%	Red	2020-07-25
EPIC0010229	2020-07-17 01:24:01	Work in progress	55%	Red	2020-07-25

[スクラム] 日次データ収集ジョブは、エピックのバーンアップレポートの生成に役立ちます。これらのエピックバーンアップレポート用に生成されたデータを使用して、各エピックの完了予定日が決定されます。この日付は、それぞれのエピックバーンアップレポートで、完了済み系列とスコープ予測系列の共通部分であることがわかります。

この予定完了日に基づいて、エピックの進捗状況が決定されます。エピックの進行状況ステータスは、次の条件でのみ計算されます。

- 終了予定日がエピックに入力されている。
- エピックの完了率が 0 より大きい値である。

進捗状況インジケーターの色は、次の条件により決定されます。

- 緑：完了予定日が終了予定日以前です。
- 黄：完了予定日が終了予定日を 1% ～ 14% 過ぎています。
- 赤：完了予定日が終了予定日を 15% 以上過ぎています。

関連情報

Agile 2.0 エピックダッシュボード

パフォーマンスアナリティクス **Agile 2.0** のコンテンツパック

プラットフォームアナリティクス Content Pack for Agile 2.0 のデータを表示した事前設定済みダッシュボードを使用して、Agile プロセスとプラクティスを改善します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パフォーマンスアナリティクス ソリューションの有効化

ダッシュボードの パフォーマンスアナリティクス ウィジェットを使用して、データの経時的な可視化、ビジネス プロセスの分析、改善が必要な箇所の特定を行います。ソリューションを使用すると、最小限のセットアップで パフォーマンスアナリティクス からアプリケーションに関する値を取得できます。

注:
ソリューションには、デフォルトでは非アクティブになっているダッシュボードがあります。これらのダッシュボードは、ビジネスニーズに従って、エンドユーザーが確認できるようにアクティブにすることができます。

この プラットフォームアナリティクスソリューション のすべての機能に無制限にアクセスするには、パフォーマンスアナリティクス のサブスクリプションを購入します。詳細については、「パフォーマンスアナリティクスサブスクリプションのアクティブ化」を参照してください。

この プラットフォームアナリティクスソリューション を使用するには、パフォーマンスアナリティクス for Business Management のサブスクリプションをアクティブ化する必要があります。パフォーマンスアナリティクス のエンタイトルメントの詳細については、「パフォーマンスアナリティクスサブスクリプションのアクティブ化」を参照してください。

このベースシステムの パフォーマンスアナリティクス ソリューションは、 ServiceNow Store から入手できます。このソリューションを有効にするには、アドミニストレーターとして システムアプリケーション > **ServiceNow Store** を検索.ServiceNow Store のランディングページが開いたら、パフォーマンスアナリティクス Content Pack for Agile 2.0 を検索します。ソリューションが見つかったら、ServiceNow Store の指示に従ってください。ServiceNow Store には、独自のドキュメントが用意されています。

ビジネスステークホルダーロールサポート

ビジネスステークホルダーロール (sn_agile_read) には、すべての Agile 2.0 ダッシュボードへの読み取り専用アクセス権があります。詳細については、「アジャイル開発 2.0 のビジネスステークホルダーロール」を参照してください。

関連情報

パフォーマンスアナリティクスサブスクリプションのアクティブ化

Agile 2.0 のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパックのインストール

ServiceNow Store から Agile 2.0 のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパックアプリケーションをインストールします。

始める前に

- アジャイル開発 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) プラグインをアクティブ化します。
- パフォーマンスアナリティクス (com.snc.pa) プラグインのアクティブ化

必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:

- プラグインとアプリケーションがインストールされ、アクティブ化されていることを確認するには、 サブスクリプション管理 > サブスクリプション インスタンス内にありますリストには、組織で購入したサブスクリプションが表示されます。
- 本番インスタンスで アジャイル開発 2.0 および パフォーマンスアナリティクスプラグインをアクティブ化するには、別のパフォーマンスアナリティクスライセンスが必要になる場合があります。詳細については、ServiceNow のサポートにお問い合わせください。

手順

1. 移動先 ServiceNow® Store.
2. Agile 2.0 のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパックを検索します。
3. アプリケーションタイルをクリックします。
   インストールしているアプリケーションに関する詳細情報を表示できます。

   注:
   該当する場合は、[他の要件] および [依存関係] セクションを読むことを検討してください。

4. [取得] をクリックし、Now Support ログイン認証情報を入力します。
5. [インストールを要求] をクリックします。
6. [インスタンス名] フィールドに詳細を入力し、[インスタンスを検証] をクリックします。
7. [インスタンスの理由] フィールドに詳細を入力し、[要求] をクリックします。
   詳細なインストール手順が記載されたメールが届きます。
8. Agile 2.0 のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパックをインストールしたいインスタンスにログインします。
9. 移動先 システムアプリケーション > アプリケーション.
10. アプリケーションを見つけて選択し、[インストール] をクリックします。

タスクの結果
アジャイル開発 2.0ダッシュボードには以下からアクセスできます アジャイル開発 > ダッシュボード.

次のタスク
[Scrum] 日次データコレクションジョブを開始します。詳細については、「Agile 2.0 ダッシュボードの日次データ収集の有効化」を参照してください。

Agile 2.0 ダッシュボードの日次データ収集の有効化

新しいデータに対するスコアの収集を自動的に開始するために、スケジュール済みデータ収集を有効にします。データ収集ジョブにより、自動インジケーターおよび自動ブレークダウンのスコアが自動的に収集されます。

始める前に
必要なロール：pa_admin または admin

このタスクについて

注:
履歴データ収集は、[Scrum] 日次データコレクションジョブの基礎となるインジケーターではサポートされていません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > パフォーマンスアナリティクス > データコレクター > ジョブ.
2. [Scrum] 日次データコレクションジョブを見つけて開きます。
3. [Scrum] 日次データコレクションジョブを開始します。
   a. [ジョブパラメーター] セクションまで下方向にスクロールします。
   b. [実行方法] フィールドを pa_admin、pa_data_collector、または admin ロールのいずれかを持つユーザーに設定します。
   c. 組織に対して [実行時のタイムゾーン] フィールドのタイムゾーンが適切であることを確認します。
   このタイムゾーンは、次の目的で使用されます。
      - このジョブ用に作成されたデータベースクエリ
      - [[作成][日付][今日]] などのインジケーター条件
   d. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、ジョブのスケジュール実行を有効にします。
4. [更新] をクリックします。

Agile 2.0 ダッシュボードのレイアウトのアップグレード

Solution Library を使用して、Agile 2.0 ダッシュボードの最新レイアウトにアップグレードします。

Agile 2.0 のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパックである最新のバージョン 1.1 にアップグレードした既存のユーザーは、Solution Library からダッシュボードの最新のレイアウトをインストールできます。

たとえば、アプリケーションのバージョン 1.0.2 以前からアップグレードしている場合は、Solution Library から次のダッシュボードをインストールすることで、最新のレイアウトを利用できます。

- Agile 2.0 エピックダッシュボード
- Agile 2.0 スプリントダッシュボード
- Agile 2.0 以前のスプリントダッシュボード
- Agile 2.0 リリースダッシュボード
- Agile 2.0 チームダッシュボード

注:
Paris リリースのユーザーの場合、Solution Library コンテンツフォームに [インストール] および [アップグレード] ボタンは表示されません。この問題の解決方法については、「ストアアプリに PA Solution Library を許可する」を参照してください。


Agile 2.0 エピックダッシュボード

エピックダッシュボードを使用して、特定の期間におけるエピックのストーリーの進行状況を視覚的に分析します。

移動先 すべて > アジャイル開発 > ダッシュボード をクリックし、[**Agile 2.0** エピックダッシュボード] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[エピックサマリー] タブ

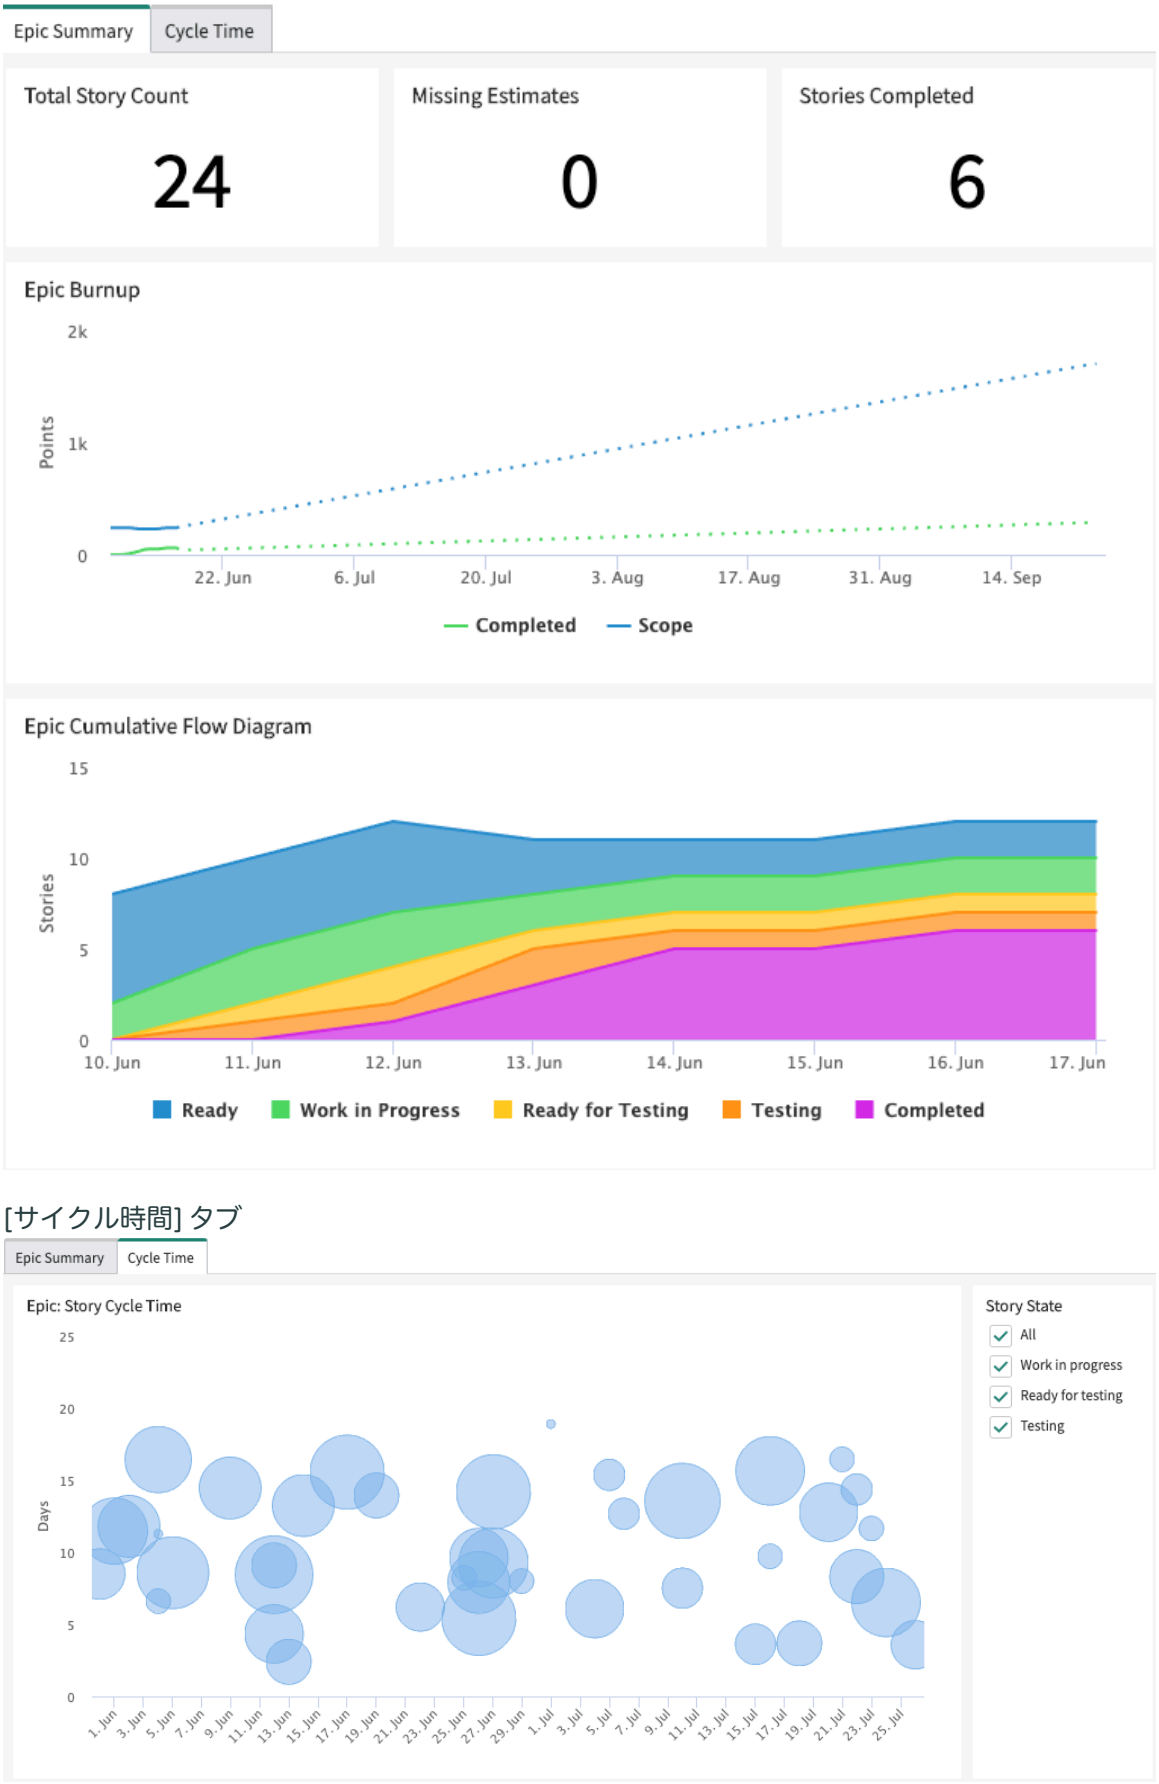

[サイクル時間] タブ

Agile 2.0 エピックダッシュボードには、次の情報が表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 完了したストーリーの数と、エピックの推定値が欠落しているストーリーの数が表示されます。
- 現在のステータスのエピックのストーリー数とその進行状況が表示されます。
- スコープの変更がある場合はその変更と、そうしたスコープの変更の傾向を示します。
- チームがエピックのストーリーで作業しているペースを示します。
- スコープの変更と完了のペースの傾向に基づいて、エピックが完了する可能性が高い時期を予測します。
- エピックのストーリーが進行中ステータスから完了済みステータスになるまでの経過時間を表示します。

キャンセルされたストーリーは、このデータのいずれにも含まれません。

エンドユーザーとロール

必要なロールとメリットを含むエンドユーザーの目標

エンドユーザーと目標	必要なロール	利点
スクラムマスター：エピックを時間どおりに完了するには、チームストーリーのリアルタイムの進捗状況とエピックのスコープの変更を明確に把握する必要があります。	scrum_user	• エピックのストーリーの現在の状況と各状況にある時間を表示できます • エピックバーンアップの傾向を表示できます • エピックの完了日を推定できます • 予想よりも時間がかかった外れ値のストーリーを特定できます

インジケーター

スクラム：エピック内のすべてのストーリーのストーリーポイントの合計

エピックのサイズを示すスコープ系列をエピックバーンアップレポートに生成します。

スクラム：エピック内の完了したストーリーのストーリーポイントの合計

エピックバーンアップレポートで、エピック内で完了した作業量を示す完了済み系列を生成します。

スクラム：現在のエピック内のすべてのストーリー数

現在のエピックのストーリー数をステータス別に示す、バブルチャートのデータ系列のエピック累積フロー図レポートを生成します。

ブレークダウン

- スクラム：エピック
- スクラム：ステータス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ウィジェット

合計ストーリー数

エピックの合計ストーリー数を示します。

完了したストーリー

エピック内で完了したストーリー数を示します。

推定の欠如

推定値が欠落しているエピック内のストーリー数を示します。


データの可視化

Agile 2.0 のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパックの 1.0.2 以前のバージョンからアップグレードしようとする場合、ソリューションライブラリからこのダッシュボードをインストールしてレイアウトをアップグレードし、次のデータの可視化にアクセスします。

- エピック累積フロー図
- ストーリーのサイクル時間

詳細については、「Agile 2.0 ダッシュボードのレイアウトのアップグレード」を参照してください。

エピックサマリー


タイトル	タイプ	説明
エピックのバーンアップ	線グラフ 	エピックバーンアップの傾向を表示します。エピックが何日で完了す す。 エピックバーンアップレポートは、環境設定に基づいて非表示/表 とができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：エピックのサイズを示します。 • スコープ予測：履歴データに基づいて、将来の日付のスコープ変 します。 • 完了：エピック内の完了した作業量を示します。 • 完了予測：将来の日付のバーンアップを予測します。エピックを できるかどうかを示します。この予測は履歴データに基づいてい 注: 完了した予測データ系列がスコープ予測データ系列と交差する り、エピックがいつ完了するかが予測されます。完了した予測 予測系列がどこまでも交差しないように見える場合は、作業の スコープが追加されていることを示してるので、注意が必要で
エピック累積フロー図	面グラフ 	実際の開始日から終了日まで、エピックのすべてのストーリーの進 す。 各ステータスのストーリーの数を、ステータスの開始時間、ステー 間、およびステータスの終了時間により示します。 エピック累積フロー図は、環境設定に基づいて非表示/表示を切り る次のバブルチャートから構成されています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エピックサマリー (続く)

タイトル	タイプ	説明
		• 準備完了：作業を開始する準備が完了しているエピックのストー す。 • 対応中：開発中のエピックのストーリー数を示します。 • テストの準備完了：テストする準備が完了しているエピックのス ます。 • テスト：現在テスト中のエピックのストーリー数を示します。 • 完了：完了したストーリー数を示します。 注: 「準備完了」ステータスおよび「キャンセル」ステータスのス のレポートには含まれません。


サイクル時間

タイトル	タイプ	説明
ストーリーのサイクル時間	バブルチャート 	エピックの各ストーリーが「進行中」ステータスから「完了」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。 グラフ内の各バブルはストーリーを表しています。バブルの x 軸からの高さは、ストーリーが「進行中」ステータスから「完了済み」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。ストーリーバブルの大きさは、ストーリーポイントに基づき、相対的なものです。 バブルの上にマウスカーソルを合わせると、該当するストーリーに関する次の詳細が表示されます。 • ストーリーポイント • ストーリーが「完了」に移行した日付 • ストーリーの合計サイクル時間 (日数) • ストーリーが [対応中] ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト準備完了」ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト中」ステータスであった日数

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サイクル時間 (続く)

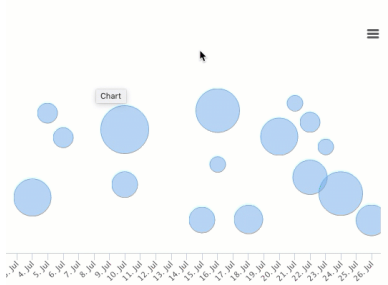タイトル	タイプ	説明
		レポートの右側にある [ストーリーのステータス] セクションから、レポートをフィルタリングして、選択した状況のストーリーのサイクル時間を表示できます。グラフには、各ストーリーのサイクル時間が、選択した状況のすべての期間の累積合計として表示されます。 レポートのチャートのいずれかの領域で、ストーリーが多すぎてバブルが密集しているように見える場合は、レポートの特定の領域を拡大して見やすくすることができます。 


バーンアップおよび累積フロー図のレポートをカスタマイズできます。詳細については、「Agile 2.0 ダッシュボードレポートのカスタマイズ」を参照してください。

Agile 2.0 スプリントダッシュボード

スプリントダッシュボードを使用して、現在のスプリントでストーリーの進行状況を追跡し、スプリントの完了を予測します。

移動先 すべて > アジャイル開発 > ダッシュボード をクリックし、[**Agile 2.0** スプリントダッシュボード] を選択します。


[Agile スプリントダッシュボード] ウィジェット

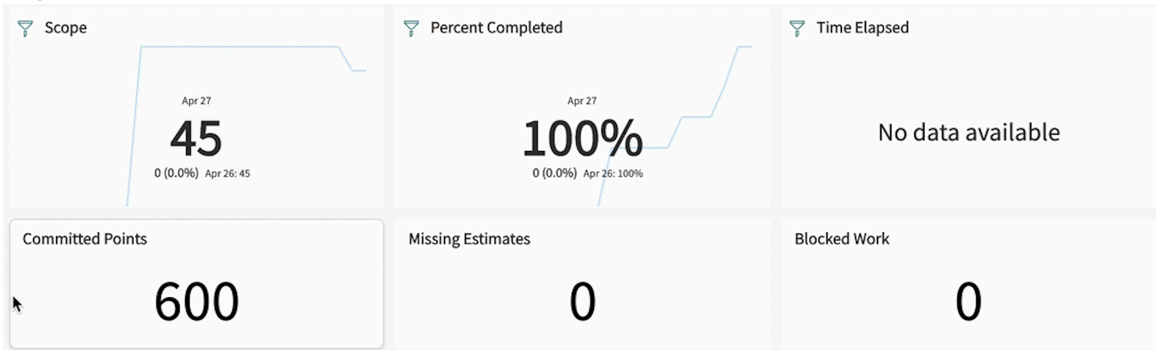


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳


Agile スプリントダッシュボードバーンダウンレポート

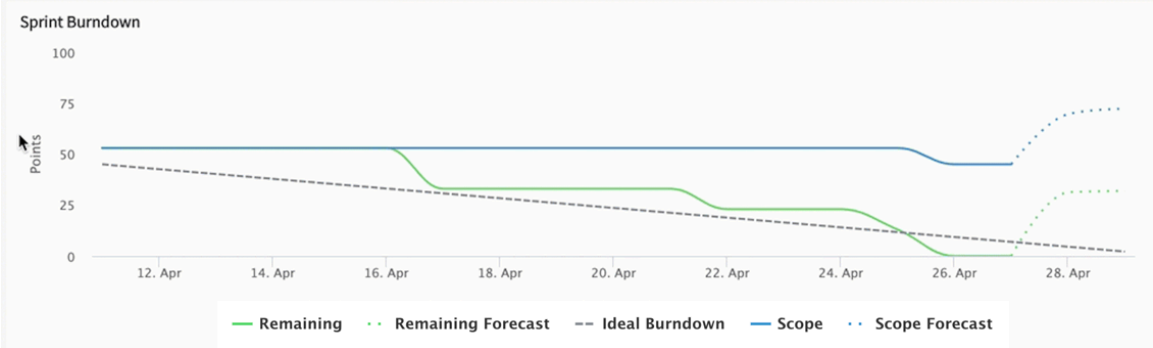

Agile スプリントダッシュボードバーンアップの可視化

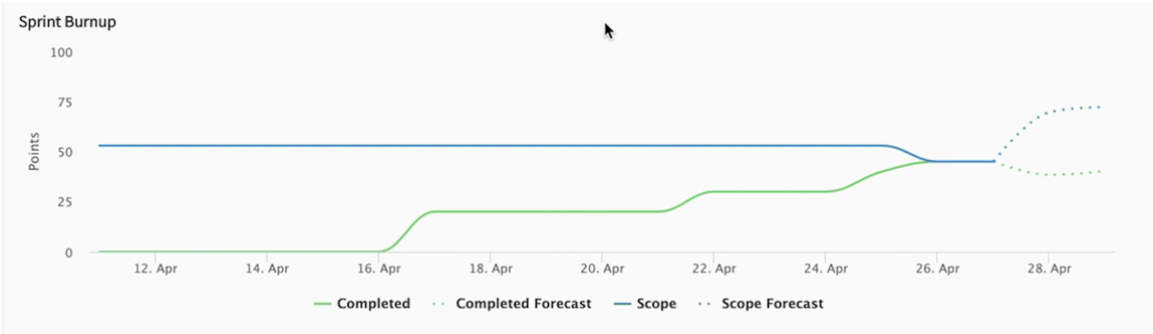

Agile スプリントダッシュボードの累積フロー図

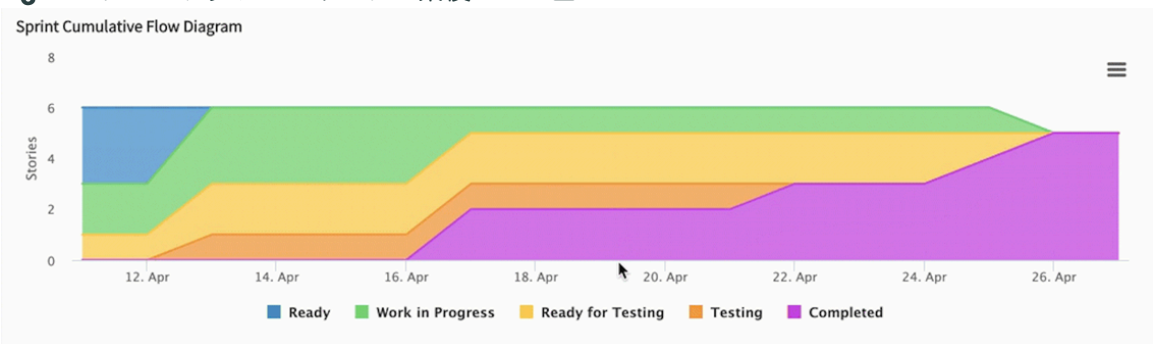

Agile 2.0 スプリントダッシュボードには、次のインサイトが表示されます。

- 完了した作業の割合、経過時間、推定が欠落しているストーリーの合計数など、スプリントの詳細を表示します。
- 現在のステータスのスプリントのストーリー数とその進行状況が表示されます。
- スコープの変更がある場合はその変更と、そうしたスコープの変更の傾向を示します。
- チームがスプリントの目標を達成するためにストーリーを進捗させる方法を示します。
- スプリントが予定通りに完了する可能性を示す予測データ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール	利点
スクラムマスターおよびスプリント計画者：スプリントを予定どおりに完了することを目的とした計画調整のために、スプリントのスコープの変更、完了済み作業、および残り作業を可視化する必要があります。	scrum_user	• スプリントのバーンアップとバーンダウンの傾向を分析する • スプリントのスコープの変更を分析する • スプリントのストーリーの現在の状況を表示し、各状況にある時間を分析します • スプリントの完了日を推定します

インジケーター

スクラム：現在のスプリントのすべてのストーリーのストーリーポイントの合計

スプリントバーンダウンレポートおよびバーンアップレポートでスコープ系列を生成します。スコープ系列は、スプリントに計画されている作業量 (ストーリーポイント) を示します。

スクラム：現在のスプリントのアクティブストーリーのストーリーポイントの合計

スプリントバーンダウンレポートおよびバーンアップレポートで完了した系列を生成します。完了済み系列は、スプリントで完了済みの作業量 (ストーリーポイント) を示します。

スクラム：スプリントでの経過時間

[経過時間] ウィジェットに表示される時間を計算します。

スクラム：現在のスプリントのすべてのストーリー数

スプリント累積フロー図レポートにバブルチャートの系列を生成します。現在のスプリントのストーリー数を示します。

スクラム：ポイントによる完了率

スプリントに対して完了した作業量 (パーセンテージ) を計算します。値は、次の式の結果です。

```
([[Scrum: Sum of story points of completed stories in current sprint]]/[[Scrum: Sum of story points of all stories in the current sprint]]*100)
```

ブレークダウン

- スクラム：スプリント
- スクラム：現在のスプリント
- スクラム：ステータス

ウィジェット

スコープ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スプリントに計画されている作業量 (ストーリーポイント) を示します。このウィジェットを使用すると、スプリントの目標を達成するために完了する必要がある作業量を一目で確認できます。また、スプリントに計画されたストーリーの詳細にドリルダウンすることもできます。

完了率

ストーリーポイントを使用して、スプリントで完了した作業の割合を示します。このウィジェットを使用すると、スプリントで完了済みの作業量を一目で確認できます。これらのウィジェットでは、隣接する [経過時間] ウィジェットと併用して、スケジュールどおりにスプリントの目標を達成できる速度で作業を完了しているかどうかを簡単に確認できます。

経過時間

スプリントの開始日から終了予定日までの経過時間の割合を示します。これらのウィジェットでは、隣接する [完了率] ウィジェットと併用して、スケジュールどおりにスプリントの目標を達成できる速度で作業を完了しているかどうかを簡単に確認できます。

コミットポイント

スプリントのコミット済みスコープ (ストーリーポイント数) を示します。これらのウィジェットでは、隣接する [スコープ] ウィジェットとともに使用して、スプリントの開始時にコミットされたスコープと、スプリントの現在のスコープの相違を確認できます。

注:
このウィジェットはデフォルトで表示されません。レポートからダッシュボードに追加できます。詳細については、「レスポンシブダッシュボードの編集」を参照してください。

推定の欠如

推定値が欠落しているスプリント内のストーリーの合計数を示します。このダッシュボードの他のインジケーター、ウィジェット、およびレポートの推定値を活用する必要があります。

ヒント:
ストーリーを推定しない場合は、[ストーリーポイント] フィールドに「1」を入力します。他のインジケーター、ウィジェット、およびレポートは、カウントごとに効果的に機能します。

ブロックされた作業

ブロックされたスプリントの作業量 (ストーリーポイント単位) を示します。

データの可視化

Agile 2.0 のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパックにバージョン 1.0.2 以前からアップグレードする場合は、ソリューションライブラリからこのダッシュボードをインストールしてレイアウトをアップグレードし、次の可視化にアクセスします。

- スプリントバーンアップ
- スプリント累積フロー図

詳細については、「Agile 2.0 ダッシュボードのレイアウトのアップグレード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
スプリントダッシュボードに表示されるすべてのレポートでは、スプリントの計画終了日がフィルターとして使用されます。完了したスプリントは、計画終了日が現在の日付以下の場合にのみグラフに表示されます。

タイトル	タイプ	説明
スプリントバーンダウン	線 	スコープの変更がある場合はその変更と、そうしたスコープの変更の傾向を示します。作業の理想的なペース、残る作業量、およびスプリントの終了前にスコープが完了する可能性があるかどうかを示します。 スプリントバーンダウンレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：スプリントに計画されている作業量を示します。 • スコープ予測：履歴データに基づいて、将来の日付のスコープ変更の可能性を予測します。 • 理想的なバーンダウン：チームがスプリントを時間どおりに完了するためにストーリーをどのように進捗させる必要があるかを示します。 • 残り：スプリントの完了までに残る作業量を示します。実際のバーンダウンが理想的なバーンダウンを上回っている場合は、当初の予定よりも多くの作業が残っていることを意味します。チームの進行は、スプリントのスケジュールより遅れています。実際のバーンダウンが理想的なバーンダウンを下回っている場合は、当初の予定よりも多くの作業が残っていることを意味します。チームの進行は、スプリントのスケジュールより進んでいます。 • 残りの予測：将来の日付のバーンダウンを予測します。スプリントを時間どおりに完了できるかどうかを示します。この予測は履歴データに基づいています。
スプリントバーンアップ	線 	スコープの変更を示すスプリントバーンアップの傾向を示します。スコープの将来の変更と作業完了の傾向を予測します。 スプリントバーンアップレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：スプリントに計画されている作業量を示します。 • スコープ予測：履歴データに基づいて、将来の日付のスコープ変更の可能性を予測します。 • 完了：スプリント内の完了した作業量を示します。 • 完了予測：将来の日付のバーンアップを予測します。スプリントを時間どおりに完了できるかどうかを示します。この予測は履歴データに基づいています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
スプリント累積フロー図	面 	実際の開始日から終了日まで、スプリントのすべてのストーリーの進行状況を監視します。 各ステータスのストーリーの数を、ステータスの開始時間、ステータスでの経過時間、およびステータスの終了時間により示します。 スプリント累積フロー図は、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のバブルチャートから構成されています。 • 準備完了：作業を開始する準備が完了しているスプリントのストーリー数を示します。 • 対応中：開発中のスプリントのストーリー数を示します。 • テストの準備完了：テストする準備が完了しているスプリントのストーリー数を示します。 • テスト：現在テスト中のスプリントのストーリー数を示します。 • 完了：完了したスプリントのストーリー数を示します。 注: 「準備完了」状況および「キャンセル」状況のストーリーは、このレポートには含まれません。


バーンアップ、バーンダウン、および累積フロー図のレポートをカスタマイズできます。詳細については、「Agile 2.0 ダッシュボードレポートのカスタマイズ」を参照してください。

Agile 2.0 以前のスプリントダッシュボード

以前のスプリントダッシュボードでは、スコープ、実際のバーンダウンとバーンアップ、および以前のスプリントの予測傾向に関するデータを視覚化できます。データを分析し、今後のスプリントの作業を計画します。

移動先 すべて > アジャイル開発 > ダッシュボード をクリックし、[**Agile 2.0** 以前のスプリントダッシュボード] を選択します。


Agile 2.0 以前のスプリントダッシュボードウィジェット

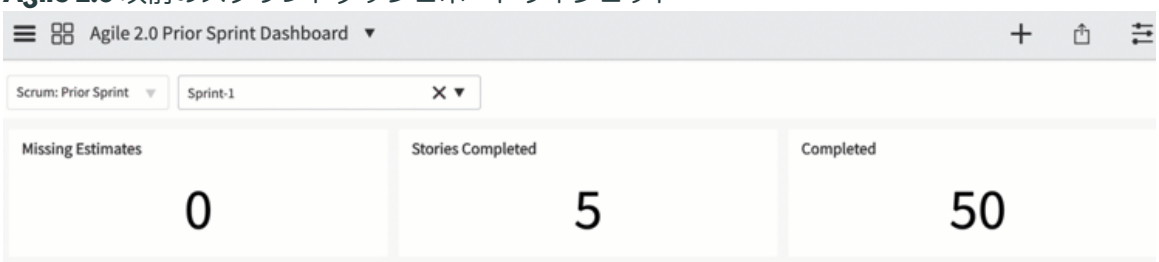


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Agile 2.0 以前のスプリントダッシュボードバーンダウンの可視化

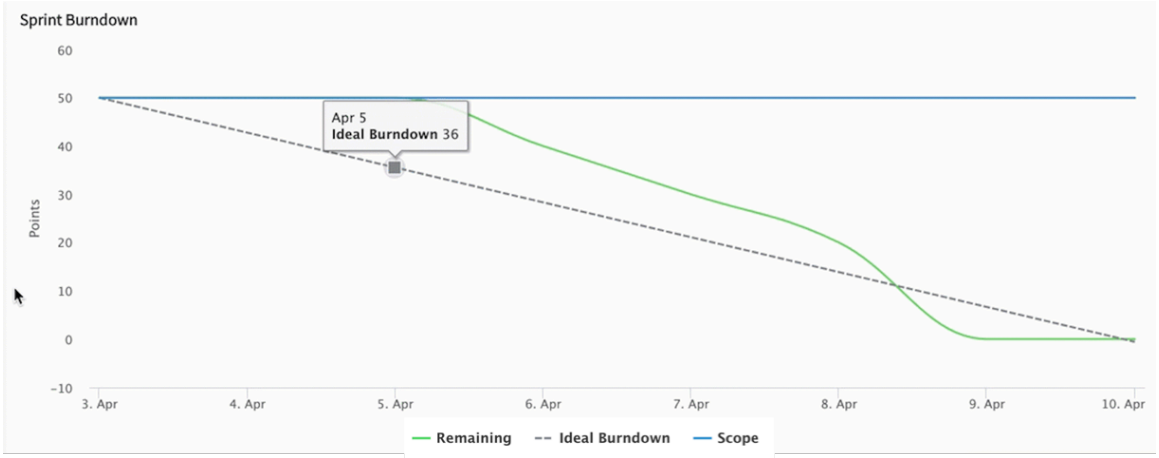

Agile 2.0 以前のスプリントダッシュボードバーンアップの可視化

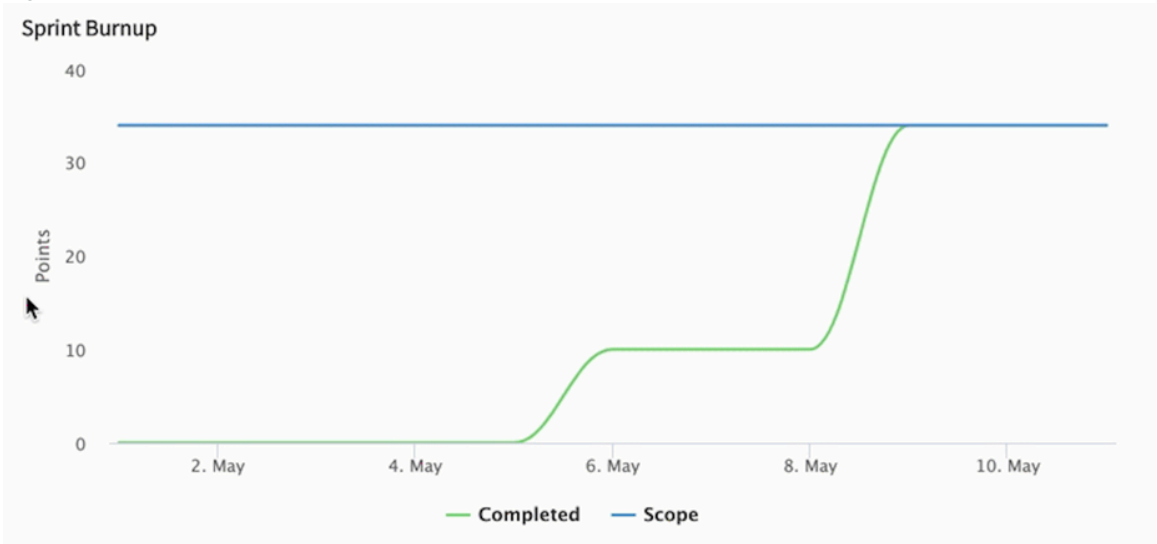

自動翻訳

注:
キャンセルされたストーリーは、このデータのいずれにも含まれません。

エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール	利点
スクラムマスターおよびスプリントプランナー：以前のスプリントのスコープと予測傾向における実際の変化を可視化する必要があります。	scrum_user	• スプリントのバーンアップとバーンダウンの傾向を分析できます • 今後のスプリントの計画にデータを利用できます

インジケーター

このダッシュボードのレポートのデータを生成するために使用されるインジケーターは次のとおりです。

スクラム：現在のスプリントのすべてのストーリーのストーリーポイントの合計

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スプリントバーンダウンレポートおよびスプリントバーンアップレポートでスコープ系列を生成します。

スクラム：現在のスプリントのアクティブストーリーのストーリーポイントの合計

スプリントバーンダウンレポートおよびスプリントバーンアップレポートで完了した系列を生成します。

ブレークダウン

インジケーターで使用されるブレークダウンは次のとおりです。

- スクラム：スプリント
- スクラム：以前のスプリント

ウィジェット

コミットポイント

スプリントのコミット済みスコープ (ストーリーポイント数) を示します。

完了したストーリー

以前のスプリントで完了したストーリーの合計数を示します。

完了


以前のスプリントで完了した作業量 (ストーリーポイント単位) を示します。

推定の欠如

推定値が欠落している以前のスプリント内のストーリーの合計数を示します。


データの可視化

Agile 2.0 のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパックに 1.0.2 以前のバージョンからアップグレードしようとする場合、ソリューションライブラリからこのダッシュボードをインストールしてレイアウトをアップグレードし、スプリントバーンアップの可視化にアクセスします。詳細については、「Agile 2.0 ダッシュボードのレイアウトのアップグレード」を参照してください。

タイトル	タイプ	説明
スプリントバーンダウン	線グラフ 	スコープの変更がある場合はその変更と、そうしたスコープの変更の傾向を示します。作業の理想的なペース、残る作業量、およびスプリントの終了前にスコープが完了する可能性があるかどうかを示します。 スプリントバーンダウンレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：スプリントに計画されている作業量を示します。 • 理想的なバーンダウン：チームがスプリントを時間どおりに完了するためにストーリーをどのように進捗させる必要があるかを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
		• 残り：スプリントの完了までに残る作業量を示します。 残りが理想的なバーンダウンを上回っている場合は、当初の予定よりも多くの作業が残っていることを意味します。チームの進行は、スプリントのスケジュールより遅れています。 残りが理想的なバーンダウンを下回っている場合は、当初の予定よりも少ない作業が残っていることを意味します。チームの進行は、スプリントのスケジュールより進んでいます。 バーンダウンの傾向を分析し、それに応じて今後のスプリントの作業負荷を計画します。
スプリントバーンアップ	線グラフ 	スコープの変更を示す以前のスプリントバーンアップの傾向を示します。チームの完了作業の傾向について、将来の変化を分析します。 スプリントバーンアップレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：スプリントに計画されている作業量を示します。 • 完了：スプリント内の完了した作業量を示します。

バーンアップおよびバーンダウンのレポートをカスタマイズできます。詳細については、「Agile 2.0 ダッシュボードレポートのカスタマイズ」を参照してください。

Agile 2.0 リリースダッシュボード


Agile 2.0 リリースダッシュボードを使用して、ストーリーの進捗状況を追跡し、現在のリリースでスコープの変更を分析します。

移動先 すべて > アジャイル開発 > ダッシュボード をクリックし、[**Agile 2.0** リリースダッシュボード] を選択します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[リリースサマリー] タブ

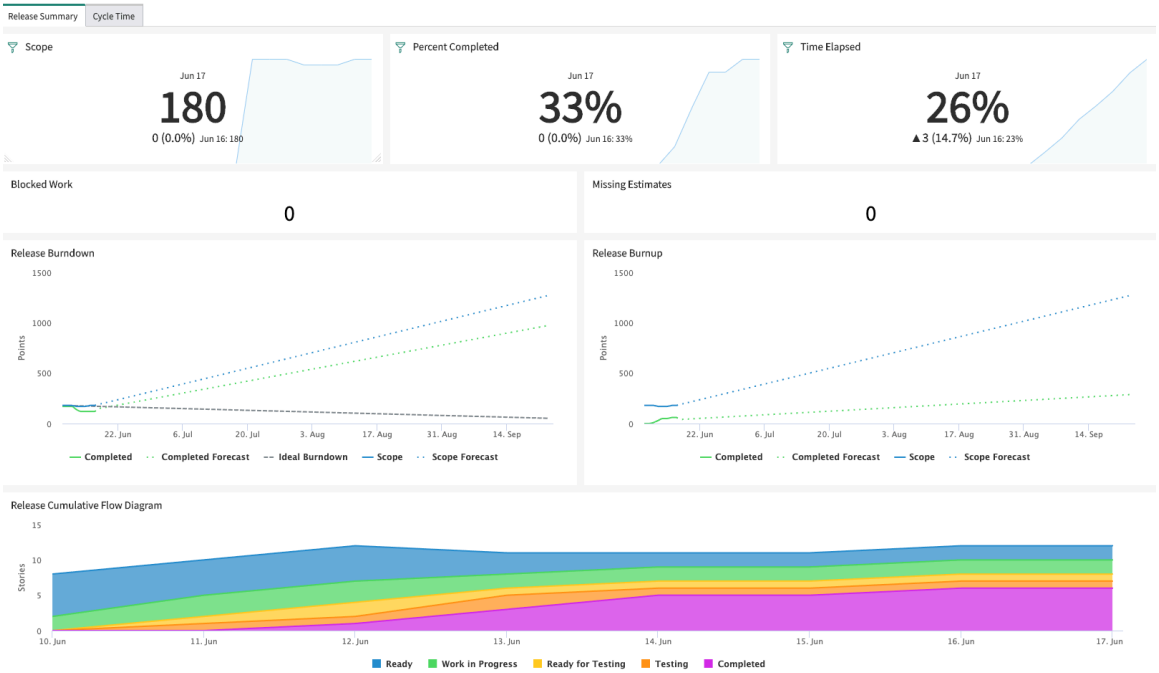

[サイクル時間] タブ

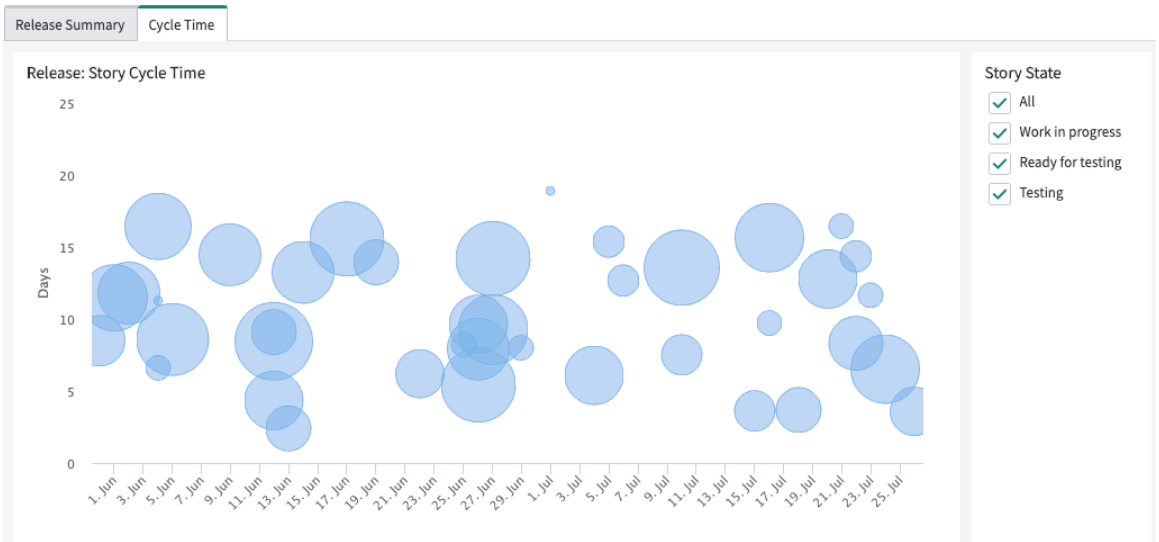

ダッシュボード：

- 完了した作業の割合、経過時間、推定が欠落しているストーリーの合計数など、リリースの重要な詳細を表示します。
- 現在のステータスのリリースのストーリー数とその進行状況が表示されます。
- スコープの変更がある場合はその変更と、そうしたスコープの変更の傾向を示します。
- チームがリリース予定のストーリーを完了するペースを示します。
- リリースが予定通りに完了する可能性を示す予測データ。
- リリースのストーリーが進行中ステータスから完了済みステータスになるまでの経過時間を表示します。

注:
キャンセルされたストーリーは、このデータのいずれにも含まれません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エンドユーザーとロール

必要なロールとメリットを含むエンドユーザーの目標

エンドユーザーと目標	必要なロール	利点
製品オーナー：リリースのストーリーのスコープ変更、チームのペース、およびリアルタイムの進捗状況を可視化する必要があります。	scrum_user	• リリースが予定されているストーリーの進捗状況を追跡できます • ボトルネックを解決し、リリースを予定どおりに提供できます • 予想よりも時間がかかった外れ値のストーリーを特定できます

インジケーター

スクラム：アクティブなリリースの完了したストーリーのストーリーポイントの合計

リリースバーンダウンレポートおよびバーンアップレポートで完了した系列を生成します。この系列は、リリースについて完了済みのストーリーポイントの作業量を示します。

スクラム：現在のリリースのアクティブストーリーのストーリーポイントの合計

リリースバーンダウンレポートおよびリリースバーンアップレポートでスコープ系列を生成します。スコープ系列は、リリースに計画されている作業量 (ストーリーポイント) を示します。

スクラム：リリースでの経過時間

[経過時間] ウィジェットに表示される時間を計算します。

スクラム：現在のリリース内のすべてのストーリー数

現在のリリースのストーリー数をステータス別に示す、バブルチャートのデータ系列のリリース累積フロー図レポートを生成します。

ブレークダウン

- スクラム：リリース
- スクラム：ステータス

ウィジェット

完了率

リリースで完了した作業の割合 (ストーリーポイント単位) を示します。このウィジェットを使用すると、リリースで完了済みの作業量を一目で確認できます。これらのウィジェットでは、隣接する [経過時間] ウィジェットと併用して、スケジュールどおりにリリースの目標を達成できる速度で作業を完了しているかどうかを簡単に確認できます。

スコープ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リリースに計画されている作業量 (ストーリーポイント) を示します。このウィジェットを使用すると、リリースの目標を達成するために完了する必要がある作業量を一目で確認できます。また、リリースに計画されたストーリーの詳細にドリルダウンすることもできます。

経過時間

リリースの開始日から終了予定日までの経過時間の割合を示します。これらのウィジェットでは、隣接する [完了率] ウィジェットと併用して、スケジュールどおりにリリースの目標を達成できる速度で作業を完了しているかどうかを簡単に確認できます。

ブロックされた作業

推定値が欠落しているリリース内のストーリーの合計数を示します。このダッシュボードの他のインジケーター、ウィジェット、およびレポートの推定値を活用する必要があります。

> **注:**
> ストーリーを推定しない場合は、[ストーリーポイント] フィールドに「1」を入力します。他のインジケーター、ウィジェット、およびレポートは、カウントごとに効果的に機能します。

ブロックされた作業

推定値が欠落しているリリース内のストーリーの合計数を示します。

データの可視化

Agile 2.0 のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパックに 1.0.2 以前のバージョンからアップグレードしようとする場合、ソリューションライブラリからこのダッシュボードをインストールしてレイアウトをアップグレードし、次の可視化にアクセスします。

- リリース累積フロー図
- ストーリーのサイクル時間

詳細については、「Agile 2.0 ダッシュボードのレイアウトのアップグレード」を参照してください。

リリースサマリー

タイトル	タイプ	説明
リリースのバーンアップ	線グラフ 	バーンアップの傾向を分析し、リリース作業がいつ完了する可能性があるかを予測します。リリースバーンアップレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：リリースに計画されている作業量を示します。 • スコープ予測：将来の日付のスコープ変更の可能性を予測します。この予測は履歴データに基づいています。 • 完了：完了したリリース作業量を示します。 • 完了予測：リリース内の将来の日付のバーンアップを予測します。これは、リリースを時間どおりに提供できるかどうかを示すものです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リリースサマリー (続く)

タイトル	タイプ	説明
		注: 完了した予測データ系列がスコープ予測データ系列と交差するポイントにより、リリースがいつ完了するかが予測されます。完了した予測系列とスコープ予測系列がどこまでも交差しないように見える場合は、作業の完了よりも速くスコープが追加されていることを示してるので、注意が必要です。
リリースバーンダウン	線グラフ 	スコープの変更がある場合はその変更と、そうしたスコープの変更の傾向を示します。作業の理想的なペース、残る作業量、およびスプリントの終了前にスコープが完了する可能性があるかどうかを示します。リリースバーンダウンレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：リリースに計画されている作業量を示します。 • スコープ予測：リリース内の将来の日付のスコープ変更の可能性を予測します。この予測は履歴データに基づいています。 • 理想的なバーンダウン：チームがリリースを時間どおりに提供するためにストーリーをどのように進捗させる必要があるかを示します。 • 残り：完了した作業量を示します。 残りが理想的なバーンダウンを上回っている場合は、当初の予定よりも多くの作業が残っていることを意味します。チームの進行は、リリースのスケジュールより遅れています。残りが理想的なバーンダウンを下回っている場合は、当初の予定よりも多くの作業が残っていることを意味します。チームの進行は、リリースのスケジュールより進んでいます。 • 完了予測：リリース内の将来の日付のバーンダウンを予測します。これは、リリースを時間どおりに提供できるかどうかを示すものです。
リリース累積フロー図	エリア 	実際の開始日から終了日まで、リリースのすべてのストーリーの進行状況を監視します。 各ステータスのストーリーの数を、ステータスの開始時間、ステータスでの経過時間、およびステータスの終了時間により示します。 リリース累積フロー図は、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のエリアから構成されています。 • 準備完了：作業を開始する準備が完了しているリリースのストーリー数を示します。 • 対応中：開発中のリリースのストーリー数を示します。 • テストの準備完了：テストする準備が完了しているリリースのストーリー数を示します。 • テスト：現在テスト中のリリースのストーリー数を示します。 • 完了：完了したリリースのストーリー数を示します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リリースサマリー (続く)

タイトル	タイプ	説明
		注: 「準備完了」状況および「キャンセル」状況のストーリーは、このレポートには含まれません。


サイクル時間

タイトル	タイプ	説明
ストーリーのサイクル時間	バブル チャート 	リリースの各ストーリーが「進行中」ステータスから「完了」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。 グラフ内の各バブルはストーリーを表しています。バブルの x 軸からの高さは、ストーリーが「進行中」ステータスから「完了済み」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。ストーリーバブルの大きさは、ストーリーポイントに基づき、相対的なものです。 バブルの上にマウスカーソルを合わせると、該当するストーリーに関する次の詳細が表示されます。 • ストーリーポイント • ストーリーが「完了」に移行した日付 • ストーリーの合計サイクル時間 (日数) • ストーリーが [対応中] ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト準備完了」ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト中」ステータスであった日数 レポートの右側にある [ストーリーのステータス] セクションから、レポートをフィルタリングして、選択した状況のストーリーのサイクル時間を表示できます。グラフには、各ストーリーのサイクル時間が、選択した状況のすべての期間の累積合計として表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サイクル時間 (続く)

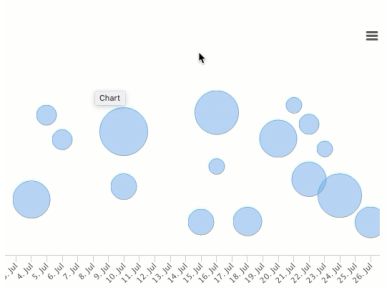タイトル	タイプ	説明
		レポートのチャートのいずれかの領域で、ストーリーが多すぎてバブルが密集しているように見える場合は、レポートの特定の領域を拡大して見やすくすることができます。 


バーンアップ、バーンダウン、および累積フロー図のレポートをカスタマイズできます。詳細については、「Agile 2.0 ダッシュボードレポートのカスタマイズ」を参照してください。

Agile 2.0 以前のリリースダッシュボード

以前のリリースダッシュボードでは、スコープ、実際のバーンアップとバーンダウン、および以前のリリースの予測傾向に関するデータを視覚化できます。データを分析し、今後のリリースの作業を計画します。


移動先 すべて > アジャイル開発 > ダッシュボード をクリックし、[**Agile 2.0** 以前のリリースダッシュボード] を選択します。

Agile 2.0 以前のリリースのバーンダウンレポート

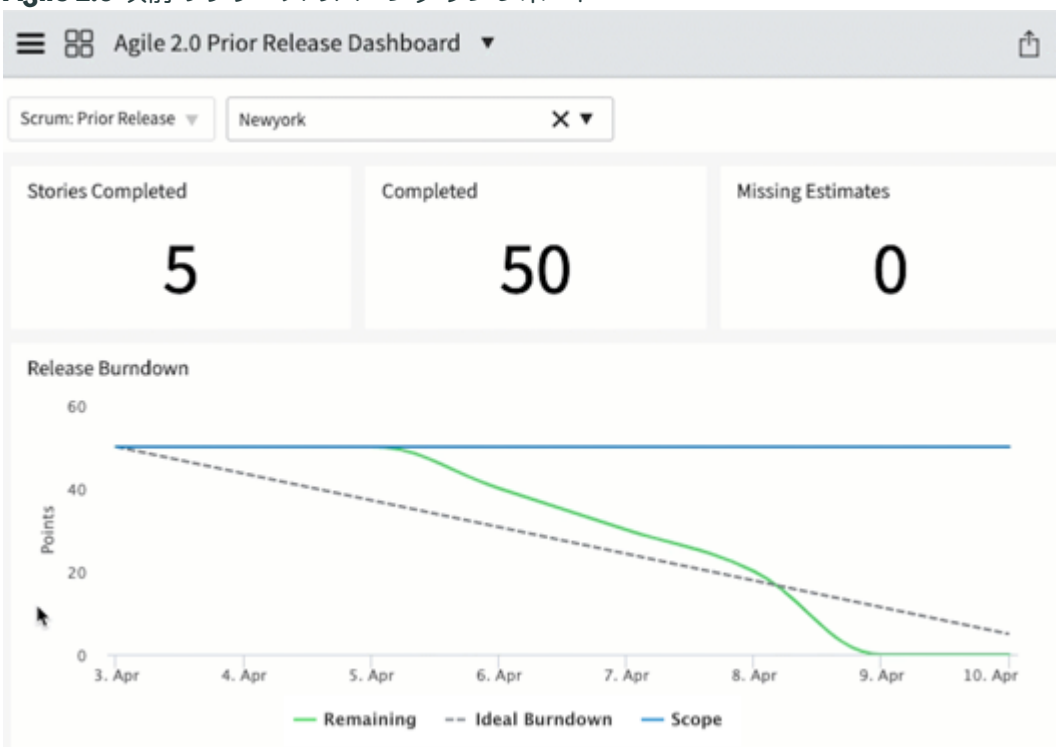

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Agile 2.0 以前のリリースのバーンアップレポート

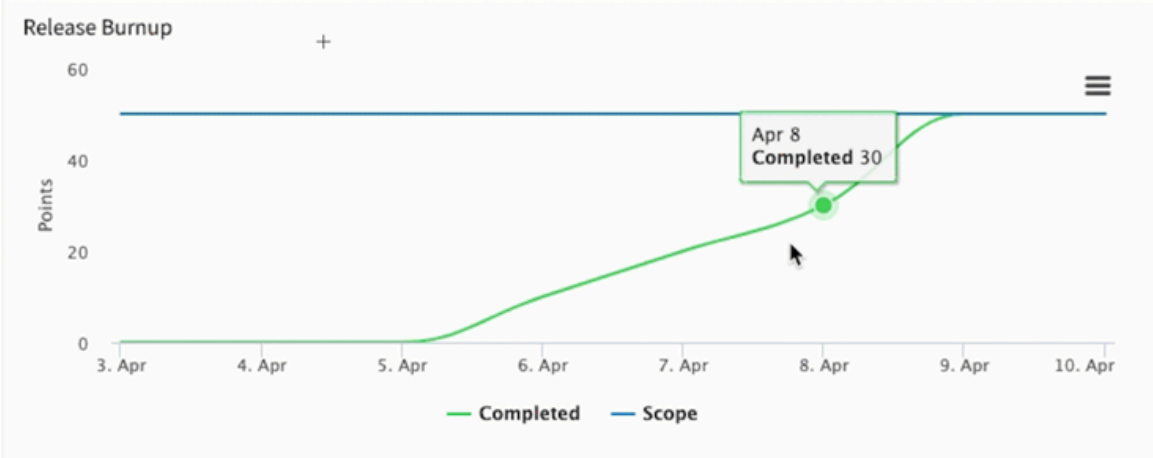

注:
キャンセルされたストーリーは、このデータのいずれにも含まれません。

エンドユーザーとロール

必要なロールとメリットを含むエンドユーザーの目標

エンドユーザーと目標	必要なロール	利点
製品オーナー：以前のリリースのスコープと予測傾向における実際の変化を可視化する必要があります。	scrum_user	次の傾向を分析します。 • スコープの変更 • 以前のリリース

インジケーター

スクラム：アクティブなリリースの完了したストーリーのストーリーポイントの合計
: リリースバーンダウンレポートに実際のバーンダウン系列を生成し、リリースバーンアップレポートに完了済みの系列を生成します。

スクラム：アクティブなリリースのすべてのストーリーのストーリーポイントの合計
: リリースバーンダウンレポートおよびリリースバーンアップレポートでスコープ系列を生成します。

ブレークダウン

- スクラム：リリース
- スクラム：以前のリリース

ウィジェット

完了したストーリー
: 以前のリリースで完了したストーリーの合計数を示します。

完了
: 以前のリリースで完了した作業量 (ストーリーポイント単位) を示します。

推定の欠如



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

推定値が欠落しているリリース内のストーリーの合計数を示します。

データの可視化

以前のリリースの概要

タイトル	タイプ	説明
リリースバーンアップ	線グラフ 	以前のリリースのバーンアップ傾向を分析します。 以前のリリースバーンアップレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：リリースに計画されている作業量を示します。 • 完了：このリリースに対して完了したリリース作業量を示します。
リリースバーンダウン	線グラフ 	スコープとスコープの変更率、作業の理想的な完了率、および実際の作業完了率を表示します。バーンダウンの傾向を分析し、それに応じて今後のリリースの作業負荷を計画します。 以前のリリースバーンアップレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：リリースに計画されている作業量を示します。 • 理想的なバーンダウン：チームがリリースを時間どおりに提供するためにストーリーをどのように進捗させる必要があるかを示します。 • 残り：完了した作業量を示します。 実際のバーンダウン (残り) が理想的なバーンダウンを上回っている場合は、チームの進捗状況がリリースのスケジュールより遅れていることを意味します。実際のバーンダウン (残り) が理想的なバーンダウンを下回っている場合は、チームの進捗状況がリリースのスケジュールより進んでいることを意味します。

バーンアップおよびバーンダウンのレポートをカスタマイズできます。詳細については、「Agile 2.0 ダッシュボードレポートのカスタマイズ」を参照してください。

Agile 2.0 チームダッシュボード


チームダッシュボードは、特定の期間におけるストーリーのチームの進捗状況を視覚化したものです。チームの予測可能性に関するチャートを提供し、今後のスプリントに対するチームのキャパシティを計画するのに役立ちます。さらに、すべてのチームメンバーの詳細が表示されます。

移動先 すべて > アジャイル開発 > ダッシュボード をクリックし、[**Agile 2.0** チームダッシュボード] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[作業アイテムの進捗状況] タブ

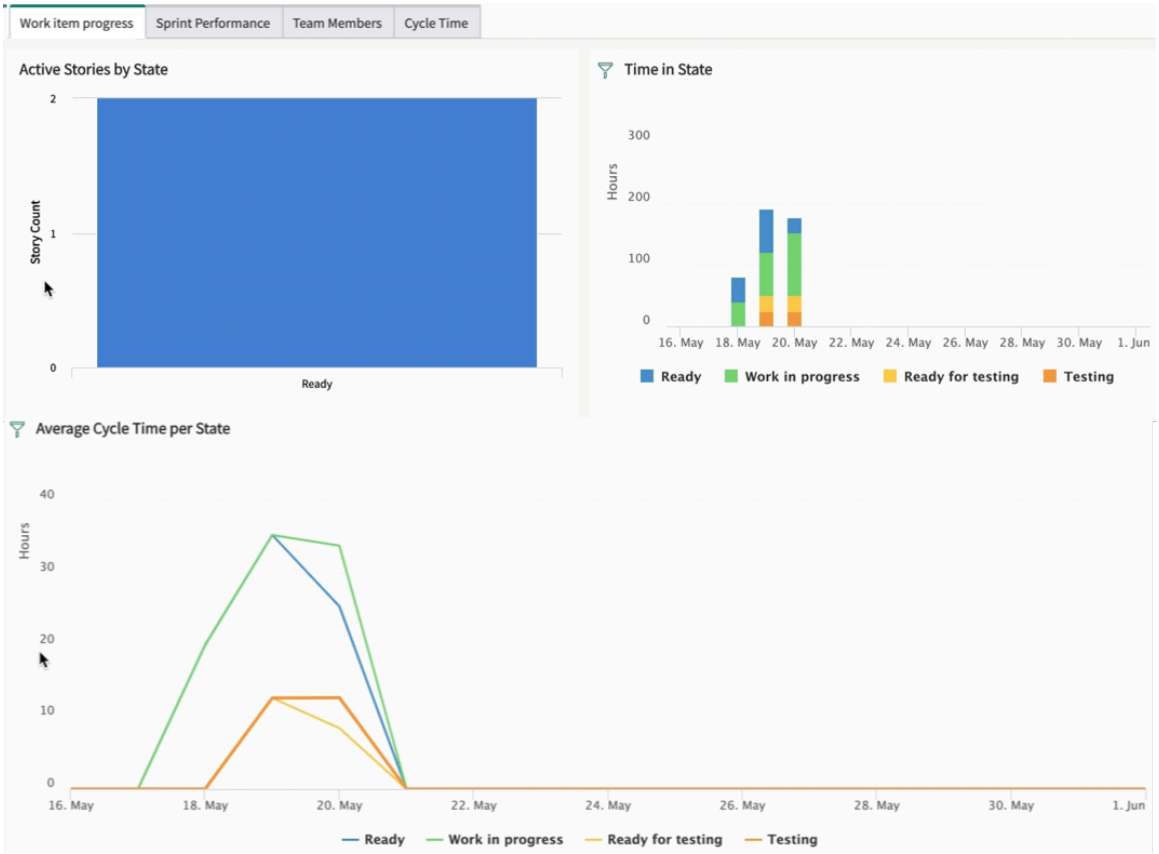

[スプリントパフォーマンス] タブ




自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[チームメンバー] タブ



[サイクル時間] タブ

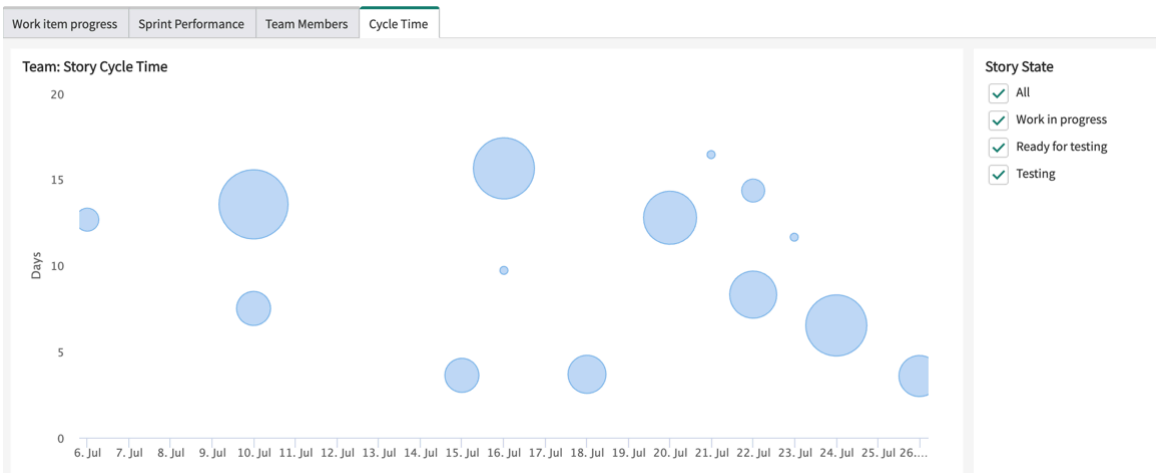

エンドユーザーとロール

必要なロールとメリットを含むエンドユーザーの目標

エンドユーザーと目標	必要なロール	利点
チームメンバー：ストーリーの完了において、チームの予測可能性と進捗状況を可視化する必要があります	scrum_user	• チームの進捗状況を作業アイテム別に表示できます • ストーリーがあるステータスから別のステータスに移行するまでにかかった時間を分析できます • チームのスプリントパフォーマンスを分析できます • チームのスプリント差異の傾向を分析し、完了した作業と、予想キャパシティおよびコミット済み作業を比較できます

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インジケーター

スクラム：ストーリーの平均ステータス期間

ステータスごとの平均サイクル時間レポートに表示されるデータを生成します。

スクラム：ストーリーのステータス期間

ステータスごとの平均サイクル時間レポートに表示されるデータを生成します。

スクラム：スプリントの合計ストーリー数

ステータスごとのアクティブなストーリー数レポートに表示されるデータを生成します。

ブレークダウン

- スクラム：グループ
- スクラム：ステータス

データの可視化

チームダッシュボードレポートは、次の 3 つのタブに分けられます。

- 作業アイテムの進捗状況：ステータス別のアクティブストーリー、ステータスでの経過時間、およびステータスごとの平均サイクル時間のレポート
- スプリントパフォーマンス：速度履歴とスプリント差異のレポート
- チームメンバー：チームのすべてのメンバーのリスト

注:
最新バージョンにアップグレードした既存のお客様の場合、チームメンバーのリストは [作業アイテムの進捗状況] タブと [チームメンバー] タブの両方に表示されますが、正確な情報が表示されるのはどちらか一方のみです。この問題を回避するには、このウィジェットを [作業アイテムの進捗状況] タブから削除できます。ウィジェットの削除方法の詳細については、「レスポンシブダッシュボードの編集」を参照してください。

Agile 2.0 のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパックの 1.0.2 以前のバージョンからアップグレードしようとする場合、ソリューションライブラリからこのダッシュボードをインストールしてレイアウトをアップグレードし、次の可視化にアクセスします。

- 速度履歴
- タイプ別の速度
- スプリントの差異
- ストーリーのサイクル時間

詳細については、「Agile 2.0 ダッシュボードのレイアウトのアップグレード」を参照してください。


作業アイテムの進捗状況

タイトル	タイプ	説明
状況別のアクティブなストーリー	棒グラフ	対応中、テストなど、各ステータスにあるストーリーの合計数を表示します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

作業アイテムの進捗状況 (続く)

タイトル	タイプ	説明
		
時間 (ステータス)	積み重ね式の棒グラフ 	ストーリーの各ステータスでチームが費やした時間数を表示します。
ステータス別の平均サイクル時間	線グラフ 	対応中の時間経過に伴う傾向と、最も重要なサイクル時間を表示します。


スプリントパフォーマンス

タイトル	タイプ	説明
速度履歴	棒グラフ 	過去 10 回のスプリントについて、チームの全体的な速度に関するインサイトを得ます。チームが安定した予測可能な速度を達成し、コミットメントを満たしているかどうかを把握します。 チーム速度履歴レポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる、スプリント別の次のデータ系列から構成されています。 • チームキャパシティ：スプリントのチームキャパシティ (ストーリーポイント) を示します。 • コミット済みストーリーポイント：チームがスプリントに対してコミットしたストーリーポイントの数を示します。 • 完了済みストーリーポイント：チームがスプリントに対

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


スプリントパフォーマンス (続く)

タイトル	タイプ	説明
		して完了したストーリーポイントの数を示します。 • 平均完了済みポイント：チームがスプリントに対して完了したストーリーポイントの平均数を示します。 • 線形 (実績)：完了した作業量がスプリント全体で増加傾向、減少傾向、または比較的安定しているかどうかを示します。
タイプ別の速度	積み重ね式の棒グラフ 	チームの速度の推移を分析し、チームの戦略的な作業負荷を運用または他のタイプの作業負荷と比較します。 棒グラフには、次のタイプの完了済みストーリーのストーリーポイントの合計を示す 2 つの棒が示されます。 • 通常のストーリー • ストーリーは、トリアージボードのアイテムから統合バックログに追加されます。 いずれかの棒をクリックすると、対応するスプリントの詳細に移動します。 このレポートに表示されるデータは、過去 10 件のスプリントのもので、最も古いスプリントが左側に表示されます。 **注:** このレポートはデフォルトでは利用できません。レポートは、スクラムカスタムグラフからダッシュボードに追加できます。詳細については、「レスポンシブダッシュボードの編集」を参照してください。
スプリントの差異	棒グラフ	過去 10 回のスプリントについて、チームのキャパシティおよびコミットポイントと比較した差異の割合を分析します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


スプリントパフォーマンス (続く)

タイトル	タイプ	説明
		チームスプリントの差異レポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる、スプリント別の次のデータ系列から構成されています。 • キャパシティまで完了：スプリントの予想キャパシティと比較した完了済みの作業の割合を示します。 • コミット済みまで完了：スプリントに対するチームのコミット済み作業と比較した完了済みの作業の割合を示します。

チームメンバー

タイトル	タイプ	説明
チームメンバー	リスト	すべてのチームメンバーの詳細を表示します。


サイクル時間

タイトル	タイプ	説明
ストーリーのサイクル時間	バブル チャート 	チームが作業する各ストーリーで「進行中」ステータスから「完了」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。 グラフ内の各バブルはストーリーを表しています。バブルの x 軸からの高さは、ストーリーが「進行中」ステータスから「完了済み」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。ストーリーバブルの大きさは、ストーリーポイントに基づき、相対的なものです。 ストーリーポイントが異なるストーリーのサイクル時間を比較し、チームがストーリーを完了するのに要した時間の傾向を分析できます。完了までに長い時間がかかったストーリーを特定し、その理由を分析することで、将来のチームのサイクル時

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サイクル時間 (続く)

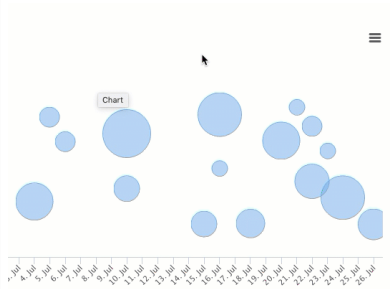タイトル	タイプ	説明
		間を短縮するためのアクション計画を作成できます。 バブルの上にマウスカーソルを合わせると、該当するストーリーに関する次の詳細が表示されます。 • ストーリーポイント • ストーリーが「完了」に移行した日付 • ストーリーの合計サイクル時間 (日数) • ストーリーが [対応中] ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト準備完了」ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト中」ステータスであった日数 レポートの右側にある [ストーリーのステータス] セクションから、レポートをフィルタリングして、選択した状況のストーリーのサイクル時間を表示できます。グラフには、各ストーリーのサイクル時間が、選択した状況のすべての期間の累積合計として表示されます。 レポートのチャートのいずれかの領域で、ストーリーが多すぎてバブルが密集しているように見える場合は、レポートの特定の領域を拡大して見やすくすることができます。 

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サイクル時間 (続く)

タイトル	タイプ	説明
		注: このチャートに表示されるストーリーは、チームが過去 30 日間に完了したストーリーです。

Agile 2.0 ダッシュボードレポートのカスタマイズ

スクラムストーリーのカスタム状況に従って、Agile 2.0 ダッシュボードのバーンアップ、バーンダウン、累積フロー図の各レポートをカスタマイズします。

- カスタマイズに合わせてインジケーターを設定します。

  たとえば、スクラムストーリーテーブルに新しい状況が導入された場合、[状態] フィールドに依存するストーリーテーブルの対応するインジケーターとインジケーターソースも更新する必要があります。

  詳細については、「Agile 2.0 ダッシュボードレポートのインジケーターのカスタマイズ」を参照してください。

- 独自のインジケーターを使用する変更のために、UI スクリプトを更新するか、またはクローンを作成します。

  ScrumAreaChartImpl や ScrumVelHistoryImpl などの UI スクリプトの空の実装 (Impl) クラスのメソッドを上書きして、カスタマイズを追加します。

  詳細については、「Agile 2.0 ダッシュボードのカスタマイズされたインジケーターを使用するための UI スクリプトの更新」を参照してください。

Agile 2.0 ダッシュボードレポートのインジケーターのカスタマイズ

Agile 2.0 ダッシュボードで、カスタマイズに合わせてインジケーターを設定します。

始める前に

必要なロール：admin または pa_admin

手順

1. 移動先 すべて > パフォーマンスアナリティクス > インジケーター > インジケーター (自動).
2. 必要なインジケーターを検索して開きます。
   たとえば、スプリントバーンアップレポートをカスタマイズする場合は、インジケーターのリストの現在スプリントで [スクラム：完了したストーリーのストーリーポイントの合計] を開きます。
3. [追加条件] セクションで、必要に応じて条件を変更します。
4. [更新] をクリックします。

Agile 2.0 ダッシュボードのカスタマイズされたインジケーターを使用するための UI スクリプトの更新

空の実装 (Impl) クラスのメソッドを上書きして、UI スクリプトをカスタマイズします。

始める前に

必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム **UI** > **UI** スクリプト.
2. 必要な UI スクリプトを検索して開きます。
   たとえば、スプリント累積フロー図レポートをカスタマイズする場合は、UI スクリプトのリストから ScrumAreaChartImpl を開きます。
3. 必要に応じて、基本実装を上書きします。
4. [更新] をクリックします。

アジャイル開発 2.0ダッシュボードレポートのストーリーステータスをカスタマイズする

アジャイル開発 2.0 ダッシュボードで、カスタマイズに合わせてストーリー状況を設定します。

始める前に
必要なロール：admin または pa_admin

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > ストーリー.
2. カスタム状況を追加するストーリーを開きます。
3. [ステータス] を右クリックし、ドロップダウンメニューから [選択を構成] を選択します。
4. [新しいアイテムのテキスト] フィールドに、新しいカスタム状況名を入力します。
5. [数値] フィールドに、対応する数値を入力します。
6. [追加] をクリックします。
   新しいステータスが [選択済み] リストに表示されます。
7. [保存] をクリックします。

アジャイル開発 2.0 とサードパーティアプリケーションとの統合

Microsoft Azure DevOps や Atlassian Jira などのサードパーティアプリケーションを アジャイル開発 2.0 と統合すると、計画された作業と実行された作業を両方のアプリケーションで同期できるようになります。

統合が設定されたら、アジャイル開発 2.0 でエピックやストーリーなどの作業を計画し、チームで Microsoft Azure DevOps や Atlassian Jira などの選択した実行アプリケーションを使用して展開できるようになります。

既存の作業アイテムはすべて 2 つのアプリケーション間で同期されます。いずれかのアプリケーションで作成された新しいアイテムは、アプリケーション間で相互に簡単にエクスポート/インポートすることができます。こうしたアイテムに加えられた変更は、2 つのアプリケーション間で自動的に同期されることになります。

こうした統合を設定する際は、以下を参照してください。

- Microsoft Azure DevOps Integration for アジャイル開発
- Atlassian Jira Integration for アジャイル開発

Atlassian Jira Integration for アジャイル開発

2 つのアプリケーションを統合することで、Atlassian Jira と ServiceNow® アジャイル開発 間のレコードの双方向同期を有効にします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

作業のソースが ServiceNow プラットフォームにあり、Jira で作業の進捗状況を追跡する場合は、アジャイル開発 2.0 を Jira と統合することで、製品開発作業を統合的に追跡できます。

たとえば、Jira でレコードを更新した場合、その更新を アジャイル開発 2.0 で確認できます。同様に、アジャイル開発 2.0 でレコードを更新した場合、その同じ更新を Jira で確認できます。

Jira を アジャイル開発 2.0 と同期すると、次のことができます。

- 利用可能な Jira プロジェクトとボードを アジャイル開発 2.0 で表示します。
- Jira から アジャイル開発 2.0 へのレコードの一括インポートを実行します。
- Jira と アジャイル開発 2.0 の間で単一レコードの更新を実行します。
- Jira と アジャイル開発 2.0 でレコード更新エントリを重複させないようにします。
- 単一のアプリケーションからタスクを計画、追跡、および更新します。

バージョン 1.1.1 以降、Atlassian Jira Integration for アジャイル開発 2.0 は、インスタンスレベルではなくプロジェクトレベルでマップ構成をサポートしています。また、このアプリケーションは、Jira Cloud および Jira サーバーに関連する次のプロジェクトタイプをサポートしています。

- クラシック
  - Scrum
  - カンバン
  - バグトラッキング
- 次世代
  - Scrum
  - カンバン

注:
Jira Data Center、Jira Align、およびその他の Atlassian 製品との統合は利用できません。

Jira のカンバンプロジェクトからの問題のインポート

カンバンタイプの Jira プロジェクトをインポートする前に、次の注意事項を考慮してください。

- エピックやストーリーなどの問題は次にインポートされます アジャイル開発 2.0
- カンバンプロジェクトに 1 つ以上の Jira ボードがある場合、それらのすべてのボードが個別のアジャイルグループにマッピングされるわけではありません。Jira プロジェクトは アジャイル開発 2.0 内の単一のグループにマッピングされ、ボードへの関連付けに関係なく、このプロジェクトのすべての問題は 1 つのアジャイルグループにアサインされます。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

アジャイル開発の Atlassian Jira 統合のインストール

アジャイル開発の Atlassian Jira 統合 (sn_agile_jira_int) アプリケーション v2.0.1 を ServiceNow Store からインストールします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
アプリケーションとその関連するすべてのストアアプリケーションに有効な ServiceNow エンタイトルメントがあることを確認してください。詳細については、次を参照してください。 のエンタイトルメントを取得 ServiceNow 製品またはアプリケーション.

インストールと設定をスムーズに行うには、次のセットアップタスクを完了してください。

1. 移動先 サブスクリプション管理 > サブスクリプション インスタンス内にありますリストには、組織で購入したサブスクリプションが表示されます。
2. アジャイル開発 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) がアクティブ化されていることを確認します。
3. ServiceNow 統合ハブスターターパックインストーラープラグイン (com.glide.hub.integrations) がアクティブ化されていることを確認します。
4. Jira Spoke 2.6.8 (sn_jira_spoke) がアクティブ化されていることを確認します。
5. Integrations - External Authentication Framework (com.glide.external.app) がアクティブ化されていることを確認します。

必要なロール：admin

注:
本番インスタンスで アジャイル開発 2.0、ServiceNow Integration Hub Starter Pack Installer、Jira Spoke、および Integrations - External Authentication Framework プラグインをアクティブ化するには、個別のライセンスが必要な場合があります。詳細については、ServiceNow のカスタマーサポートにお問い合わせください。

手順

1. に移動します ServiceNow Store.
2. ServiceNow Storeで、アジャイル開発の Atlassian Jira 統合を検索します。
3. アプリケーションタイルをクリックします。
   アプリケーションに関する詳細情報を表示できます。該当する場合は、[他の要件] および [依存関係] セクションを読むことを検討してください。
4. [取得] をクリックし、Now Support ログイン認証情報を入力します。
5. [インストールを要求] をクリックします。
6. [インスタンス名] フィールドに詳細を入力し、[インスタンスを検証] をクリックします。
7. [インスタンスの理由] フィールドに詳細を入力し、[要求] をクリックします。
   詳細なインストール手順が記載されたメールが届きます。
8. アジャイル開発の Atlassian Jira 統合アプリケーションをインストールするインスタンスにログインします。
9. 選択 システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
10. フィルター基準と検索バーを使用してアプリケーションを見つけて選択し、[インストール] をクリックします。

タスクの結果
以下のコンポーネントは、アプリケーションのインストール時にインストールされます 。

- ロール
- スケジュール済みジョブ
- テーブル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細については、「アジャイル開発の Atlassian Jira 統合とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

アジャイル開発の **Atlassian Jira** 統合とともにインストールされるコンポーネント

アジャイル開発の Atlassian Jira 統合アプリケーションがアクティブ化されると、いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロール、スケジュール済みジョブなど) がインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
Jira 統合アドミン [sn_jira_int.admin]	アプリケーションへの完全なアクセス権がある	• sn_int_common.admin • sn_jira_int.user
Jira 統合ユーザー [sn_jira_int.user]	• Jira と アジャイル開発 との統合の設定 • Jira と アジャイル開発 の間で新しいマップ構成を作成したり、既存のマップ構成を更新したりできます。	• connection_admin • sn_int_common.user • credential_admin

インストールされたスケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
Jira 問題をインポート	スケジュール設定された時刻に問題とスプリントを Jira から自動的にインポートします。 このジョブは、デフォルトで非アクティブです。 詳細については、「Jira から アジャイル開発 2.0 へ問題を自動インポートするジョブをスケジュール設定する」を参照してください。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
添付マップ [sn_int_common_attachment_map]	Jira と アジャイル開発 との間の問題に対する添付ファイルのマッピングを保存します。
選択マップ [sn_int_common_choice_map]	Jira プロジェクトのワークフロー状況マッピングのリストを保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
イベントタイプ [sn_int_common_input_event_type]	作業アイテムの作成、更新、削除など、Webhook イベントのタイプの情報を保存します。
外部識別子 [sn_int_common_external_identifiers]	外部 ID、外部キー、外部プロジェクト、外部 URL など、すべての Jira 参照識別子のリストを保存します。
外部プロジェクト [sn_int_common_project]	プロジェクト ID、このプロジェクトの Jira インスタンス、プロジェクト名など、Jira プロジェクトの情報を保存します。
外部システム [sn_int_common_external_system]	統合に使用される Jira アプリケーションの情報を保存します。
外部システムバージョン [sn_int_common_external_system_version]	統合に使用される Jira アプリケーションのバージョン情報を保存します。
フィールドマップ [sn_int_common_field_map]	Jira プロジェクトの各種問題タイプのフィールドマッピングのリストを保存します。
Jira ボード [sn_jira_int_board]	Jira からインポートされたボードのリストを保存します。
Jira インポート要求 [sn_jira_int_import_request]	Jira からプロジェクト、ボード、プロジェクトスタイルマッピングをインポートするために作成されたすべてのインポート要求のリストを保存します。
Jira インスタンス [sn_jira_int_instance]	すべての Jira インスタンスのリストを保存します。
Jira プロジェクト [sn_jira_int_project]	Jira からインポートされたすべてのプロジェクトのリストを保存します。
プロジェクト統合設定 [sn_agile_jira_int_import_settings]	Jira プロジェクト、ボード、および Agile アサイン先グループ間の 1 対 1 関係のリストを保存します。
プロジェクトスタイルマッピング [sn_jira_int_prj_style_mapping]	Jira プロジェクトスタイルごとのマップ構成テンプレートのリストを保存します。
テーブルマップ [sn_int_common_table_map]	Jira プロジェクトのテーブルマップのリストを保存します。
Webhook レジストリー [sn_int_common_webhook_registry]	イベントの更新を受信するために Jira に登録された Webhook のレジストリーコールバックパスの詳細を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Jira とアジャイル開発 2.0 との統合の設定

Atlassian Jira Integration for アジャイル開発 2.0 のセットアッププロセスを理解します。

アプリケーションが ServiceNow インスタンスにインストールされたら、sn_jira_int.user ロールを使用した統合の設定に進むことができます。

統合のセットアッププロセスには、次のタスクが含まれます。

1. アジャイル開発 2.0 を Jira に接続します。
2. Jira から利用可能なプロジェクトとボードを検出してインポートします。
3. 問題のインポートとエクスポートを有効にし、問題を Jira プロジェクトから アジャイル開発 2.0 に一括インポートします。
4. Jira プロジェクトを アジャイル開発 2.0 のアサイン先グループに関連付けます。
5. スプリントを Jira から アジャイル開発 2.0 にインポートします。
6. Jira からプロジェクトと問題を定期的にインポートするスケジュール済みジョブを有効にします。
7. Jira と アジャイル開発 2.0 の間で、テーブル、フィールド、およびワークフロー状況のカスタムマップ構成を作成します。

アジャイル開発 2.0 の Jira への接続

Jira 接続エイリアスと Jira インスタンスを使用して、アジャイル開発 2.0 と Jira との接続を確立します。

アジャイル開発 2.0 を Jira にコネクトすると、Webhook が Jira に登録され、Jira と アジャイル開発 2.0 の間の次のイベント更新を受信します。

- プロジェクトの作成または更新。
- エピック、ストーリー、スプリント、およびカスタムテーブルマップとそのフィールドの情報の作成、更新、または削除。

アジャイル開発 2.0 との統合のための Jira 接続エイリアスの作成

基本認証情報および Jira 接続エイリアスとの HTTP(s) 接続を作成し、Jira との接続を確立します。

始める前に

必要なロール：

- 接続および資格情報エイリアスを作成する場合は admin
- 基本認証情報と HTTP(s) 接続を作成する場合は sn_jira_int.admin または sn_jira_int.user

手順

1. 接続情報および認証情報エイリアスの作成
   - デフォルトで使用可能な接続エイリアス (sn_jira_int.Jira) を使用できます。
   - 使用するすべての Jira インスタンスに対して接続エイリアスを作成する必要があります。
   - Jira サーバー (オンプレミス) ユーザーの場合は、**server_type** と **server_version** の接続属性が存在することを確認します。
2. 基本認証情報 を作成します。
   基本認証情報が作成されたユーザーが、すべての Jira プロジェクトにアクセスできることを確認します。
3. HTTP(S) 接続を作成します 。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アジャイル開発 2.0 との統合のための Jira インスタンスの作成

作成した接続エイリアスを使用して Jira インスタンスレコードを作成し、Jira と アジャイル開発 2.0 の統合のセットアップを可能にします。

始める前に
必要なロール：sn_jira_int.admin または sn_jira_int.user

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Jira** 統合 > **Jira** インスタンス.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

[Jira インスタンス] フォーム

フィールド	説明
名前	Jira インスタンスの名前。任意の名前を入力します。
接続エイリアス	作成済みの Jira 接続エイリアス。ルックアップ ( ) オプションを使用して、接続エイリアスを選択します。
バージョン	Jira バージョン。ルックアップ ( ) オプションを使用して、Jira API バージョンを選択します。

4. [送信] をクリックします。

アジャイル開発 2.0 と Jira の接続

統合を有効にするには、Jira を アジャイル開発 2.0 に接続します。

始める前に
必要なロール：sn_jira_int.user

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Jira** 統合 > **Jira** インスタンス.
2. Jira インスタンスレコードを開きます。
3. [コネクト] をクリックします。

タスクの結果

- 接続が成功すると、Jira インスタンスレコードの [ステータス] フィールドに [接続] と表示されます。これで、更新イベントを受信する Webhook が Jira に登録されました。
- 接続を確立できなかった場合は、Jira インスタンスレコードの [ステータス] フィールドに [接続が失敗しました] と表示されます。エラーメッセージで失敗の理由を確認できます。

次のタスク
Jira プロジェクトとボードの検出とインポート

。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Jira プロジェクトとボードの検出とインポート

利用可能なすべての Jira プロジェクトとボードを検出して アジャイル開発 2.0 にインポートし、2 つのアプリケーション間の統合の使用を開始します。

始める前に

- アジャイル開発 2.0 の Jira への接続。
- 必要なロール：sn_jira_int.user

このタスクについて

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Jira** 統合 > **Jira** インスタンス.
2. Jira インスタンスレコードを開きます。
3. [プロジェクトの検出] をクリックします。

   このアクションでは、Jira プロジェクト、これらすべてのプロジェクトのマップ構成、および Jira ボードをインポートする要求を作成します。[Jira インポート要求] 関連リストですべてのインポート要求を表示できます。すべての要求の初期ステータスは [要求済み] です。

タスクの結果

各インポート要求のステータスが [完了] に変更されると、この Jira インスタンスの関連リストが次のように設定されていることがわかります。

- Jira プロジェクト：Jira から利用可能なすべてのプロジェクト
- Jira ボード：Jira から利用可能なすべてのボード
- プロジェクトスタイルマッピング：Jira インスタンスのタイプに従ってインポートされたすべての Jira プロジェクトのマップ構成。次のようになります。
  - **classic_on_prem** プロジェクトテンプレートには、Jira サーバープロジェクトに関連するマップ構成が含まれています。
  - **classic** プロジェクトテンプレートには、Jira Cloud クラシックプロジェクトに関連するマップ構成が含まれています。
  - **next-gen** プロジェクトテンプレートには、Jira Cloud 次世代プロジェクトに関連するマップ構成が含まれています。

  [マッピングの作成] 要求のステータスが [完了] に変更されると、[Jira プロジェクト] 関連リストの [マッピング構成] 列に、インポートされた各 Jira プロジェクトのマップ構成が表示されます。作業アイテムのデフォルトのマップ構成の詳細については、「アジャイル開発 2.0 と Jira の間のデフォルトのマッピング構成」を参照してください。

次のタスク

Jira から アジャイル開発 2.0 に問題をインポートします。詳細については、「Jira から アジャイル開発 2.0 への問題とスプリントのインポート」を参照してください。

アジャイル開発 2.0 と Jira の間のデフォルトのマッピング構成

Jira と アジャイル開発 2.0 の間にあるプロジェクトの作業アイテムのデフォルトフィールドマッピング構成を理解します。

マッピング構成は、プロジェクトで Jira のレコードを アジャイル開発 2.0 にマップするために使用されます。問題タイプのテーブルマップが Jira プロジェクトに存在しない場合、問題を Jira と アジャイル開発 2.0 の間でインポートおよびエクスポートすることはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトのマッピング構成を確認することで、Jira の問題タイプが アジャイル開発 2.0 のタスクタイプにどのようにマッピングされるかを理解できます。また、2 つのアプリケーション間でフィールドがどのようにマッピングされているかを確認することもできます。Jira プロジェクトの利用可能な問題およびスプリントをインポートすると、このデータはプロジェクトのマップ構成での定義に従ってテーブルに保存されます。

バージョン 1.1.1 以降では、マッピング構成はインスタンスレベルではなくプロジェクトごとに生成されます。作業アイテムのインポートとエクスポートが影響を受けないように、以前に構成したカスタムマップを更新する必要があります。

Jira プロジェクトのデフォルトのマップ構成テーブルを表示する方法は次のとおりです。

1. 移動先 **Agile Jira** 統合 > **Jira** インスタンス.
2. Jira インスタンスレコードを開きます。
3. [Jira プロジェクト] 関連リストから、Jira プロジェクトを開きます。
4. [テーブルマップ] 関連リストから、ストーリーまたはエピックのレコードを開きます。

次の表に、ストーリーとエピックのデフォルトのフィールドマップ構成を示します。

エピックのマップ構成

Jira のフィールド	アジャイル開発 のフィールド
エピック名	簡単な説明
優先度	優先度
サマリー	説明
ステータス	ステータス

ストーリーのマップ構成

Jira のフィールド	アジャイル開発 2.0 のフィールド
ステータス	状況
スプリント	スプリント
説明	説明
優先度	優先度
エピックリンク (Epic Link)	Epic
サマリー	簡単な説明
アサイニー	担当者

組織の設定に応じて、Jira と アジャイル開発 2.0 の間でプロジェクトのフィールド、テーブル、および選択マップの構成を追加または更新できます。詳細については、「Jira プロジェクトのマップ構成のカスタマイズ」を参照してください。

Jira から アジャイル開発 **2.0** への問題とスプリントのインポート

既存の問題とスプリントを Jira から アジャイル開発 2.0 にインポートするプロセスを理解します。

Jira プロジェクトの既存の問題をストーリーやエピックとして、また、Jira ボードの既存のスプリントデータをスプリントとして、アジャイル開発 2.0 にインポートできます。利用可能なデータをイン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ポートした後、エピック、ストーリー、またはスプリントのレコードに対して行った更新は、Jira とアジャイル開発 2.0 の両方で自動的に同期されます。

問題のインポート

バージョン 2.0.1 からは、Jira からプロジェクトを検出した直後に、Jira プロジェクトから問題をインポートすることができます。チーム統合設定を作成する必要はありません。ただし、インポートされた問題は アジャイル開発 2.0 のどのアサイン先グループにも関連付けられていません。これらの問題は、後でアサイン先グループに手動で割り当てることができます。

インポートした問題をアサイン先グループに自動的にアサインする場合は、Jira プロジェクトを Agile 2.0 アサイン先グループに関連付けてチーム統合設定を作成してから、問題のインポートに進むことができます。この設定により、Jira プロジェクトに属するインポートされた問題が、関連付けられたアサイン先グループに確実にアサインされます。

スプリントのインポート

Jira ボードからスプリントデータをインポートするには、ボードに Agile 2.0 アサイン先グループに関連付けるチーム統合設定が必要です。Jira ボードのスプリントデータは、これらのスプリントがすでに Jira で開始されている場合にのみ、そのアサイン先グループにインポートされます。また、Jira の完了したスプリントと現在のスプリントのみがインポートされます。

チーム統合設定

バージョン 2.0.1 以降、プロジェクト統合設定モジュールはチーム統合設定として使用できます。チーム統合設定は、Jira プロジェクトとボードを Agile 2.0 アサイン先グループに関連付けて、レコード更新の双方向同期を促進するのに役立ちます。

Jira プロジェクトをアサイン先グループに関連付けると、次のことが可能になります。

- このプロジェクトとその関連グループとの間で利用可能なすべてのストーリーとエピックのインポートとエクスポートを有効にします。
- アジャイル開発 2.0 と Jira の両方で、新しいストーリーとエピック、または既存のストーリーとエピックに加えられた更新を表示します。

Jira ボードをアサイン先グループに関連付けると、次のことが可能になります。

- 完了したすべてのスプリントと現在のスプリントをこのボードから関連するグループにインポートします。
- アジャイル開発 2.0 と Jira の両方で、完了したスプリントと現在のスプリントまたは更新を表示します。

アジャイル開発 2.0 と Jira の間の問題のインポートおよびエクスポートのワークフローを理解するには、アジャイル開発 2.0 と Jira の間の問題のインポートとエクスポート を参照してください。

Jira プロジェクトおよびボードと アジャイル開発 **2.0** のアサイン先グループとの関連付け

Jira プロジェクトとボードを アジャイル開発 2.0 のアサイン先グループに関連付けて、関連付けられたプロジェクトとアサイン先グループとの間で利用可能なすべての問題をインポートおよびエクスポートできるようにします。

始める前に

- Jira プロジェクトとボードの検出とインポート。
- アジャイル開発 2.0 でアサイン先グループを作成します。「アジャイル開発 2.0 でのアサイン先グループの作成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- Jira プロジェクトにマッピング構成が定義されていることを確認します。
- 必要なロール：sn_jira_int.user

このタスクについて

チーム統合設定を作成して、Jira プロジェクトと Jira ボードを Agile 2.0 アサイン先グループに関連付けます。

> **重要:**
> アサイン先グループは、Jira の 1 つのプロジェクトとボードのみに関連付けることができます。

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Jira** 統合 > チーム統合設定.
2. [**New**] をクリックします。
3. [チーム統合設定] フォームで、次を選択します。
   - Jira プロジェクト
   - Jira ボード
   - 選択した Jira プロジェクトとボードを関連付ける アジャイル開発 2.0 内のアサイン先グループ

   フォームでの Jira ボードの選択はオプションです。アジャイル開発 2.0 と Jira の間でボードのスプリントデータを同期させたくない場合は、Jira ボードの選択をスキップできます。

   > **注:**
   > Jira プロジェクトがカンバンタイプの場合は、[**Jira** ボード] フィールドを空のままにすることができます。カンバンプロジェクトのすべての問題は、単一の Agile 2.0 グループにマッピングされます。

4. [**Submit** (送信)] を選択します。

次のタスク

この Jira プロジェクトの問題またはこの Jira ボードのスプリントを関連するアサイン先グループにインポートできます。

関連情報

Jira プロジェクトから アジャイル開発 2.0 への問題のインポート：

Jira から アジャイル開発 2.0 へのスプリントのインポート

Jira プロジェクトから アジャイル開発 **2.0** への問題のインポート：

このプロジェクトのチーム統合設定の有無にかかわらず、利用可能な問題を Jira プロジェクトからインポートし、アジャイル開発 2.0 から Jira の既存のレコードを更新できるようにします。

始める前に

- Jira プロジェクトとボードの検出とインポート
- 必要なロール：sn_jira_int.user

このタスクについて

Jira プロジェクトにチーム統合設定がある場合、インポートされた問題はチーム統合設定に従ってアサイン先グループに割り当てられます。Jira プロジェクトにチーム統合設定がない場合、インポートされた問題はアサイン先グループに関連付けられません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:**
> このタスクでは、スプリントのインポートについては説明しません。Jira からスプリントをインポートする方法については、「Jira から アジャイル開発 2.0 へのスプリントのインポート」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Jira** 統合 > **Jira** インスタンス.
2. Jira インスタンスレコードを開きます。
3. [Jira プロジェクト] 関連リストから、問題をインポートするプロジェクトを開きます。
4. [インポートを有効にする] および [エクスポートを有効にする] オプションを適宜選択して、問題のインポートとエクスポートを有効にします。
   Agile と Jira 間で複数選択フィールドの同期がサポートされるようになりました。
5. [問題のインポート] をクリックします。
6. Jira から問題をインポートする日付範囲を選択します。
7. [送信] をクリックします。

   [問題のインポート] タイプのインポート要求が、[Jira インポート要求] 関連リストに作成されます。この要求のステータスが [完了] に変更されると、インポートされたすべてのレコードを アジャイル開発 2.0 のエピックおよびストーリーモジュールで表示できます。ストーリーとエピックの関係は、Jira の場合と同じです。

   > **注:**
   > 問題の既存のコメントと添付ファイルは、一括インポート中に Jira からインポートされません。

Jira から アジャイル開発 2.0 へのスプリントのインポート

Jira ボードからスプリントをインポートして、これらのスプリントの進行状況を アジャイル開発 2.0 で直接追跡できるようにします。

始める前に

- スプリントのインポート元の Jira ボードにチーム統合設定があることを確認します。詳細については、「Jira プロジェクトおよびボードと アジャイル開発 2.0 のアサイン先グループとの関連付け」を参照してください。
- 必要なロール：sn_jira_int.user

このタスクについて
Jira ボードの完了したスプリントと現在のスプリントを アジャイル開発 2.0 にインポートします。

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Jira** 統合 > **Jira** インスタンス.
2. Jira インスタンスレコードを開きます。
3. [Jira プロジェクト] 関連リストから、スプリントをインポートする Jira ボードに関連付けられているプロジェクトを開きます。
4. [インポートを有効にする] および [エクスポートを有効にする] オプションを適宜選択して、スプリントのインポートとエクスポートを有効にします。
5. [問題のインポート] をクリックします。
6. Jira からスプリントをインポートする日付範囲を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

7. [送信] をクリックします。

   [スプリントのインポート] タイプのインポート要求が、[Jira インポート要求] 関連リストに作成されます。この要求のステータスが [完了] に変更されると、アジャイル開発 の関連するアサイン先グループの [スプリント] 関連リストにインポートされたすべてのスプリントデータを表示できます。

Jira から アジャイル開発 2.0 へ問題を自動インポートするジョブをスケジュール設定する

問題とスプリントを Jira から アジャイル開発 2.0 に定期的に自動インポートするジョブをスケジュール設定します。

始める前に
必要なロール：sn_jira_int.user

このタスクについて
スケジュール済みジョブを構成すると、[インポートを有効にする] オプションを選択したすべてのプロジェクトから問題がインポートされます。

スケジュール済みジョブを構成しない場合は、検出されたプロジェクトの問題を手動でインポートする必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. [Jira 問題をインポート] ジョブを開きます。

   このジョブは、デフォルトでは非アクティブです。
3. [今すぐ実行] をクリックしても手動でジョブを実行できます。
4. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、スケジュールされた時刻にジョブを設定します。
   必要に応じて、[実行] フィールドと [時刻] フィールドの詳細を編集できます。
5. [更新] をクリックします。

Jira プロジェクトのマップ構成のカスタマイズ

Jira プロジェクトのフィールド、テーブル、またはワークフロー状況マップ構成をカスタマイズします。単一のプロジェクト、またはプロジェクトスタイルが同じ複数のプロジェクトのマップ構成をカスタマイズできます。

> **注:**
> カスタムマップ構成では、番号、選択、テキスト、および日付タイプのフィールドのみがサポートされています。

テーブルマップ構成のカスタマイズ

Jira プロジェクトの希望の アジャイル開発 2.0 テーブルをマップします。

始める前に

- Jira プロジェクトとボードの検出とインポート。
- 必要なロール：sn_jira_int.user

このタスクについて
Jira プロジェクトの希望のカスタムテーブルマップを作成し、そのフィールドを構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

特定のプロジェクトタイプのすべての Jira プロジェクトに適用できるカスタムテーブルがある場合は、「複数の Jira プロジェクトへのカスタムマップ構成の適用」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Jira** 統合 > **Jira** インスタンス.
2. Jira インスタンスレコードを開きます。
3. [Jira プロジェクト] 関連リストから、マップ構成をカスタマイズする Jira プロジェクトを開きます。
4. Jira プロジェクトの [テーブルマップ] 関連リストから、[新規] をクリックします。
5. フォームのフィールドに入力します。

テーブルマップフォーム

フィールド	説明
内部テーブル	アジャイル開発 2.0 内のテーブル名。
マップ構成	このプロジェクトのマップ構成。 このフィールドは、プロジェクトに基づいて自動入力されます。
外部テーブル	Jira におけるテーブル ID。
外部テーブル名	Jira におけるテーブルの表示名。

6. テーブル構成を保存します。
7. テーブルマップレコードの [フィールドマップ] 関連リストから、次のフィールドの新しいフィールドマップを作成します。

Jira のフィールド	アジャイル開発 2.0 のフィールド
問題のサマリー (Summary of the issue)	簡単な説明
問題の説明 (Description of the issue)	説明

テーブルのフィールドマッピングの設定方法については、「フィールドマップ構成のカスタマイズ」を参照してください。新しいテーブル構成用に他のフィールドマップを作成することもできます。

次のタスク

1. プロジェクトフォームから [マッピングを検証して修正] をクリックして、新しいテーブルマップ構成を検証します。
2. プロジェクトの [テーブルマップ] 関連リストで、構成の [有効] 列に次のように表示されている場合：
   - true：マップ構成の検証に成功しました。
   - false：マップ構成の検証に失敗しました。すべてのフィールドに正しい値を入力したことを確認し、再度検証してください。
3. この新しいテーブルマップ構成を Jira にエクスポートするビジネスルールを作成します。「カスタムの アジャイル開発 2.0 テーブルマップ構成を適用するビジネスルールの作成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. この新しいテーブルマップの添付ファイルのインポートとエクスポートをサポートする場合は、「カスタムの アジャイル開発 2.0 テーブルの添付ファイルのインポートとエクスポートの許可」を参照してください。
5. カスタムテーブルマップで Jira 識別子を参照するフィールドの表示を有効にする場合は、「アジャイル開発 2.0 カスタムテーブルの Jira プロジェクト識別子参照フィールドへの入力」を参照してください。

フィールドマップ構成のカスタマイズ

Jira プロジェクトの希望のフィールドをマップします。

始める前に

- Jira プロジェクトとボードの検出とインポート。
- 必要なロール：sn_jira_int.user

このタスクについて

アジャイル開発 2.0 のフィールドにマップする Jira プロジェクトのカスタムフィールドがある場合は、この Jira プロジェクトにのみ適用されるカスタムフィールドマップ構成を作成できます。

特定のプロジェクトタイプのすべての Jira プロジェクトに適用できるカスタムフィールドがある場合は、「複数の Jira プロジェクトへのカスタムマップ構成の適用」を参照してください。カスタムフィールドマップ構成では、次のフィールドタイプがサポートされています。

- 番号
- 選択
- テキスト
- 日付
- ID
- 日時
- 参照
- リスト

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Jira** 統合 > **Jira** インスタンス.
2. Jira インスタンスレコードを開きます。
3. [Jira プロジェクト] 関連リストから、マップ構成をカスタマイズする Jira プロジェクトを開きます。
4. [テーブルマップ] 関連リストから、スプリント、エピック、またはストーリーレコードを開き、そのレコードの新しいフィールドマップ構成を追加します。
5. [フィールドマップ] 関連リストで、[新規] をクリックします。
6. フォームのフィールドに入力します。

フィールドマップフォーム

フィールド	説明
内部フィールド	アジャイル開発 2.0 におけるフィールド名。
テーブルマップ	このフィールドが作成される、アジャイル開発 2.0 におけるテーブルマップ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	このフィールドは、選択したテーブルマップレコードに基づいて自動入力されます。
内部テーブル	アジャイル開発 2.0 内のテーブル。 このフィールドは、選択したテーブルマップレコードに基づいて自動入力されます。
外部フィールド	Jira におけるフィールド ID。
外部フィールド名	Jira におけるフィールドの表示名。 このフィールドが Jira プロジェクト画面に追加されていることを確認します。

7. [更新] をクリックします。

次のタスク

1. プロジェクトフォームから [マッピングを検証して修正] をクリックして、フィールドマップ構成を検証します。
2. プロジェクトの [テーブルマップ] 関連リストから、新しいフィールドマップ構成に移動します。構成の [有効] 列に次のように表示されている場合：
   - true：マップ構成の検証に成功しました。
   - false：マップ構成の検証に失敗しました。すべてのフィールドに正しい値を入力したことを確認し、再度検証してください。

> **重要:**
> カスタムマップ構成が無効な場合、または構成されたカスタムフィールドが問題のデフォルトの画面スキームに追加されていない場合、エクスポートアクションは機能しません。


自動翻訳

Jira での参照フィールドの構成

新しいフィールドマップ構成を作成するときに参照フィールドを構成する方法を理解します。

[内部フィールド] フィールドの参照フィールドを選択する場合は、[ルックアップ列名] フィールドの値を選択する必要があります。[ルックアップ列名] フィールドの値は、Jira DevOps と アジャイル開発 2.0 の間で作業アイテムをインポートおよびエクスポートするときに使用されます。

インポート中に、統合アプリケーションは [ルックアップ列名] フィールドを使用して参照テーブル内のレコードを検索します。レコードが見つからない場合、作業アイテムの値は アジャイル開発 2.0 で空になります。



ワークフロー状況構成のカスタマイズ

Jira プロジェクトの希望のカスタムワークフロー状況マップを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- Jira プロジェクトとボードの検出とインポート。
- 必要なロール：sn_jira_int.user

このタスクについて
カスタムワークフロー状況を Jira から アジャイル開発 2.0 にマップします。

Jira のワークフロー状況を アジャイル開発 2.0 の複数のワークフロー状況にマップできます。このような場合、問題タイプの アジャイル開発 2.0 におけるステータスは、このステータス構成に指定する選択肢の順序値によって異なります。

たとえば、 Jira の [処理中] 状況は、10、20、30 という選択肢の順序を使用して アジャイル開発 2.0 の [対応中]、[テスト準備完了]、[テスト中] などの複数の状況にマップされます。

そのため、Jira の [処理中] の問題がインポートされた場合、アジャイル開発 2.0 の [ステータス] フィールドは、選択肢の順序値が最も小さいため、[対応中] に設定されます。

Jira における複数のワークフロー状況を アジャイル開発 2.0 における 1 つのワークフロー状況にマップすることもできます。

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Jira** 統合 > **Jira** インスタンス.
2. Jira インスタンスレコードを開きます。
3. [Jira プロジェクト] 関連リストから、選択マップ構成をカスタマイズする Jira プロジェクトを開きます。
4. このプロジェクトのワークフロー状況マップを開きます。
   a. [テーブルマップ] 関連リストで、[ストーリー] をクリックします。
   b. [フィールドマップ] 関連リストで、[ステータス] をクリックします。
5. [選択マップ] 関連リストで、[新規] をクリックします。
6. フォームのフィールドに入力します。

[選択マップ] フォーム

フィールド	説明
内部選択肢	アジャイル開発 2.0 におけるワークフロー状況の値。この値は整数です。
外部選択肢	Jira におけるワークフロー移行の ID。 注: 移行がない場合は、ワークフロー状況の ID を挿入します。
外部選択肢名	Jira におけるワークフロー移行の表示名。 注: 移行がない場合は、ワークフロー状況の表示名を挿入します。

7. [更新] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次のタスク

1. プロジェクトフォームから [マッピングを検証して修正] をクリックして、選択マップ構成を検証します。
2. プロジェクトの [テーブルマップ] 関連リストから、新しい選択マップ構成に移動します。構成の [有効] 列に次のように表示されている場合：
   - true：マップ構成の検証に成功しました。
   - false：マップ構成の検証に失敗しました。すべてのフィールドに正しい値を入力したことを確認し、再度検証してください。

複数の **Jira** プロジェクトへのカスタムマップ構成の適用

アジャイル開発 2.0 のマップ構成テンプレートに、特定のタイプのすべての Jira プロジェクトに適用できるカスタムテーブルまたはフィールドを追加します。

始める前に

- Jira プロジェクトとボードの検出とインポート。
- 必要なロール：sn_jira_int.user

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Jira** 統合 > **Jira** インスタンス.
2. Jira インスタンスレコードを開きます。
3. [プロジェクトスタイルマッピング] 関連リストから、カスタムフィールドを追加するプロジェクトテンプレートを選択します。
   たとえば、追加するフィールドがクラシックタイプのすべての Jira プロジェクトに適用できる場合は、[クラシック] を選択します。
4. [デフォルトマッピング] フィールドで、アジャイル開発 2.0 のカスタムテーブルまたはフィールドを既存のマップ構成に追加します。
   [デフォルトマッピング] フィールドのコンテンツを JSON ビューアーにコピーして、希望の形式でコンテンツを表示できます。たとえば、次の図に示すように、欠陥 [rm_defect] の新しいテーブルを追加して Jira のバグテーブルをマップしたり、既存のストーリー [rm_story] テーブルの新しいフィールドを追加してストーリーポイントをマップしたりできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

欠陥のカスタムテーブルマップ

```
    }
},


"rm_defect": {
  "name": "Bug",
  "fields": {
    "short_description": {
      "name": "Summary"
    }
  }
},


"rm_epic": {
```

ストーリーポイントのカスタムフィールドマップ

```
{
  "rm_story": {
    "name": "Story",
    "fields": {
      "short_description": {
        "name": "Summary"
      },

      "story_points": {
        "name": "Story Points"
      },

      "description": {
        "name": "Description"
      },
      "epic": {
        "name": "Epic Link"
      },
```

Custom field for story points

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "rm_story" : {
    "name" : "Story",
    "fields" : {
      "short_description" : {
        "name" : "Summary"
      },
      "business_units" : {
        "name" : "BusinessChoices",
        "id" : "customfield_10062",
        "lookup_table_name" : "business_unit",
        "lookup_column_name" : "name"
      },
      "description" : {
        "name" : "Description"
      },
      "epic" : {
        "name" : "Epic Link"
      },
      "state" : {
        "name" : "Status",
```

新しいフィールドを追加する場合は、構成されたカスタムフィールドが問題のデフォルトの画面スキームに追加されていることを確認します。

5. [更新] をクリックします。

次のタスク

関連するすべての Jira プロジェクトにカスタムプロジェクトスタイルマップを適用します。

1. インポートされたすべての Jira プロジェクトの既存のマップ構成を削除します。

   [マッピング構成] フィールドを空にすることで、プロジェクトのマップ構成を削除できます。

   > **ヒント:**
   > [Jira プロジェクト] 関連リストから、すべての Jira プロジェクトレコードの [マッピング構成] フィールドを複数選択し、それらの値を削除して、これらのフィールドをすべて空にします。

2. 新しいテーブルマップを作成した場合は、この新しいテーブルマップ構成を適用するビジネスルールを作成します。「カスタムの アジャイル開発 2.0 テーブルマップ構成を適用するビジネスルールの作成」を参照してください。
3. [プロジェクトの検出] をクリックして、これらのプロジェクトを Jira からインポートします。

   これにより、カスタマイズされたプロジェクトスタイルマップに従って、すべての Jira プロジェクトとそのマップ構成がインポートされます。

カスタムの アジャイル開発 2.0 テーブルマップ構成を適用するビジネスルールの作成

新しいカスタムの アジャイル開発 2.0 テーブルマップ構成から Jira プロジェクトへのエクスポートを有効にするビジネスルールを作成します。

始める前に

必要なロール：admin または sn_jira_int.admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
単一または複数の Jira プロジェクトのカスタムテーブルマップを作成した後、Jira とのストーリーの同期に似たビジネスルールを作成し、この新しいテーブルマップの情報を アジャイル開発 2.0 から Jira にエクスポートできるようにします。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > ビジネスルール.
2. 利用可能なビジネスルールのリストから、[Jira とのストーリーの同期 (Synch Story with Jira)] ルールを見つけて開きます。
3. コンテキストメニュー (☰) から、このビジネスルールに対して [挿入と維持] 操作を実行します。
   ServiceNow インスタンスで [挿入と維持] アクションを有効にしていない場合は、「レコードの挿入オプションの許可」を参照してください。
4. [ビジネスルール] フォームで、次のフィールドを編集します。

[ビジネスルール] フォーム

フィールド	説明
名前	ビジネスルールの一意の名前。 たとえば、新しいテーブルマップで欠陥をマップする場合は、このルールに「Jira との欠陥の同期」といった名前を付けます。
テーブル	カスタムマップを作成した アジャイル開発 2.0 テーブルを選択します。 例：欠陥 [rm_defect]。

5. [更新] をクリックします。

カスタムの アジャイル開発 2.0 テーブルの添付ファイルのインポートとエクスポートの許可

マップ構成に追加したカスタムの Agile 2.0 テーブルについて、Jira と アジャイル開発 2.0 の間で添付ファイルのインポートとエクスポートを有効にします。

始める前に
必要なロール：admin または sn_jira_int.admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > ビジネスルール.
2. ビジネスルールのリストから、[Jira への添付ファイルの同期 (Sync Attachment to Jira)] ルールを見つけて開きます。
3. フォームの [実行タイミング] セクションで、カスタムテーブルマップをフィルター条件に追加して含めます。
   たとえば、追加したカスタムテーブルが欠陥である場合は、次のようにします。
   a. [「OR」節を追加] をクリックします。
   b. 新しい節を [テーブル名] [次の値と同じ] **[rm_defect]** に設定します。
4. [更新] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 2.0 カスタムテーブルの Jira プロジェクト識別子参照フィールドへの入力

マップ構成に追加した アジャイル開発 2.0 カスタムテーブルの Jira 識別子参照フィールドを有効にします。

始める前に
必要なロール：admin または sn_jira_int.admin

このタスクについて
ID、キー、Jira プロジェクト、およびプロジェクト URL の参照をカスタムテーブルフォームに表示するには、このテーブルを [外部識別子参照の入力 (Populate External Identifier Reference)] ビジネスルールに追加します。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > ビジネスルール.
2. ビジネスルールのリストから、[外部識別子参照の入力 (Populate External Identifier Reference)] ルールを見つけて開きます。
3. フォームの [実行タイミング] セクションで、カスタムテーブルマップをフィルター条件に追加して含めます。
   たとえば、追加したカスタムテーブルが欠陥である場合は、次のようにします。
   a. [「OR」節を追加] をクリックします。
   b. 新しい節を [参照テーブル] [次の値と同じ] **[rm_defect]** に設定します。
4. [更新] をクリックします。

次のタスク
フォームレイアウトを構成するか、カスタムテーブルのリストレイアウトをカスタマイズして、次のフィールドのいずれかまたはすべてを表示します。

- 外部 ID (External ID)
- 外部キー
- 外部プロジェクト
- 外部 URL

関連情報

v2 リストのカスタマイズ

フォームレイアウトの構成

Jira プロジェクトのマッピング構成のリセット

複数の Jira プロジェクトの既存のマッピング構成をデフォルトのマッピング構成にリセットします。

始める前に

- Jira プロジェクトとボードの検出とインポート
- 必要なロール：sn_jira_int.user

このタスクについて
デフォルトのマッピング構成をすべてまたは一部の Jira プロジェクトに適用します。これらのプロジェクトの既存のカスタムマッピング構成は、マッピングをリセットすると削除されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[マッピング構成] フィールドをクリアした場合、またはこのプロジェクトの既存のテーブルマップを削除した場合、このプロジェクトのマッピングをリセットすると、マッピング構成がデフォルト構成に復元されます。

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Jira** 統合 > **Jira** インスタンス.
2. Jira インスタンスレコードを開きます。
3. 次のいずれかの方法を使用して、複数の Jira プロジェクトのマッピングをリセットします。

タスクの結果

プロジェクトのマッピング構成は、選択したプロジェクトが属する [プロジェクトスタイルマッピング] フォームの [デフォルトマッピング] フィールドに従って更新されます。

アジャイル開発 **2.0** と **Jira** の間の問題のインポートとエクスポート

アジャイル開発 2.0 と Jira の間の問題のインポートおよびエクスポートのワークフローを理解します。

アジャイル開発 2.0 と Jira の間で問題をエクスポートおよびインポートするには、Jira プロジェクトのチーム統合設定を完了する必要があります。

Jira から アジャイル開発 **2.0** へのインポート

- Jira プロジェクトでエピックタイプの問題を作成すると、構成したチーム統合設定に従ってアサイン先グループのエピックが作成されます。
- Jira プロジェクトでストーリータイプの問題を作成すると、構成したチーム統合設定に従ってアサイン先グループのストーリーが作成されます。
  - ストーリーとエピックの関係は、Jira の場合と同じです。
  - 同じメールアドレスを持つユーザーが アジャイル開発 2.0 で見つかった場合にのみ、ストーリーの [アサイン先] フィールドに Jira のユーザーが表示されます。
- フィールドマップで定義されたフィールドのみがストーリーまたはエピックに保持されます。デフォルトのマッピング構成の詳細については、「アジャイル開発 2.0 と Jira の間のデフォルトのマッピング構成」を参照してください。
- Jira で問題に添付ファイルを追加すると、同じ添付ファイルが アジャイル開発 2.0 の対応するストーリーまたはエピックに追加されます。
- Jira で問題にコメントを追加すると、そのコメントは、マップ構成に基づき、アジャイル開発 2.0 のストーリーまたはエピックの [作業メモ] フィールドで更新されます。

  注:
  コメントに追加された画像は添付ファイルとして表示されます。

- Jira で問題を削除すると、対応するレコードが アジャイル開発 2.0 で削除されます。


  注:
  アジャイル開発 2.0 でレコードを削除するには、各テーブルのアプリケーションアクセスで [他のアプリケーションスコープからの削除アクセスを許可します] フィールドを **[true]** に設定します。詳細については、「テーブルの設計時と実行時の設定」を参照してください。

- Jira ボードがチーム統合設定で構成されている場合、Jira でスプリントを開始すると、アジャイル開発 2.0 のアサイン先グループに対してスプリントが作成されます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Jira で作成された問題のインポートワークフロー



Jira で更新された問題のインポートワークフロー



アジャイル開発 から **Jira** へのエクスポート

- アサイン先グループのエピックを作成すると、構成したチーム統合設定に従って Jira でプロジェクトにエクスポートされます。
- アサイン先グループのストーリーを作成すると、構成したチーム統合設定に従って Jira でプロジェクトにエクスポートされます。
  - ストーリーとエピックの関係は、Jira の場合と同じです。
  - ServiceNow プラットフォームの [アサイン先] フィールドに対する更新は、Jira にエクスポートされます。
- ストーリーまたはエピックに添付ファイルを追加すると、同じ添付ファイルが Jira の対応する問題に追加されます。
- 作業メモにストーリーまたはエピックを追加すると、その作業メモはコメントとして Jira の対応する問題で更新されます。
- アジャイル開発 2.0 で既存のストーリーのアサイン先グループを更新すると、更新されたアサイン先グループに関連付けられている Jira プロジェクトの問題が再作成されます。
- アジャイル開発 2.0 のアサイン先グループに対してスプリントを作成すると、Jira ボードをチーム統合設定で構成した場合に限り Jira にエクスポートされます。

アジャイル開発 **2.0** との **Jira** 統合に関する問題のトラブルシューティング

Jira と アジャイル開発 2.0 の統合作業中に発生する可能性がある一般的な問題を解決します。

問題	アクション
エクスポートアクションが機能していません。	• カスタムマップ構成を確認します。 カスタムマップ構成が無効な場合、または構成されたカスタムフィールドが問題のデフォルトの画面スキームに追加されていない場合、エクスポートは機能しません。 • この Jira プロジェクトまたはボードのプロジェクト統合設定で [エクスポートを有効にする] チェックボックスがオンになっていることを確認します。 • Jira パスワードの有効期限が切れていないか確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

問題	アクション
スプリントがインポートされたストーリーに関連付けられていません。	スプリントが Jira で開始されているかどうかを確認します。ストーリーに関連付けられているスプリントが将来のスプリントである場合、アジャイル開発 のストーリーには関連付けられません。 Jira からのスプリントデータは、スプリントが Jira でアクティブな場合にのみ アジャイル開発 で更新されます。
スプリントが アジャイル開発 2.0 にインポートされません。	• Jira のスプリントに日付があることを確認します。 • Jira のスプリントの日付が、アジャイル開発 2.0 の同じアサイン先グループの別のスプリントと重複しないようにします。
Jira のフィールドの値が アジャイル開発 2.0 に入力されません。	カスタムフィールドマップが構成されているかどうかを確認します。
Jira の [優先度] および [ステータス] フィールドの値が アジャイル開発 2.0 に入力されません。	カスタムワークフロー状況マップが構成されているかどうかを確認します。
Jira のユーザーによる更新が アジャイル開発 2.0 で更新されません。	Jira と アジャイル開発 の統合を設定するために使用されるユーザー認証情報が、レコード更新の実行に使用されていないことを確認します。
問題は Jira で削除されますが、アジャイル開発 2.0 で削除されません。	各テーブルのアプリケーションアクセスで [他のアプリケーションスコープからの削除アクセスを許可します] フィールドが [true] に設定されていることを確認します。
Jira Cloud ユーザーの場合、インポートすると重複するコメントが表示されます。	循環ペイロードを検証します。メールアドレスを Webhook イベントに表示するには、接続ユーザー (アジャイル開発 2.0 の HTTP 接続で使用) のプライバシー設定を有効にする必要があります。
Jira でプロジェクトまたはボードを削除しても、アジャイル開発 2.0 でアクションが発生しません。	Jira でプロジェクトまたはボードを削除した後、Jira アドミニストレーターは アジャイル開発 2.0 で関連するストーリーを手動で削除する必要があります。
Jira でリッチテキストを使用すると、アジャイル開発 2.0 でテキストが文字化けします。	Jira で使用されている wiki テキスト形式はサポートされていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

問題	アクション
次世代 Jira プロジェクトで、Jira のエピックに対してストーリーが作成されると、ストーリーとエピックの関係が アジャイル開発 2.0 にインポートされません。	Jira で、ストーリーに名目上の更新を加え、この更新とともにエピックとの関係を アジャイル開発 2.0 に送信します。
サブタスク情報が Jira と アジャイル開発 2.0 の間でインポートもエクスポートもされません。	Jira から アジャイル開発 2.0 へのサブタスクのインポートを有効にするには、このタスクタイプのカスタムマッピングを手動で構成する必要があります。詳細については、「テーブルマップ構成のカスタマイズ」を参照してください。
次世代 Jira プロジェクトで、スクラムタスクが アジャイル開発 2.0 から Jira にエクスポートされません。	アプリケーションでは、Jira から アジャイル開発 2.0 へのサブタスクのインポートのみがサポートされており、これらのタスクの Jira へのエクスポートはサポートされていません。
プロジェクトを検出してインポートした後、プロジェクトのマップ構成が生成されません。	接続エイリアスが作成されたユーザーが、すべての Jira プロジェクトにアクセスできることを確認します。
接続、切断、および検証と修正の UI アクションが初めて使用するときにエラーになります。	これは既知の問題です。UI アクションを再試行します。
Jira プロジェクトメタデータのフェッチ中に、フローデザイナーで API 呼び出しが失敗し、**[API** 応答サイズの超過 **(API response size exceeded)]** エラーが発生します。	バッチサイズプロパティの値を 1 ～ 50 の任意の値に設定して、値を減らします。詳細については、「Jira プロジェクトメタデータのバッチサイズの定義」を参照してください。
インポートの問題が永久に「処理中」ステータスのままになります。	[サーバー] ではなく [クラウド] に誤って設定されていたため、リセットマッピングがサーバータイプとして機能せず、インポート要求が停止します。接続属性をセットアップしない顧客はほとんどいないため、[サーバータイプ] と [サーバーバージョン] はそれぞれデフォルトで [クラウド] と [8] に設定されます。Jira オンプレミスの顧客が適切な接続属性を使用するためのガイドラインを設定します。
作業項目データの一括インポートが **API** 応答サイズ超過エラーで失敗します。	JiraConstants スクリプトインクルードの *MAX_LIMIT* の値を減らしてから、作業項目データの一括インポートを再試行してください。

詳細なプロジェクトログの有効化

プロジェクトのログ記録の詳細をすべて表示するには、統合プロジェクトログ記録のプロパティを有効にします。詳細については、「アジャイル開発 との Jira 統合における詳細なプロジェクトログ記録の有効化」を参照してください。

アジャイル開発 との **Jira** 統合における詳細なプロジェクトログ記録の有効化

Jira で統合プロジェクトログ記録を有効にして、詳細なプロジェクトログを表示できるようにする方法を理解します。

始める前に

必要なロール：sn_jira_int.admin (編集アクセス権あり) または sn_jira_int.user (読み取りアクセス権あり)。

このタスクについて

Agile Jira 統合アプリケーションでプロジェクトログ記録のプロパティを有効にします。


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Jira** 統合 > プロパティ.
2. [統合プロジェクトのログ記録を有効にする **(Enable Integration Project Logging)]** チェックボックスをクリックします。

Agile Jira 統合のプロパティ

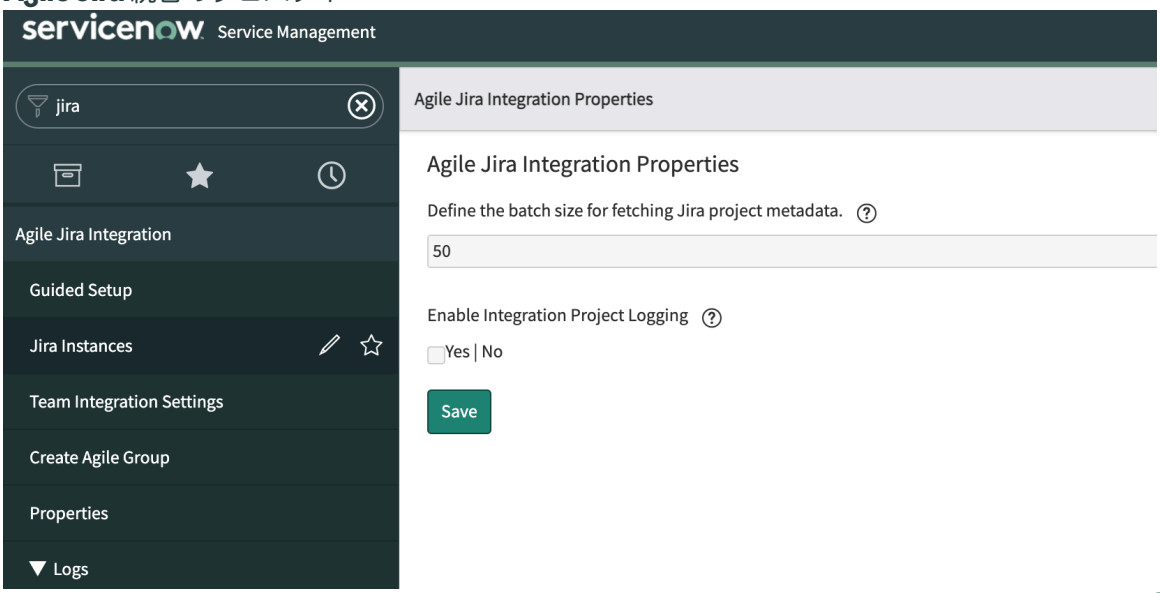

3. [保存] をクリックします。

Jira プロジェクトメタデータのバッチサイズの定義

Jira プロジェクトからメタデータをフェッチするために使用されるバッチサイズ値を定義します。

始める前に

必要なロール：sn_jira_int.admin (編集アクセス権あり) または sn_jira_int.user (読み取りアクセス権あり)。

このタスクについて

Jira プロジェクトメタデータのフェッチ中に発生する可能性がある **[API** 応答サイズの超過 **(API response size exceeded)]** エラーを解決するには、バッチサイズプロパティの値を減らします。


手順

1. 移動先 すべて > **Agile Jira** 統合 > プロパティ.
2. **[Jira** プロジェクトメタデータをフェッチするためのバッチサイズを定義してください **(Define the batch size for fetching Jira project metadata)]** フィールドの値を 50 未満に変更します。
   推奨される値の範囲は、5 ～ 50 です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[Jira プロジェクトメタデータをフェッチするためのバッチサイズを定義してください (Define the batch size for fetching Jira project metadata)]

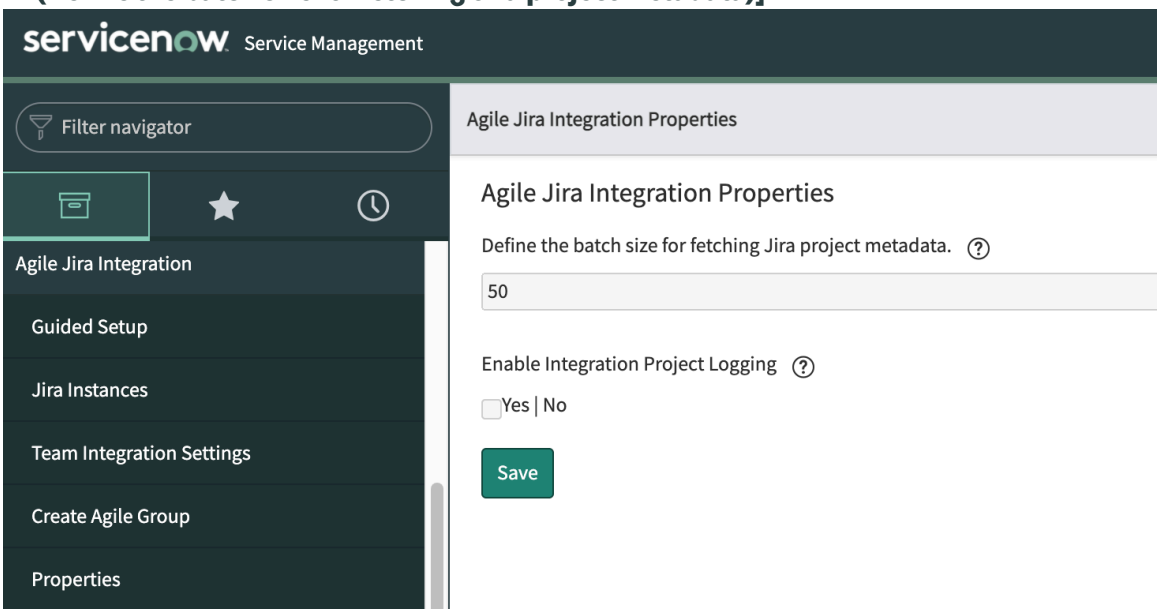

3. [保存] をクリックします。

Microsoft Azure DevOps Integration for アジャイル開発

2 つのアプリケーションを統合することで Microsoft Azure DevOps と ServiceNow® アジャイル開発 2.0 の間で作業アイテムの双方向同期を可能にします。

たとえば、Microsoft Azure DevOps でレコードを更新すると、その更新は アジャイル開発 2.0 に反映されます。同様に、アジャイル開発 2.0 でレコードを更新すると、その更新は Microsoft Azure DevOps に反映されます。

Microsoft Azure DevOps と アジャイル開発 のデータ連携により、次のことが可能になります。

- 利用可能な Microsoft Azure DevOps プロジェクトを アジャイル開発で表示します。
- Microsoft Azure DevOps から アジャイル開発 2.0 へのレコードの一括インポートを実行します。
- Microsoft Azure DevOps と アジャイル開発 2.0 の間で単一レコードの更新を実行します。
- Microsoft Azure DevOps と アジャイル開発 2.0 でレコード更新エントリを重複させないようにします。
- 単一のアプリケーションからタスクを計画、追跡、および更新します。

バージョン 1.3 以降、Microsoft Azure DevOps Integration for アジャイル開発 ではプロセスレベルのマップ構成がサポートされ、アジャイル開発 2.0 と同期するように複数のプロセスを構成できます。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft Azure DevOps Integration for アジャイル開発 のインストール

Microsoft Azure DevOps Integration for アジャイル開発 (sn_agile_ado_int) アプリケーション バージョン 1.3 を ServiceNow Store からインストールします。

始める前に

インストールと設定をスムーズに行うには、次のセットアップチェックリストを完了してください。

1. アジャイル開発 2.0 プラグイン (com.snc.sdlc.agile.2.0) がアクティブ化されていることを確認します。
2. ServiceNow 統合ハブ標準パックインストーラープラグイン (com.glide.hub.integrations.standard) がアクティブ化されていることを確認します。
3. Azure DevOps Boards Spoke 1.6.1 プラグイン (sn_azure_dev_spoke) がアクティブ化されていることを確認します。

ヒント:
移動先 サブスクリプション管理 > サブスクリプション. リストには、組織で購入したサブスクリプションが表示されます。

必要なロール：admin

注:
本番インスタンスで Agile Development 2.0、ServiceNow 統合ハブ標準パックインストーラー、および Azure DevOps Board Spoke プラグインをアクティブ化するには、個別のライセンスが必要になる場合があります。詳細については、ServiceNow のカスタマーサポートにお問い合わせください。

手順

1. 移動先 ServiceNow Store .
2. ServiceNow Storeで、Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development を検索します。
3. アプリケーションタイルをクリックします。
   アプリケーションに関する詳細情報を表示できます。

   注:
   該当する場合は、[他の要件] および [依存関係] セクションを読むことを検討してください。

4. [取得] をクリックし、Now Support ログイン認証情報を入力します。
5. [インストールを要求] をクリックします。
6. [インスタンス名] フィールドに詳細を入力し、[インスタンスを検証] をクリックします。
7. [インスタンスの理由] フィールドに詳細を入力し、[要求] をクリックします。
   詳細なインストール手順が記載されたメールが届きます。
8. Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development アプリケーションをインストールするインスタンスにログインします。
9. 選択 システムアプリケーション > アプリケーション.
10. アプリケーションを見つけて選択し、[インストール] をクリックします。

タスクの結果

以下のコンポーネントは、アプリケーションのインストール時にインストールされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ロール
- スケジュール済みジョブ
- テーブル

詳細については、「Microsoft Azure DevOps Integration for アジャイル開発 とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

Microsoft Azure DevOps Integration for アジャイル開発 とともにインストールされるコンポーネント

Microsoft Azure DevOps Integration for アジャイル開発 アプリケーションがアクティブ化されると、いくつかのタイプのコンポーネント (ユーザーロール、スケジュール済みジョブ、テーブルなど) がインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
Azure DevOps Integration アドミン [sn_ado_int.admin]	アプリケーションへの完全なアクセス権がある	• sn_int_common.admin • sn_ado_int.user
Azure DevOps Integration ユーザー [sn_ado_int.user]	• Azure DevOps と アジャイル開発 の間の統合を設定します。 • Azure DevOps と アジャイル開発 の間で新しいマップ構成を作成したり、既存のマップ構成を更新したりできます。	• connection_admin • sn_int_common.user • credential_admin

インストールされたスケジュール済みジョブ

スケジュール済みジョブ	説明
Azure プロジェクトジョブの検出 (Discover Azure Project Job)	スケジュールされた時刻に新しい Azure DevOps プロジェクトを検出し、それらを自動的にインポートします。
Azure DevOps のチーム、エリア、反復をインポート (Import Azure DevOps Teams Areas and Iterations)	スケジュールされた時刻にチーム、エリア、反復を Azure DevOps から自動的にインポートします。
Azure DevOps 作業アイテムのインポート (Import Azure DevOps Work Items)	スケジュールされた時刻に作業アイテムを Azure DevOps から自動的にインポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スケジュール済みジョブはすべて、デフォルトでは非アクティブです。詳細については、「Azure DevOps からプロジェクト、チーム、エリア、および作業アイテムをインポートするジョブのスケジュール設定」を参照してください。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
エリアチーム多対多 [sn_ado_int_m2m_area_team]	チームとエリアとの関係を保存します。
添付マップ [sn_int_common_attachment_map]	Azure DevOps と アジャイル開発 との間の問題に対する添付ファイルのマッピングを保存します。
Azure DevOps エリア [sn_ado_int_area]	Azure DevOps からインポートされたエリアのリストを保存します。
Azure DevOps インポート要求 [sn_ado_int_import_request]	Azure DevOps からプロジェクトとプロセスマッピングをインポートするために作成されたすべてのインポート要求のリストを保存します。
Azure DevOps インスタンス [sn_ado_int_instance]	すべての Azure DevOps インスタンスのリストを保存します。
Azure DevOps 反復 [sn_ado_int_iteration]	Azure DevOps からインポートされた反復のリストを保存します。
Azure DevOps プロジェクト [sn_ado_int_project]	Azure DevOps からインポートされたプロジェクトのリストを保存します。
Azure DevOps サブスクリプション [sn_ado_int_subscription]	Azure に登録されている Webhook のイベントタイプのサブスクリプション ID を保存します。
Azure DevOps チーム [sn_ado_int_team]	インポートされた Azure DevOps チームのリストを保存します。
選択マップ [sn_int_common_choice_map]	Azure DevOps プロジェクトのワークフロー状況マッピングのリストを保存します。
イベントタイプ [sn_int_common_input_event_type]	作業アイテムの作成、更新、削除など、Webhook イベントのタイプの情報を保存します。
外部識別子 [sn_int_common_external_identifiers]	外部 ID、外部キー、外部プロジェクト、外部 URL など、すべての Azure DevOps 参照識別子のリストを保存します。
外部プロジェクト [sn_int_common_project]	プロジェクト ID、このプロジェクトの Azure DevOps インスタンス、プロジェクト名な

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
	ど、Azure DevOps プロジェクトの情報を保存します。
外部システム [sn_int_common_external_system]	統合に使用される Azure DevOps アプリケーションの情報を保存します。
外部システムバージョン [sn_int_common_external_system_version]	統合に使用される Azure DevOps アプリケーションの API バージョン情報を保存します。
フィールドマップ [sn_int_common_field_map]	Azure DevOps プロジェクトの各種作業アイテムのフィールドマッピングのリストを保存します。
プロセスマッピング [sn_ado_int_process_mapping]	Azure DevOps プロセスごとのマップ構成テンプレートのリストを保存します。
テーブルマップ [sn_int_common_table_map]	Azure DevOps プロジェクトのテーブルマップのリストを保存します。
チーム統合設定 [sn_agile_ado_int_import_settings]	Azure DevOps プロジェクト、チーム、および Agile アサイン先グループ間の 1 対 1 関係のリストを保存します。
Webhook レジストリー [sn_int_common_webhook_registry]	イベントの更新を受信するために Azure DevOps に登録された Webhook のレジストリーコールバックパスの詳細を保存します。

Microsoft Azure DevOps と アジャイル開発 2.0 間の統合のセットアップ

アジャイル開発 2.0 との統合のための Microsoft Azure DevOps のセットアッププロセスを理解します。

アプリケーションが ServiceNow インスタンスにインストールされたら、sn_ado_int.user ロールを使用したデータ連携の設定に進むことができます。

統合のセットアッププロセスには、次のタスクが含まれます。

1. アジャイル開発 2.0 と Azure DevOps を接続します。
2. 利用可能なプロジェクトを Azure DevOps から検出してインポートします。
3. Azure DevOps から アジャイル開発 2.0 にチーム、エリア、反復をインポートします。
4. アジャイル開発 2.0 と Azure DevOps の間でインポートとエクスポートを設定します。
   a. Azure DevOps プロジェクトの Webhook を登録します。
   b. Azure DevOps プロジェクトを アジャイル開発 2.0 でアサイン先グループに関連付けます。
5. 作業アイテムと反復を アジャイル開発 2.0 に一括インポートします。スケジュール済みジョブを有効にして、Azure DevOps から問題を自動インポートします。
6. Azure DevOps と アジャイル開発 2.0 の間で、テーブル、フィールド、およびワークフロー状況のカスタムマップ構成を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 **2.0** と **Azure DevOps** の接続

接続エイリアスと Azure DevOps インスタンスを使用して、アジャイル開発 2.0 と Azure DevOps の間に接続を確立します。

Azure DevOps 接続エイリアスの作成

Azure DevOps との接続を確立するための接続エイリアスとして一緒に使用される基本認証資格情報と HTTP(s) 接続を作成します。

始める前に
必要なロール：

- 接続情報および認証情報エイリアスを作成する場合は admin
- 基本認証情報と HTTP(s) 接続を作成する場合は sn_ado_int.admin または sn_ado_int.user

手順

1. 接続情報および認証情報エイリアスの作成
   - デフォルトでは、接続エイリアス (sn_ado_int.Azure_DevOps) を使用できます。
   - 使用するすべての Azure DevOps 組織の接続エイリアスを作成する必要があります。
2. OAuth 2.0 または基本認証を使用して認証情報を作成します。
   - OAuth 2.0: Set up the Microsoft Azure DevOps Boards spoke using OAuth を参照してください。
   - ベーシック認証: ベーシック認証情報 を参照してください。

     注:
     基本認証情報を作成するときは、 Azure DevOps で個人アクセストークンの詳細を使用します。
     - ベーシック認証情報の [パスワード] フィールドを、Azure DevOps で個人アクセストークンとして設定します。
     - ベーシック認証情報の [ユーザー名] フィールドを、Azure DevOps で個人アクセストークンを作成するときに使用するユーザー名として設定します。

       ログインの形式が *`domainname\username`* の場合は、*`username`* のみを使用します。
3. 作成 HTTP(S) 接続を作成します 。

次のタスク
Azure DevOps インスタンスの作成

.

Azure DevOps インスタンスの作成

作成した接続エイリアスを使用して、Azure DevOps インスタンスレコードを作成します。このインスタンスは、アジャイル開発 2.0 と Azure DevOps の間の統合を確立するために使用されます。

始める前に
必要なロール：sn_ado_int.admin または sn_ado_int.user

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Azure DevOps Integration** > **Azure DevOps** インスタンス.
2. [**New**] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. フォームのフィールドに入力します。

Azure DevOps インスタンスフォーム

フィールド	説明
名前	Azure DevOps インスタンスの名前。任意の名前を入力します。
接続エイリアス	作成済みの Azure DevOps 接続エイリアス。ルックアップ ( ) オプションを使用して、接続エイリアスを選択します。
バージョン	Azure DevOps バージョン。ルックアップ ( ) オプションを使用して、Azure DevOps バージョンを選択します。

4. [送信] をクリックします。

次のタスク
Azure DevOps への接続

。

Azure DevOps への接続

統合を有効にするには、Azure DevOps を アジャイル開発 2.0 に接続します。

始める前に
必要なロール：sn_ado_int.user

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Azure DevOps Integration** > **Azure DevOps** インスタンス.
2. Azure DevOps インスタンスレコードを開きます。
3. [接続] をクリックします。

タスクの結果
Azure DevOps インスタンスレコードの [ステータス] フィールドに次のように表示されている場合：

- [接続]：接続に成功しました。
- [未接続]：接続を確立できませんでした。エラーメッセージで失敗の理由を確認できます。

次のタスク
Azure DevOps プロジェクトの検出とインポート

。

Azure DevOps プロジェクトの検出とインポート

利用可能なすべての Azure DevOps プロジェクトを検出して アジャイル開発 2.0 にインポートし、2 つのアプリケーション間のデータ連携の使用を開始します。

始める前に

- 完了 接続 アジャイル開発 および Azure DevOps.
- 必要なロール：sn_ado_int.user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Azure DevOps Integration** > **Azure DevOps** インスタンス.
2. Azure DevOps インスタンスレコードを開きます。
3. [プロジェクトの検出] をクリックします。

   このアクションでは、Azure DevOps プロジェクトをインポートし、これらすべてのプロジェクトのマップ構成を処理する要求を作成します。[Azure DevOps インポート要求] 関連リストで、すべてのインポート要求を表示できます。これらの要求の初期状態は [要求済み] です。

タスクの結果
各インポート要求のステータスが [完了] に変更されると、この Azure DevOps インスタンスの関連リストが次のように設定されていることがわかります。

- Azure DevOps プロジェクト：Azure DevOps から利用可能なすべてのプロジェクト
- プロセスマッピング：プロセスタイプに従ってインポートされたすべての Azure DevOps プロジェクトのマップ構成。

  たとえば、Agile、基本、CMMI などのデフォルトのプロセスタイプや、Azure DevOps プロジェクトに定義したカスタムプロセスタイプなどです。

  作業アイテムのデフォルトのマップ構成の詳細については、「アジャイル開発 2.0 との Azure DevOps 統合のデフォルトのマップ構成」を参照してください。

次のタスク
Azure DevOps からチーム、エリア、反復をインポートする

。

アジャイル開発 **2.0** との **Azure DevOps** 統合のデフォルトのマップ構成

Azure DevOps と アジャイル開発 2.0 の間の、さまざまなプロセスタイプのデフォルトのフィールドマップ構成を理解します。

さまざまなプロセスタイプのデフォルトのマップ構成を確認することで、Azure DevOps の作業アイテムタイプが アジャイル開発 でどのようにマッピングされているかを確認できます。また、2 つのアプリケーション間でフィールドがどのようにマッピングされているかを確認することもできます。

利用可能なエピック、ストーリー、および問題を Azure DevOps からインポートすると、このデータはプロセスマップ構成での定義に従ってテーブルに保存されます。

注:

アプリケーションのバージョン 1.3 にアップグレードすると、マップ構成は、インスタンスレベルではなく、プロセスタイプごとにプロセスレベルで生成されます。作業アイテムのインポートとエクスポートが影響を受けないように、以前に構成したカスタムマップを更新する必要があります。

さまざまなプロセスタイプのデフォルトのマップ構成を表示する方法は次のとおりです。

1. 移動先 **Agile Azure DevOps Integration** > **Azure DevOps** インスタンス.
2. Azure DevOps インスタンスレコードを開きます。
3. [プロセスマッピング] 関連リストから、プロセスマップのレコードを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Azure DevOps と アジャイル開発 2.0 の間で、フィールド、テーブル、および選択マップの構成を追加または更新できます。詳細については、「Azure DevOps データ連携のためのマップ構成のカスタマイズ」を参照してください。

Azure DevOps のさまざまなプロセスタイプのデフォルトのマップ構成の詳細を次に示します。

アジャイルプロセスのデフォルトマッピング

アジャイルプロセスのデフォルトマッピング構成

Azure DevOps のテーブル	Agile Development 2.0 のテーブル
ユーザーストーリー	ストーリー [rm_story]
エピック	エピック [rm_epic]
機能	機能 [sn_safe_feature]

基本プロセスのデフォルトマッピング

基本プロセスのデフォルトのマッピング構成

Azure DevOps のテーブル	Agile Development 2.0 のテーブル
問題	ストーリー [rm_story]
エピック	エピック [rm_epic]

CMMI プロセスのデフォルトマッピング

CMMI プロセスのデフォルトのマッピング構成

Azure DevOps のテーブル	Agile Development 2.0 のテーブル
エピック	エピック [rm_epic]
要件	ストーリー [rm_story]

スクラムプロセスのデフォルトマッピング

スクラムプロセスのデフォルトマッピング構成

Azure DevOps のテーブル	Agile Development 2.0 のテーブル
製品バックログアイテム	ストーリー [rm_story]
エピック	エピック [rm_epic]

Azure DevOps からチーム、エリア、反復をインポートする

Azure DevOps プロジェクトのエリア、チーム、反復をインポートします。これらの詳細は、スプリントデータをインポートし、Azure DevOps プロジェクトを アジャイル開発 2.0 のアサイン先グループに関連付けるために使用されます。

始める前に

- Azure DevOps プロジェクトの検出とインポート。
- 必要なロール：sn_ado_int.user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Azure DevOps Integration** > **Azure DevOps** インスタンス.
2. Azure DevOps インスタンスレコードを開きます。
3. [Azure DevOps プロジェクト] 関連リストから、プロジェクトレコードを開きます。
4. [エリア、反復、およびチームをインポートします] をクリックします。

   [Azure DevOps インポート要求] 関連リストに、インポート要求の詳細が表示されます。

   インポートされたすべてのチーム、反復、およびエリアは、このプロジェクトの [Azure DevOps チーム]、[Azure DevOps 反復]、および [Azure DevOps エリア] 関連リストで表示できます。

次のタスク
Azure DevOps と アジャイル開発 2.0 の間のインポートとエクスポートの設定

。

Azure DevOps と アジャイル開発 **2.0** の間のインポートとエクスポートの設定

アジャイル開発 2.0 と Azure DevOps の間での作業アイテムのインポートおよびエクスポートアクションの設定を構成します。

作業アイテムの同期を有効にするには、Azure DevOps プロジェクトの Webhook を登録し、Azure DevOps プロジェクトとチームを アジャイル開発 2.0 のアサイン先グループに関連付けます。

Azure DevOps プロジェクトの **Webhook** の登録

Webhook を登録して、Azure DevOps プロジェクトから アジャイル開発 2.0 へのイベントに登録します。

始める前に

- Azure DevOps プロジェクトの検出とインポート。
- 必要なロール：sn_ado_int.user

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Azure DevOps Integration** > **Azure DevOps** インスタンス.
2. Azure DevOps インスタンスレコードを開きます。
3. [Azure DevOps プロジェクト] 関連リストから、プロジェクトレコードを開きます。
4. **[Webhook** を登録] をクリックします。
   Webhook 登録が成功すると、プロジェクトフォームの [ステータス] フィールドが [未登録] から [登録済み] に変更されます。

タスクの結果
Webhook を Azure DevOps に登録すると、Azure DevOps と アジャイル開発 2.0 の間で次のイベント更新が受信されます。

- 作業アイテムを作成
- 作業アイテムを更新
- 作業アイテムを削除
- 作業アイテムを復元
- 作業アイテムにコメント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらの Webhook イベントに応じて作業アイテムを同期する詳細については、「アジャイル開発と Azure DevOps の間で作業アイテムをインポートおよびエクスポートする」を参照してください。

次のタスク
Azure DevOps プロジェクトを アジャイル開発 2.0 でアサイン先グループに関連付ける

。

Azure DevOps プロジェクトを アジャイル開発 2.0 でアサイン先グループに関連付ける

Azure DevOps プロジェクトとチームを アジャイル開発 2.0 のアサイン先グループに関連付けて、2 つのアプリケーション間で問題をインポートおよびエクスポートできるようにします。

始める前に

- Azure DevOps からチーム、エリア、反復をインポートする。
- アジャイル開発 でアサイン先グループを作成します。「アジャイル開発 2.0 でのアサイン先グループの作成」を参照してください。
- 必要なロール：sn_ado_int.user

このタスクについて

Azure DevOps チームをアサイン先グループに関連付けると、次のことができます。

- このチームの利用可能なすべてのストーリーとエピックを関連するグループにインポートします。
- アジャイル開発 2.0 と Azure DevOps の両方で、新しいストーリーとエピック、または既存のストーリーとエピックに加えられた更新を表示します。
- 反復をスプリントとして アジャイル開発 2.0 にインポートします。

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Azure DevOps Integration** > チーム統合設定.
2. [**New**] をクリックします。
3. [チームデータ連携設定] フォームで、次を選択します。
   - Azure DevOps プロジェクト
   - Azure DevOps プロジェクトのチーム
   - 選択した Azure DevOps チームを関連付ける、アジャイル開発 2.0 のアサイン先グループ

   [デフォルトエリア] フィールドの値は、選択したチームに応じて自動的に入力されます。

   注:
   [デフォルト領域] の値がチーム統合設定レコードに既に使用されている場合、アジャイル開発 2.0バックログを複数のアサイン先グループ間で共有できないため、別のチーム統合設定レコードに使用することはできません。

   アジャイル開発 2.0 にアサイン先グループがないストーリーまたはエピックは、Azure DevOps と同期されません。これは、チーム統合設定レコードの値によって、 アジャイル開発 2.0 内のストーリーまたはエピックが属する ADO プロジェクトが決定されるためです。
4. [**Submit** (送信)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

設定の詳細は、[Azure DevOps プロジェクト] フォームの [チームデータ連携設定] で確認できます。

> **注:**
> アサイン先グループに関連付けることができる Azure DevOps チームは 1 つのみです。

次のタスク
Azure DevOps から アジャイル開発 2.0 への作業アイテムのインポート

。

関連情報

アジャイル開発 と Azure DevOps の間で作業アイテムをインポートおよびエクスポートする

Azure DevOps から アジャイル開発 **2.0** への作業アイテムのインポート

Azure DevOps プロジェクトの作業アイテムと反復を アジャイル開発 にインポートして、作業のステータスを追跡および更新します。

始める前に

- Azure DevOps プロジェクトのチームデータ連携設定をセットアップします。詳細については、「Azure DevOps プロジェクトを アジャイル開発 2.0 でアサイン先グループに関連付ける」を参照してください。
- 必要なロール：sn_ado_int.user

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Azure DevOps Integration** > **Azure DevOps** インスタンス.
2. Azure DevOps インスタンスレコードを開きます。
3. [Azure DevOps プロジェクト] 関連リストから、プロジェクトレコードを開きます。
4. [作業アイテムのインポートを有効にする] および [作業アイテムのエクスポートを有効にする] オプションを選択して、作業アイテムのインポートとエクスポートを有効にします。
5. [同期スプリント] オプションを選択して、スプリントデータの同期を有効にします。
6. [作業アイテムのインポート] をクリックします。
7. 日付と時刻の範囲を選択します。
8. **[Submit** (送信)] をクリックします。

> **注:**
> 一括インポートアクションでは、[説明] フィールドと [受け入れ条件] フィールドはインポートされません。ただし、インポートが完了した後に Azure DevOps でこれらのレコードが更新された場合、これらのフィールドは Webhook イベントを介して Agile で同期されます。

[Azure DevOps インポート要求] 関連リストに、インポート要求の詳細が表示されます。

アジャイル開発 アプリケーションでは、インポートされたすべての作業アイテムとスプリントを表示できます。

- ストーリーとエピックの関係は、Azure DevOps の場合と同じです。

  ストーリーの [アサイン先] フィールドは、ユーザーのメールアドレスに基づいてユーザーに設定されます。メールアドレスはユーザーアカウントごとに一意である必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- Azure DevOps の反復と アジャイル開発 のスプリントとの状況マッピングは次のとおりです。

Azure DevOps でのステータス	アジャイル開発 2.0 でのステータス
過去	完了
予定	ドラフト
現在	現在

- 次の条件では、アジャイル開発 2.0 にスプリントが作成されません。
  - Azure DevOps の反復の日付フィールドが空の場合。
  - 反復に子反復が関連付けられている場合。
  - スプリントの日付が重複している場合。
- Azure DevOps で 2 つ以上のチームがバックログ反復を共有する場合、各チームの個別のスプリントレコードが アジャイル開発 2.0 に作成されます。

次のタスク

Azure DevOps からプロジェクト、チーム、エリア、および作業アイテムをインポートするジョブのスケジュール設定

。

Azure DevOps からプロジェクト、チーム、エリア、および作業アイテムをインポートするジョブのスケジュール設定

Azure DevOps から アジャイル開発 2.0 に定期的に新規プロジェクト、チーム、エリア、作業アイテム、スプリントを自動的にインポートするジョブをスケジュール設定します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

スケジュール済みジョブを構成しない場合は、プロジェクトを手動で検出し、エリアとチームをインポートする必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > スケジュール済みジョブ.
2. 次のいずれかのジョブを開きます。
   - Azure プロジェクトジョブの検出 (Discover Azure Project Job)
   - Azure DevOps のチーム、エリア、反復をインポート (Import Azure DevOps Teams Areas and Iterations)
   - Azure DevOps 作業アイテムのインポート (Import Azure DevOps Work Items)

   これらのジョブは、デフォルトでは非アクティブです。
3. 手動でジョブを実行するには、[今すぐ実行] をクリックします。
4. スケジュールされた時刻にジョブを実行するには、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。
   必要に応じて、[実行] フィールドと [時刻] フィールドの詳細を編集できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [更新] をクリックします。
6. 他の 2 つのスケジュール済みジョブについても、この手順を繰り返します。

Azure DevOps データ連携のためのマップ構成のカスタマイズ

組織の設定に従って、Azure DevOps と アジャイル開発 2.0 の間のテーブル、フィールド、またはステータスのマップ構成をカスタマイズします。

- プロセスタイプの既存のマップ構成に変更を加えると、このプロセスマップを使用するすべての Azure DevOps プロジェクトに適用されます。
- カスタムマップ構成では、番号、選択、テキスト、日付、ID、日付、日時、および参照タイプのフィールドのみがサポートされています。

テーブルマップ構成のカスタマイズ

Azure DevOps のタスク、反復、および作業領域と アジャイル開発 2.0 のテーブルとの間のテーブルマップを構成し、プロセスタイプの Azure DevOps プロジェクトでフィールドを構成します。

始める前に

- Azure DevOps プロジェクトの検出とインポート。
- 必要なロール：sn_ado_int.user

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Azure DevOps Integration** > **Azure DevOps** インスタンス.
2. Azure DevOps インスタンスレコードを開きます。
3. [プロセスマッピング] 関連リストから、マップ構成をカスタマイズするプロセスマップを開きます。
4. [テーブルマップ] 関連リストから、[新規] をクリックします。
5. フォームのフィールドに入力します。

テーブルマップフォーム

フィールド	説明
内部テーブル	アジャイル開発 2.0 におけるテーブルの名前。
外部テーブル	Azure DevOps におけるテーブル ID。
外部テーブル名	Azure DevOps におけるテーブルの表示名。

6. テーブル構成を保存します。
7. テーブルマップレコードの [フィールドマップ] 関連リストから、次のフィールドをマップするための新しいフィールドマップを作成します。

Azure DevOps のフィールド	アジャイル開発 のフィールド
作業アイテムのタイトル (Title of the work item)	簡単な説明

テーブルのフィールドマッピングの構成方法については、「フィールドマップ構成のカスタマイズ」を参照してください。新しいテーブル構成用に他のフィールドマップを作成することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次のタスク

1. プロセスマップフォームから [マッピングを検証して修正] をクリックして、新しいテーブルマップ構成を検証します。
2. [テーブルマップ] 関連リストで、構成の [有効] 列に次のように表示されている場合：
   - true：マップ構成の検証に成功しました。
   - false：マップ構成の検証に失敗しました。すべてのフィールドに正しい値を入力したことを確認し、再度検証してください。
3. この新しいテーブルマップ構成を Azure DevOps にエクスポートするビジネスルールを作成します。詳細については、「カスタムテーブルマップ構成を適用するビジネスルールの作成」を参照してください。

フィールドマップ構成のカスタマイズ

プロセスタイプの Azure DevOps プロジェクトで アジャイル開発 2.0 テーブル内にフィールドをマップするカスタムのフィールドマップ構成を作成します。

始める前に

- Azure DevOps プロジェクトの検出とインポート。
- 必要なロール：sn_ado_int.user

このタスクについて

カスタムフィールドマップ構成では、次のフィールドタイプがサポートされています。

- 番号
- 選択
- テキスト
- 日付
- ID
- 日時
- 参照
- リスト

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Azure DevOps Integration** > **Azure DevOps** インスタンス.
2. Azure DevOps インスタンスレコードを開きます。
3. [プロセスマッピング] 関連リストから、マップ構成をカスタマイズするプロセスマップを開きます。
4. [テーブルマップ] 関連リストから、そのテーブルマップのフィールドマップ構成を作成するレコードを開きます。
5. [フィールドマップ] 関連リストで、[新規] をクリックします。
6. フォームのフィールドに入力します。

フィールドマップフォーム

フィールド	説明
内部フィールド	アジャイル開発 2.0 におけるフィールド名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ルックアップ列名	このフィールドは、内部フィールドとして参照フィールドを選択する場合に必要です。 詳細については、「Azure DevOps での参照フィールドの構成」を参照してください。
テーブルマップ	このフィールドが作成される、アジャイル開発 2.0 におけるテーブルマップ。 このフィールドは、選択したテーブルマップレコードに基づいて自動入力されます。
外部フィールド	Azure DevOps におけるフィールド ID。
外部フィールド名	Azure DevOps におけるフィールドの表示名。

7. [送信] をクリックします。

次のタスク

1. プロセスマップフォームから [マッピングを検証して修正] をクリックして、新しいテーブルマップ構成を検証します。
2. [テーブルマップ] 関連リストから、新しいフィールドマップ構成に移動します。構成の [有効] 列に次のように表示されている場合：
   - true：マップ構成の検証に成功しました。
   - false：マップ構成の検証に失敗しました。すべてのフィールドに正しい値を入力したことを確認し、再度検証してください。


重要:
カスタムマップ構成が無効である場合、または必須フィールドがその作業アイテムにマップされていない場合、エクスポートおよびインポートアクションは機能しません。

Azure DevOps での参照フィールドの構成

新しいフィールドマップ構成を作成するときに参照フィールドを構成する方法を理解します。

[内部フィールド] フィールドの参照フィールドを選択する場合は、[ルックアップ列名] フィールドの値を選択する必要があります。[ルックアップ列名] フィールドの値は、Azure DevOps と アジャイル開発 2.0 の間で作業アイテムをインポートおよびエクスポートするときに使用されます。

インポート中に、統合アプリケーションは [ルックアップ列名] フィールドを使用して参照テーブル内のレコードを検索します。レコードが見つからない場合、作業アイテムの値は アジャイル開発 2.0 で空になります。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスマップ構成のカスタマイズ

プロセスタイプの Azure DevOps プロジェクトで希望のワークフロー状況をマップする、アジャイル開発 2.0 テーブルのフィールドに対するカスタム状況マップ構成を作成します。

始める前に

- Azure DevOps プロジェクトの検出とインポート。
- 必要なロール：sn_ado_int.user

このタスクについて

Azure DevOps における 1 つの状況を アジャイル開発 2.0 における複数の状況にマップできます。このような場合、問題タイプの アジャイル開発 2.0 におけるステータスは、このステータス構成に指定する選択肢の順序値によって異なります。

たとえば、[アクティブ] ステータスにある Azure DevOps の作業アイテムがインポートされた場合、アジャイル開発 2.0 の [ステータス] フィールドは、選択肢の順序値が最も小さいため、[対応中] に設定されます。

Azure DevOps における複数の状況を アジャイル開発 2.0 における 1 つの状況にマップすることもできます。

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Azure DevOps Integration** > **Azure DevOps** インスタンス.
2. Azure DevOps インスタンスレコードを開きます。
3. [プロセスマッピング] 関連リストから、選択マップ構成をカスタマイズするプロセスマップを開きます。
4. このプロセスタイプのワークフロー状況マップを開きます。
   a. [テーブルマップ] 関連リストで、[ユーザーストーリー **(User Story)]** をクリックします。
   b. [フィールドマップ] 関連リストで、[ステータス] をクリックします。
5. [選択マップ] 関連リストで、[新規] をクリックします。
6. フォームのフィールドに入力します。

[選択マップ] フォーム

フィールド	説明
内部選択肢	アジャイル開発 2.0 におけるステータスの値。この値は整数です。
外部選択肢	Azure DevOps でのステータスの名前。
外部選択肢名	Azure DevOps におけるステータスの表示名。

7. [送信] をクリックします。

次のタスク

1. プロセスマップフォームから [マッピングを検証して修正] をクリックして、新しいテーブルマップ構成を検証します。
2. 新しい選択マップ構成に移動します。構成の [有効] 列に次のように表示されている場合：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- true：マップ構成の検証に成功しました。
- false：マップ構成の検証に失敗しました。すべてのフィールドに正しい値を入力したことを確認し、再度検証してください。

カスタムテーブルマップ構成を適用するビジネスルールの作成

アジャイル開発 2.0 テーブルの新しいカスタムマップ構成から Azure DevOps プロジェクトへのエクスポートを有効にするビジネスルールを作成します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
Azure DevOps プロセスタイプのカスタムテーブルマップを作成した後、Azure DevOps とのストーリーの同期に似たビジネスルールを作成し、この新しいテーブルマップを使用して Azure DevOps に情報をエクスポートできるようにします。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > ビジネスルール.
2. 利用可能なビジネスルールのリストから、[Azure DevOps とのストーリーの同期 (Synch Story with Azure DevOps)] ルールを見つけて開きます。
3. コンテキストメニュー (☰) から、このビジネスルールに対して [挿入と維持] 操作を実行します。
   ServiceNow インスタンスで [挿入と維持] アクションを有効にしていない場合は、「レコードの挿入オプションの許可」を参照してください。
4. [ビジネスルール] フォームで、次のフィールドを編集します。

[ビジネスルール] フォーム

フィールド	説明
名前	ビジネスルールの一意の名前。 たとえば、新しいテーブルマップで欠陥をマップする場合は、このルールに「Azure DevOps との欠陥の同期」といった名前を付けます。
テーブル	アジャイル開発 2.0 内で、カスタムマップを作成したテーブルを選択します。 例：欠陥 [rm_defect]。

5. [更新] をクリックします。

カスタムテーブルの添付ファイルのインポートとエクスポートの許可

プロセスタイプのマップ構成に追加したカスタムテーブルについて、Azure DevOps と アジャイル開発 2.0 の間で添付ファイルのインポートとエクスポートを有効にします。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > ビジネスルール.
2. ビジネスルールのリストから、[Azure への添付ファイルの同期 (Sync Attachment to Azure)] ルールを見つけて開きます。
3. フォームの [実行タイミング] セクションで、カスタムテーブルマップをフィルター条件に追加して含めます。
   たとえば、追加したカスタムテーブルが欠陥である場合は、次のようにします。
   a. [「OR」節を追加] をクリックします。
   b. 新しい節を [テーブル名] [次の値と同じ] **[rm_defect]** に設定します。
4. [更新] をクリックします。

カスタムテーブルの **Azure DevOps** 識別子参照フィールドへの入力

プロセスタイプのマップ構成に追加した アジャイル開発 2.0 テーブルの Azure DevOps プロジェクト識別子参照フィールドを有効にします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ID、キー、Azure DevOps プロジェクト、およびプロジェクト URL の参照をカスタムテーブルフォームに表示するには、このテーブルを [外部識別子参照の入力 (Populate External Identifier Reference)] ビジネスルールに追加します。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > ビジネスルール.
2. ビジネスルールのリストから、[作業アイテムの外部 URL の設定 (Set external URL for Work Items)] ルールを見つけて開きます。
3. フォームの [実行タイミング] セクションで、カスタムテーブルマップをフィルター条件に追加して含めます。
   たとえば、追加したカスタムテーブルが欠陥である場合は、次のようにします。
   a. [「OR」節を追加] をクリックします。
   b. 新しい節を [参照テーブル] [次の値と同じ] **[rm_defect]** に設定します。
4. [更新] をクリックします。

次のタスク
フォームレイアウトを構成するか、カスタムテーブルのリストレイアウトをカスタマイズして、次のフィールドのいずれかまたはすべてを表示します。

- 外部 ID (External ID)
- 外部キー
- 外部プロジェクト
- 外部 URL

関連情報

v2 リストのカスタマイズ

フォームレイアウトの構成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAFe との Azure DevOps データ連携の構成

ServiceNow インスタンスで SAFe との Microsoft Azure DevOps データ連携を設定する方法について説明します。

1. SAFe にマップする Azure DevOps のプロセスを特定します。

   Azure DevOps インスタンスレコードの [プロセスマッピング] 関連リストから、SAFe 構成にマップするプロセスを特定します。

   [プロセスマッピング] 関連リストが空の場合は、Azure DevOps プロジェクトを検出してからもう一度試してください。

2. マップ構成を更新して、SAFe エンティティをインポートします。

   SAFe エンティティのテーブル、フィールド、およびワークフロー状況マッピングを作成する方法については、「Azure DevOps データ連携のためのマップ構成のカスタマイズ」を参照してください。

3. 「SAFe の Azure DevOps プロジェクトの構成」を参照してください。

SAFe の Azure DevOps プロジェクトの構成

Azure DevOps プロジェクトで SAFe 関連構成をセットアップし、Azure DevOps との SAFe PI およびスプリントデータ連携のワークフローを理解します。

SAFe エンティティのマップ構成を作成した後、Azure DevOps プロジェクトのエリア、チーム、および反復をインポートし、次のフィールドを更新します。[同期スプリント] が **[true]** に設定されている場合、これらのフィールドは必須です。

- **[ART]**：Agile リリーストレーニング (ART) を選択します。
- **[ART** 反復パス]：PI の親と同等の反復を選択します。


  注:
  ART 反復パスのルックアップ (🔍) でレコードが返されない場合は、Azure DevOps からエリア、チーム、反復をインポートして、もう一度試してください。

  次のスクリーンショットに示す例では、[ART 反復パス] として **[Fabrikam]** を選択する必要があります。

アプリケーションは、PI 1 をプログラムインクリメントとして自動的に識別し、Sprint 1、Sprint 2 などを ServiceNow インスタンスの対応する SAFe スプリントとして自動的に識別します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

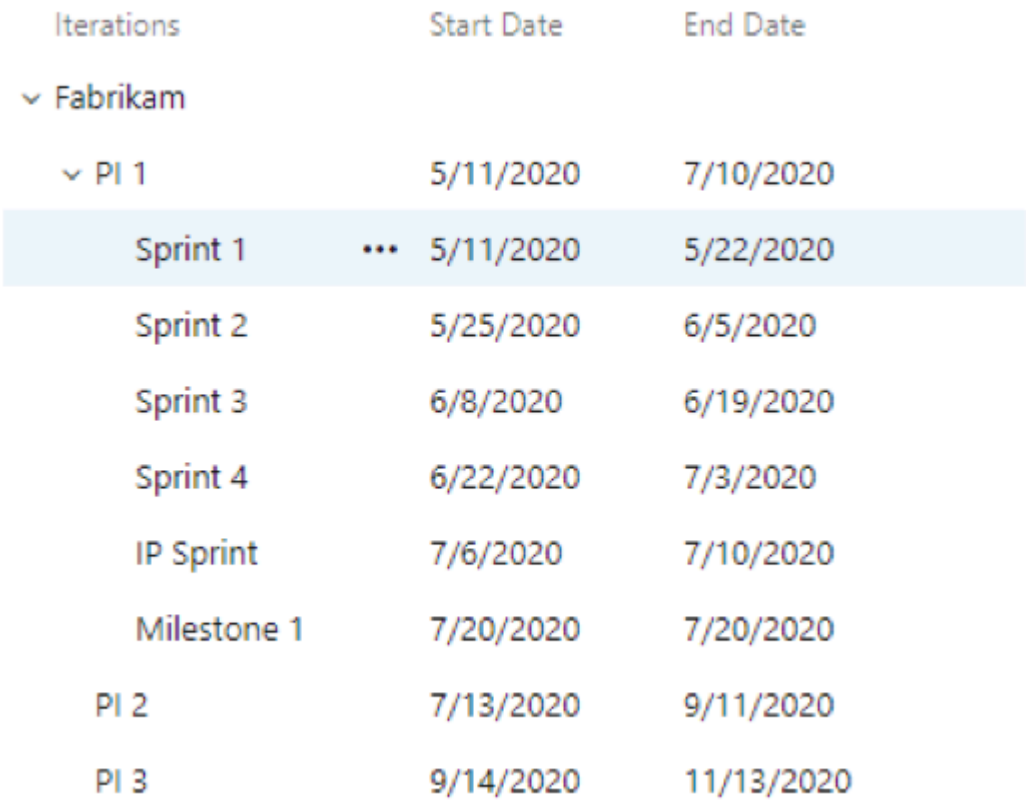

Iterations	Start Date	End Date
Fabrikam		
PI 1	5/11/2020	7/10/2020
Sprint 1	5/11/2020	5/22/2020
Sprint 2	5/25/2020	6/5/2020
Sprint 3	6/8/2020	6/19/2020
Sprint 4	6/22/2020	7/3/2020
IP Sprint	7/6/2020	7/10/2020
Milestone 1	7/20/2020	7/20/2020
PI 2	7/13/2020	9/11/2020
PI 3	9/14/2020	11/13/2020


重要:

- プロジェクトのチームデータ連携設定を作成するには、SAFe チームがプロジェクトの ART に含まれている必要があります。
- ART のすべてのチームは、同じスプリントサイクルを共有する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAFe スプリントと PI のデータ連携ワークフロー

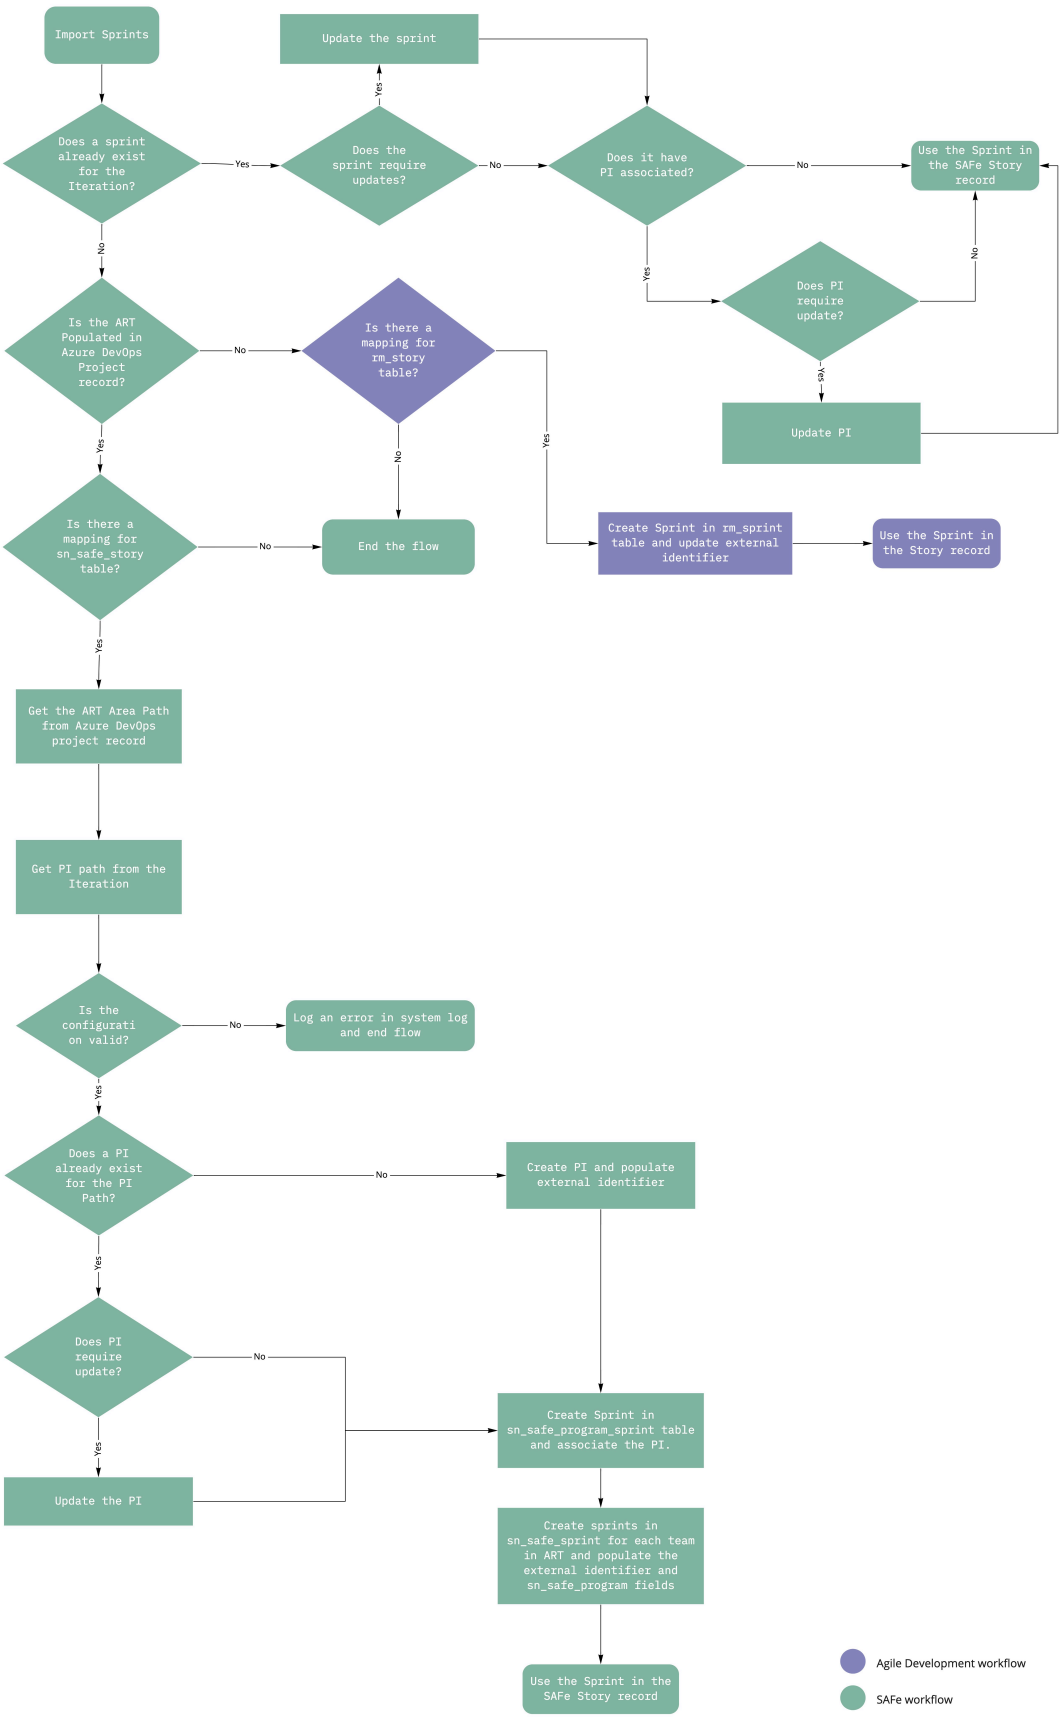

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Azure DevOps と SAFe の統合に関する問題のトラブルシューティング

Azure DevOps と SAFe の統合作業中に発生する可能性がある一般的な問題を解決します。

問題	アクション
[ART] および **[ART** 反復パス] フィールドが Azure DevOps プロジェクトフォームに表示されません。	SAFe ストーリーのテーブルマッピングが存在することを確認します。
スプリントが Azure DevOps から SAFe にインポートされません。	• スプリントのステータスを確認します。状況が未来と現在のスプリントのみがインポートされます。 • 重複するスプリントがないことを確認します。
PI が Azure DevOps から SAFe にインポートされません。	• 重複する PI がないことを確認します。 • Azure DevOps プロジェクトフォームで正しい ART 反復パスが選択されていることを確認します。
エラーメッセージ「*Ensure that the selected assignment group belongs to the ART and try again*」が Azure DevOps プロジェクトフォームに表示されます。	この Azure DevOps プロジェクトのすべてのチームデータ連携設定のアサイン先グループは、このプロジェクト用に選択された ART に属する SAFe チームである必要があります。 そうでない場合は、これらの SAFe チームを ART に追加し、これらの SAFe チームをアサイン先グループとして使用してチームデータ連携設定の作成に進みます。
スプリントが SAFe 機能にリンクされません。	機能を PI にリンクすることはできますが、SAFe ではサポートされていないため、スプリントにはリンクされません。Azure DevOps ポータルの機能で PI 反復パスを選択すると、この機能は SAFe の PI にリンクされます。

関連情報

Azure DevOps と アジャイル開発 の統合に関する問題のトラブルシューティング

Azure DevOps と アジャイル開発 2.0 の間のデフォルトマップ構成の生成

既存のマップ構成をリセットする場合は、Azure DevOps プロセスタイプのデフォルトマッピングを生成します。

始める前に

- Azure DevOps プロジェクトの検出とインポート。
- 必要なロール：sn_ado_int.user

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
Azure DevOps プロセスタイプのデフォルトマップ構成を復元するには、既存のテーブルマップを削除してから、このプロセスタイプのマッピングを作成します。

エピックやストーリーなど利用可能な作業アイテムを Azure DevOps からインポートすると、このデータはプロジェクトのプロセスタイプのマップ構成での定義に従ってテーブルに保存されます。

Azure DevOps プロセスに作業アイテムのテーブルマップが存在しない場合、Azure DevOps とアジャイル開発 2.0 との間でこの作業アイテムをインポートおよびエクスポートすることはできません。

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Azure DevOps Integration** > **Azure DevOps** インスタンス.
2. Azure DevOps インスタンスレコードを開きます。
3. [プロセスマッピング] 関連リストから、デフォルトのマップ構成を生成するプロセスマップを開きます。
4. [マッピングの作成] をクリックします。

   注:
   このプロセスのテーブルマップが既に存在する場合、[マッピングの作成] ボタンは表示されません。

   [マッピングの作成] タイプの要求が作成され、Azure DevOps インスタンスの [Azure DevOps インポート要求] 関連リストに表示されます。

タスクの結果
マッピングの作成要求のステータスが [完了] に変更されると、この Azure DevOps プロセスの [マッピング構成] フィールドに値が入力されていることがわかります。また、このプロセスの [テーブルマップ] 関連リストで、デフォルトのマップ構成を確認することもできます。

関連情報

Azure DevOps データ連携のためのマップ構成のカスタマイズ

アジャイル開発 と **Azure DevOps** の間で作業アイテムをインポートおよびエクスポートする

アジャイル開発 と Azure DevOps の間の作業アイテムのインポートおよびエクスポートのワークフローを理解します。

アジャイル開発 2.0 と Azure DevOps の間で作業アイテムのインポートおよびエクスポートを有効にするには、設定を構成する必要があります。

Azure DevOps から アジャイル開発 **2.0** へのインポート

- Azure DevOps でエピックタイプの作業アイテムを作成すると、構成したチームデータ連携設定に従ってアサイン先グループのエピックが作成されます。
- Azure DevOps でストーリータイプの作業アイテムを作成すると、構成したチームデータ連携設定に従ってアサイン先グループのストーリーが作成されます。

  ストーリーとエピックの関係は、Azure DevOps の場合と同じです。

- フィールドマップ構成で定義されたフィールドのみがストーリーまたはエピックに保持されます。デフォルトのマップ構成の詳細については、「アジャイル開発 2.0 との Azure DevOps 統合のデフォルトのマップ構成」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- Azure DevOps で作業アイテムに添付ファイルを追加すると、同じ添付ファイルが アジャイル開発 2.0 の対応するストーリーまたはエピックに追加されます。

- Azure DevOps で作成された新しい反復では、対応するスプリントレコードはすぐには アジャイル開発 2.0 に作成されません。

  Azure DevOps の新しい反復に作業項目が初めて追加されると、対応するスプリントレコードがアジャイル開発 2.0 に作成されます。2 つのアプリケーション間で常にデータの整合性を確保するには、 アジャイル開発 2.0 でスプリントを作成します。

- アジャイル開発 2.0 には、リーフレベルの反復のみがスプリントとして保持されます。
- Azure DevOps で問題にコメントを追加すると、そのコメントは、マップ構成に基づき、Agile Development のストーリーまたはエピックの [作業メモ] フィールドで更新されます。

  注:
  コメントに追加された画像はサポートされていません。


- Azure DevOps で作業アイテムを削除すると、対応するレコードが アジャイル開発 2.0 で削除されます。
- Azure DevOps で反復を削除すると、対応するスプリントが アジャイル開発 2.0 で削除されます。

  注:
  アジャイル開発 2.0 でレコードを削除するには、各テーブルのアプリケーションアクセスで [他のアプリケーションスコープからの削除アクセスを許可します] フィールドを **[true]** に設定します。詳細については、「テーブルの設計時と実行時の設定」を参照してください。

- Azure DevOps のゴミ箱から作業アイテムを復元すると、チームデータ連携設定に従って、対応するレコードが アジャイル開発 2.0 に作成されます。


Azure DevOps で作成された作業アイテムのインポートワークフロー

Import workflow for work item created in Azure DevOps

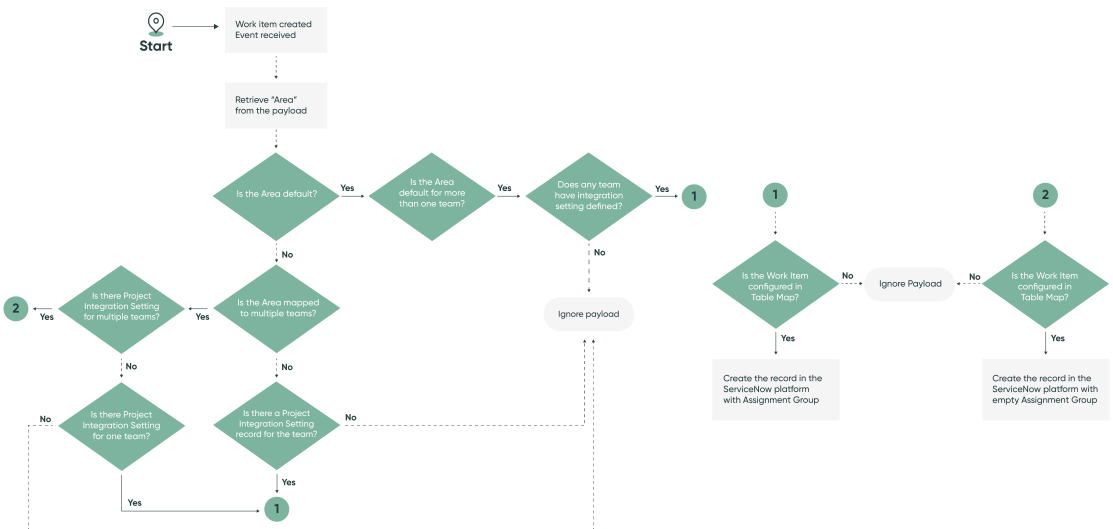

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Azure DevOps で更新されたエリアのインポートワークフロー

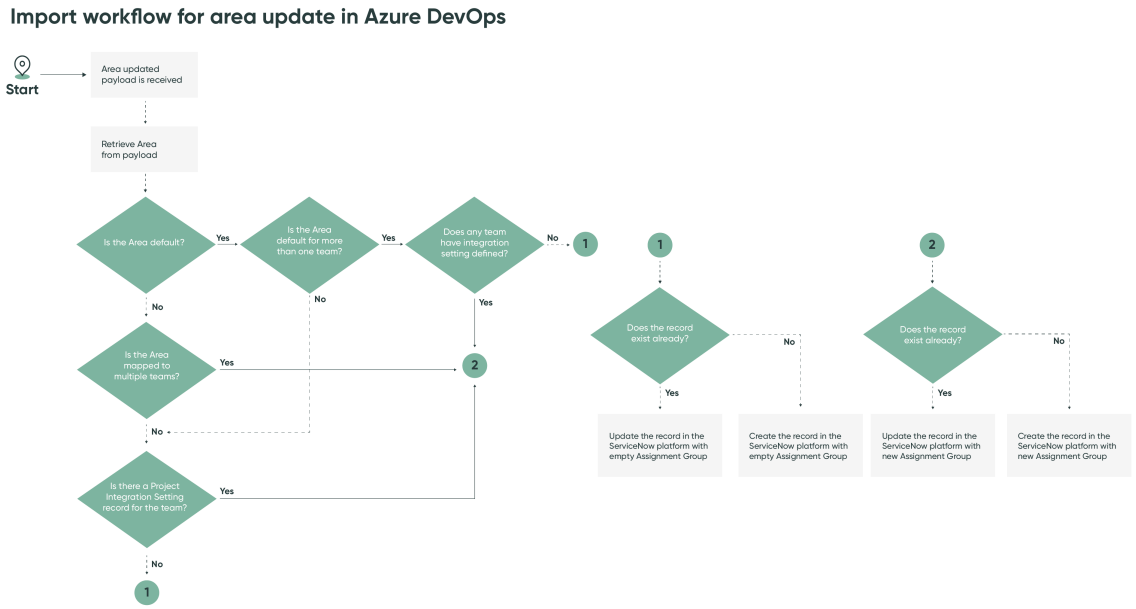

アジャイル開発 から **Azure DevOps** へのエクスポート


- アサイン先グループのエピックを作成すると、構成したチームデータ連携設定に従って Azure DevOps でエリアに作業アイテムとしてエクスポートされます。
- アサイン先グループのストーリーを作成すると、構成したチームデータ連携設定に従って Azure DevOps のエリアに作業アイテムとしてエクスポートされます。

  ストーリーとエピックの関係は、Azure DevOps の場合と同じです。
- ストーリーまたはエピックに添付ファイルを追加すると、同じ添付ファイルが Azure DevOps の対応する作業アイテムに追加されます。
- アジャイル開発 2.0 で既存のストーリーのアサイン先グループを更新すると、更新されたアサイン先グループに関連付けられている Azure DevOps エリアの作業アイテムが再作成されます。
- アジャイル開発 2.0 でアサイン先グループのスプリントを作成すると、チームデータ連携設定に従って、Azure DevOps のバックログ反復の下にエクスポートされます。
- アジャイル開発 2.0 でアサイン先グループのスプリントを削除すると、Azure DevOps でチームの反復からスプリント選択のリンクが解除されます。
- アジャイル開発 2.0 で作業アイテムを更新すると、更新されたフィールドのみがペイロードの一部として Azure DevOps に送信されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 **2.0** で更新されたアサイン先グループのエクスポートワークフロー

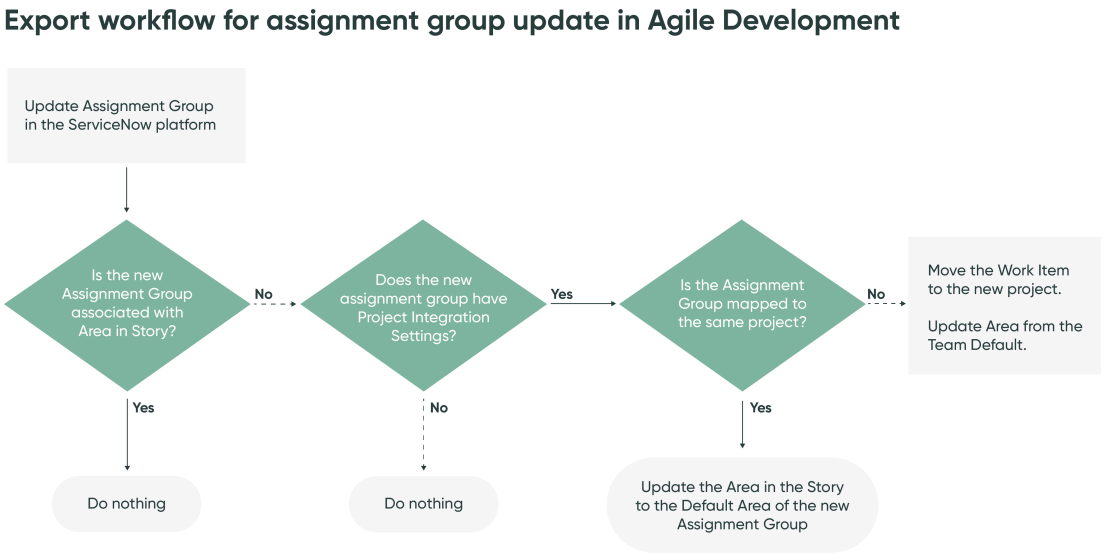

アジャイル開発 **2.0**と **Azure DevOps** の間でのスプリントの詳細の同期

アジャイル開発 2.0 から Azure DevOps へスプリントの詳細を同期します。[同期スプリント] フィールドがオンになっている場合、アジャイル開発 2.0 でのスプリントの詳細の変更は、Azure DevOps の反復パスにエクスポートされます。

アジャイル開発 **2.0** での新規作業アイテムのスプリントの詳細の同期

同期スプリント	エクスポート	インポート
無効 (Azure DevOps で反復パスを利用可能)	プロジェクトのデフォルトの反復パスを Azure DevOps に送信します。	アジャイル開発 2.0 内のスプリント値は変更されません。
無効 (Azure DevOps で反復パスを利用不可)	プロジェクトのデフォルトの反復パスを Azure DevOps に送信します。	アジャイル開発 2.0 内のスプリント値は変更されません。
有効 (Azure DevOps で反復パスを利用可能)	プロジェクトの該当の反復パスを Azure DevOps に送信します。	アジャイル開発 2.0 内のスプリント値は変更されません。
有効 (Azure DevOps で反復パスを利用不可)	プロジェクトのデフォルトの反復パスを Azure DevOps に送信します。	アジャイル開発 2.0 内のスプリント値がクリアされます。

アジャイル開発 **2.0** での既存の作業アイテムのスプリントの詳細の同期

スプリントを同期	エクスポート	インポート
無効	前の反復パスを Azure に送信します。反復パスは Azure DevOps で同じになります。	アジャイル開発 2.0 のスプリント値が選択されています。
有効	選択に基づいて新しい反復パスを送信します。反復は選択に基づいて変更されます。	アジャイル開発 2.0 のスプリント値が選択されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Azure DevOps と アジャイル開発 の統合に関する問題のトラブルシューティング

Azure DevOps と アジャイル開発 2.0 の統合作業中に発生する可能性がある一般的な問題を解決します。

問題	アクション
エクスポートアクションが機能していません。	• カスタムマップ構成を確認します。 カスタムマップ構成が無効である場合、または必須フィールドがその作業アイテムにマップされていない場合、エクスポートは機能しません。 • プロジェクトの [エクスポートを有効にする] チェックボックスがオンになっていることを確認します。 • Azure DevOps パスワードの有効期限が切れているかどうかを確認します。
スプリントが Azure DevOps から アジャイル開発 2.0 にインポートされません。	次のいずれかの理由で、スプリントは アジャイル開発 2.0 にインポートされません。 • Azure DevOps で作成された新しい反復では、対応するスプリントレコードはすぐには アジャイル開発 2.0 に作成されません。 Azure DevOps の新しい反復に作業項目が初めて追加されると、対応するスプリントレコードが アジャイル開発 2.0 に作成されます。 2 つのアプリケーション間で常にデータの整合性を確保するには、 アジャイル開発 2.0 でスプリントを作成します。 • 重複するスプリントがないことを確認します。
ストーリーまたはエピックのアサイン先グループが設定されません。	チームが アジャイル開発 2.0 のアサイン先グループに関連付けられていない場合、アサイン先グループが設定されない可能性があります。Azure DevOps チームのプロジェクトデータ連携設定が存在することを確認します。 作業アイテムのエリアが複数のチームにマップされている場合、アジャイル開発 2.0 ではその作業アイテムのアサイン先グループは空です。このような場合、この作業アイテムのアサイン先グループを手動で選択できます。
Azure DevOps のフィールドの値が アジャイル開発 2.0 に設定されません。	カスタムフィールドマップが構成されているかどうかを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

問題	アクション
Azure DevOps の [優先度] および [ステータス] フィールドの値が アジャイル開発 2.0 に設定されません。	カスタム状況マップが構成されているかどうかを確認します。
Azure DevOps におけるユーザーによる更新がアジャイル開発 2.0 では更新されません。	Azure DevOps と アジャイル開発 2.0 のデータ連携を設定するために使用されるユーザー認証情報が、レコード更新の実行に使用されていないことを確認します。
作業アイテムが Azure DevOps では削除されますが、アジャイル開発 2.0 では削除されません。	各テーブルのアプリケーションアクセスで [他のアプリケーションスコープからの削除アクセスを許可します] フィールドが **[true]** に設定されていることを確認します。 詳細については、「テーブルの設計時と実行時の設定」を参照してください。
プロジェクト、チーム、またはエリアを削除しても、アジャイル開発 2.0 でアクションが発生しません。	Azure DevOps でプロジェクト、チーム、またはエリアを削除した後、Azure DevOps アドミニストレーターは、アジャイル開発 2.0 で対応する Azure DevOps プロジェクトとそれに関連するストーリーを手動で削除する必要があります。
新しい Azure DevOps プロジェクトが自動的にインポートされません。	Azure DevOps インスタンスレコードからプロジェクトを手動で検出してプロジェクトの更新を即座に同期するか、これらの更新を検出してインポートする日次ジョブをスケジュール設定します。 スケジュール済みジョブの詳細については、「Azure DevOps からプロジェクト、チーム、エリア、および作業アイテムをインポートするジョブのスケジュール設定」を参照してください。
プロジェクトのインポートされた作業アイテム (エピックとストーリー) に、関連付けられたアサイン先グループがありません。	このプロジェクトのチームデータ連携設定があることを確認します。詳細については、「Azure DevOps プロジェクトを アジャイル開発 2.0 でアサイン先グループに関連付ける」を参照してください。 Azure DevOps プロジェクトのインポートされた作業アイテムに関連付けられているアサイン先グループは、そのプロジェクトのチームデータ連携設定に基づきます。プロジェクトにチームデータ連携設定がない場合、インポートされた作業アイテムには空のアサイン先グループが設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

問題	アクション
Azure DevOps で反復に加えられた変更がすぐに アジャイル開発 2.0 に反映されません。	Azure DevOps プロジェクトレコードから手動で反復をインポートするか、これらの更新を検出してインポートする日次ジョブをスケジュール設定します。 スケジュール済みジョブの詳細については、「Azure DevOps からプロジェクト、チーム、エリア、および作業アイテムをインポートするジョブのスケジュール設定」を参照してください。
接続、切断、および検証と修正の UI アクションが初めて使用するときにエラーになります。	このエラーは既知の問題です。UI アクションを再試行します。
Azure DevOps の [説明] フィールドに & がある場合、アジャイル開発 2.0 では & として表示されます。	アジャイル開発 2.0 と Azure DevOps 間のフィールドマッピングは、HTML フィールドではサポートされていません。
Webhook が登録解除されても、エクスポートは引き続き機能します。	Webhook は、Azure DevOps から アジャイル開発 2.0 にデータをインポートするためだけのものです。作業アイテムのエクスポートを停止するには、プロジェクトの [作業アイテムのエクスポート] チェックボックスをオフにします。

詳細なプロジェクトログの有効化

プロジェクトのログ記録の詳細をすべて表示するには、統合プロジェクトログ記録のプロパティを有効にします。詳細については、「アジャイル開発 2.0 との Microsoft Azure DevOps データ連携における詳細なプロジェクトログ記録の有効化」を参照してください。

アジャイル開発 **2.0** との **Microsoft Azure DevOps** データ連携における詳細なプロジェクトログ記録の有効化

アジャイル開発 2.0 との Microsoft Azure DevOps データ連携でデータ連携プロジェクトログ記録を有効にして、詳細なプロジェクトログを表示できるようにする方法を理解します。

始める前に

必要なロール：sn_jira_int.admin (編集アクセス権あり) または sn_jira_int.user (読み取りアクセス権あり)。

このタスクについて


Agile Azure DevOps Integration アプリケーションでプロジェクトログ記録のプロパティを有効にします。

手順

1. 移動先 すべて > **Agile Azure DevOps Integration** > プロパティ.
2. [データ連携プロジェクトのログ記録を有効にする **(Enable Integration Project Logging)**] チェックボックスをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

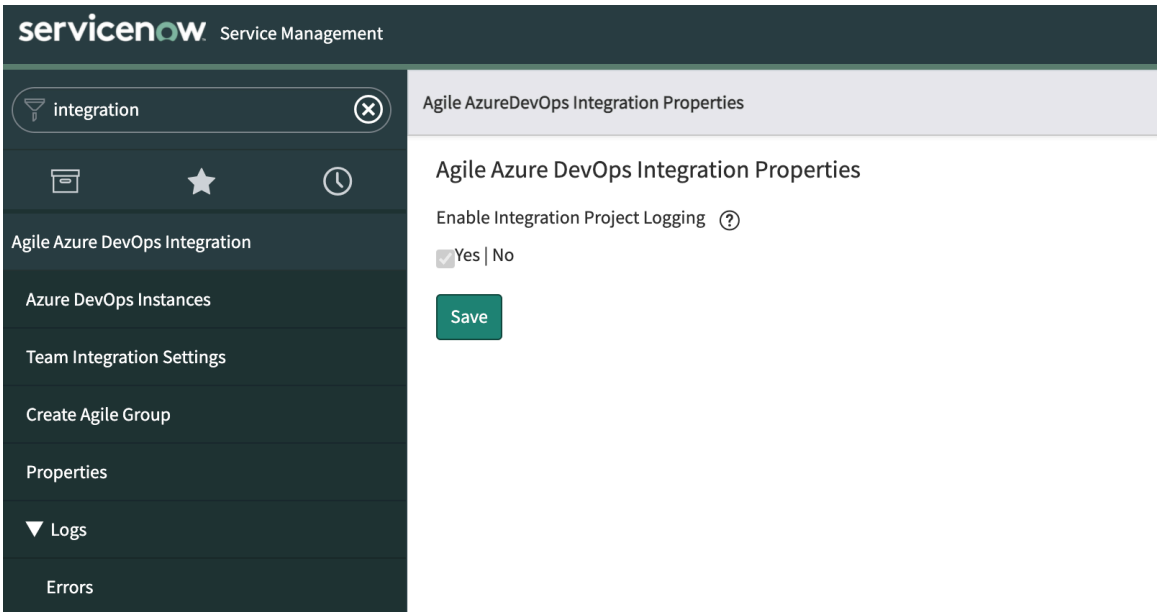

3. [保存] をクリックします。

アジャイル開発 **2.0**の参照

フィールド、関連リスト、ユーザーロール、テーブル、ガイドライン、ドメインセパレーション情報など、アジャイル開発 2.0 アプリケーションに関するその他の詳細情報を提供する参照情報です。

アジャイル開発 **2.0** とともにインストールされるコンポーネント

アジャイル開発 2.0 プラグインが有効になると、いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロール、プロパティなど) がインストールされます。

> **注:**
> アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

この機能ではデモデータを利用できます。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
スクラムアドミン [scrum_admin]	スクラムアドミニストレーターは、Agile Development 2.0 アプリケーションを完全に制御できます。	• scrum_user • rm_product_admin • rm_task_admin • rm_test_admin • rm_doc_admin • rm_story_admin • rm_epic_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
		• rm_releasescrum_admin • rm_sprint_admin
スクラムマスター [scrum_master]	スクラムマスターは、スプリントを通じてチームメンバーをガイドし、発生した問題に対応するサウンディングボードとして機能します。 スクラムマスターは、リリースバックログとスプリントの間でストーリーを移動できます。このユーザーは、以下を作成および管理できます。 • エピック • ストーリー • スプリント • チームメンバー	• scrum_sprint_planner • scrum_story_creator • scrum_user
スクラム製品オーナー [scrum_product_owner]	このロールを持つユーザーは、プロジェクトのビジネス価値と製品バックログの管理について責任を負います。 製品オーナーは、製品バックログとリリースの間でストーリーを移動できます。このユーザーは、以下を作成および管理できます。 • テーマ • エピック • ストーリー • 製品 • リリース • Teams	• scrum_release_planner • scrum_story_creator • scrum_user
スクラムリリース計画者 [scrum_release_planner]	このロールを持つユーザーは、リリース計画アクティビティを実行します。 リリース計画担当者は、以下を作成および管理できます。 • テーマ • 製品 • リリース	• scrum_user • scrum_story_creator
スクラムスプリント計画者	このロールを持つユーザーは、スプリントプロセスを管理します。	• scrum_user • scrum_story_creator

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
[scrum_sprint_planner]	スプリント計画担当者は、以下を作成および管理できます。 • ストーリー • スプリント	
スクラムストーリー作成者 [scrum_story_creator]	このロールを持つユーザーは、製品の説明的な要素を作成します。 ストーリー作成者は、以下を作成および管理できます。 • エピック • ストーリー • タスク	• rm_scrum_task_admin • scrum_user
スクラムストーリー編集者 [scrum_story_editor]	このロールを持つユーザーには、ストーリー [rm_story] テーブルへの編集アクセス権があります。	• scrum_user • rm_scrum_task_admin
スクラムチームメンバー [scrum_team_member]	このロールを持つユーザーは、スプリント内のストーリーで作業するスクラムユーザーです。 チームメンバーは、スクラムタスクを作成し、ストーリーに対する更新を実行して、拡張要求または欠陥レポートをログに記録することができます。	• scrum_user • scrum_story_creator • scrum_story_editor • rm_defect_admin • rm_enhancement_admin • rm_scrum_task_admin
スクラムタスクアドミン [rm_scrum_task_admin]	[rm_scrum_task] テーブルへのアクセス権を持つスクラムタスクアドミン。	scrum_user
スクラムユーザー [scrum_user]	他のすべてのロールが継承する基本スクラムロール。Agile Development アプリケーションに読み取り専用権限を付与します。 スクラムユーザーは、アジャイルのすべての要素を表示できますが、どのタイプのレコードも作成、編集、または管理できません。	cmdb_read

インストールされるテーブル

テーブル	説明
製品アサイン先グループ [m2m_product_group]	製品とグループ間の関係を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
リリースアサイン先グループ [m2m_release_group]	リリースとグループ間の関係を保存します。
アプリケーション モデル [cmdb_application_product_model]	リリースが管理されている製品全体を表します。
リリース製品 [m2m_ product_release]	すべての管理対象製品を表します。
ストーリーの依存関係 [m2m_story_dependencies]	既存のストーリーに関連するすべてのストーリー (必須条件および依存関係) を表します。
スクラムタスク [rm_scrum_task]	スプリント中に実行されたストーリーの個別の作業量を表します。
リリースチームのメンバー [scrum_pp_release_team_member]	リリースの一部であるユーザーのリストを表します。
スプリントチームのメンバー [scrum_pp_sprint_team_member]	スプリントの一部であるユーザーのリストを表します。
チーム [scrum_pp_team]	リリースおよびスプリント中にスクラムタスクとストーリーを完了したユーザーを表します。
チーム名 [scrum_pp_team_name]	スクラムチームの名前を表します。
テーマ [scrum_theme]	具体的な製品 (取引アプリケーションなど) または抽象的な目標 (パフォーマンス調整など) のいずれかを表します。
スクラムリリース [rm_release_scrum]	製品の個々のバージョン (リリース) を表します。各リリースには、スプリントのストーリーが完了する必要がある時間範囲を含むスプリントのリストが含まれています。
スプリント [rm_sprint]	指定された期間中にまとめて対応されるバックログアイテムであるスプリントを格納します。
Epic [rm_epic]	まだストーリーに変換していない関連ストーリーまたは要件を表します。
ストーリー [rm_story]	スプリント内で完了できる自己完結型の作業を表します。
不具合	製品の予想される動作からの逸脱を表します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
[rm_defect]	
ドキュメントタスク [rm_doc]	製品のドキュメントタスクを表します。
拡張 [rm_enhancement]	既存の製品の改善を表します。
SDLC リリース [rm_release_sdlc]	製品の個々のバージョンを表します。
テストタスク [rm_test]	製品のテストタスクを表します。

Agile Development 2.0 とともにインストールされるプロパティ

プロパティは、Agile Development 2.0 を有効化すると追加されます。

Agile Development 2.0 では、次のプロパティが追加されます。

注:
これらのプロパティはすべて、システムプロパティ [sys_properties] テーブルに配置されています。テーブルにアクセスするには、ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力します。

プロパティ	使用法
バーンダウンチャートの理想線を直線で描画します com.snc.sdlc.scrum.pp.burndown.ideal.linear	バーンダウンチャートの理想線を直線で描画します。 • タイプ：true|false • デフォルト値：false
このカンマ区切りのリスト内で指定されたステータスのいずれかのストーリーが進捗ボードに表示されます (指定された順番で) com.snc.sdlc.scrum.pp.progress.story.states	ストーリーの進行状況ボードに表示するカンマ区切りリストを使用して、ストーリーのステータスを指定します。進行状況ボードのステータスは、ここで指定した順序に従います。 • タイプ：整数 • 順番のデフォルト値： ○ -6：ドラフト ○ 1：準備完了 ○ 2：対応中 ○ -7：テスト準備完了

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	使用法
	○ -8：テスト中 ○ 3：完了
このカンマ区切りのリスト内で指定された状況のいずれかのタスクが進捗ボードに表示されます (指定された順番で) com.snc.sdlc.scrum.pp.progress.task.state	進行状況ボードに表示するカンマ区切りリストを使用して、タスクのステータスを指定します。進行状況ボードのステータスは、ここで指定した順序に従います。 • タイプ：整数 • 順番のデフォルト値： ○ -6：ドラフト ○ 1：準備完了 ○ 2：対応中 ○ 3：完了
スクラムタスクに対して [実績時間] フィールドを有効化 com.snc.sdlc.scrum.pp.task_uses_actual_hours	スクラムタスクフォームの [実績時間] フィールドを有効化します。タスク進捗ボードにタスクの実際の時間を表示します。 • タイプ：true|false • デフォルト値：true
スプリント期間がスプリントから算出できない場合に使用される、デフォルトのスプリント長 (日数)。 com.snc.sdlc.scrum.pp.default_sprint_length	スプリントからスプリント長を計算できない場合に、スプリントの作成時に使用するデフォルトのスプリント期間を指定します。 • タイプ：整数 • デフォルト値： 14

アジャイル開発 2.0 での効果的なストーリーの記述

ストーリーの記述が適切だと、あらゆる開発者や、テストまたはドキュメントなどのチームのメンバーも理解しやすくなります。

ストーリーを使用すると、アサイン先グループは、完了の定義に従って作業を実施するために必要な工数を正確に見積もることができます。完了の定義は、ストーリーがどのような状況で完了するかを決定する、グループによって合意された終了基準です。

ストーリーには、次の基本条件があります。

- 説明：ストーリーの説明は、アドミンなどのユーザーペルソナに関連し、ビジネス価値を説明するか、技術的負債に対処します。
- 受け入れ基準：ストーリーの受け入れ基準は測定可能およびテスト可能です。

ストーリーの説明

適切なユーザーストーリーの説明は、指定された要件を満たすための次のことを示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- システム内のユーザーペルソナのロール
- ユーザーペルソナによって表されるニーズ
- 開発者、ユーザーなどのすべてのステークホルダーにとってのメリット

通常、ストーリーの説明は、「<ロール> として、<メリット> のために、<目標またはニーズ> を実現したい」という形式で表現されます。

適切なストーリーの説明の例

- 説明：開発者として、本番システムにアプリケーションを展開するために、アプリケーションの現在のステータスを更新セットに公開したいと考えています。
- 説明：顧客として、最新のステータスを得るために、インシデントにコメントが入力されたときに通知を受け取るようにしたいと考えています。
- 説明：変更マネージャーとして、複数の選択肢からなる質問のリストを作成して、特定の変更に対するリスクのアセスメントを可能にしたいと考えています。

不適切なストーリーの説明の例

説明：インシデントが作成されると、通知が送信されます。

この説明は、次の理由で不適切です。

- 説明に、通知の送信者や送信内容が記載されておらず、またメールなどの通知の形式も記載されていません。
- 説明にメリットに関する情報が含まれていないため、ビジネス価値が明確ではありません。

次のように記述してください。

説明：インシデント作成者として、関係者に影響を与えるインシデントが作成されたときに関係者に通知できるように、インシデントを作成するときに、事前定義された一連の関係者にメール通知を送信したいと考えています。

ストーリーの受け入れ条件

受け入れ基準は、ユーザーストーリーの境界を定義し、ソフトウェアが意図したとおりに動作している状況、つまりストーリーが完了した状況を確認するために使用されます。受け入れ基準は、ストーリーの「完了の定義」の重要な部分です。

適切な受け入れ条件

適切な受け入れ条件には、必要に応じて以下のことを含める必要があります。

- 使いやすさ：受け入れ条件には、使いやすさの測定値を必ず含めてください。この質問に対する回答方法を示してください：使いやすいですか？重要なのは、適切な測定値を特定し、それぞれが定量化可能であることを確認することです。
- 機能：プロジェクトの最後に実施する必要がある特定のユーザータスク、ビジネスプロセス、または機能を特定します。機能の要件は次のとおりです：ユーザーは複数のサイズから選択できます。
- エラー処理：エラーケースとそれぞれの処理方法を列挙します。たとえば、ユーザーが間違った順序でステップを実行した場合に、ソフトウェアはそれをどのように処理するのでしょうか？
- パフォーマンス：個々のユーザーの観点からシステムパフォーマンスをテストします。例：UI はレスポンシブですか？

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ストレステスト：多数のユーザー、トランザクション、またはクエリによりシステムがストレスを受けたときにシステムがどのように対応するかを説明します。受け入れ条件では、ストレステストの許容可能なしきい値を定義する必要があります。例：100 人のユーザーが同時にクエリを送信した場合、システムは 250 ミリ秒のしきい値以内に応答しますか？

適切な受け入れ条件の例

説明：顧客として、クレジットカード情報の安全性を確保するために、安全な Web ベースのフォームを使用して書籍の注文と支払いを行いたいと考えています。

受け入れ条件：

- 顧客がフォームを送信する前に、すべての必須フィールドに入力する必要がある。
- フォームの情報は、顧客注文データベースに保存される。
- 支払いは、Amex、マスターカード、または Visa クレジットカードで行うことができる。
- システムは売上税を正確に計算して適用しなければならない。
- システムは配送料を正確に計算して適用しなければならない。
- 顧客は注文の正確性を確認できるものとする。
- フォームを送信した顧客に確認メールが送信される。
- スパムに対する保護機能が働く。

不適切な受け入れ条件の例

説明：顧客として、最新のステータスを得るために、インシデントにコメントが入力されたときに通知を受け取るようにしたいと考えています。

受け入れ条件：インシデントにコメントが入力されたときに、適切な担当者に通知されます。

適切な担当者が明確でないなど、テストに十分な詳細が提供されていないため、受け入れ条件は不十分です。

受け入れ条件は、次のように記述してください。

1. ESS ユーザーとして、インシデントを作成します。
2. [ステークホルダーに通知] を選択します。
3. インシデントを保存します。
4. ステークホルダーとしてログインします。
5. ログに記録されたインシデントのメールを受信したことを確認します。

アジャイル開発 プロセスデータモデル


アジャイルプロセスを管理したり、リリースや、スプリントに含める製品バックログアイテムを表したりする際に アジャイル開発 2.0 で使用されるテーブル間の関係性について説明します。

次の図は、Agile Development テーブルと他のテーブルとの関係を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発プロセスの関係図

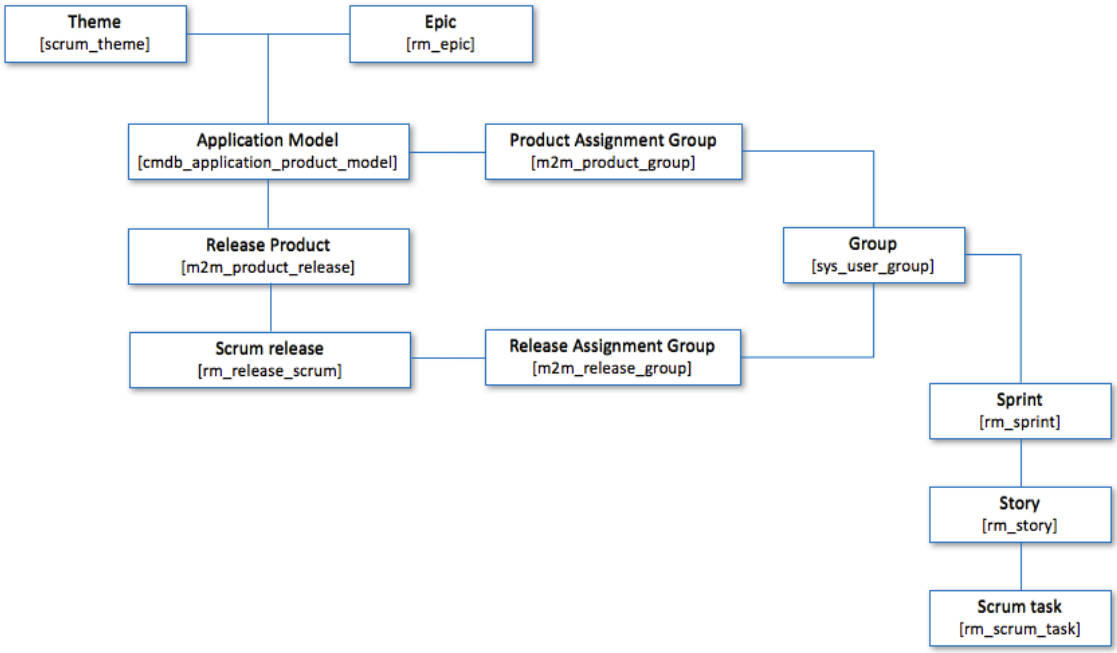

アジャイル開発 **2.0** のビジネスステークホルダーロール

ビジネスステークホルダーロールを使用して、アジャイル開発 2.0 およびスクラムプログラムアプリケーションの任意のテーブルからデータを読み取って取得し、レポートを生成します。

ServiceNowインスタンスでビジネスステークホルダープラグイン (com.snc.business_stakeholder) を有効化すると、Agile 2.0 プラグインの読み取り専用ロール (com.snc.release_management_read_roles) も有効化されます。このプラグインは、アジャイル開発 2.0 とスクラムプログラムアプリケーションのすべてのテーブルにアクセスできるビジネスステークホルダーロール (sn_agile_read) を提供します。ビジネスステークホルダーであるすべての組織内ユーザーに、このロールをアサインできます。

プラグインの使用可否

新規顧客の場合、Agile 2.0 プラグインの読み取り専用ロール (com.snc.agile_read_roles) が zBoot で有効化されます。ただし、ビジネスステークホルダーロール (sn_agile_read) は、アジャイル開発 2.0 プラグイン (com.snc.sdlc.agile.2.0) を有効化した場合にのみ使用できます。

アップグレード顧客の場合、Agile 2.0 プラグインの読み取り専用ロール (com.snc.agile_read_roles) を手動で有効化する必要があります。

ビジネスステークホルダーロールを持つユーザーがアクセスできる アジャイル開発 **2.0** テーブル

Agile 2.0 プラグインの読み取り専用ロール (com.snc.agile_read_roles) および アジャイル開発 2.0 プラグイン (com.snc.sdlc.agile.2.0) が ServiceNow インスタンス内で有効である場合、ビジネスステークホルダーロール (sn_release_read) を持つユーザーは、以下のテーブルに対する読み取りアクセス権を持ちます。

アジャイル開発 **2.0** テーブル

テーブル	説明
製品アサイン先グループ	製品とグループ間の関係を保存します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 **2.0** テーブル (続く)

テーブル	説明
[m2m_product_group]	
リリースアサイン先グループ [m2m_release_group]	リリースとグループ間の関係を保存します。
アプリケーション モデル [cmdb_application_product_model]	リリースが管理されている製品全体を表します。
リリース製品 [m2m_ product_release]	すべての管理対象製品を表します。
ストーリーの依存関係 [m2m_story_dependencies]	既存のストーリーに関連するすべてのストーリー (必須条件および依存関係) を表します。
スクラムタスク [rm_scrum_task]	スプリント中に実行されたストーリーの個別の作業量を表します。
スプリントチームのメンバー [scrum_pp_sprint_team_member]	スプリントの一部であるユーザーのリストを表します。
チーム [scrum_pp_team]	リリースおよびスプリント中にスクラムタスクとストーリーを完了したユーザーを表します。
チーム名 [scrum_pp_team_name]	スクラムチームの名前を表します。
テーマ [scrum_theme]	具体的な製品 (取引アプリケーションなど) または抽象的な目標 (パフォーマンス調整など) のいずれかを表します。
スクラムリリース [rm_release_scrum]	製品の個々のバージョン (リリース) を表します。各リリースには、スプリントのストーリーが完了する必要がある時間範囲を含むスプリントのリストが含まれています。
スプリント [rm_sprint]	指定された期間中にまとめて対応されるバックログアイテムであるスプリントを格納します。
Epic [rm_epic]	まだストーリーに変換していない関連ストーリーまたは要件を表します。
ストーリー [rm_story]	スプリント内で完了できる自己完結型の作業を表します。
不具合	製品の予想される動作からの逸脱を表します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 **2.0** テーブル (続く)

テーブル	説明
[rm_defect]	
拡張 [rm_enhancement]	既存の製品の改善を表します。

スクラムプログラムテーブル

テーブル	説明
epic_backlog_definition	エピックバックログの作成に使用されるフィルター基準を保存します。
scrum_program_m2m_group	スクラムプログラムとチームとの関係を保存します。

アジャイル開発 **2.0**のドメインセパレーション

ここでは、ドメインセパレーションの概要と、Agile Development 2.0 でのドメインセパレーションの仕組みについて説明します。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

Agile Development 2.0 でのドメインセパレーションの仕組み

- Agile 2.0 のエンティティはタスクの機能を拡張するため、タスクのドメイン動作を継承します。作成した新しいエントリは、現在ログインしているユーザーのドメインになります。
- アジャイルボードでは、ドメインセパレーションが考慮され、[スプリント計画立案] ページおよび [スプリント追跡] ページに、ユーザーが属するグループのリストが表示されます。表示されるバッ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クログエントリーは、現在のユーザーが所有しているか、または他のユーザーと共有しているものと同じドメインに含まれます。アジャイルボードに表示されるストーリーは、現在ログインしているユーザーのドメインに制限されます。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

アジャイル開発 2.0 におけるアサイン先グループの関連リンクと関連リスト

アジャイル開発 2.0 では、スプリントの追加やグループメンバーの編集など、アサイン先グループ向けに実行が必要なアクションに対して、グループフォームの関連リストを使用します。

グループフォームの関連リンク

名前	説明
スプリントの作成	チームのスプリントを作成します。新しいスプリントが、グループの [スプリント] 関連リストに一覧表示されます。
スプリント計画立案	アジャイル開発 2.0 でのスプリントアクティビティの計画。

グループフォームの関連リスト

名前	説明
グループメンバー	グループのメンバーをリストします。[編集] を選択すると、アジャイルグループのメンバーを追加したり削除したりできます。 [スプリントあたりの平均ポイント] フィールドがロールアップされ、スプリントのグループキャパシティが算出されます。
スプリント	グループのスプリントをリストします。[新規] をクリックして、スプリントをグループに追加します。

アジャイル開発 2.0 における製品の関連リスト

アジャイル開発 2.0 では、リリース、テーマ、エピック、ストーリー、アサイン先グループの関連付けなど、製品レコードで実行が必要なアクションに対して、製品フォームの関連リストを使用します。

製品フォーム関連リスト

リスト	説明
リリース	製品に関連するリリースの一覧を示します。 [新規] を選択してリリースを作成し、この製品に関連付けたり、[追加] を選択して既存の製品を追加したりできます。
テーマ	製品の一部であるテーマの一覧を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品フォーム関連リスト (続く)

リスト	説明
	[新規] を選択してテーマを作成し、製品に関連付けたり、[追加] を選択して既存のテーマを追加したりできます。
エピック	製品に関連するエピックの一覧を示します。 [新規] を選択してエピックを作成し、製品に関連付けたり、[追加] を選択して既存のエピックを追加したりできます。
ストーリー	製品に関連するストーリーの一覧を示します。 [新規] を選択してストーリーを作成し、製品に関連付けたり、[追加] を選択して既存のストーリーを追加したりできます。
グループ	製品にアサインされたグループの一覧を示します。[編集] を選択すると、既存のアジャイルグループを製品にアサインすることができます。 (アジャイルチームタイプの) 1 つ以上のアサイン先グループを製品に関連付けることができます。 製品をリリースに関連付けると、製品にアサインされたグループも自動的にリリースに追加されます。

アジャイル開発 **2.0** におけるリリースの関連リスト

アジャイル開発 2.0 では、製品、ストーリー、アサイン先グループの関連付けなど、リリースで実行が必要なアクションに対して、リリースフォームの関連リストを使用します。

リリースフォーム関連リスト

リスト	説明
製品	リリースに関連する 製品 の一覧を示します。 [新規] を選択して製品を作成し、リリースに関連付けたり、[追加] を選択して既存の製品を追加したりできます。
ストーリー	リリースに関連するストーリーの一覧を示します。 [新規] を選択してストーリーを作成し、リリースに関連付けたり、[追加] を選択して既存のストーリーを追加したりできます。 ストーリーを追加すると、リリースバックログが作成されます。
グループ	リリースにアサインされたグループの一覧を示します。[編集] を選択すると、既存のアジャイルグループをリリースにアサインすることができます。 製品をリリースに関連付けると、製品にアサインされたグループが自動的にリリースに追加されます。

アジャイル開発 **2.0** におけるストーリーの関連リンクと関連リスト

アジャイル開発 2.0 では、スクラムタスクや依存関係の追加、ストーリーの分割など、ストーリーで実行が必要なアクションに対して、ストーリーフォームの関連リンクや関連リストを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ストーリーの関連リンク

名前	説明
分割ストーリー	同じ詳細で新しいストーリーを作成して、ストーリーを 2 つのストーリーに分割します。古いストーリーの未完了のタスクは、この新しいストーリーに移動されます。 **注:** ストーリーの状態を [キャンセル] または [完了] にすることはできません。また、[元のタスク] フィールドが存在する場合、カタログ タスクや欠陥などのストーリー以外のレコードを含めることはできません。
スクラムタスクの追加	現在のストーリーに対して複数のスクラムタスクを作成できます。 スクラムタスクは、ストーリーの [スクラムタスク] 関連リストに表示されます。 詳細については、「アジャイル開発 2.0 でのストーリーに対する複数のスクラムタスクの作成」を参照してください。
エピックに変換	アクティブなストーリーをエピックに変換し、ストーリーを「キャンセル済み」ステータスに移行します。 作成したストーリーが大きすぎる場合は、エピックに変換してから、複数のストーリーに分割することができます。 • このストーリーがすでにエピックに関連付けられている場合、ストーリーはこのエピックの子エピックになります。 たとえば、STRY01 は EPIC01 に変換されます。STRY01 が EPIC02 に関連付けられていた場合、EPIC01 は EPIC02 の子エピックになります。それ以外の場合、EPIC01 はスタンドアロンエピックとして作成されます。 • 新しく作成されたエピックのステータスは、自動的に [ドラフト] に設定されます。 • キャンセルされたストーリーは、新しく作成されたエピックに関連付けられます。
ストーリーをコピー	既存のアクティブなストーリーの詳細を新しいストーリーにコピーします。ストーリーのテストとタスクもコピーされます。 新しく作成されたストーリーのステータスは、自動的に [ドラフト] に設定されます。 このアクションは、トリアージボードから追加されたストーリーには使用できません。 **注:** ストーリーの状態を [キャンセル] または [完了] にすることはできません。また、[元のタスク] フィールドが存在する場合、カタログ タスクや欠陥などのストーリー以外のレコードを含めることはできません。

ストーリーの関連リスト

名前	説明
スクラムタスク	ストーリー用に作成されたスクラムタスクの一覧を示します。[新規] をクリックしてスクラムタスクを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ストーリーの関連リスト (続く)

名前	説明
	詳細については、「アジャイル開発 2.0 ストーリーに対するスクラムタスクの作成」を参照してください。
必須条件ストーリー	現在のストーリーを完了する前に完了する必要があるストーリーの一覧を示します。[編集] をクリックして必須条件ストーリーを追加します。
依存ストーリー	現在のストーリーに依存するストーリーの一覧を示します。[編集] をクリックして依存ストーリーを追加します。
テスト	既存のテストをストーリーに追加します。 これらのテストは、このストーリーのスプリントが開始した後、アジャイルボードの [スプリント追跡] タブにも表示されます。

関連情報

- アジャイル開発 2.0 でのストーリー作成
- アジャイル開発 2.0 での効果的なストーリーの記述

Agile Development 2.0 におけるテーマの関連リスト

アジャイル開発 2.0 では、ストーリーやエピックとテーマとの関連付けなど、テーマで実行が必要なアクションに対して、テーマフォームの関連リストを使用します。

アジャイル開発 **2.0** におけるテーマの関連リスト

フィールド	説明
エピック	テーマに関連するエピックの一覧を示します。 [新規] を選択すると、エピックを新規作成してテーマに関連付けることができます。
ストーリー	テーマに関連するストーリーの一覧を示します。 [新規] を選択すると、ストーリーを新規作成してテーマに関連付けることができます。

アジャイル開発 **2.0** におけるテストバージョンフォーム

テストバージョンフォームのフィールドについて説明します。アジャイル開発 2.0 では、ストーリーに対して、このフォームを使用してテストを作成したり実行したりします。

テストバージョンフォーム

フィールド	説明
テスト	テストの一意の名前。
所有者	テストを作成したオーナー。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

テストバージョンフォーム (続く)

フィールド	説明
バージョン	自動生成されたバージョンのテスト。
状況	テストの現在のステータス。 • ドラフト：テストが作成されたときの状態。 • 準備完了：編集できない場合のテストの状態。テストに複数のバージョンがある場合、一度に 1 つのテストのみが「準備完了」ステータスになります • 廃止：利用されなくなったときのテストのステータス。
簡単な説明	テストに関する簡単な説明。
ステップを追加	テストにステップを追加するオプション
実行	ステップを実行するために使用するボタン。テストが「準備完了」ステータス の場合にのみ表示されます。「アジャイル開発 2.0 でのストーリーのテストの実行」を参照してください。
更新	テストバージョンの詳細を更新するオプション
準備完了	テストバージョンのステータスを「準備完了」に変更するオプション
新規バージョンを作成	別バージョンのテストを作成するオプション
削除	テストバージョンを削除するオプション
ステップ順序の変更 ()	テストステップの順序を変更するオプション。アイコンを選択し、必要な場所にステップをドラッグします。
検証が必要	検証でテストステップをマークするオプション
テストステップを削除 ()	テストステップを削除するオプション

関連情報

アジャイル開発 2.0 でのスプリントの進捗状況の追跡

アジャイル開発 **2.0** におけるテストバージョンの関連リスト

アジャイル開発 2.0 では、テスト結果の確認や、他の関連するテストバージョンやテストセットの表示など、テストで実行が必要なアクションに対して、テストバージョンフォームの関連リストを使用します。

関連リスト	説明
その他のバージョン	テストのバージョンをすべて表示します。
テスト結果	各テストバージョンの実行結果を表示します。
テストセット	テストセットの関連テストを表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

関連情報

アジャイル開発 2.0 でのスプリントの進捗状況の追跡

アジャイル開発 2.0のモバイルエクスペリエンス

アジャイル開発 v2 モバイルアプリを使用して、モバイルデバイスから現在のスプリントのストーリーとスクラムタスクのステータスを追跡および更新します。

アジャイル開発 v2 モバイルアプリでは、自分が属しているアサイン先グループのスプリントを追跡できます。モバイルデバイスから、現在のスプリントに対して次の操作を実行できます。

- 自分が属しているアサイン先グループのストーリーとスクラムタスクのステータスと詳細を表示します。
- ストーリーとスクラムタスクの詳細を編集および更新します。
- ストーリーのスクラムタスクを作成します。
- ストーリーまたはスクラムタスクに作業メモと添付ファイルを追加します。
- ストーリーまたはスクラムタスクで他のステークホルダーと共同作業を行います。
- ストーリーまたはスクラムタスクにメモが追加されたときにモバイル通知を受信します。

アジャイル開発 v2 のインストール

アジャイル開発 v2 モバイルアプリ (sn_store_agile_mob) を ServiceNow Store からインストールします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 ServiceNow Store .
2. ServiceNow Store で、アジャイル開発 v2 を検索します。
3. アプリケーションタイルをクリックします。
   アプリケーションに関する詳細情報を表示できます。

   注:
   該当する場合は、[他の要件] および [依存関係] セクションを読むことを検討してください。

4. [アプリを要求] をクリックし、Now Support ログイン認証情報を入力します。
5. [購入] をクリックします。
6. [インスタンス名] と [インスタンスの理由] を入力し、[インスタンスを検証] をクリックします。
7. [要求] をクリックします。
   詳細なインストール手順が記載されたメールが届きます。
8. アジャイル開発 をインストールするインスタンスにログインします。
9. 移動先 システムアプリケーション > アプリケーション.
10. アプリケーションを見つけて選択し、[インストール] をクリックします。

次のタスク
アジャイル開発 v2 モバイルアプリの開始

。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 **v2** モバイルアプリの開始

アジャイル開発 モバイルアプリにアクセスして、スプリント、ストーリー、およびタスクを追跡します。

始める前に

- モバイルエージェント モバイルアプリをアプリストア (iOS) または Google Play ストア (Android) からダウンロードします。
- ServiceNow インスタンスで アジャイル開発 v2 のインストール を実行します。
- 必要なロール：admin

手順

1. 次のいずれかの方法で、モバイルデバイスの モバイルエージェント アプリ上の ServiceNow インスタンスアドレスを使用してログインします。

既存のユーザー	○ モバイルエージェント アプリで既に使用しているインスタンスに アジャイル開発 v2 モバイルアプリをインストールした場合は、アプリを更新して **Agile 2.0** をアプレットランチャーとして表示します。 ○ アジャイル開発 モバイル v2 アプリを別のインスタンスにインストールした場合： **a.** タップしてログアウト 設定 > ログアウト. **b.** 追加アイコン ( ) をタップし、新しい ServiceNow インスタンスアドレスでログインします。
新規ユーザー	**a.** 次の 2 つの方法のいずれかでインスタンスアドレスを入力します。 ▪ インスタンスアドレスフィールドにインスタンスアドレスを入力します。 ▪ アドミニストレーターによって QR コードが提供されている場合は、QR アイコン ( ) をタップし、QR コードをスキャンします。 **b.** [保存してログイン] をタップします。

2. ユーザー名とパスワードを使用してログインします。
3. アジャイル開発 v2 アイコン ( ) をタップして、スプリント、ストーリー、およびスクラムタスクの追跡を開始します。

次のタスク

検索項目

- アジャイル開発 v2 モバイルアプリでのストーリーの管理。
- アジャイル開発 v2 モバイルアプリでのスクラムタスクの管理。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アジャイル開発 **v2** モバイルアプリでのストーリーの管理


モバイルデバイスで現在のスプリントに割り当てられたストーリーの詳細を表示、編集、および更新します。

モバイルデバイスで モバイルエージェント アプリを開き、アジャイル開発 v2 に移動します。scrum_product_owner、scrum_team_member、または scrum_master のロールを使用して、次のアクションを実行します。

アジャイル開発 **v2** でのストーリーの追跡

モバイルデバイスから、複数のアサイン先グループからアサインされたストーリーを含む、アサイン先グループのすべてのストーリーを追跡します。


アサイン先グループのすべてのストーリー

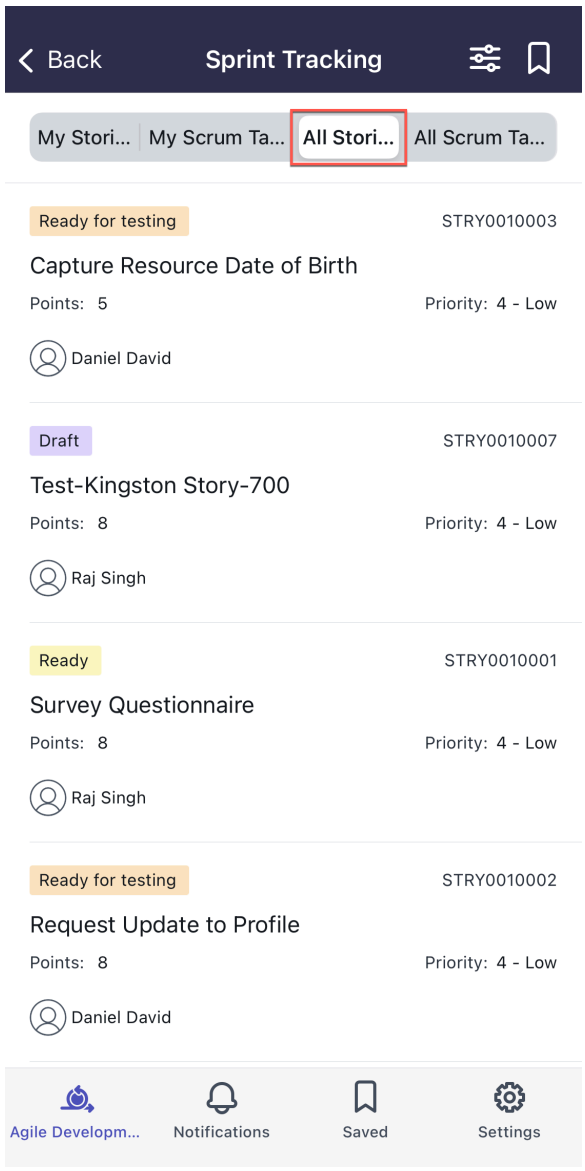ステップ	モバイルユーザーインターフェイス
1. スプリント追跡アプレットで、[すべて表示] をタップします。 **2.** アサイン先グループの名前をタップして開きます。 **3.** [すべてのストーリー] をタップします。	


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アサイン先グループからアサインされたストーリー

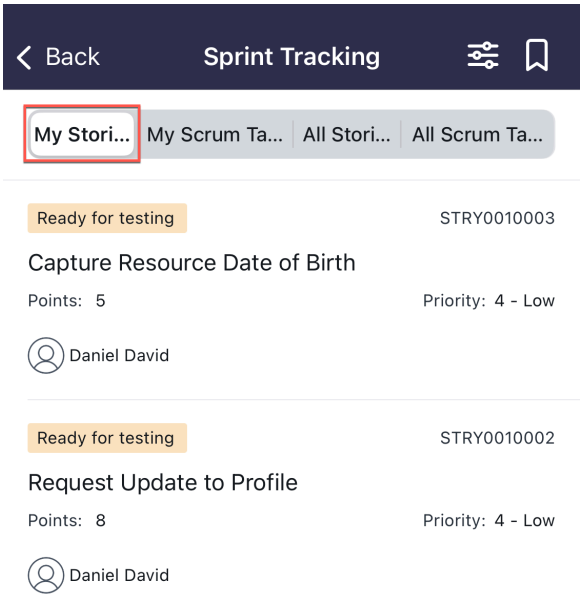ステップ	モバイルユーザーインターフェイス
1. スプリント追跡アプレットで、[すべて表示] をタップします。 **2.** アサイン先グループの名前をタップして開きます。 **3.** [自分のストーリー] をタップします。 **注:** [自分のストーリー] タブは、ロール scrum_team_member のユーザーにのみ表示されます。	


自分に割り当てられているすべてのストーリー

ステップ	モバイルユーザーインターフェイス
[自分のストーリー] アプレットには、すべてのアサイン先グループから現在のスプリントにアサインされているすべてのストーリーが表示されます。 • すべてのストーリーをカードとして表示するには、アプレットを左にスワイプします。 • すべてのストーリーのリストを表示するには、アプレットの [すべて表示] をタップします。 **注:** [自分のストーリー] アプレットは、ロール scrum_team_member のユーザーにのみ表示されます。	


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ブロック済みストーリー

ステップ	モバイルユーザーインターフェイス
ブロック済みストーリーアプレットには、ブロックされているすべてのストーリーが表示されます。 • すべてのブロック済みストーリーをカードとして表示するには、アプレットを左にスワイプします。 • すべてのブロック済みストーリーのリストを表示するには、アプレットの [すべて表示] をタップします。 **注:** ブロック済みストーリーアプレットは、ロール scrum_master および scrum_product_owner のユーザーにのみ表示されます。	

ストーリーレコードを左にスワイプすると、ストーリーにコメントを追加することや、ストーリーのステータスを更新することができるクイックアクションが提示されます。



ストーリーをタップすると、詳細が表示されます。たとえば、エピック、受け入れ条件、説明などを表示できます。

アジャイル開発 **v2** でストーリーを更新

モバイルデバイスから アジャイル開発 2.0 ストーリーの詳細を編集および更新します。

始める前に

必要なロール：scrum_product_owner、scrum_team_member、または scrum_master

手順

1. [スプリント追跡] または [マイストーリー] アプレットからストーリーに移動します。

2. ストーリーをタップして開きます。

3. ストーリーの詳細を更新するには：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [詳細] をタップしてから、[編集] をタップします。

b. 更新するフィールドを編集します。

ステータス、簡単な説明、ストーリーポイント、アサイン先、優先度、ストーリーが属するスプリントのフィールドを編集できます。

c. [送信] をタップします。

> **注:**
> ストーリーのスプリントを将来のスプリントに更新すると、そのスプリントが開始されない限り、ストーリーはアプリに表示されなくなります。スプリントのステータスが最新であることを確認します。

4. 作業メモまたは添付ファイルをストーリーに追加するには：


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [アクティビティ] をタップします。

b. 実行するアクティビティを選択します。

使用可能なオプションには、作業メモ、ファイル、画像などの追加が含まれます。

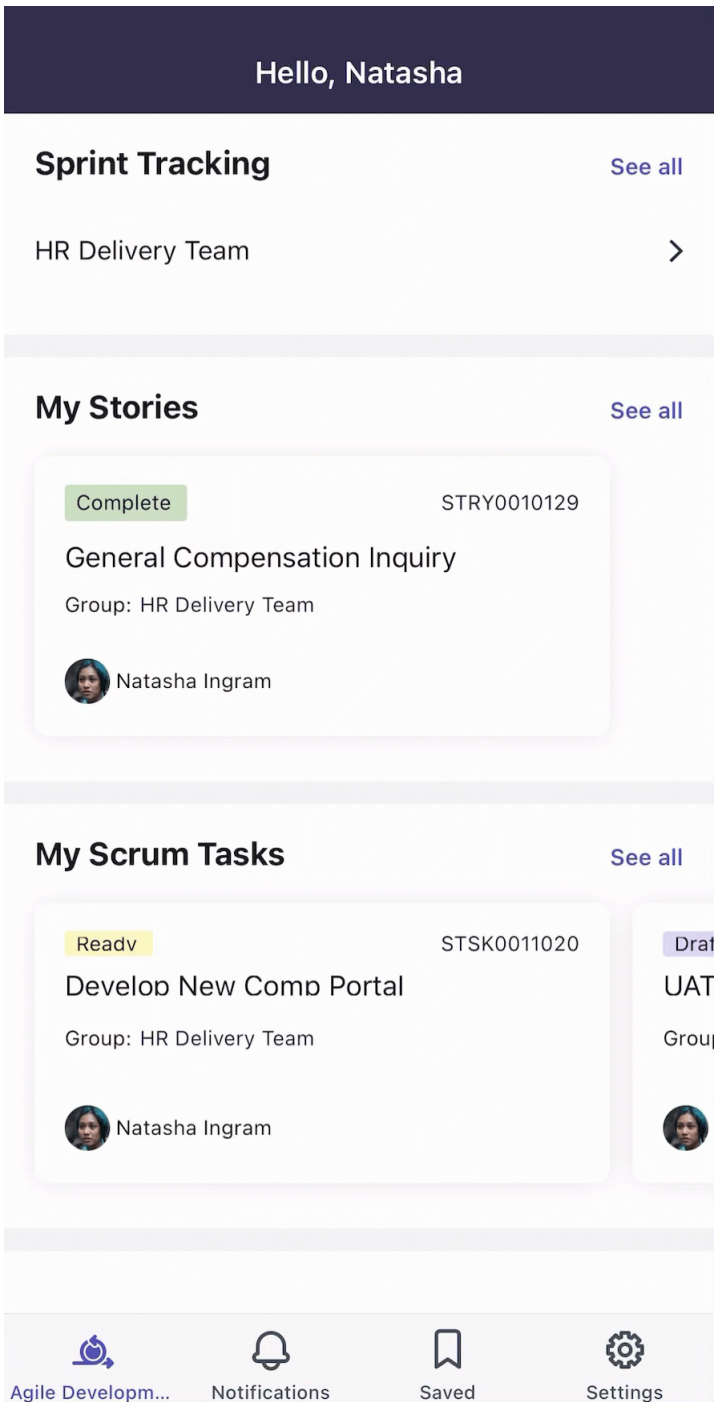

アジャイル開発 **v2** モバイルアプリでのスクラムタスクの管理

モバイルデバイスで現在のスプリントのストーリーに対して作成されたスクラムタスクの詳細を表示、編集、および更新します。

モバイルデバイスで モバイルエージェント アプリを開き、アジャイル開発 v2 に移動します。scrum_product_owner、scrum_team_member、または scrum_master のロールを使用して、次のアクションを実行します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アジャイル開発 **v2** でのスクラムタスクの追跡

複数のアサイン先グループからアサインされたスクラムタスクを含めて、アサイン先グループのすべてのスクラムタスクをモバイルデバイスから追跡します。


アサイン先グループのすべてのスクラムタスク

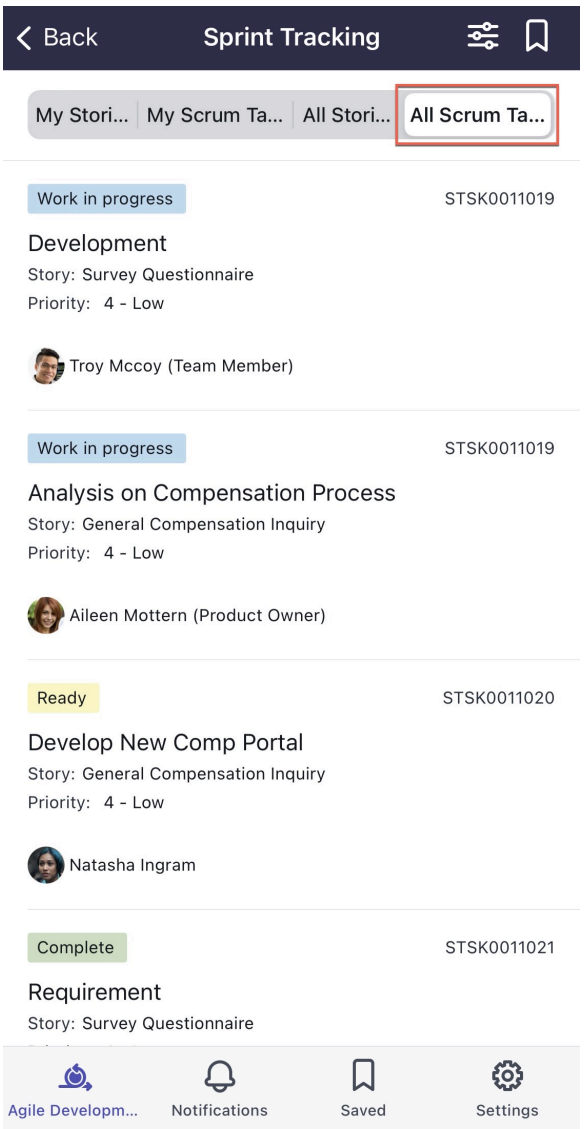ステップ	モバイルユーザーインターフェイス
1. スプリント追跡アプレットで、[すべて表示] をタップします。 **2.** アサイン先グループの名前をタップして開きます。 **3.** [すべてのスクラムタスク] をタップします。	


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アサイン先グループからアサインされたスクラムタスク

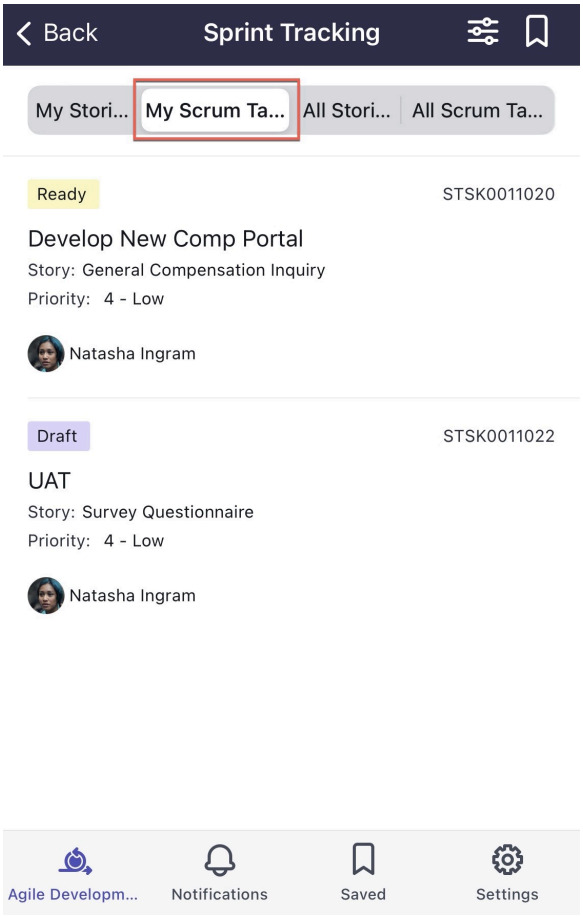ステップ	モバイルユーザーインターフェイス
1. スプリント追跡アプレットで、[すべて表示] をタップします。 **2.** アサイン先グループの名前をタップして開きます。 **3.** [自分のスクラムタスク] をタップします。 **注:** [自分のスクラムタスク] タブは、ロール scrum_team_member のユーザーにのみ表示されます。	


自分に割り当てられたすべてのスクラムタスク

ステップ	モバイルユーザーインターフェイス
[自分のスクラムタスク] アプレットには、すべてのアサイン先グループから現在のスプリントにアサインされているすべてのスクラムタスクが表示されます。 • すべてのスクラムタスクをカードとして表示するには、アプレットを左にスワイプします。 • すべてのスクラムタスクのリストを表示するには、アプレットの [すべて表示] をタップします。 **注:** [自分のスクラムタスク] アプレットは、ロール scrum_team_member のユーザーにのみ表示されます。	

スクラムタスクレコードを左にスワイプすると、スクラムタスクにコメントを追加することや、スクラムタスクのステータスを更新することができるクイックアクションが提示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

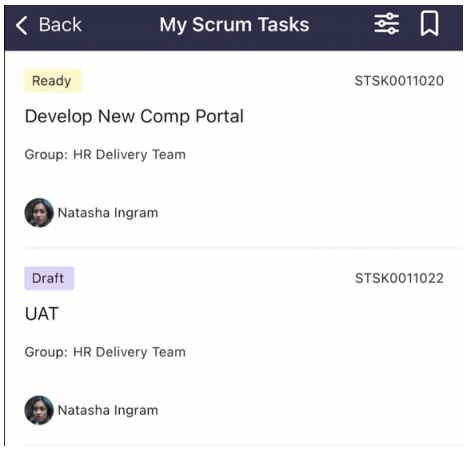

スクラムタスクをタップすると、タスクタイプ、ストーリー、アサイン先、説明、アクティビティなどの詳細が表示されます。

アジャイル開発 **v2** でのスクラムタスクの作成

モバイルアプリからストーリーのスクラムタスクを追加します。

始める前に

必要なロール：scrum_product_owner、scrum_team_member、または scrum_master

手順

1. [スプリント追跡] または [マイストーリー] アプレットからストーリーに移動します。
2. 新しいスクラムタスクを追加するストーリーをタップします。
3. その他のオプションアイコン (iOS では •••) または (Android では ⋮) をタップし、[新しいスクラムタスク] をタップします。
4. フォームのフィールドに入力します。

新しいスクラムタスクモバイルフォーム


フィールド	説明
簡単な説明	スクラムタスクの簡単な説明。
説明	スクラムタスクの詳細な説明。
予定時間数	タスクを完了するための推定時間数。 一般的なスクラムタスクには、4 時間から 12 時間かかります。タスクに 12 時間以上かかる場合は、複数のタスクに分割することを検討してください。
優先度	タスクの優先度。
タイプ	関連する作業のタイプ。
状況	スクラムタスクの現在のステータス。新しいスクラムタスクのデフォルトステータスは [ドラフト] です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [送信] をタップします

注:
[送信] は、すべての必須フィールドが入力されている場合にのみ表示されます。

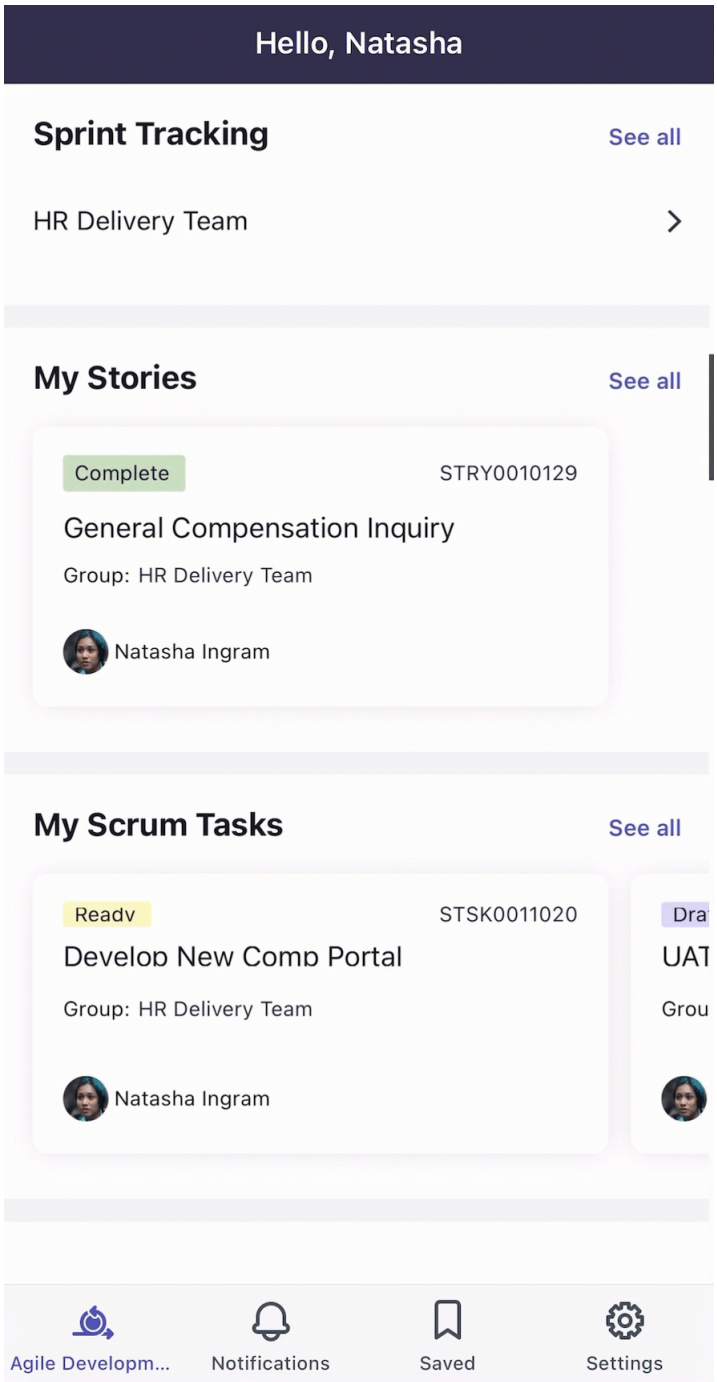

自動翻訳

アジャイル開発 **v2** でのスクラムタスクの更新

モバイルデバイスからストーリーのスクラムタスクの詳細を編集および更新します。

始める前に
必要なロール：scrum_product_owner、scrum_team_member、または scrum_master

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. [スプリント追跡] または [自分のスクラムタスク] アプレットからスクラムタスクに移動します。
2. 詳細を更新するスクラムタスクをタップします。
3. スクラムタスクの詳細を更新するには：
   a. [詳細] をタップしてから、[編集] をタップします。
   b. 更新するフィールドを編集します。

      スクラムタスクのステータス、タスクの簡単な説明、説明、アサイン先、実際の時間数、および優先度のフィールドを編集できます。

   c. [送信] をタップします。
4. 作業メモまたは添付ファイルをスクラムタスクに追加するには：


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [アクティビティ] をタップします。

b. 実行するアクティビティを選択します。

使用可能なオプションには、作業メモ、ファイル、画像などの追加が含まれます。

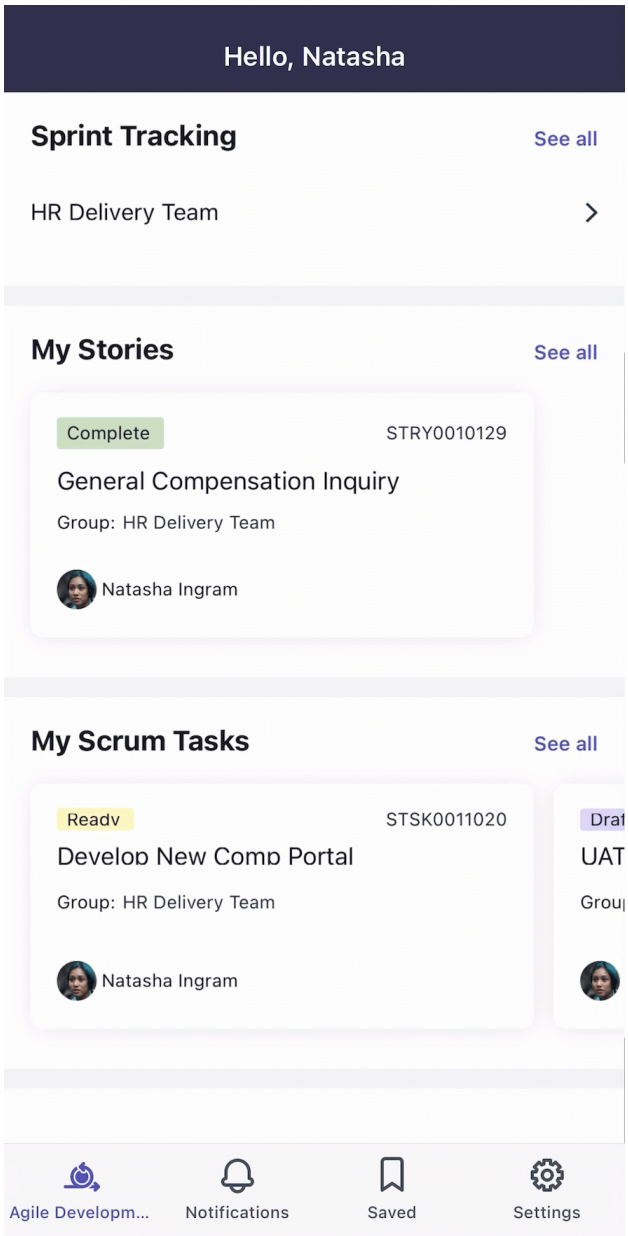

自動翻訳

スケール アジャイル フレームワーク (SAFe)®

ServiceNow 大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) アプリケーションは、無駄のないアジャイルプリンシパルを大企業に適用し、実現可能な最短のリードタイムで、より欠陥の少ないソフトウェア製品を開発して提供できるように支援します。

Scaled Agile Framework アプリケーションの概要。所要時間は約 3 分です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAFe の概要

- 組織のすべてのレベルで開発プロセスを管理するだけでなく、より広い範囲の視点を提供します。
- コラボレーションを促進し、事業部門、部門、およびチーム全体のアクティビティの計画と監視を簡素化します。

注:
SAFe と Scaled Agile Framework は、Scaled Agile、Inc の登録商標であり、ServiceNow は Scaled Agile, Inc. のプラットフォームパートナーです。

SAFe の構成

ServiceNow では、SAFe の 2 つの異なる構成 Essential SAFe および Portfolio SAFe をサポートするアプリケーションを提供します。以下のセクションでは、各構成の機能について説明し、組織に適した構成を選択するための指針を提供します。

Essential SAFe

Essential SAFe を使用すると、無駄のないアジャイルプリンシパルを Agile リリーストレーニングとチームに適用し、実行可能な最短のリードタイムで欠陥の少ない作業を開発、提供できます。

ポートフォリオ SAFe

Portfolio SAFe を使用すると、組織の目標と戦略をポートフォリオに合わせて調整し、無駄のないアジャイルプリンシパルを適用して、ポートフォリオ作業をシームレスに管理および実施できます。

ドメインセパレーションと 大規模アジャイルフレームワーク (SAFe)

ドメインセパレーションは、大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) アプリケーションでサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Essential SAFe および Portfolio SAFe のビジネスステークホルダーロール

ビジネスステークホルダーロールを使用して、Essential SAFe および Portfolio SAFe アプリケーションの任意のテーブルからデータを読み取って取得し、レポートを生成します。

重要:

Xanadu リリース以降、プラグイン Portfolio SAFe、Essential SAFe、Essential SAFe のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパック、SAFe の作業進捗ステータス、Agile - Scaled Agile Framework - Unified Backlog、および SAFe の読み取り専用ロールが、将来の廃止に向けて準備されています。これらのプラグインは非表示になり、新しいインスタンスではアクティブ化できなくなりますが、引き続きサポートされます。エンタープライズアジャイル計画は 戦略的計画 の値のいずれか は、この機能の最新のエクスペリエンスを提供します。

廃止プロセスおよびその影響の詳細については、Now Support ナレッジベースのアプリケーション/プラグインの廃止プロセス [KB0867184] の記事を参照してください。

ServiceNow インスタンスで Business Stakeholder プラグイン (com.snc.business_stakeholder) を有効化すると、SAFe プラグイン (com.snc.sdlc.safe_read_role) の読み取り専用ロールも有効になります。このプラグインは、Essential SAFe アプリケーションおよび Portfolio SAFe アプリケーションのすべてのテーブルにアクセスできるビジネスステークホルダーロール (sn_agile_read) を提供します。ビジネスステークホルダーであるすべての組織内ユーザーに、このロールをアサインできます。

プラグインの使用可否

新規のお客様の場合、SAFe の読み取り専用ロールプラグイン (com.snc.sdlc.safe_read_roles) は zboot で有効化されます。ただし、ビジネスステークホルダーロール (sn_safe_read) は、Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe プラグイン (com.snc.sdlc.safe) または Agile - Scaled Agile Framework - Portfolio SAFe プラグイン (com.snc.sdlc.portfolio_safe) を有効化している場合にのみ使用できます。

アップグレードのお客様は、Essential SAFe および Portfolio SAFe プラグインの読み取り専用ロール (com.snc.sdlc.safe_read_roles) を手動で有効化する必要があります。

ビジネスステークホルダーロールを持つユーザーがアクセスできる SAFe テーブル

SAFe プラグインの読み取り専用ロール (com.snc.sdlc.safe_read_roles) が Essential SAFe プラグイン (com.snc.sdlc.safe) または Portfolio SAFe プラグイン (com.snc.sdlc.portfolio_safe) とともに ServiceNow インスタンスでアクティブである場合、ビジネスステークホルダーロール (sn_safe_read) を持つユーザーは、次のテーブルに対する読み取りアクセス権を持ちます。

Essential SAFe テーブル

テーブル	説明
SAFe エピック [sn_safe_epic]	エピックに関する情報。
SAFe 機能 [sn_safe_feature]	機能に関する情報。
Agile リリーストレーニング	ART に関する情報。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Essential SAFe テーブル (続く)

テーブル	説明
[sn_safe_program]	
プログラムインクリメント [sn_safe_program_increment]	プログラムインクリメントに関する情報。PI 目標の予測可能性測定データを保存します。
SAFe ART チーム [sn_safe_program_m2m_group]	グループと ART の関係。
SAFe ART メンバー [sn_safe_program_member]	ART 内のメンバーに関する情報。
SAFe ART スプリント [sn_safe_program_sprint]	ART 内のチームのスプリントスケジュール。
SAFe ART VTB ボード [sn_safe_program_vtb_board]	ART レベルで [ボード] タブに表示されるレコード。
SAFe スクラムタスク [sn_safe_scrum_task]	SAFe スクラムタスクに関する情報。
SAFe スプリント [sn_safe_sprint]	スプリントに関する情報。
SAFe ストーリー [sn_safe_story]	ストーリーに関する情報。
SAFe チーム VTB ボード [sn_safe_team_vtb_board]	チームレベルで [ボード] タブに表示されるレコード。
SAFe PI の目標 [sn_safe_pi_objective]	SAFe PI の目標を保存します。
SAFe チームの予測可能性の測定 [sn_safe_pi_m2m_group]	チームレベルの予測可能性の測定データに使用される PI 目標から、チームごとに達成されたビジネス価値を格納します。

Portfolio SAFe テーブル

テーブル	説明
SAFe エピック [sn_safe_epic]	エピックに関する情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Portfolio SAFe テーブル (続く)

テーブル	説明
SAFe 機能 [sn_safe_feature]	機能に関する情報。
Agile リリーストレーニング [sn_safe_program]	ART に関する情報。
プログラムインクリメント [sn_safe_program_increment]	プログラムインクリメントに関する情報。
SAFe ART チーム [sn_safe_program_m2m_group]	グループと ART の関係。
SAFe ART メンバー [sn_safe_program_member]	ART 内のメンバーに関する情報。
SAFe ART スプリント [sn_safe_program_sprint]	ART 内のチームのスプリントスケジュール。
SAFe ART VTB ボード [sn_safe_program_vtb_board]	ART レベルで [ボード] タブに表示されるレコード。
SAFe スクラムタスク [sn_safe_scrum_task]	SAFe スクラムタスクに関する情報。
SAFe スプリント [sn_safe_sprint]	スプリントに関する情報。
SAFe ストーリー [sn_safe_story]	ストーリーに関する情報。
SAFe PI の目標 [sn_safe_pi_objective]	SAFe PI の目標を保存します。
SAFe チームの予測可能性の測定 [sn_safe_pi_m2m_group]	チームレベルの予測可能性の測定データに使用される PI 目標から、チームごとに達成されたビジネス価値を格納します。
ポートフォリオ [pm_portfolio]	ポートフォリオに関する情報。
ポートフォリオ SAFe VTB ボード	ポートフォリオレベルで [ボード] タブに表示されるレコード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Portfolio SAFe テーブル (続く)

テーブル	説明
[sn_portfolio_safe_vtb_board]	
SAFe チーム VTB ボード [sn_safe_team_vtb_board]	チームレベルで [ボード] タブに表示されるレコード。

Essential SAFe


Essential SAFe を使用すると、無駄のないアジャイルプリンシパルを Agile リリーストレーニングとチームに適用し、実行可能な最短のリードタイムで欠陥の少ない作業を開発、提供できます。

Essential SAFe は SAFe の最も基本的な構成で、製品マネージャーとチームメンバーの両方に対して 2 つのレベルで機能します。Agile リリーストレーニング（ART）レベルでは、製品マネージャーは一元化されたバックログで機能をキャプチャして優先順位を付け、ビジュアルタスクボードで機能の進捗状況を監視できます。

チームレベルでは、チームメンバーは機能を分解したストーリーを実装できます。レベルの詳細については、以下の「SAFe ボード」セクションを参照してください。

Essential SAFe の機能の使用を開始するには、Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe プラグイン (com.snc.sdlc.safe) をインストールします。

Essential SAFe を使用してより良いソフトウェアをより効率的に提供する方法

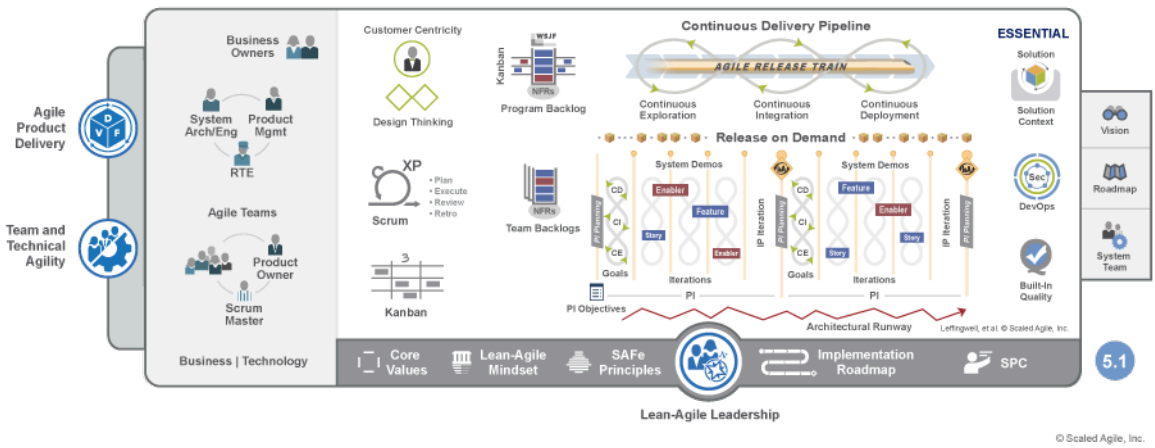

Essential SAFe の概要については、この 5 分間のビデオをご覧ください。 このビデオでは、Essential SAFe 機能の使用方法について説明します

SAFe ボード

次の表に、SAFe ボード上の Essential SAFe のキーレベルにアクセスする方法の概要を示します。

レベル	説明
Agile リリーストレーニング (ART)	製品マネージャーは、で **ART** レベルにアクセスして、ART 内のチーム全体のアクティビティを計画および監視できます。 **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード. さらに、次のことができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

レベル	説明
	• ART バックログを一元管理します。 • プログラムインクリメントを定義し、そのプログラムインクリメント内で完了する必要がある機能を特定します。 • ビッグルームの計画を実行します。 • ART のすべての機能を追跡し、ビジュアルタスクボードで、あるステータス (レーン) から別のステータス (レーン) への移行を表示します。
チーム	チームメンバーは、で チーム レベルにアクセスして、チーム内のアクティビティを計画および監視できます。 **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード. さらに、次のことができます。 • チームバックログを一元管理します。 • スプリント計画立案と完了アクティビティを簡素化します。 • すべてのストーリーを追跡し、ビジュアルタスクボードで、あるステータス (レーン) から別のステータス (レーン) への移行を表示します。

Essential SAFe とともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe プラグイン (com.snc.sdlc.safe) の有効化とともにインストールされます。

インストールされるロール

ロール	説明	ロールを含む
SAFe アドミン [safe_admin]	• SAFe ART、エピック、機能、ストーリー、およびプログラムインクリメントを編集、作成、および削除します。 • SAFe チームに対する読み取り専用アクセス権があります。	• safe_art_user • safe_scrum_master • safe_product_owner
SAFe スクラム製品オーナー [safe_product_owner]	• チームのバックログを管理し、SAFe ストーリーを編集、作成、および削除できます。 • PI 目標を作成するためのアクセス権があります。 • SAFe ART、チーム、エピック、および機能に対する読み取り専用アクセス権があります。 • SAFe プログラムインクリメントに対する読み取り専用アクセス権があります。	safe_story_creator

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロール	説明	ロールを含む
SAFe ART ユーザー [safe_art_user]	• ART バックログを管理し、SAFe エピック、機能、ストーリー、およびプログラムインクリメントを編集、作成、および削除できます。 • PI 目標を作成するためのアクセス権があります。 • SAFe チームを編集します。 • SAFe ART に対する作成および編集アクセス権があります。	safe_story_creator
SAFe スクラムマスター [safe_scrum_master]	• SAFe ストーリーを編集および削除します。 • PI 目標を作成するためのアクセス権があります。 • SAFe チームを編集します。 • SAFe ART、エピック、機能、およびプログラムインクリメントに対する読み取り専用アクセス権があります。 • Scaled Agile Framework — 統合バックログプラグイン (com.snc.sdlc.safe.multi_task) が有効化されている場合にのみトリアージボードにアクセスできます。	safe_story_creator
SAFe スクラムユーザー [safe_scrum_user]	SAFe のすべての要素を表示できますが、どのタイプのレコードも作成、編集、または管理できません。	なし
SAFe スクラムストーリー作成者 [safe_story_creator]	• SAFe ストーリーを編集、作成、および削除します。 • SAFe ART、チーム、エピック、機能、およびプログラムインクリメントに対する読み取り専用アクセス権があります。	safe_story_editor
SAFe スクラムストーリー編集者 [safe_story_editor]	• ドラッグアンドドロップ機能を使用して、チームのバックログ内にストーリーを配置します。 • SAFe ストーリーを編集します。 • SAFe ART、チーム、エピック、機能、およびプログラムインクリメントに対する読み取り専用アクセス権があります。	• safe_scrum_user • rm_scrum_task_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
SAFe エピック [sn_safe_epic]	エピックに関する情報。
SAFe 機能 [sn_safe_feature]	機能に関する情報。
Agile リリーストレーニング [sn_safe_program]	ART に関する情報。
プログラムインクリメント [sn_safe_program_increment]	プログラムインクリメントに関する情報。PI 目標の予測可能性測定データを保存します。
SAFe ART チーム [sn_safe_program_m2m_group]	グループと ART の関係。
SAFe ART メンバー [sn_safe_program_member]	ART 内のメンバーに関する情報。
SAFe ART スプリント [sn_safe_program_sprint]	ART 内のチームのスプリントスケジュール。
SAFe ART VTB ボード [sn_safe_program_vtb_board]	ART レベルで [ボード] タブに表示されるレコード。
SAFe スクラムタスク [sn_safe_scrum_task]	SAFe スクラムタスクに関する情報。
SAFe スプリント [sn_safe_sprint]	スプリントに関する情報。
SAFe ストーリー [sn_safe_story]	ストーリーに関する情報。
SAFe チーム VTB ボード [sn_safe_team_vtb_board]	チームレベルで [ボード] タブに表示されるレコード。
SAFe PI の目標 [sn_safe_pi_objective]	SAFe PI の目標を保存します。
SAFe チームの予測可能性の測定 [sn_safe_pi_m2m_group]	チームレベルの予測可能性の測定データに使用される PI 目標から、チームごとに達成されたビジネス価値を格納します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Essential SAFeのクイックスタートテスト

アプリケーションの開発やアップグレードの適用などの構成変更を行った後も、Essential SAFe が変わらず正常に動作するかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。

Essential SAFe クイックスタートテストには、Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe プラグイン (com.snc.sdlc.safe) と Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe - ATF テストプラグイン (com.snc.sdlc.safe.atf) を有効にする必要があります。

Essential SAFe テストスイート

テスト	説明	リリースバージョン
Essential SAFe：機能テスト	機能のグローバルランクの更新を確認します。	Madrid
Essential SAFe：機能テスト	SAFe 機能について以下を確認します。 • 実際の開始日は、ステータスが [実装]、[ステージング時の検証]、または [展開] に変更された後に入力されます。 • 実際の終了日は、ステータスが [リリース済み] または [キャンセル] に変更された後に入力されます。 • アクティブフラグが次の適切な値に設定されています。 ○ ステータスが [リリース済み] または [キャンセル] に変更された場合は **false**、 ○ その他すべてのステータスでは **true** です。	Orlando
Essential SAFe：機能テスト	PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) が有効である場合は、デマンドフォームの **[SAFe 機能の作成]** 関連リンクを使用して、デマンドを SAFe 機能に変換できることを確認してください。 SAFe 機能をデマンドから作成する方法の詳細については、「デマンドからアーティファクトを作成する」を参照してください。	Quebec
Essential SAFe：プログラム増分テスト	プログラムの増分の日付が重複していることを確認してください。	Madrid

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Essential SAFe テストスイート (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
Essential SAFe：スプリントテスト	ART スプリントとチームスプリントの生成、およびスプリントポイントと日付の更新を確認します。	Madrid
Essential SAFe：スプリントテスト	アサイン先グループの [グループキャパシティ] フィールドが更新されると、このアサイン先グループに関連付けられているさまざまなスプリントの [グループキャパシティ] フィールドに以下の変更があることを確認してください。 • [ドラフト] または [計画] の状況のスプリントの場合： ○ グループキャパシティが新しい値に更新されます。 ○ [グループキャパシティ] フィールドは編集可能です。 • [現在]、[完了]、または [キャンセル] の状況のスプリントの場合： ○ グループキャパシティは古い値のままです。 ○ [グループキャパシティ] フィールドは読み取り専用です。 [ドラフト] または [計画] ステータスのスプリントについては、後でいつでもスプリントのグループキャパシティを個別に編集できます。これにより、このスプリントに関連付けられているアサイン先グループのグループキャパシティが変更されることはありません。	Paris
Essential SAFe：ストーリーテスト	ストーリーのグローバルランクの更新を確認します。	Madrid
Essential SAFe：ストーリーテスト	SAFe ストーリーのアクティブフラグが次のように適切な値に設定されることを確認します。	Orlando

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Essential SAFe テストスイート (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
	• ステータスが [完了] または [キャンセル] に変更された場合、**False**。 • その他すべてのステータスでは True です。	
Essential SAFe：ストーリーテスト	SAFe ストーリーの追加、評価、削除、削除、更新、またはキャンセルによって、SAFe 機能レベルとエピックレベルのロールアップが正しく更新されることを確認します。	Orlando
Essential SAFe：ストーリーテスト	SAFe ストーリーへの機能の追加、更新、または削除によって、[SAFe ストーリー] フォームの [エピック] フィールドが更新されることを確認します。	Orlando
Essential SAFe：ストーリーテスト	PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) が有効である場合は、デマンドフォームの **[SAFe** ストーリーの作成] 関連リンクを使用して、デマンドを SAFe ストーリーに変換できることを確認してください。 SAFe ストーリーをデマンドから作成する方法の詳細については、「デマンドからアーティファクトを作成する」を参照してください。	Quebec
Essential SAFe：チームテスト	ART とチームの関連付けを確認します。	Madrid
Essential SAFe：エピックテスト	SAFe エピックについて以下を確認します。 • 実際の開始日は、ステータスが [実装] に変更された後に入力されます。 • 実際の終了日は、ステータスが [完了] に変更された後に入力されます。 • アクティブフラグが次の適切な値に設定されています。	Orlando

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Essential SAFe テストスイート (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
	○ 状況が [リリース済み] または [キャンセル] に変更された場合は、**false**。 ○ その他すべてのステータスでは **true** です。	
Essential SAFe：エピックテスト	PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) が有効である場合は、デマンドフォームの **[SAFe** エピックの作成] 関連リンクを使用して、デマンドを SAFe エピックに変換できることを確認してください。 SAFe エピックをデマンドから作成する方法の詳細については、「デマンドからアーティファクトを作成する」を参照してください。	Quebec
Essential SAFe：プログラム PI 目標テスト	PI 目標の作成と更新の機能を確認します。 • プログラムインクリメントレベルの目標を作成できることを確認します。 • 作成された PI 目標を計画されたビジネス価値 (PBV) と実際のビジネス価値 (ABV) で更新できることを確認します。 • PI のプログラムの PBV と比較して、達成されたビジネス価値のパーセンテージが、コミットされた PI 目標のみを対象とした ABV 完了率として計算されていることを確認します。	Rome
Essential SAFe：チーム PI 目標テスト	チーム PI 目標を作成および更新する機能を確認します。 • チームレベル PI 目標を作成できることを確認します。 • 作成された PI 目標を計画されたビジネス価値 (PBV) と実際のビジネス価値 (ABV) で更新できることを確認します。	Rome

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Essential SAFe テストスイート (続く)

テスト	説明	リリースバージョン
	• PI のチームの PBV と比較して、達成されたビジネス価値のパーセンテージが、コミットされた PI 目標のみを対象とした ABV 完了率として計算されていることを確認します。	

関連情報

クイックスタートテスト

SAFe エンティティ

ソフトウェア製品の計画、追跡、および提供を成功させるために使用されるさまざまな SAFe エンティティについて説明します。

Epic

SAFe のエピックは最大の作業単位であり、複数のプログラムインクリメントを通じて継続的に適用できます。エピックはビジネスの仮定をキャプチャし、WSJF スコア (加重最短ジョブ優先：最適なビジネス価値を生み出すためのジョブの優先順位付けと順序付けに使用) により、優先順位付けと評価を行います。

エピックは、SAFe ART による実装と提供のために、さらに機能に分解されます。

機能

SAFe 機能は、アジャイル開発 のエピックに相当します。プログラムインクリメントサイクル内で完了するには、十分に小さくする必要があります。グローバルランクに基づいて、ART バックログで優先順位付けと並べ替えが行われます。機能は、SAFe チームによる実装と提供のために、さらにユーザーストーリーに分解されます。

ストーリー

SAFe ストーリーは、ユーザー中心の言語で記述された製品要件またはビジネスケースを要約する簡単な説明です。ストーリーは、1 回のスプリントで完了できるように十分に小さくする必要があります。ストーリーを完了するために必要な工数概算は、ストーリーポイントで測定されます。より多くの工数を必要とするストーリーにより多くのポイントが割り当てられます。ストーリーポイントは、SAFe チームメンバーの概算に基づいて、ストーリーを完了するために必要な工数 (必ずしも時間ではありません) の任意の測定値です。

Agile リリーストレーニング

Agile リリーストレーニング (ART) は、単一のソリューションに対して作業する一連のチームで構成されています。

プログラムインクリメント

プログラムインクリメントは、合意された目標を達成するために、ART 内のチームが協力して生産する期間として設定されます。SAFe のプログラムインクリメントは、アジャイル開発 のスプリントに似ており、通常は 8 ～ 12 週間かかります。プログラムインクリメントの最も一般的な形式は、4 つの開発スプリントとそれに続く 1 つのイノベーションおよび計画立案スプリントで構成されます。

SAFe チーム

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAFe チームは、自律的で機能横断的なチームであり、共通の目標を達成するために協力して作業するさまざまなスキルセットを持つメンバーで構成されます。

safe_scrum_master または safe_art_user ロールを持つユーザーは、SAFe チームを作成できます。これらのチームは、ストーリー、エピック、機能などの SAFe 作業アイテムに割り当てることができます。

SAFe チームが作成されると、そのチームにメンバーを追加できます。

- 新規顧客：システムアドミニストレーターはチームにメンバーを追加できます。
- 既存の顧客：safe_scrum_master または safe_art_user ロールを持つユーザーは、SAFe チームにメンバーを追加できます。

  注:

  safe.disallow_scrum_add_group_member プロパティを作成して **[true]** に設定することで、この機能をシステムアドミニストレーターだけに制限できます。

  プロパティの作成方法については、「システムのプロパティの追加」を参照してください。

スプリント

SAFe のプログラムインクリメントは、関与するチームのスプリント内にさらにセグメント化され、週単位で測定されます。

SAFe でエピックを定義

SAFe でエピックを作成します。エピックは、お客様の要求やビジネス要件などの共通の目標が割り当てられた最大の作業単位です。エピックは、SAFe Agile リリーストレーニング (ART) による実装と提供のために、さらに機能に分解されます。

始める前に
必要なロール：safe_art_user または safe_admin

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用してエピックを作成します。

2. フォームのフィールドに入力します。

[SAFe エピック] フォーム

フィールド	説明
番号	エピックのシステム生成番号。
実現要因	エピックを実現要因として識別するチェックボックス。実現要因は直接的なビジネス価値を付加するものではなく、将来の作業基盤をビルドするのに役立ちます。たとえば、実現要因エピックには、機能のビルドに使用されるアーキテクチャの調査などが考えられます。
状況	エピックのステータス： ○ じょうごグラフ:作成元 **Scaled Agile Framework (SAFe)** > エピック. ○ レビュー：WSJF スコアや WIP 制限などのパラメーターを考慮したレビューを実施中です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ 分析：WSJF スコアの絞り込み、コストの見積もり、代替、WIP 制限などのパラメーターに基づいて承認または却下されます。 ○ バックログ：承認され、ART に割り当てられています。このステータスでは、ART レベルのユーザーがエピックを機能に区分化しています。 ○ 実装：エピックが実装中です。 ○ 完了：実装が完了しました。
色	エピックに属性として割り当てた色。エピックの色により、SAFe ボードの ART のバックログページで機能をエピック別に視覚的に識別し、グループ化できます。
WSJF スコア	加重最短ジョブ優先 (WSJF) スコアは、ジョブの優先順位付けと並べ替えを行い、最適なビジネス価値を生み出すために使用されます。WSJF スコアが最も高いジョブは、実装の優先度が最も高くなります。ジョブは、エピック、機能、または任意のビジネスケイパビリティを示す可能性があります。
簡単な説明	エピックの簡単な説明。
説明	エピックの詳細な説明。

エピックフォームの加重最短ジョブ優先スコアセクション

フィールド	説明
ユーザー/ビジネス価値	収益への影響や、同様の機能を提供する市場内の他のソリューションなどのパラメーターに基づく、ジョブのビジネス価値。
時間の重要度	期限を過ぎた場合のビジネスへの影響。たとえば、期限が変更された場合に、予測収益が時間経過とともにどのように減少するかなどです。
リスクの削減	次のような質問に答えることで、このエピックがどの程度のリスク回避に役立つかを分析します。 ○ ジョブは他の方法でビジネスに付加価値をもたらしますか？ ○ ジョブは新しいビジネス機会をもたらしますか？ ○ このジョブは将来の納品のリスクを軽減しますか？
ジョブの大きさ	ジョブの推定完了期間。
合計ストーリー数	エピックのアクティブなストーリーの数。 このフィールドは、デフォルトでは表示されません。フォームレイアウトでフィールドを設定します。
完了数	エピック内の完了したストーリーの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	このフィールドは、デフォルトでは表示されません。フォームレイアウトでフィールドを設定します。
数による完了率 (%)	エピック内で完了した作業のパーセンテージ。値はストーリー数で計算されます。 このフィールドは、デフォルトでは表示されません。フォームレイアウトでフィールドを設定します。
推定合計	エピック内のすべてのアクティブストーリーの推定合計値。 このフィールドは、デフォルトでは表示されません。フォームレイアウトでフィールドを設定します。
完了推定	エピック内のすべての完了したストーリーの推定合計値。 このフィールドは、デフォルトでは表示されません。フォームレイアウトでフィールドを設定します。
推定による完了率 (%)	エピック内で完了した作業のパーセンテージ。値は、エピック内のストーリーのポイント (推定) によって計算されます。 このフィールドは、デフォルトでは表示されません。フォームレイアウトでフィールドを設定します。
推定の欠如	推定ポイントのないストーリーの数。 このフィールドは、デフォルトでは表示されません。フォームレイアウトでフィールドを設定します。
トッププログラム	プログラムが SAFe 作業にマッピングされ、トップダウンのハイブリッド計画が有効になります。このエピックのアクティブな子 SAFe 機能はすべて、選択したプログラムに自動的に関連付けられます。 このフィールドは、PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) を有効化している場合に、エピックフォームの SAFe ビューに表示されます。

3. エピックの福利厚生計画を作成する場合は、[計画] セクションに入力します。
このセクションは、[福利厚生] ビューが選択されている場合に利用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エピックフォームの計画セクション

フィールド	説明
開始予定日	エピックの予測開始日。開始予定日は、現在の日付または将来の日付にすることができます。
終了予定日	エピックの予測終了日。終了予定日は開始予定日より後にする必要があります。
計画利益	利益ブレークダウンからロールアップされた利益値。
実開始日	エピックの実際の開始日。開始実績日時は、開始予定日以前にすることができます。
終了実績日時	エピックの実際の終了日。終了実績日時は、開始予定日より前にすることはできますが、開始実績日時より前にすることはできません。
実績利益	実績利益値は、利益ブレークダウンの実績利益からロールアップされます。

4. [送信] をクリックします。

エピックの金銭的利益計画を作成する

エピックの利益計画は、エピックの実行時にエピックによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。金銭的利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。

始める前に

必要なロール：safe_product_owner、safe_scrum_master、または safe_admin

このタスクについて

利益計画を保存すると、金銭的利益計画明細レコードが自動的に作成されます。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > エピック.
2. 必要なエピックを開きます。
3. ハンバーガーアイコン (≡) をクリックし、 表示 > 利益.
4. フォームの [計画] セクションのフィールドに入力します。
   このセクションは、[福利厚生] ビューが選択されている場合に利用できます。

エピックフォームの計画セクション

フィールド	説明
開始予定日	エピックの予測開始日。開始予定日は、現在の日付または将来の日付にすることができます。
終了予定日	エピックの予測終了日。終了予定日は開始予定日より後にする必要があります。
計画利益	利益ブレークダウンからロールアップされた利益値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
実開始日	エピックの実際の開始日。開始実績日時は、開始予定日以前にすることができます。
終了実績日時	エピックの実際の終了日。終了実績日時は、開始予定日より前にすることはできますが、開始実績日時より前にすることはできません。
実績利益	実績利益値は、利益ブレークダウンの実績利益からロールアップされます。

5. レコードを保存します。
6. [金銭的な利益計画] 関連リストで、[新規] をクリックします。
7. フォームのフィールドに入力します。

[利益計画] フォーム

フィールド	説明
名前	利益計画の内容を表す名前。
作業	利益計画が属するエピック。
スポンサー	エピックのスポンサー。
カテゴリ	利益のタイプ： ○ ハード：収益の観点から測定できる利益。 ○ ソフト：価値の観点から測定される利益。
サブカテゴリ	ハードおよびソフトの利益のサブカテゴリ。 [カテゴリ] フィールドの選択により、このフィールドで利用可能な選択肢が決まります。
利益タイプ	利益のタイプ。[金銭的な利益] を選択します。
オフセットタイプ (Offset type)	利益がいつ実現し始めるかを示すフィールド。次のオプションのいずれかを選択します。 ○ なし：デフォルト値は [なし] です。[なし] を選択した場合は、利益計画の会計期間の開始および終了を手動で入力する必要があります。 ○ マイルストーン：マイルストーンの完了後。 ○ 開始日：エピックの開始時。 ○ 終了日：エピックの終了後。 選択したオフセットタイプの値が変更されると、それに応じて利益計画の開始日がシフトします。たとえば、オフセットタイプが [終了日] に設定されていて、エピックの終了日が変更された場合、利益計画の開始日はエピックの新しい終了日に合わせてシフトされます。
マイルストーン	利益計画が属するエピックマイルストーン。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)**] フィールドで [マイルストーン] を選択した場合に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
マイルストーンの開始日	選択したマイルストーンの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)**] フィールドで [マイルストーン] を選択した場合に表示されます。
作業開始日	エピックの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)**] フィールドで [開始日] を選択した場合に表示されます。
作業終了日	エピックの終了日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)**] フィールドで [終了日] を選択した場合に表示されます。
オフセット (OffSet)	利益計画の開始時点のオフセットタイプの前または後の期間の数。たとえば、オフセットタイプが [終了日] として選択され、オフセットが「-2」である場合、利益計画はエピック終了日の 2 期間前になります。エピックの終了日がシフトされると、利益計画の開始日が新しいエピック期日の 2 期間前にシフトされます。
期間	利益計画の長さ (期間)。
会計期間の開始	会計期間の開始。選択した [マイルストーン]、[作業開始日]、または [作業終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] の値に基づいて設定されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)**] フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。 会計期間の開始を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
会計期間の終了	会計期間の終了。選択した [マイルストーン]、[作業開始日]、または [作業終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] の値に基づいて設定されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)**] フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。 会計期間の終了を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
関連利益	この金銭的利益計画に関連付けられている金銭以外の利益。

利益計画フォーム - 財務の詳細

フィールド	説明
入力通貨での利益	入力通貨で表される、指定のエピックから発生する利益。
入力通貨 (Entered currency)	利益計画の作成に使用する通貨。
機能通貨	**glide.system.locale** プロパティ から取得される通貨。
合計計画利益	エピックの潜在的利益の推定額。
機能通貨での利益	機能通貨で表される、エピックから発生する利益。[入力通貨] が機能通貨と異なる場合、このフィールドの値が変わります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
実績利益	エピックから発生する実績利益。この値は、すべての利益計画ブレークダウンの [実績利益] フィールドからロールアップされます。
繰り返し	利益計画のすべての会計期間で利益が繰り返し発生することを示すオプション。

8. [送信] をクリックします。

次のタスク
[利益計画] フォームの [金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdowns)] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。

エピックの金銭的利益計画ブレークダウンの更新

特定の会計期間の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定する、金銭的利益計画ブレークダウンレコードを更新します。

始める前に
必要なロール：safe_product_owner、safe_scrum_master、または safe_admin

手順
1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > エピック.
2. 必要なエピックを開きます。
3. ハンバーガーアイコン ( ) をクリックし、 表示 > 利益.
4. [金銭的な利益計画] 関連リストをクリックします。
5. 必要な金銭的利益計画を開きます。
6. [金銭的利益計画明細 (Monetary Benefit Plan Breakdowns)] 関連リストで、金銭的利益計画明細の情報アイコン ( ) をクリックします。
7. [レコードを開く] をクリックします。
8. 金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdown) フォームで、有効なフィールドを表示して更新します。
9. [更新] をクリックします。

エピックの金銭以外の利益計画の作成

エピックの利益計画は、エピックの実行時にエピックによって発生する潜在的な非予定利益をキャプチャします。金銭以外の利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。

始める前に
必要なロール：safe_product_owner、safe_scrum_master、または safe_admin

このタスクについて
[ブレークダウンタイプ] フィールドで [自動] または [手動] を選択して利益計画を保存すると、金銭以外の利益計画ブレークダウンレコードが自動的に作成されます。金銭以外の利益計画ブレークダウンレコードは、特定の会計期間 (FY16 の 4 月および FY16 の 5 月など) の財務以外の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定します。[金銭以外の利益計画ブレークダウン] 関連リストには、エピックの各会計期間における推定非予定利益と実績非予定利益の集計利益が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > エピック.
2. 必要なエピックを開きます。
3. ハンバーガーアイコン ( ) をクリックし、 表示 > 利益.
4. フォームの [計画] セクションの必須フィールドに入力します。
このセクションは、[福利厚生] ビューが選択されている場合に利用できます。

エピックフォームの計画セクション

フィールド	説明
開始予定日	エピックの予測開始日。開始予定日は、現在の日付または将来の日付にすることができます。
終了予定日	エピックの予測終了日。終了予定日は開始予定日より後にする必要があります。
計画利益	利益ブレークダウンからロールアップされた利益値。
実開始日	エピックの実際の開始日。開始実績日時は、開始予定日以前にすることができます。
終了実績日時	エピックの実際の終了日。終了実績日時は、開始予定日より前にすることはできますが、開始実績日時より前にすることはできません。
実績利益	実績利益値は、利益ブレークダウンの実績利益からロールアップされます。

5. レコードを保存します。
6. [金銭以外の利益計画] 関連リストをクリックします。
7. 金銭以外の利益計画を作成するには、[新規] をクリックします。
8. フォームのフィールドに入力します。

[利益計画] フォーム

フィールド	説明
名前	利益計画の内容を表す名前。
作業	利益計画が属するエピック。
スポンサー	エピックのスポンサー。
カテゴリ	利益のタイプ： ○ ハード：収益の観点から測定できる利益。 ○ ソフト：価値の観点から測定される利益。
サブカテゴリ	ハードおよびソフトの利益のサブカテゴリ。 [カテゴリ] フィールドの値により、このフィールドで利用可能な選択肢が決まります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
福利厚生タイプ	利益のタイプ。[金銭以外の利益] を選択します。
オフセットタイプ (Offset type)	利益がいつ実現し始めるかを示すフィールド。次のオプションのいずれかを選択します。 ○ なし：デフォルト値は [なし] です。[なし] を選択した場合は、利益計画の会計期間の開始および終了を手動で入力する必要があります。 ○ マイルストーン：マイルストーンの完了後。 ○ 開始日：エピックの開始時。 ○ 終了日：エピックの終了後。 [オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドの値が変更されると、それに応じて利益計画の開始日がシフトします。たとえば、[オフセットタイプ] フィールドが [終了日] に設定されていて、エピックの終了日が変更された場合、利益計画の開始日はエピックの新しい終了日に合わせてシフトされます。
マイルストーン	利益計画が属するエピックマイルストーン。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [マイルストーン] を選択した場合にのみ表示されます。
マイルストーンの開始日	選択したマイルストーンの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [マイルストーン] を選択した場合にのみ表示されます。
作業開始日	エピックの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [開始日] を選択した場合にのみ表示されます。
作業終了日	エピックの終了日。このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [終了日] を選択した場合にのみ表示されます。
オフセット (OffSet)	利益計画の開始時点のオフセットタイプの前または後の期間の数。たとえば、オフセットタイプが [終了日] として選択され、オフセットが「-2」である場合、利益計画はエピック終了日の 2 期間前になります。エピックの終了日が変更されると、利益計画の開始日が新しいエピック期日の 2 期間前にシフトされます。
期間	利益計画の長さ (期間)。
会計期間の開始	会計期間の開始。このフィールドは、選択した [マイルストーン]、[作業開始日]、または [作業終了日] に対する [オフセット] フィールド値、および [期間] の値に基づいて入力されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。 会計期間の開始を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
会計期間の終了	会計期間の終了。このフィールドは、選択した [マイルストーン]、[プロジェクト/デマンドの開始日]、または [プロジェクト/デマンドの終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] の値に基づいて入力されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ **(Offset type)]** フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	会計期間の終了を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
関連利益	この金銭以外の利益計画に関連付けられている金銭的利益。

福利厚生フォームの金銭以外の [詳細] セクション

フィールド	説明
測定	金銭以外の利益計画の測定のタイプ。測定タイプは、カウント、パーセンテージ、時間、日、スコアです。 定量化できない利益を追跡するには、[はい/いいえ] オプションを選択します。このオプションを選択した場合、利用できるフィールドは [利益の達成] のみです。チェックボックスをオンにして、利益が達成されたことを示すことができます。
金銭以外の入力通貨での利益	潜在的利益の推定値。 利益計画の計画利益に変更があると、将来の会計期間についてのみ、関連する利益ブレークダウン値が更新されます。
金銭以外の計画利益	利益ブレークダウンからロールアップされた利益値。
利益の達成	利益が達成されたかどうかを示すオプション。
ブレークダウンタイプ	利益計画を保存するときのブレークダウン作成のタイプ。 ○ なし：明細は作成されません。 ○ 自動：金銭以外の利益計画明細レコードがデータとともに自動的に作成されます。明細は線形的に計算されます。 ○ 手動：金銭以外の利益計画明細レコードが自動的に作成されますが、[入力通貨での利益] 列にはデータがありません。
アグリゲーションモード	ブレークダウンから利益計画へのロールアップをどのように行うかを決定し、[金銭以外の計画利益] および [金銭以外の実績利益] フィールドの値を更新します。 ○ 合計：すべてのブレークダウンのデータを集計します。 ○ 平均：すべてのブレークダウンの平均値。 ○ 最新：最新のブレークダウン値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ 最大：ブレークダウンの最大値。 ○ 最小：ブレークダウンの最小値。
金銭以外の実績利益	金銭以外の利益計画明細の実績利益からロールアップされる実績利益値。

9. [送信] をクリックします。

次のタスク

- 利益計画フォームの [金銭以外の利益計画ブレークダウン] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。
- 金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連付け、ハイブリッド利益計画のエピックによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。

エピックの非金銭的利益計画ブレークダウンの更新

特定の会計期間の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定する、金銭以外の利益計画ブレークダウンレコードを更新します。

始める前に

必要なロール：safe_product_owner、safe_scrum_master、または safe_admin

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > エピック.
2. 必要なエピックを開きます。
3. ハンバーガーアイコン (≡) をクリックし、 表示 > 利益.
4. [金銭以外の利益計画] 関連リストをクリックします。
5. 必要な金銭以外の利益計画を開きます。
6. [金銭以外の利益計画明細] 関連リストで、金銭以外の利益計画明細の情報アイコン (ⓘ) をクリックします。
7. [レコードを開く] をクリックします。
8. 金銭以外の利益計画ブレークダウンフォームで、有効なフィールドを表示して更新します。
9. [更新] をクリックします。

金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連付け

金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を関連付けて、ハイブリッド利益計画のエピックによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。

始める前に

必要なロール：safe_product_owner、safe_scrum_master、または safe_admin

このタスクについて

金銭的利益計画を金銭以外の利益計画に関連付けることも、その逆も可能です。

注:
利益計画を削除すると、関連する利益計画とのいかなる関係も削除されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > エピック.
2. 必要なエピックを開きます。
3. 選択 表示 > 利益 [他のアクション] メニュー ( ) から
4. [金銭的な利益計画] または [金銭以外の利益計画] 関連リストをクリックします。
5. 関連付ける利益計画の情報アイコン ( ) をクリックします。
6. [レコードを開く] をクリックします。
7. 金銭的利益計画または金銭以外の利益計画を関連付けます。
8. [保存] をクリックします。

タスクの結果
選択した利益計画は別の計画に関連付けられます。

次のタスク
[関連する利益計画を表示] 関連リンクをクリックして、関連付けられている利益計画を表示します。

エピックの人件費の生成

エピックのリソースのアサインに基づく人件費を表示します。

始める前に

- エピックにリソースのアサインが含まれている必要があります。
- 必要なロール：sn_spm_financial_user

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > エピック.
2. 必要なエピックを選択します。
3. [人件費の生成] 関連リンクを選択します。
   ページを更新して、[コスト計画] 関連リストに生成された人件費を表示します。

SAFe での機能の定義

SAFe で機能を作成し、より小さなユーザーストーリーに分割して、SAFe チームが実装および提供できるようにします。

始める前に
必要なロール：safe_art_user または safe_admin

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して機能を作成します。
   アクティブな SAFe ストーリーを SAFe 機能に変換することもできます。詳細については、「SAFe ストーリーの関連リンクとリスト」を参照してください。
2. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAFe 機能フォーム

フィールド	説明
番号	機能のシステム生成番号。
実現要因	機能を実現要因として識別するオプション。実現要因はビジネス価値をもたらすものではありませんが、将来の作業の基盤をビルドするために役立ちます。たとえば、実現要因を使用して、ストーリーのビルドに使用されるアーキテクチャを調査できます。
色	機能に属性として割り当てた色。機能の色によって、SAFe ボードのチームのバックログページでストーリーを機能別に視覚的に識別し、グループ化できます。 この色は、SAFe PI 計画ボードの SAFe ストーリーカードにも塗りつぶされた円として表示され、その機能を識別できます。
WSJF スコア	加重最短ジョブ優先 (WSJF) スコアは、ジョブの優先順位付けと並べ替えを行い、最適なビジネス価値を生み出すために使用します。 WSJF スコアが最も高いジョブは、実装の優先度が最も高くなります。ジョブは、エピック、機能、または任意のビジネスケイパビリティである可能性があります。
状況	機能のステータス。次のいずれかを選択します。 ◦ じょうご：このステータスでは、承認されたアイデアから機能を作成できます。 ◦ 分析：このステータスでは、製品管理チームが機能をレビューし、受け入れ条件、仮説利益、技術的な実現可能性、およびスコープの推定を検討します。 ◦ バックログ：このステータスでは、承認された機能に優先順位を付けて、それを ART に割り当てることができます。 ◦ 実装：このステータスでは、機能をストーリーに分割し、後でチームにアサインすることができます。 ◦ ステージング時の検証：このステータスでは、機能をシステムに統合し、製品管理チームに提示して承認とフィードバックを得ることができます。 ◦ 展開：このステータスでは、機能の展開テストは完了しています。 ◦ リリース済み：このステータスでは、機能をエンドユーザーにリリースし、仮説利益を評価する準備が整っています。 ◦ キャンセル：このステータスでは、機能はキャンセルされています。
SAFe エピック	機能が属するエピック。
Agile リリーストレーニング	機能が属する Agile リリーストレーニング。
プログラムインクリメント	機能の完了がスケジュールされているプログラムインクリメント。
SAFe チーム	機能の提供を主に担当するチーム。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
簡単な説明	機能の簡単な説明。
説明	機能の詳細な説明。
作業メモ	ライフサイクルのさまざまな段階における機能の進捗状況を示す作業メモ。

SAFe 機能フォームの加重最短ジョブの最初のセクション

フィールド	説明
ユーザー/ビジネス価値	この機能によるジョブのビジネス価値の推定。収益への影響または同様の機能を提供する市場内の他のソリューションについて検討します。
時間の重要度	期限を過ぎた場合のビジネスへの推定される影響。たとえば、期限が変更された場合に、予測収益がどのように減少するかについて検討します。
リスクの削減	この機能がどの程度リスクを回避できるかを分析します。次のような質問に答えます。 ○ ジョブは他の方法でビジネスに付加価値をもたらしますか？ ○ ジョブは新しいビジネス機会をもたらしますか？ ○ このジョブは将来の納品のリスクを軽減しますか？
ジョブの大きさ	ジョブの推定完了期間。

3. [**Submit** (送信)] を選択します。

次のタスク
SAFe ストーリー関連リストを使用して、ストーリーを表示し、機能に追加します。

関連情報

SAFe でのストーリーの定義

SAFe 機能の分割

完全なストーリーと不完全なストーリーを追跡できるように、SAFe 機能を 2 つの別々の機能に分割します。不完全なストーリーを持つ機能をバックログまたは将来のプログラムインクリメント (PI) に移動して、以前のスプリントと PI の正確なメトリクスを維持することができます。

始める前に
必要なロール：safe_art_user または safe_admin

このタスクについて
SAFe 機能の PI の最後に不完全なストーリーがある場合は、この機能を 2 つの機能に分割できます。

新しい機能には元の機能への参照が含まれ、フィールド値は元の機能からコピーされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

元の機能の完了したストーリーは、ステータスが「リリース済み」に設定された新しい機能に移動します。

> **注:**
> SAFe 機能を分割するには、少なくとも 1 つの完全なストーリーと不完全なストーリーが必要です。

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. 左上隅のリストから、レベルに **[ART]** を選択し、Agile リリーストレーニングを選択します。
3. [バックログ] タブをクリックします。
4. [リストビュー] を選択します。



5. 現在の PI セクションから、不完全なストーリーがある SAFe 機能を見つけ、その番号をクリックしてフォームを開きます。
   [完了] をクリックすると、不完全な機能のリストを取得できます。
6. 機能フォームで、[完了したストーリーを新しい機能に移動] 関連リンクをクリックします。
   - 更新された機能フォームには、不完全なストーリーのみが表示されます。
   - 新しい機能には、元の機能の完了したストーリーが含まれています。
   - 新しい機能の [元の機能] フィールドは、分割した元の機能を示します。

     > **注:**
     > 機能のフォームレイアウトを設定してこのフィールドを表示します。

   - 新しい機能の簡単な説明に「- 完了済み」が付加され、完了したことが示されます。

次のタスク
不完全なストーリーがある機能をバックログまたは選択した新しい PI にスケジュールします。

SAFe でのストーリーの定義

SAFe で高レベルの要件定義をストーリーの形式で作成します。

始める前に
必要なロール：
safe_sprint_planner、safe_art_user、safe_scrum_master、safe_story_editor、safe_team_member、または safe_admin

手順

1. 次のいずれかのオプションでストーリーを作成します。
2. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAFe ストーリーフォーム

フィールド	説明
番号	ストーリーのシステム生成番号。
機能	ストーリーが属する機能。
SAFe エピック	ストーリーが属するエピック。
SAFe スプリント	ストーリーの完了がスケジュールされているスプリント。
ポイント	ストーリーを完了するために必要な工数概算を示すポイント数。このポイント値が大きいほど、多くの工数が必要であることを示します。
状況	ストーリーのステータス。次のいずれかを選択します。 ○ ドラフト：このステータスでは、説明や受け入れ条件などのストーリー要件は、依然としてドラフト段階です。 ○ 準備完了：このステータスでは、開発チームがピックアップする準備が完了している旨のマークが設定されます。 ○ 対応中：このステータスでは、開発チームはストーリーに取り組んでおり、変更内容を [作業メモ] フィールドに記録します。 ○ テストの準備完了：このステータスでは、ストーリーにはテスターが取り上げる準備ができている旨のマークが設定されます。 ○ テスト中：このステータスでは、テスターがストーリーで指定された要件に基づいてストーリーのテスト作業を実施しています。 ○ 完了：このステータスでは、ストーリーの開発とテストが完了しています。 ○ キャンセル：このステータスでは、ストーリーはキャンセルされています。 新しいストーリーのデフォルトステータスは [ドラフト] です。
SAFe チーム	ストーリーがアサインされているチーム。
担当者	ストーリーがアサインされているユーザー。
実現要因	ストーリーを実現要因として識別するチェックボックス。実現要因は直接的なビジネス価値を付加するものではなく、将来の作業基盤をビルドするのに役立ちます。
簡単な説明	ストーリーの簡単な説明。
説明	ストーリーの詳細な説明。
受け入れ条件	このストーリーを [完了] ステータスに移行するために必要な機能の条件またはテスト結果。
作業メモ	ライフサイクルのさまざまな段階におけるストーリーの進捗状況を示す作業メモ。

3. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク

- ストーリーの関連リンクとリストを使用して、このストーリーのタスクを作成するか、現在のストーリーの依存関係を他のストーリーに追加します。要件に応じて、このストーリーを SAFe 機能に変換したり、ストーリーを 2 つに分割したりすることもできます。詳細については、「SAFe ストーリーの関連リンクとリスト」を参照してください。
- ストーリーの追加アクション ( ) の [挿入] または [挿入と維持] オプションを使用して、このストーリーと同じ詳細でストーリーを作成できます。

  [挿入と維持] を使用すると、新しく作成されたストーリーのフォームが開いたままになるため、詳細を変更することや、こうした詳細を含むストーリーをさらに作成すること、またはその両方を行うことができます。

  SAFe ボードでは、新しいストーリーは元のストーリーのすぐ下に配置され、それに応じて新しいストーリーのグローバルランクが設定されます。

  注:
  - こうしたアクションにアクセスするには、glide.ui.advance プロパティおよび glide.ui.advance プロパティを **true** に設定します。
  - これらのアクションは、トリアージボードから追加されたストーリーでは許可されません。

SAFe ストーリーの関連リンクとリスト

ストーリーで実行する必要があるアクションに基づいて、SAFe ストーリーフォームの関連リンクと関連リストを使用します。

SAFe ストーリーフォームの関連リンクとリストは次のとおりです。

SAFe ストーリーの関連リンク

名前	説明
分割ストーリー	同じ詳細で新しいストーリーを作成して、ストーリーを 2 つのストーリーに分割します。古いストーリーの未完了のタスクは、この新しいストーリーに移動されます。
機能への変換	アクティブなストーリーを機能に変換し、ストーリーを「キャンセル済み」ステータスに移行します。 次の変更が発生しました: • 新しく作成した機能のデフォルトのステータスは「じょうご」です。 • キャンセルされたストーリーは、新しく作成された機能に関連付けられます。 作成したストーリーが大きすぎる場合は、機能に変換してから、複数のストーリーに分割することができます。
ストーリーをコピー	既存のアクティブなストーリーの詳細を新しいストーリーにコピーします。ストーリーのテストとタスクもコピーされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAFe ストーリーの関連リンク (続く)

名前	説明
	新しく作成されたストーリーは、「ドラフト」ステータスに移行します。 このアクションは、トリアージボードから追加されたストーリーには使用できません。

SAFe ストーリーの関連リスト

名前	説明
SAFe スクラムタスク	ストーリー用に作成されたスクラムタスクの一覧を示します。[新規] をクリックしてスクラムタスクを作成します。
前提条件ストーリー	現在のストーリーを完了する前に完了する必要があるストーリーの一覧を示します。[編集] をクリックして必須条件ストーリーを追加します。
依存ストーリー	現在のストーリーに依存するストーリーの一覧を示します。[編集] をクリックして依存ストーリーを追加します。
テスト	ストーリーに使用されるテストのリストを表示します。既存のテストをストーリーに追加します。

自動翻訳

SAFe ストーリーへの依存関係の追加

SAFe ストーリーに対して、前提条件と依存ストーリーを追加して依存関係を設定します。SAFe 計画ボードを使用すると、ビッグルームの計画時にこうした依存関係をストーリー間で区別し、必要に応じてストーリーを再計画できます。

始める前に

必要なロール：safe_story_creator

このタスクについて

前提条件ストーリーは、現在のストーリーを完了する前に完了する必要があるストーリーです。依存ストーリーは、現在のストーリーの完了に依存するストーリーです。

手順

1. 次のいずれかのオプションでストーリーに移動します。

2. [前提条件ストーリー] 関連リストまたは [依存ストーリー] 関連リストで、依存関係に従ってストーリーを追加します。
3. [保存] をクリックします。
4. [更新] をクリックします。

   SAFe 計画ボードを表示している場合は、依存関係アイコン ( ) をクリックして、ストーリー間の依存関係線を表示または非表示にします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Agile リリーストレーニングの定義

SAFe から、単一のソリューションに対して作業するアジャイルチームのグループである Agile リリーストレーニング (ART) を定義します。

始める前に
必要なロール：safe_admin

手順

1. 次のいずれかのオプションで Agile リリーストレーニングを作成します。

2. Agile リリーストレーニングに適した名前を入力し、[送信] をクリックします。

次のタスク
次の関連リンクを使用してください。

関連リスト	説明
メンバー	Agile リリーストレーニングに対して、メンバーを追加するか、または削除します。メンバーは ART に含まれていますが、特定のアジャイルチームに属していません。たとえば、ビジネスオーナー、製品マネージャー、リリーストレーニングエンジニア、システムアーキテクトなどです。
チーム	Agile リリーストレーニングに属するチーム。
SAFe 機能	Agile リリーストレーニングの機能を表示するか、または追加します。
プログラムインクリメント	プログラムインクリメントを表示または追加します。
PI 目標	この ART のすべての PI 目標のリスト。PI 目標を表示、作成、および更新します。 この関連リストは、ART フォームの SAFe ビューに表示されます。

関連情報

SAFe での機能の定義

SAFe でプログラムインクリメントを定義する

SAFe でプログラムインクリメントを定義する

SAFe を使用して、プログラムインクリメント (PI) を定義します。プログラムの増分は、通常 8 ～ 12 週間の長さであり、その間に ART は、機能するテスト済みのソフトウェアとシステムの形態で増分値を提供します。

始める前に
必要なロール：safe_admin

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、プログラムインクリメントフォームに移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. フォームのフィールドに入力します。

SAFe プログラムインクリメントフォーム

フィールド	説明
番号	ストーリーのシステム生成番号。
Agile リリーストレーニング	PI が属する ART。
スプリント長	PI 内の各スプリントの期間。
PI キャパシティ	予測 PI キャパシティ。通常、PI の各スプリントに対する各チームのグループキャパシティの集計です。 予測 PI キャパシティと比較して、計画されている機能の負荷を判断するのに役立ちます
名前	PI の名前。
状況	PI の現在のステータス。 デフォルトのステータスは [ドラフト] です。
開始予定日	PI の開始日。
終了予定日	PI の終了日。
スプリント数	プログラムインクリメントに含まれるスプリントの数。
計画されたビジネス価値の合計	この PI のすべての目標に対して設定された計画済みビジネス価値スコア。 フィールド値は読み取り専用であり、この PI のコミット済み PI 目標のすべての計画済みビジネス価値スコアの合計として計算されます。
合計実績ビジネス価値	この PI のすべての目標に対して実現した計画済みビジネス価値スコア。 フィールド値は読み取り専用であり、この PI のコミット済みおよび非コミット済みの両 PI 目標のすべての実績ビジネス価値スコアの合計として計算されます。
達成されたビジネス価値	計画済みおよび実績のビジネス価値スコアの合計を使用して計算された、達成済みビジネス価値の割合。

PI のチームのスプリントは、 [スプリント長]、 [開始予定日]、および [スプリント数] で指定された値により決定します。

3. [送信] をクリックします。

次のタスク

次の関連リンクにアクセスします。

関連リスト	説明
SAFe 機能	プログラムインクリメントで完了するようにスケジュールされている機能のリスト。
SAFe ストーリー	プログラムインクリメントで完了するようにスケジュールされているストーリーを表示、追加、変更または削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連リスト	説明
SAFe スプリント	プログラムインクリメントのスプリントを表示、追加、変更、または削除します。
SAFe チーム	ART の PI に参加したすべてのチームのリスト。各チームの計画および実績のビジネス価値の合計スコアと達成率を視覚的に表示します。 この関連リストは、PI フォームの SAFe ビューに表示されます。
PI 目標	この PI のすべての目標のリスト。PI 目標を表示、作成、および更新します。 この関連リストは、PI フォームの SAFe ビューに表示されます。

関連情報

SAFe での機能の定義

SAFe でのストーリーの定義

SAFe チームを定義する

SAFe から、アジャイルチームを作成し、それを ART に関連付けます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** チーム.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

グループフォーム

フィールド	説明
名前	グループに適した名前。
マネージャー	チームの指定されたサーバントリーダー。
グループキャパシティ (ポイント)	ストーリーポイントで測定されたスプリントあたりのチームの合計キャパシティ。
グループ メール	グループのメール配布リスト。
説明	グループに適した説明。

4. [**Submit** (送信)] を選択します。
5. 移動先 **Scaled Agile Framework (SAFe)** > アジャイルリリーストレイン.
6. SAFe チームを関連付ける ART を選択します。
7. [編集]をクリックして、チームを ART に関連付けます。
8. [保存] をクリックします。

次のタスク
次の関連リンクを使用してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連リスト	説明
グループメンバー	グループに対してメンバーを追加または削除します。
ストーリー	グループにアサインされたストーリーを追加または編集します。
スプリント	グループのスプリントを表示または追加します。
PI 目標	このチームのすべての PI 目標のリスト。PI 目標を表示、作成、および更新します。 この関連リストは、グループフォームの SAFe ビューに表示されます。

SAFe PI 目標

SAFe プログラムインクリメント (PI) 目標を使用して、PI でチームまたは Agile リリーストレーニング (ART) の全体的な目標をハイライト表示します。

SAFe PI 目標は、チームまたは ART のビジネス面および技術面の目標を要約するために作成します。PI 計画中、チームはまず、次の PI で達成する予定の PI 目標を作成します。プログラムマネージャーは、PI 目標を高レベルの PI 目標の個別セットにまとめることができます。

PI 目標は、機能に直接関連付けることができます。ただし、場合によっては、複数の機能が単一の目標に寄与することがあります。この状況では、複数のチーム間でコラボレーションが必要になる場合があります。

チームには理想的には 7 ～ 10 個の PI 目標が必要ですが、チームが持つことができる目標数に制限はありません。

PI 目標は、チームレベルまたはプログラムレベルで、コミットすることも、コミットしないこともできます。コミットされている目標は、チームが確実に達成できる目標です。対照的に、コミットされていない目標は、さまざまな依存関係やその他の要因のために、チームの達成できる確実性が低い目標です。コミットされていない目標の作業は計画されますが、PI のスコープ内で異なる場合があります。

PI の計画が進行して完了すると、ビジネスオーナーはすべての PI 目標に計画ビジネス価値 (PBV) スコアを割り当てます。スコアは 1 ～ 10 のスケールで、1 は最低の優先度、10 は最高の優先度を表します。チームが PI を完了すると、ビジネスオーナーは実際のビジネス価値 (ABV) スコアを達成済みの PI 目標に割り当てます。PI の最後に、PBV および ABV のスコアを使用して、各チームとさらに ART 全体の達成度の値が計算されます。

SAFe ART メンバーは、PI 目標のビジネス価値スコアの計画値および実績値を使用して、チームの過去のパフォーマンスを追跡できます。このパフォーマンスデータを使用することで、ART メンバーは PI の SAFe 予測可能性の測定値をグラフ化できます。これらのレポートは、チームと ART が PI ごとに提供するビジネス価値に対する可視化を提供します。

SAFe PI 目標を定義する

今後の PI についてチームまたは Agile リリーストレーニング (ART) の目標を要約できるように、SAFe プログラムインクリメント (PI) の目標を作成します。

始める前に

必要なロール：safe_art_user、safe_scrum_master、または safe_product_owner

このタスクについて

PI 目標の形態でビジネスゴールと技術目標を作成します。PI 期間中、PI 目標を ART またはチームに関連付けます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **PI** オブジェクティブ.
   SAFe チームフォーム、ART フォーム、または PI フォームの PI 目標関連リストを使用することもできます。
2. [新規] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

SAFe 目標フォーム

フィールド	説明
番号	目標のシステム生成番号。
プログラムインクリメント	この目標が計画されている PI。
コミット	この目標がコミットされているかどうかを示すオプション。
タイプ	目標のタイプ。[プログラム] または [チーム] から選択します。
Agile リリーストレーニング	この目標が計画されている ART。
計画されたビジネス価値	この目標に対して計画されたビジネス価値。フィールドは、1 ～ 10 の範囲の整数スコアとして設定します。スコア 1 は最低の優先度、スコア 10 は最高の優先度を表します。
実際のビジネス価値	この目標から実現される実際のビジネス価値。フィールドは、1 ～ 10 の範囲の整数スコアとして設定します。スコア 1 は最低の優先度、スコア 10 は最高の優先度を表します。
簡単な説明	目標の簡単な説明。
説明	目標の詳細なサマリー。説明が技術的すぎたり、曖昧になりすぎたりしないようにしてください。
作業メモ	PI 期間中の目標の進捗状況を示す作業メモ。

4. [送信] をクリックします。

SAFe ボード：ART レベル

製品マネージャーは、SAFe ボードで ART レベルにアクセスして、Agile リリーストレーニング (ART) 内のチーム全体のアクティビティを計画および監視できます。

ART レベルには、次のタブがあります。

- ボード
- バックログ
- 計画

ボード

[ボード] タブを使用すると、単一のビューで Agile リリーストレーニングのすべての機能を追跡できます。ボードはビジュアルタスクボード上にビルドされ、クラシック環境のナビゲーションをインタ


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ラクティブなグラフィカルエクスペリエンスに変換します。ビジュアルタスクボードインターフェイスは、管理と協業作業用のグラフィカルな環境を提供します。このボードで実行できるアクションの詳細については、「ビジュアルタスクボード」を参照してください。

レーン間で機能を移動すると、機能のステータスが更新されます。たとえば、機能を分析レーンからバックログレーンに移動すると、機能のステータスが「バックログ」に更新されます。

SAFe ボードの ART レベル

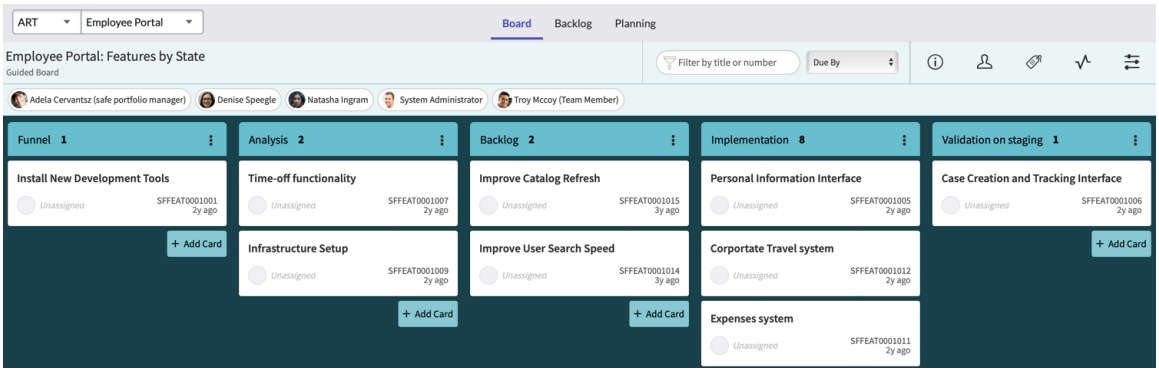


バックログ

[バックログ] タブでは、ART バックログを管理し、機能レベルで次のプログラムインクリメントを事前に計画することができます。

プログラムインクリメントは、さまざまなアジャイルチームが協力して、プログラムインクリメントサイクルの終了に向けて相当量の作業を提供する期間です。SAFe のプログラムインクリメントは、アジャイル開発 のスプリントに相当し、通常は 8 ～ 12 週間かかります。プログラムインクリメントの最も一般的な形式は、4 つの開発スプリントとそれに続く 1 つのイノベーションおよび計画立案スプリントで構成されます。

プログラムインクリメント

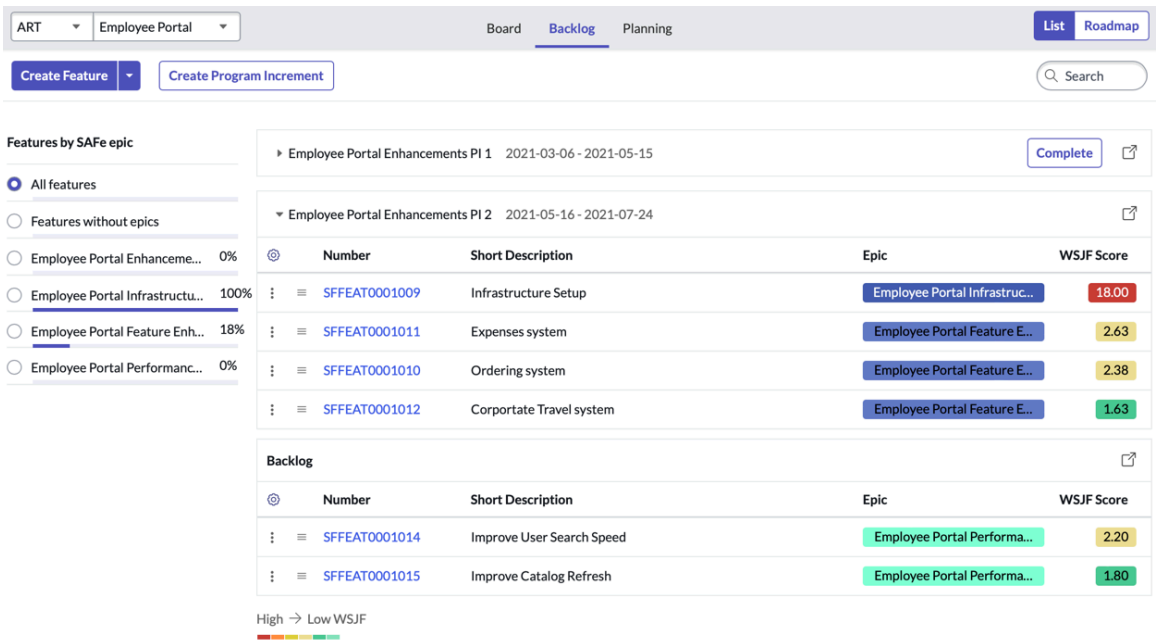

計画


[計画] タブでは、今後のプログラムインクリメントの詳細な計画を立てることができます。これにより、ART メンバーは、プログラムインクリメントの機能について話し合い、ストーリーに分解して、プログラムインクリメントを完了するために必要なスプリントを事前に計画することができま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

す。[計画] タブには、ストーリー間の依存関係と機能間の依存関係が表示され、計画プロセスに役立ちます。

[計画] タブ

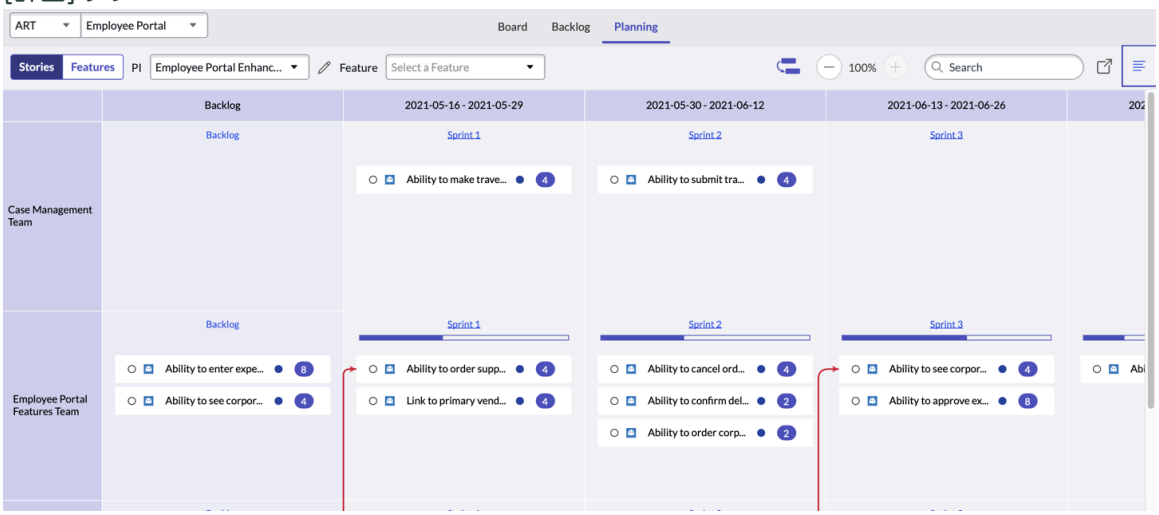

ボードの機能を追跡する

ART の機能の進捗状況を追跡します。あるステータス (レーン) から別のステータス (レーン) への移行を表示します。

始める前に

必要なロール：safe_admin または safe_art_user

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. 左上隅の選択リストから、レベルとして **[ART]** を選択します。
3. [ボードビュー] を選択します。
4. 機能カードをドラッグアンドドロップして、機能を必要なステータスに移動します。
5. オプション: 特定の状況に機能を追加します。

   a. [カードを追加] をクリックします。

   b. フォームのフィールドに入力して、送信します。
   機能フォームフィールドの詳細については、「SAFe での機能の定義」を参照してください。

SAFe ボードからの ART バックログの管理

Agile リリーストレーニング (ART) バックログの機能に優先順位を付けて管理します。ART バックログには、プログラムインクリメントに割り当てられていないアクティブな機能のみがリストに表示されます。

始める前に

必要なロール：safe_art_user または safe_admin

このタスクについて

SAFe ボードでは、新しい機能の追加や既存の機能の管理など、バックログを管理するためのさまざまなアクションを実行できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ステップ 1 ～ 3 では、ART バックログを管理します。ステップ 4 ～ 11 では、SAFe ボードで実行できるさまざまなアクションに関するガイダンスを提供します。ステップ 4 ～ 11 で、実行するアクションを選択します。

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. SAFe ボードの左上隅のリストから、レベルとして **[ART]** を選択し、ART を選択します。
3. [バックログ] タブをクリックします。
4. バックログに機能を追加します。
   a. [機能を作成] をクリックします。
   b. 機能フォームで必要な詳細を指定します。
   c. [送信] をクリックします。
      機能が、最後のページのバックログの一番下にリストされます。

   バックログの特定の位置に機能を追加する場合は、該当する位置のすぐ上にある機能を選択し、[機能の作成] をクリックします。新しい機能が、選択した機能の下に表示されます。
5. バックログから機能を更新します。
   a. 更新する機能の番号をクリックします。
   b. 機能の詳細を編集し、[更新] をクリックします。
6. [バックログ] セクションおよび [プログラムインクリメント (PI)] セクションでエピックのリストをフィルタリングするには、 [SAFe エピック別機能] セクションのリストにあるエピックを使用します。
   [SAFe エピック別機能] セクションには、ART に割り当てられているエピックのみのリストが表示されます。このセクションには、機能を含まないエピックは表示されません。
7. [SAFe エピック別機能] セクションにエピックを追加します。
   a. [機能を作成] オプションの横にあるオプションアイコン ( ) を選択します。
   b. [エピックを作成] を選択します。
   c. SAFe エピックフォームのフィールドに入力して、フォームを送信します。
      詳細については、SAFe でエピックを定義を参照してください。
8. 次のいずれかのオプションを使用して、バックログページ内に機能を配置します。
   - マウスデバイスを使用して機能を選択して保持し、必要な位置にドラッグアンドドロップします。
   - キーボードを使用します。詳細については、「キーボードを使用して SAFe バックログページに機能を配置する」を参照してください。
9. リスト内の列をカスタマイズするには、歯車アイコン ( ) を選択します。
10. 単一の機能または一連の機能に対してさまざまなアクションを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. 必要な機能を選択します。

b. オプションアイコン ( ) をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

11. 標準リストのレコードを表示するには、標準リストアイコン ( ) を選択します。

キーボードを使用して **SAFe** バックログページに機能を配置する

キーボードを使用して、 SAFe ボードの [バックログ] タブに SAFe 機能を移動および配置します。

始める前に
必要なロール：safe_art_user または safe_admin

このタスクについて
キーボードを使用して、バックログリストまたはプログラムインクリメント (PI) リスト内で機能の順序を変更できます。

手順

1. Tab キーを押して、機能をハイライト表示します。

2. もう一度 Tab キーを押します。
機能のコンテキストメニューアイコン ( ) がハイライト表示されます。

3. Enter キーを押して機能を選択します。

4. 上下の矢印キーを使用して、機能を目的の位置に移動します。

5. Enter キーを押して機能の位置を固定します。

キーボードを使用して **SAFe** ボードに複数の機能を配置する

キーボードを使用して、SAFe ボードの [バックログ] タブに複数の SAFe 機能を移動および配置します。

始める前に
必要なロール：safe_art_user または safe_admin

このタスクについて
キーボードを使用して、バックログリストまたはプログラムインクリメント (PI) リスト内で複数の機能の順序を変更できます。

手順

1. Tab キーを押して、機能をハイライト表示します。

2. Enter キーを押して機能を選択します。

3. 上向き矢印キーと下向き矢印キー、および Shift キーまたは Control キーを使用して、複数の機能を選択します。
- 連続する機能を選択するには、下向き矢印キーを使用して最後に選択する機能をハイライト表示します。Shift キーと Enter キーを押します。
- ページ上の異なる位置にある機能を選択するには、下向き矢印キーを使用して次に選択したい機能に移動します。Control キーと Enter キーを押します。このステップを繰り返して、他の機能を選択します。


4. もう一度 Tab キーを押して、機能のコンテキストメニュー ( ) アイコンをハイライト表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. Enter キーを押して、選択したすべての機能をグループ化します。

   選択した複数の機能がグループ化されて表示されます。

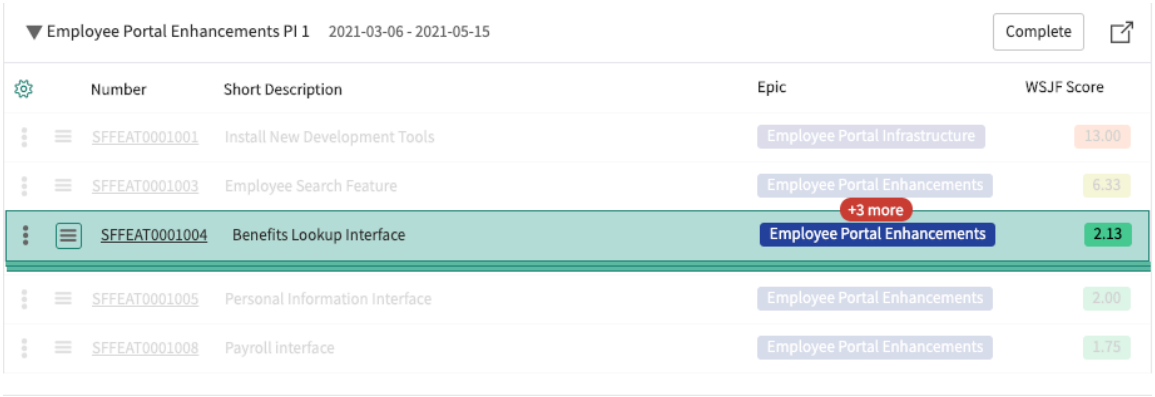

6. 上下の矢印キーを使用して、機能を目的の位置に移動します。
7. Enter キーを押して機能の位置を固定します。

プログラムインクリメントの機能をスケジュールする

プログラムインクリメント (PI) を定義し、その PI 内で完了する予定の機能を計画します。

始める前に
必要なロール：safe_art_user または safe_admin

手順

1. PI の機能を作成します。
2. 現在および将来のプログラムインクリメントをリストビューまたはビジュアルタスクボード (VTB) に表示します。
3. バックログの機能を評価し、PI に移動します。


SAFe プログラムリストビューを使用する

SAFe プログラムリストビューを使用して、プログラムインクリメント (PI) を作成、整理、追跡、開始、および完了します。

始める前に
必要なロール：safe_admin または safe_art_user

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. 左上隅のリストから、レベルに **[ART]** を選択し、ART を選択します。
3. [バックログ] タブをクリックします。
4. [リストビュー] を選択します。



5. PI を作成するには、[プログラムインクリメントを作成] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PI フォームで、必須フィールドに入力します。既存の PI を編集するには、プログラムインクリメント番号をクリックし、フォームで必要な詳細を編集します。

6. 機能をスケジュールするには、[バックログ] セクションで機能をドラッグし、必要な PI にドロップします。
7. リストの列をカスタマイズして表示するには、  をクリックします。
8. 最初の PI を開始するには、該当するセクションに表示される [開始] をクリックします。
[計画] タブが開きます。
9. PI を完了するには、該当セクションに表示される [完了] をクリックします。


完了済みおよび未完了のストーリー、機能、およびスプリントの数を示すダイアログボックスが表示されます。未完了の機能を将来のプログラムインクリメントに移動するか、機能と残りのスプリントを [完了] としてマークします。

SAFe プログラムロードマップビューを使用する

SAFe プログラムロードマップビューを使用して、Agile リリーストレーニング (ART) のプログラムインクリメント (PI) を追跡し、将来の PI の機能を計画します。

始める前に
必要なロール：safe_admin または safe_art_user

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. 左上隅のリストから、レベルに **[ART]** を選択し、ART を選択します。
3. [バックログ] タブをクリックします。
4. [ロードマップ] ビューを選択します。


5. 機能を [プログラムインクリメントなし] レーンからドラッグして、必要なプログラムインクリメントレーンにドロップすることでスケジュールします。
ある PI レーンから別の PI レーンに機能カードを再配置することで、機能を再スケジュールできます。
6. レーンのリストの一番下にある [カードを追加] をクリックして、PI レーンに機能を直接追加します。

[その他のオプション] アイコン () をクリックし、[カードを追加] をクリックすることもできます。

7. [その他のオプション] アイコン () をクリックし、[レーンを非表示] をクリックすることで、PI レーンを非表示にできます。

SAFePI 計画ボード

一元化されたボードを使用して、Agile リリーストレーニング (ART) のプログラムインクリメント (PI) を計画します。ストーリーを作成してチームに割り当てることや、ストーリーの依存関係を追加および表示すること、スプリントによりストーリーを追跡すること、必要に応じてこうしたストーリーを再計画することができます。

SAFe PI 計画ボードの UI コンポーネント。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAFe PI 計画ボードには、計画立案プロセスをガイドする次のコンポーネントが含まれています。

ストーリーと機能の切り替え

[ストーリー] を選択して切り替えると、PI のストーリーがスプリント内に計画されます。

[機能] を選択して切り替えると、PI のすべての機能の進捗状況が追跡されます。

SAFe PI セレクター

計画またはレビューする PI を選択します。

機能フィルター

PI に関連付けられている機能を選択します。機能を選択すると、プログラム計画ボードと機能バックログペインでストーリーをフィルタリングできます。この機能から作業負荷を分析し、スプリント全体で作業負荷がどのようにスケジュールされているかを理解できます。

ストーリーの依存関係

ストーリーの依存関係線を使用して、異なるスプリントおよびチームのストーリー間の依存関係を視覚的に分析します。依存関係アイコン () を使用して、こうした依存関係線を表示または非表示にできます。依存関係を非表示にすることを選択した場合、またはボード上に存在しないストーリーが依存関係に含まれている場合は、ストーリーカードに色付きの境界線が表示されます。

依存関係の色は、ストーリーをスケジュールした方法を示します。使用される色は次のとおりです。

- 緑：前提条件ストーリーは、依存ストーリーのスプリントの前のスプリントにスケジュールされています。
- 黄：前提条件ストーリーは、依存ストーリーと同じスプリントにスケジュールされています。
- 赤：前提条件ストーリーは、依存ストーリーのスプリントの後のスプリントにスケジュールされています。依存関係を確認し、必要に応じてストーリーを再スケジュールします。

前提条件ストーリーまたは依存ストーリーに関連付けられているストーリーがない場合、依存関係アイコン () は表示されません。ストーリーの依存関係を追加する方法については、SAFe ストーリーへの依存関係の追加を参照してください。

機能バックログペイン

選択した PI のすべての機能のリストを表示するには、バックログペインを使用します。機能に対して次のアクションを実行できます。

- 説明を表示します。
- 機能名をクリックして情報を編集します。
- [ストーリーを作成] をクリックして、機能に新しいストーリーを追加します。
- この機能の未アサインおよび未スケジュールのストーリーは、簡単な説明とストーリーポイントを示すカードとして表示されます。

SAFe チーム

選択した ART のすべてのチームが計画ボードの左側に表示されます。計画ボードには一度に最大 15 チームを表示できます。この制限は、計画アクティビティ中にボードの最適なパフォーマンスを確保するために設定されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

チームのバックログレーン

チームにアサインされていても、まだスプリントにスケジュールされていないストーリーが表示されます。

チームにアサインする必要があるストーリーがわかっていても、使用すべきスプリントがわからない場合は、こうしたストーリーを機能のバックログレーンからチームのバックログレーンに移動できます。これによって、今後のスプリントに対するチームの作業負荷を明確に把握し、最終的にこうしたストーリーを正しいスプリントに追加することができます。

ストーリーカードをチームのバックログにドラッグして戻すことで、すでにスプリントにスケジュールされているストーリーの計画を解除することもできます。後で計画ボードに再度アクセスすると、どのチームがこのストーリーを保持しているかがわかり、どのスプリントを使用すべきかを決定できます。

チームのスプリントレーン

チームのスプリント周期を確認します。

スプリントの名前にカーソルを合わせると、期間、合計ストーリーポイント、最大キャパシティなどのスプリントの詳細を確認できます。スプリント名をクリックすると、グループキャパシティ、開始予定日、終了日などの詳細を編集できます。

PI の計画中に、ストーリーが処理されるスプリントがわかっている場合は、ストーリーカードをそのスプリントに移動できます。


ストーリーカード

SAFe 機能のストーリーをカード形式で表示します。これらのカードを移動してチームに割り当てたり、スプリントで計画したりすることができます。

SAFe — 統合バックログ プラグイン (com.snc.sdlc.safe.multi_task) を有効化している場合は、トリアージボードから統合バックログに追加されたストーリーも表示されます。PI 計画ボードから、ストーリーカードをダブルクリックすることで、モーダルフォームで開き、詳細を編集できます。インシデントなどのトリアージボード上のレコードからストーリーが作成された場合は、ストーリー情報と欠陥情報の両方が並べて表示されます。

ストーリーカードでは、次のインジケーターを使用します。

SAFe PI 計画ボードのストーリーカードの凡例

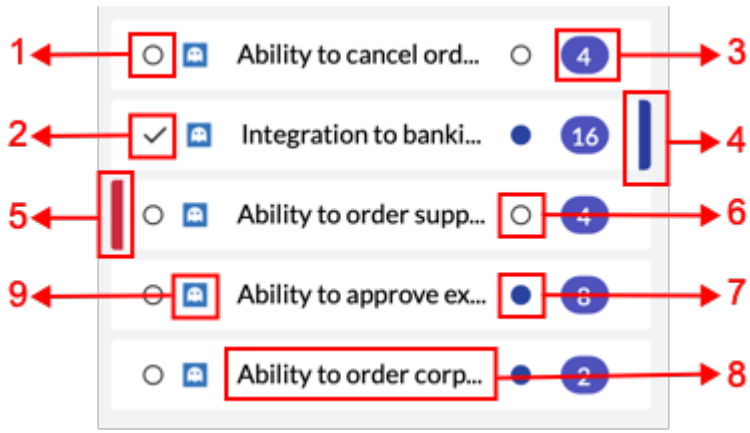

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAFe PI 計画ボードのストーリーカードのインジケーター

番号	インジケーターの説明
1	ストーリーは未完了です。
2	ストーリーは完了しています。
3	ストーリーポイント。
4	ストーリーは依存ストーリーに関連付けられています。このバンドが赤または黄で表示されている場合、依存関係が正しく設定されていないことを示し、確認する必要があります。
5	ストーリーは前提条件ストーリーに関連付けられています。このバンドが赤または黄で表示されている場合、依存関係が正しく設定されていないことを示し、確認する必要があります。
6	ストーリーは、この色の機能に属しています。ドットにカーソルを合わせると、機能の名前が表示されます。
7	ストーリーは、色の属性がない機能に属しています。ドットにカーソルを合わせると、機能の名前が表示されます。
8	ストーリーの短い説明。
9	ストーリーは通常のストーリーです。このアイコンは、ストーリーレコードのタイプによって変わります。たとえば、インシデント、機能拡張、欠陥、問題などのレコードからストーリーを作成することができます。

注:
拡張機能、欠陥、インシデントなどのレコードからストーリーを作成できるのは、 SAFe — 統合バックログ プラグイン (com.snc.sdlc.safe.multi_task) がアクティブ化されている場合のみです。

スプリント作業負荷キャパシティバー

スプリント名の下にある作業負荷キャパシティバーを使用して、スプリントを効率的に計画できます。このバーは、チームに計画されている作業負荷と、該当するスプリントに対するチームのキャパシティを比較して示します。

スプリントのグループキャパシティがゼロの場合、スプリントの負荷とキャパシティの詳細は表示されません。

ズームインとズームアウト

ズームインアイコン ( ) とズームアウトアイコン (アイコン) を使用してボードビューを調整します。

検索

検索用語を使用して、計画ボード上のストーリーをフィルタリングします。たとえば、簡単な説明からストーリー番号やフレーズを入力できます。

ストーリーリスト

標準リストビューアイコン ( ) を使用して、プログラムのすべてのストーリーのリストを表示します。

SAFe プログラムインクリメントを計画する

SAFe プログラムインクリメント (PI) を計画し、インタラクティブな計画ボードでストーリーと機能の進捗状況を追跡します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


自動翻訳

始める前に
必要なロール：

- [計画] タブの表示：safe_scrum_user
- ストーリーの作成：safe_story_creator

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. [計画] をクリックします。
3. 画面の左上隅のリストから、**[ART]** を選択し、Agile リリーストレーニングを選択します。
4. [PI] リストから PI を選択します。
5. [ストーリー] タブを選択します。



6. チームとスプリントにストーリーをアサインします。
   a. 機能のバックログアイコン ( ) をクリックします。
   b. オプション: バックログペインで、[ストーリーを作成] をクリックして、この機能に新しいストーリーを追加します。
   c. ストーリーカードを機能のバックログペインからドラッグし、チームの必要なスプリントまたはバックログレーンにドロップします。

   ストーリーカードを再配置することで、チーム間およびスプリント間でストーリーを再スケジュールすることができます。

   - ストーリーカードをチームのバックログに移動すると、それに応じて **[SAFe** チーム] フィールドが更新されます。
   - ストーリーカードをスプリントに計画すると、それに応じてストーリーの **[SAFe** チーム] フィールドと **[SAFe** スプリント] フィールドが更新されます。

     スプリント名の下にあるスプリントキャパシティバーには、スケジュールされているストーリーに応じて入力されます。

7. オプション: 計画されたストーリー間の依存関係を追加します。

   (Optional) ストーリー間に追加した依存関係は、ストーリーの機能に自動的に適用されます。

   依存関係アイコン ( ) をクリックして、ストーリー間の依存関係を表示または非表示にします。

   ストーリーの依存関係の詳細については、SAFe ストーリーへの依存関係の追加 を参照してください。

8. オプション: スプリント名をクリックすることで、チームのスプリントのグループキャパシティを更新します。

   グループキャパシティは、各スプリントに対するグループの予測キャパシティ（ストーリーポイント）です。スプリントのグループキャパシティがゼロの場合、スプリントの負荷とキャパシティの詳細は表示されません。

   > **注:**
   > スプリントの詳細を更新できるのは、safe_scrum_master ロールを持つ場合のみです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAFe ボード：チームレベル

チームメンバーは、SAFe ボードでチームレベルにアクセスして、チーム内のアクティビティを計画および監視できます。

チームレベルには、次のタブがあります。

- バックログ
- スプリント追跡

バックログ

[バックログ] タブでは、バックログのストーリーを評価することで、スプリントまたは複数のスプリントのストーリーを計画し、優先順位を付けることができます。

さらに、次のことができます。


- ストーリーを作成します。
- ドラッグ機能を使用して、バックログのストーリーを並べ替えます。バックログの一番上にあるストーリーは、優先度が高く、ランク値が低いものと見なされます。バックログの一番下にあるストーリーは、優先度が低く、ランク値が高いものと見なされます。
- 機能によりストーリーをフィルタリングします。
- 詳細がキーワードと一致するストーリーのみを表示するには、検索ボックスにキーワードを入力します。
- スプリントを作成、整理、監視、開始、および完了します。
- 現在および将来のスプリントを時系列で表示します。
- スプリントの重要なアスペクト (現在のスプリントの開始予定日と終了予定日、およびストーリーポイント数 (合計、完了、処理待ち)) を表示します。
- バックログのストーリーを評価し、スプリントにドラッグします。
- 未完了のストーリーを完了済みスプリントからバックログまたは将来のスプリントに移動します。

注:
SAFe ボードでチームのバックログを確認するには、チームが次の状態であることを確認します。

- グループタイプが SAFe チームで、チームメンバーにロール safe_scrum_user が割り当てられている
- Agile リリーストレーニングに追加されている

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

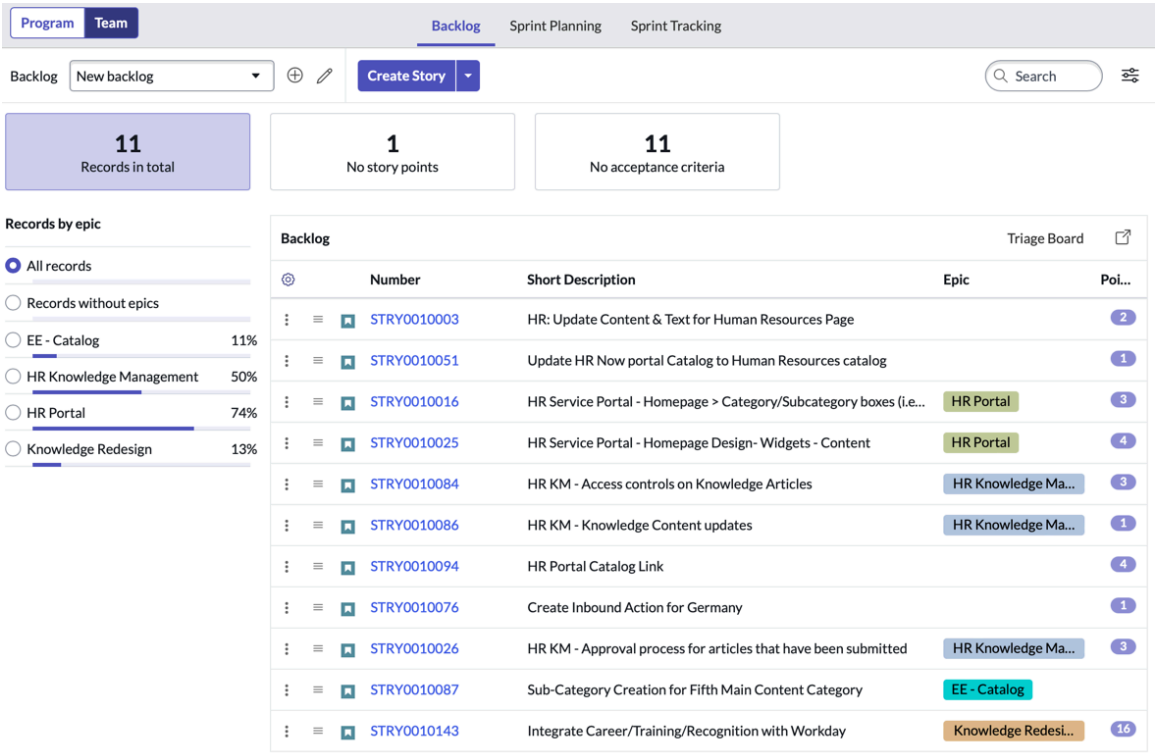


スプリント追跡

[スプリント追跡] タブには、次のビューがあります。

ストーリーボード

ストーリーボードはビジュアルタスクボード上にビルドされ、リストやフォームのナビゲーションをインタラクティブなグラフィカルエクスペリエンスに変換します。ビジュアルタスクボードインターフェイスは、レコードの管理と協業作業に適したグラフィカルな環境を提供します。このボードで実行できるアクションの詳細については、「ビジュアルタスクボード」を参照してください。さらに、次のことができます。

- レーン全体で現在のスプリントのすべてのストーリーを追跡します。
- ストーリーをあるレーンから別のレーンに移動すると、ストーリーのステータスが更新されます。
- 検索条件に基づいてストーリーをフィルタリングします。

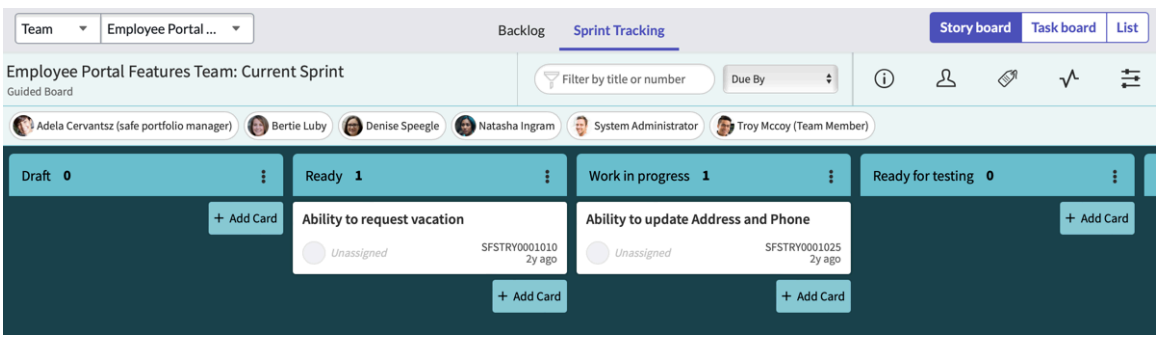


タスクボード

タスクボードを使用すると、レーン全体で現在のスプリントのストーリーに対するすべてのスクラムタスクを追跡できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


- スクラムタスクをあるレーンから別のレーンに移動すると、スクラムタスクのステータスが更新されます。
- 検索条件に基づいてスクラムタスクをフィルタリングします。

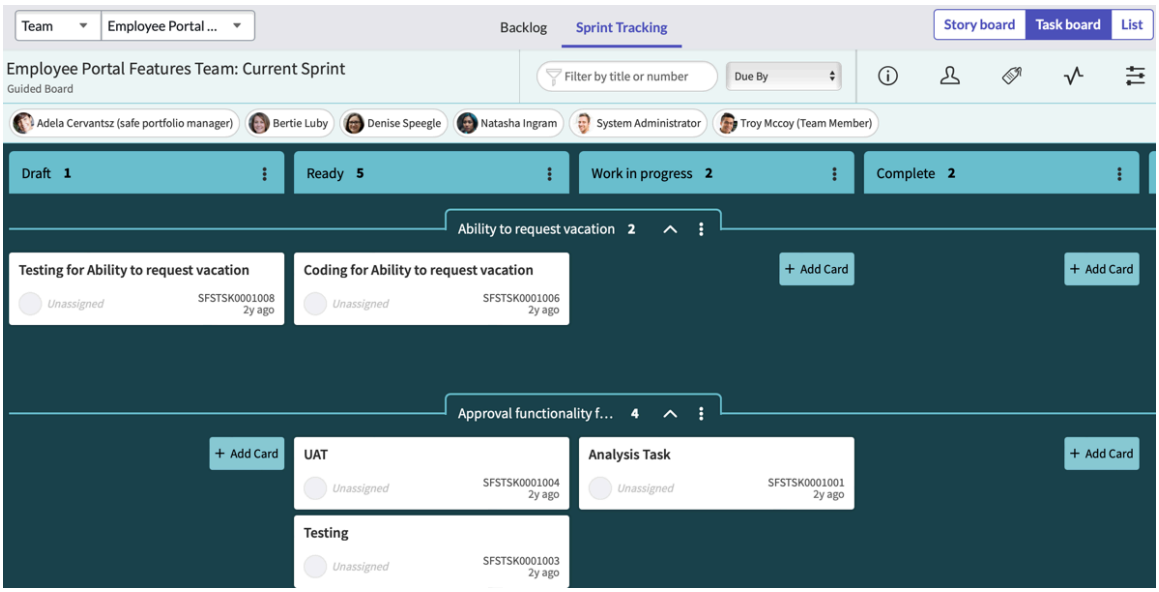

リスト

リストには、各スプリントのストーリーに関連付けられたスクラムタスクとテストが表示されます。以下のことを行うことができます。

- レコードのコンテキストを離れずにスクラムタスクとテストを追加します。
- スクラムタスクのステータス、簡単な説明、および担当者を表示しますが、詳細は表示しません。
- テストの簡単な説明と実行結果を表示します。
- 現在のスプリントがクローズする前に処理待ちのスクラムタスクとテストを評価します。

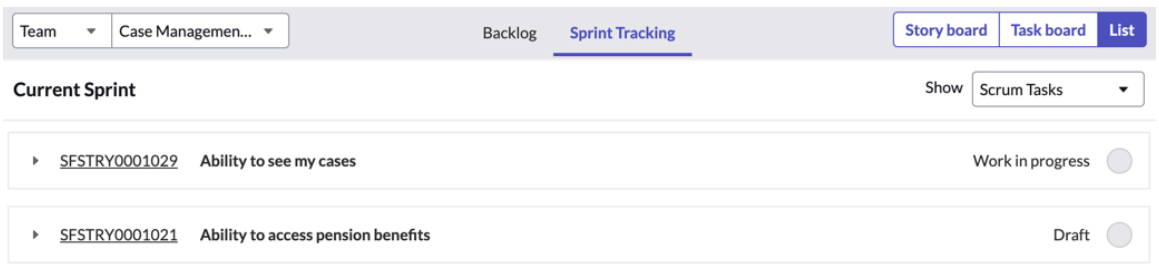

チームのバックログの管理

チームバックログのストーリーの管理、評価、優先順位付け、および並べ替えを行います。

始める前に

- チームが属するプログラムには、アクティブなプログラムインクリメントが含まれている必要があります。
- このタブには、現在のプログラムインクリメントのスプリントのみが表示されます。

必要なロール：scrum_product_owner、scrum_master、safe_product_owner、または safe_scrum_master

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. 左上隅の選択リストから、レベルとして [チーム] を選択します。
3. [バックログ] タブを選択します。
4. バックログにストーリーを追加する。
   a. [ストーリーの作成] をクリックします。
   b. ストーリーフォームで必要な詳細を指定します。
   c. [送信] をクリックします。
      ストーリーはバックログの一番下に表示されます。
5. ストーリーをバックログに追加し、同時にその実装順序を決定するには、次のステップを実行します。
   a. バックログでストーリーを選択します。
   b. [ストーリーの作成] をクリックします。
   c. ストーリーフォームで必要な詳細を指定し、[送信] をクリックします。
      ストーリーは、バックログで選択されたストーリーの下に作成されます。
6. **[SAFe** 機能別のレコード] セクションには、バックログのレコードが属する機能のリストが表示されます。
   機能を選択します。この機能に属するレコードのみが表示されます。
7. 特定のタスクタイプ (問題や欠陥など) のトリアージボードを開くには、あるいはすべてのタスクタイプのトリアージボードのレコードの合計数の表示、トリアージボードのフィルター定義の編集、または別のトリアージ定義の作成を行うには、[トリアージボード] をクリックします。

   注:
   [トリアージボード] リンクは、Agile — Scaled Agile Framework — 統合バックログプラグイン (com.snc.sdlc.safe.multi_task) がインストールされている場合にのみ表示されます。

8. 標準プラットフォームリストでレコードを表示するには、  をクリックします。
9. リストの列をカスタマイズするには、  をクリックします。
10. トリアージしたレコードを [バックログ] タブからトリアージボードに戻すには、次の手順を実行します。
    a. フォームでレコードを開きます。
    b. [トリアージボードに戻る] 関連リンクをクリックします。
11. どのスプリントにもアサインされていないストーリーを整理するには、次のいずれかのオプションを使用します。
12. 一連のストーリーに対してアクションを実行するには、次の手順を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 必要なストーリーを選択します。
-  をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

スプリント計画を実行する

バックログのストーリーを評価し、スプリントのストーリーを選択して、ストーリーの作業量を見積もることによって、スプリント計画を実行します。

始める前に

必要なロール：scrum_master
このタブには、現在のプログラムインクリメントのスプリントのみが表示されます。

このタスクについて

SAFe では、スプリント計画の主要部分は、ビッグルーム計画プロセス中に行われます。チームバックログとそのスプリント計画部分は、絞り込みセッション用に設計されています。プログラムインクリメントの各スプリントの全体的な計画は既に存在しますが、チームは、欠落しているストーリーを追加して初期計画を調整するために、依然として 2 週間ごとにスプリント計画セッションを実施しています。

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. 左上隅の選択リストから、レベルとして [チーム] を選択します。
3. [バックログ] タブを選択します。
4. ストーリーをスプリントに追加し、同時にその実装順序を決定するには、次のステップを実行します。
   a. スプリントのストーリーをポイントします。
   b. [ストーリーの作成] をクリックします。
   c. ストーリーフォームで必要な詳細を指定し、[送信] をクリックします。
      ストーリーは、バックログまたはスプリントで選択されたストーリーの下に作成されます。
5. リストの列をカスタマイズするには、  をクリックします。
6. スプリントを開始するには、最初または一番上のスプリントの右隅に表示された [開始] をクリックします。
7. スプリントを完了するには、最初または一番上のスプリントの右隅に表示された [スプリントの完了] をクリックします。
   スプリント内で完了済みのストーリーと未完了のストーリーの数を示すダイアログボックスが表示されます。未完了のストーリーがある場合は、バックログまたは将来のスプリントに移動します。[完了] をクリックします。

ボードビューから **SAFe** タスクを追跡する

SAFe ストーリーとスクラムタスクの進捗状況を追跡します。ビジュアルタスクボードで、あるステータス (レーン) から別のステータス (レーン) への移行を表示します。

始める前に

必要なロール：safe_scrum_user または safe_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. 左上隅のリストから、レベルとして [チーム] を選択します。
3. [スプリント追跡] タブをクリックします。
4. 現在のスプリントのストーリーの進行状況を追跡するには、[ストーリーボード] ビューを選択します。
   a. ストーリーのステータスを変更するには、ストーリーをあるレーンから別のレーンに移動します。
   b. 特定のレーンにストーリーを追加するには、次の手順を実行します。
      i. [タスクを追加] をクリックします。
      ii. フォームのフィールドに入力します。
      iii. [送信] をクリックします。
5. 現在のスプリントのストーリーのスクラムタスクの進行状況を追跡するには、[タスクボード] ビューを選択します。
   a. スクラムタスクのステータスを変更するには、スクラムタスクをあるレーンから別のレーンに移動します。
   b. 特定のレーンにスクラムタスクを追加するには、次の手順を実行します。
      i. [タスクを追加] をクリックします。
      ii. フォームのフィールドに入力します。
      iii. [送信] をクリックします。

リストビューから **SAFe** チームの作業を追跡する

リストビューから SAFe ストーリーのスクラムタスクとテストを作成、実行、追跡、および完了します。

始める前に
必要なロール：safe_scrum_user または safe_admin

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. 左上隅のリストから、レベルとして [チーム] を選択します。
3. 隣接するリストから、必要なチーム値を選択します。
4. [スプリント追跡] タブをクリックし、リストビューを選択します。
5. ストーリーをスクラムタスクにブレークダウンするには、次の手順を実行します。
   a. 右上隅の [表示] リストから、[スクラムタスク] を選択します。
   b. [スクラムタスクの追加]をクリックします。
   c. フォームのフィールドに入力します。

スクラムタスクフォーム

フィールド	説明
番号	SAFe ストーリーのシステム生成番号。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
SAFe ストーリー	スクラムタスクに関連付けられた SAFe ストーリー。
優先度	スクラムタスクに設定された優先度。
タイプ	スクラムタスクを完了するために必要な作業のタイプ。
状況	スクラムタスクの現在のステータス。スクラムタスクの進行状況を示します。
担当者	スクラムタスクがアサインされているユーザー。
簡単な説明	スクラムタスクの簡単な説明。
説明	スクラムタスクの詳細な説明。
作業メモ	ライフサイクルのさまざまな段階におけるスクラムタスクの進捗状況を示す作業メモ。

d. [送信] をクリックします。

6. SAFe ストーリーのテストを作成するには、次の手順を実行します。

> **注:**
> テストを作成するオプションは、テスト管理 2.0 がインストールされている場合にのみ使用できます。

a. 右上隅の [表示] リストから、[テスト] を選択します。

b. [テストの追加] をクリックします。詳細については、「SAFe ストーリーのテストを作成する」を参照してください。

7. SAFe ストーリーに対して「準備完了ステータス」にあるテストを実行するには、次の手順を実行します。

a. ストーリーの [実行] ボタンをクリックします。

b. ポップアップで、テストを実行する環境を選択し、[実行] をクリックします。詳細については、「SAFe ストーリーのテストを実行する」を参照してください。

8. リストの列をカスタマイズするには、  をクリックします。

SAFe ストーリーのテストを作成する

テストを作成し、テストにステップを追加して、さまざまなバージョンのテストを作成、維持します。テストは、SAFe ストーリーが正しく機能しているかどうかを判定するために使用される条件またはステップの集まりです。テストには、テストの成否を決定するための、予期される結果を含めることもできます。

始める前に

- 必要なロール：safe_scrum_user または safe_admin
- リストビューからテストを作成できるのは、テスト管理 2.0 プラグインがインストールされている場合のみです。

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.

2. 左上隅のリストから、レベルとして [チーム] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. 隣接するリストから、必要なチーム値を選択します。
4. [スプリント追跡] タブをクリックし、リストビューを選択します。
5. 右上隅の [表示] リストから、[テスト] を選択します。
6. [テストの追加] をクリックします。
7. フォームのフィールドに入力します。

テストバージョンフォーム

フィールド	説明
テスト	テストの一意の名前。
所有者	テストを作成したオーナー。
バージョン	自動生成されたバージョンのテスト。
状況	テストの現在のステータス。 ○ ドラフト：テストが作成されたときの状態。 ○ 準備完了：編集できない場合のテストの状態。テストに複数のバージョンがある場合、一度に 1 つのテストのみが「準備完了」ステータスになります。 ○ 廃止：利用されなくなったときのテストのステータス。
簡単な説明	テストに関する簡単な説明。
ステップを追加	テストにステップを追加するために使用するボタン。
実行	ステップを実行するために使用するボタン。テストが「準備完了」ステータス の場合にのみ表示されます。
更新	テストバージョンの詳細を更新するために使用されるボタン。
準備完了	テストバージョンのステータスを「準備完了」に変更するために使用するボタン。
新規バージョンを作成	別バージョンのテストを作成するために使用するボタン。
テストを削除	テストバージョンの詳細を更新するために使用されるボタン。
ステップの順序を変更 ()	テストステップの順序を変更するために使用するアイコン。アイコンを選択し、必要な場所にステップをドラッグします。
検証が必要	検証のためにテストステップをマークするために使用するチェックボックス。
テストステップを削除 ()	テストステップを削除するために使用するアイコン。

次のタスク
次の関連リストの情報を確認してください。

関連リスト	説明
その他のバージョン	テストのすべてのバージョンを表示します。
テスト結果	各テストバージョンの実行結果を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連リスト	説明
テストセット	テストセット内の関連するテストを表示します。

SAFe ストーリーのテストを実行する

テストシナリオを表示し、SAFe ストーリーを検証するテストのすべてのステップを実行します。

始める前に
必要なロール：safe_scrum_user または safe_admin

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. 左上隅のリストから、レベルとして [チーム] を選択します。
3. 隣接するリストから、必要なチーム値を選択します。
4. [スプリント追跡] タブをクリックし、リストビューを選択します。
5. リストから [テスト] を選択します。
6. [実行] ボタンをクリックしてストーリーを検証します。
   このアクションは、ストーリーのすべてのテストを一度に実行します。
7. ポップアップで、テストを実行する環境を選択します。
8. [テスト実行] ポップアップで、次のアイコンを使用してステップを合格、不合格、またはブロックとしてマークします。
   - アイコンを選択する場合、**Tab** キーを押してから **Enter** キーを押すこともできます。
   - 一時停止して後でテストを行うには、[一時停止] をクリックします。
9. [完了] をクリックします。

タスクの結果
テスト結果はテスト結果フォームに保存されます。各テストの最新のテスト結果がリストビューに表示されます。

テストの全体的なステータスは、テストステップのステータスによって定義されます。

- すべてのテストステップに合格した場合、テストのステータスは [合格] になります。
- テストの少なくとも 1 つのステップが実行されていない場合、テストのステータスは「未完了」になります。
- テストの少なくとも 1 つのステップが不合格の場合、テストのステータスは 「不合格」になります。このルールは、前のルールよりも優先されます。
- テストの少なくとも 1 つのステップがブロックされている場合、テストのステータスは「ブロック」になります。このルールは、前の 2 つのルールよりも優先されます。

テスト失敗のトラブルシューティング

テスト実行の履歴を表示します。SAFe のテストの失敗をトラブルシューティングして修正します。

始める前に
必要なロール：safe_scrum_user または safe_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. 左上隅のリストから、レベルとして [チーム] を選択します。
3. [スプリント追跡] タブをクリックし、リストビューを選択します。
4. ストーリー内のテストをクリックします。
5. [テスト計画] 関連リストをクリックします。
   該当するバージョンのテストに関連するテスト結果が表示されます。
6. テスト結果をクリックすると、その詳細がフォームに表示されます。

テスト結果フォーム

フィールド	説明
番号	テスト結果に対して自動的に生成される番号。
結果	テストの実行状況：合格、 不合格、またはブロック。
実行環境	テストが実行される環境。
実行者	テスト計画を実行したテスターの名前。
テスト	実行中のテスト。
バージョン	実行中のテストのバージョン。
更新日時	テスト結果が記録された日時。
テスト実行	テスト実行の名前。
簡単な説明	テスト結果に関する簡単な説明。

テストの各ステップの実行状況もフォームの下部に表示されます。

ポートフォリオ SAFe

Portfolio SAFe を使用すると、組織の目標と戦略をポートフォリオに合わせて調整し、無駄のないアジャイルプリンシパルを適用して、ポートフォリオ作業をシームレスに管理および実施できます。

Portfolio SAFe は、ポートフォリオマネージャー、製品マネージャー、およびチームメンバーの 3 つのレベルで動作します。ポートフォリオレベルでは、ポートフォリオマネージャーは一元化されたバックログでエピックをキャプチャして優先順位を付け、ビジュアルタスクボードでエピックの進捗状況を監視できます。エピックは、お客様の要求やビジネス要件などの共通の目標が割り当てられた最大の作業単位です。


ART レベルでは、製品マネージャーはエピックから分解された機能をキャプチャし、優先順位を設定して、監視できます。チームレベルでは、チームメンバーは機能を分解したストーリーを実装できます。レベルの詳細については、以下の「SAFe ボード」セクションを参照してください。

Portfolio SAFe の機能の使用を開始するには、Agile - Scaled Agile Framework - Portfolio SAFe プラグイン (com.snc.sdlc.portfolio_safe) をインストールします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Portfolio SAFe によるポートフォリオ作業の管理の改善方法

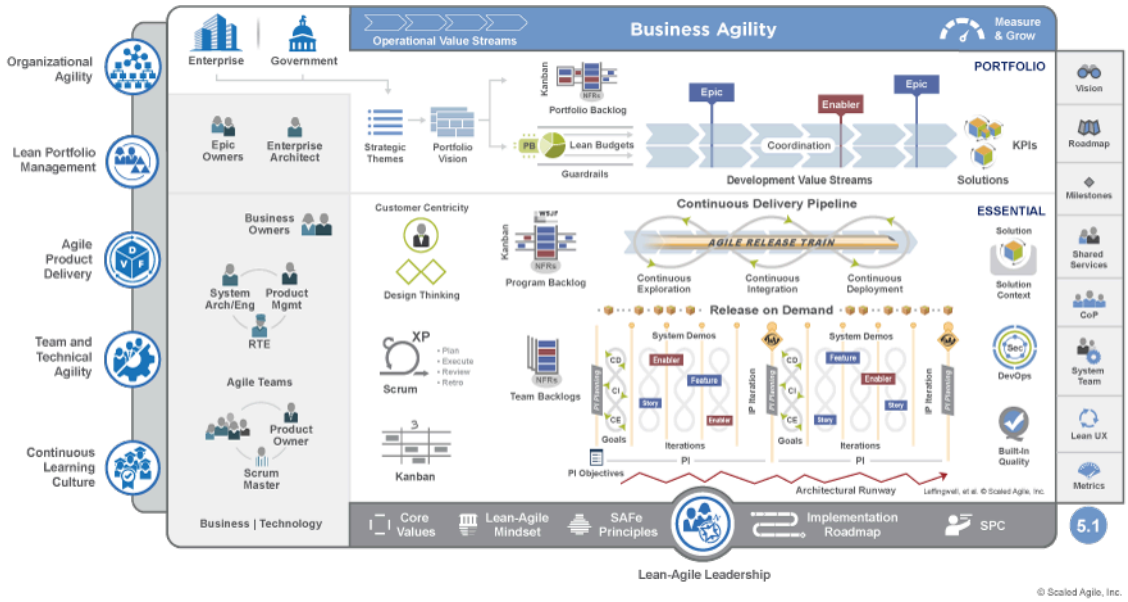

SAFe ボード

次の表に、SAFe ボード上の Portfolio SAFe のキーレベルにアクセスする方法の概要を示します。

レベル	説明
ポートフォリオ	ポートフォリオマネージャーは、の ポートフォリオ レベルにアクセスして、ポートフォリオ内のアクティビティを計画および監視できます。 **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード. さらに、次のことができます。 • ポートフォリオバックログを一元管理します。 • ポートフォリオのすべてのエピックを追跡し、ビジュアルタスクボードで、あるステータス (レーン) から別のステータス (レーン) への移行を表示します。
Agile リリーストレーニング (ART)	製品マネージャーは、で **ART** レベルにアクセスして、ART 内のチーム全体のアクティビティを計画および監視できます。 **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード. さらに、次のことができます。 • ART バックログを一元管理します。 • プログラムインクリメントを定義し、そのプログラムインクリメント内で完了する必要がある機能を特定します。 • ビッグルームの計画を実行します。 • ART のすべての機能を追跡し、ビジュアルタスクボードで、あるステータス (レーン) から別のステータス (レーン) への移行を表示します。
チーム	チームメンバーは、で チーム レベルにアクセスして、チーム内のアクティビティを計画および監視できます。 **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード. さらに、次のことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レベル	説明
	• チームバックログを一元管理します。 • スプリント計画立案と完了アクティビティを簡素化します。 • すべてのストーリーを追跡し、ビジュアルタスクボードで、あるステータス (レーン) から別のステータス (レーン) への移行を表示します。

Portfolio SAFe とともにインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、Agile - Scaled Agile Framework - Portfolio SAFe プラグイン (com.snc.sdlc.portfolio_safe) の有効化とともにインストールされます。

インストールされるロール

ロール	説明	ロールを含む
SAFe アドミン [safe_admin]	• SAFe ART、エピック、機能、ストーリー、およびプログラムインクリメントを編集、作成、および削除します。 • SAFe チームに対する読み取り専用アクセス権があります。	• safe_art_user • safe_scrum_master • safe_product_owner
SAFe ポートフォリオユーザー [sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user]	ポートフォリオのバックログを管理し、SAFe エピック、機能、およびストーリーを編集、作成、および削除できます。	safe_art_user
SAFe スクラム製品オーナー [safe_product_owner]	• チームのバックログを管理し、SAFe ストーリーを編集、作成、および削除できます。 • SAFe ART、チーム、エピック、および機能に対する読み取り専用アクセス権があります。 • SAFe プログラムインクリメントに対する読み取り専用アクセス権があります。	safe_story_creator
SAFe ART ユーザー [safe_art_user]	• ART バックログを管理し、SAFe エピック、機能、ストーリー、およびプログラムインクリメン	safe_story_creator

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ロール	説明	ロールを含む
	トを編集、作成、および削除できます。 • SAFe チームを編集します。 • SAFe ART に対する読み取り専用アクセス権があります。	
SAFe スクラムマスター [safe_scrum_master]	• SAFe ストーリーを編集および削除します。 • SAFe チームを編集します。 • SAFe ART、エピック、機能、およびプログラムインクリメントに対する読み取り専用アクセス権があります。	safe_story_creator
SAFe スクラムユーザー [safe_scrum_user]	SAFe のすべての要素を表示できますが、どのタイプのレコードも作成、編集、または管理できません。	なし
SAFe スクラムストーリー作成者 [safe_story_creator]	• SAFe ストーリーを編集、作成、および削除します。 • SAFe ART、チーム、エピック、機能、およびプログラムインクリメントに対する読み取り専用アクセス権があります。	safe_story_editor
SAFe スクラムストーリー編集者 [safe_story_editor]	• ドラッグアンドドロップ機能を使用して、チームのバックログ内にストーリーを配置します。 • SAFe ストーリーを編集します。 • SAFe ART、チーム、エピック、機能、およびプログラムインクリメントに対する読み取り専用アクセス権があります。	• safe_scrum_user • rm_scrum_task_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールされるテーブル

テーブル	説明
SAFe エピック [sn_safe_epic]	エピックに関する情報。
SAFe 機能 [sn_safe_feature]	機能に関する情報。
Agile リリーストレーニング [sn_safe_program]	ART に関する情報。
プログラムインクリメント [sn_safe_program_increment]	プログラムインクリメントに関する情報。
SAFe ART チーム [sn_safe_program_m2m_group]	グループと ART の関係。
SAFe ART メンバー [sn_safe_program_member]	ART 内のメンバーに関する情報。
SAFe ART スプリント [sn_safe_program_sprint]	ART 内のチームのスプリントスケジュール。
SAFe ART VTB ボード [sn_safe_program_vtb_board]	ART レベルで [ボード] タブに表示されるレコード。
SAFe スクラムタスク [sn_safe_scrum_task]	SAFe スクラムタスクに関する情報。
SAFe スプリント [sn_safe_sprint]	スプリントに関する情報。
SAFe ストーリー [sn_safe_story]	ストーリーに関する情報。
SAFe PI の目標 [sn_safe_pi_objective]	SAFe PI の目標を保存します。
SAFe チームの予測可能性の測定 [sn_safe_pi_m2m_group]	チームレベルの予測可能性の測定データに使用される PI 目標から、チームごとに達成されたビジネス価値を格納します。
ポートフォリオ [pm_portfolio]	ポートフォリオに関する情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
ポートフォリオ SAFe VTB ボード [sn_portfolio_safe_vtb_board]	ポートフォリオレベルで [ボード] タブに表示されるレコード。
SAFe チーム VTB ボード [sn_safe_team_vtb_board]	チームレベルで [ボード] タブに表示されるレコード。

ポートフォリオを定義する

SAFe から、単一のソリューションに対して作業する ART のグループであるポートフォリオを定義します。

始める前に

必要なロール：sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > ポートフォリオ.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

ポートフォリオフォーム

フィールド	説明
名前	ポートフォリオの一意の名前。
ポートフォリオマネージャー	ポートフォリオが割り当てられているマネージャー。
説明	ポートフォリオの詳細な説明。

次のタスク

- Agile リリーストレーニングの定義
- SAFe でエピックを定義

SAFe ボード：ポートフォリオレベル

ポートフォリオマネージャーは、SAFe ボードでポートフォリオレベルにアクセスして、ポートフォリオ内のアクティビティを計画および監視できます。

ポートフォリオレベルには、次のタブがあります。

- ボード
- バックログ

ボード


[ボード] タブを使用すると、単一のビューでポートフォリオのすべてのエピックを追跡できます。ボードはビジュアルタスクボード上にビルドされ、リストやフォームのナビゲーションをインタラクティブなグラフィカルエクスペリエンスに変換します。ビジュアルタスクボードインターフェイスは、管理と協業作業用のグラフィカルな環境を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

さらに、レーン間でエピックを移動すると、エピックのステータスが更新されます。このボードで実行できるアクションの詳細については、「ビジュアルタスクボード」を参照してください。

ポートフォリオの **SAFe** ボード

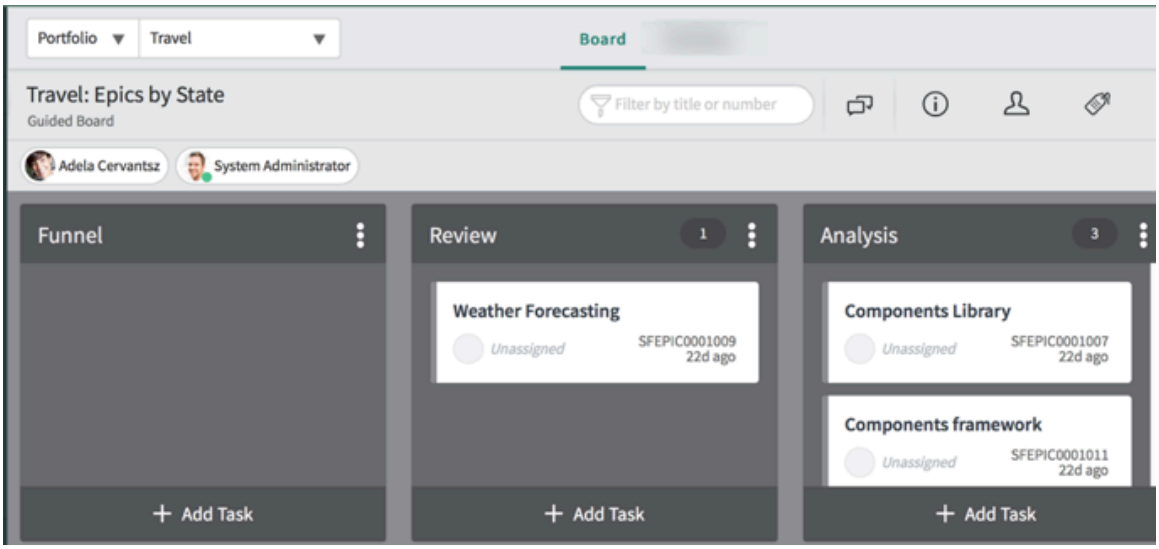

バックログ

[バックログ] タブでは、エピックを構成するポートフォリオバックログを管理できます。

ポートフォリオバックログを管理する



エピックを追跡する

[ボード] タブを使用して、ポートフォリオのすべてのエピックを追跡し、あるステータス (レーン) から別のステータス (レーン) への移行を表示します。

始める前に

必要なロール：sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. 左上隅の選択リストから、レベルとして [ポートフォリオ] を選択します。
3. [ボードビュー] を選択します。
4. エピックカードをドラッグアンドドロップして、エピックを必要なステータスに移動します。
5. オプション: 特定の状況にエピックを追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. [カードを追加] をクリックします。

b. フォームのフィールドに入力して、送信します。
エピックフィールドの詳細については、SAFe でエピックを定義 を参照してください。

ポートフォリオバックログを管理する

ポートフォリオバックログのエピックの管理、評価、優先順位付け、および並べ替えを行います。

始める前に
必要なロール：sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. 左上隅の選択リストから、レベルとして [ポートフォリオ] を選択します。
3. [バックログ] タブをクリックします。
4. バックログの最後にエピックを追加するには、次の手順を実行します。
   a. [エピックを作成] をクリックします。
   b. フォームで必要な詳細を指定し、[送信] をクリックします。
5. エピックを追加すると同時に、バックログでの実施順序を決定するには、次の手順を実行します。
   a. バックログ内のエピックを選択します。
   b. [エピックを作成] をクリックします。
   c. フォームで必要な詳細を指定し、[送信] をクリックします。
   エピックは、バックログで選択されたエピックの下に作成されます。
6. 簡単な説明でエピックを検索するには、検索ボックスに単語を入力して **Enter** キーを押します。
7. バックログ内でエピックを配置するには、次のいずれかのオプションを使用します。

   バックログに 50 を超えるエピックが含まれている場合、ページネーションコントロールがリストの下部に表示され、リスト内の最初のページ、最後のページ、前ページ、または次ページに移動できます。

8. 標準プラットフォームリストでバックログを表示するには、[標準リストを表示] をクリックします。
9. 一連のエピックに対してアクションを実行するには、次の手順を実行します。
   - 必要なエピックを選択します。
   -  をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

SAFe – 統一されたバックログ

SAFe — 統合バックログ により、欠陥、問題、インシデントタスク、ストーリーなど、さまざまなタスクタイプのレコードを含む一元化されたバックログを維持できます。これにより、1 つの場所で

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

さまざまなタスクタイプレコードの優先順位付けと順序付けが容易になり、ステップを節約できます。また、レコードをストーリーに変換するオーバーヘッドがなくなります。

重要:

Xanadu リリース以降、プラグイン Portfolio SAFe、Essential SAFe、Essential SAFe のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパック、SAFe の作業進捗ステータス、Agile - Scaled Agile Framework - Unified Backlog、および SAFe の読み取り専用ロールが、将来の廃止に向けて準備されています。これらのプラグインは非表示になり、新しいインスタンスではアクティブ化できなくなりますが、引き続きサポートされます。エンタープライズアジャイル計画は 戦略的計画 の値のいずれか は、この機能の最新のエクスペリエンスを提供します。

廃止プロセスおよびその影響の詳細については、Now Support ナレッジベースのアプリケーション/プラグインの廃止プロセス [KB0867184] の記事を参照してください。

以下で説明するフローは、Essential SAFe とともに SAFe — 統合バックログ を使用して、レコードを作成および管理するための一般的な方法を示しています。

トリアージボードの設定

フィルター条件を定義してトリアージボードを設定し、特定のタスクタイプのレコードをトリアージボードに表示できます。たとえば、欠陥に対して 1 つのトリアージボードを作成し、インシデントに対して別のトリアージボードを作成することができます。レコードはすべてのトリアージボードで動的に更新されます。

レコードのトリアージと割り当て

トリアージボードから [バックログ] タブにレコードを移動できます。[バックログ] タブで、ポイントを推定し、レコードの [ストーリー情報] タブの [ポイント] フィールドおよび [アサイン先] フィールドを使用して、レコードをユーザーに割り当てることができます。任意の特定のタスクタイプのトリアージボードを開き、すべてのタスクタイプのトリアージボードの合計レコード数を表示することや、特定のトリアージボードのフィルター定義を編集することができます。

ボードビューでのトリアージレコードの操作

ストーリーの操作時には、ボードビューの [スプリント追跡] タブで、トリアージされたレコード (ストーリー別に示されます) を操作します。トリアージされたレコードを別のレーンに移動すると、ラッパーストーリーのステータスは変更されますが、トリアージされた元のレコードのステータスは変わりません。元のトリアージされたレコードのステータスを変更するには、フォームでレコードを開き、ステータスを更新する必要があります。

SAFe でトリアージボードを設定する

フィルター基準を定義して独自のトリアージボードを設定し、問題、インシデントタスク、欠陥、変更要求など、チームにとって重要なレコードを表示します。たとえば、欠陥に対して 1 つのトリアージボードを作成し、インシデントに対して別のトリアージボードを作成することができます。

始める前に
このトリアージボードから、作業の処理を担当する SAFe チームに追加される必要があります。

必要なロール：safe_scrum_master

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **SAFe** ボード.
2. [バックログ] タブを選択します。
3. [トリアージボード] を選択します。
4. フォームのフィールドに入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

SAFe トリアージ定義フォーム

フィールド	説明
名前	トリアージボードに適した名前。
テーブル	レコードをフィルターするテーブル。
フィルター	レコードを絞り込むためにテーブルに適用するフィルター条件。

注:
トリアージボードを設定するときは、次のデフォルト条件を削除しないでください。

- アクティブが **true**：この条件は、トリアージボード上のタスクに関連性があることを確認するものです。
- アジャイルストーリーが空：この条件は、タスクが他のバックログに存在しないことを確認するものです。

5. [送信] をクリックします。
トリアージ定義が作成されます。

次のタスク

1. トリアージ定義を選択します。
2. トリアージ定義にレコードを追加するには、[新規] をクリックします。
3. トリアージボードから [バックログ] タブにレコードを移動するには、[バックログに追加] をクリックします。

Essential SAFe 用 パフォーマンスアナリティクス コンテンツパック

Essential SAFe 用 プラットフォームアナリティクス コンテンツパックでデータを視覚化する事前設定済みダッシュボードを使用して、SAFe プロセスとプラクティスを改善します。

Essential SAFe の パフォーマンスアナリティクス ダッシュボードの概要。

重要:

Xanadu リリース以降、プラグイン Portfolio SAFe、Essential SAFe、Essential SAFe のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパック、SAFe の作業進捗ステータス、Agile - Scaled Agile Framework - Unified Backlog、および SAFe の読み取り専用ロールが、将来の廃止に向けて準備されています。これらのプラグインは非表示になり、新しいインスタンスではアクティブ化できなくなりますが、引き続きサポートされます。エンタープライズアジャイル計画 は 戦略的計画 の値のいずれか は、この機能の最新のエクスペリエンスを提供します。

廃止プロセスおよびその影響の詳細については、Now Support ナレッジベースのアプリケーション/プラグインの廃止プロセス [KB0867184] の記事を参照してください。

パフォーマンスアナリティクス ソリューションの有効化

ダッシュボードの パフォーマンスアナリティクス ウィジェットを使用して、データの経時的な可視化、ビジネス プロセスの分析、改善が必要な箇所の特定を行います。ソリューションを使用すると、最小限のセットアップで パフォーマンスアナリティクス からアプリケーションに関する値を取得できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注:
ソリューションには、デフォルトでは非アクティブになっているダッシュボードがあります。これらのダッシュボードは、ビジネスニーズに従って、エンドユーザーが確認できるようにアクティブにすることができます。

この プラットフォームアナリティクスソリューション のすべての機能に無制限にアクセスするには、パフォーマンスアナリティクス のサブスクリプションを購入します。詳細については、「パフォーマンスアナリティクスサブスクリプションのアクティブ化」を参照してください。

この プラットフォームアナリティクスソリューション を使用するには、パフォーマンスアナリティクス for Business Management のサブスクリプションをアクティブ化する必要があります。パフォーマンスアナリティクス のエンタイトルメントの詳細については、「パフォーマンスアナリティクスサブスクリプションのアクティブ化」を参照してください。

このベースシステム プラットフォームアナリティクスソリューション は ServiceNow Store から利用できます。このソリューションを有効にするには、アドミニストレーターとして システムアプリケーション > **ServiceNow Store** を検索.ServiceNow Store のランディングページが開いたら、Essential SAFe の パフォーマンスアナリティクス コンテンツパックを検索します。ソリューションが見つかったら、ServiceNow Store の指示に従ってください。ServiceNow Store には、独自のドキュメントが用意されています。

ビジネスステークホルダーロールサポート

ビジネスステークホルダーロール (sn_safe_read) には、すべての Essential SAFe ダッシュボードへの読み取り専用アクセス権があります。詳細については、「Essential SAFe および Portfolio SAFe のビジネスステークホルダーロール」を参照してください。

関連情報

パフォーマンスアナリティクスサブスクリプションのアクティブ化

Essential SAFe ダッシュボードの日次データ収集の有効化

Essential SAFe ダッシュボードにて、新しいデータに対するスコア収集が自動的に行われるようにするには、スケジュール設定済みデータ収集を有効にします。データ収集ジョブにより、自動インジケーターおよび自動ブレークダウンのスコアが自動的に収集されます。

始める前に
必要なロール：pa_admin または admin

このタスクについて

注:
履歴データ収集は、[SAFe] 日次データ収集ジョブの基礎となるインジケーターではサポートされていません。

手順

1. 移動先 すべて > パフォーマンスアナリティクス > データコレクター > ジョブ.
2. [SAFe] 日次データ収集ジョブを見つけて開きます。
3. [SAFe] 日次データ収集ジョブを開始します。
   a. [ジョブパラメーター] セクションまで下方向にスクロールします。
   b. [実行方法] フィールドを pa_admin、pa_data_collector、または admin ロールに設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

c. 組織に対して [実行時のタイムゾーン] フィールドのタイムゾーンが適切であることを確認します。
このタイムゾーンは、次の目的で使用されます。
   - このジョブ用に作成されたデータベースクエリ
   - [[作成][日付][今日]] などのインジケーター条件

d. [アクティブ] チェックボックスをオンにして、ジョブのスケジュール実行を有効にします。

4. [更新] をクリックします。

Solution Library for Essential SAFe ダッシュボードの使用

Solution Library を使用して、Essential SAFe ダッシュボードの最新レイアウトにアップグレードします。

Essential SAFe のパフォーマンスアナリティクス子コンテンツパックの最新バージョン 1.1 にアップグレードした既存のユーザーは、ソリューションライブラリからダッシュボードの最新のレイアウトをインストールできます。

たとえば、アプリケーションのバージョン 1.0.1 以前からアップグレードしている場合は、Solution Library から次のダッシュボードをインストールすることで、最新のレイアウトを利用できます。

- SAFe 機能ダッシュボード
- SAFe スプリントダッシュボード
- SAFe PI ダッシュボード
- SAFe エピックダッシュボード
- SAFe チームダッシュボード

注:
Yokohama リリースのユーザーの場合、Solution Library コンテンツフォームに [インストール] および [アップグレード] ボタンは表示されません。この問題の解決方法については、「ストアアプリに PA Solution Library を許可する」を参照してください。


SAFe 機能ダッシュボード

SAFe 機能ダッシュボードでは、特定の期間におけるスコープの変更と、機能のストーリーの進行状況を視覚化することができます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[機能サマリー] タブ

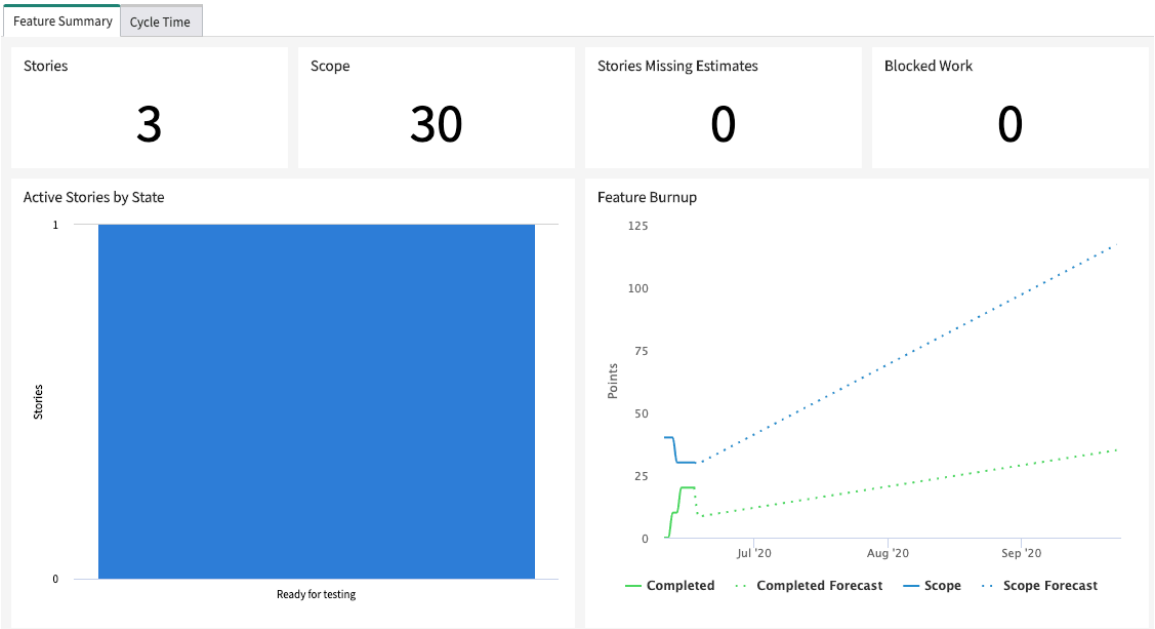

[サイクル時間] タブ

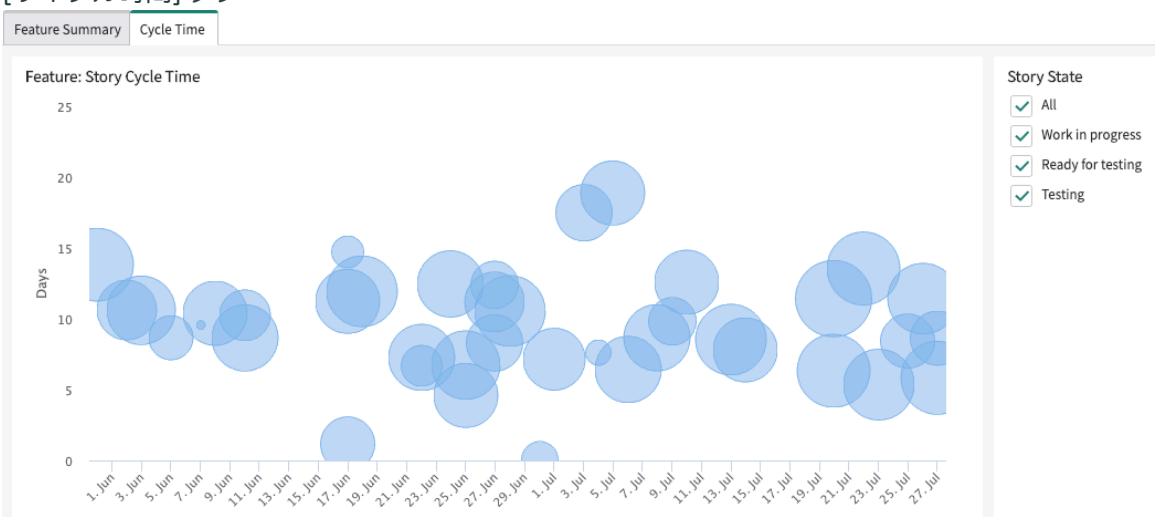

エンドユーザーとロール

必要なロールを持つエンドユーザー目標

エンドユーザーと目標	必要なロール
SAFe ART ユーザー：機能で完了した作業の量を表示します。機能が時間どおりに完了できるかどうかを測定します。	safe_scrum_user

インジケーター

SAFe：機能内のすべてのストーリーのストーリーポイントの合計

機能バーンアップレポートに完了した行を生成します。

SAFe：機能内の完了したストーリーのストーリーポイントの合計

機能バーンアップレポートにスコープ行を生成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ウィジェット

ストーリー

機能の合計ストーリー数を示します。

スコープ

ストーリーポイント内にある機能のスコープを示します。このウィジェットを使用すると、機能で完了する必要がある作業量を一目で確認できます。

推定値が欠落するストーリー

推定値が欠落している機能内のストーリー数を示します。

ブロックされた作業

ブロックされた機能の作業量 (ストーリーポイント単位) を示します。

データの可視化

バージョン 1.0.2 以前の Essential SAFe のパフォーマンスアンリティクスコンテンツパックからアップグレードする場合は、ソリューションライブラリからこのダッシュボードをインストールしてレイアウトをアップグレードし、次の可視化にアクセスします。

- 機能バーンアップ
- ストーリーのサイクル時間

詳細については、「Solution Library for Essential SAFe ダッシュボードの使用」を参照してください。

作業アイテムの進捗状況

タイトル	タイプ	説明
ステータス別のストーリー	棒グラフ 	ステータス別にグループ化されたすべてのストーリーを確認し、機能の全体的な進捗状況を一目で把握できます。
機能バーンアップ	線グラフ 	スコープの変更がある場合はその変更と、そうしたスコープの変更の傾向を示します。機能が完了すると考えられる時期を推定できます。 機能バーンアップレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：機能のサイズを、この機能で定義されたストーリーポイントの合計として示します。 • スコープ予測：履歴データに基づいて、将来の日付のスコープ変更の可能性を予測します。 • 完了：完了した機能の作業量 (ストーリーポイント単位) を示します。 • 完了予測：将来の日付のバーンアップを予測します。機能が時間どおりに完了できるかどうかを示します。この予測は履歴データに基づいています。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

作業アイテムの進捗状況 (続く)

タイトル	タイプ	説明
		注: 完了した予測データ系列がスコープ予測データ系列と交差するポイントにより、機能がいつ完了するかが予測されます。完了した予測系列とスコープ予測系列がどこまでも交差しないように見える場合は、作業の完了よりも速くスコープが追加されていることを示してるので、注意が必要です。


サイクル時間

タイトル	タイプ	説明
ストーリーのサイクル時間	バブル チャート 	機能の各ストーリーが「進行中」ステータスから「完了」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。 グラフ内の各バブルはストーリーを表しています。バブルの x 軸からの高さは、ストーリーが「進行中」ステータスから「完了済み」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。ストーリーバブルの大きさは、ストーリーポイントに基づき、相対的なものです。 バブルの上にマウスカーソルを合わせると、該当するストーリーに関する次の詳細が表示されます。 • ストーリーポイント • ストーリーが「完了」に移行した日付 • ストーリーの合計サイクル時間 (日数) • ストーリーが [対応中] ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト準備完了」ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト中」ステータスであった日数 レポートの右側にある [ストーリーのステータス] セクションから、レポートをフィルタリングして、選択した状況のストーリーのサイクル時間を表示できます。グラフには、各ストーリーのサイクル時間が、選択し

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サイクル時間 (続く)

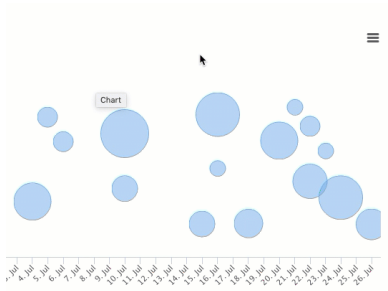タイトル	タイプ	説明
		た状況のすべての期間の累積合計として表示されます。 レポートのチャートのいずれかの領域で、ストーリーが多すぎてバブルが密集しているように見える場合は、レポートの特定の領域を拡大して見やすくすることができます。 

バーンアップレポートをカスタマイズできます。詳細については、「Essential SAFe ダッシュボードレポートのカスタマイズ」を参照してください。


SAFe エピックダッシュボード

SAFe エピックダッシュボードでは、特定の期間でエピックの機能がどのように進行しているかを視覚化することができます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[エピックサマリー] タブ

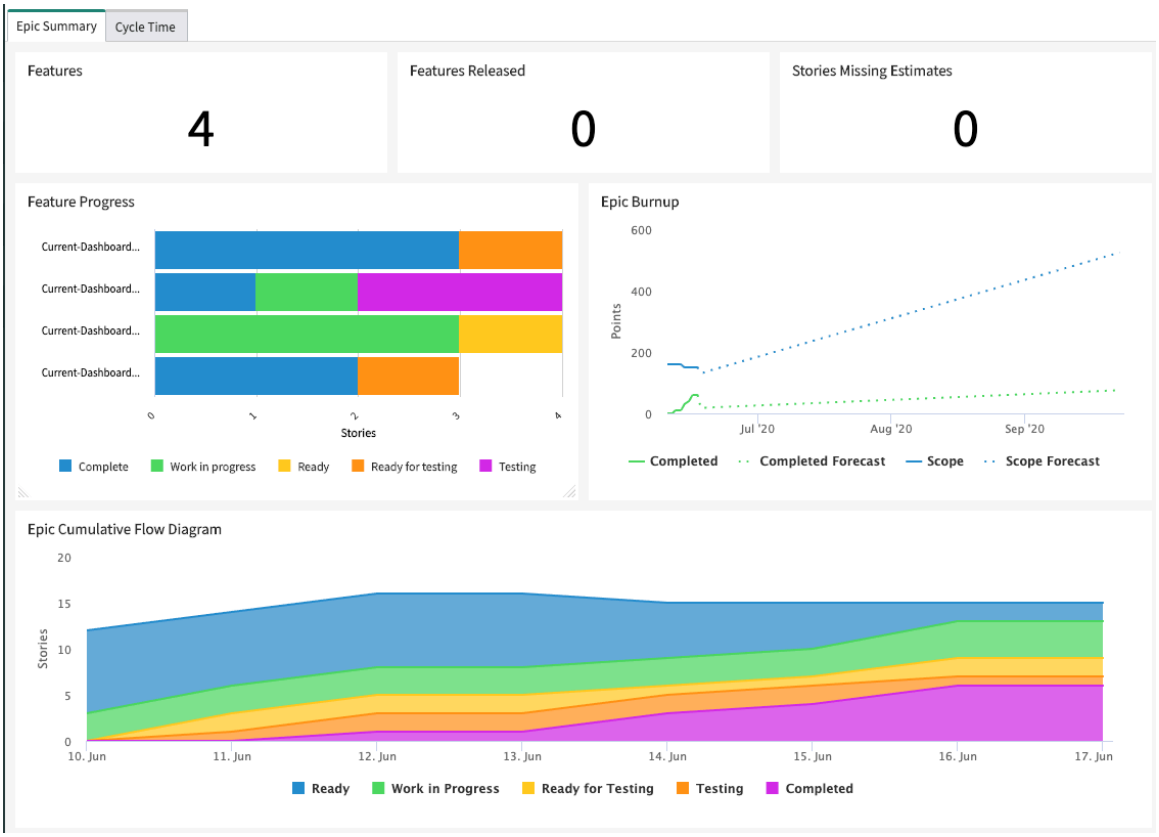

[サイクル時間] タブ

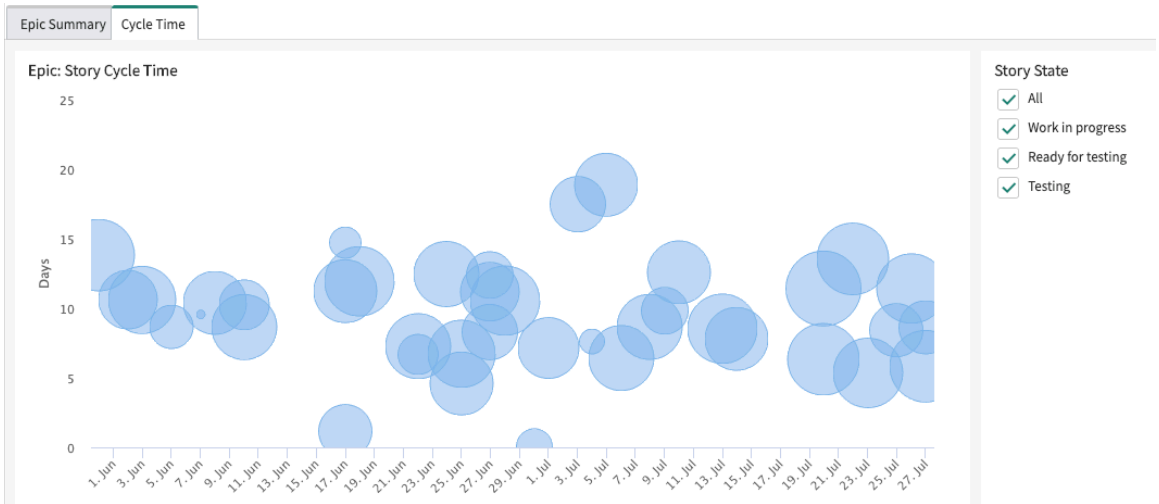

SAFe エピックダッシュボードでは、完了した機能の合計数、推定値が欠落しているストーリーの数などが表示されます。また、ART メンバーがエピックの機能を完了するペースも示します。

エンドユーザーとロール

必要なロールを持つエンドユーザー目標

エンドユーザーと目標	必要なロール
SAFe ART ユーザー：エピックのすべての機能の進捗状況を示します。	safe_scrum_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

インジケーター

SAFe：エピック内のすべてのストーリーのストーリーポイントの合計

エピックバーンアップレポートにスコープ系列を生成します。

SAFe：エピック内の完了したストーリーのストーリーポイントの合計

エピックバーンアップレポートに完了した系列を生成します。この系列は、エピック内の完了済みの作業量を示します。

SAFe：現在のエピックのすべてのストーリーの数

現在のエピックのストーリー数をステータス別に示す、バブルチャートのデータ系列のエピック累積フロー図レポートを生成します。

ブレークダウン

- SAFe：エピック
- SAFe：ステータス

ウィジェット

特徴

エピックの合計機能数を示します。

リリースされた機能

エピック内で完了した機能数を示します。

推定値が欠落するストーリー

推定値が欠落しているエピック内のストーリー数を示します。

データの可視化

バージョン 1.0.2 以前の Essential SAFe のパフォーマンスアンリティクスコンテンツパックからアップグレードする場合は、ソリューションライブラリからこのダッシュボードをインストールしてレイアウトをアップグレードし、次の可視化にアクセスします。

- エピックバーンアップ
- エピック累積フロー図
- ストーリーのサイクル時間

詳細については、「Solution Library for Essential SAFe ダッシュボードの使用」を参照してください。



エピックサマリー

タイトル	タイプ	説明
機能の進捗状況	水平棒グラフ	エピックのすべての機能の進捗状況を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エピックサマリー (続く)

タイトル	タイプ	説明
		
エピックバーンアップ	線グラフ 	エピックバーンアップの傾向を表示します。エピックがいつ完了す ます。 エピックバーンアップレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示 とができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：エピックのサイズを示します。 • スコープ予測：履歴データに基づいて、将来の日付のスコープ変 測します。 • 完了：エピック内の完了した作業量を示します。 • 完了予測：将来の日付のバーンアップを予測します。エピックを 了できるかどうかを示します。この予測は履歴データに基づいて **注:** 完了した予測データ系列がスコープ予測データ系列と交差する り、エピックがいつ完了するかが予測されます。完了した予測 予測系列がどこまでも交差しないように見える場合は、作業の スコープが追加されていることを示してるので、注意が必要で
エピック累積フロー図	面グラフ 	実際の開始日から終了日まで、エピックの全ストーリーの進行状況 各ステータスのストーリーの数を、ステータスの開始時間、ステー 間、およびステータスの終了時間により示します。 エピック累積フロー図は、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替 る次のバブルチャートから構成されています。 • 準備完了：作業を開始する準備が完了しているエピックのストー す。 • 対応中：開発中のエピックのストーリー数を示します。 • テストの準備完了：テストする準備が完了しているエピックのス します。 • テスト：現在テスト中のエピックのストーリー数を示します。 • 完了：完了したストーリー数を示します。 **注:** 「準備完了」ステータスおよび「キャンセル」ステータスのス のレポートには含まれません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


サイクル時間

タイトル	タイプ	説明
ストーリーのサイクル時間	バブル チャート 	エピックの各ストーリーのステータスが「進行中」から「完了」に変わるまでにかかった時間を示します。 グラフ内の各バブルはストーリーを表しています。バブルの x 軸からの高さは、ストーリーが「進行中」ステータスから「完了済み」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。ストーリーバブルの大きさは、ストーリーポイントに基づき、相対的なものです。 バブルの上にマウスカーソルを合わせると、該当するストーリーに関する次の詳細が表示されます。 • ストーリーポイント • ストーリーが「完了」に移行した日付 • ストーリーの合計サイクル時間 (日数) • ストーリーが [対応中] ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト準備完了」ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト中」ステータスであった日数 レポートの右側にある [ストーリーのステータス] セクションから、レポートをフィルタリングして、選択した状況のストーリーのサイクル時間を表示できます。グラフには、各ストーリーのサイクル時間が、選択したステータスのすべての期間の累積合計として表示されます。 レポートのチャートのいずれかの領域で、ストーリーが多すぎてバブルが密集しているように見える場合は、レポートの特定の領域を拡大して見やすくすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サイクル時間 (続く)

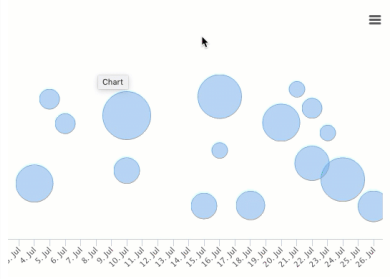
タイトル	タイプ	説明
		

バーンアップおよび累積フロー図のレポートをカスタマイズできます。詳細については、「Essential SAFe ダッシュボードレポートのカスタマイズ」を参照してください。

SAFe スプリントダッシュボード

SAFe スプリントダッシュボードを使用して、現在のスプリントで SAFe ストーリーの進行状況を追跡し、スプリントの完了を予測します。


[SAFe スプリントダッシュボード] ウィジェット

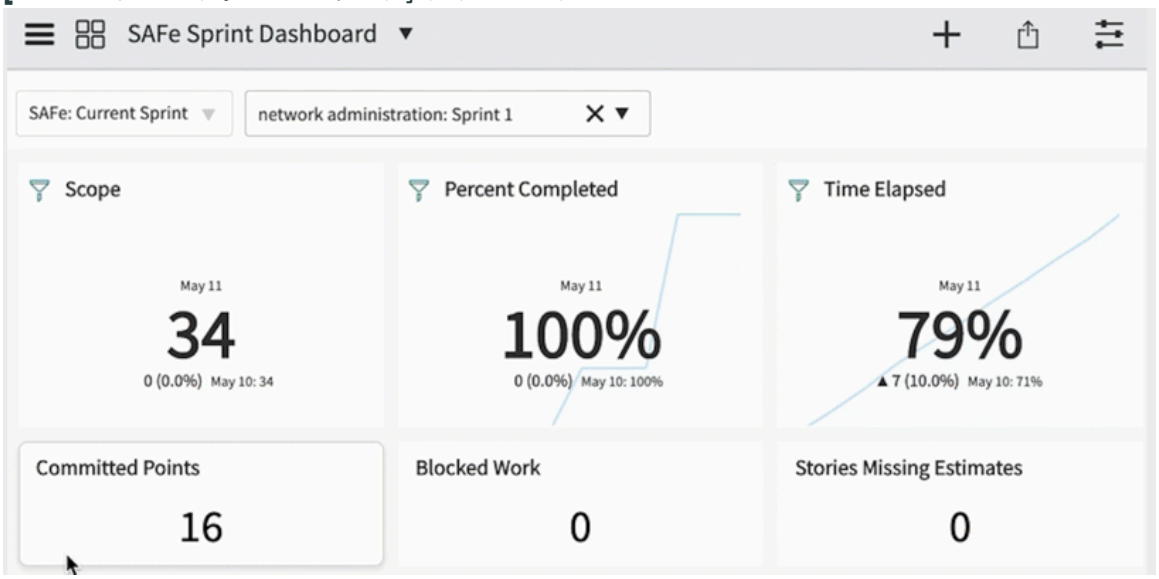


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


SAFe スプリントダッシュボードバーンダウンレポート

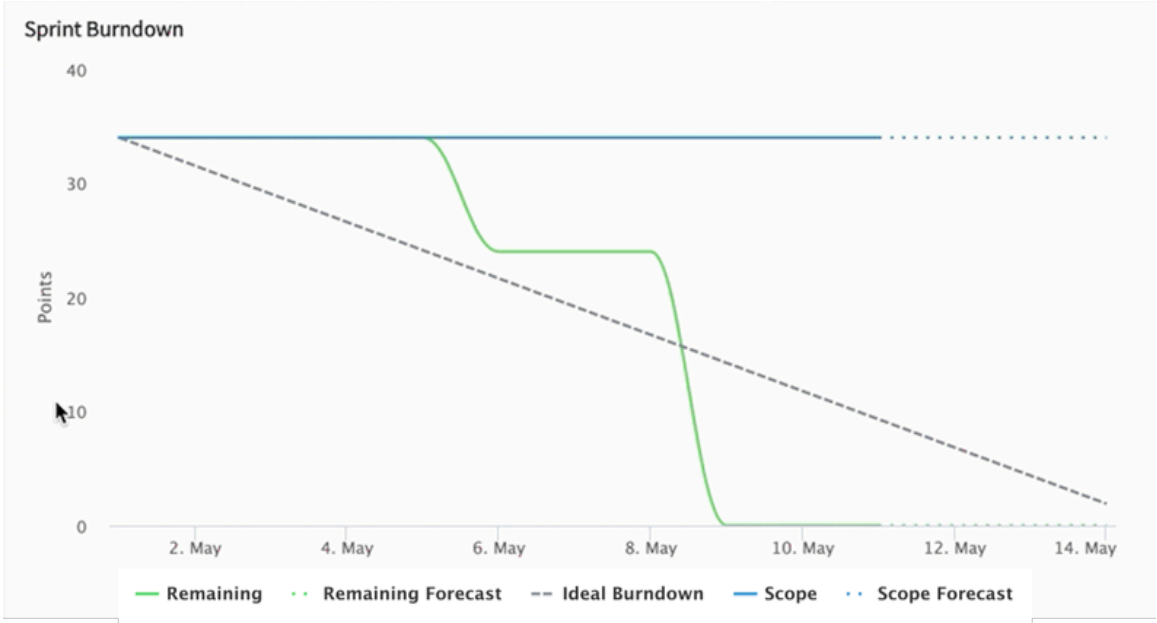

SAFe スプリントダッシュボードバーンアップレポート

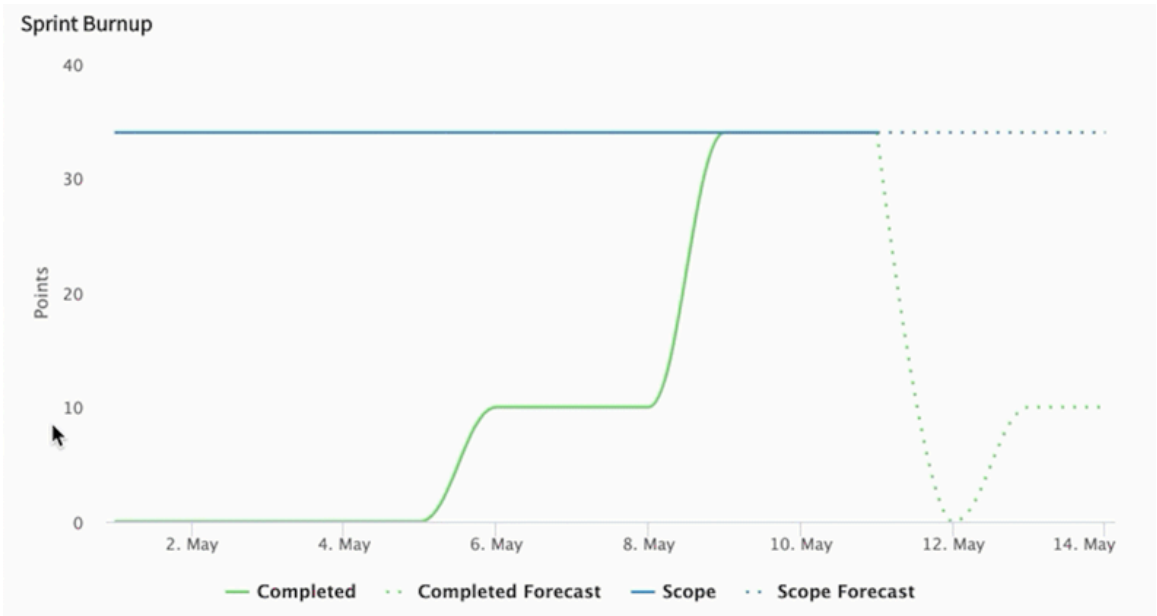

SAFe スプリントダッシュボードの累積フロー図

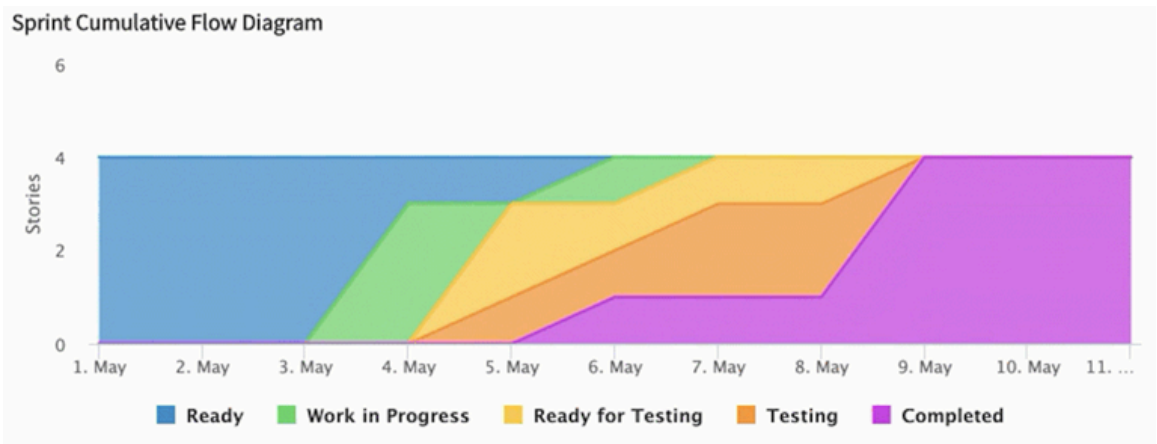

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ダッシュボード：

- 完了した作業の割合、経過時間、推定が欠落しているストーリーの合計数など、スプリントの重要な詳細を表示します。
- 現在のステータスのスプリントのストーリー数とその進行状況が表示されます。
- スコープの変更がある場合はその変更と、そうしたスコープの変更の傾向を示します。
- チームがスプリントの目標を達成するためにストーリーを進捗させる方法を示します。
- スプリントが予定通りに完了する可能性を示す予測データ。

注:
キャンセルされたストーリーは、このデータのいずれにも含まれません。

エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール	利点
SAFe スクラムマスター：スプリントバーンダウンの傾向をレビューします。ボトルネックを解消し、スプリントを時間どおりに完了するためのターゲットを設定します。	safe_scrum_user	• スプリントのスコープの変更を分析します • スプリントのストーリーの現在のステータスを表示し、各状況にある時間を分析します • スプリントの完了日を推定します

インジケーター

SAFe：現在のスプリントのすべてのストーリーのストーリーポイントの合計

スプリントバーンダウンレポートでスコープ系列を生成します。スコープ系列は、スプリントに計画されている作業量 (ストーリーポイント) を示します。

SAFe：現在のスプリントのアクティブストーリーのストーリーポイントの合計

スプリントバーンダウンレポートで実際のバーンダウン系列を生成します。実際のバーンダウン系列は、完了までに残る作業量 (ストーリーポイント) を示します。

SAFe：現在のスプリントの完了したストーリーのストーリーポイントの合計

現在のスプリントで完了したストーリーのパーセンテージを算出します。

SAFe：スプリントでの経過時間

[経過時間] ウィジェットに表示される時間を計算します。

SAFe：現在のスプリントのストーリー数

スプリント累積フロー図レポートにバブルチャートの系列を生成します。現在のスプリントのストーリー数を示します。

ブレークダウン

- SAFe：スプリント
- SAFe：現在のスプリント
- SAFe：ステータス

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ウィジェット

スコープ

スプリントに計画されている作業量 (ストーリーポイント) を示します。このウィジェットを使用すると、スプリントの目標を達成するために完了する必要がある作業量を一目で確認できます。また、スプリントに計画されたストーリーの詳細にドリルダウンすることもできます。

完了率

ストーリーポイントを使用して、スプリントで完了した作業の割合を示します。このウィジェットを使用すると、スプリントで完了済みの作業量を一目で確認できます。これらのウィジェットでは、隣接する [経過時間] ウィジェットと併用して、スケジュールどおりにスプリントの目標を達成できる速度で作業を完了しているかどうかを簡単に確認できます。

経過時間

スプリントの開始日から終了予定日までの経過時間の割合を示します。これらのウィジェットでは、隣接する [完了率] ウィジェットと併用して、スケジュールどおりにスプリントの目標を達成できる速度で作業を完了しているかどうかを簡単に確認できます。

コミットポイント

スプリントのコミット済みスコープ (ストーリーポイント数) を示します。これらのウィジェットでは、隣接する [スコープ] ウィジェットとともに使用して、スプリントの開始時にコミットされたスコープと、スプリントの現在のスコープの相違を確認できます。

> **注:**
> このウィジェットはデフォルトで表示されません。レポートからダッシュボードに追加できます。詳細については、「レスポンシブダッシュボードの編集」を参照してください。

ブロックされた作業

ブロックされたスプリントの作業量 (ストーリーポイント単位) を示します。

推定値が欠落するストーリー

推定値が欠落しているスプリント内のストーリーの合計数を示します。このダッシュボードの他のインジケーター、ウィジェット、およびレポートの推定値を活用する必要があります。

> **注:**
> ストーリーを推定しない場合は、[ストーリーポイント] フィールドに「1」を入力します。他のインジケーター、ウィジェット、およびレポートは、カウントごとに効果的に機能します。

データの可視化


バージョン 1.0.2 以前の Essential SAFe のパフォーマンスアンリティクスコンテンツパックからアップグレードする場合は、ソリューションライブラリからこのダッシュボードをインストールしてレイアウトをアップグレードし、次の可視化にアクセスします。

- スプリントバーンアップ
- スプリント累積フロー図

自動翻訳



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細については、「Solution Library for Essential SAFe ダッシュボードの使用」を参照してください。

タイトル	タイプ	説明
スプリントバーンダウン	線グラフ 	スコープの変更がある場合はその変更と、そうしたスコープの変更の傾向を示します。作業の理想的なペース、残る作業量、およびスプリントの終了前にスコープが完了する可能性があるかどうかを示します。スプリントバーンダウンレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：スプリントに現在計画されている作業量を示します。スプリントの開始後にストーリーがスプリントに追加されたり、スプリントから削除されたりすると、この値は変化する可能性があります。 • スコープ予測：現在のスプリントの変更履歴に基づいて、将来の日付のスコープ変更の可能性を予測します。 • 理想的なバーンダウン：チームがスプリントを時間どおりに完了するためにストーリーをどのように進捗させる必要があるかを示します。 • 残り：スプリントの完了までに残る作業量を示します。 実際のバーンダウン (残り) が理想的なバーンダウンを上回っている場合は、当初の予定よりも多くの作業が残っていることを意味します。チームの進行は、スプリントのスケジュールより遅れています。実際のバーンダウン (残り) が理想的なバーンダウンを下回っている場合は、当初の予定よりも多くの作業が残っていることを意味します。チームの進行は、スプリントのスケジュールより進んでいます。 • 残りの予測：現在のスプリントの変更履歴に基づいて、将来の日付のバーンダウンを予測します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

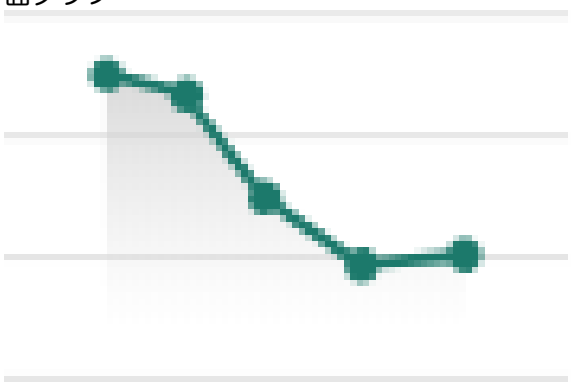タイトル	タイプ	説明
スプリントバーンアップ	線グラフ 	スコープの変更を示すスプリントバーンアップの傾向を示します。スコープの将来の変更と作業完了の傾向を予測します。 スプリントバーンアップレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：スプリントに計画されている作業量を示します。 • スコープ予測：履歴データに基づいて、将来の日付のスコープ変更の可能性を予測します。 • 完了：スプリント内の完了した作業量を示します。 • 完了予測：将来の日付のバーンアップを予測します。スプリントを時間どおりに完了できるかどうかを示します。この予測は履歴データに基づいています。
スプリント累積フロー図	面グラフ 	実際の開始日から終了日まで、スプリントの全ストーリーの進行状況を監視します。 各ステータスのストーリーの数を、ステータスの開始時間、ステータスでの経過時間、およびステータスの終了時間により示します。 スプリント累積フロー図は、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のバブルチャートから構成されています。 • 準備完了：作業を開始する準備が完了しているスプリントのストーリー数を示します。 • 対応中：開発中のスプリントのストーリー数を示します。 • テストの準備完了：テストする準備が完了しているスプリントのストーリー数を示します。 • テスト：現在テスト中のスプリントのストーリー数を示します。 • 完了：完了したスプリントのストーリー数を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


タイトル	タイプ	説明
		注: 「準備完了」状況および「キャンセル」状況のストーリーは、このレポートには含まれません。

バーンアップ、バーンダウン、および累積フロー図のレポートをカスタマイズできます。詳細については、「Essential SAFe ダッシュボードレポートのカスタマイズ」を参照してください。

SAFe 先行スプリントダッシュボード

SAFe 先行スプリントダッシュボードでは、スコープ、実際のバーンアップとバーンダウン、および以前のスプリントの予測傾向に関するデータを視覚化できます。データを分析し、今後のスプリントの作業を計画します。

[SAFe 以前のスプリントダッシュボード] ウィジェット

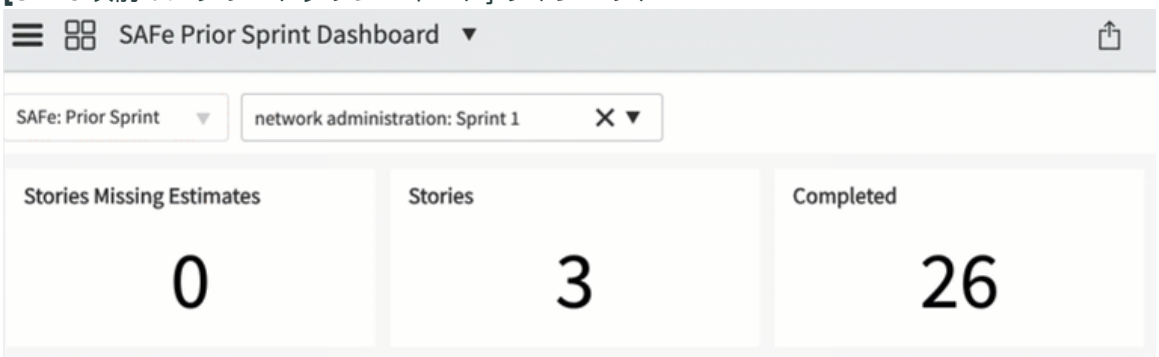

SAFe 以前のスプリントダッシュボードバーンダウンレポート



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAFe 以前のスプリントダッシュボードバーンアップレポート



注:
キャンセルされたストーリーは、このデータのいずれにも含まれません。

エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール	利点
SAFe スクラムマスター：スコープ、実際のバーンアップとバーンダウンに関するデータを分析し、以前のスプリントの傾向を予測します。	safe_scrum_user	• スプリントのバーンアップとバーンダウンの傾向を分析できます • 今後のスプリントの計画にデータを利用できます

インジケーター

SAFe：現在のスプリントのすべてのストーリーのストーリーポイントの合計

SAFe スプリントバーンダウンレポートでスコープ系列を生成します。

SAFe：現在のスプリントのアクティブストーリーのストーリーポイントの合計

SAFe スプリントバーンダウンレポートで実際のバーンダウン系列を生成します。

ブレークダウン

- SAFe：スプリント
- SAFe：以前のスプリント

ウィジェット

コミットポイント

スプリントのコミット済みスコープ (ストーリーポイント数) を示します。

ストーリー

以前のスプリントで完了したストーリーの合計数を示します。

完了

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳


以前のスプリントで完了した作業量 (ストーリーポイント単位) を示します。

推定値が欠落するストーリー

推定値が欠落している以前のスプリント内のストーリーの合計数を示します。


データの可視化

バージョン 1.0.2 以前の Essential SAFe のパフォーマンスアンリティクスコンテンツパックからアップグレードする場合は、ソリューションライブラリからこのダッシュボードをインストールしてレイアウトをアップグレードし、スプリントバーンアップレポートにアクセスします。詳細については、「Solution Library for Essential SAFe ダッシュボードの使用」を参照してください。

タイトル	タイプ	説明
スプリントバーンダウン	線グラフ 	スコープとスコープの変更率、作業の理想的な完了率、および実際の作業完了率を表示します。バーンダウンの傾向を分析し、それに応じて今後のスプリントの作業負荷を計画します。 スプリントバーンダウンレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：スプリントに計画されている作業量を示します。 • 理想的なバーンダウン：チームがスプリントを時間どおりに完了するためにストーリーをどのように進捗させる必要があるかを示します。 • 残り：スプリントの完了までに残る作業量を示します。 残りが理想的なバーンダウンを上回っている場合は、当初の予定よりも多くの作業が残っていることを意味します。チームの進行は、スプリントのスケジュールより遅れています。 残りが理想的なバーンダウンを下回っている場合は、当初の予定よりも少ない作業が残っていることを意味します。チームの進行は、スプリントのスケジュールより進んでいます。 バーンダウンの傾向を分析し、それに応じて今後のスプリントの作業負荷を計画します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
スプリントバーンアップ	線グラフ 	スコープの変更を示す以前のスプリントバーンアップの傾向を示します。チームの完了作業の傾向について、将来の変化を分析します。 スプリントバーンアップレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：スプリントに計画されている作業量を示します。 • 完了：スプリント内の完了した作業量を示します。

バーンアップおよびバーンダウンのレポートをカスタマイズできます。詳細については、「Essential SAFe ダッシュボードレポートのカスタマイズ」を参照してください。


SAFe PI ダッシュボード

SAFe PI ダッシュボードを使用すると、現在のプログラムインクリメント (PI) における機能の進捗状況を追跡できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


[PI サマリー] タブ

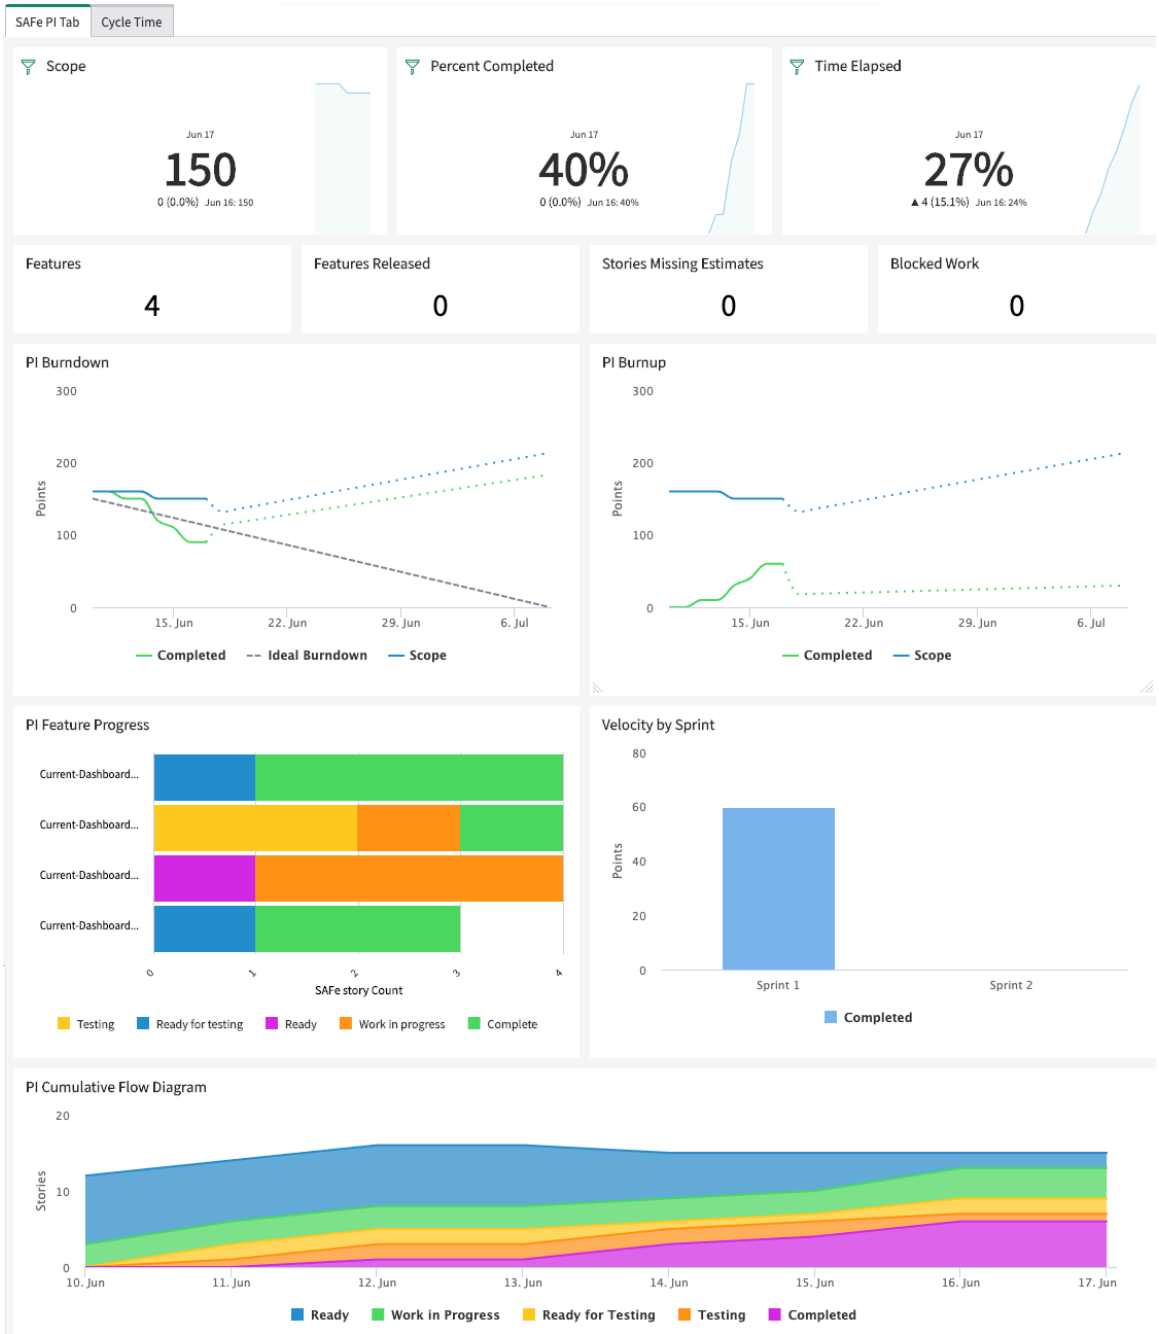

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[サイクル時間] タブ

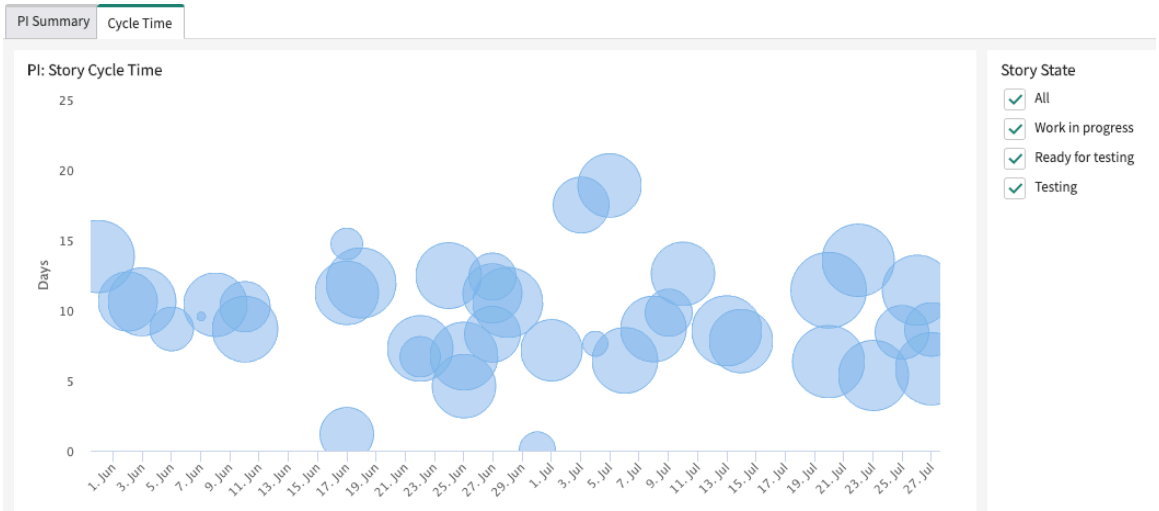

SAFe PI ダッシュボードには、次の詳細が表示されます。

- 完了した作業の割合、経過時間、推定が欠落しているストーリーの合計数など、PI の重要な詳細を表示します。
- 現在のステータスの PI のストーリー数とその進行状況が表示されます。
- スコープの変更がある場合はその変更と、そうしたスコープの変更の傾向を示します。
- ART メンバーが PI に対して計画されている機能を完了するペースを示します。
- PI が予定通りに完了する可能性を示す予測データ。
- PI のストーリーが進行中ステータスから完了済みステータスになるまでの経過時間を表示します。

エンドユーザーとロール

必要なロールを持つエンドユーザー目標

エンドユーザーと目標	必要なロール
SAFe ART ユーザー：PI に対して計画されているストーリーの進行状況を追跡します。ボトルネックを解消し、PI を時間どおりに完了するためのターゲットを設定します。	safe_scrum_user

インジケーター

SAFe：現在の PI のすべてのストーリーの数

現在の PI のストーリー数をステータス別に示す、バブルチャートのデータ系列の PI 累積フロー図レポートを生成します。

SAFe：現在の PI のすべてのストーリーのストーリーポイントの合計

PI バーンダウンレポートでスコープ系列を生成します。この系列は、PI に計画されている作業量 (ストーリーポイント) を示します。

SAFe：現在の PI の完了したストーリーのストーリーポイントの合計

PI バーンダウンレポートに実際のバーンダウン系列を生成し、PI バーンアップレポートに完了済みの系列を生成します。この系列は、PI について完了済みの作業量 (ストーリーポイント) を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAFe：現在の PI のアクティブストーリーのストーリーポイントの合計

PI バーンダウンレポートおよび PI バーンアップレポートでスコープ系列を生成します。スコープ系列は、PI に計画されている作業量 (ストーリーポイント) を示します。

SAFe：PI での経過時間

[経過時間] ウィジェットに表示される時間を計算します。

ブレークダウン

- SAFe：PI
- SAFe：ステータス

ウィジェット

スコープ

PI に計画されている作業量 (ストーリーポイント) を示します。このウィジェットを使用すると、PI の目標を達成するために完了する必要がある作業量を一目で確認できます。また、PI での完了を計画されたストーリーの詳細にドリルダウンすることもできます。

完了率

ストーリーポイントを使用して、PI で完了した作業の割合を示します。このウィジェットを使用すると、PI で完了済みの作業量を一目で確認できます。これらのウィジェットでは、隣接する [経過時間] ウィジェットと併用して、スケジュールどおりに PI の目標を達成できる速度で作業を完了しているかどうかを簡単に確認できます。

経過時間

PI の開始日から終了予定日までの経過時間の割合を示します。これらのウィジェットでは、隣接する [完了率] ウィジェットと併用して、スケジュールどおりに PI の目標を達成できる速度で作業を完了しているかどうかを簡単に確認できます。

特徴

PI で完了する予定の機能の合計数を示します。

リリースされた機能

PI 内で完了した機能の合計数を示します。

推定値が欠落するストーリー

推定値が欠落している PI 内のストーリーの合計数を示します。このダッシュボードの他のインジケーター、ウィジェット、およびレポートの推定値を活用する必要があります。

> **注:**
> ストーリーを推定しない場合は、[ストーリーポイント] フィールドに「1」を入力します。他のインジケーター、ウィジェット、およびレポートは、カウントごとに効果的に機能します。

ブロックされた作業

ブロックされた PI の作業量 (ストーリーポイント単位) を示します。

データの可視化

バージョン 1.0.2 以前の Essential SAFe のパフォーマンスアンリティクスコンテンツパックからアップグレードする場合は、ソリューションライブラリからこのダッシュボードをインストールしてレイアウトをアップグレードし、次の可視化にアクセスします。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- PI 累積フロー図
- ストーリーのサイクル時間


詳細については、「Solution Library for Essential SAFe ダッシュボードの使用」を参照してください。

SAFe PI サマリー

タイトル	タイプ	説明
PI バーンダウン	線グラフ 	スコープの変更がある場合はその変更と、そうしたスコープの変更の作業の理想的なペース、残る作業量、および PI の終了前にスコープ性があるかどうかを示します。PI バーンダウンレポートは、環境設定示/表示を切り替えることができる次のデータ系列から構成されてい • スコープ：PI に計画されている作業量を示します。 • スコープ予測：PI 内の将来の日付のスコープ変更の可能性を予測は履歴データに基づいています。 • 理想的なバーンダウン：ART メンバーが PI を時間どおりに提供リーをどのように進捗させる必要があるかを示します。 • 残り：PI で完了した作業量を示します。 • 残りの予測：リリース内の将来の日付のバーンダウンを予測します時間どおりに提供できるかどうかを示すものです。
PI バーンアップ	線グラフ 	バーンアップの傾向を分析し、PI 作業がいつ完了する可能性があるす。PI バーンアップレポートは、環境設定に基づいて非表示/表示をできる次のデータ系列から構成されています。 • スコープ：PI に計画されている作業量を示します。 • スコープ予測：将来の日付のスコープ変更の可能性を予測します。データに基づいています。 • 完了：PI 内の完了した作業量を示します。 • 完了予測：PI 内の将来の日付のバーンアップを予測します。PI をできるかどうかを示します。 **注:** 完了した予測データ系列がスコープ予測データ系列と交差するり、PI がいつ完了するかが予測されます。完了した予測系列とがどこまでも交差しないように見える場合は、作業の完了よりも追加されていることを示してるので、注意が必要です。
PI 機能の進捗状況	水平棒グラフ 	ステータス別に分けられたストーリーの数を表示して、PI のすべてを分析します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAFe PI サマリー (続く)

タイトル	タイプ	説明
スプリント別の速度	棒グラフ 	PI 全体の ART メンバーの速度を表示します。ART メンバーがスプリ 定した予測可能な速度を達成し、コミットメントを満たしているかど す。
PI 累積フロー図	面グラフ 	実際の開始日から終了日まで、PI のすべてのストーリーの進行状況を 各ステータスのストーリーの数を、ステータスの開始時間、ステータ およびステータスの終了時間により示します。 PI 累積フロー図は、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えるこ ブルチャートから構成されています。 • 準備完了：作業を開始する準備が完了している PI のストーリー数 • 対応中：開発中の PI のストーリー数を示します。 • テストの準備完了：テストする準備が完了している PI のストーリ • テスト：現在テスト中の PI のストーリー数を示します。 • 完了：完了したストーリー数を示します。 **注:** 「準備完了」ステータスおよび「キャンセル」ステータスのスト レポートには含まれません。


サイクル時間

タイトル	タイプ	説明
ストーリーのサイクル時間	バブル チャート 	PI の各ストーリーが「進行中」ステータスから「完了」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。 グラフ内の各バブルはストーリーを表しています。バブルの x 軸からの高さは、ストーリーが「進行中」ステータスから「完了済み」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。ストーリーバブルの大きさは、ストーリーポイントに基づき、相対的なものです。 バブルの上にマウスカーソルを合わせると、該当するストーリーに関する次の詳細が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サイクル時間 (続く)

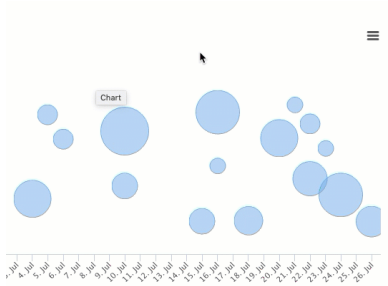タイトル	タイプ	説明
		• ストーリーポイント • ストーリーが「完了」に移行した日付 • ストーリーの合計サイクル時間 (日数) • ストーリーが [対応中] ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト準備完了」ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト中」ステータスであった日数 レポートの右側にある [ストーリーのステータス] セクションから、レポートをフィルタリングして、選択した状況のストーリーのサイクル時間を表示できます。グラフには、各ストーリーのサイクル時間が、選択した状況のすべての期間の累積合計として表示されます。 レポートのチャートのいずれかの領域で、ストーリーが多すぎてバブルが密集しているように見える場合は、レポートの特定の領域を拡大して見やすくすることができます。 

バーンアップ、バーンダウン、および累積フロー図のレポートをカスタマイズできます。詳細については、「Essential SAFe ダッシュボードレポートのカスタマイズ」を参照してください。


SAFe 先行 PI ダッシュボード

SAFe 先行 PI ダッシュボードでは、スコープ、実際のバーンダウン、および以前のプログラムインクリメントの予測傾向に関するデータを視覚化できます。データを分析して、今後の PI の作業を計画します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[SAFe 以前の PI ダッシュボード] ウィジェット

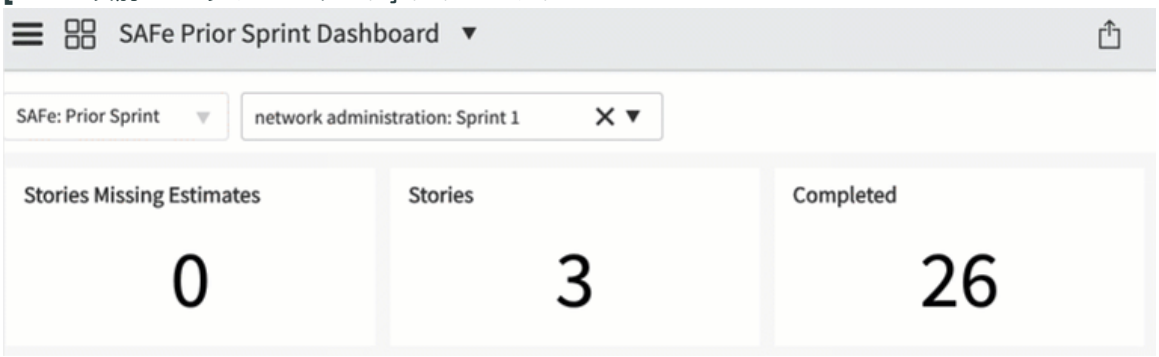

SAFe 以前の PI バーンアップレポート

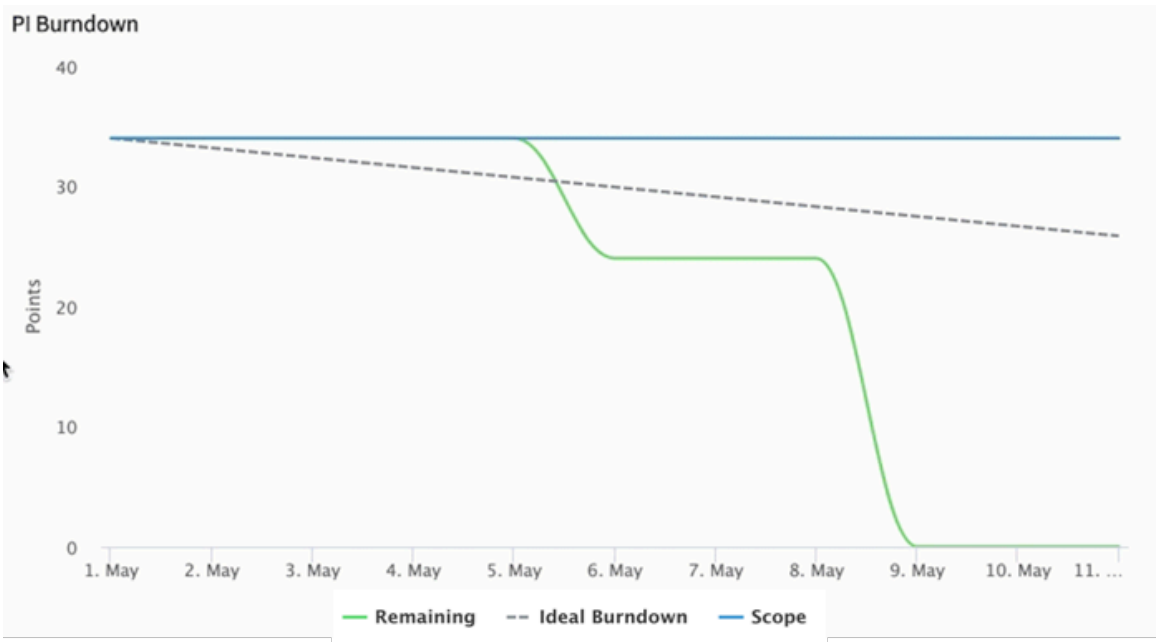

SAFe 以前の PI バーンアップレポート



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エンドユーザーとロール

エンドユーザーと目標	必要なロール
SAFe ART ユーザー：以前のプログラムインクリメントのスコープ、バーンダウン、および予測傾向を分析します。	safe_scrum_user

インジケーター

SAFe：アクティブな PI の完了したストーリーのストーリーポイントの合計

PI バーンダウンレポートに実際のバーンダウン系列を生成し、PI バーンアップレポートに完了済みの系列を生成します。

SAFe：アクティブな PI 内のすべてのストーリーのストーリーポイントの合計

PI バーンダウンレポートおよび PI バーンアップレポートでスコープ系列を生成します。

ブレークダウン

SAFe：以前の PI。

ウィジェット

特徴

以前の PI で完了する予定だった機能の合計数を示します。


完了

以前の PI で完了した機能の合計数を示します。

推定値が欠落するストーリー



推定値が欠落している以前の PI 内のストーリーの合計数を示します。

データの可視化

タイトル	タイプ	説明
PI バーンアップ	線グラフ 	以前の PI のバーンアップ傾向を分析します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

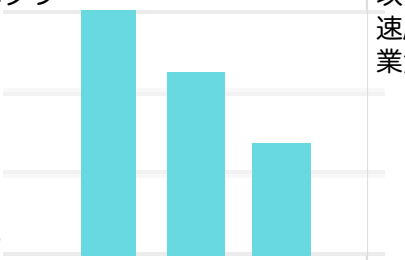
タイトル	タイプ	説明
PI バーンダウン	線グラフ 	スコープとスコープの変更率、作業の理想的な完了率、および実際の作業完了率を表示します。バーンダウンの傾向を分析し、それに応じて今後の PI の作業負荷を計画します。
PI 速度チャート	棒グラフ 	以前の PI の ART メンバーの速度を表示し、今後の PI の作業負荷を計画します。

バーンアップおよびバーンダウンのレポートをカスタマイズできます。詳細については、「Essential SAFe ダッシュボードレポートのカスタマイズ」を参照してください。

SAFe ART ダッシュボード

SAFeART ダッシュボードを使用して、特定の期間における機能とプログラムインクリメント (PI) に対する ART メンバーの進捗状況を視覚化します。ART メンバーの全体的な速度、PI 目標に対する ART の過去のパフォーマンスに関するインサイトを得て、それに応じて今後のプログラムインクリメントの作業を計画できます。


[ART サマリー] タブ

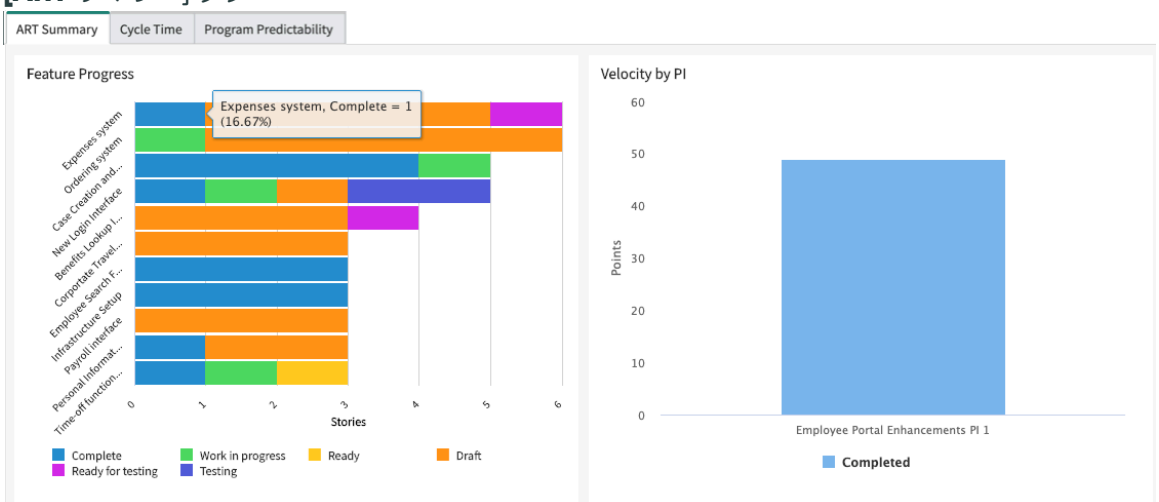


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[サイクル時間] タブ

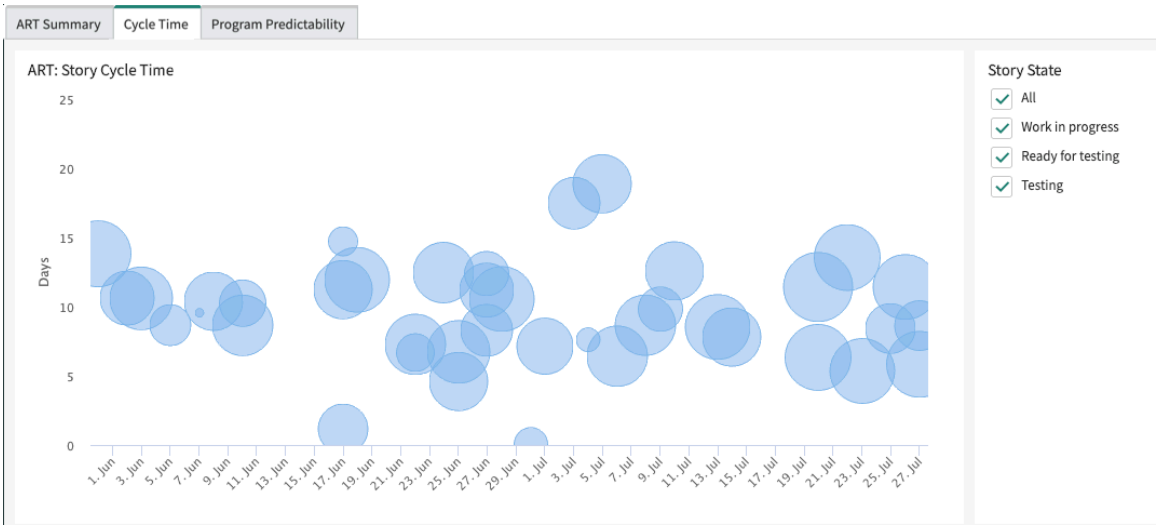

[プログラムの予測可能性] タブ

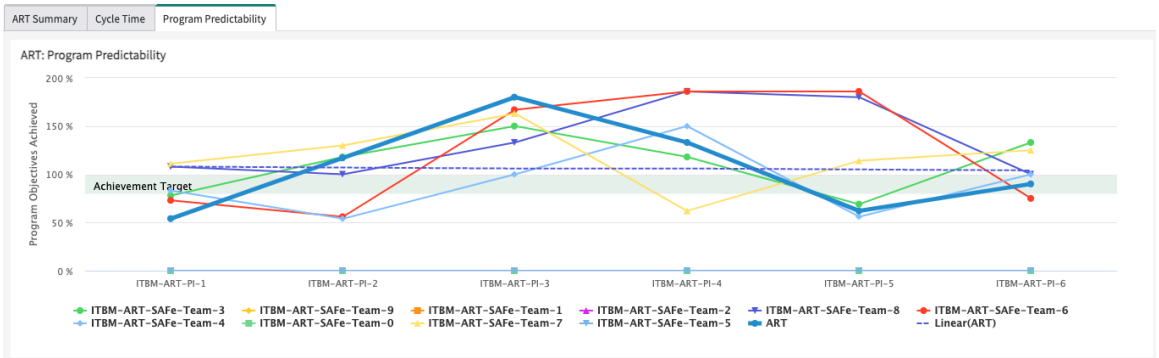

エンドユーザーとロール

必要なロールを持つエンドユーザー目標

エンドユーザーと目標	必要なロール
SAFe ART ユーザー：ART メンバーが機能と PI をどのように進捗しているかを表示します。	safe_scrum_user

データの可視化

バージョン 1.0.2 以前の Essential SAFe のパフォーマンスアンリティクスくらコンテンツパックからアップグレードする場合は、ソリューションライブラリからこのダッシュボードをインストールしてレイアウトをアップグレードし、次のストーリーサイクル時間レポートにアクセスします。詳細については、「Solution Library for Essential SAFe ダッシュボードの使用」を参照してください。



ART サマリー

タイトル	タイプ	説明
機能の進捗状況	水平棒グラフ	ART メンバーが作業しているすべての機能の進捗状況を表示します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ART サマリー (続く)

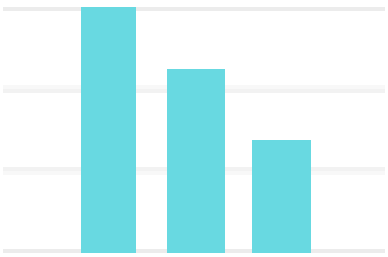タイトル	タイプ	説明
		
PI 別速度	棒グラフ 	さまざまな PI の ART の速度を表示します。ART が安定した予測可能な速度を達成しているかどうかを把握します。


サイクル時間


タイトル	タイプ	説明
ストーリーのサイクル時間	バブル チャート 	ART の各ストーリーが「進行中」ステータスから「完了」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。 グラフ内の各バブルはストーリーを表しています。バブルの x 軸からの高さは、ストーリーが「進行中」ステータスから「完了済み」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。ストーリーバブルの大きさは、ストーリーポイントに基づき、相対的なものです。 バブルの上にマウスカーソルを合わせると、該当するストーリーに関する次の詳細が表示されます。 • ストーリーポイント • ストーリーが「完了」に移行した日付 • ストーリーの合計サイクル時間 (日数) • ストーリーが [対応中] ステータスであった日数

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サイクル時間 (続く)

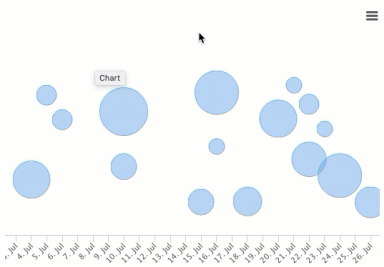タイトル	タイプ	説明
		• ストーリーが「テスト準備完了」ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト中」ステータスであった日数 レポートの右側にある [ストーリーのステータス] セクションから、レポートをフィルタリングして、選択した状況のストーリーのサイクル時間を表示できます。グラフには、各ストーリーのサイクル時間が、選択した状況のすべての期間の累積合計として表示されます。 レポートのチャートのいずれかの領域で、ストーリーが多すぎてバブルが密集しているように見える場合は、レポートの特定の領域を拡大して見やすくすることができます。 

タイトル	タイプ	説明
ART：プログラムの予測可能性	線グラフ 	PI 目標達成に関する ART の過去のパフォーマンスを追跡します。 このレポートの系列では、ART 全体のパフォーマンスに加えて、ART の各チームのパフォーマンスも示します。 横軸は完了した PI を示し、縦軸は達成されたビジネス価値の範囲をパーセンテージ (%) で示します。 各系列は達成されたビジネス価値を表し、PI 目標の計画ビジネス価値および実績ビジネス価値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
		から計算されます。詳細については、「SAFe PI 目標」を参照してください。 グラフから、設定された PI 目標を 80% から 100% の間で一貫して達成しているチームを確認できます。これは SAFe に基づく理想的な範囲です。 チャート上の直線 (ART) の点線の系列は、ART で達成されたビジネス価値に関する線形回帰を示します。この系列は、達成されたビジネス価値のスコアがどのような傾向にあるかを示すものです。 系列のいずれかのデータポイントにマウスカーソルを合わせると、達成したビジネス価値の数値が表示されます。 • ART 系列の PI のデータポイントのいずれかをクリックすると、ドリルダウンされ、クリックした PI のグラフのプロットに使用される PI 目標のリストが表示されます。 [タイプ] 列を [プログラム] に設定してリストをフィルタリングすると、ART に対する PI 目標のみが表示されます。 • チーム系列の PI のデータポイントのいずれかをクリックすると、ドリルダウンされ、クリックした PI のグラフのプロットに使用される PI 目標のリストが表示されます。 このリストに表示されている目標は、選択したチームに対するもののみです。


SAFe チームダッシュボード

特定の期間におけるストーリーに対するチームの進捗状況を視覚的に分析します。チームの全体的な速度に関するインサイトを得て、今後のスプリントとプログラムインクリメント (PI) に対するチームのキャパシティを計画するのに役立ちます。さらに、すべてのチームメンバーの詳細を確認することもできます。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[作業アイテムの進捗状況] タブ

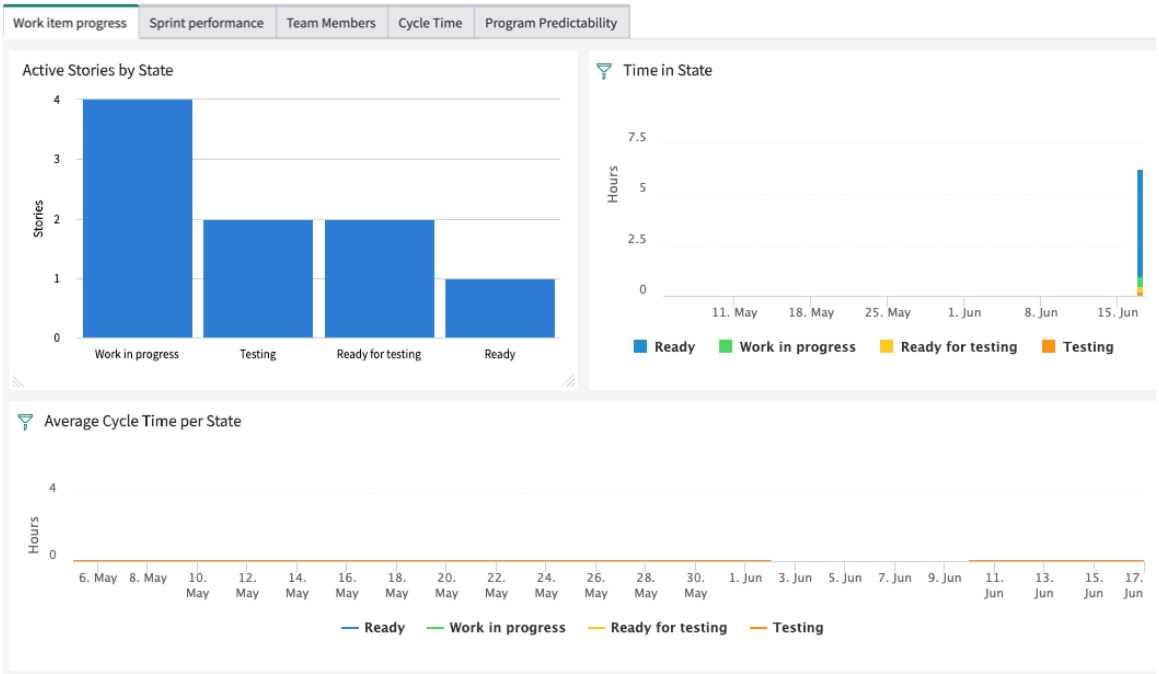


[スプリントパフォーマンス] タブ

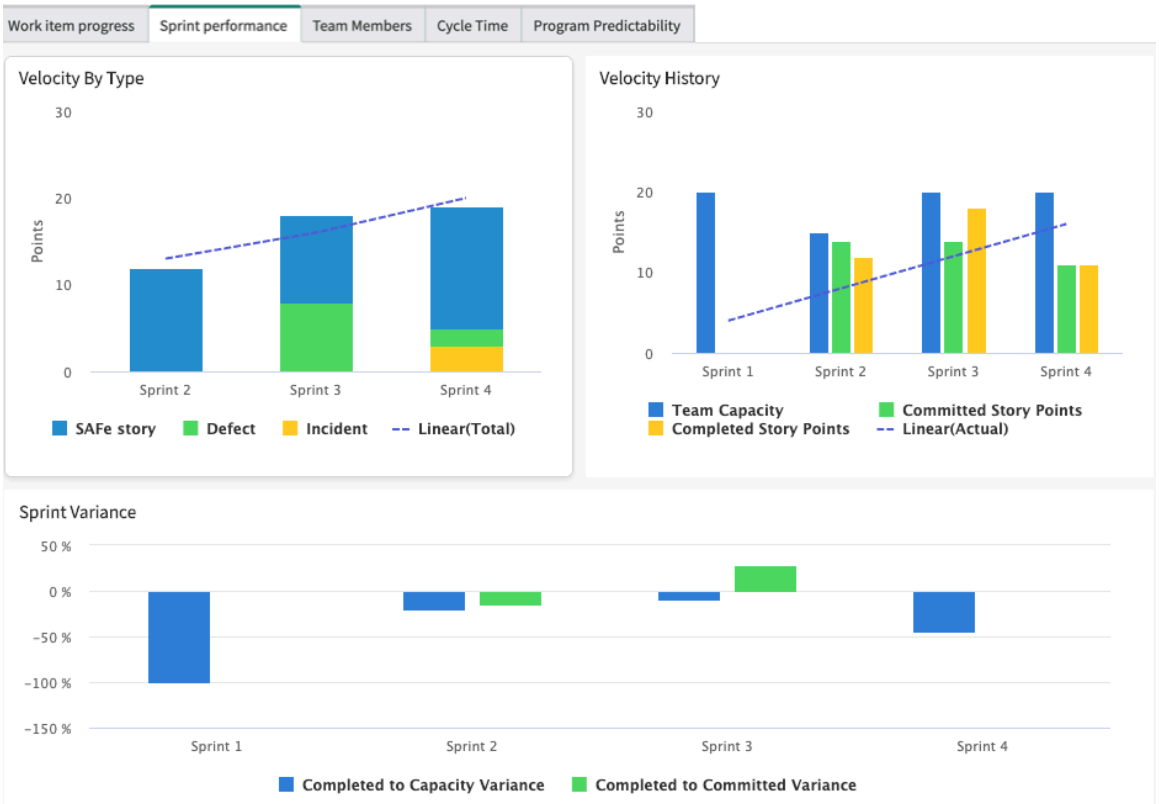


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


[チームメンバー] タブ

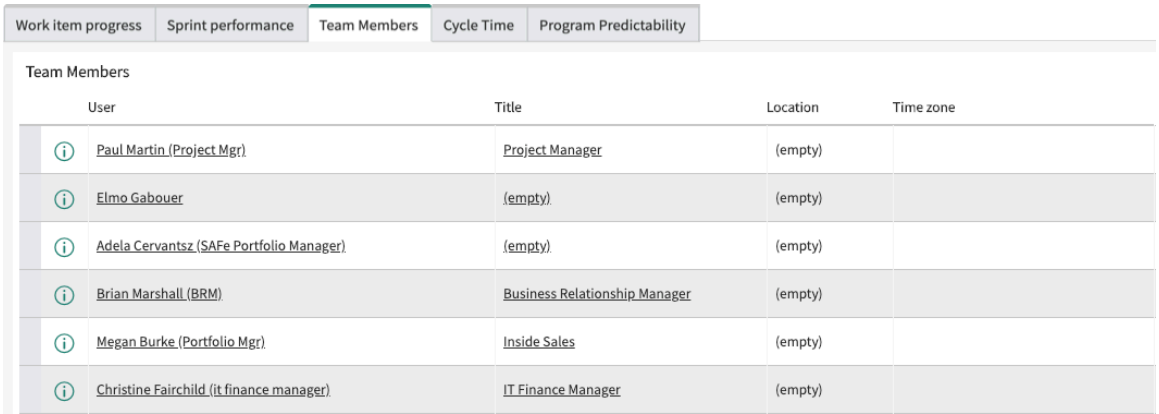

[サイクル時間] タブ

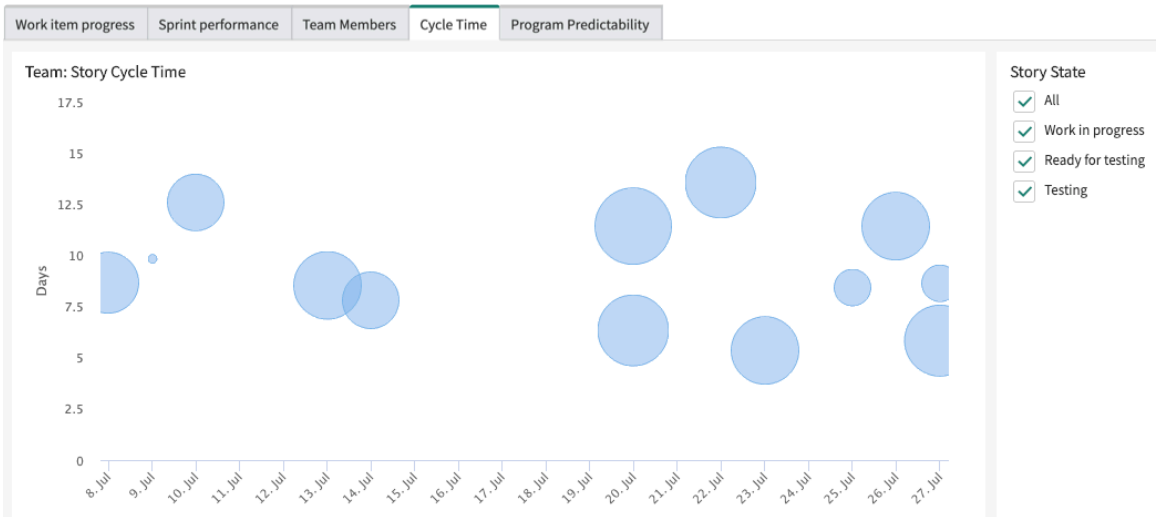

プログラムの予測可能性

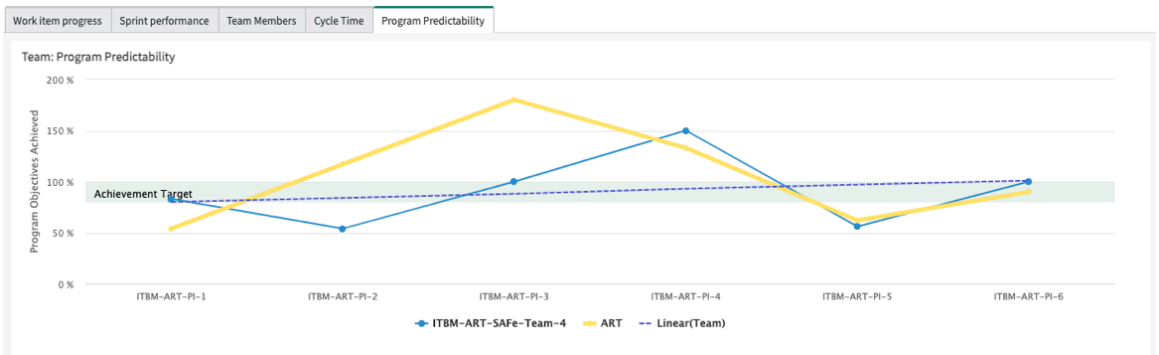

エンドユーザーとロール

必要なロールを持つエンドユーザー目標

エンドユーザーと目標	必要なロール
SAFe スクラムマスター：ストーリーに対するチームの進捗状況を表示します。	safe_scrum_user

インジケーター

SAFe：ストーリーの平均ステータス期間

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスごとの平均サイクル時間レポートに表示されるデータを生成します。

SAFe：ストーリーのステータス期間

ステータスごとの平均サイクル時間レポートに表示されるデータを生成します。

ブレークダウン

- SAFe：ステータス
- SAFe：チーム

データの可視化

チームダッシュボードの可視化は、以下のタブに分けられています。

- 作業アイテムの進捗状況：ステータス別のアクティブストーリー、ステータスでの経過時間、およびステータスごとの平均サイクル時間のレポート
- スプリントパフォーマンス：速度履歴とスプリント差異のレポート
- チームメンバー：チームのすべてのメンバーのリスト

> **注:**
> 最新バージョンにアップグレードした既存のお客様の場合、チームメンバーのリストは [作業アイテムの進捗状況] タブと [チームメンバー] タブの両方に表示されますが、正確な情報が表示されるのはどちらか一方のみです。この問題を回避するには、このウィジェットを [作業アイテムの進捗状況] タブから削除できます。ウィジェットの削除方法の詳細については、「レスポンシブダッシュボードの編集」を参照してください。

- サイクル時間：チームのストーリーサイクルのレポート。
- プログラムの予測可能性：PI の目標を達成するためのチームの過去のパフォーマンスのレポート。

バージョン 1.0.2 以前の Essential SAFe のパフォーマンスアンリティクスコンテンツパックからアップグレードする場合は、ソリューションライブラリからこのダッシュボードをインストールしてレイアウトをアップグレードし、次のレポートにアクセスします。

- 速度履歴
- タイプ別の速度
- スプリントの差異
- ストーリーのサイクル時間

詳細については、「Solution Library for Essential SAFe ダッシュボードの使用」を参照してください。


作業アイテムの進捗状況

タイトル	タイプ	説明
ステータス別のアクティブストーリー	棒グラフ 	対応中、テストなど、各ステータスにあるストーリーの合計数を表示します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

作業アイテムの進捗状況 (続く)

タイトル	タイプ	説明
時間 (ステータス)	積み重ね式の棒グラフ 	ストーリーの各ステータスでチームが費やした時間数を表示します。
ステータス別の平均サイクル時間	線グラフ 	対応中の時間経過に伴う傾向と、最も重要なサイクル時間を表示します。

スプリントパフォーマンス

タイトル	タイプ	説明
速度履歴	グループ化された棒グラフ 	過去 10 回のスプリントより、チームの全体的な速度に関するインサイトを得ます。チームが安定した予測可能な速度を達成し、コミットメントを満たしているかどうかを把握します。 チーム速度履歴レポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる、スプリント別の次のデータ系列から構成されています。 • チームキャパシティ：スプリントのチームキャパシティ (ストーリーポイント) を示します。 • コミット済みストーリーポイント：チームがスプリントに対してコミットしたストーリーポイントの数を示します。 • 完了済みストーリーポイント：チームがスプリントに対して完了したストーリーポイントの数を示します。 • 平均完了済みポイント：チームがスプリントに対して完了したストーリーポイントの平均数を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スプリントパフォーマンス (続く)

タイトル	タイプ	説明
		• 線形 (実績)：完了した作業量がスプリント全体で増加傾向、減少傾向、または比較的安定しているかどうかを示します。
タイプ別の速度	積み重ね式の棒グラフ 	チームの速度の推移を分析し、チームの戦略的な作業負荷を運用または他のタイプの作業負荷と比較します。 棒グラフには、次のタイプの完了済みストーリーのストーリーポイントの合計を示す 2 つの棒が示されます。 • 通常のストーリー • ストーリーは、トリアージボードのアイテムから統合バックログに追加されます。 いずれかの棒をクリックすると、対応するスプリントの詳細に移動します。 このレポートに表示されるデータは、過去 10 件のスプリントのもので、最も古いスプリントが左側に表示されます。 **注:** このレポートはデフォルトでは利用できません。レポートは、スクラムカスタムグラフからダッシュボードに追加できます。詳細については、「レスポンシブダッシュボードの編集」を参照してください。
スプリントの差異	グループ化された棒グラフ 	過去 10 回のスプリントより、キャパシティやコミットポイントで比較したチームの差異率を分析します。 チームスプリントの差異レポートは、環境設定に基づいて非表示/表示を切り替えることができる、スプリント別の次のデータ系列から構成されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


スプリントパフォーマンス (続く)

タイトル	タイプ	説明
		• キャパシティまで完了：スプリントの予想キャパシティと比較した完了済みの作業の割合を示します。 • コミット済みまで完了：スプリントに対するチームのコミット済み作業と比較した完了済みの作業の割合を示します。

チームメンバー

タイトル	タイプ	説明
チームメンバー	リスト	すべてのチームメンバーの詳細を表示します。


サイクル時間

タイトル	タイプ	説明
ストーリーのサイクル時間	バブル チャート 	チームが作業する各ストーリーで「進行中」ステータスから「完了」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。 グラフ内の各バブルはストーリーを表しています。バブルの x 軸からの高さは、ストーリーが「進行中」ステータスから「完了済み」ステータスに移行するまでにかかった時間を示します。ストーリーバブルの大きさは、ストーリーポイントに基づき、相対的なものです。 ストーリーポイントが異なるストーリーのサイクル時間を比較し、チームがストーリーを完了するのに要した時間の傾向を分析できます。完了までに長い時間がかかったストーリーを特定し、その理由を分析することで、将来のチームのサイクル時間を短縮するためのアクション計画を作成できます。 バブルにカーソルを合わせると、該当のストーリーに関する次の詳細が表示されます。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サイクル時間 (続く)

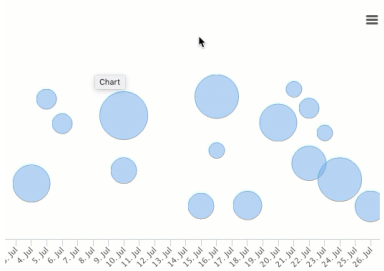タイトル	タイプ	説明
		• ストーリーポイント • ストーリーが「完了」に移行した日付 • ストーリーの合計サイクル時間 (日数) • ストーリーが [対応中] ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト準備完了」ステータスであった日数 • ストーリーが「テスト中」ステータスであった日数 レポートの右側にある [ストーリーのステータス] セクションから、レポートをフィルタリングして、選択したステータスのストーリーのサイクル時間を表示することができます。グラフには、各ストーリーのサイクル時間が、選択したステータスのすべての期間の累積合計として表示されます。 レポートにおいて、チャート内のストーリーが多すぎたりバブルが密集しすぎたりする場合は、レポートの特定箇所を拡大して見やすくすることができます。  **注:** このチャートに表示されるストーリーは、チームが過去 30 日間に完了したストーリーです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
チーム：プログラムの予測可能性	線グラフ 	PI 目標達成に関するチームの過去のパフォーマンスを追跡します。 このレポートの系列は、複数の PI におけるチームのパフォーマンスと、このチームが属する ART を示します。 横軸は完了した PI を示し、縦軸は達成されたビジネス価値の範囲をパーセンテージ (%) で示します。 各系列は達成されたビジネス価値を表し、PI 目標の計画ビジネス価値および実績ビジネス価値から計算されます。詳細については、「SAFe PI 目標」を参照してください。 グラフから、設定された PI 目標を 80% から 100% の間でチームが一貫して達成しているかどうかを確認できます。これは SAFe に基づく理想的な範囲です。 チャート上の直線 (チーム) の点線の系列は、チームで達成されたビジネス価値に関する線形回帰を示します。この系列は、達成されたビジネス価値のスコアがどのような傾向にあるかを示すものです。 系列のいずれかのデータポイントにカーソルを合わせると、達成したビジネス価値の数値が表示されます。 • ART 系列の PI のデータポイントのいずれかをクリックすると、ドリルダウンされ、クリックした PI のグラフのプロットに使用される PI 目標のリストが表示されます。 [タイプ] 列を [プログラム] に設定してリストをフィルタリングすると、ART に対する PI 目標のみが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイトル	タイプ	説明
		• チーム系列の PI のデータポイントのいずれかをクリックすると、ドリルダウンされ、クリックした PI のグラフのプロットに使用される PI 目標のリストが表示されます。 このリストに表示されている目標は、選択したチームに対するもののみです。

Essential SAFe ダッシュボードレポートのカスタマイズ

SAFe ストーリーのカスタム状況に従って、ダッシュボードのバーンアップ、バーンダウン、および累積フロー図レポートをカスタマイズします。

- カスタマイズに合わせてインジケーターを設定します。

  たとえば、SAFe ストーリーテーブルに新しい状況が導入された場合、[状態] フィールドに依存するストーリーテーブルの対応するインジケーターとインジケーターソースも更新する必要があります。

  詳細については、「Essential SAFe ダッシュボードレポートのインジケーターをカスタマイズする」を参照してください。

- 独自のインジケーターを使用する変更のために、UI スクリプトを更新するか、またはクローンを作成します。

  SafeAreaChartImpl や SafeVelHistoryImpl などの UI スクリプトの空の実装 (Impl) クラスのメソッドを上書きして、カスタマイズを追加します。

  詳細については、「Essential SAFe ダッシュボードでインジケーターを使用するために UI スクリプトを更新する」を参照してください。

Essential SAFe ダッシュボードレポートのインジケーターをカスタマイズする

Essential SAFe ダッシュボードのカスタマイズに合わせてインジケーターを設定します。

始める前に
必要なロール：admin または pa_admin

手順

1. 移動先 すべて > パフォーマンスアナリティクス > インジケーター > インジケーター (自動).
2. 必要なインジケーターを検索して開きます。
   たとえば、SAFe バーンアップレポートをカスタマイズする場合は、インジケーターのリストの現在スプリントの機能で [SAFe：すべてのストーリーのストーリーポイントの合計] を開きます。
3. [追加条件] セクションで、必要に応じて条件を変更します。
4. [更新] をクリックします。

Essential SAFe ダッシュボードでインジケーターを使用するために UI スクリプトを更新する

空の実装 (Impl) クラスのメソッドを上書きして、UI スクリプトをカスタマイズします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **UI** > **UI** スクリプト.
2. 必要な UI スクリプトを検索して開きます。
   たとえば、SAFe スプリント累積フロー図レポートをカスタマイズする場合は、UI スクリプトのリストから SAFeAreaChartImpl を開きます。
3. 必要に応じて、基本実装を上書きします。
4. [更新] をクリックします。

Essential SAFeダッシュボードレポートのストーリーステータスをカスタマイズする

Essential SAFe ダッシュボードで、カスタマイズに合わせてストーリー状況を設定します。

始める前に
必要なロール：admin または pa_admin

手順

1. 移動先 すべて > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > ストーリー.
2. カスタム状況を追加するストーリーを開きます。
3. [ステータス] を右クリックし、ドロップダウンメニューから [選択を構成] を選択します。
4. [新しいアイテムのテキスト] フィールドに、新しいカスタム状況名を入力します。
5. [数値] フィールドに、対応する数値を入力します。
6. [追加] をクリックします。
   新しいステータスが [選択済み] リストに表示されます。
7. [保存] をクリックします。

Work Progress Status for SAFe

Work Progress Status for SAFe アプリケーションは、すべての SAFe エピックおよび機能の完了予定日や進捗状況 (緑、黄、赤) などのインジケーターを提供します。

重要:

Xanadu リリース以降、プラグイン Portfolio SAFe、Essential SAFe、Essential SAFe のパフォーマンスアナリティクスコンテンツパック、SAFe の作業進捗ステータス、Agile - Scaled Agile Framework - Unified Backlog、および SAFe の読み取り専用ロールが、将来の廃止に向けて準備されています。これらのプラグインは非表示になり、新しいインスタンスではアクティブ化できなくなりますが、引き続きサポートされます。エンタープライズアジャイル計画は 戦略的計画 の値のいずれか は、この機能の最新のエクスペリエンスを提供します。

廃止プロセスおよびその影響の詳細については、Now Support ナレッジベースのアプリケーション/プラグインの廃止プロセス [KB0867184] の記事を参照してください。

製品オーナーまたはチームリーダーとして、こうしたインジケーターは、SAFe チームが作業を終了予定日までに完了できるかどうかを把握し、それに応じて計画を調整するために役立ちます。SAFe のストーリーに取り組むチームメンバーとして、これらのステータスインジケーターは、必要に応じて作業戦略をレビューできるように、作業全体への貢献度と進捗状況を理解するのに役立ちます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注:
これらの作業進捗ステータスインジケーターを設定するには、 SAFe の機能またはエピックの [終了予定日] フィールドに値を入力する必要があります。

SAFe の機能とエピックの進捗状況の確認

SAFe の機能とエピックの進捗状況を確認して、作業が終了予定日までに完了するかどうかを判断します。


移動先 **Scaled Agile Framework (SAFe)** > エピック または **Scaled Agile Framework (SAFe)** > 機能 をクリックし、チームのレコードをフィルタリングします。

リストの [ステータス] 列には、各レコードの緑、黄、または赤のインジケーターが表示され、各色で次のことが示されます。


- 緑：作業は終了予定日までに完了する見込みです。
- 黄：作業の進行が予定どおりではなく、実行計画をレビューする必要があります。
- 赤：エピックまたは機能の進行が順調ではなく、終了予定日までに完了しない可能性があります。

完了予定日には、エピックまたは機能が完了する可能性がある日付が表示されます。

SAFe エピックの進捗状況



SAFe 機能の進捗状況

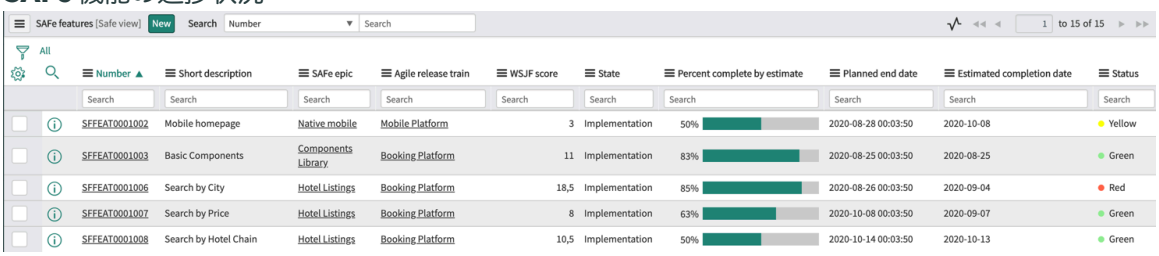

[SAFe] 日次データ収集ジョブは、エピックおよび機能のバーンアップレポートの生成に役立ちます。これらのエピックバーンアップレポート用に生成されたデータを使用して、完了予定日が決定されます。この日付は、それぞれのバーンアップレポートで、完了済み系列とスコープ予測系列の共通部分であることがわかります。

この予定完了日に基づいて、SAFe のエピックと機能の進捗状況が決定されます。進捗状況のステータスは、次の条件でのみ計算されます。

- SAFe のエピックと機能の終了予定日が入力されている。
- エピックの完了率が 0 より大きい値である。

進捗状況インジケーターの色は、次の条件により決定されます。

- 緑：完了予定日が終了予定日以前です。
- 黄：完了予定日が終了予定日を 1% ～ 14% 過ぎています。
- 赤：完了予定日が終了予定日を 15% 以上過ぎています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連情報

SAFe 機能ダッシュボード

SAFe エピックダッシュボード

テスト管理アプリケーション

ServiceNow® テスト管理 アプリケーションは、テストプロセスの管理を簡素化し、ソフトウェア製品をより効率的かつ少ないエラー数で提供できるようにします。

テスト管理 には 2 つのバージョンがあります。

- テスト管理 2.0 は、アジャイル開発 2.0 および 大規模アジャイルフレームワーク (SAFe) との統合を含む多くの機能拡張を提供します。
- テスト管理 1.0 には、組織に役立つ特定の機能が含まれている場合があります。

次の比較を使用して、組織の情報に基づいた意思決定を行います。

テスト管理 **1.0** と テスト管理 **2.0** の違い

テスト管理 1.0 では、ユーザー受け入れテストをカバーしています。テストバージョン、テスト実行、テスト結果などの主要なデータモデル構造は含まれません。また、テスト管理 1.0 でテスト計画を構成することはできません。

テスト管理 2.0 には、業界標準に合致するデータモデル構造が含まれています。テストボードと呼ばれる直感的なユーザーインターフェイスが用意されており、そこからテスト計画を構成し、テスト作業のフェーズを計画することができます。

機能	テスト管理 1.0	テスト管理 2.0
統合：プロジェクトポートフォリオ管理	いいえ	はい
統合：アジャイル開発 2.0	いいえ	はい
統合：大規模アジャイルフレームワーク (SAFe)	いいえ	はい
テストバージョン	テストの複数のバージョンを作成して管理することはできません。	テストの複数のバージョンを作成して管理することができます。
テスト関係	テストは 1 つのテストスイートにのみ関連付けることができます。	テストは、複数のテストセット、テスト計画、およびテストサイクルに関連付けることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能	テスト管理 1.0	テスト管理 2.0
期間	製品または機能のテスト方法を説明するテスト計画を作成できます。	• 製品または機能のテスト方法を説明するテスト計画、およびテスト計画を実行する必要がある期間を作成できます。 • さらに、テスト計画をテストサイクルに分解し、テストサイクルをテスト実行セットに分解し、それらの実行の時間範囲を指定することができます。
テスト実行とテスト結果のトレーサビリティ	以下のことを行うことができます。 • 一度に 1 つのテストを実行します。 • テスト結果を表示します。	以下のことを行うことができます。 • 一度に 1 つのテストを実行します。 • 実行されたテストのバージョンを表示します。 • テスト結果を表示します。

注:

- London より前のリリースの既存の テスト管理 ユーザーの場合は、テスト管理 (com.snc.test_mgmt) プラグインによってアクティブ化された テスト管理 1.0 を使用しています。詳細については、テスト管理 1.0 のドキュメントを参照してください。
- 新規ユーザーの場合は、拡張テスト機能を提供する テスト管理 2.0 (com.snc.test_management.2.0) プラグインをアクティブ化する ことができます。詳細については、テスト管理 2.0 のドキュメントを参照してください。

ドメインセパレーションと テスト管理

ドメインセパレーションは テスト管理 でサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

関連情報

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

テスト管理 1.0

ServiceNow® テスト管理 1.0 アプリケーションは、手動でソフトウェアをテストするためのツールを提供します。

テスト管理 プラグイン (com.snc.test_mgmt) を使用すると、テストマネージャーとテスターは次の機能を実行し、テストプロセスのすべてのフェーズを管理できます。

- テストスイート、テストケース、およびテストを作成して、テストリポジトリを作成および管理します。
- テスト計画を作成し、テストケースを追加し、テスターをテストケースに割り当てることで、テストの実行を有効にします。
- テストプロセスを開始し、進捗状況を監視します。
- テストを実行し、テスト結果を記録します。
- テストケースのステータスを更新します。
- 欠陥を報告し、必要に応じて再テストします。
- テスト結果を評価し、テスト計画サインオフフォームに記入します。
- テスト管理ダッシュボードでテストレポートを表示します。

テスト管理のアクティブ化

テスト管理 (com.snc.test_mgmt) プラグインをアクティブ化するには、admin ロールが必要です。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

注:

テスト管理 プラグインをアクティブ化するには、次の 2 つの方法があります。

- 個別のアプリケーションとして
- ファイナンシャルを備えたプロジェクトポートフォリオスイート プラグインの一部として

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テスト管理と一緒にインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、テスト管理プラグインのアクティブ化とともにインストールされます。

注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

インストールされるロール

ロール タイトル [名前]	説明	ロールを含む
テストマネージャー [tm_test_manager]	テスト計画とテストスイート (メタデータ) を管理します。計画、実行、および管理を含む、テスト管理内のすべての権限を持ちます。	tm_tester
テスター [tm_tester]	テストケースとテストを実行します。	feature_user

インストールされるテーブル

テーブル	説明
テストケース [tm_test_case]	テストケースを保存します。
テストケースインスタンス [tm_test_case_instance]	予定されているタスクテーブルを拡張します。
テストスイート [tm_test_suite]	テストスイートを保存します。
テスト環境 [tm_test_environment]	テスト環境を保存します。
テスト [tm_test]	テストを保存します。
テストインスタンス [tm_test_instance]	テスト計画の下にテストを保存します。
テスト計画 [tm_test_plan]	テスト計画を保存します。予定されているタスクテーブルを拡張します。
テストケースの欠陥 [m2m_tm_test_case_instance_defect]	不合格になったテストについて記録されたテストケースの欠陥を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テスト管理 1.0 のビジネスステークホルダーロール

ビジネスステークホルダーロールを使用して、テスト管理 1.0 アプリケーションの任意のテーブルからデータを読み取って取得し、レポートを生成します。

ServiceNow インスタンスでビジネスステークホルダープラグイン (com.snc.business_stakeholder) をアクティブ化すると、テスト管理 1.0 プラグイン (com.snc.tm1_read_roles) の読み取り専用ロールもアクティブ化されます。このプラグインは、テスト管理 1.0 アプリケーションのすべてのテーブルにアクセスできるビジネスステークホルダーロール (sn_tm1_read) を提供します。このロールでは、テスト管理ダッシュボードへの読み取り専用アクセスも許可されます。ビジネスステークホルダーであるすべての組織内ユーザーに、このロールをアサインできます。

プラグインの使用可否

新規顧客の場合、テスト管理 1.0 プラグインの読み取り専用ロール (com.snc.tm1_read_roles) が zBoot でアクティブ化されます。ただし、ビジネスステークホルダーロール (sn_tm1_read) は、テスト管理 1.0 プラグイン (com.snc.test_mgmt) をアクティブ化した場合にのみ使用できます。

アップグレードのお客様は、テスト管理 1.0 プラグインの読み取り専用ロール (com.snc.tm1_read_roles) を手動でアクティブ化する必要があります。

ビジネスステークホルダーロールを持つユーザーがアクセスできる テスト管理 1.0 テーブル

テスト管理 1.0 プラグインの読み取り専用ロール (com.snc.tm1_read_roles) および テスト管理 1.0 プラグイン (com.snc.test_mgmt) が ServiceNow インスタンス内で有効である場合、ビジネスステークホルダーロール (sn_tm1_read) を持つユーザーは、以下のテーブルに対する読み取りアクセス権を持ちます。

テスト管理 1.0 テーブル

テーブル	説明
テストケース [tm_test_case]	テストケースを保存します。
テストケースインスタンス [tm_test_case_instance]	予定されているタスクテーブルを拡張します。
テストスイート [tm_test_suite]	テストスイートを保存します。
テスト環境 [tm_test_environment]	テスト環境を保存します。
テスト [tm_test]	テストを保存します。
テストインスタンス [tm_test_instance]	テスト計画の下にテストを保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テスト管理 **1.0** テーブル (続く)

テーブル	説明
テスト計画 [tm_test_plan]	テスト計画を保存します。予定されているタスクテーブルを拡張します。
テストケースの欠陥 [m2m_tm_test_case_instance_defect]	不合格になったテストについて記録されたテストケースの欠陥を保存します。

主要な テスト管理 用語

主要な用語とは、テスト管理 で使用される用語を説明するものです。

主要な用語

用語	定義
テストスイート	テストケースのリポジトリ。テストスイート内のテストケースは、テスト計画にコピーできます。
テストケース	関連するテストのコレクション。テストケースはテストスイートの一部として保存され、テスト計画に追加できます。テスト計画内の各テストケースには、テスターがアサインされています。
テスト	正しく機能しているかどうかを判定するために使用される条件またはステップの集まり。テストには、テストケースの成否を決定するために使用される、予期される結果も含まれます。
テスト計画	製品または機能をテストする方法に関するタスク。テスト計画には、1 つ以上のテストケースが含まれ、テスト環境を指定することもできます。テストマネージャーは、テスト計画を使用してテストケースをアサインして実行し、テストの進捗状況を追跡します。
テスト環境	テストを実行するインスタンス。URL で指定します。テスト環境は、テストマネージャーがテスト計画に関連付けることができるオプションのパラメーターです。
テスト実行	テストを実行するプロセス。テストマネージャーは、テスト計画のテストケースにテスターをアサインします。テスターは、アサインされたテストケースでテストを実行します。
ガイド付きテスト実行	テストを実行するための自動通知プロセス。テストマネージャーは、テスト計画内のテストケースにテスターをアサインし、[テスト計画] フォームからテストを開始します。テスターは、アセスメントエンジンを使用してテストを開始するための通知を受け取ります。

Test Management プロセスフロー

手動ソフトウェアテストに関連するタスクは、いくつかのステップに分割できます。

テストマネージャーとテスターは、製品または機能の手動テストプロセスで次のアクティビティに関与します。

- テストスイート、テストケース、およびテストを作成して、テストリポジトリをビルドします。
- 特定の製品または機能をテストするためのテスト計画を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- テスト計画にテストケースを追加します。
- テスターを各テストケースにアサインします。
- 必要に応じて、テスト環境を定義します。
- アサインされたテストケースのテストを実行します。
- 結果を記録し、各テストのステータスを更新します。
- テストケースのステータスを更新します。
- テスト計画、テストケース、およびテストの進捗状況を監視します。

ステークホルダーは、テスト結果と未解決の問題をレビューして、テスト計画のサインオフを決定します。

最後にテスト計画サインオフフォームに記入することを除いて、これらのテストタスクを実行するために必要な順序はありません。各タスクは個別に実行できます。

手動テストプロセスの設定

テストスイート、テストケース、およびテスト計画を設定して監視します。

テスト管理 1.0 では、次のタスクを実行できます。

- テストスイート、テストケース、およびテストを含むテストリポジトリを作成および管理します。
- テスト計画を作成します。
- 必要に応じてテスト環境を定義します。
- テスト計画にテストケースを追加します。
- テスターを各テストケースにアサインします。
- テストを開始するようにテスターに通知します。
- テストプロセスを監視します。
- テスト結果を評価します。
- テストサインオフフォームに記入します。

テストスイート

テストを効率的に実行できるように、テストスイートを使用してテストケースをグループ化します。

移動先 テスト管理 > テストリポジトリ > テストスイート テストスイートのリストを表示します。テストスイートをクリックすると、スイートに含まれるすべてのテストケースがリストされた [テストスイート] フォームが表示されます。

テストスイートの作成

テストスイートは、実行のためにグループ化された 1 つ以上のテストケースで構成されます。

始める前に

必要なロール：tm_test_manager または tm_tester

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テストリポジトリ > テストスイート.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[テストスイート] フォーム

フィールド	説明
番号	システムによってテストスイートに生成された一意の識別子。
名前	テストスイートの名前。
有効	テストスイートがアクティブかどうかを示すオプション。 アクティブとして示されている場合、ユーザーが [テストケース] フォームからこのスイートにテストケースを追加しようとすると、このテストスイートが表示されます。
所有者	テストスイートの所有者。
説明	テストスイートの詳細説明。

4. [送信] をクリックします。

次のタスク

新しいテストスイートの関連リンクと関連リストを使用して、次のアクションを実行できます。

- [テスト計画に追加] 関連リンクをクリックして、このテストケースをテスト計画に追加します。
- [複製の作成] 関連リンクをクリックして、このテストスイートのコピーを作成します。詳細については、「既存のテストスイートのコピーを作成する」を参照してください。
- [テストケース] 関連リストを使用して、テストケースをこのテストスイートに関連付けます。詳細については、「テストスイートにテストケースを追加する」を参照してください。

既存のテストスイートのコピーを作成する

既存のテストスイートの詳細を使用してテストスイートを作成します。

始める前に

- テストスイートの作成。
- 必要なロール：tm_test_manager または tm_tester

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テストリポジトリ > テストスイート.
2. コピーを作成するテストスイートを開きます。
3. [複製の作成] 関連リンクをクリックします。
4. [テストスイート名] フィールドに名前を入力します。
5. [**OK**] をクリックします。

次のタスク

新しいテストスイートの関連リンクと関連リストを使用して、次のアクションを実行できます。

- [テスト計画に追加] 関連リンクをクリックして、このテストケースおよび関連するすべてのテストケースをテスト計画に追加します。
- [テストケース] 関連リストを使用して、テストケースをこのテストスイートに関連付けます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テストスイートにテストケースを追加する

新しいテストケースを作成し、既存のテストスイートに追加します。

始める前に

- テストスイートの作成。
- 必要なロール：tm_test_manager または tm_tester

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テストリポジトリ > テストスイート.
2. テストケースを追加するテストスイートを開きます。
3. [テストケース] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。

[テストケース] フォーム

フィールド	説明
番号	システムによってテストケースに生成された一意の識別子。
有効	テストケースがアクティブかどうかを示すオプション。
テストスイート	テストケースが追加されるテストスイート。
簡単な説明	テストケースの詳細説明。
必須条件	テストケースを実行する前に満たす必要のある条件。

5. [送信] をクリックします。

テストケース

テストケースを使用して、関連するテストをグループ化し、テストスイートまたはテスト計画に追加できるようにします。

移動先 テスト管理 > テストリポジトリ > テストケース をクリックして、テストケースのリストを表示します。テストケースをクリックすると、テストケースに含まれるすべてのテストがリストされた [テストケース] フォームが表示されます。

テストケースの作成

テストケースを作成して、1 つ以上の関連する個々のテストをグループ化します。

始める前に

必要なロール：tm_test_manager または tm_tester

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テストリポジトリ > テストケース.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[テストケース] フォーム

フィールド	説明
番号	システムによってテストケースに生成された一意の識別子。
有効	テストケースがアクティブかどうかを示すオプション。
テストスイート	テストケースが追加されるテストスイート。
簡単な説明	テストケースの詳細説明。
必須条件	テストケースを実行する前に満たす必要のある条件。

4. [送信] をクリックします。

次のタスク

新しいテストケースの関連リンクと関連リストを使用して、次のアクションを実行できます。

- [テスト計画に追加] 関連リンクをクリックして、このテストケースをテスト計画に追加します。
- [テスト] 関連リストを使用して、テストをこのテストケースに追加します。詳細については、「テストケースにテストを追加する」を参照してください。

テストケースにテストを追加する

新しいテストを作成し、既存のテストケースに追加します。

始める前に

- テストケースの作成。
- 必要なロール：tm_test_manager または tm_tester

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テストリポジトリ > テストケース.
2. テストを追加するテストケースを開きます。
3. [テスト] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。

[テスト] フォーム

フィールド	説明
番号	システムによってテストに生成された一意の識別子。
状況	テストのステータス。次のいずれかから選択します。 ○ [ドラフト]：テストを実行する準備ができていません。 ○ [準備完了]：テストを実行する準備ができています。 ○ [非アクティブ]：テストはアクティブではなくなりました。
順番	このテストケース内の他のテストと比較した、テストが実行される順番。
テスト	テストの名前
期待する結果	期待するテスト結果。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
詳細な説明	テスト対象の詳細な説明。

5. [送信] をクリックします。

次のタスク
テストフォームの [重複の作成] 関連リンクを使用して、このテストのコピーを作成できます。

テストケースの削除

テストケースとそれに関連するすべてのテストを削除します。


始める前に
必要なロール：tm_test_manager

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テストリポジトリ > テストケース.

2. 削除するテストケースを開きます。


3. [削除] をクリックします。

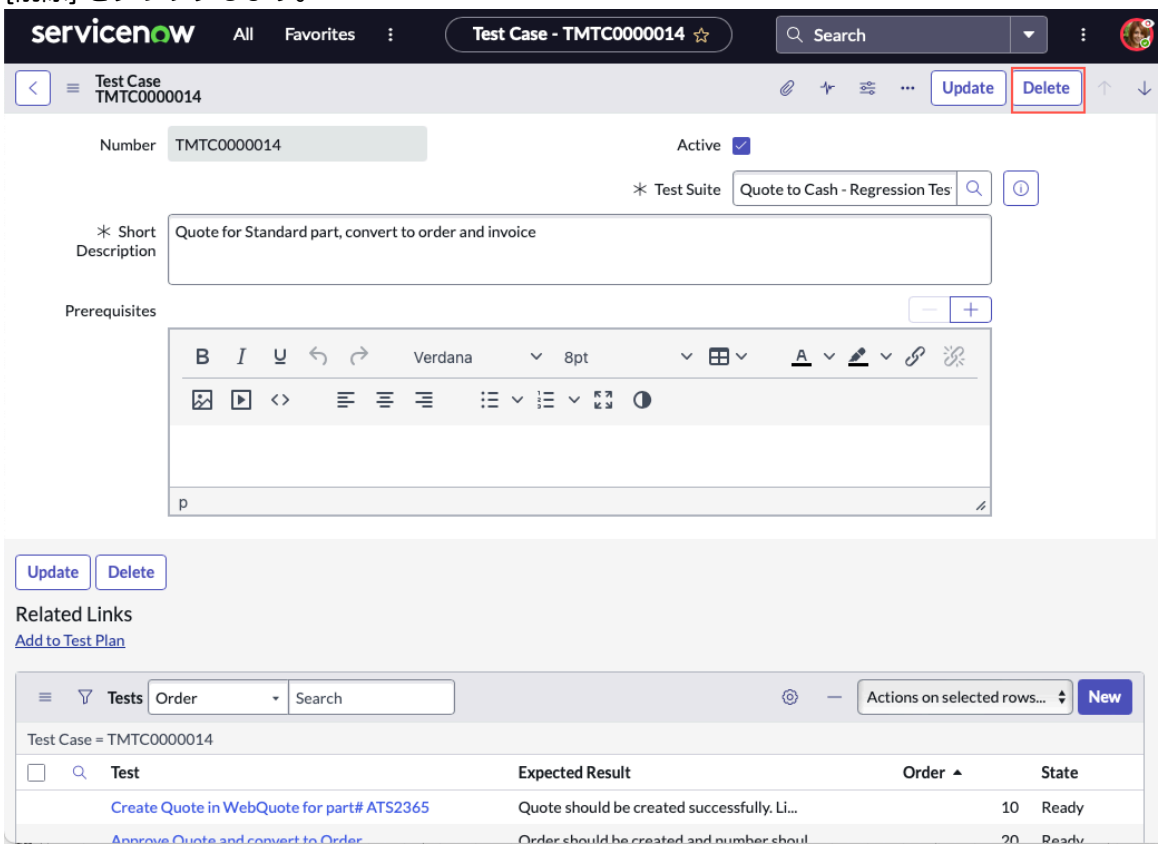

4. オプション: 確認ポップアップウィンドウで警告メッセージを読みます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



5. [削除] をクリックし削除を確認します。

タスクの結果
テストケースがリストから削除され、関連するすべてのテストが削除されます。

テスト

テストを使用して、機能またはアプリケーションが正常に動作しているかどうかを判断します。

テストは、正しく機能しているかどうかを判定するために使用される条件、変数、またはステップで構成されます。テストには、テストの成否を決定するために使用される、予期される結果も含まれます。

関連するテストは、テストケースにグループ化されます。[テストケース] フォームの [テスト] 関連リストから、テストケースに関連付けられているすべてのテストのリストを表示できます。移動先 テスト管理 > テストリポジトリ > テストケース をクリックし、テストケースを選択して、そのテストのリストを表示します。

テストの作成

テストを作成して、機能が正しく動作しているかどうかを確認します。

始める前に

- テストケースの作成。
- 必要なロール：tm_test_manager または tm_tester

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テストリポジトリ > テストケース.
2. テストを追加するテストケースを開きます。
3. [テスト] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。

[テスト] フォーム

フィールド	説明
番号	システムによってこのテストに対して生成された一意の識別子。
状況	テストのステータス。次のいずれかを選択します。 ○ [ドラフト]：テストを実行する準備ができていません。 ○ [準備完了]：テストを実行する準備ができています。 ○ [非アクティブ]：テストはアクティブではなくなりました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
順番	このテストケース内の他のテストと比較した、このテストが実行される順番。
テスト	テストの目的を示す、テストの名前。たとえば、「見積もりを承認して注文に変換 **(Approve Quote and convert to Order)**」とします。
期待する結果	期待するテスト結果。
詳細な説明	テスト対象の説明。

5. [送信] をクリックします。

次のタスク

[複製の作成] 関連リンクをクリックして、このテストのコピーを作成できます。詳細については、「既存のテストのコピーを作成する」を参照してください。

既存のテストのコピーを作成する

既存のテストの詳細を使用してテストを作成します。

始める前に

- テストの作成。
- 必要なロール：tm_test_manager または tm_tester


手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テストリポジトリ > テストケース.
2. 複製するテストのあるテストケースを開きます。
3. [テスト] 関連リストから、複製するテストを開きます。
4. [複製の作成] 関連リンクをクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

古いテストの詳細を使用して新しいテストが作成され、テストフォームが開きま

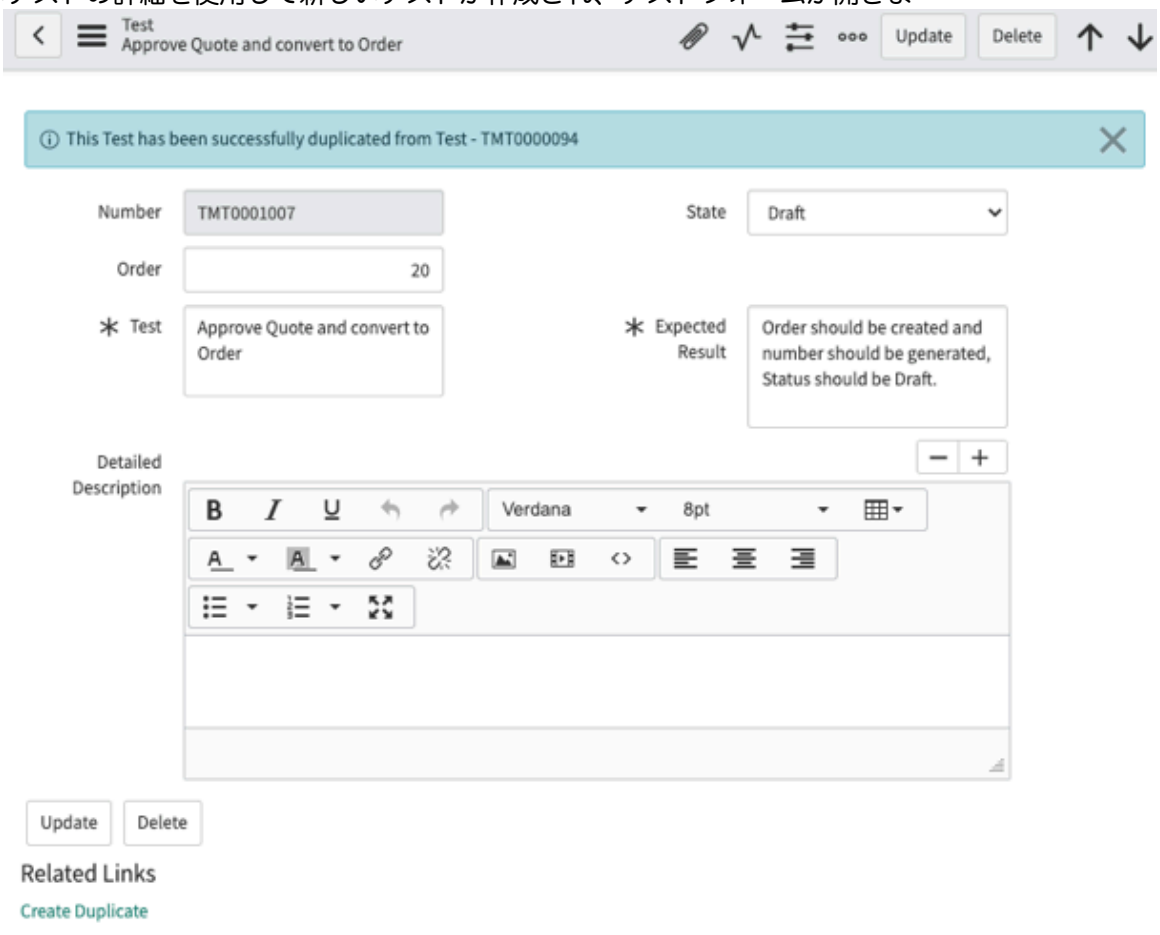

す。

5. オプション: 新しいテストの詳細に必要な変更を加えます。
6. [更新] をクリックします。

テスト環境の作成

テスト環境を作成して、テスト計画でテストを実施するときに使用するセットアップを定義します。

始める前に

必要なロール：tm_test_manager

このタスクについて

テスト計画では、使用するソフトウェアバージョンまたはオペレーティングシステムを指定できます。[テスト環境] フォームには環境のタイプが含まれており、URL を含めることもできます。

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テスト実行 > テスト環境.
2. **[New]** をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

[テスト環境] フォーム

フィールド	説明
番号	システムによってテスト環境に生成された一意の識別子。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
名前	テスト環境の名前。
タイプ	環境のタイプ。次のいずれかを選択します。 ○ 開発 ○ 本番 ○ QA ○ ユーザー受け入れテスト (UAT) (User Acceptance Testing (UAT)) ○ ステージング ○ サポート
URL	テスト環境の URL。
簡単な説明	テスト環境に関する簡単な説明。

4. [送信] をクリックします。

テスト計画

テスト管理 1.0 のテスト計画を使用して、機能またはアプリケーションのテスト方法を計画します。

テスト計画には、1 つ以上のテストケースが含まれ、テスト環境を指定することもできます。テスト計画は、テストケースをテスターにアサインしたり、テストの進捗状況を監視したりするために使用します。

に移動すると、テスト計画のリストを表示できます テスト管理 > テスト実行 > テスト計画. このリストには、現在のテスト計画、完了したテストケースの割合、およびテストケースのステータスが表示されます。テスト計画を開くと、この計画に使用されているテスト環境や、この計画に追加されたテストケースのリストなどの詳細が表示されます。

テスト計画を作成する

製品または機能のテスト方法を説明するテスト計画を作成します。

始める前に

必要なロール：tm_test_manager または tm_tester

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テスト実行 > テスト計画.

2. [**New**] をクリックします。

3. フォームのフィールドに入力します。

テスト計画フォーム

フィールド	説明
簡単な説明	テスト計画の簡単な説明。テスト計画の目的を示します。
所有者	テスト計画のオーナー。
テスト環境	テストに使用する特定の環境。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	ユーザーは、[テスト環境] フィールドの横にある情報アイコン (ⓘ) をクリックして、アサインされたテスト環境の詳細を確認できます。
有効	テスト計画がアクティブかどうかを示すオプション。 アクティブとして示されている場合、ユーザーが [テストスイート] フォームからこの計画にテストスイートを追加しようとすると、このテスト計画が表示されます。
説明	このテスト計画に関する特定の指示。
プロジェクト	関連するプロジェクトの名前。 このフィールドは、テスト管理 PPM 統合がプロジェクトポートフォリオスイートプラグイン (com.snc.project_portfolio_suite) の一部としてアクティブ化されている場合に、[テスト計画] フォームに表示されます。
プロジェクトフェーズ	プロジェクトワークベンチ内で関連するプロジェクトフェーズの名前。 このフィールドは、テスト管理 PPM 統合がプロジェクトポートフォリオスイートプラグイン (com.snc.project_portfolio_suite) の一部としてアクティブ化されている場合に、[テスト計画] フォームに表示されます。
開始予定日	テスト計画の予測開始日。開始予定日は、現在の日付または将来の日付にすることができます。 このフィールドは自動的に現在の日付に設定されます。開始予定日を変更するには、カレンダーアイコン ( ) をクリックし、新しい日付を選択します。 このフィールドを追加するためにフォームを構成しなければならない場合があります。詳細については、「テスト計画の実行の開始日と終了日を表示する」を参照してください。
終了予定日	テスト計画の予測終了日。終了予定日は開始予定日より後にする必要があります。 このフィールドは自動的に現在の日付に設定されます。終了予定日を変更するには、カレンダーアイコン ( ) をクリックし、新しい日付を選択します。 このフィールドを追加するためにフォームを構成しなければならない場合があります。詳細については、「テスト計画の実行の開始日と終了日を表示する」を参照してください。
開始実績日時	テスト計画の開始実績日時。開始実績日時は、開始予定日以前にすることができます。 このフィールドを追加するためにフォームを構成しなければならない場合があります。詳細については、「テスト計画の実行の開始日と終了日を表示する」を参照してください。
終了実績日時	テスト計画の終了実績日時。終了実績日時は、開始予定日より前にすることはできますが、開始実績日時より前にすることはできません。 このフィールドを追加するためにフォームを構成しなければならない場合があります。詳細については、「テスト計画の実行の開始日と終了日を表示する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 次のいずれかの選択肢を使用して、テスト計画を保存します。
   - [送信] をクリックして、[テスト計画] リストに戻ります。
   - [保存] をクリックして、[テスト計画] フォームに留まります。

次のタスク
新しいテストスイートの関連リンクと関連リストを使用して、次のアクションを実行できます。

- [テストスイートからテストケースを追加] 関連リンクをクリックして、テストスイートからこのテスト計画に既存のテストケースを追加します。
- [テストケース] 関連リストからこのテスト計画に新しいテストケースを追加します。詳細については、「テスト計画に新しいテストケースを追加する」を参照してください。
- [テストスイートとして保存] 関連リンクをクリックして、このテスト計画を新しいテストスイートとして保存します。この計画のすべてのテストケースを含む新しいテストスイートが作成され、別のテスト計画に追加できるようになります。
- テスト計画を開始し、[テスターに通知] 関連リンクを使用して、テストのターゲット終了日をテスターに通知します。詳細については、「ガイド付きテスト実行の開始」を参照してください。
- [テストの実行をキャンセルします] 関連リンクをクリックして、テスト実行をキャンセルします。このリンクは、[テスターに通知] 関連リンクを使用してテスト計画を開始した場合にのみ使用できます。詳細については、「ガイド付きテスト実行のキャンセル」を参照してください。
- **[Visual Task Board** を表示] 関連リンクをクリックして、Visual Task Board (VTB) にすべてのテストケースを表示します。VTB は、実行状況別に整理されたレーンにテストケースを表示します。
- [テスト計画をコピー] をクリックして、このテスト計画のコピーを作成します。
- テスト実行の概要を表示し、[サインオフテスト計画] 関連リンクをクリックしてテスト計画をサインオフします。
- [テスト計画の欠陥] 関連リストを表示し、テストケースからログに記録されたすべての欠陥のリストを確認します。

テスト計画の実行の開始日と終了日を表示する

[テスト計画] フォームに予定および実績の開始日と終了日のフィールドを追加して、実行日情報を表示します。

始める前に
必要なロール：tm_test_manager または tm_tester

このタスクについて
テスト計画の予定および実績の開始日と終了日を表示するように、[テスト計画] フォームのレイアウトを構成します。

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テスト実行 > テスト計画.
2. 実行の開始日と終了日を確認するテスト計画を開きます。
3. フォームレイアウト構成を開きます。
   a. フォームヘッダーを右クリックします。
   b. [設定] を選択します。
   c. [フォームレイアウト] を選択します。
4. 次のフィールドを [利用可能] リストから [選択済み]リストに移動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 開始予定日
- 終了予定日
- 開始実績日時
- 終了実績日時

5. オプション: [選択済み] リストのフィールドの順序を並べ替えます。
6. [保存] をクリックします。

タスクの結果
[テスト計画] フォームが、新しく追加された日付フィールドとともに表示されます。

テスト計画に新しいテストケースを追加する

テスターにアサインしてテスト実行を開始できるように、テスト計画に新しいテストケースを追加します。

始める前に
必要なロール：tm_test_manager または tm_tester

このタスクについて
既存のテストスイートに含まれていないテストケースを追加できます。[テストケース] 関連リストを使用して、[テスト計画] フォームから直接テストケースを作成します。

手順
1. 移動先 すべて > テスト管理 > テスト実行 > テスト計画.
2. テストケースを追加するテスト計画を開きます。
3. [テストケース] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. フォームのフィールドに入力します。
   テストケースフォームフィールドの詳細については、「テストケースの作成」を参照してください。
5. [送信] をクリックします。

タスクの結果
新しいテストケースが [テストケース] 関連リストに追加されます。

テストケースにテスターをアサインする

テスト計画内のテストケースをテスター (tm_tester) ロールを持つユーザーとビジネスユーザーにアサインします。

テストケースは、[テスト計画] フォームから直接、またはテスト計画内のテストケースの Visual Task Board (VTB) ビューからユーザーにアサインできます。

tm_tester ロールを持つユーザーは、テスト実行に [テスト計画] フォーム、[テストケース] フォーム、VTB、またはガイド付きテスト実行機能を使用することを選択できます。ビジネスユーザーは、ガイド付きテスト実行を使用してのみテストを実行できます。

[テスト計画] フォームからテスターをアサインする

[テスト計画] フォームの [テストケース] 関連リストを使用して、テスターをアサインします。

始める前に
必要なロール：tm_test_manager または tm_tester

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テスト実行 > テスト計画.
2. テスト計画を開きます。
3. [テストケース] 関連リストから、テスターをアサインするテストケースを開きます。
4. [アサイン先] フィールドでユーザーを選択します。
5. [更新] をクリックします。

Visual Task Board からテスターをアサインする

Visual Task Board (VTB) からテスターにテストケースをアサインします。


始める前に
必要なロール：tm_test_manager または tm_tester

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テスト実行 > テスト計画.
2. テスト計画を開きます。
3. **[Visual Task Board** を表示] 関連リンクをクリックします。

   VTB には、テストケースステータスのレーンが表示されます。各テストケースのカードが、ステータスに基づいて適切なレーンに表示されます。どのユーザーにもアサインされていないテストケースは、カードに [未アサイン] と表示されます。

   [テスト計画] の **Visual Task Board** で未アサインのテストケースカード

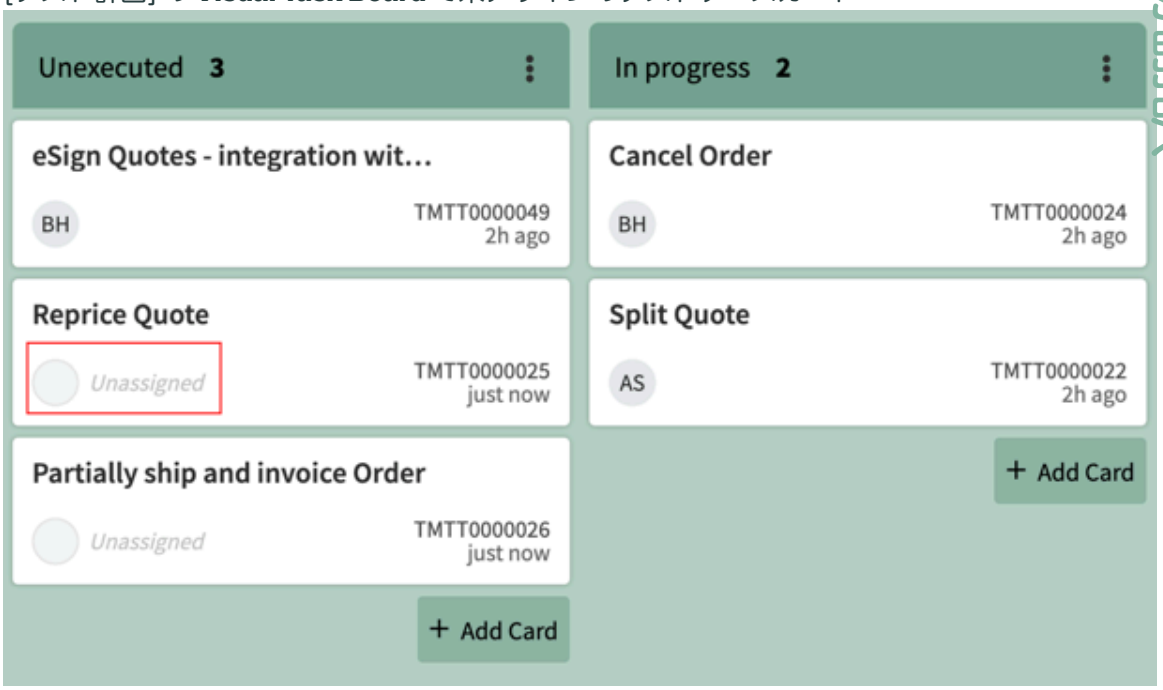

4. 未アサインのカードをクリックして、テストケースフォームを開きます。
5. 右側のパネルから [アサイン先] クリックします。
6. [プライマリ受託者の追加] をクリックし、ユーザーを選択します。
7. 閉じるアイコン (✕) をクリックして、カードを閉じます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ガイド付きテスト実行

アサインされたテストケースについてアセスメントアプリケーションを使用してテスターに通知することにより、ガイド付きテストの実行を通じてアサインされたテストケースについてテスターに通知します。

どのユーザーも、ガイド付きテスト機能を使用してテストを実行できます。テスター (tm_tester) ロールは必要ありません。テスト計画内のテスターごとに、アセスメントメトリクスカテゴリが作成されます。

テストマネージャーは、[テスト計画] フォームからテストケースにテスターをアサインし、テストの終了日をアサインしてテストを開始します。テスターは、次の場所に移動できます: セルフサービス > 自分のテスト または セルフサービス > 自分のアセスメント アサインされたテストケースを表示して作業します。詳細については、「ガイド付きテスト実行の開始」を参照してください。

テスト計画、テストケース、またはテストに対する変更は、アセスメントで自動的に更新されます。テスターがアセスメントを進めると、テスターが結果を送信したときにテスト計画とテストケースが更新されます。

テストマネージャーは、いつでも [テスト計画] フォームからガイド付きテスト実行を直接キャンセルできます。詳細については、「ガイド付きテスト実行のキャンセル」を参照してください。

ガイド付きテスト実行の開始

テストを開始するように通知することにより、テスト計画内の各テストケースにアサインされたテスターのアセスメントを作成します。テストマネージャーは、[テスト計画] フォームからガイド付きテスト実行を開始できます。

始める前に

- テスト計画を作成する。
- テスト計画にテストケースを追加します。
- [テスト計画] フォームからテスターをアサインする。
- 必要なロール：tm_test_manager または tm_tester

このタスクについて

ガイド付きテスト実行を使用している場合は、[テスト計画] フォームから直接テストを開始するようにテスターに通知することができます。テスターには、アサインされたアセスメントがメールで通知されます。テスターは、次の場所に移動してこれらのアセスメントを見つけることができます セルフサービス > 自分のテスト または セルフサービス > 自分のアセスメント.

手順

1. 移動先 テスト管理 > テスト実行 > テスト計画.
2. 実行を開始するテスト計画を開きます。
3. [テストケース] 関連リストから、[アサイン先] フィールドを使用してテスターにテストケースをアサインします。
4. [テスターに通知] 関連リンクをクリックします。
5. [テスト終了日] フィールドに日付を入力し、**[OK]** をクリックします。
   この日付は、アセスメントの期日として使用されます。

タスクの結果

各テスターのアセスメントが作成され、アセスメントとテストの詳細が記載されたメールが各テスターに送信されます。テスターにメールで通知された後、[テスト計画] フォームの [テスターに通知] 関連リンクが [テストの実行をキャンセルします] に変更されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ガイド付きテスト実行のキャンセル

ガイド付きテストプロセスの開始後にキャンセルし、必要に応じて再開できるようにします。

始める前に

- テスト計画を作成する。
- テスト計画にテストケースを追加します。
- [テスト計画] フォームからテスターをアサインする。
- ガイド付きテスト実行の開始
- 必要なロール：tm_test_manager または tm_tester

このタスクについて

[テスト計画] フォームの関連リンクを使用して、すでに開始されているテストの実行をキャンセルします。

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テスト実行 > テスト計画.
2. テストを停止するテスト計画を開きます。
3. [テストの実行をキャンセルします] 関連リンクをクリックします。
4. [**OK**] をクリックします。

タスクの結果

テスト計画の実行がキャンセルされたこと、およびテスト計画に対して作成されたメトリクスタイプが削除されたことを示すメッセージが表示されます。

[テスト計画] ページの [テストの実行をキャンセルします] 関連リンクが [テスターに通知] に変更されます。

テストの実行とテストステータスの更新

テストケースがアサインされた後に、テストを実行し、テスト結果を記録し、テストステータスを更新します。

テスターは、テスト管理 アプリケーションで次のアクションを実行できます。

- テストケースのテストを実行し、結果を記録します。
- テストのステータスを更新します。
- テストが失敗した場合は欠陥を報告します。
- テストがブロックされている場合はブロッキングの問題を報告します。
- 必要に応じて再テストします。
- テストケースのステータスを更新します。

ガイド付きテスト実行機能を使用すると、任意のユーザーをテストケースにアサインでき、そのテストケース内でテストを実行できます。

[テストケース] フォームを使用してテストを実行する

[テストケース] フォームを使用して、アサインされたテストケースからテストを実行し、結果を記録します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：tm_tester

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テスト実行 > テスト計画.
2. [テストケース] 関連リストでアサインされたテストケースをクリックします。
3. [テストケース] フォームの [実行状況] フィールドを [処理中] に設定し、[保存] をクリックします。
4. [テスト] 関連リストで、最初のテストを開きます。
   テストの順番は、[順番] フィールドの番号によって決まります。
5. テストの [ステータス] フィールドを [処理中] に設定します。
6. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。
7. [詳細な説明] フィールドで説明されている手順を実行します。
8. 結果を [実際の結果] フィールドに記録します。
9. 実際の結果を期待する結果と比較し、[ステータス] フィールドのテストステータスを次のいずれかに更新します。
   - 合格
   - 失敗
   - ブロック済み
10. [更新] をクリックします。
11. テストケースの残りのテストについて、手順 4 ～ 10 を繰り返します。
12. すべてのテストが完了したら、テストケースのステータスを更新します。
    詳細については、「テストケースのステータスの更新」を参照してください。

Visual Task Board を使用してテストを実行する

アサインされたテストケースからテストを実行し、掲示板風のグラフィカルインターフェイスを使用して結果を記録します。

始める前に
必要なロール：tm_tester

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テスト実行 > テスト計画.
2. **[Visual Task Board** を表示] 関連リンクをクリックします。
3. カードのテストケース番号をクリックして、アサインされたテストケースを開きます。
4. [テストケース] フォームの [実行状況] フィールドを [処理中] に設定し、[保存] をクリックします。
5. [テスト] 関連リストで、最初のテストを開きます。
   [順番] フィールドの番号によってテストの順番が決まります。
6. テストの [ステータス] フィールドを [処理中] に設定します。
7. フォームヘッダーを右クリックし、 [保存] をクリックします。
8. [詳細な説明] フィールドで説明されている手順を実行します。
9. 結果を [実際の結果] フィールドに記録します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

10. 実際の結果を期待する結果と比較し、[ステータス] フィールドのテストステータスを次のいずれかの値に更新します。
    - 合格
    - 失敗
    - ブロック済み
11. [更新] をクリックします。
12. テストケースの残りのテストについて、手順 5 ～ 11 を繰り返します。
13. すべてのテストが完了したら、テストケースのステータスを更新します。
    詳細については、「テストケースのステータスの更新」を参照してください。

ガイド付きテスト実行を使用してテストを実行する

アサインされたテストケースからテストを実行し、結果を記録します。

始める前に
必要なロール：なし

このタスクについて
テスト計画でテストケースに割り当てられたテスターは、ガイド付きテストが開始されるとメールで通知を受け、テストを開始できます。

手順
1. 次のいずれかの方法を使用して、アサインされたテストケースに移動します。
    - セルフサービス > 自分のテスト
    - セルフサービス > 自分のアセスメント
    テスト計画名とアサイン情報が記載されたカードが表示されます。
2. [テストの開始] ボタンをクリックすると、アサインされたテストケースのリストと各ケースに含まれるテストが表示されます。
3. 個々のテストステップに従って、テストケース内の各テストを実行します。
4. 実行した各テストについて、次のいずれかの結果を記録します。
    - 合格
    - 失敗
    - ブロック済み
5. リストの一番下で、テストケースの全体的な結果を次から選択します。
    - 合格
    - 失敗
    - ブロック済み
6. [保存] をクリックします。

テストケースのステータスの更新

テストケースのステータスを手動で更新します。テストケース内の個々のテストのステータスは、テストケースの全体的なステータスには影響しません。

始める前に
必要なロール：tm_test_manager または tm_tester

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テストリポジトリ > テスト計画.
2. テストケースを含むテスト計画を開きます。
3. [テストケース] 関連リストで、テストケースをクリックします。
4. [実行状況] フィールドで、ステータスを選択します。
   - [未実行]：テストはまだ実行されていません。
   - [処理中]：このテストケースのテストは処理中です。
   - [合格]：このテストケースにアサインされたすべてのテストのステータスが [合格] です。
   - [失敗]：このテストケースにアサインされた 1 つ以上のテストのステータスが [失敗] です。
   - [ブロック済み]：このテストケースにアサインされた 1 つ以上のテストのステータスが [ブロック済み] です。
   - [再テスト]：失敗したテストに起因する欠陥が [完了してクローズ] に設定されたため、テストを再実行する準備ができています。
5. ステータスとして [ブロック済み] を選択した場合、このテストがブロックされた理由を [ブロックされた理由] フィールドに入力します。
6. 次のいずれかの選択肢を使用して、更新内容を保存します。
   - [送信] をクリックして保存し、[テストケース] リストに戻ります。
   - [保存] をクリックして保存し、[テストケース] フォームに留まります。

   テスト計画のテスト結果が更新されます。

次のタスク

テストケースが失敗した場合は、[欠陥を報告] 関連リンクをクリックして、失敗したテストからこのテストケースの欠陥を作成できます。詳細については、「失敗したテストの欠陥を報告する」を参照してください。

[欠陥の割り当て] 関連リンクをクリックすると、既存の欠陥をテストケースにリンクできます。詳細については、「欠陥をテストケースに割り当てる」を参照してください。

報告されアサインされた欠陥は、[テストケースの欠陥] 関連リストに一覧表示されます。

失敗したテストの欠陥を報告する

テストの失敗をさらに調査できるように、失敗した個々のテストから欠陥を報告します。

始める前に

- アジャイル開発 2.0 のアクティブ化

  欠陥を報告する機能は、アジャイル開発 2.0 プラグインがアクティブ化されている場合にのみ使用できます。

- テストを実行し、テストステータスを更新します。詳細については、「テストの実行とテストステータスの更新」を参照してください。
- 必要なロール：rm_tester

このタスクについて

[テスト] フォームを使用して、失敗したテストの欠陥を報告します。報告された欠陥は、このテストに関連するテストケースにもリンクされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テスト実行 > テスト計画.
2. 失敗したテストがあるテスト計画を開きます。
3. [テストケース] 関連リストから、失敗したテストがあるテストケースを開きます。
4. [テスト] 関連リストから、失敗したテストを開きます。
5. [テスト] フォームで、次のいずれかのリンクをクリックします。
   - [ステータス] フィールドの横にある [欠陥を報告] リンク。
   - [欠陥を報告] 関連リンク。
6. フォームのフィールドに入力します。

[欠陥を報告] フォーム

フィールド	説明
番号	システムによって欠陥に生成された一意の識別子。
アサイン先グループ	この欠陥を修正するためにアサインされたグループ。
担当者	この欠陥を修正するためにアサインされた個人。
優先度	欠陥の優先度。次のいずれか 1 つを選択します。 ○ 1- 重大 ○ 2 - 高 ○ 3：中 ○ 4：低 ○ 5 - 計画中
状況	欠陥の現在のステータス。次のいずれかを選択します。 ○ ドラフト ○ スコーピング ○ 承認待ち ○ 対応中 ○ テスト/QA ○ 展開/起動 ○ クローズ済み/完了 (Closed/Complete) ○ 保留中 ○ キャンセル
簡単な説明	欠陥の簡単な説明。
説明	欠陥の詳細な説明。
作業メモ	欠陥に関連するコメント、メモ、またはその他の情報。

7. [送信] をクリックします。

タスクの結果
欠陥が作成され、次の関連リストに追加されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 失敗したテストに関連付けられたテストケースの [テストケースの欠陥] 関連リスト。
- 失敗したテストに関連付けられたテスト計画の [テスト計画の欠陥] 関連リスト。

。

欠陥をテストケースに割り当てる

既存の欠陥をテストケースに割り当てます。

始める前に

- アジャイル開発 2.0 のアクティブ化

  欠陥を割り当てる機能は、アジャイル開発 2.0 プラグインがアクティブ化されている場合にのみ使用できます。

- テストを実行し、テストステータスを更新します。詳細については、「テストの実行とテストステータスの更新」を参照してください。
- 必要なロール：rm_tester

このタスクについて

欠陥をテストケースにリンクすると、欠陥への参照がテストケースとこのテストケースのテスト計画の両方に追加されます。

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 > テスト実行 > テスト計画.
2. テストケースを含むテスト計画を開きます。
3. [テストケース] 関連リストから、欠陥を割り当てるテストケースを開きます。
4. [欠陥の割り当て] をクリックします。
5. [欠陥] フィールドから欠陥を選択します。
6. [**OK**] をクリックします。

タスクの結果

テストケースに割り当てた欠陥が、次の関連リストに追加されます。

- テストケースの [テストケースの欠陥] 関連リスト。
- テストケースに関連付けられたテスト計画の [テスト計画の欠陥] 関連リスト。

[テストケース] 関連リストを表示するように [欠陥] フォームを構成して、この欠陥に関連付けられたテストケースを表示することもできます。

テストの進捗状況を監視する

テスト計画モジュールまたはテスト管理ダッシュボードを使用して、テスト計画、テストケース、および個々のテストに関してテストの進捗状況を追跡します。

テスト計画モジュール

すべてのテスト計画の進捗状況を把握するには、次に移動します: テスト管理 > テスト実行 > テスト計画 をクリックし、テスト計画のリストから次の情報を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [完了率]：テスト計画で完了したテストの量。

  この値は、(合格したケース数 + 失敗したケース数) / テストケースの合計数として計算されます。

- [不合格のテストケース]：テスト計画で失敗したテストケースの数。
- [合格したテストケース]：テスト計画で合格したテストケースの数。
- [テストケース数]：テスト計画内のテストケースの合計数。

ここから、このテスト計画に関連付けられたテストケースの詳細と、各テストケースに添付されたテストにドリルダウンできます。

[テスト計画] フォームの [テストケース] 関連リストから、各テストケースの次の情報を表示できます。

- 合格したテスト数
- 不合格のテスト数
- テストケースの実行状況

[テストケース] 関連リストからテストケースを開くと、各テストの次の情報を表示できます。

- 期待する結果
- 実際の結果
- テストステータス

テスト管理ダッシュボード

テスト管理ダッシュボードの複数のレポートを使用して、すべてのアクティブなテスト計画の進捗状況を分析します。詳細については、「テスト管理ダッシュボード」を参照してください。


テスト管理ダッシュボード

テスト管理ダッシュボードでテスト計画レポートを表示します。

テスト管理ダッシュボードの各レポートから、個々のテスト計画を選択することも、またはすべてのアクティブなテスト計画を選択してすべてのテストの概要を確認することもできます。

ダッシュボードにアクセスするには、次に移動します: テスト管理 > 概要. 次に、レポートの [テスト計画を選択] フィールドから、進捗状況を分析するテスト計画を選択します。レポートのデータは自動的に更新されます。

テスト管理ダッシュボード

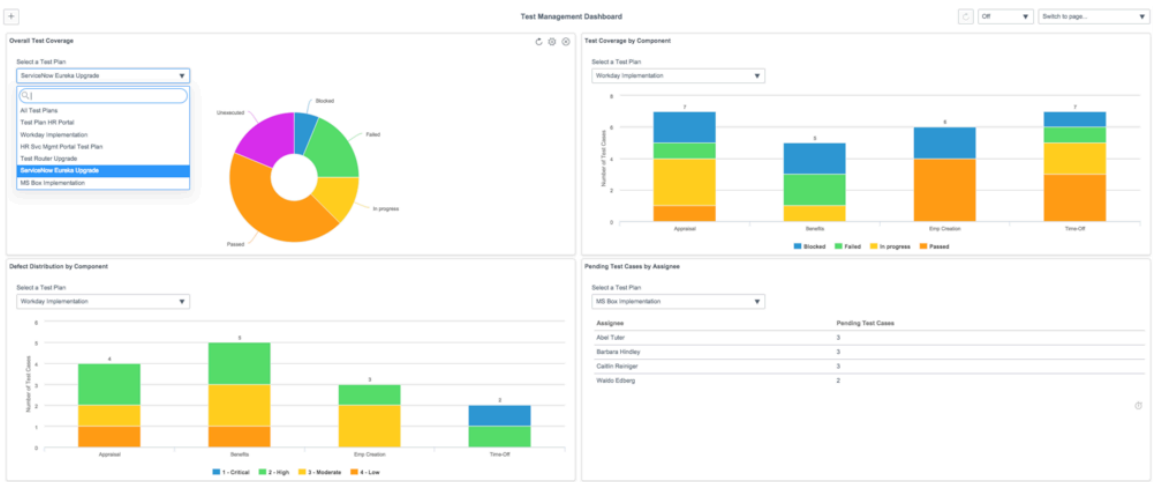

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

テスト管理ダッシュボードのレポート

レポートタイトル	レポートタイプ	説明
全体的なテスト範囲 (Overall Test Coverage)	円グラフ 	実行状況別にテストケースの分布を表示します。 • 合格 • 失敗 • ブロック済み • 処理中 • 未実行
コンポーネントタグ別のテスト範囲 (Test Coverage By Component Tags)	棒グラフ 	このレポートではタグ付け機能を使用して、タグをテストケースに割り当てることができます。次に、このレポートを使用し、割り当てられたタグに基づいてテストケースの分布を表示します。タグごとに、異なる色で実行状況を表します。 • 合格 • 失敗 • ブロック済み • 処理中 • 未実行
コンポーネントタグ別の欠陥分布 (Defect Distribution By Component Tags)	棒グラフ 	このレポートではタグ付け機能を使用して、タグをテストケースに割り当てることができます。次に、このレポートを使用し、割り当てられたタグに基づいてテストケースの欠陥を表示します。タグごとに、異なる色で欠陥の優先度を表します。 • 重大 • 高 • 中 • 低
アサイニー別の処理待ちのテストケース (Pending Test Cases By Assignee)	リスト	割り当てられたテスターごとの処理待ちのテストケースの数。

テスト計画のサインオフ

テスト計画をサインオフする機能を使用して、テスト計画の承認を記録します。

[テスト計画] フォームに移動し、[サインオフテスト計画] 関連リンクをクリックして、テスト実行サインオフレポートに移動します。このレポートでは、次の情報を使用して、現在の日付におけるテストケースの結果、未解決のテストケース、および未解決の問題について概要を提供します。

- 合格、不合格、ブロック済み、または未テストのテストケースの数。
- 未解決のテストケースのリスト。このリストには、ブロック済み、不合格、処理中、および未実行のケースが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 未解決の欠陥と未解決の問題のリスト ()。
- サインオフ履歴を含むサインオフの詳細。

テストマネージャーは詳細を確認し、テスト計画のサインオフに進むことができます。

1 つのテスト計画に対して複数のサインオフが必要な場合があります。また、失敗したテストケースがある場合でもテスト計画をサインオフすることができます。各サインオフでは、現在のステータスのテスト計画のスナップショットを取得し、スナップショットを PDF として保存して、そのファイルをテスト計画に添付します。このスナップショットは、不合格のテストケースや未実行のテストケース、未解決の欠陥など、すべてのテストケースをキャプチャします。

テスト計画サインオフの記入

テスト計画の承認を記録できるように、テスト計画をレビューしてサインオフします。

始める前に
必要なロール：tm_test_manager

手順

1. [テスト管理] > [テスト実行] > [テスト計画] に移動します。
2. サインオフするテスト計画を開きます。
3. [サインオフテスト計画] 関連リンクをクリックします。
4. [サインオフ] セクションで、[コメント] フィールドに追加情報を入力します。
5. オプション: [サインオフ担当者] フィールドでユーザーをレビューします。
6. オプション: [サインオフ日] フィールドで日付をレビューします。
7. [送信] をクリックします。

テスト管理 2.0

ServiceNow® テスト管理 2.0 アプリケーションは、テストプロセスの管理を簡素化し、ソフトウェア製品をより効率的かつ少ないエラー数で提供できるようにします。テストの複数のバージョンを作成して、アジャイル開発 2.0 とデータ連携することができます。

テスト管理 のさまざまなバージョンについて学び、テスト要件を満たすのに役立つバージョンを選択するには、「テスト管理アプリケーション」を参照してください。

探索	セットアップ	使用
• テスト管理 2.0 の概要 • を使用したテスト テスト管理 2.0 • スプリントテスト	• テスト管理 2.0 のアクティブ化 • テスト管理 2.0のクイックスタートテスト	のテストボード テスト管理 2.0

開発	トラブルシューティングとヘルプ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 開発者トレーニング
- 開発者ドキュメント
- テスト管理 2.0 と一緒にインストールされるコンポーネント
- ビジネスマネジメントコミュニティで質問や回答をする
- Known Error Portal で既知のエラー記事を検索
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

テスト管理 2.0 の概要

テスト管理 2.0 は、テスターとマネージャーの両者のテストプロセスを管理および簡素化することで、ソフトウェア製品をより効率的に、かつ欠陥を少なくして提供できるように支援します。テストの複数のバージョンを作成して、アジャイル開発 2.0 とデータ連携することができます。

テスト管理 のさまざまなバージョンについて学び、テスト要件を満たすのに役立つバージョンを選択するには、「テスト管理アプリケーション」を参照してください。

ユーザー	説明
テスター	次の方法でソフトウェア製品のテストを実行し、欠陥を報告できます。 • テストとテストセットを作成します。 • テストを実行し、テスト結果を記録します。 • テストのステータスを更新します。 • 欠陥をレポートし、必要に応じて再テストします。
テストマネージャー	ソフトウェア製品の手動テストプロセスを、下記の操作により設定および監視できます。 • テストとテストセットを作成および管理します。 • テスターによって作成されたテスト、テストステップ、およびテストセットを評価します。 • テスト計画を作成し、テスト計画をテストサイクルに細分化し、テストサイクルをテスト実行スイートに細分化することで、テストの実行を容易にします。 • テスターにテストをアサインし、全体的な進捗状況を監視することで、テストプロセスを開始します。 • テスト結果を評価し、テスト計画を終結します。

主要な用語

次のセクションでは、テスト管理 2.0 で使用される重要な用語について説明します。

用語	説明
テスト	正しく機能しているかどうかを判定するために使用される条件またはステップの集まり。テストには、テストケースの成否を決定するために使用される、予期される結果を含めることもできます。 テストモジュールを使用して、さまざまなバージョンのテストを作成および管理できます。
テスト	関連するテストのコレクション。テストは、1 つまたは複数のテストセットに含めることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

用語	説明
セット	テストセットモジュールを使用してテストセットを作成し、関連するテストをそのテストセットにグループ化することができます。
テスト計画	製品または機能のテスト方法、およびテスト計画を実行する必要がある期間を説明する計画。テスト計画はさらにテストサイクルに分割でき、テストサイクルはテスト実行スイートに分割できます。 テスト計画モジュールを使用して、テスト計画を作成できます。
テストケース	関連するテストのコレクション。テストケースはテストスイートの一部として保存され、テスト計画に追加できます。テスト計画内の各テストケースには、テスターがアサインされています。
実行	テスト実行の開始時刻と終了時刻、環境の詳細、テスト実行の結果など、テスト結果の詳細なレポート。 実行モジュールを使用してテスト結果を表示できます。

テスト管理 2.0 のアクティブ化

admin ロールを持っている場合は、テスト管理 2.0 プラグイン (com.snc.test_management.2.0) をアクティブ化します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

テスト管理 2.0 と一緒にインストールされるコンポーネント

いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) が、テスト管理 2.0 プラグイン (com.snc.sdlc.test_management) のアクティブ化とともにインストールされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールされるロール

ロール	説明	ロールを含む
テスター [sn_test_management.tester]	テストを作成し、類似のテストをテストセットにグループ化できます。	なし
テストマネージャー sn_test_management.test_manager	テストを作成し、類似のテストをテストセットにグループ化し、テスト計画を管理し、実行結果を表示できます。	sn_test_management.tester

インストールされるテーブル

テーブル	説明
タスクテスト [sn_test_management_m2m_task_test]	テストを複数のスクラムタスクに関連付けます。
テストセットのテスト [sn_test_management_m2m_test_set_test]	テストを複数のテストセットに関連付けます。
予定テストタスク [sn_test_management_planned_task]	予定されているタスクテーブルを拡張します。
ステップ [sn_test_management_step]	テストステップの詳細を保存します。
ステップ結果 [sn_test_management_step_result]	ステップの結果の詳細を保存します。
テスト [sn_test_management_test]	テストの詳細を保存します。
テスト実行のアサイン [sn_test_management_test_assignment]	テスターへのテストのリンクを保存します。
テストサイクル [sn_test_management_test_cycle]	テストサイクルの詳細を保存します。
テスト環境 [sn_test_management_test_environment]	テスト環境の詳細を保存します。
テスト実行スイート [sn_test_management_test_execution_suite]	テスト実行スイートの詳細を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル	説明
テスト計画 [sn_test_management_test_plan]	テスト計画の詳細を保存します。
テスト結果 [sn_test_management_test_result]	テスト結果の詳細を保存します。
テスト実行 [sn_test_management_test_run]	テスト実行の詳細を保存します。
テストセット [sn_test_management_test_set]	テストセットの詳細を保存します。
テストバージョン [sn_test_management_test_version]	テストバージョンの詳細を保存します。

テスト管理 **2.0** のビジネスステークホルダーロール

ビジネスステークホルダーロールを使用して、テスト管理 2.0 アプリケーションの任意のテーブルからデータを読み取って取得し、レポートを生成します。

ServiceNow インスタンスでビジネスステークホルダープラグイン (com.snc.business_stakeholder) をアクティブ化すると、テスト管理 2.0 プラグイン (com.snc.tm2_read_roles) の読み取り専用ロールもアクティブ化されます。このプラグインは、テスト管理 2.0 アプリケーションのすべてのテーブルにアクセスできるビジネスステークホルダーロール (sn_tm2_read) を提供します。このロールでは、テスト管理ダッシュボードへの読み取り専用アクセスも許可されます。ビジネスステークホルダーであるすべての組織内ユーザーに、このロールをアサインできます。

自動翻訳

プラグインの使用可否

新規のお客様の場合、テスト管理 2.0 プラグインの読み取り専用ロール (com.snc.tm2_read_roles) が zBoot でアクティブ化されます。ただし、ビジネスステークホルダーロール (sn_tm2_read) は、テスト管理 2.0 プラグイン (com.snc.test_management.2.0) をアクティブ化した場合にのみ使用できます。

アップグレードのお客様は、テスト管理 2.0 プラグインの読み取り専用ロール (com.snc.tm2_read_roles) を手動でアクティブ化する必要があります。

ビジネスステークホルダーロールを持つユーザーがアクセスできる テスト管理 **2.0** テーブル

テスト管理 2.0 プラグインの読み取り専用ロール (com.snc.tm2_read_roles) および テスト管理 2.0 プラグイン (com.snc.test_management.2.0) が ServiceNow インスタンス内で有効である場合、ビジネスステークホルダーロール (sn_tm2_read) を持つユーザーは、以下のテーブルに対する読み取りアクセス権を持ちます。

テスト管理 **2.0** テーブル

テーブル	説明
タスクテスト	テストを複数のスクラムタスクに関連付けます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テスト管理 **2.0** テーブル (続く)

テーブル	説明
[sn_test_management_m2m_task_test]	
テストセットのテスト [sn_test_management_m2m_test_set_test]	テストを複数のテストセットに関連付けます。
予定テストタスク [sn_test_management_planned_task]	予定されているタスクテーブルを拡張します。
ステップ [sn_test_management_step]	テストステップの詳細を保存します。
ステップ結果 [sn_test_management_step_result]	ステップの結果の詳細を保存します。
テスト [sn_test_management_test]	テストの詳細を保存します。
テスト実行のアサイン [sn_test_management_test_assignment]	テスターへのテストのリンクを保存します。
テストサイクル [sn_test_management_test_cycle]	テストサイクルの詳細を保存します。
テスト環境 [sn_test_management_test_environment]	テスト環境の詳細を保存します。
テスト実行スイート [sn_test_management_test_execution_suite]	テスト実行スイートの詳細を保存します。
テスト計画 [sn_test_management_test_plan]	テスト計画の詳細を保存します。
テスト結果 [sn_test_management_test_result]	テスト結果の詳細を保存します。
テスト実行 [sn_test_management_test_run]	テスト実行の詳細を保存します。
テストセット [sn_test_management_test_set]	テストセットの詳細を保存します。
テストバージョン	テストバージョンの詳細を保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テスト管理 **2.0** テーブル (続く)

テーブル	説明
[sn_test_management_test_version]	

テスト管理 **2.0**のクイックスタートテスト

アプリケーションの開発やアップグレードの適用などの構成変更を行った後も、テスト管理 2.0 が変わらず正常に動作するかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。

テスト管理 2.0 クイックスタートテストでは、テスト管理 2.0 プラグイン (com.snc.test_management.2.0) および テスト管理 2.0 - ATF テストプラグイン (com.snc.test_management.2.0.atf) をアクティブ化する必要があります。

テスト管理 2.0：テストバージョンテストスイート

テスト	説明	リリースバージョン
テストバージョンを作成するとテストが作成される	テストの作成とバージョンを検証します。	Madrid
検証手順が含まれている場合、テストバージョンを準備完了としてマークすることができる	テストに検証手順があるときにテストのステータスを検証します。	Madrid
検証手順が含まれていない場合、テストバージョンを準備完了としてマークすることができない	テストに検証手順がないときにテストのステータスを検証します。	Madrid
テストバージョンを準備完了としてマークしたときに、準備完了ステータスの他のテストバージョンを廃止する	テストを準備完了としてマークしたときにテストのステータスを検証します。	Madrid

テスト管理 2.0：テスト結果ロールアップテストスイート

テスト	説明	リリースバージョン
テスト実行が終了したときに実行スイートの進行状況を更新する	実行状況の進行状況を検証します。	Madrid
準備完了ステータスではないテストを割り当てることができない	テストの割り当てを検証します。	Madrid
テストの進行状況をテスト計画とテストサイクルのためにロールアップする	テスト計画とテストサイクルについてテストの進行状況を検証します。	Madrid

関連情報

クイックスタートテスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

を使用したテスト テスト管理 2.0

テスト管理 2.0は、リリースのフェーズのテスト、市場投入前の一連の機能または製品のテスト、統合とアクセシビリティに関するリリース準備テストの実行 (新しいソフトウェアの場合) などの一般的なテストに使用できます。

一般的なテストは、次のステップで構成されます。

1. テストを作成します。「テスト管理 2.0 でのテストの作成」を参照してください。
2. テストセットを作成し、類似のテストをテストセットにグループ化します。「でテストセットを作成しますテスト管理 2.0」を参照してください。
3. テストボード機能を使用してテスト計画を作成します。「でテストボード を使用してテスト計画を作成する テスト管理 2.0」を参照してください。
4. テストボードの [計画] タブでテスト計画を構成します。
   - テスト計画をテストサイクルに分割して、テスト作業のフェーズを計画およびスケジュールします。「でのテストサイクルとテスト実行スイートの追加と変更 テスト管理 2.0」を参照してください。
   - テストサイクルをテスト実行セットに分解してテストをスケジュールし、それらのテストを実行するユーザーをアサインします。「でのテスト実行スイートの作成 テスト管理 2.0」を参照してください。
5. テストを実行し、テスト実行結果を表示します。「でテストのアサインを実行する テスト管理 2.0」を参照してください。

テスト管理 2.0 でのテストの作成

正しく機能しているかどうかを判定するために使用される条件またはステップを指定するテストを作成します。

始める前に

必要なロール：sn_test_management.tester または sn_test_management.test_manager

手順

1. 次のいずれかのオプションを使用して、テストを作成します。
2. [テストバージョン] フォームで、テスト名を入力し、テストのステップを追加します。
3. **[Submit** (送信)] を選択します。
4. [テスト] のリストから、作成したテストを開きます。
5. [テストバージョン] 関連リストから、作成したテストバージョンを開きます。

テストバージョンフォーム

フィールド	説明
テスト	テストの一意の名前。
所有者	テストを作成したオーナー。
バージョン	自動生成されたバージョンのテ
状況	テストの現在のステータス。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	○ ドラフト：テストが作成され ○ 準備完了：編集できない場合 数のバージョンがある場合、 「準備完了」ステータスにな ○ 廃止：利用されなくなったと
簡単な説明	テストに関する簡単な説明。
ステップを追加	テストにステップを追加するた
ステップ順序の変更 ()	テストステップの順序を変更す イコンを選択し、必要な場所に このアイコンは、テストステッ
検証が必要	検証のためにテストステップを チェックボックス。 このアイコンは、テストステッ ます。 このチェックボックスが選択さ 行時にこのステップが合格、失 るかどうかを確認する必要はあ
テストステップを削除 ()	テストステップを削除するため
実行	ステップを実行するために使用 了」ステータス の場合にのみ表 「でテストのアサインを実行す てください。
更新	テストバージョンの詳細を更新
準備完了	テストバージョンのステータス に使用されるボタン。
新規バージョンを作成	別バージョンのテストを作成す
削除	テストバージョンの詳細を更新

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

6. [**Submit** (送信)] を選択します。

テストバージョンフォームの例

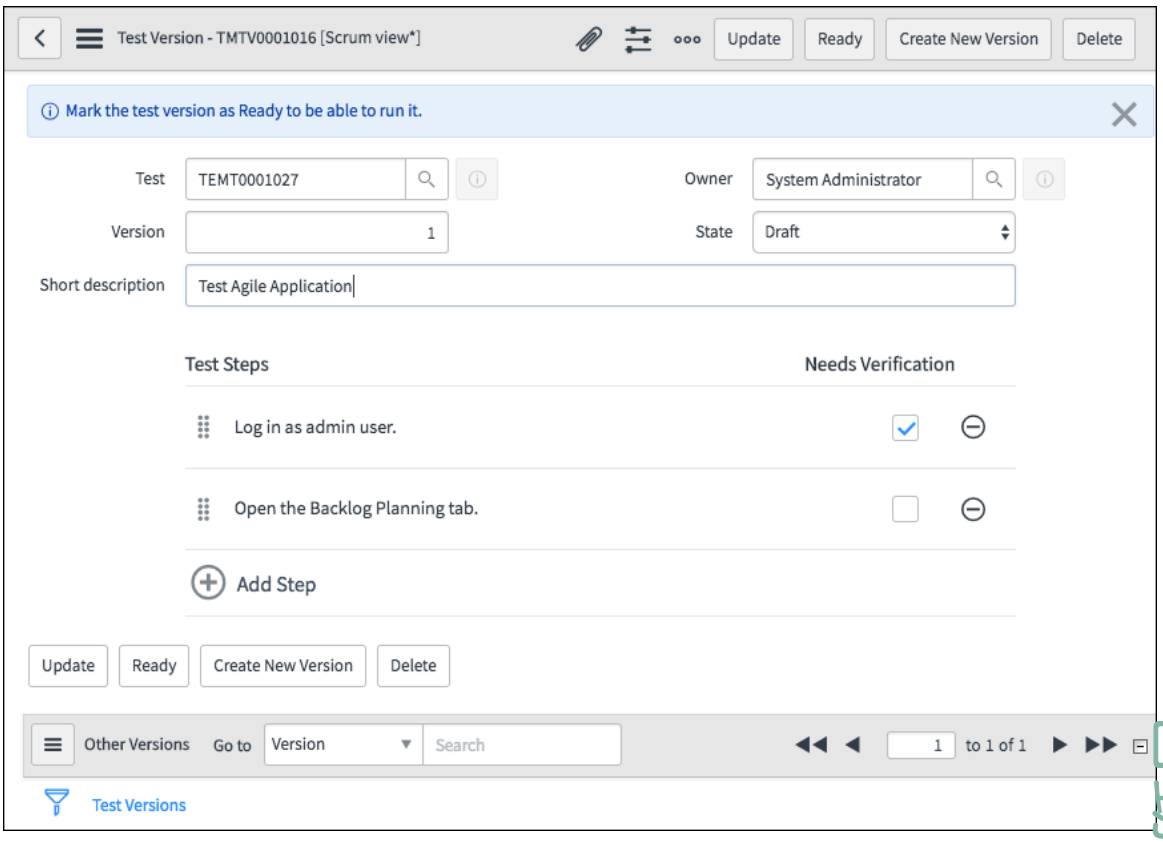

次のタスク
テストセットにテストを追加するには：

1. [テスト] リストからテストを選択します。
2. [テストセットに追加] をクリックします。

でテストセットを作成しますテスト管理 **2.0**

関連するテストをテストセットにグループ化します。テストセットは、カテゴリ別またはタグ別にテストを見つけるのに役立ちます。

始める前に
必要なロール：sn_test_management.tester または sn_test_management.test_manager

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 **2.0** > テストセット.
2. [**New**] をクリックします。
3. テストセットの名前を入力し、[送信] をクリックします。

次のタスク
テストセットにテストを追加する必要があります。

1. 移動先 テスト管理 **2.0** > テスト.
2. 必要なテストを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [テストセットに追加] をクリックします。
4. [テストセットを選択] ウィンドウで、必要なテストセットを検索し、[追加] をクリックします。

のテストボード テスト管理 2.0


テストボードは、テスト計画の包括的なビューを提供し、テスト計画をより効率的に管理できるようにします。

テストボードでは、次のことができます。

- すべてのテスト計画を集計し、1 つの場所でカードとして表示します。各カードには、開始日と終了日、合格したテストの割合、失敗したテストの割合、ブロックされたテストの割合、完了までの残り日数など、テスト計画の重要な詳細が表示されます。
- 名前、期間、所有者などのフィルター条件を定義して、特定のテスト計画を検索します。
- 単一のインターフェイスからテスト計画を追跡、管理、および完了することで、時間と労力を節約できます。

1. テスト計画を作成して、製品または機能をテストする方法を定義します。
2. [計画] タブでテスト計画を構造化します。テスト計画をテストサイクルに分割して、テスト作業のフェーズを計画およびスケジュールします。さらに、テストサイクルをテスト実行セットに分解し、テストをスケジュールし、それらのテストを実行するユーザーをアサインします。
3. テスト計画の進捗状況と完了を監視します。

テストボードのテスト計画の集計ビュー

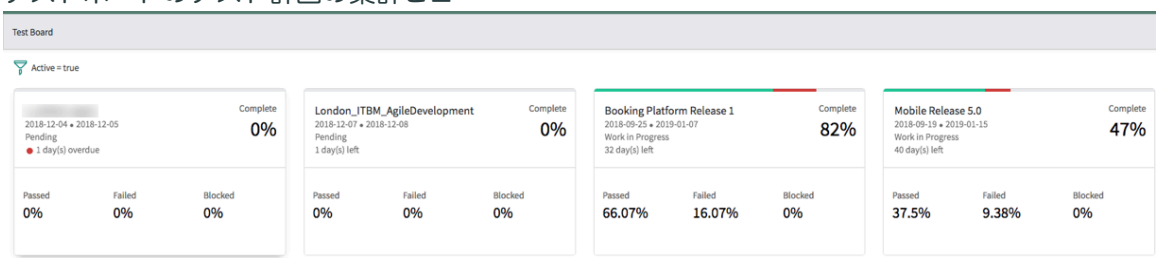

タスクの計画

テスト計画はテストボードの [計画] タブで構成できます。このタブには次の機能があります。

テスト計画作業アイテム階層

テスト計画作業アイテム階層では、さまざまなテスト計画情報が展開可能な行に表示されます。テスト計画内にネストされたテストサイクルとテスト実行スイートとともに、テスト計画の簡単な概要を提供します。

さらに、次のことができます。

- 各フォームを開いてフィールド値を 1 つずつ変更するのではなく、テスト計画、テストサイクル、およびテスト実行スイートの属性 (開始時間や終了時間など) を変更します。
- テストサイクルとテスト実行スイートを追加または削除し、開始日と終了日を調整してから、テスト計画の全体的な進捗状況を評価します。
- テスト計画作業アイテム階層に表示される列を構成します。

ガントチャート


ガントチャートでは、青いタスクバーを使用して、テスト計画とその子タスクのタイムラインを視覚的に表現できます。テスト計画に関連するタスクバーの長さは、子タスク

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

の期間の調整に応じて増減します。タスクバーの端を必要な場所にドラッグして、期間を手動で増減することもできます。

[計画] タブのテスト計画作業アイテム階層とガントチャート

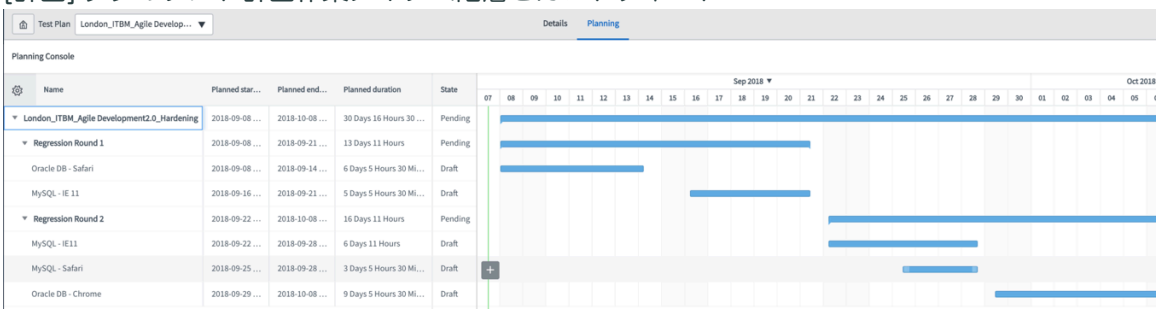

でテストボード を使用してテスト計画を作成する テスト管理 **2.0**

テスト計画を作成して、製品または機能をテストする方法を定義します。

始める前に
必要なロール：sn_test_management.test_manager

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 **2.0** > ボードをテストします。.
2. [テスト計画の作成] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

テスト計画フォーム

フィールド	値
名前	テスト計画の一意の名前。
開始予定日	テスト計画の実行を開始する予定日時。

4. [**OK**] をクリックします。
   [詳細] タブが開きます。
5. テスト計画の詳細を提供、レビュー、および編集します。

フィールド	値
終了予定日	テスト計画の実行を終了する予定日時。
期間	テスト計画の予定期間。これは、開始予定日と終了予定日の差です。
番号	テスト計画に対して自動的に生成される一意の ID 番号。
所有者	テスト計画を作成したオーナー。
状況	テスト計画の現在のステータス。 ○ [処理待ち]：テスト計画を実行する準備ができていません。 ○ [オープン]：テスト計画を実行する準備ができています。 ○ [対応中]：テスト計画は現在実行中です。 ○ [完了してクローズ]：テスト計画は完了後にクローズされました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	値
	○ [未完了でクローズ]：テスト計画は完了せずにクローズされました。 ○ [スキップしてクローズ]：テストは実行されずにクローズされました。
説明	テスト計画の説明。

注:
[進捗状況] セクションには、テスト計画の全体的なステータスが表示され、テスト計画内で合格、不合格、またはブロック済みのテストの割合が示されます。

でのテストサイクルとテスト実行スイートの追加と変更 テスト管理 2.0

複数のユーザーインターフェイスやフォームを切り替えることなく、単一のユーザーインターフェイスからテストサイクルとテスト実行スイートを追加および変更できます。

始める前に
必要なロール：sn_test_management.test_manager

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 **2.0** > ボードをテストします。.
2. テスト計画を選択します。
3. [計画] タブを選択します。
4. テスト計画作業アイテム階層でテスト計画とテスト実行スイートを追加または変更します。
5. ガントチャートで概要を表示したりタスクの期間を調整したりします。

のテストボードの [計画] タブ でカスタム列を定義する テスト管理 2.0

[計画] タブの [テスト計画作業アイテム階層] セクションに重要な情報を表示するカスタム列を定義します。たとえば、完了したテスト計画の割合を表示する列を定義します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 **2.0** > 設定 > 計画立案コンソール.
2. ページの右上隅にある歯車アイコン ( ) をクリックします。
3. [システム設定] ウィンドウで、次の操作を実行します。
   a. [開発者] セクションをクリックします。
   b. [アプリケーション] リストで、[テスト管理] を選択し、ウィンドウを閉じます。
4. [計画立案コンソール表示列] 関連リストで、[新規] をクリックします。
5. [計画立案コンソール表示列] フォームで、列のラベルとその他の詳細を入力します。
6. [送信] をクリックします。

次のタスク
列を作成したら、その列を必要なテーブルに関連付けます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

でのテスト実行スイートの作成 テスト管理 **2.0**

テストの労力を最小限に抑え、テスト実行スイートのテスト計画とテストサイクルを作成する際のオーバーヘッドを避けたい場合は、簡単なテスト計画を作成します。

始める前に

必要なロール：sn_test_management.test_manager

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 **2.0** > テスト実行スイート.
2. フォームのフィールドに入力します。

[テスト実行スイート] フォーム

フィールド	説明
名前	テスト実行スイートの一意の名前。
開始予定日	テスト実行スイートを開始する予定日時。
終了予定日	テスト実行スイートを終了する予定日時。
計画された期間	テスト実行スイートの予定期間。この期間は、開始予定日と終了予定日の差です。
番号	テスト実行スイートに対して自動的に生成される番号。
状況	テスト実行スイートの現在のステータス。
アサイン先グループ	テスト実行スイートに取り組んでいるグループ。

テスト実行フォームの [進行状況] セクション

フィールド	説明
完了率 (%)	完了したテスト実行スイートの割合。この値は自動的に計算されます。
合格率 (%)	合格したテスト実行スイートの割合。この値は自動的に計算されます。
失敗率 (%)	失敗したテスト実行スイートの割合。この値は自動的に計算されます。
ブロック率 (%)	ブロックされたテスト実行スイートの割合。この値は自動的に計算されます。

3. [送信] をクリックします。

次のタスク

- テスト実行スイートにテストを追加するには、[テストを追加] をクリックします。[テスト] リストから必要なテストを選択し、[実行スイートに追加] をクリックします。
- テスト実行スイートにテストセットを追加するには、[テストセットを追加] をクリックします。[テストセット] リストから必要なテストセットを選択し、[実行スイートに追加] をクリックします。
- [テスト実行のアサイン] 関連リストで、テストを選択し、ユーザーにアサインします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

でテストのアサインを実行する テスト管理 **2.0**

テストのアサインを実行し、結果をキャプチャします。

始める前に
必要なロール：sn_test_management.tester

手順

1. 移動先 すべて > テスト管理 **2.0** > 自分にアサインされたテスト.

2. 必要なテストを選択し、[実行] をクリックします。

> **注:**
> [準備完了] ステータスのテストのみ実行できます。

3. ポップアップで、テストを実行する必要がある実行環境を選択します。

4. [テスト実行] ポップアップで、次のアイコンを使用してステップを合格、不合格、またはブロックとしてマークします。
一時停止して後でテストを行うには、[一時停止] をクリックします。

5. [完了] をクリックします。

タスクの結果
テスト結果はテスト結果フォームに保存されます。テストの全体的なステータスは、テストステップのステータスによって定義されます。

- すべてのテストステップに合格した場合、テストのステータスは [合格] になります。
- テストの少なくとも 1 つのステップが実行されていない場合、テストのステータスは「未完了」になります。
- テストの少なくとも 1 つのステップが不合格の場合、テストの全体的なステータスは 「不合格」になります。このルールは、前のルールよりも優先されます。
- テストの少なくとも 1 つのステップがブロックされている場合、テストの全体的なステータスは「ブロック」になります。このルールは、前の 2 つのルールよりも優先されます。

次のタスク
ですべてのテスト結果を表示する テスト管理 **2.0** > テスト実行.

スプリントテスト

テスト管理 2.0 と アジャイル開発 2.0 を組み合わせて使用すると、スクラムチームの作業をスプリントごとにテストできます。

スプリントテストは、次のステップで構成されます。

1. スプリントのストーリーのテストを作成します。

2. テストの実行、テスト結果の検証、ストーリーの終結を実施します。

テスト管理 **2.0**とアジャイル開発 **2.0**との統合

テスト管理 2.0とアジャイル開発 2.0の統合により、以下からスプリントテストを実行できます **Agile Development 2.0** > アジャイルボード > スプリント追跡.

- スプリントに対して実行するテストを見つけます。
- スプリントのストーリーのテストを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- テストの複数のバージョンを管理します。
- 一度に 1 つのバージョンのテストを実行します。
- 実行されたテストのバージョンを表示します。
- テスト実行の履歴をレビューします。
- ストーリーを閉じます。

ストーリーのテストを作成する

テストを作成し、テストにステップを追加して、さまざまなバージョンのテストを作成、維持します。テストは、ストーリーが正しく機能しているかどうかを判定するために使用される条件またはステップの集まりです。テストには、テストの成否を決定するための、予期される結果を含めることもできます。

始める前に

- 必要なロール：scrum_user または scrum_admin
- リストビューからテストを作成できるのは、アジャイル開発 2.0 が テスト管理 2.0 とともにインストールされている場合のみです。
- アジャイルグループのメンバーであることが必要です。

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード.
2. [スプリント追跡] タブをクリックし、[リスト] ビューを選択します。
3. 右上隅の [表示] リストから、[テスト] を選択します。
4. [テストの追加] をクリックします。
5. フォームのフィールドに入力します。

テストバージョンフォーム


フィールド	説明
テスト	テストの一意の名前。
所有者	テストを作成したオーナー。
バージョン	自動生成されたバージョンのテスト。
状況	テストの現在のステータス。 ○ ドラフト：テストが作成されたときの状態。 ○ 準備完了：編集できない場合のテストの状態。テストに複数のバージョンがある場合、一度に 1 つのテストのみが「準備完了」ステータスになります。 ○ 廃止：利用されなくなったときのテストのステータス。
簡単な説明	テストに関する簡単な説明。
ステップを追加	テストにステップを追加するために使用するボタン。
実行	ステップを実行するために使用するボタン。テストが「準備完了」ステータス の場合にのみ表示されます。「リストビューからテストを実行する」を参照してください。
更新	テストバージョンの詳細を更新するために使用されるボタン。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
準備完了	テストバージョンのステータスを「準備完了」に変更するために使用するボタン。
新規バージョンを作成	別バージョンのテストを作成するために使用するボタン。
削除	テストバージョンの詳細を更新するために使用されるボタン。
ステップ順序の変更 (☰)	テストステップの順序を変更するために使用するアイコン。アイコンを選択し、必要な場所にステップをドラッグします。
検証が必要	検証のためにテストステップをマークするために使用するチェックボックス。
テストステップを削除 (⊖)	テストステップを削除するために使用するアイコン。

テストバージョンフォームの例

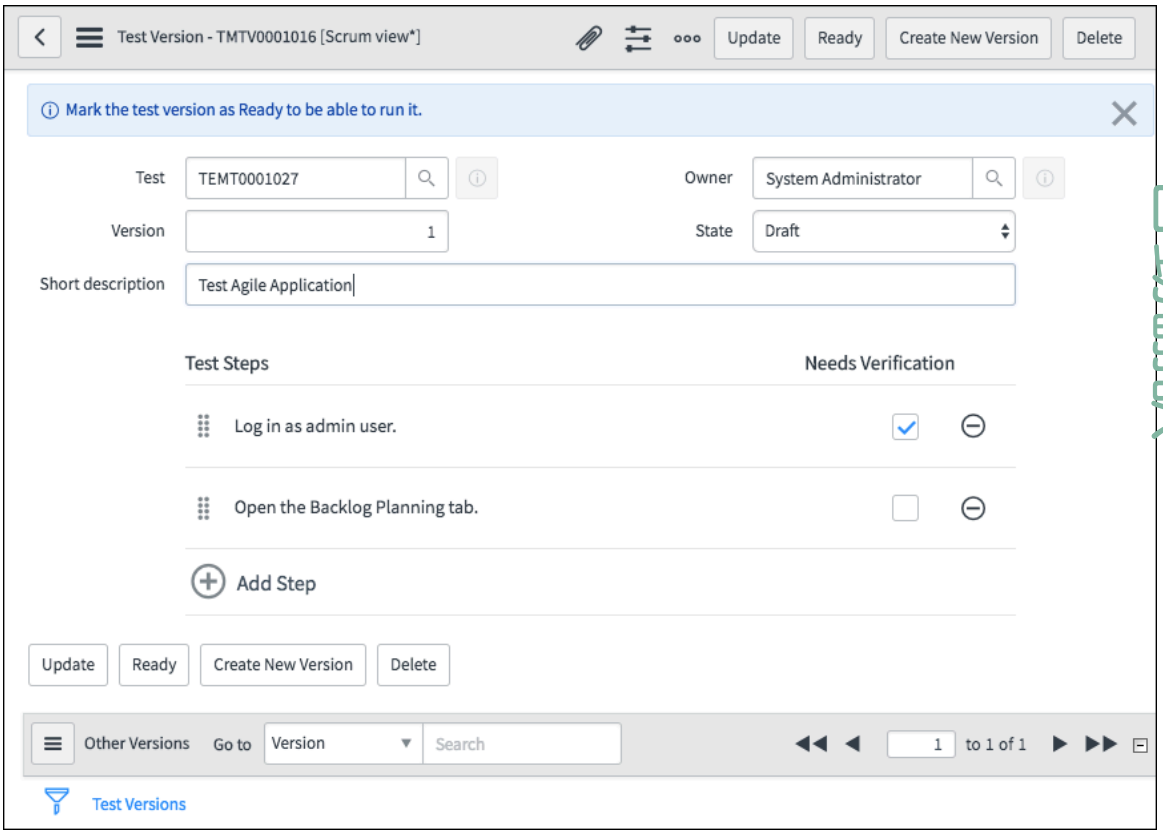

次のタスク
次の関連リストの情報を確認してください。

関連リスト	説明
その他のバージョン	テストのすべてのバージョンを表示します。
テスト結果	各テストバージョンの実行結果を表示します。
テストセット	テストセット内の関連するテストを表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リストビューからテストを実行する

テストシナリオを表示し、テストのすべてのステップを実行し、テスト結果をレビューします。

始める前に
必要なロール：scrum_user

手順

1. 移動先 すべて > アジャイル開発 > アジャイルボード.
2. [スプリント追跡] タブをクリックし、[リスト] ビューを選択します。
3. [テスト] をクリックします。
4. ストーリーの [実行] ボタンをクリックしてストーリーを検証します。
   このステップは、ストーリーのすべてのテストを一度に実行します。
5. ポップアップで、テストを実行する環境を選択します。
   a. [リストから参照] アイコンをクリックします。
   b. [実行] をクリックします。
6. [テスト実行] ポップアップで、次のアイコンを使用してステップを合格、不合格、またはブロックとしてマークします。
   - アイコンを選択するために、**Tab** キーを使用することもできます。**Tab** キーを押してから **Enter** キーを押します。
   - 一時停止して後でテストを行うには、[一時停止] をクリックします。
7. [完了] をクリックします。

タスクの結果
テスト結果がテスト結果フォームに保存され、各テストの最新のテスト結果がリストビューに表示されます。

テストの全体的なステータスは、テストステップのステータスによって定義されます。

- すべてのテストステップに合格した場合、テストのステータスは [合格] になります。
- テストの少なくとも 1 つのステップが実行されていない場合、テストのステータスは「未完了」になります。
- テストの少なくとも 1 つのステップが不合格の場合、テストの全体的なステータスは 「不合格」になります。このルールは、前のルールよりも優先されます。
- テストの少なくとも 1 つのステップがブロックされている場合、テストの全体的なステータスは「ブロック」になります。このルールは、前の 2 つのルールよりも優先されます。

テスト管理 1.0 からテスト管理 2.0 への移行

テストデータを テスト管理 1.0 から テスト管理 2.0 に移行し、拡張されたテスト機能のために テスト管理 2.0 の使用を開始してください。

非本番インスタンスで次の移行手順を実行し、移行が意図したとおりに完了するかどうかを確認してから、本番インスタンスで移行手順を実行します。

プラグインをアクティブ化する

テスト管理 2.0 (com.snc.test_management.2.0) およびテスト管理 2.0 - データ移行 (com.snc.test_migration_v1_v2) プラグインをアクティブ化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データの移行


移行プロセスでは、テストスイート、テストケース、およびテストを移動できます。


注:

- データモデルが大幅に変更されたため、テスト計画は移行できません。
- テスト管理 2.0 に移行されたテストスイート、テストケース、およびテストは、テスト管理 1.0 から削除されません。

テスト管理 2.0 に移行されたテストケースは、次の方法でテストバージョンに変換されます。

テスト管理 1.0：テストケース	テスト管理 2.0：テストバージョン
簡単な説明	簡単な説明
ドメイン	ドメイン
テストスイート	テストとテストセットの関係を作成します
必須条件	古いテストケースへのリンク

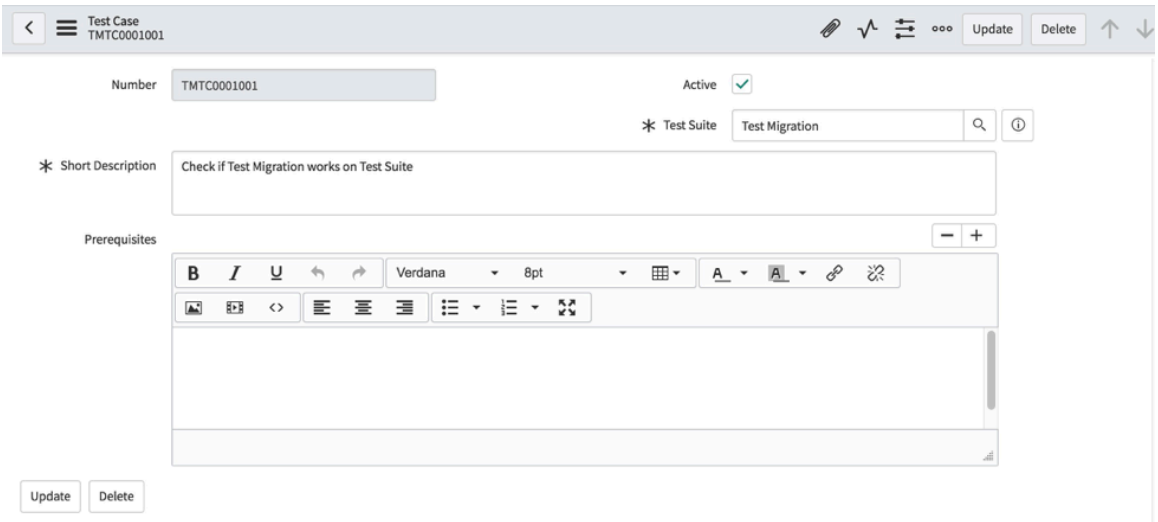

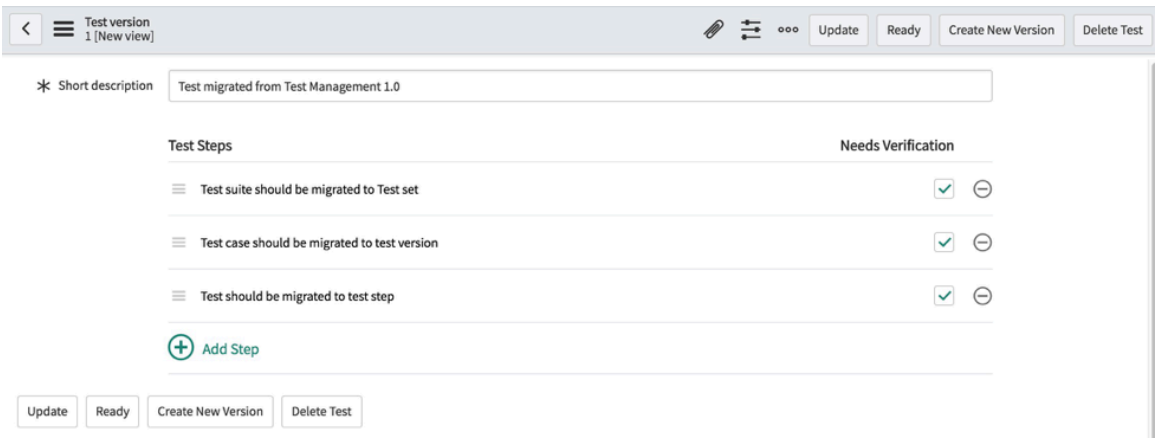

テスト管理 2.0 に移行されたテストは、次の方法でテストステップに変換されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テスト管理 1.0：テスト	テスト管理 2.0：テストステップ
順番	順番
ドメイン	ドメイン
詳細な説明	古いテストへのリンク
テスト	ステップ
テストデータ	古いテストへのリンク
期待する結果	検証ステップ

テスト管理 2.0 に移行されたテストスイートは、次の方法でテストセットに変換されます。

テスト管理 **1.0** のテストセット	テスト管理 **2.0** のテストセット
名前	名前
所有者	所有者
ドメイン	ドメイン

移行にカスタムフィールドを追加する

テスト管理 1.0 のテーブルにカスタムフィールドを追加した場合、そのフィールドを テスト管理 2.0 の対応するカスタム列に移動したいことがあります。このような場合は、スクリプトインクルード **TestMigrationTableMapping** のマッピング情報を上書きして、カスタムフィールドを移行に含めます。デフォルトのマッピングは、スクリプトインクルード **TestMigrationTableMappingBase** で提供されます。

テストスイートの変換

基礎となるテストケースとともに、テストセットおよびテストへの テストスイートの変換 を行います。

テストスイートの変換

テスト管理 1.0 のテストスイートを テスト管理 2.0 のテストセットに変換します。拡張されたテスト機能のために テスト管理 2.0 の使用を開始してください。

始める前に

- 必要なロール：admin
- テスト管理 2.0 - データ移行プラグイン (com.snc.test_migration_v1_v2) をインストールします。

手順

1. 移動先 すべて > テスト移行 > テストスイートを移行.
   テスト管理 1.0 で利用可能なテストスイートのリストが表示されます。
2. 必要なテストスイートを選択し、それらをテストセットに変換します。

付録 - テスト管理 **2.0**

テスト管理 2.0 は、テスト管理 1.0 に対していくつかの機能拡張を提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

こうした機能拡張は、次のカテゴリに分類できます。


- 機能拡張
- データモデルの機能拡張
- 使いやすさの向上

テスト管理 **2.0** の機能拡張

テスト管理 2.0 は、テスト管理 1.0 に対していくつかの機能拡張を提供します。

統合： アジャイル開発 **2.0**

テスト管理 2.0 と アジャイル開発 2.0 の統合により、スクラムチームに組み込みテスト機能が提供されます。テスト管理 2.0 を使用すると、スプリントのストーリーのテストを作成し、それらのテストの実行と完了を追跡することができます。スクラムマスターまたは製品オーナーは、テストされクローズされるストーリーについてのインサイトを得ることができます。

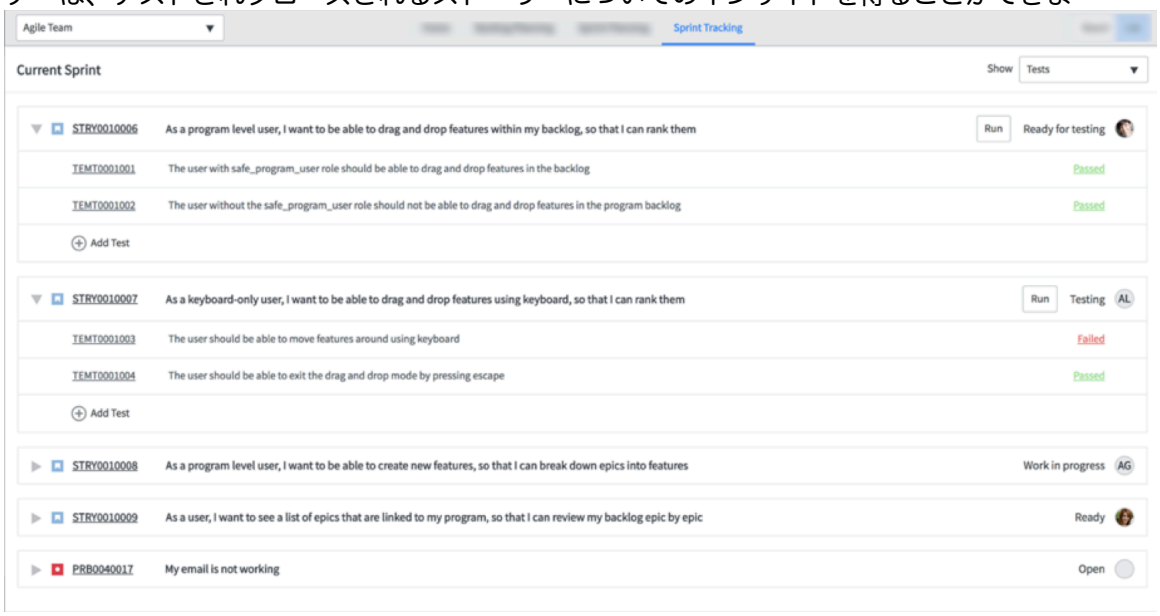

テスト管理 **2.0** のデータモデル拡張


テスト管理 2.0 は、テスト管理 1.0 に対していくつかのデータモデルの拡張を提供します。

強化されたトレーサビリティ


テスト管理 2.0 の各テストには、複数のバージョンを設定できます。テストバージョンが [準備完了] ステータスの場合、実行はできますが編集はできません。すべてのテスト結果は、テストの特定の実行と特定のバージョンに関連付けられています。このロジックにより、特定のテスト結果を受信したときに、いつでもテストの内容を確認でき


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

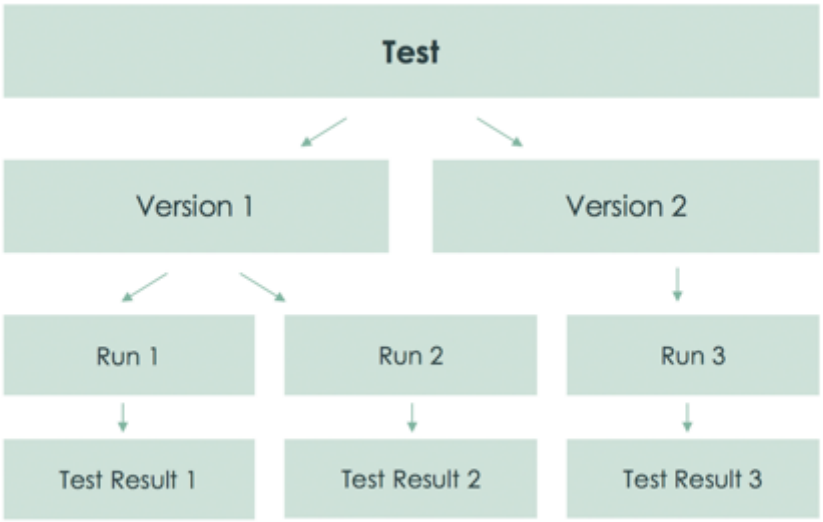

ます。

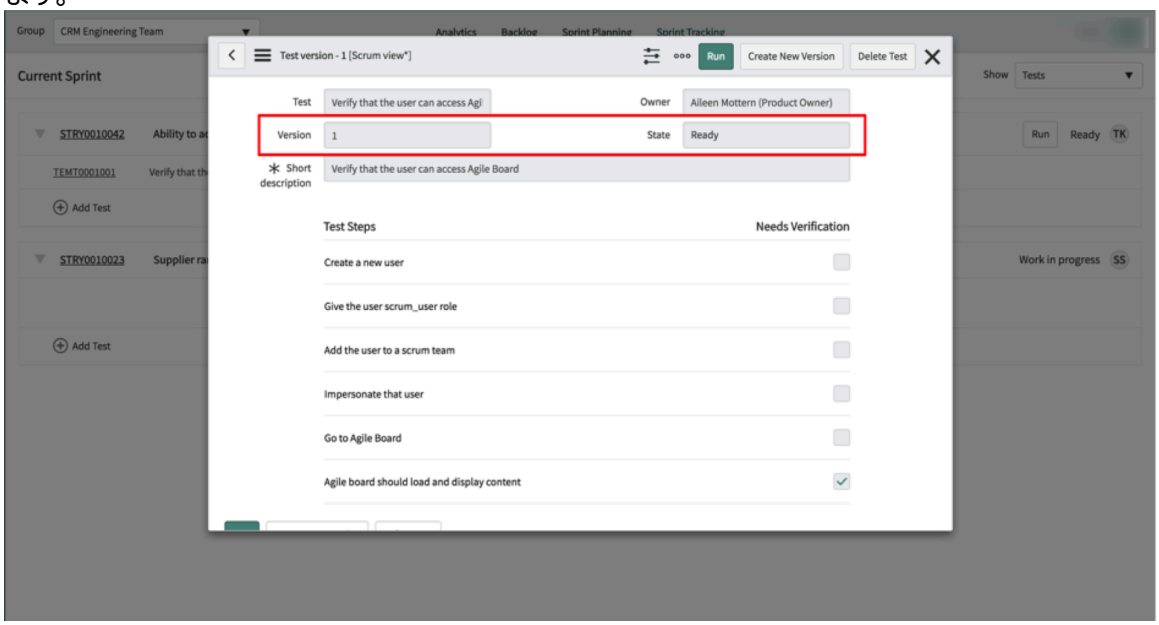

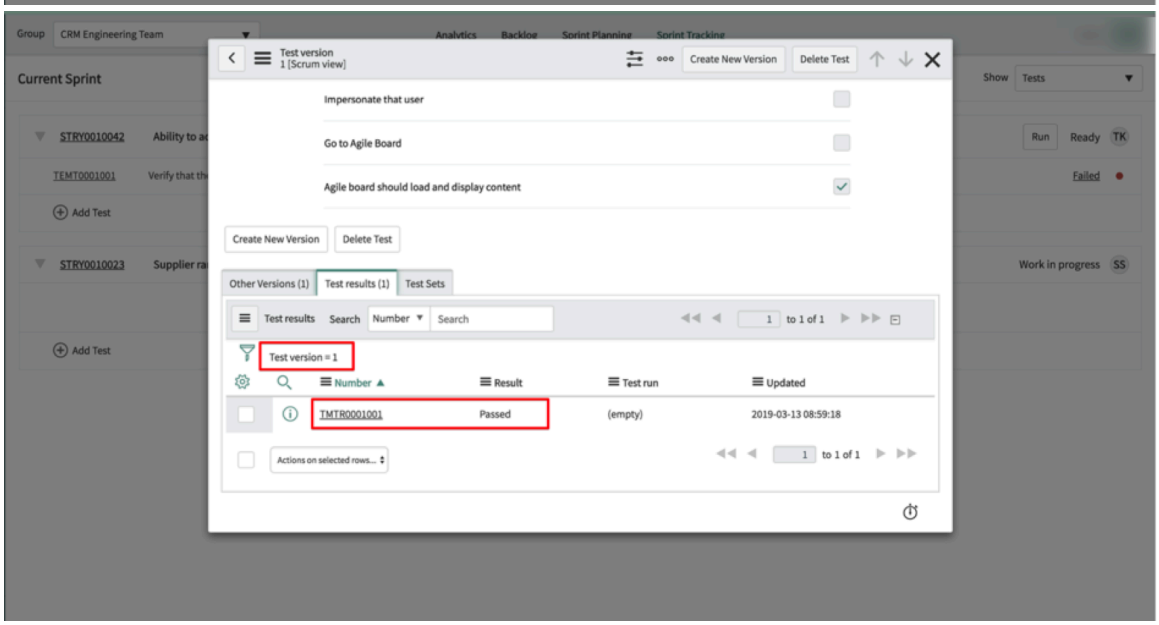


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


テストを整理するためのより柔軟なアプローチ

テストケースを 1 つのテストスイートにのみ配置できる テスト管理 1.0 とは異なり、テスト管理 2.0 のテストは複数のテストセットに配置できます。テストセットは、自由形式のテストのコレクションです。テストは、製品別、コンポーネント別、またはリリース別の任意のロジックを使用して、テストセットにグループ化できます。

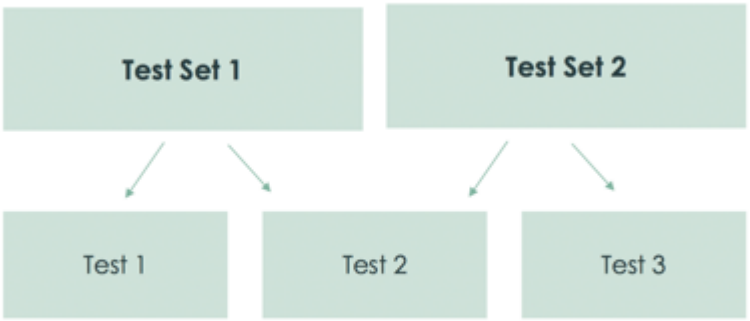

テスト計画による期間の定義

テスト管理 2.0 のテスト計画は、テストを実行する期間をキャプチャします。さらに、テスト計画をより小さな計画期間とテストサイクルに分割して、ユーザー受け入れテストや統合テストなどのより正確な計画を立てることができます。さらに、テストサイクルは、テストのスプリントに似たテスト実行スイートに分解できます。テスト実行スイートは、いつ誰がテストを実行する必要があるかを

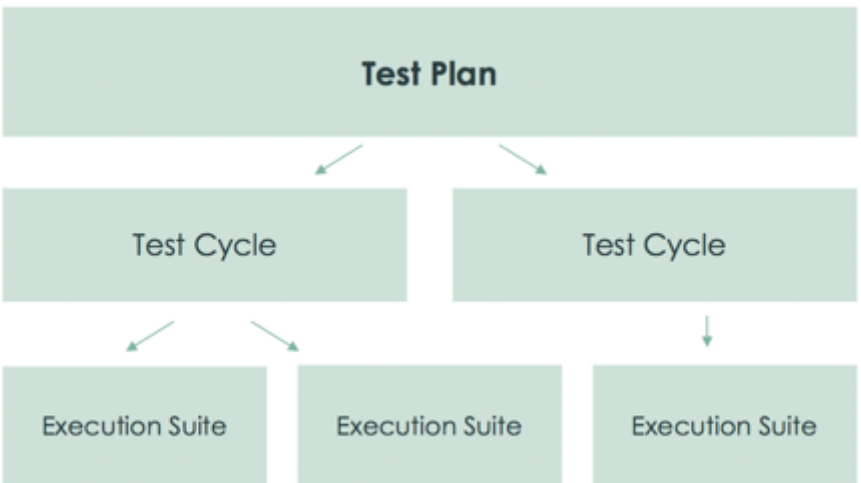

定義します。

テスト管理 **2.0** のユーザビリティ拡張


テスト管理 2.0 は、テスト管理 1.0 に対していくつかのユーザビリティ拡張を提供します。

[アジャイルボード] の [スプリント追跡] タブで、スプリントのストーリーのテストの実行を作成して追跡します。さらに、次のことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


- 各テストのテスト結果を表示します。
- ストーリーのすべてのテストを一度に実行します。

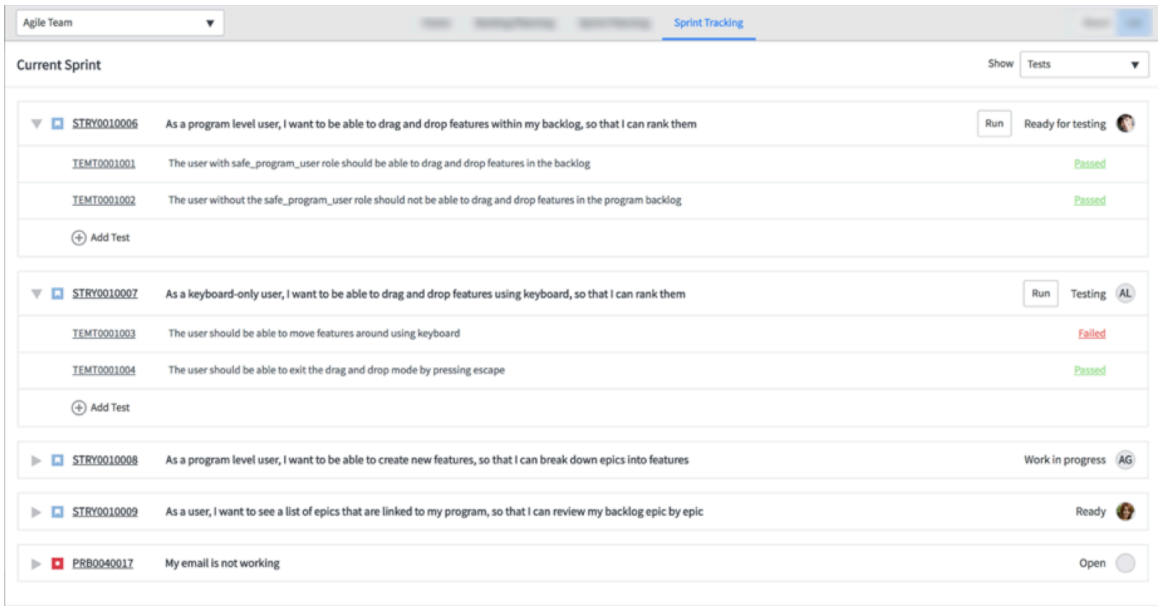

テストを簡単に作成する方法


テスト管理 2.0 は、テストを作成するための新しいユーザーエクスペリエンスを提供します。

- テストフォームのコンテキストを離れることなく、テストステップを作成できます。
- テストシナリオ全体を一度に作成できます。ステップの説明を入力し、Enter キーを押して次のステップに進みます。
- 期待される結果をキャプチャするために追加のレコードを作成する必要はありません。期待される結果は、検証ステップとしてマークされた別のテストステップとしてキャプチャできます。

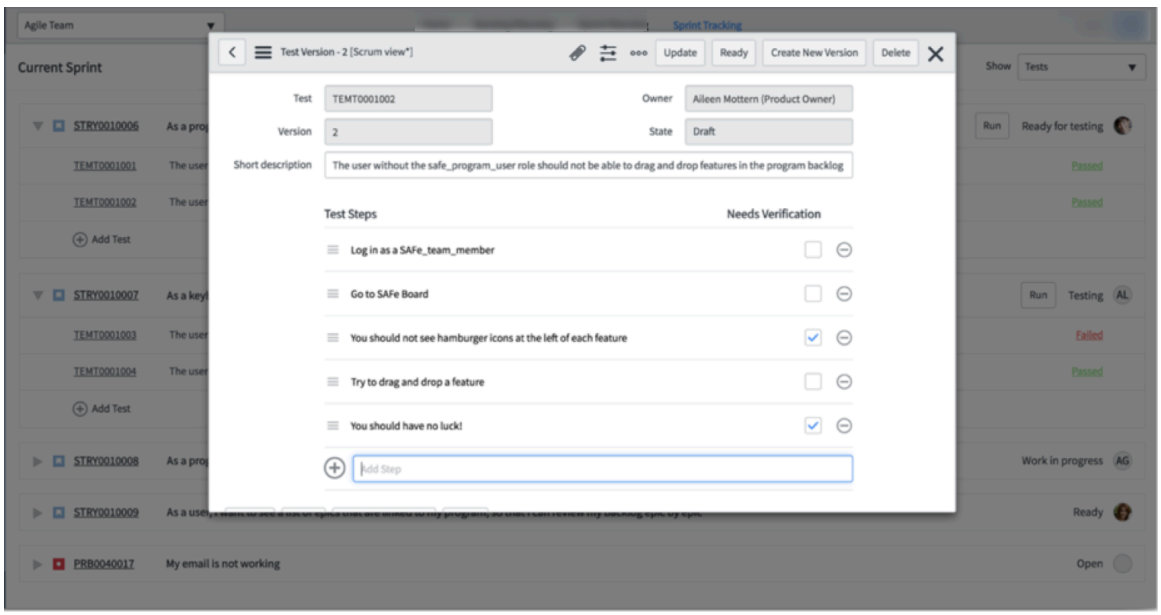

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


テストを実行するためのユーザーエクスペリエンスの向上

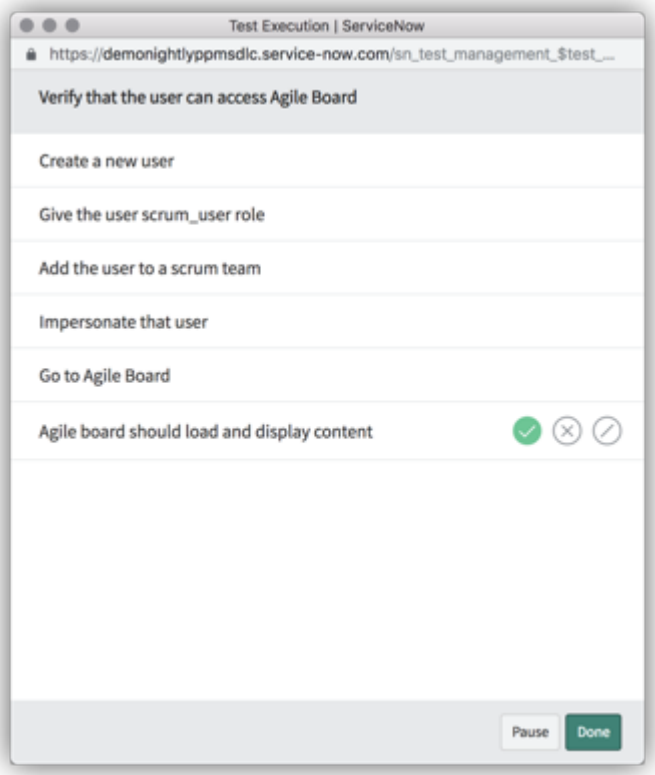

テスト管理 2.0 は、テストを実行するための新しいユーザーインターフェイスを提供します。インターフェイスが小さなブラウザウィンドウに表示され、テスト対象のシステムと並べて配置できます。ウィンドウを再起動しなくても、一度に複数のテストを行うことができます。ステップが失敗またはブロック済みとしてマークされるたびに、観察内容を記録するためのコメントと添付ファイルを追加できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

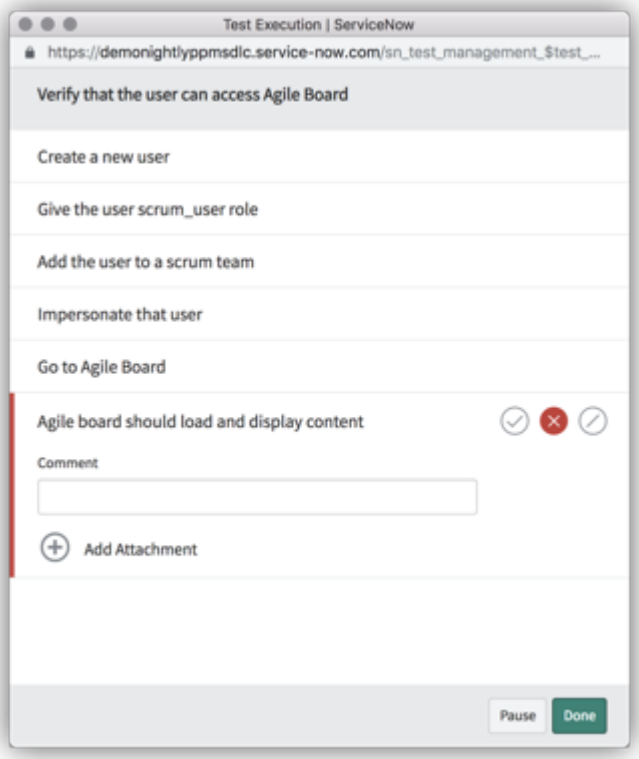


テスト計画を構造化する視覚的アプローチ

自動翻訳

テスト管理 2.0 は、テスト計画を作成および構造化するための専用のユーザーインターフェイスであるテストボードを提供します。テストマネージャーは、テスト計画、テストサイクル、およびテスト実行スイートを作成し、それらを実行する期間を定義できます。テストサイクルと実行スイートの名前は、ページを離れることなくインラインで編集できます。その後、テスト実行スイートにテストを入力し、それらのテストをテスターにアサインできます。

テストボードのテスト計画作業アイテム階層では、青いタスクバーを使用して、テスト計画とその子タスクのタイムラインを視覚的に表現できます。テスト計画に関連するタスクバーの長さは、子タスクの期間の調整に応じて増減します。タスクバーの端を必要な場所にドラッグして、期間を手動で増減することもできます。

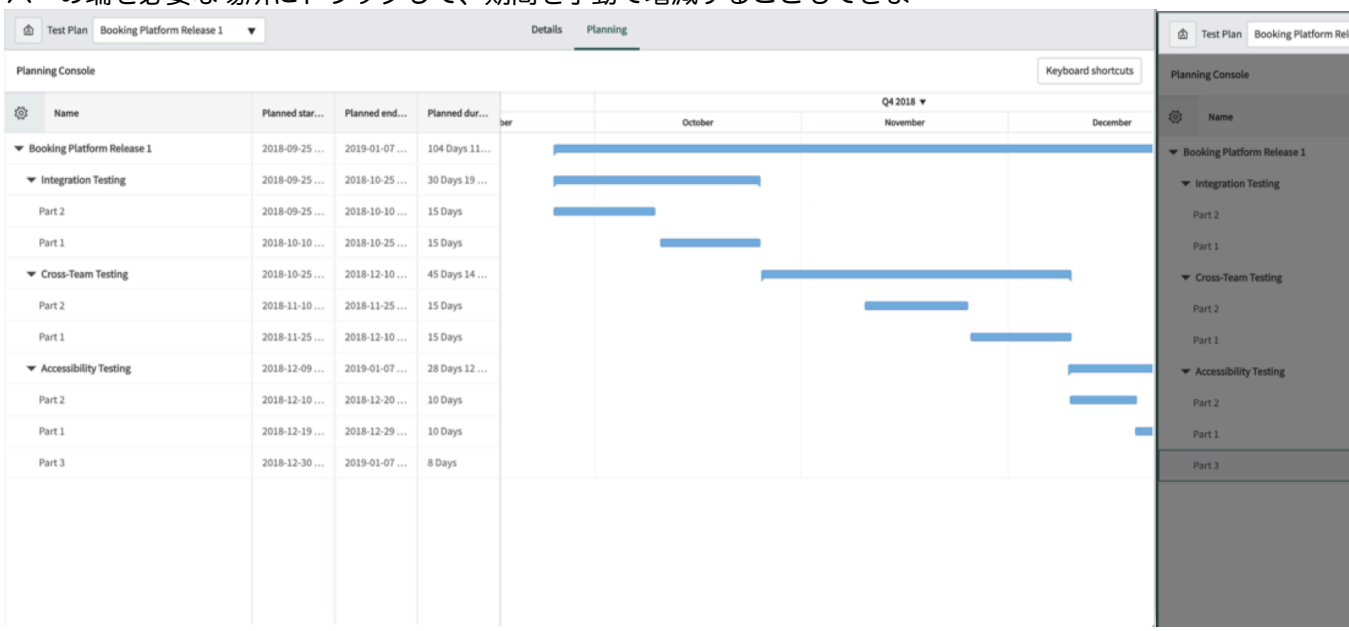

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

事業計画立案ポータル

事業計画には、ビジネスゴールとその目標を達成するための計画が含まれます。事業計画立案には、目標、事業部門、ビジネス機能、機能マップ、企業戦略、事業部門戦略など、事業のさまざまなエンティティが含まれます。事業計画者は、事業計画立案ポータルからこれらのエンティティを管理できます。

事業計画立案ポータルにアクセスするには、Business Planner (com.snc.apm.business_planner) プラグインを有効化する必要があります。このプラグインは、他の 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) プラグインのいずれかが既にインストールされている場合にのみインストールされます。


事業計画立案エンティティ、目標、事業部門、企業戦略、事業部門戦略、機能、および **Business Planner** モジュールの機能にアクセスします。

事業計画者のための事業計画立案ポータル

事業計画者は、ビジネスゴールを達成するためにビジネスエンティティを表示、作成、更新するなど、事業計画立案ポータルからさまざまなタスクを実行できます。さらに、事業計画者は次のことができます。 Use capability map for planning - Legacy 。

注:
事業計画者のロールには、ビジネスゴールを達成するためのエンティティの計画と管理のみが含まれます。ビジネスアプリケーションやビジネスをサポートするテクノロジーは扱いません。

事業計画立案ポータル

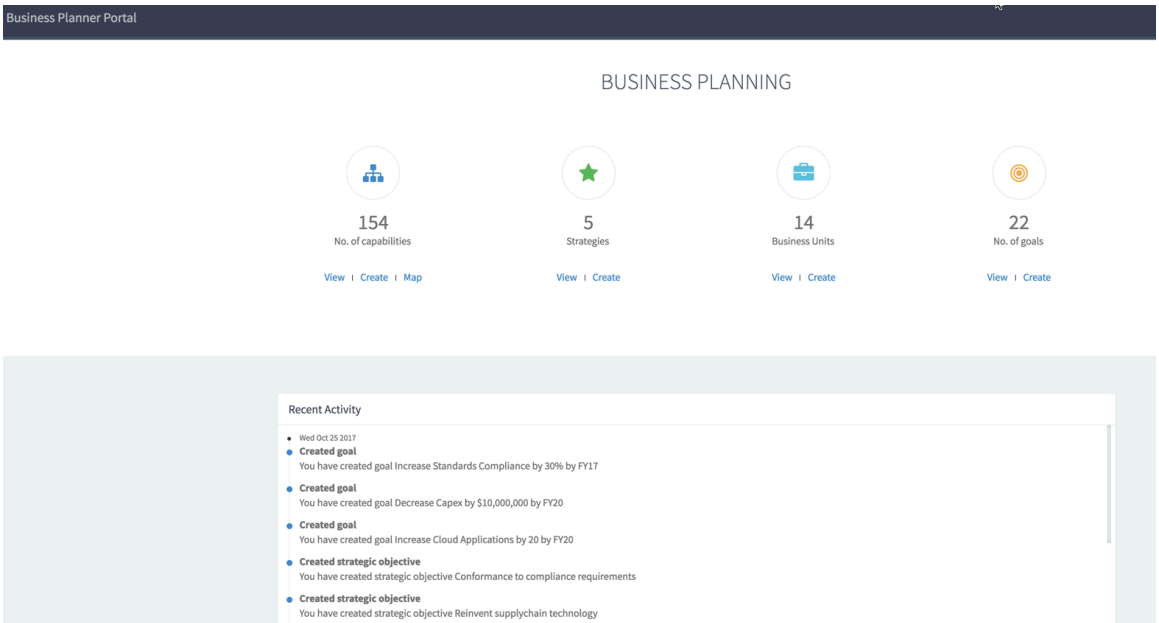

事業計画立案ポータルは、事業計画者が目標、事業部門、機能、および戦略を表示および作成するのに役立ちます。

機能の数

作成された機能の数を表示します。クリックすると、企業に対して定義された機能のリストが表示されます。 既存の機能が事業計画に準拠していない場合は、Create business capability and relate the capability with an application - Legacy 。

エンタープライズアーキテクチャ (以前の APM) をインストールしている場合は、[マップ] リンクを使用できます。[マップ] をクリックして、機能マップを起動します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戦略

作成された目標の数を表示します。クリックすると、事業計画に沿った戦略的目標のリストが表示されます。クリックすると、新しい事業計画を履行するための事業部門戦略を作成または企業戦略を作成します。戦略を目標に割り当てることもできます。

- 企業戦略は高位レベルにあり、事業部門戦略をその子レベルで割り当てることができます。
- 事業部門戦略は下位レベルにあり、企業戦略または事業部門戦略を親戦略として割り当てることができます。

事業部門

事業部門は、ビジネス機能を表す企業のセグメントです。組織内の既存の事業部門数を表示します。クリックすると、事業部門を作成し、その機能を定義します。

目標の数

事業計画を達成するために作成された目標の数を表示します。目標を多くの企業戦略および事業部門戦略に関連付けることができます。同様に、複数の企業戦略および事業部門戦略を複数の目標に関連付けることができます。リストから目標をクリックしてそのステータスを更新したり、タスクをアサインしたりします。アプリケーション戦略の目標を作成する ことできます。

最近のアクティビティ

作成した最近の目標、戦略的目標、および事業部門を表示します。

事業部門

事業部門は、経理、人事、IT など特定の業務を担当する組織の一部です。

事業部門は通常、部門で構成され、会社に関連付けられています。デフォルトでは、セグメントの階層には、事業部門、部門、およびベンダーのセグメントが含まれています。ベンダーとは、[ベンダー] オプションが選択されている会社です。セグメント設定では、事業部門、部門、またはベンダーに経費を割り当てたり、経費割り当てをロールアップしたりすることができます。ユーザー管理の一環として、部門と会社の両方を構成できます。

事業部門の作成

組織機能を定義する事業部門を作成します。ロールアップルールを作成し、経費をこれらの事業部門にロールアップするために階層の最上位セグメントを設定するには、事業部門も必要です。

始める前に
必要なロール：business_planner

手順

1. 移動先 すべて > 組織 > 業務部門.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します (表を参照)。
4. **[Save** (保存)] をクリックします。

[事業部門] フォーム

フィールド	説明
Name (名前)	事業部門の名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
Company (会社)	この事業部門に関連付けられている会社 (存在する場合)。[ベンダー] フィールドが選択されていない会社を含め、任意の会社を選択できます。
業務部門長	事業部門の責任者。
Description (説明)	事業部門の説明。
Parent (親)	別の事業部門を指します。[親] フィールドは、事業部門を階層要素として作成します。
Hierarchy level (階層レベル)	事業部門のレベルを示す番号またはテキスト。

[事業部門] フォームの [関連リスト] セクション

フィールド	説明
部門	この事業部門を構成する部門。必要な数の部門を追加します。

デフォルトでは、[部門] 関連リストは表示されません。必要に応じて、作成した事業部門レコードに部門関連リストを追加できます。部門関連リストを追加するには:

a. フォームヘッダーを右クリックし、 構成 > 関連リスト.

b. [利用可能] ボックスで [部門] アイテムを探し、[選択済み] ボックスに移動します。

c. **[Save** (保存)] を選択します。

企業戦略を作成する

事業計画者は、目標、事業部門、ビジネス機能、ビジネスの企業戦略、事業部門戦略などのビジネスエンティティを管理できます。企業戦略を作成して、事業計画を目標に合わせます。

始める前に

必要なロール：user_admin、business_planner

このタスクについて

組織戦略のパフォーマンスを理解するには、「Strategic Spend Tracking for PPM ダッシュボード」トピックを参照してください。プロジェクトの計画コスト、実際のコスト、メリットを、組織の戦略傾向に合わせて経時的にどのように調整するかを理解できる、包括的なビジュアルを提供します。

手順

1. 移動先 すべて > 事業計画者 > 企業戦略.

に移動することもできます 組織 > 企業戦略.

2. [新規] をクリックするか、レコードを開きます。

3. フォームフィールドに記入します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[企業戦略] フォーム

フィールド	説明
タイトル	企業戦略を説明する短いタイトル。
番号	システムによってアサインされた企業番号。
アサイン先	企業戦略がアサインされている人物。
開始日	企業戦略が有効になる日付。
終了日	企業戦略が有効である最終日の日付。
タイプ	この戦略に沿った組織戦略のタイプを選択します。
アクティブ	チェックボックスをオンにすると、企業戦略がアクティブになります。
説明	企業戦略に関する簡単な説明。

4. [送信] をクリックします。

次のタスク
[事業部門戦略] 関連リストを使用して事業部門の戦略を作成し、事業部門戦略を企業戦略、別の事業部門、または別の事業部門戦略に関連付けます。

関連情報
プロジェクトの戦略と目標の割合の割り当てまたは変更

事業部門戦略を作成する

事業部門は、経理、人事、IT などの特定の業務を担当する企業のセグメントです。これらの各事業部門は、企業または別の事業部門と連携した戦略を持つことができます。

始める前に
必要なロール：user_admin、business_planner

手順
1. 移動先 すべて > 事業計画者 > 事業部門戦略.

   に移動することもできます 組織 > 事業部門戦略.

2. [新規] をクリックするか、レコードを開きます。
3. フォームフィールドに記入します。

[事業部門戦略] フォーム

フィールド	説明
タイトル	事業部門戦略を説明する短いタイトル。
番号	システムに割り当てられた事業部門番号。
アサイン先	事業部門戦略がアサインされている人物。
開始日	事業部門戦略が有効になる日付。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
終了日	事業部門戦略が有効である最終日の日付。
事業部門	戦略を作成する事業部門。
戦略	事業部門戦略が準拠する組織の戦略的目標。
タイプ	この戦略に沿った組織戦略のタイプを選択します。
アクティブ	チェックボックスをオンにすると、事業部門戦略がアクティブになります。
説明	事業部門戦略に関する簡単な説明。

4. [送信] をクリックします。

次のタスク
事業計画立案ポータルで作成した戦略的目標を表示します。事業計画立案の戦略的目標のレコードを使用して、ステータス、アサイン先、有効期間、およびタイプを明確に可視化できます。

コスト管理

ServiceNow® コスト管理アプリケーションは、構成アイテムのコストを追跡します。コストは事業部門に割り当て、レポートで使用できます。

コスト管理では、次の機能が有効になります。

- レートカードを使用する。
- 構成アイテム (CI) コストを定義する。
- CI の 1 回限りのコストを追跡する。
- 経費ラインを生成するために、繰り返し発生する CI コストを処理する。
- 一括コストを複数の経費ラインソースに配分する。
- タスクとプロジェクトに関連するコストを追跡する。
- 構成アイテムのコストを集計し、ビジネスサービスまたはアプリケーションに総コストを課金する。
- 柔軟な割り当てルールで事業部門に経費ラインを割り当てる。
- コストセンターごとに計画および実際の予算コストを追跡する。

コスト管理オプション

次のコスト管理オプションを使用して、ビジネスコストを計画および管理します。

- 構成アイテム、契約、タスク、および賃金のコストを適切に追跡するためのレートカードを作成する。
- 経費ラインおよび経費割り当てルールを作成する。
- 構成アイテムのコストを集計し、リレーションシップパスを使用してビジネスサービスまたはアプリケーションに総コストを適用する。
- 配布コストと配布コストルールを作成して、レコードのグループ間でコストを分割する。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コスト管理を有効化

admin ロールを使用して、コスト管理プラグイン (com.snc.cost_management) を有効にします。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択します。

   注:
   ドメインセパレーションと代理アドミニストレーターがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーは [グローバル] ドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインのアクティブ化。
4. [有効化] を選択します。

   注:
   デモデータをロードするには、[デモデータのロード] チェックボックスをオンにします。

コスト管理 とともにインストールされるコンポーネント

コスト管理アプリケーションにはいくつかのコンポーネントがインストールされています。

デモデータはコスト管理で利用できます。デモデータは、サンプル予算、配布コスト、経費割り当て、契約レートカード、およびレードカードコストを提供します。

テーブル

コスト管理は、次のテーブルを追加します。

テーブル

テーブル	説明
割り当てユニット [allocation_unit]	ビジネスサービスのキャパシティと使用状況を追跡します。ビジネスサービスへの参照、キャパシティユニットの合計、割り当て済み、および残りを格納します。
予算 [fm_budget]	コストセンターのコレクションの計画および合計の経費配賦額を追跡します。
予算コストセンター [fm_budget_cost_center]	1 つ以上のコストセンターを予算に関連付けます。
CI コストセンターリレーションシップ [fm_cmdb_rel_cc]	コストセンターを、消費するビジネスサービスと使用するユニット数に関連付けます。これは、割り当てられたユニット数を計算して、割り当てユニットレコードを更新するために使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル (続く)

テーブル	説明
CI レートカード[fm_ci_rate_card]	構成アイテムとコストをリンクします。CI のグループに対して複数のレートカードを使用できるように、分類を定義することもできます。
CI レートカード[fm_ci_rate_card_cmdb_ci_m2m]	構成アイテムをレートカードに関連付けます。
契約レートカード[fm_contract_rate_card]	契約の詳細な価格情報を提供し、自動的に繰り返し経費を生成することができます。
配分コスト[fm_distribution_cost]	レコードのグループ間で分割できるコストを表します。たとえば、データセンター内の CI 間で分割できるデータセンターの電力コストなどです。
配分コストルール[fm_distribution_cost_rule]	コストを CI に配分する方法を決定します。
配布単位 [fm_distribution_units]	現在のレートカードにリンクされている構成アイテムに関連付けるユニットの数を格納します。
経費割り当て[fm_expense_allocation]	経費の値をターゲット参照に関連付けます。値は、割り当てルールを処理することによって経費ラインから生成されます。ターゲットは、その経費額の原因となるレコードです。一般的なターゲットは、コストセンター、部門、会社、グループ、およびユーザーです。
経費割り当てルール[fm_expense_allocation_rule]	経費ラインを経費割り当てに処理する方法を決定します。ロジックは、実行対象のテーブルと条件を定義することから始まります。選択したテーブルにリンクされている経費は、このルールによって評価されます。条件が満たされると、割り当てフィールド値によって定義された参照に対して、定義されたパーセンテージの割り当てが作成されます。詳細スクリプトを使用して、カスタム割り当ての生成を定義することもできます。
ファイナンシャルマネジメントログ [fm_log]	財務管理情報を記録して追跡したり、デバッグ用の資産にします。システムログテーブルを拡張します。
賃金レートカード[fm_labor_rate_card]	機能ロールに基づいて経費ライン生成の時給レートを定義します。
レートカード [fm_rate_card]	構成アイテムをレートカードに関連付けます。
レートカード[fm_recurring_rate_card]	繰り返し発生するコストの集合を表します。
レートカードコスト[fm_ci_rate_card_cost]	定期的な CI コストをレートカードに関連付けて、レートカードに関連付けられているすべての CI に適用されるようにします。
レートカードユーザー[clm_m2m_rate_card_user]	ユーザーをレートカードに関連付けます。
リレーションシップパス[fm_relationship_path]	親レコードや子レコードなどの構成アイテム間の関係を定義します。
タスクレートカード[fm_task_rate_card]	タスクコストを定義するレコードを保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザーロール

コスト管理は、次のユーザーロールを追加します。user_admin または admin ロールを持つユーザーは、適切なロールを割り当てることができます。

ユーザーロール

ロール	説明	ロールを含む
財務ユーザー (financial_mgmt_user)	財務ユーザーは財務プロセスに参加し、機能へのアクセスが制限されています。 割り当てユニットと経費配分の読み込みができます。レートカードと経費ラインの作成/読み込み/書き込みができます。固定資産、減価償却、配布コストの作成/読み込み/書き込み/削除ができます。	なし
財務アドミン (financial_mgmt_admin)	財務アドミニストレーターは、システム内の財務プロセスを管理します。 割り当てユニット、固定資産、減価償却、レートカード、配布コスト、経費ライン、経費配分の作成/書き込み/削除ができます。	financial_mgmt_user

プロパティ

コスト管理は、次のプロパティを追加します。

プロパティ

名前	説明
com.snc.time_card.default_rate	賃金レードカードがユーザーに適用されない場合に使用するデフォルトの時間単位のレートを設定します。
glide.cost_mgmt.calc_actual_cost	[予定タスク] の [タイプ] のタスクで経費ラインが作成されたときに、すべてのタスク経費ラインを合計し、タスクレコードの [作業コスト] フィールドにその合計を追加します。
glide.cost_mgmt.debug	コスト管理プロセスのデバッグを有効にします。すべてのログイベントは、ファイナンシャルマネジメントログ [fm_log] テーブルに記録されます。この機能は大量のログ記録を生成できるため、初期テスト中またはトラブルシューティングの際にのみ有効にするべきです。
glide.cost_mgmt.process_task_cis	タスク経費ラインを作成するときに、影響を受ける構成アイテムに対して経費ラインを作成します。デフォルト値は **false** です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	説明
glide.cost_mgmt.service_allocation.method	コストセンターの割り当てコストに対するビジネスサービスは、合計単位または割り当て単位に基づいて計算される必要があるかどうかを定義します。

UI ポリシー

コスト管理は、次の UI ポリシーを追加します。

UI ポリシー

名前	テーブル	説明
定額料金と請求レートフィールドを制御 (Control flat rate vs bill rate fields)	[fm_task_rate_card]	[作業時間を使用] チェックボックスがオンの場合、 [タスクレードカード] フォームで [タスクレート] フィールドを非表示にし、[デフォルトの賃金レート] フィールドを表示します。
[条件の定義] が無効になっている場合は非表示 (Hide if define condition disabled)	[fm_ci_rate_card]	[条件を定義] チェックボックスがオンの場合、[CI レートカード] フォームに [テーブル] および [条件] フィールドを表示します。
すべて有効になっている場合は親クラスを非表示 (Hide parent class if all enabled)	[fm_relationship_path]	[すべての親クラス] チェックボックスがオンの場合、[リレーションシップパス] フォームの [親クラス] フィールドを非表示にします。
1 回限りのコストの繰り返しフィールドを非表示 (Hide recurring fields for one time cost)	[fm_distribution_cost]	[繰り返し] チェックボックスをオフにすると、[配布コスト] フォームの [終了日] フィールドと [間隔] フィールドを非表示にします。
すべて有効になっている場合、リレーションシップタイプを非表示 (Hide relationship type if all enabled)	[fm_relationship_path]	[すべてのリレーションシップ] チェックボックスがオンの場合、[リレーションシップパス] フォームの [リレーションシップタイプ] フィールドを非表示にします。
[詳細フィールドを表示] を非表示 (Hide Show Advanced Field)	[fm_distribution_cost_rule]	[詳細] チェックボックスがオンの場合、[配分コストルール] フォームの [テーブル] および [条件] フィールドを非表示にし、[スクリプト] フィールドを表示します。
テーブルフィールドを非表示 (Hide table field)	[fm_labor_rate_card]	[賃金レードカード] フォームの [テーブル] フィールドを常に非表示にします。
配賦方法の値フィールドルールを変更 (Modify value field	[fm_contract_rate_card]	[コストを配賦] フィールドが [値ごとにコストを割り当ておよび配賦] に設定されている場合、[契約レートカード]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

UI ポリシー (続く)

名前	テーブル	説明
rules on distribution method)		フォームの [値]フィールドを読み取り専用から必須に変更します。
詳細の場合はスクリプトフィールドを表示 (Show script field if advanced)	[fm_expense_allocation_rule]	[詳細] チェックボックスがオンの場合、[経費割り当てルール] フォームに [スクリプト] フィールドを表示します。

クライアントスクリプト

コスト管理は、次のクライアントスクリプトを追加します。

クライアントスクリプト

名前	テーブル	説明
税コストの計算 - 基本コスト	[fm_rate_card]	契約レートカードレコードで、ベースコストの変更に基づいて税コストと総コストを計算します。
税コストの計算 - 売上税	[fm_rate_card]	契約レートカードレコードで、[消費税] オプションがオンの場合に総コストを計算します。
税コストの計算 - 税率	[fm_rate_card]	契約レートカードレコードで、税率の変更に基づいて税コストと総コストを計算します。
レートカードの終了日を設定 (Set Rate Card End Date)	[fm_contract_rate_card]	契約レートカードレコードで、契約に終了日がある場合、レートカードの終了日を契約の終了日に設定します。

ビジネスルール

コスト管理は、次のビジネスルールを追加します。

ビジネスルール

名前	テーブル	説明
合計で税金を計算する	[fm_recurring_rate_card]	[消費税]、[ベースコスト]、または [税率] フィールドの値が変更されたときに、[税率]、[税コスト]、および [総コスト] フィールドを更新します。
承認されたタイムカードから経費を作成 (Create expense from approved time card)	[time_card]	タイムカードが承認された後に経費ラインを作成します。
fm_calcBudgetValues	[fm_budget]	計画値または実績値が変更された場合、予算残額を更新します。
fm_レードカードコストを無効にする (fm_Disable rate card costs)	[fm_ci_rate_card]	レートカードが無効になっている場合、すべてのレードカードコストを無効にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルール (続く)

名前	テーブル	説明
fm_InsertBudget	[fm_budget]	新しいレコードが挿入されたときに、次の予算番号を含むメッセージを表示します。
fm_月フィールドを設定 (fm_Populate Month Field)	[fm_expense_allocation]	[経費日付 **(Expense date)**] フィールドに基づいて [月] フィールドに入力します。
fm_processExpenseAllocation	[fm_expense_line]	処理待ちのアイテムの経費ラインが作成されたときに経費割り当てルールを処理します。
fm_デフォルトの次のプロセスを設定 (fm_Set default next process)	[fm_ci_rate_card_cost]	新しい構成アイテムのレードカードコストに対し、デフォルトの次の処理日を設定します。
fm_デフォルトの次のプロセスを設定 (fm_Set default next process)	[fm_distribution_cost]	新しい配分コストに対しデフォルトの次の処理日を設定します。
fm_updateAllocationAvailable	[allocation_unit]	割り当てられたユニット数が更新されると、利用可能なユニット数を再計算します。
fm_updateAllocationUnits	[fm_cmdb_rel_cc]	ビジネスサービスに割り当てられたユニット数を再計算します。
次の処理日の検証 (Next process date validation)	[fm_contract_rate_card]	契約レートカードの次の処理日が開始日より後の場合、このビジネスルールは次の日付を開始日に設定します。
CI ごとに複数の割り当てを防止 (Prevent more than one allocation per ci)	[allocation_unit]	構成アイテムごとに複数の割り当てを防止します。
CI 関係を処理 (Process CI Relationships)	[fm_expense_line]	親関連アイテムを処理し、構成アイテムソース経費の経費ラインを生成します。タスクコストを、タスクソース経費の影響を受ける構成アイテム経費ラインに処理します。
タスクレードカードを処理する	[task]	タスクが非アクティブに設定されている場合にタスクレードカードを処理します。
契約を更新 (Update Contract)	[fm_contract_rate_card]	レートカードから契約にコストをロールします。総コスト、税コスト、または税率の値が変更されたときに、契約総コスト、税コスト、税率、およびベースコストを更新します。
計画タスク実績コストを更新 (Update Planned Task Actual Cost)	[fm_expense_line]	計画タスクソース経費の関連経費ラインから合計実績コストを計算します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルール (続く)

名前	テーブル	説明
レートカードの開始日と終了日を確認 (Verify rate card's start and end dates)	[fm_contract_rate_card]	レートカードの開始日が指定されていて、終了日より後ではないことを検証します。このビジネスルールでは、さらに • レートカードの開始日が契約の開始日より前ではなく、レートカードの終了日が契約の終了日より後ではないことを検証します。 • 値が未入力で、契約に終了日がある場合、レートカードの終了日を契約の終了日に設定します。

コスト管理のデモデータ


コスト管理で利用可能なデモデータには、その使用法を示すデータタイプのサンプルが用意されています。

本番データとの競合を防ぐため、デモデータは開発インスタンスまたはテストインスタンスにのみロードする必要があります。

概要のデータレビュー

コスト概要モジュールには、よく要求されるレポートが多数あります。

ビジネスサービスの概要

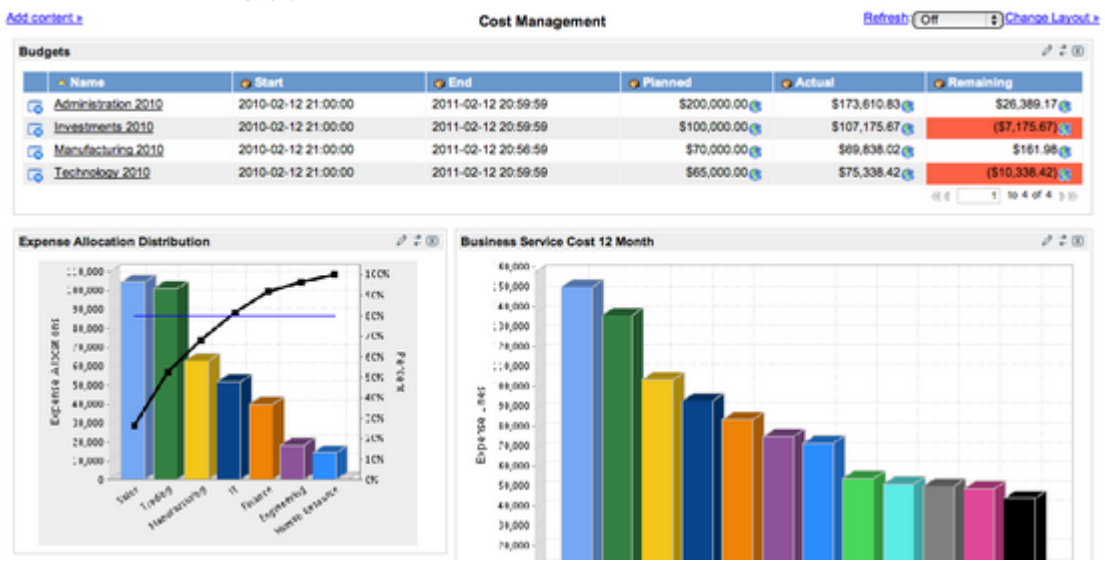

ビジネスサービスの概要


ビジネスサービスオーナーは、一定期間にわたってサービスを維持するためにかかるコストを知りたいと考えています。これには、依存 CI コストを収集し、ビジネスサービスレベルで表す必要があります。CI コストをビジネスサービスにロールアップするには、CI とサービスの間に関係が存在する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

デモデータには、依存 CI からのコストが含まれる多数のサービスが含まれています。[コスト概要] ホームページの **[12** か月間のビジネスサービスコスト] レポートには、次の情報の概要が表示されます。

コストレポート

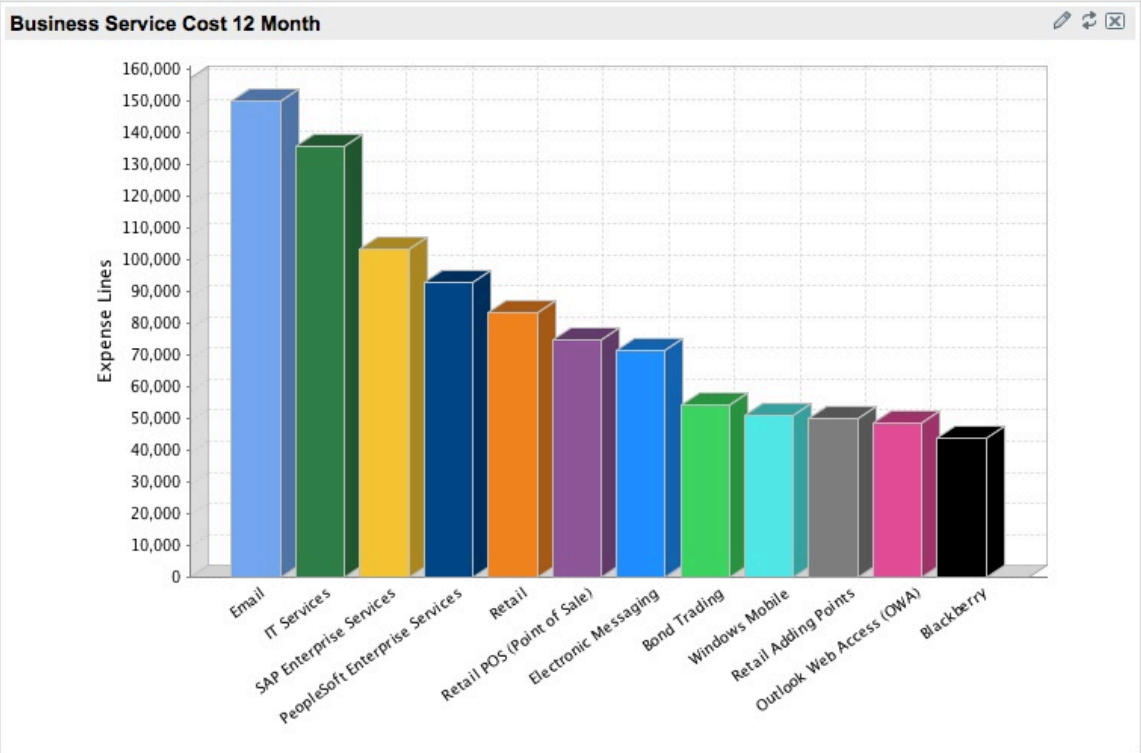

割り当ての概要


経費割り当てルールのコストを使用すると、ユーザー、グループ、部門、会社、コストセンターなどの 1 つ以上のビジネスエンティティにコストを割り当てることができます。割り当ての目的は、ビジネスで負担するコストを表すことです。これは、チャージバックまたは請求とは見なされませんが、請求のソースとして使用できます。経費割り当ての主な目的は、何らかの経費が発生したプロセスのコンシューマーを表すことです。

次の図は、コストセンターへの経費の分配を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


レポートの例

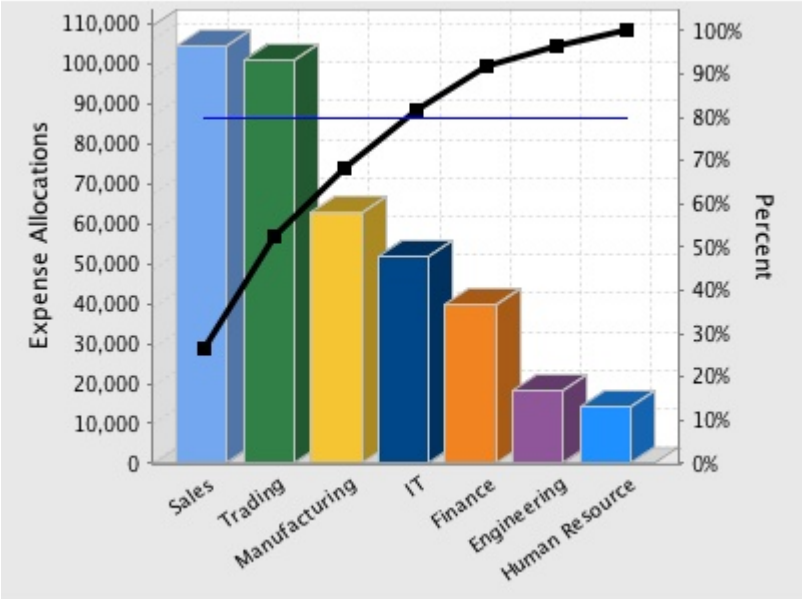

予算の概要

コストセンターに割り当てられた金額は、予定予算に対して追跡できます。予算は、コストセンターの集合、期間、およびその期間中にコストセンターに割り当てられると予想される金額を表します。この管理予算には 3 つのコストセンターが含まれており、この期間中にこれまでに $173,610.83 が発生しました。

予算デモ

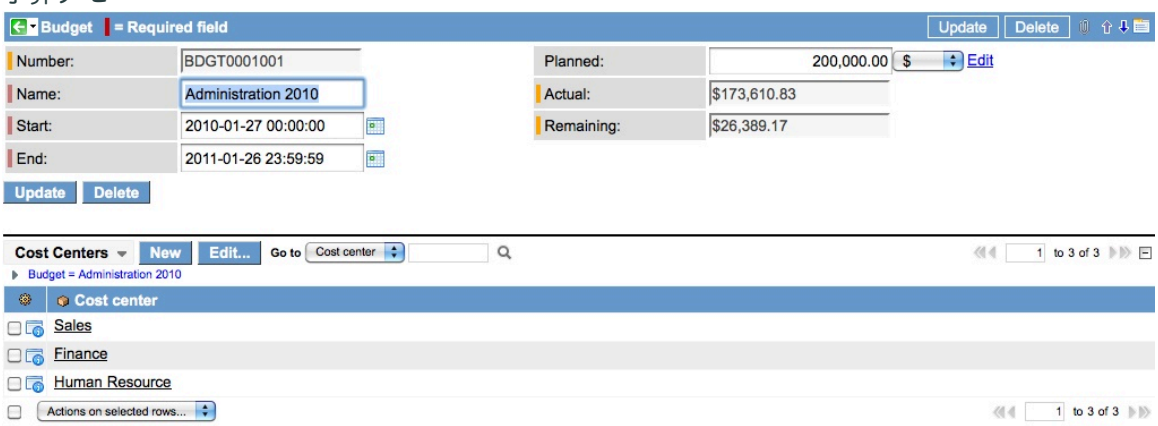

コスト概要モジュール

コスト概要モジュールには、さまざまなコスト管理レポートが表示されます。

財務アドミンや他のユーザーに主要なコスト管理情報のサマリービューを提供します。

コスト概要は一種のホームページです。

特定のロールを持つユーザーのみコスト概要モジュールにアクセスできます。詳細については、「コスト概要モジュールのロール」を参照してください。

コスト概要モジュールのロール

コスト概要モジュールをカスタマイズできるのは、特定のロールのみです。アクセス権を持つロールは、レポートの表示に加えて、更新、追加、削除、および再配置を行うことができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

コスト概要モジュールのロールアクセス権

ロール	アクセス
admin	表示、カスタマイズ
資産	表示、カスタマイズ
financial_mgmt_admin	表示
financial_mgmt_user	表示
procurement_user	表示
sam	表示

CI レートカード

構成アイテム (CI) レートカードは、複数の構成アイテムに関連付けられた繰り返し発生する構成アイテムコストのグループです。レートカードを使用すると、複数の構成アイテムで同じコストを簡単に入力して追跡できます。

レートカードは通常、すべてのコストが記録され割り当てられるフレームワークに従います。たとえば、ニューヨークのデータセンター内にある特定モデルのサーバーの契約コストは、マドリッドのデータセンターで稼働している同じサーバーモデルと異なる場合があります。各モデルには、コストの詳細が記載された個別のレートカードがあります。

財務アドミン (financial_mgmt_admin) および財務ユーザー (financial_mgmt_user) ロールを持つユーザーは、CI レートカードを管理できます。

CI レートカードを作成する

時給を指定する CI レートカードを追加し、レートコードを関連付けることができます。

始める前に
必要なロール：financial_mgmt_admin

手順

1. 移動先 すべて > コスト > コスト > **CI** レートカード.
2. [**New**] をクリックします。
3. 必要に応じてフィールドに入力します。

フィールド	説明
番号	[読み取り専用] CI レートカード識別番号。自動的に割り当てられます。
条件を定義	[条件] フィールドを使用してレートカードの構成アイテムをフィルターするかどうかを示すチェックボックス。
名前	CI レートカード名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
サマリータイプ	CI レートカードのカテゴリ：[ビジネスを成長]、[ビジネスを運営]、または [ビジネスを変革]。分類するとレポート作成に便利です。
有効	レート カードを使用できるかどうかを示すチェック ボックス。オフにすると、レートカードを無効にし、関連するすべてのレードカードコストを非アクティブ化します。
テーブル	構成アイテムの条件でクエリするテーブル。このフィールドは、[条件を定義] が選択されている場合に使用できます。
条件	指定されたテーブルに対してクエリする条件。このフィールドには、条件によってキャプチャされたレコードをプレビューするための条件数ウィジェットがあります。このフィールドは、[条件を定義] が選択されている場合に使用できます。
簡単な説明	レートカードの簡単な説明

CI レートカードに条件を追加する

CI レートカードに条件を追加する場合は、**[CI** リストを更新] 関連リンクを使用して、構成アイテム (1 つまたは複数) とレートカードの間の関係を作成します。

始める前に
必要なロール：financial_mgmt_admin

手順


1. 移動先 すべて > コスト > コスト > **CI** レートカード.
2. レートカードを選択します。
3. [条件を定義] を選択します。
4. 条件を作成します。
5. ヘッダー バーを右クリックし、[保存] を選択します。
6. [関連リンク] で、**[CI** リストを更新] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example

CI リストを更新

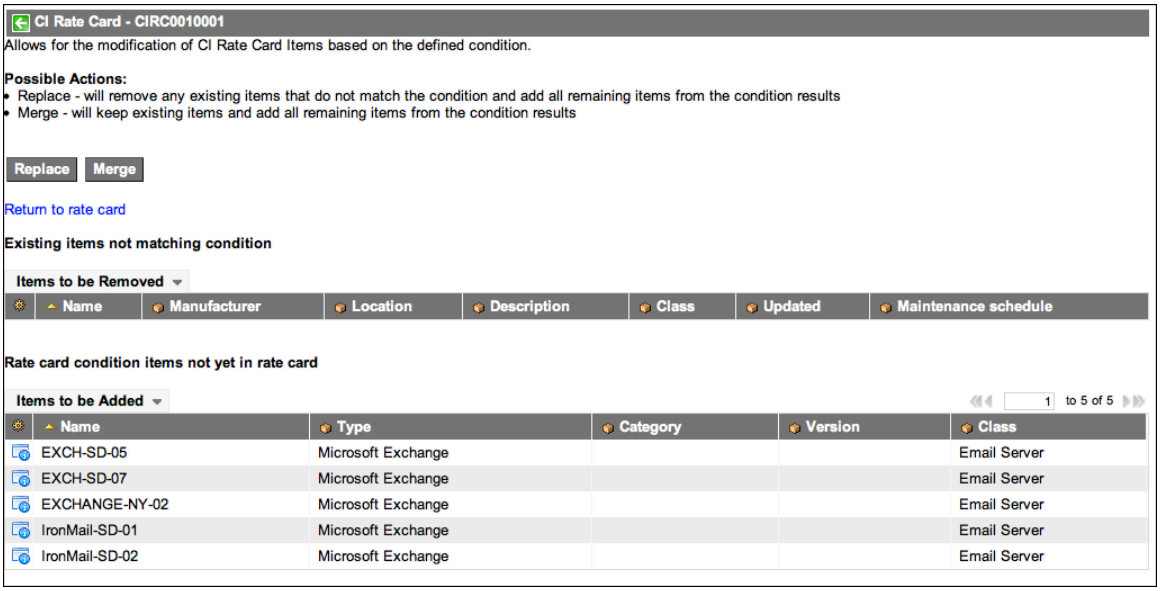

7. いずれかの選択肢をクリックします。

   - [置換]：条件に一致しない既存のアイテムを削除し、残りのすべてのアイテムを条件の結果から追加します。
   - [結合]：既存のアイテムを保持し、条件の結果から残りのすべてのアイテムを追加します。

8. [レードカードに戻る] をクリックします。

CI レートカードコスト

CI レートカードコストは、関連するレートカードの構成アイテムの経費ラインを生成します。

レートカードに関連付けられたコストは、レートカードコスト (fm_ci_rate_card_cost) テーブルに保存されます。各コストは、コストが処理されるときにレートカードに関連付けられたすべての構成アイテムに適用されます。

経費ラインはデフォルトで有効になっています。

CI レートカードコストを追加する

レードカードコストを CI レートカードに追加できます。

始める前に
必要なロール：financial_mgmt_admin

手順

1. 移動先 すべて > コスト > コスト > **CI** レートカード.
2. レートカードを選択します。
3. [レートカードコスト] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. 開始日を入力します。
5. 必要に応じてフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
番号	[読み取り専用] レートカード識別番号。自動的に割り当てられます。
レートカード	レードカードコストが関連付けられているレートカードの識別番号。
名前	レードカードコスト名。
有効	このコストのコスト処理を有効にするかどうかを示すチェックボックス。
簡単な説明	レードカードコストの簡単な説明。説明は、経費ラインレコードで処理されたコストを識別するために使用されます。
開始日	コストの処理を開始する日付。
終了日	コストの処理を停止する日付。
間隔	レートカードのコストが繰り返し発生する頻度。
繰り返し	コストが繰り返しコストであるかどうかを示すチェックボックス。また、生成された経費ラインを繰り返しとして表示するように設定します。このチェックボックスをオフにすると、それ以降の経費は自動的に生成されません。
売上税	コストに消費税を適用するかどうかを示すチェックボックス。
税率	コストに適用される税率。
順番	タスクレードカードで使用されます。
前回処理	[読み取り専用] このコストが最後に処理された日時。
次のプロセス	[FM コストの処理] スケジュール済みジョブに基づいて新しい経費が処理される次の日付。
ベースコスト	支払われなければならない課税前の金額。
税コスト	税の総額。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
総コスト	税込みの総レートカードコスト。
説明	レードカードコストの詳細な説明。

レードカードコストを削除する

[CI レートカード] フォームのレードカードコストを削除できます。

始める前に
必要なロール：financial_mgmt_admin

手順

1. 移動先 すべて > コスト > コスト > **CI** レートカード.
2. レートカードを選択します。
3. [レートカードコスト] 関連リストで、番号 をクリックします。
4. [削除] をクリックします。

レードカードコストを無効にする

コストが処理されないようにするには、[アクティブ] オプションをオフにします。このオプションを使用して、レードカードコストを永続的に非アクティブにするか、コストの処理を一時的にスキップします。

始める前に
必要なロール：financial_mgmt_admin

手順

1. 移動先 すべて > コスト > コスト > **CI** レートカード.
2. レートカードを選択します。
3. [レートカードコスト] 関連リストで、番号 をクリックします。
4. [アクティブ] チェックボックスをオフにします。

レードカードコストを変更する

多くの場合、構成アイテムのコストは、施設やベンダーのレートの変化に応じて変化します。

始める前に
必要なロール：financial_mgmt_admin

このタスクについて
経費ラインは特定の間隔のコストのスナップショットであるため、コストを変更しても既に生成された経費ラインには影響しません。コストが変更された場合は、コスト金額を変更するか、現在のコストを無効にして、今後のコストを表す新しいコストを作成します。変更は、次に生成される経費ラインで処理されます。コストの履歴レコードを保持するには、既存のコストを変更するのではなく新しいコストを作成し、無効化されたコストの終了日を設定して、コストの合意期限が切れたことを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > コスト > コスト > **CI** レートカード.
2. レートカードを選択します。
3. レードカードコストの番号をクリックします。
4. 必要に応じてフィールドを変更します。

CI コストの集計

経費ラインを集計して、リレーションシップパスを持つ親ビジネスサービスまたはアプリケーションに対してすべての構成アイテム経費を適用できます。

子構成クラスから 1 つまたは複数の親クラスへのリレーションシップパスを定義します。パスがリレーションシップパスレコード基準のいずれかと一致しない場合、経費集計を決定するときにパスはリレーションシップとして表示されません。「CI 関係」を参照してください。

関係のアグリゲーションを有効にする

[先月の CI コストの処理 (Process Last Month CI Costs)] スケジュール済みジョブは、構成アイテムのコストを処理します。親に対する経費の集計を開始するには、集計に使用する関係を特定します。CMDB の関係には多くのオプションがあるため、集計に使用可能なすべてのパスを使用することは一般的に効率的ではありません。

始める前に
必要なロール：financial_mgmt_admin

このタスクについて
子クラスごとに複数の関係を持つことができます。たとえば、特定の関係または親クラスのみを有効にするには、子クラスとペアになっているタイプとクラスの組み合わせごとに新しいレコードを作成します。

構成アイテムコストから経費ラインが生成されると、構成アイテムの親が評価されます。親クラスと関係タイプがリレーションシップパスレコードリストと比較され、集計に使用する一致があるかどうかが確認されます。一致するものがある場合、親構成アイテムの経費ラインが生成されます。このプロセスは、親関係がなくなるか、当該の関係がリレーションシップパスレコードで定義された基準を満たさなくなるまで、すべての親に対して繰り返されます。

手順

1. 移動先 すべて > コスト > アドミニストレーション > リレーションシップパス.
2. [**New**] をクリックします。
3. 必要に応じてフィールドに入力します。

フィールド	説明
有効	リレーションシップパスが有効かどうかを示すチェックボックス。
子クラス	子構成アイテムクラス。このクラスは、構成アイテムコストの処理中に生成された経費のソースです。
すべての親クラス	すべての親クラスとの CMDB での CI 関係 を処理するかどうかを示すチェックボックス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
親クラス	選択した子クラスの有効な親 CI クラス。[すべての親クラス] が選択されていない場合にのみ使用できます。
すべてのリレーションシップ	子クラスと親クラスの間のすべてのリレーションシップタイプを処理するかどうかを示すチェックボックス。
関係性タイプ	子クラスと親クラスの間で処理する関係のタイプ。[すべてのリレーションシップ] が選択されている場合にのみ使用できます。

次のタスク
1 つの構成アイテムに対して有効なリレーションシップパスを持つ複数の親がある場合、集計される金額を各親に分割して、アイテムコストが過度に集計されないようにします。アクティブなリレーションシップパスに対する親関係を評価する場合、集計では有効な関係の合計数がカウントされます。子構成アイテムからの経費ライン金額は、有効な数のパス間で均等に分割され、その金額が親の継承された経費ラインの作成時に使用されます。

タスクレードカードと賃金レードカード

コスト管理のタスクレードカードと賃金レードカードは、タスクを実行するためのコストを表す経費ラインを生成することによって運用コストを取得します。

- タスクレードカードは、タスクのタイプと関連コストの計算方法を定義するために使用されるテンプレートです。
- 賃金レードカードは、作業時間に基づいてタスクコストを計算するときに労働者の賃金レートを定義するために使用されるテンプレートです。

賃金レードカードを管理する

賃金レードカードは、レートコードを賃金レートに関連付けます。

始める前に
必要なロール：financial_mgmt_admin

手順

1. 移動先 すべて > コスト > 賃金レートカード.
2. レコードを作成または編集します (詳細はテーブルを参照)。

フィールド	入力値
名前	レートカードの目的を要約した文字列フィールド。
レートコード	レートを外部システムと調整する場合に、参照でのみ使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	入力値
レートタイプ	賃金レードカードがタイムカードのレートタイプと一致するかどうかを判断するために使用されるレートタイプ。
有効	レートカードをアクティブに使用するかどうかを決定するチェックボックス。
時間単価	労働者が定義された条件を満たす場合にタスク時間作業エントリに適用される時給を識別します。
条件	ユーザーがこのレートカードにタスク作業時間を適用するかどうかを決定する、ユーザーテーブルのフィルターを定義します。このフィールドは、条件によって返されるレコードをプレビューするための条件数ウィジェットを使用します。

賃金レードカードのレートタイプ

レートタイプ機能は、さまざまなタイプの作業を分類するために使用されます。たとえば、標準と残業などです。

[賃金レートカード] フォームには、レートタイプの指定、レートタイプの時給の指定、および賃金レードカードを適用できるユーザーの指定を行うオプションが含まれています。1 人のユーザーを、さまざまな料金タイプを含む複数の賃金レードカードに関連付けることができます。

ユーザーがタスクに対して時間を記録し、[タイムカード] フォームでレートタイプ [標準] を選択したとします。承認されると、タイムカードの経費ライン (コスト) は、タイムカードのユーザーとレートタイプを、そのユーザーに割り当てられた同じレートタイプの賃金レードカードと照合することによって導出されます。ユーザーが同じレートタイプの賃金レードカードを複数持っている場合、[順番] フィールドの値が最も低い賃金レードカードに基づいて経費ラインが生成されます。ユーザーとレートタイプに関連付けられた賃金レードカードがない場合は、タイムシート > アドミニストレーション > タイムシートポリシー フォームが使用されます (**com.snc.time_card.default_rate** プロパティ)。

> **注:**
> レートタイプを入力できるのは、ユーザーのタイムシートポリシーによって許可されている場合のみです。

関連情報

レートタイプの作成

タスクレードカードを管理する

タスクレードカードは、タスクテーブルのレコードに関連付けられたレートカードです。

始める前に
必要なロール：financial_mgmt_admin

手順

1. 移動先 すべて > コスト > コスト.
2. レコードを作成または編集します (詳細はテーブルを参照)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	入力値
名前	レートカードの目的を要約した文字列フィールド。
テーブル	レートカードが適用されるタスクのタイプ。
順番	同じタスクに複数のタスクレードカードが適用される場合は、順番が最も低いものが使用されます。
有効	レートカードをアクティブに使用するかどうかを決定するチェックボックス。
サマリータイプ	サマリーレポートを簡単にするための経費タイプの概要。この値は、[経費ラインサマリータイプ] フィールドの設定に使用されます。
条件	選択したテーブルで実行するフィルター。このレートカードを特定のタスクに適用するかどうかを決定します。このフィールドは、条件によって返されるレコードをプレビューするための条件数ウィジェットを使用します。
タスクレート	タスクのレート (通貨リスト付き)。新しい通貨を追加するには、[編集] リンクを使用します。
作業時間を使用	デフォルトでは、タスクごとの定額料金がレートカードで定義されます。チェックボックスをオンにすると、ルールは関連するタスク作業時間エントリに基づいてタスクコストを計算します。
デフォルトの賃金レート	ワーカーが賃金レードカードを持っていない場合に、作業時間エントリに適用するデフォルトの時給を定義します。[作業時間を使用] を選択すると表示されます。

自動翻訳

タスクレードカードを処理する

ビジネスルール [タスクレードカードを処理 (Process Task Rate Cards)] は、タスクがクローズされたときに実行され、適用されるタスクレードカードがあるかどうかを確認します。ある場合は、レートカードに従って経費ラインが作成されます。

[タスクレードカードを処理 (Process Task Rate Cards)] ビジネスルールのプロセスフローは次のとおりです。

1. タスクがクローズします。
2. ビジネスルールが実行されます。
3. 一致する条件を探すために、アクティブなタスクレードカードがクエリされます。
4. 作業時間を使用していないレートカードの認定。

   タスクレート値を使用して、タスクにリンクされた経費ラインを生成します。
5. 作業時間を使用しているレートカードの認定。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. ユーザー (ワーカー) でグループ化されたタスク作業時間エントリを取得します。

b. ユーザーごとに、ユーザーがいずれかの賃金レードカードの条件に一致するかどうかを確認します。

   i. 賃金レードカードが見つかった場合は、作業時間と賃金レートを使用して経費ラインを生成します。

   ii. 賃金レードカードが見つからない場合は、タスクレードカードからデフォルトの賃金レートを使用して経費ラインを生成します。

予算とコストセンター

予算とコストセンターとは何か、コスト管理 アプリケーションでそれらを管理する方法を理解します。

予算

予算を使用すると、支出の計画と実績を追跡できます。予算は、1 つ以上のコストセンターの特定期間に対して定義されます。

コストセンター

コストセンターは、ビジネスエンティティを表すために使用されます。予算期間中に予算のコストセンターに割り当てられたすべての経費割り当ては、予算の実際の経費割り当ての計算に使用されます。

コストセンターレコードから予算にコストセンターを割り当てることもできます。コストセンターレコードには、予算関連リストが含まれています。


予算とコストセンターの例

財務情報を関連付ける最も一般的なビジネスエンティティはコストセンターです。

この例は、サービスの使用状況に基づいてコストセンターに経費を割り当てる方法を示しています。この例では、その情報を使用してコストセンターの定義済み予算と比較します。

予算は、1 つ以上のコストセンターに対する計画支出額のプレースホルダーです。例を表示するには、次に移動します: ファイナンシャルマネジメント > 予算 をクリックし、[投資予算] を選択します。

コストデモの予算

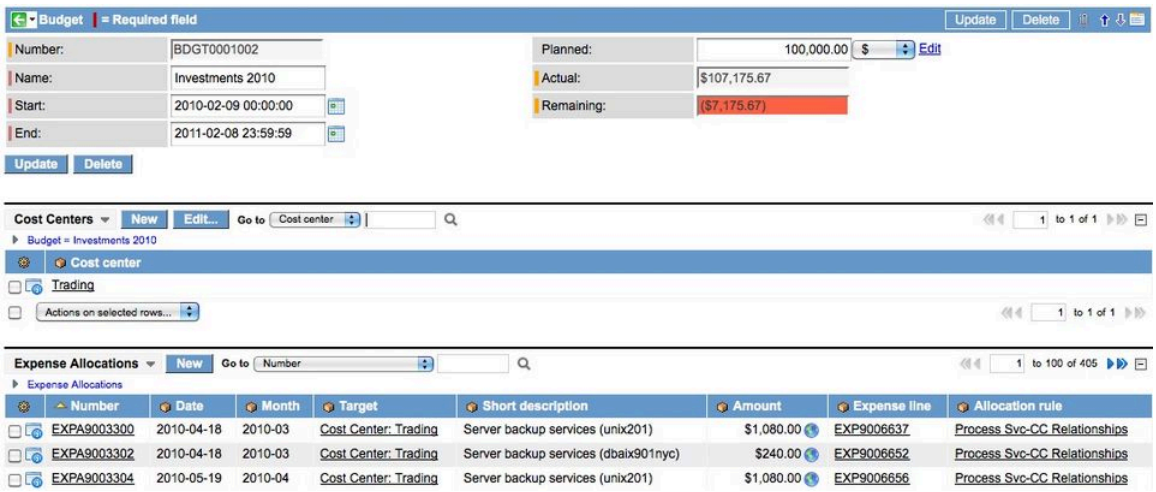

この予算には、定義済みの開始日と終了日、予定金額、および実際の金額があります。[コストセンター] 関連リストで、[取引 **(Trading)]** はメンバーです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

予算期間中に [取引 **(Trading)]** コストセンターに割り当てられたすべての経費割り当てについて、割り当てが合計されて実際の予算フィールドに入力されます。関連する経費割り当てレコードは、[経費割り当て] 関連リストでも表示できます。

コストセンターの作成または更新

新しいコストセンターを定義するか、既存のコストセンターの詳細を更新します。

始める前に

必要なロール：financial_mgmt_admin

手順

1. 移動先 すべて > コスト > 構成 > コストセンター.
2. 編集するコストセンターを選択するか、[新規] を選択して作成します。
3. フォームのフィールドに入力します。

コストセンターフォーム

フィールド	説明
名前	コストセンターの名前
マネージャー	このコストセンターのマネージャー
口座番号	このコストセンターのアカウント番号
有効開始日	コストセンターが有効になる開始日カレンダーオプションを使用して日付を選択します。
コード	このコストセンターに割り当てられたコード
有効期限	その時までコストセンターが有効である日カレンダーオプションを使用して日付を選択します。
ロケーション	このコストセンターの場所ルックアップオプションを使用して 1 つを選択します。
親	親コストセンター (存在する場合) ルックアップオプションを使用して 1 つを選択します。

4. [送信] を選択します。

次のタスク

このコストセンターの関連リストを確認し、必要に応じて更新します。「コストセンターの関連レコード」を参照してください。

関連情報

予算とコストセンター

予算の作成または更新

コスト管理では、特定の期間の経費を計画するための予算を提供します。

始める前に

必要なロール：financial_mgmt_admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > コスト > 構成 > 予算.
2. 編集する予算を選択するか、[新規] を選択します。
3. フォームに記入します (表を参照)

予算フォーム

フィールド	入力値
番号	システムによって生成されたレコード番号。
名前	予算の名前の文字列フィールド。
開始	予算期間の開始を定義する日付フィールド。
終了	予算期間の終了を定義する日付フィールド。
計画	予算期間中の関連コストセンターの計画経費額を表す通貨フィールド。この値は入力またはインポートされます。
実際	予算期間中の関連コストセンターの実績経費額を表す通貨フィールド。これは、コストセンターの経費割り当てリストを使用して計算されたフィールドです。
残り	計画経費額から実績経費額を差し引いた金額を表す通貨フィールド。これは計算フィールドです。
予測	予算期間中の関連コストセンターの推定経費額を表す通貨フィールド。1 日あたりの平均経費額が計算され、残りの予算期間に適用されて、予測が決定されます。

次のタスク
この予算の関連リストを確認し、必要に応じて更新します。「予算関連レコード」を参照してください。

関連情報

予算とコストセンター

コストセンターの関連レコード

コストセンターは、そのフォームに関連リストとして表示される追加のレコードに関連付けられています。


コスト管理 プラグインは、次の関連リストをコストセンターレコードに追加します。これらの関連リストにレコードを追加することも、既存のレコードを削除することもできます。

- 予算：このコストセンターがメンバーとなっている予算
- CI コストセンターリレーションシップ：このコストセンターが消費しているビジネスサービスキャパシティの量を定義します。
- 経費割り当て：このコストセンターをターゲットとするすべての経費割り当てレコードを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コストセンター関連リスト

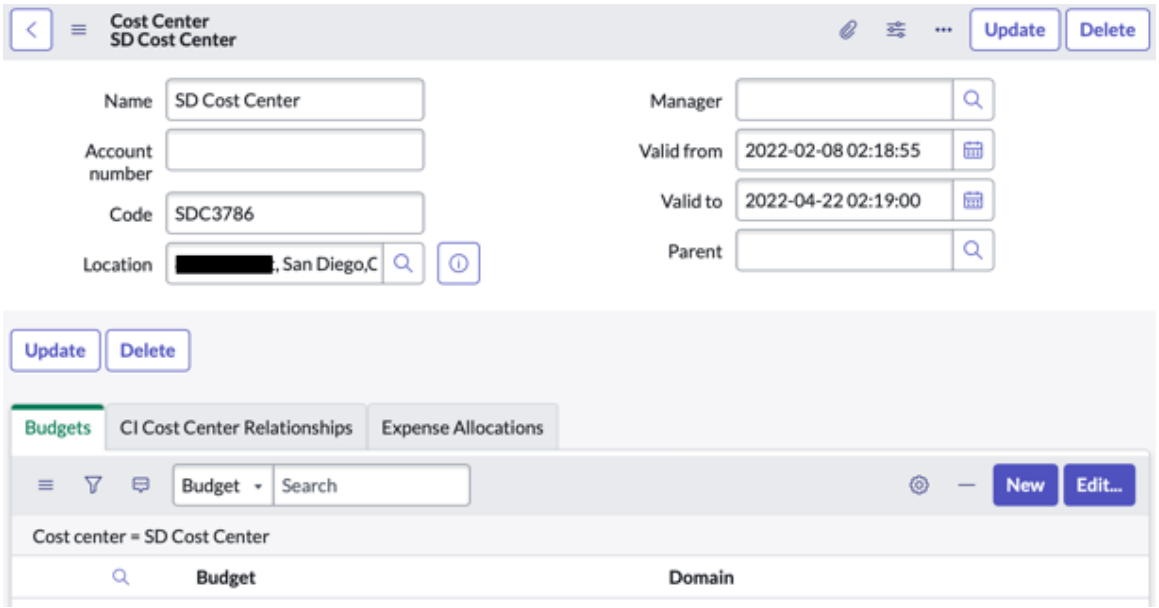

コストセンターを予算に関連付けます。

コストセンターを作成し、それらに予算と経費割り当てを関連付けます。

始める前に
必要なロール：financial_mgmt_admin

手順

1. から既存の予算を開く コスト > 構成 > 予算 移動します
2. [コストセンター] 関連リストが表示されていることを確認します。
3. [編集] を使用して、既存のコストセンターを予算に追加または予算から削除します。
4. [新規] ボタンを使用して、新しいコストセンターレコードを作成します。

配布コストとルールの使用

配布コストとは、レコードのグループ間で分割できるコストを表します。

たとえば、データセンター内の CI 間で分割できるデータセンターの電力コストなどです。

配分ルールは、配布コストを CI 間でどのように分割するかを決定します。

配布コストの定義

新しい配布コストを定義するには、次に移動します: ファイナンシャルマネジメント > コスト管理 > 配賦コストをクリックし、[新規] を選択します。次のフィールドにデータが入力されます。

配布コストの定義

フィールド	入力値
番号	システムによって配分コストに生成された一意の識別子。
名前	人間が判読可能なコスト識別子。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

配布コストの定義 (続く)

フィールド	入力値
総計	コストの金額と通貨リスト。新しい通貨を追加するには、[編集] リンクを使用します。
配分ルール	コストを CI 間でどのように配分するかを決定する配分ルールを選択します。「配分ルール」を参照してください。
有効	コストがアクティブに使用されているかどうかを決定します。
開始日	コストの日付、またはコストが繰り返し発生している場合はコストの最初の日付。
繰り返し	オンにした場合、コストは繰り返し発生し、定期的に追加されます。
終了日	[繰り返し] が *[true]* の場合、配布コストを追加する最終日。
サマリータイプ	サマリーレポートを簡単にするための経費タイプの概要を指定します。この値は、[経費ラインサマリータイプ] フィールドの設定に使用されます。
間隔	[繰り返し] が *[true]* の場合、[開始日] から [終了日] までに配分コストを追加する間隔。
前回処理	配分コストが最後に処理された日時の読み取り専用表示。
次のプロセス	予定されている次の処理日の読み取り専用表示。

配分ルールの定義

配分ルールを定義して、ルールに従って配分される配布コストを表示します。

新しい配分ルールを定義するには、 ファイナンシャルマネジメント > 管理者 > 配送費ルールをクリックし、[新規] を選択して、以下を入力します。

配分ルールフォーム

フィールド	入力値
名前	ルールの一意の名前。
有効	ルールがアクティブに使用されているかどうかを決定します。
詳細	オンにした場合、配分ルールはスクリプトによって決定されます。オフの場合は、テーブルと条件によって決定されます。
説明	ルールの説明とその使用に関する注意事項。
スクリプト	[詳細] が *[true]* の場合、ルールの動作を決定するスクリプト。
テーブル	[詳細] が *[false]* の場合、コストを配分するレコードを見つけるテーブルのリスト。
条件	[詳細] が *[false]* の場合、[テーブル] フィールドによって決定されるテーブルで、配分されたコストを受け取るレコードを決定する条件ビルダー。コストの金額は、テーブルと条件の

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

配分ルールフォーム (続く)

フィールド	入力値
	値で特定されるレコード全体に均等に配分されます。このフィールドは、条件によって返されるレコードをプレビューするための条件数ウィジェットを使用します。

送信すると、ルールに従って配分するコストを決定するために役立つ配布コスト関連リストが表示されます。

スクリプト化された配分

スクリプト化された配分では、テーブルおよび条件フィルターを使用する場合の均等分割配分とは対照的に、カスタム配分量を使用できます。

配分ルールでスクリプト化された処理を有効にするには：

- [詳細] フィールドのチェックボックスをオンにすると、スクリプトフィールドが表示されます。
- 次の概念を利用してスクリプトを作成します。
  - 割り当て量の計算に使用するターゲットレコードおよびデータを照会します。
  - ExpenseLine API を使用して経費ラインレコードを作成します。

    詳細については、「ExpenseLine」を参照してください。

デフォルトのスクリプトに記載されているように、[詳細] フィールドが有効になっている場合、スクリプトの処理中に次の変数を使用できます。

- `distCost`：配分コストの GlideRecord。すべてのフィールドへのアクセスを許可します。
- `distCostAmount`：システム通貨でのコスト金額。

配布コストの処理

[FM コストの処理] と呼ばれるスケジュール済みジョブが配布コストを毎日自動的に処理します。

経費でビジネスサービスを使用する

割り当て単位とコストセンターを使用して、ビジネスサービスとその経費の関係を管理します。

コストセンターを定義する

コストセンターは、財務システムと IT の間でよく使用される参照です。コストセンターレコードはビジネスエンティティを表し、コストセンターのビジネスサービス消費を測定する CI コストセンターリレーションシップの関連リストがあります。

始める前に
必要なロール：financial_mgmt_admin

手順

1. 移動先 すべて > コスト > 構成 > コストセンター.
2. 編集するレコードを選択するか、[新規] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
名前	コストセンターの一意の名前。
アカウント番号	コストセンターに関連付けられているアカウント番号 (存在する場合)。
コード	コストセンターに関連付けられているコード (存在する場合)。
ロケーション	コストセンターの場所への参照。
マネージャー	コストセンターを管理するユーザーへの参照。
有効開始日	コストセンターが有効である開始日。
有効期限	コストセンターが有効である終了日。

CI コストセンターリレーションシップ

フィールド	説明
サービス	ビジネスサービスへの参照。
コストセンター	関係を適用するコストセンター。関連リストからアクセスした場合は、適切なコストセンターに既に関連付けられているはずです。
割り当てのパーセンテージ	まだ実装されていない機能です。
割り当てタイプ	選択リスト。[単位] である必要があります。
割り当てユニット	コストセンターが使用しているユニットの数。これは、割り当てユニットレコードでビジネスサービスの合計キャパシティを定義するために使用されるのと同じタイプの単位を使用して測定されます。この数値は、割り当てユニットレコードの割り当てられたユニット数を更新するために使用されます。また、合計キャパシティに対する使用ビジネスサービスのパーセンテージに基づいてコストセンターに割り当てる経費の額を決定するためにも使用されます。

デフォルトの割り当てルール

ビジネスサービスに対して生成されたすべての経費ラインについて、デフォルトの割り当てルール [SVC-CC リレーションシップの処理 (Process Svc-CC Relationships)] では、経費を処理し、サービスを消費している各コストセンターの割り当てを作成します。

経費割り当て額は、コストセンターが消費しているユニット数をビジネスサービスの合計ユニット数で割って算出されます。この計算方法は、合計ユニットキャパシティを使用して割り当てのパーセンテージを決定するため、「全ユニット」割り当てと呼ばれます。

詳細な例については、デモのウォークスルーを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

特定のビジネスサービス経費ラインでは、すべてのユニットがコストセンターに配分されるわけではないため、この方法を使用した経費の割り当ては 100% 未満になることが一般的です。未割り当ての経費は、IT オーバーヘッドと見なされる可能性があります。使用中のユニット数に関係なく、経費割り当てが 100% であると表示されることを希望する組織もあります。この方法は、コストセンターが消費しているユニット数をすべてのコストセンターから割り当てられたユニットの合計数で除算することで割り当てのパーセンテージが計算されるため、「割り当て済みユニット」と呼ばれます。

割り当ての計算方法	例
all_units	サービスは 100 ユニットをサポートしているが、50 ユニットのみが割り当てられており、かつ、コストセンター ABC に 25 ユニットが割り当てられている場合、この方法では、割り当てコストは 25/100、つまりサービスの合計コストの 25% になります。経費の 50% (未割り当て 50 ユニット分) は割り当てられません。
assigned_units	サービスは 100 ユニットをサポートしているが、50 ユニットのみが割り当てられており、かつ、コストセンター ABC に 25 ユニットが割り当てられている場合、この方法では、割り当てコストは 25/50、つまりサービスの合計コストの 50% になります。経費の 100% が割り当てられ、コスト全回収であると表示されます。

これはシステム全体の設定であり、次に移動して構成できます: ファイナンシャルマネジメント > プロパティ モジュールに移動し、選択リストからオプションを選択します。

割り当てユニットの定義

割り当てユニットレコードは、ビジネスサービスのキャパシティと使用状況を定義します。

始める前に

必要なロール：financial_mgmt_admin

手順

1. 移動先 すべて > コスト > 構成 > 割り当てユニット.
2. 編集するレコードを選択するか、[新規] を選択します。

> **注:**
> 構成アイテムの名前を選択すると、割り当てユニットではなく CI レコードが表示されます。

フィールド	説明
構成アイテム	割り当てユニットを定義するビジネスサービスを選択します。
合計ユニット	割り当て可能な経費の合計ユニット数。ユニットは、あらゆるものを表すことができる汎用的な測定値です。コストセンターリレーションシップユニットと一致する必要があります。ユニットが表すものは、[ユニットタイプ] フィールドに記録できます。[合計ユニット] オプションを使用すると、未割り当てのビジネスサービスユニットがある場合に未割り当ての経費が発生する可能性があります。[割り当てられたユニット] オプションを使用すると、常に 100% の経費が割り当てられます。
割り当てら	合計ユニット数のうち割り当てられる数。スクリプトによって入力されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
れたユニット	
利用可能ユニット	合計ユニット数のうち未割り当ての数。スクリプトによって入力されます。
更新日時	ユニットが最後に更新された日時。
ユニットタイプ (フォームを構成して追加)	ユニットが表す内容 (シート、ライセンス、ギガバイトなど) を記録するために使用されます。

コストのソース

システム内のオブジェクトの経費ラインを生成する方法はいくつかあります。

これらは一般に次の 3 つのタイプのいずれかに分類されます。

- CI コスト
- タスクコスト
- カスタム生成コスト：これらはデモデータには含まれていません。詳細については、ExpenseLine API を参照してください。

CI レートカード


CI レートカードは、特定のタイプの CI のコストを定義するテンプレートです。この例では、サーバー関連のコストのみを使用しています。いくつかの異なるサーバーモデルしかなく、コストは各モデルで同じであるため、CI レートカードは各モデルのコストのテンプレートを定義できます。

以下は、[Sun E20K Servers NY] レートカードです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コストデモの **CI** レートカード

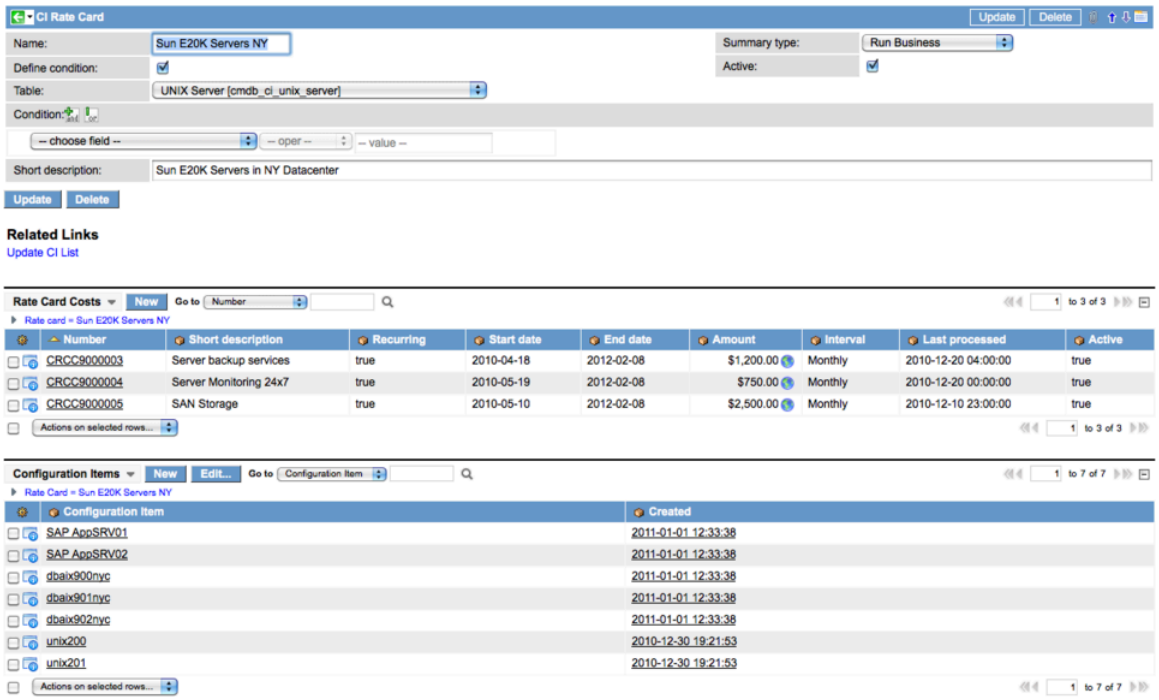


これは、サーバーの使用目的に関係なく、NY データセンター内の UNIX サーバーの一般的なコストと CI を表しています。

関連リストには、このレートカードの使用方法に関する情報が含まれています。[構成アイテム] 関連リストには、このレートカードを使用する各サーバーが表示されます。このアイテムのリストは、[編集] ボタンまたは **[CI** リストを更新] 関連リンクを使用して手動で管理できます。このレートカードのレートカード条件は [テーブル] **= [UNIX** サーバー]です。**[CI** リストを更新] 関連リンクをクリックすると、次の 2 つの内容が表示されます。

- レートカードのメンバーであるが条件に一致しない CI。
- レートカードのメンバーでないが条件に一致する CI。

レートカードを「調整」するには、[置換] または [結合] ボタンを使用します。

コストデモの **CI** レートカード更新

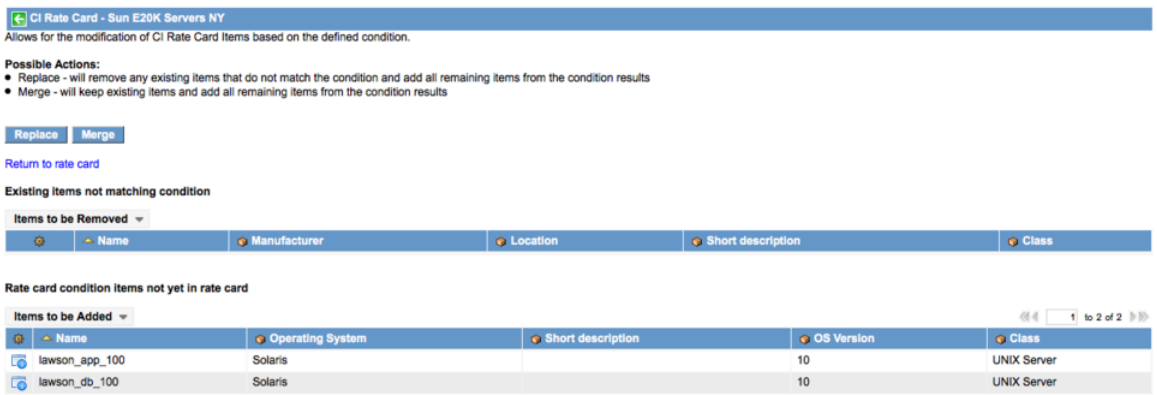

この場合、レートカードにない追加の UNIX サーバーが 2 つあります。それらを追加するには、[結合] ボタンを使用します。レートカードに 9 つの項目が表示されるようになりました。

注:
インスタンスに追加の CI がある場合、個数が異なる場合があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[レードカートコスト] 関連リストには、すべてのサーバーで発生する繰り返し発生するコスト (この場合は月次ベース) が表示されます。

[経費ライン] 関連リストを [CI レートカード] フォームに追加すると、このレートカードのコストから生成された経費ラインのリストが表示されます。2 つのサーバーのサーバーバックアップサービスの経費は次のとおりです。

コストデモの **CI** レートカード

Expense Lines | New | Go to Number | 1 to 100 of 475

Expense Lines

Number	Inherited	Parent	Date	Short description	Cost ID	Source ID	Amount	Type	Summary type
EXP9006635	false		2010-04-18	Server backup services (unix200)	Rate Card Cost: CRCC9000003	UNIX Server: unix200	$1,200.00	Recurring	Run Business
EXP9006636	false		2010-04-18	Server backup services (unix201)	Rate Card Cost: CRCC9000003	UNIX Server: unix201	$1,200.00	Recurring	Run Business

配布コスト

複数の CI によって生成されるより一般的な一括コストの場合、配布コストは個々の CI レートカードが適用されないより広範なコストを表すことができます。移動先 ファイナンシャルマネジメント > 配賦コスト いくつかの例を表示します。

リストから [データセンター施設 (償却) **(Datacenter Facilities (amort))]** を選択します。

コストデモの配分コスト

Distribution Cost | = Required field | Update | Delete

Number:	DST9000004	Start date:	2010-02-09
Name:	Datacenter Facilities (amo	Recurring:	☑
Amount:	5,500.00 $ Edit	End date:	2021-02-08
Distribution rule:	All Installed Servers	Interval:	Monthly
Summary type:	Run Business	Last processed:	2010-12-09 19:00:00
Active:	☐	Next process:	2011-01-09

Update | Delete

この例では、1 か月間のデータセンターの電力コストが償却されていて、月次の繰り返し配分コストとして表されています。

サーバーおよびコストセンターごとのコストのレポートを有効にするには、この一括コストをすべてのサーバーに均等に配分する必要があります。これは、コストのフォームにリストされている [配分ルール] で実現されます。配分コストを表示するには、[配分ルール] フィールドで [すべてのインストール済みサーバー **(All Installed Servers)]** ルールの参照アイコンをクリックします。

コストデモの配分コストルール

Distribution Cost Rule | = Required field | Update | Delete

Name:	All Installed Servers
Active:	☑
Advanced:	☐
Description:	

Distribute a cost across all servers evenly with status of installed

Table:	Server [cmdb_ci_server]	
Condition:		
Status(install_status)	is	Installed

Update | Delete

Related Links

View Condition Results

このルールは $5,500 を受け取り、ルール条件に一致する各サーバーに配分します。ここでの条件は、インストールステータスが「インストール済み」のすべてのサーバーです。[条件結果の表示] 関連リンクには、条件に一致する現在のレコードが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクコスト


タスク関連アクティビティでは、経費ラインを生成して、タスクの処理に関連するコストを追跡することもできます。タスク関連コストを生成する主な方法は、タスクレードカードを使用することです。

タスクレードカード

タスクレードカードは、タスクのコスト計算方法を決定するためにシステムが使用する条件ベースのレコードです。

例を表示するには、次に移動します: ファイナンシャルマネジメント > タスクレートカード インシデント **P1** を選択します。

コストデモのインシデントレートカード




レートカードは、タスクがクローズされるたびに処理されます。この処理は、ビジネスルールによってトリガーされます。レートカードには次の情報が含まれています。

- 優先度が **[1 - 重要]** であるインシデントがクローズされると、$150 の経費ラインが生成されます。
- これは、P1 インシデントごとに定義された定額料金です。

[経費ライン] 関連リストには、このレートカードによって作成された経費のリストが表示されます。

[タスクレートカード] リストに戻り、[変更要求 (緊急) **(Change Request (emergency))]** レートカードを開きます。

コストデモの変更要求



この緊急変更要求のレートカードは、インシデントレートカードの定額料金モデルではなく、タスクの作業にかかった時間に基づいてタスクコストを作成する例を示しています。

- レートカードの [作業時間を使用] フラグは、タスクコストを決定するときにタスクに関連付けられたタスク作業時間レコードを使用するようにシステムに指示します。
- このレートを処理すると、次のようになります。
  - タスク作業時間レコードリストをクエリします。
  - タスク作業時間レコードでユーザーの時給を解決するか、レートカードで定義されているデフォルトレートの $250/時を使用してみてください。
  - 作業時間エントリごとに経費ラインを生成します。

[経費ライン] 関連リストには、このレートカードから生成された経費が表示されます。

自動翻訳


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

賃金レードカード

賃金レードカードは、時給の一般的なパターンを定義する方法であるため、システム内の個人ごとにレートを管理する必要はありません。

サンプルレートを表示するには、 ファイナンシャルマネジメント > 賃金レートカード をクリックし、 開発 レートカードを選択します。

コストデモの開発賃金レート



[開発] 部門のユーザーの場合、作業時間コストは時給 $100 を使用するという条件があります。

CI 関係

ビジネスサービスの総コストを表すレポートを取得するには、サービスとサービスを構成する CI との間に何らかの関連付けが必要です。これは CI 関係で行われます。

始める前に

必要なロール：financial_mgmt_admin


このタスクについて

コスト管理 プラグインのデモデータを使用して、ビジネスサービスに関連するすべての経費ラインを確認する方法を理解してください。

手順

1. 移動先 すべて > コスト > 構成 > ビジネスサービス.
2. [小売業] を選択します。
3. 依存関係ビューアイコン ( ) を選択して、ビジネスサービスマップを表示します。

ビジネスサービスマップの例

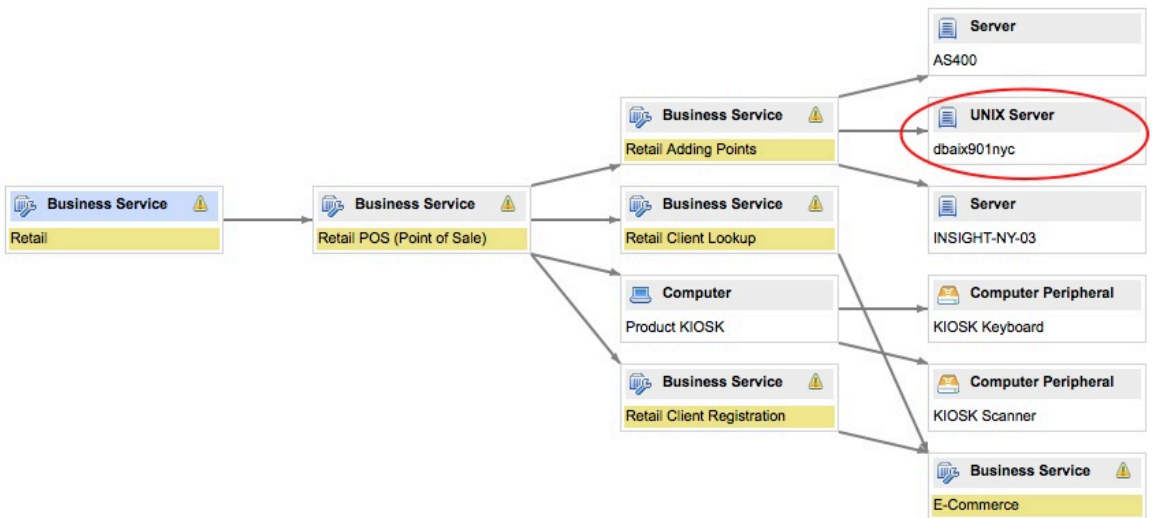

このビューは、dbaix901nyc サーバーが [小売業追加ポイント (Retail Adding Points)]、[小売業 POS (Retail POS)]、および [小売業] ビジネスサービスの依存関係にあることを示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

したがって、dbaix901nyc サーバーにコストが発生するたびに、各ビジネスサービスで表示されます。

dbaix901nyc サーバーは Sun E20K Servers NY の CI レートカードのメンバーであるため、この CI レートカードから経費を検証できます。

それらを表示するには：

a. 移動先 すべて > コスト > コスト > **CI** レートカード.

b. [Sun E20K Servers NY] を選択します。


c. [Expense Line] 関連リストを選択します。

この関連リストが利用できない場合は、[Expense Line] > [レートカード] 関連リストを表示するようにフォームレイアウトを構成します。

d. [簡単な説明] に **dbaix901nyc** が含まれるという条件で関連リストをフィルタします。

サーバーの経費が表示されるようになりました。

サーバー経費の例



この例には、1 つの直接経費 ([継承] **= [false]**) と、他の直接経費から生成された 3 つの継承経費が含まれています。これらの継承経費は CI 関係に基づいており、任意のビジネスサービスレベルでのレポートが可能です。

経費のアグリゲーションの詳細については、「関係のアグリゲーションを有効にする」を参照してください。

経費の割り当て

経費は、経費を負担するビジネスエンティティに割り当てることもできます。

これは、チャージバックまたは請求とは見なされませんが、請求のソースとして使用できます。経費割り当ての主な目的は、何らかの経費が発生したプロセスのコンシューマーを表すことです。これは、経費割り当てルールを定義することで達成できます。

簡単な例

この例では、サーバー関連のすべての経費ラインをサーバー担当部門に割り当てる方法を示します。

例を表示するには：

1. 移動先 ファイナンシャルマネジメント > 経費割り当てルール.

2. リストフィルターを削除して、非アクティブなルールとアクティブなルールを表示します。

3. [サーバー **-** 部門 **(Server - Department)]** ルールを選択します。

このルールでは、選択したステータスのいずれかを持つサーバーに関連付けられたすべての経費ライン ([経費ソース **(Expense source)]** フィールド) について、経費金額の 100% の経費場所レコードを生成し、その割り当てをサーバーの部門に割り当てるように設定されています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

経費割り当てを表示するには、[経費割り当て] 関連リストをフォームに追加します。[ターゲット] フィールドは、経費が割り当てられる事業部門です。

コストデモの経費割り当て



Number	Date	Month	Target	Short description	Amount	Expense line
EXPA9004601	2010-02-09	2009-12	Department: Sales	Server monthly lease (SAP LoadBal01)	$8,500.00	EXP9008842
EXPA9004612	2010-03-12	2010-01	Department: Sales	Server monthly lease (SAP LoadBal01)	$8,500.00	EXP9008872
EXPA9004628	2010-04-09	2010-02	Department: Sales	Server monthly lease (SAP LoadBal01)	$8,500.00	EXP9008902
EXPA9004634	2010-05-10	2010-03	Department: Sales	Server monthly lease (SAP LoadBal01)	$8,500.00	EXP9008932
EXPA9004650	2010-06-09	2010-04	Department: Sales	Server monthly lease (SAP LoadBal01)	$8,500.00	EXP9008962

複雑な例

より一般的な例は、ビジネスサービスのコストをビジネスコンシューマーに割り当てることです。コストセンターは通常、ビジネス財務を参照するときに使用されるため、この例では、サービスを消費している各コストセンターにビジネスサービスコストを割り当て、コストセンターが消費するサービスの量に基づいて割り当て量を算出します。

例を表示するには、次に移動します: ファイナンシャルマネジメント > ビジネスサービス をクリックし、[小売] を選択します。追加の関連リストにアクセスするには、[コスト] ビューに切り替えます。

[割り当てユニット] レコードは、このサービスが提供するキャパシティの量を定義します。この場合、[小売業] サービスは 50 の場所 (ユニット) をサポートでき、そのうち 45 が割り当て済みです。ユニットは、そのビジネスサービスにとって意味のあるものを表すことができる一般的な概念です。このレコードは、割り当てを表すためにユニットを使用しています。目的は、このユニット数とコストセンターのユニット数を使用して合計のパーセンテージを決定し、配分額を計算することです。

コストデモの小売業の割り当てユニット



Total units	Unit type	Allocated units	Available units
50	Locations	45	5

[CI コストセンターリレーションシップ] リストには、サービスを使用しているコストセンターと、使用しているユニット数が表示されます。この情報は、各コストセンターに割り当てるサービス経費の額を決定するために使用されます。たとえば、[取引 (Trading)] 部門は割り当て済み 50 ユニットのうち 10 を使用しているため、すべての小売業経費の 20% が割り当てられます。合計 (10 または 45) に基づいて割り当てるオプションもあります。

コストデモの小売業ユーザー



Cost center	Allocation units
Sales	35
Trading	10


経費ラインがどのように割り当てられているかを確認するには、[経費ライン] 関連リストでエントリを選択し、[経費割り当て] 関連リストを [経費ライン] フォームに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

以下は、dbaix901nyc サーバーの $2,500 の経費です。この経費から 2 つの経費割り当てが生成されます。[取引 **(Trading)]** コストセンターには、前に確認した CI コストセンターリレーションシップに基づいて、経費のうち $500 (20%) が割り当てられました。

コストデモの小売業の例

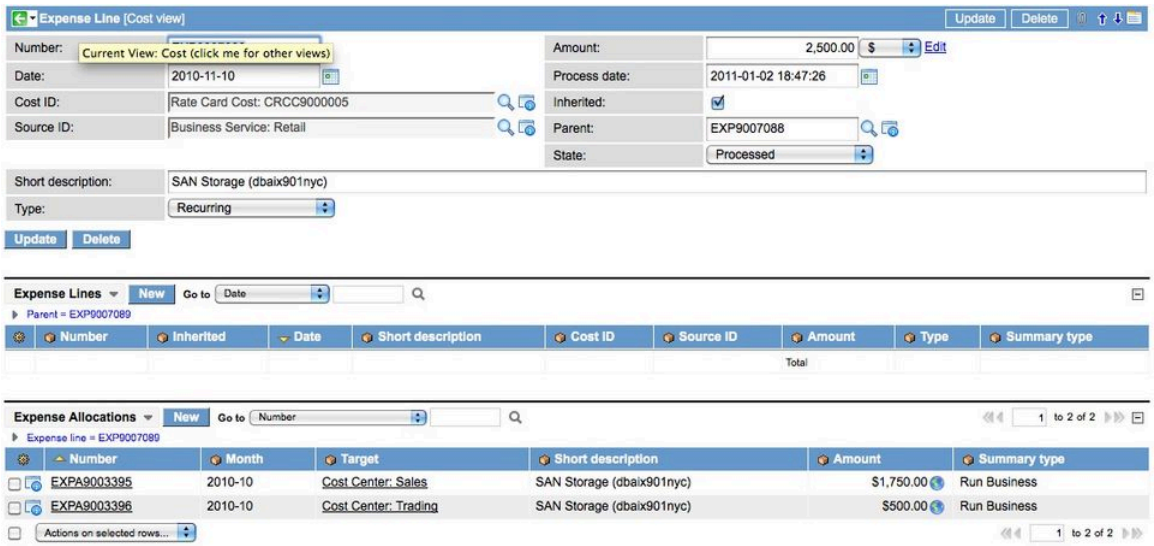

ビジネスサービスからコストセンターへのこのタイプの割り当ては、**[SVC-CC** リレーションシップの処理 **(Process Svc-CC Relationships)]** 経費割り当てルールによって行われます。これは、スクリプトを使用して割り当てロジックを決定する高度なルールです。

予算関連レコード

予算は、そのフォームに関連リストとして表示される追加のレコードに関連付けられています。

予算レコードの関連リストは次のとおりです。これらの関連リストにレコードを追加することも、既存のレコードを削除することもできます。

- コストセンター：この予算のメンバーとなっているコストセンターが表示されます。
- 経費割り当て：予算の全コストセンターに関する予算期間中のすべての経費割り当てレコードを表示します。

ドメインセパレーションとコスト管理

コスト管理ではドメインセパレーションはサポートされていません。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル: サポートなし

- ドメインフィールドがデータテーブル に存在している可能性がありますが、データを管理するロジックがありません。
- このレベルでは、ドメイン分割は考慮されません。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート」を参照してください。

関連情報


サービスプロバイダーのドメインセパレーション

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ワークフローベースのドラフト]戦略的ポートフォリオ管理 (SPM):test-default

作業をビジネスゴールに戦略的に合わせ、製品とサービスを提供します。 ServiceNow® 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) (旧 IT Business Management) はデジタルトランスフォーメーションを可能にするため、さまざまな方法論で価値を計画、提供、追跡し、顧客価値をより迅速に推進できます。

フィードバックを収集してアイデアを出す




製品フィードバックを分析し、機能強化を特定し、アイデアを送信します。

目標の設定と戦略の策定




目標を作成し、ターゲットを設定し、ビジネスの成果を促進するための作業を開始しましょう。

調整、計画、優先順位付け




ビジネスゴールと戦略的優先事項に合わせて作業を計画し、優先順位を付け、ロードマップを作成します。

コラボレーション、実行、テスト



チームで柔軟にコラボレーションし、実行方法を選択します。

ダッシュボードの表示、レポートの生成とエクスポート



実用的なインサイトを抽出し、ステータスレポートを共有します。

SPM の **Now Assist** で生産性を向上



SPM アプリ内で利用できるさまざまな生成 AI スキルについて説明します。


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ドラフト]フィードバックを収集し、アイデアを出し、革新する

アイデアと製品フィードバックを通じて製品発掘を可能にし、イノベーションを促進します。戦略的計画ワークスペース内の製品フィードバック、または PPM Standard アプリセット内のイノベーション管理を使用して、複数のソースからインサイトとフィードバックを収集します。製品のアイデアを定式化し、実装の可能性が最も高いアイデアに優先順位を付けます。

開始

製品フィードバック (戦略的計画)	イノベーション管理 **(PPM** 標準)
	
さまざまなソースからのインサイトと顧客フィードバックを使用し、製品検出を通じて価値を推進します。	従来のプロジェクトポートフォリオ管理からアイデアポータルを使用して、アイデアを識別、評価、および処理します。

自動翻訳

製品フィードバック

アプリの価値に関する簡単な紹介。

アプリの機能に関する詳細な説明。該当する場合、ワークフローを示すインフォグラフィック。

Innovation Management (イノベーション管理)

アプリの価値に関する簡単な紹介。

アプリの機能に関する詳細な説明。該当する場合、ワークフローを示すインフォグラフィック。

アプリケーションと機能

- フィードバック
- イノベーション管理


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ドラフト]ビジネス目標の設定と管理

目標を作成し、そのためのターゲットを設定し、目標とターゲットの進捗状況を評価して、組織計画を達成してビジネスの成果を推進します。

開始

SPM のゴールフレームワーク

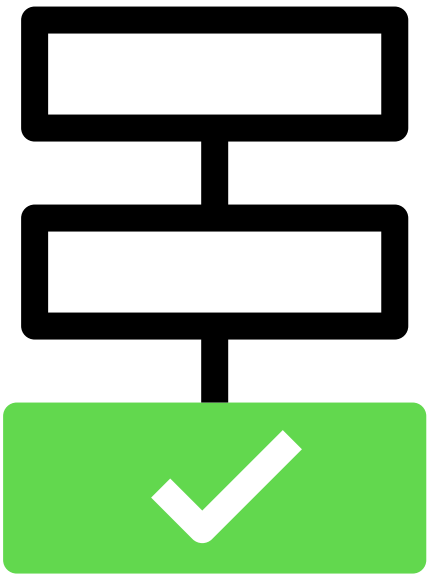

戦略計画の一環として、組織の戦略的優先事項と関連する目標を定義します。目標を作成したら、作業アイテムをこれらの目標に関連付けることができます。

目標管理 **(Strategic Planning Workspace)**



ポートフォリオ計画の目標を作成し、それらのターゲットを設定し、これらの目標とターゲットの進捗状況を評価して、組織計画を達成します。

自動翻訳

SPM のゴールフレームワーク

アプリのビジネス価値に関する簡単な概要。

アプリの機能に関する詳細な説明。

目標管理 **(Strategic Planning Workspace)**

アプリのビジネス価値に関する簡単な概要。

アプリの機能に関する詳細な説明。

アプリケーションと機能

- ゴールフレームワーク および SPM のゴールフレームワーク
- 戦略的計画 でのゴール管理


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ドラフト]作業の計画と調整

ビジネスニーズに最適な計画立案アプリケーションを使用して、作業をビジネス目標に合わせて調整し、投資する適切な作業を決定し、リソース使用率を最大化します。

開始

戦略的計画ワークスペース



作業を戦略に合わせて調整し、シナリオに優先順位を付け、作業に優先順位を付け、キャパシティと財務を計画し、目標に対する進捗状況を追跡します。

Portfolio Planning Workspace
(ポートフォリオ計画ワークスペース)



プロジェクトとデマンドの計画に優先順位を付け、ロードマップを作成することで、従来の製品およびポートフォリオ管理を強化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソース管理ワークスペース	プロジェクトポートフォリオ管理クラシック
	
一元化されたワークスペースから、リソースにアサインされた作業の割り当てとブレークダウンを表示します。	簡素化されたチーム指向のアプローチに従い、複数の個別アプリケーションを使用してデマンド、プロジェクト、プログラム、およびポートフォリオを管理します。

自動翻訳

アプリケーションと機能

- 戦略的計画ワークスペースでのポートフォリオ計画
- Portfolio Planning Workspace (ポートフォリオ計画ワークスペース)
- リソース管理ワークスペース
- プロジェクトポートフォリオ管理


[ドラフト]計画された作業を実行

ビジネスニーズに基づいて、従来の方法、アジャイルな方法、またはハイブリッドな方法で計画された作業を実行および提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


開始

エンタープライズアジャイル計画



多様なチームとの調整を促進し、柔軟な作業とチーム構造の構成により、アジャイルフレームワークを組織全体に拡張します。

プロジェクトワークスペース




計画、財務、RIDAC、アナリティクス、およびドキュメントのセクションを使用して、一元的な場所からプロジェクトを計画および管理します。

コラボレーションワーク管理




中央のワークスペースからチームと共同作業を行い、作業の進捗状況を管理するために複数のツールを切り替える手間を省きます。

Agile Development 2.0




製品のライフサイクル全体での純粋なアジャイルアプローチや、従来のプロジェクト構造内でアジャイル手法を使用するハイブリッドアプローチを実装します。

サードパーティアプリとの統合



Microsoft Azure DevOpsまたはAtlassian Jiraを統合アジャイル開発 2.0

テスト管理アプリケーション



テストプロセスの管理を簡素化し、ソフトウェア製品をより効率的かつ少ないエラー数で提供します。

アプリケーションと機能

- エンタープライズアジャイル計画 は 戦略的計画 の値のいずれか
- プロジェクトワークスペース

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コラボレーションワーク管理
- アジャイル開発 2.0
- Atlassian Jira Integration for アジャイル開発
- Microsoft Azure DevOps Integration for アジャイル開発
- テスト管理 1.0
- テスト管理 2.0

[ドラフト]ダッシュボードの表示、レポートの生成とエクスポート

アプリ内ダッシュボードを使用してパフォーマンスの傾向を分析し、プロジェクト、ポートフォリオ計画、ロードマップの Microsoft PowerPoint ステータスレポートを生成し、Microsoft Excel にデータをエクスポートします。

開始

SPM の PowerPoint へのエクスポート



ポートフォリオ計画、ロードマップ、プロジェクトステータスを Microsoft PowerPoint ファイルにエクスポートします。

Enterprise アジャイル計画ダッシュボード



メトリクスを可視化し、ブロッカーを特定し、アジャイルチームのパフォーマンス傾向を分析します。


目標とターゲットのデータをエクスポート



Microsoft Excel または CSV ファイルを使用して、SPM 外のステークホルダーや協力者と目標の進捗状況を共有します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースポートフォリオビューをエクスポートする	計画立案アイテムスコアのエクスポート	**CWM** ボードのエクスポート
		
Microsoft Excel または CSV ファイルを使用して、SPM 外のステークホルダーとリソース割り当てを共有します。	Microsoft Excel または CSV ファイルを介して、ポートフォリオ計画の計画立案アイテムの採点データを SPM 外のステークホルダーと共有します。	コラボレーションワーク管理 (CWM) ボードを CSV または Microsoft Excel にエクスポートすることで、インサイトを取得し、SPM 外のステークホルダーとタスクの進捗状況を共有します。

アプリケーションと機能

- 戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート
- コラボレーションワーク管理
- プロジェクトワークスペース
- リソース管理ワークスペース
- 戦略的計画
- エンタープライズアジャイル計画 は 戦略的計画 の値のいずれか

[ドラフト]SPM の **Now Assist** で生産性を向上


戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) の生成 AI スキルは、フィードバックやドキュメントサマリーの生成、エピックからのストーリー、会話からのデマンド、プロジェクトサマリーの生成など、さまざまなタスクでプロダクトマネージャーを支援します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。


開始

製品フィードバックの要約

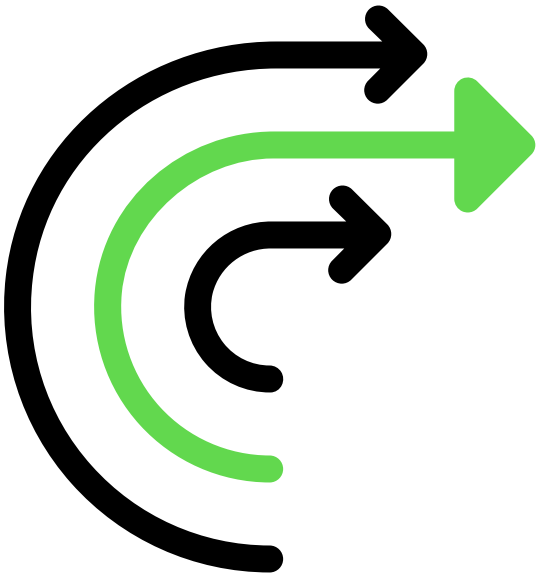

フィードバックレコードの名前と説明からサマリーを生成すると、各フィードバックレコードを手動で読み取らずに大量のフィードバックを迅速に分析できます。

エピックからストーリーを生成する

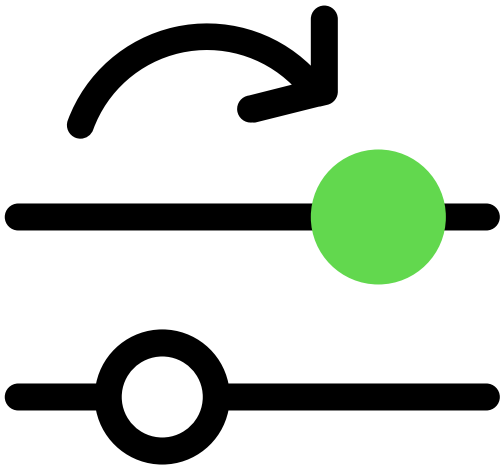

エンタープライズアジャイル計画 (EAP) ワークスペースのNow Assistパネルを使用して、エピックをストーリーに分類します。

会話エクスペリエンスからのデマンドの作成



仮想エージェントをサポートする任意のアプリケーションからデマンドを作成します。

ドキュメントコンテンツの要約を作成



計画立案アイテム、プロジェクト、およびチームのドキュメントサマリーを生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SPM 向け Now Assist のスキルの概要


SPM の Now Assist アプリケーションには生成 AI のスキルと機能が含まれており、製品、プロジェクト、およびデマンドマネージャーがNow Assistスキルを活用してプロセスとワークフローを合理化できるようにします。

フィードバック要約作成

長い顧客フィードバックコメントを簡潔にした有益なサマリーを製品マネージャーに提供します。製品マネージャーは、1 つまたは複数のフィードバックレコードの名前と説明からサマリーを生成できるので、フィードバックコンテキストをすばやく理解できます。生成されたサマリーは、直接実行アイテムに変換できます。 Now Assist 、フィードバックの入力データに使用されるフィールドに 60 個以上の単語が含まれている場合にのみ、フィードバックからサマリーを生成できます。60 語という最小語は、要約を作成するのに十分な情報があることを確認することで、エクスペリエンスを最適化します。

次の例は、マルチフィードバック要約スキルを使用した複数のフィードバックレコードの要約を示しています。

EAPワークスペースでストーリー生成スキルを使用して、エピックの高品質なストーリーの推奨事項を生成します。Now Assist、エピックの名前、説明、既存のストーリーを使用して、ストーリーの推奨事項を提供します。推奨事項に基づいて、 Now Assist に推奨事項の結合、分割、削除、変更、元の推奨事項に基づくストーリーの生成を依頼できます。

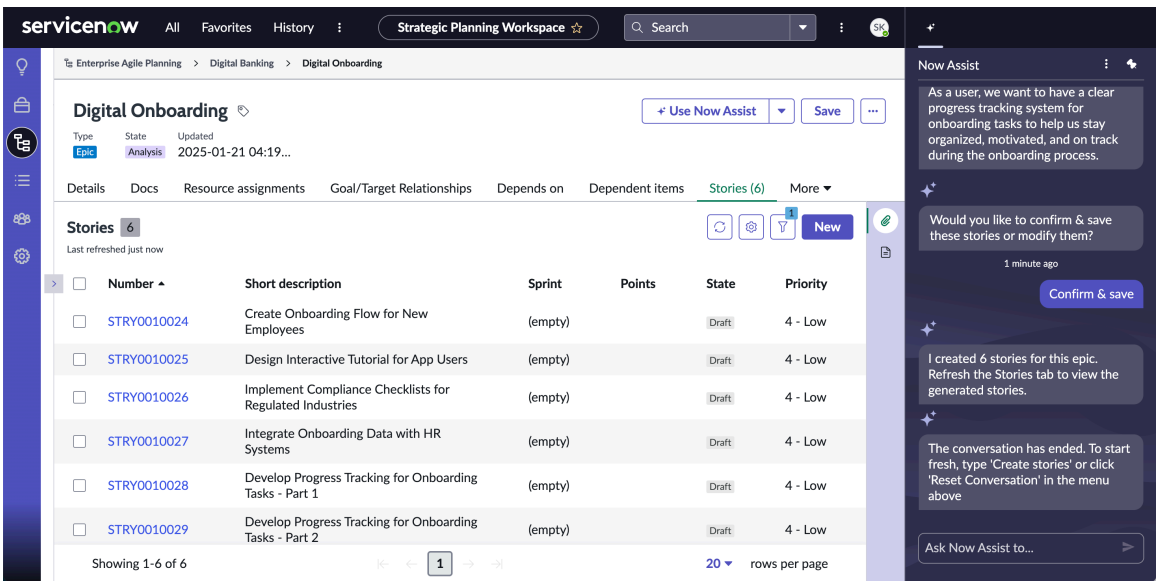

したがって、Now Assist のストーリー生成スキルを使用すると、次のことができます。

- 最初の障害を取り除き、エピックのストーリーを作成します。
- ストーリー作成プロセスを自動化することで、時間を節約し、生産性を向上させます。
- ペルソナ、結果、受け入れ条件に対応して、ストーリーの完全性を確保します。

ストーリー生成スキルは、 Yokohama リリースおよび Strategic Planning v4.5.0 以降でサポートされています。

デマンド作成のための会話エクスペリエンス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Now Assist 会話型カタログ作成機能を使用して、従業員サービス管理 (ESM) (ESC) ポータル内でデマンドを作成するプロセスを簡素化します。


- デマンドの作成に適したアイテムを見つけるためにカタログアイテムのリストを検索することは避けてください。
- チャットでコンテキストに応じた質問に回答して、[デマンド] フォームの関連フィールドに自動入力します。

注:
このスキルは、Now Assist アドミンコンソールの [プラットフォーム] カテゴリで利用できます。

プロジェクトドキュメント要約とアクション、計画アイテムドキュメント要約とアクション、または EAP ドキュメント要約とアクション

ドキュメントの Now Assist を使用して、選択したテキストまたは完全なテキストを簡潔にした有益なサマリーを製品マネージャーに提供します。製品マネージャーは、プロジェクトドキュメントの要約とアクション (プロジェクトワークスペース)、計画アイテムのドキュメントの要約とアクション (戦略的計画)、または EAP ドキュメントの要約とアクション (Enterprise Agile Planning) スキルを使用して、重要な情報をすばやく理解するために、選択したコンテンツまたは完了したコンテンツをドキュメントで要約、詳細化、または短縮できます。

ドキュメントの **Now Assist**

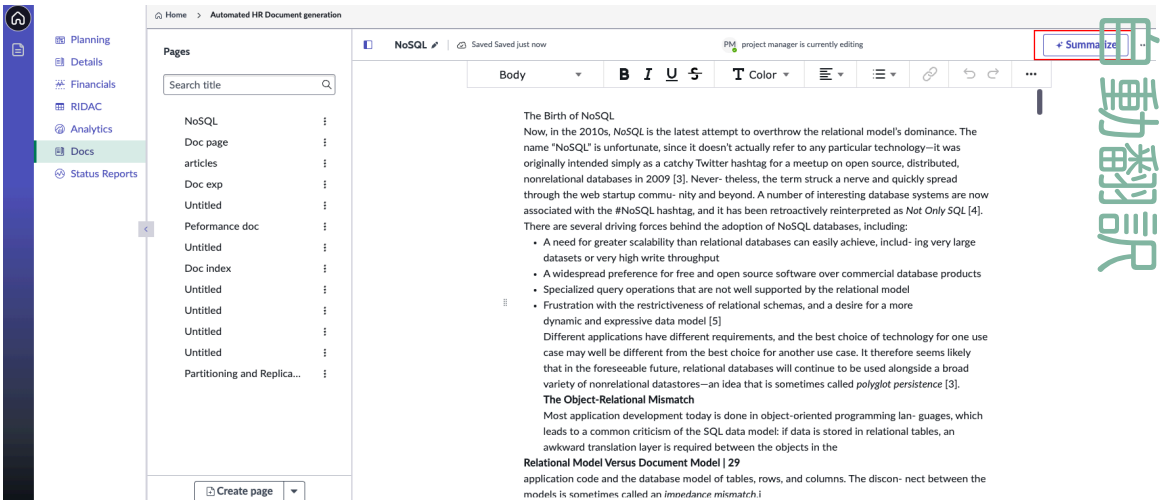

アプリケーションと機能



- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist
- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist を使用したフィードバックの要約
- 会話エクスペリエンスを使用したデマンドの作成
- を使用した EAP での作業アイテムからのストーリーの生成 SPM の Now Assist
- Email project summary スキルを使用してプロジェクトサマリーメールをスケジュールする

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[ワークスペースベースのドラフト]戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

作業をビジネスゴールに戦略的に合わせ、製品とサービスを提供します。 ServiceNow® 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) (旧 IT Business Management) はデジタルトランスフォーメーションを可能にするため、さまざまな方法論で価値を計画、提供、追跡し、顧客価値をより迅速に推進できます。

https://player.vimeo.com/video/1011388119?h=22a1bc163b&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

戦略的計画ワークスペース	**Portfolio Planning Workspace** (ポートフォリオ計画ワークスペース)	プロジェクトワークスペース	リソース管理ワークスペース
			
製品フィードバックからイノベーションを起こし、作業を戦略に合わせて調整し、柔軟な作業とチーム構成で実行します。	プロジェクトとデマンドの計画に優先順位を付け、ロードマップを作成することで、従来の製品およびポートフォリオ管理を強化します。	計画、財務、RIDAC、アナリティクス、およびドキュメントのセクションを使用して、一元的な場所からプロジェクトを計画および管理します。	一元化されたワークスペースから、リソースにアサインされた作業の割り当てとブレークダウンを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コラボレーションワーク管理




中央のワークスペースからチームと共同作業を行い、作業の進捗状況を管理するために複数のツールを切り替える手間を省きます。

プロジェクトポートフォリオ管理クラシック



簡素化されたチーム指向のアプローチに従い、複数の個別アプリケーションを使用してデマンド、プロジェクト、プログラム、およびポートフォリオを管理します。

Agile Development 2.0



製品のライフサイクル全体での純粋なアジャイルアプローチや、従来のプロジェクト構造内でアジャイル手法を使用するハイブリッドアプローチを実装します。

SPM の Now Assist で生産性を向上



SPM アプリ内で利用できるさまざまな生成 AI スキルについて説明します。

アプリケーションと機能

- 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 向け Now Assist
- 戦略的計画
- ポートフォリオ計画
- プロジェクトワークスペース
- リソース管理ワークスペース
- 戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート
- ゴールフレームワーク および SPM のゴールフレームワーク
- Project Portfolio Management (プロジェクトポートフォリオ管理)
- タイムカード管理
- アジャイル開発 2.0
- Microsoft Azure DevOps Integration for アジャイル開発
- Atlassian Jira Integration for アジャイル開発
- Scaled Agile Framework (SAFe)
- テスト管理アプリケーション
- SPM ベンチマーク
- コスト管理
- データ分離

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。
